
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS


	Modo	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1		**Implementación de acciones de conservación, rehabilitación, educación, extensión y uso sostenible de la biodiversidad y los servicios**	**540 días?**	**Sat 01-11-25 7:00**
2		**ETAPA PRECONTRACTUAL**	**32 días**	**Tue 16-12-25 7:00**
3		**DISMINUIR EL IMPACTO ANTROPICO SOBRE LAS AREAS DE PROTECCION DEL MUNICIPIO**	**497 días?**	**Sat 01-11-25 7:00**
4		**IMPLEMENTACIÓN DE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS SOBRE MARCO NORMATIVO Y TECNICO DE LOS ECOSISTEMAS LOCALES**	70 días	Sat 17-01-26 7:00
5		**Implementar jornadas lúdico-pedagógicas a las Instituciones Educativas a través de los PRAES.**	**54 días**	**Mon 02-02-26 7:00**
6		Asistencia técnica para el fortalecimiento de los PRAES a traves de jornadas de sensibilización en las instituciones educativas oficiales	54 días	Mon 02-02-26 7:00
7		Complemento nutricional (Refrigerios) - Un Jugo Natural maracuyá o mora o lulo o guayaba en agua, servido en vaso plastico de varios usos (reutilizabe) con capacidad minima 230 cc;producto pasteleria: Empanada, elaborada con harina de trigo, rellena de ar	54 días	Mon 02-02-26 7:00
8		Kit de logística N°1 para jornadas lúdico-pedagógicas para las Instituciones	54 días	Mon 02-02-26 7:00
9		Servicio de Transporte de personal en vehiculo tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Igual a 2021 o superior (Decreto No 0056 de 2024)	54 días	Mon 02-02-26 7:00
10		**Insumos y materiales entregados a las instituciones educativas como fortalecimiento a los PRAES**	**70 días**	**Sat 17-01-26 7:00**
11		Contenedor plástico: Punto Ecológico capacidad mínima volumétrica 50 litros. Tres (3) recipientes. Estructura metálica. Largo mínimo 85 cm, Alto mínimo 90, ancho mínimo 30 cm	54 días	Mon 02-02-26 7:00
12		Tanque para almacenamiento de agua, con tapa. Capacidad 2.000 litros. Fabricado en polietileno negro con aditivo U.V. que bloquea el paso de los rayos solares, evitando la formación de algas y bacterias en el agua. Fabricado en polietileno. Color negro. A	54 días	Sat 17-01-26 7:00
13		Batea plástica capacidad 100 litros (Recipiente plástico en forma de bóveda-media caneca). Capacidad 100 litros	54 días	Sat 17-01-26 7:00
14		Bolsas de colores: 80 cm x 110 cm. Polietileno de baja densidad, material reciclado	54 días	Sat 17-01-26 7:00
15		Guantes en latex: Caja de guantes en latex, 100 unidades por recipiente.	54 días	Sat 17-01-26 7:00
16		Tapabocas: Recipiente de 50 unidades. Elaborado en tela no tejida de uso	54 días	Sat 17-01-26 7:00
17		Material Vegetal Ornamental: Altura Mínima 35 cm. libres de plagas y enfermedades, con buen estado de vigor,nutricional y fitosanitario. Especies a entregar Ixoras,Durantas,Crotos,Palmas Bismarckia,Palmas Abanico,Palmas de Moriche,Palmas Manila,	54 días	Sat 17-01-26 7:00
18		Abono orgánico: Compost. Con registro ICA.	54 días	Sat 17-01-26 7:00
19		Lombriz Roja californiana, corresponde a la especie y genero Eisenia foetida:	54 días	Sat 17-01-26 7:00
20		Cartillas para Colorear Aves: incluye 16 especies representativas e ilustradas a todo color como referencia para colorear los bosquejos en blanco y negro de las mismas aves que encuentran en su interior. Tamaño 12 x 22 cm	54 días	Sat 17-01-26 7:00
21		Servicio de Transporte de Carga para insumos y materiales entregados a las Instituciones Educativas del municipio mediante Un vehículo tipo camión con capacidad de tres toneladas o más para transporte de carga a todo costo, incluyendo los costos de manten	54 días	Sat 17-01-26 7:00
22		**Desarrollar acciones de sensibilización educativa ambiental a las comunidades rurales a través de PROCEDAS.**	**497 días?**	**Sat 01-11-25 7:00**
23		Complemento nutricional (refrigerios)	30 días	Mon 02-02-26 7:00
24		Kit de logística N°2 para jornadas lúdico-pedagógicas con comunidades rurales (Según APU 1.1.2.3)	30 días	Mon 02-02-26 7:00
25		Servicio de Transporte de personal en vehículo tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Igual a 2021 o superior (Decreto No 0056 de 2024).	30 días	Mon 02-02-26 7:00
26		**Asistencia técnica agropecuaria para la implementación de los Laboratorios pedagógicos Agroambientales**	180 días	Mon 02-02-26 7:00

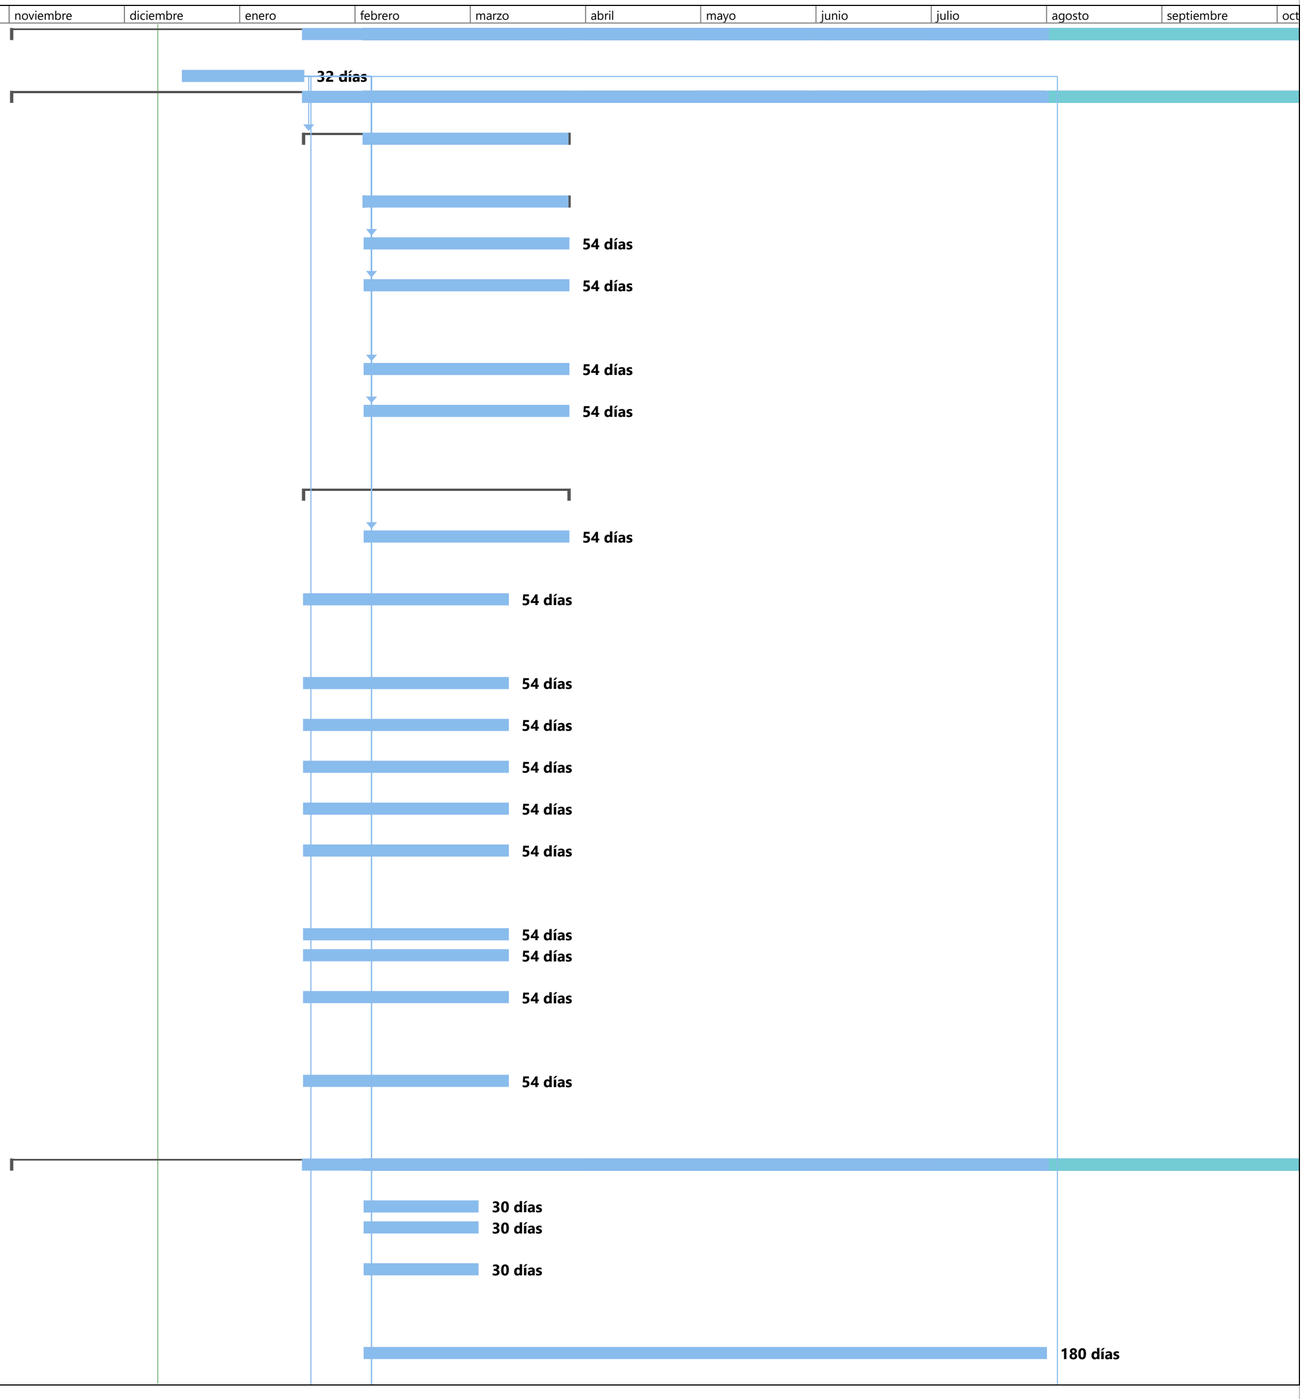

Proyecto: Diagrama de Gantt proyecto ambiental
Fecha: Wed 10-12-25 16:41

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS

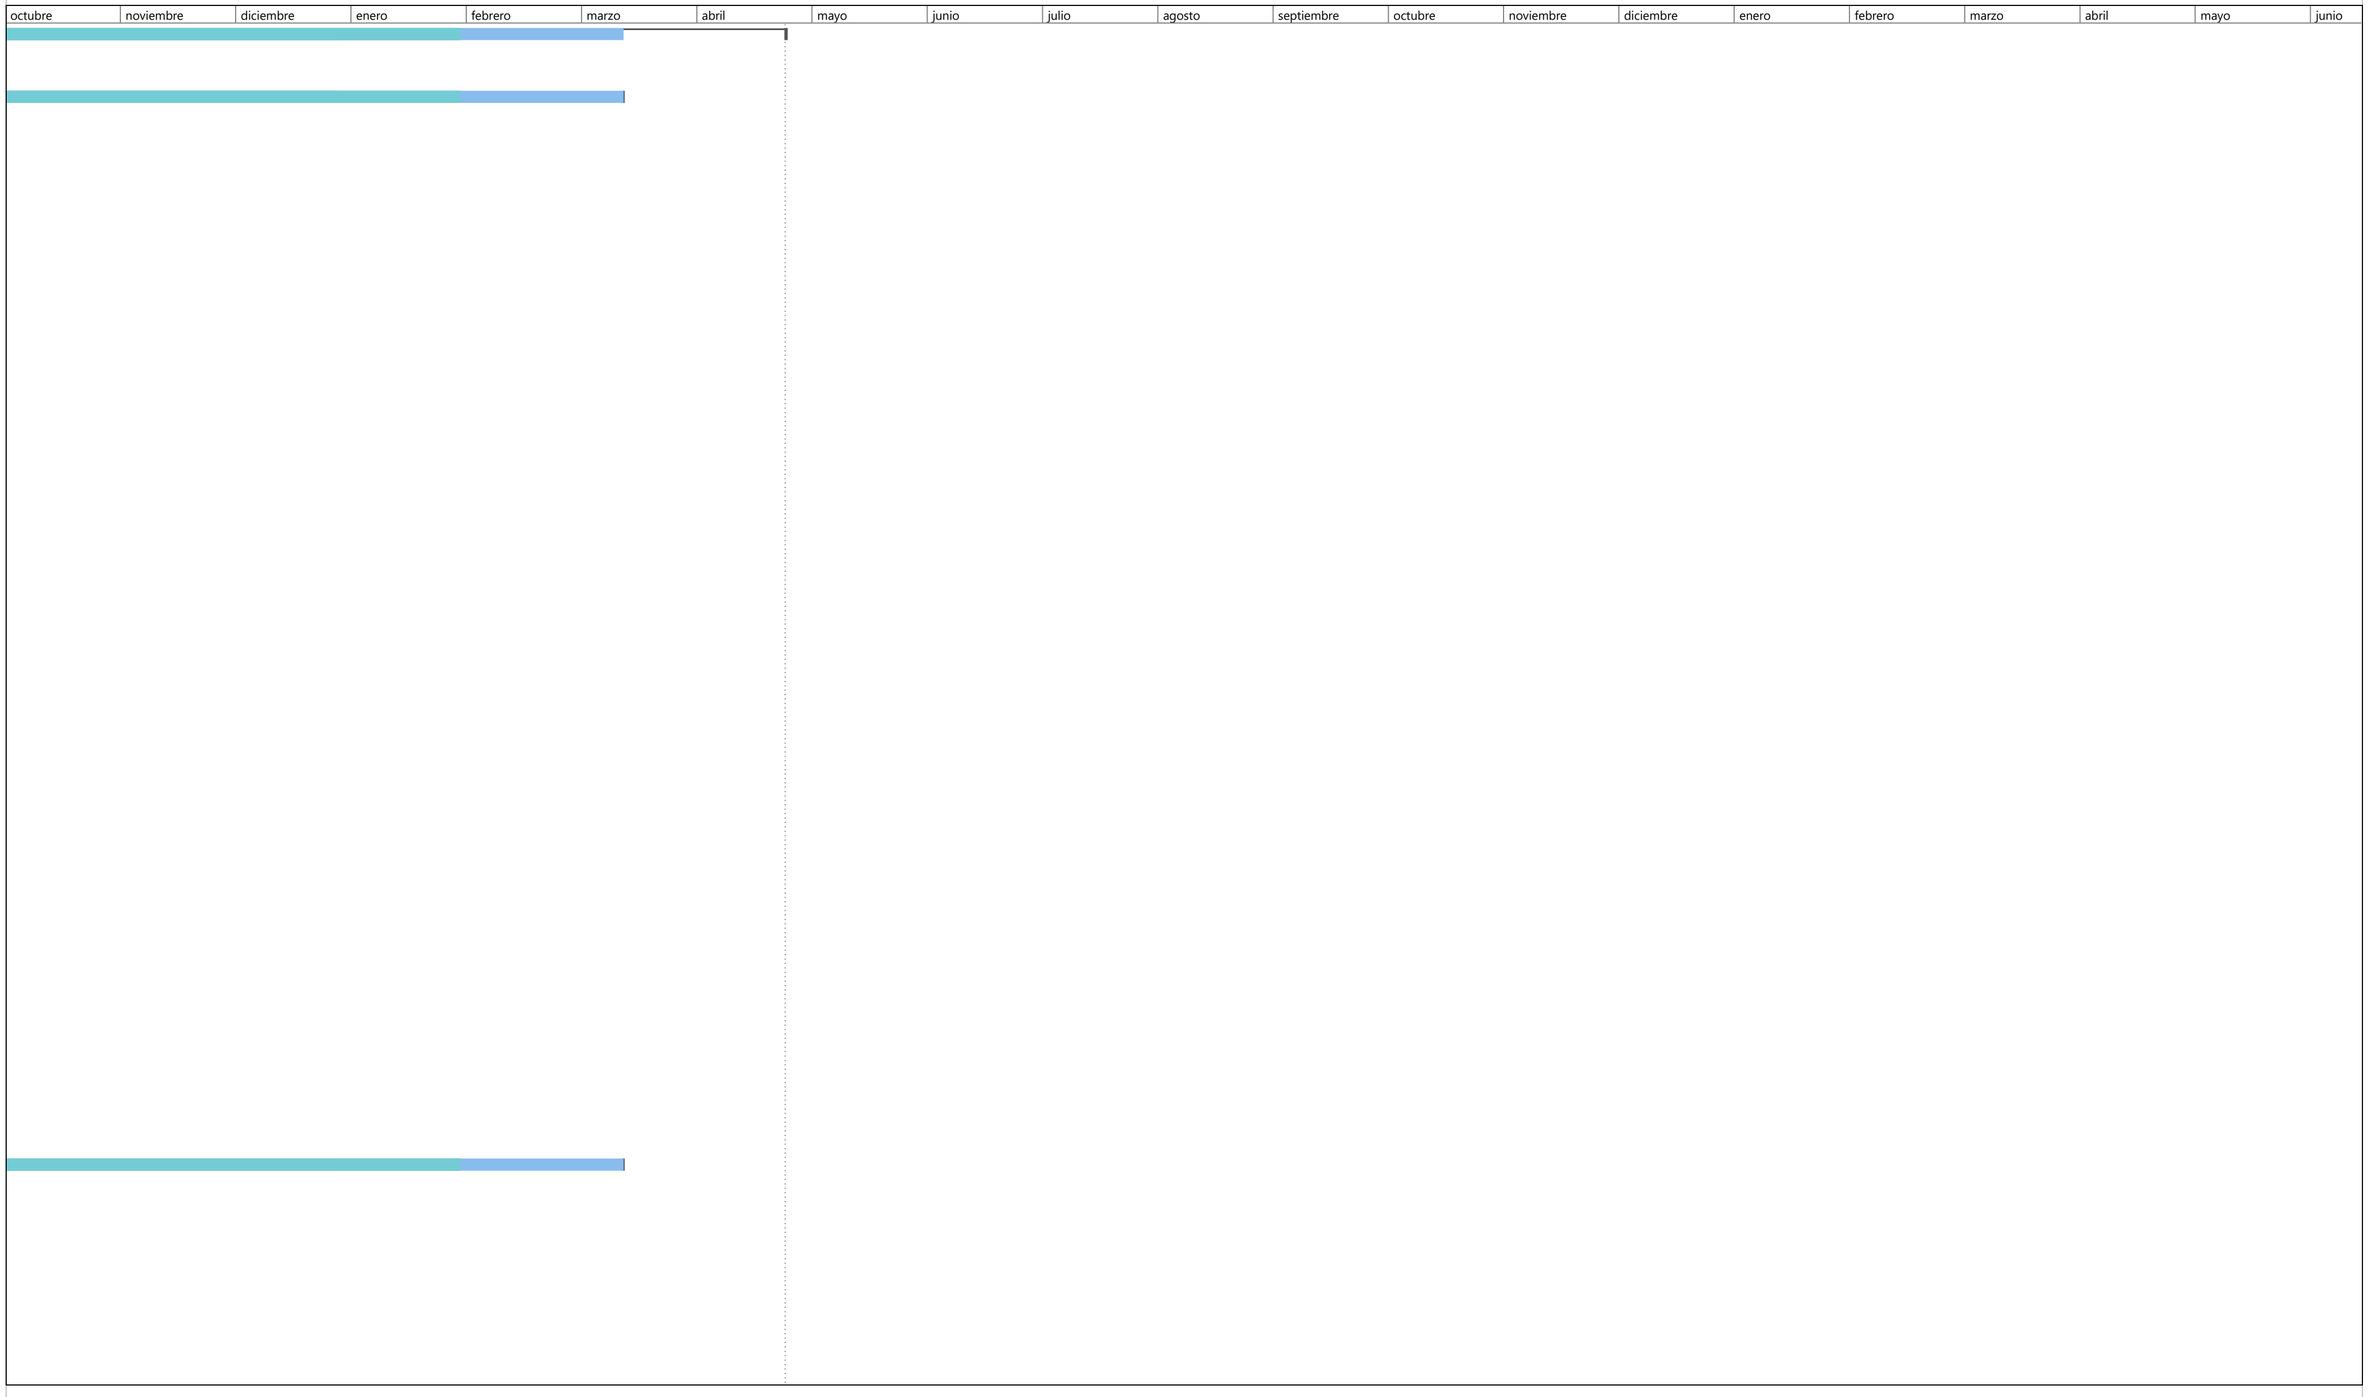


Proyecto: Diagrama de Gantt proyecto ambiental
Fecha: Wed 10-12-25 16:41

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS

	Modo	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
27		ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA: Un profesional (1). Título universitario en Ingeniería Agroforestal, título de especialización. Experiencia profesional de cuatro (4) años, de los cuales se debe acreditar como mínimo tres (3) años de experiencia relaciona	180 días	Mon 02-02-26 7:00
28		ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA:Un profesional (1). Título universitario en Medicina Veterinaria	180 días	Mon 02-02-26 7:00
29		ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA-: Un profesional (1). Título universitario en Ingeniería Agroindustrial. Experiencia profesional de dos (2) años de los cuales debe acreditar como mínimo un (1) año de experiencia relacionada.	180 días	Mon 02-02-26 7:00
30		ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA -: Un profesional (1). Título universitario en Administración industriales. Experiencia profesional de un año (1) años de los cuales debe acreditar como mínimo seis (6) meses de experiencia relacionada.	180 días	Sat 01-11-25 7:00
31		ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA- DOS (2) TECNOLOGOS O TECNICOS: Título de formación técnica ciencias agropecuarias o ambientales o afines.	180 días	Sat 01-11-25 7:00
32		Récord registro visitas asistencia técnica agropecuaria (talonario para 50 visitas en papel químico original, tamaño carta, dos copias)	180 días	Sat 01-11-25 7:00
33		Servicio de Transporte de personal en vehículo tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Igual a 2021 o superior (Decreto No 0056 de 2024).	180 días	Sat 01-11-25 7:00
34		**Kit de Insumos y materiales para la implementación de los Laboratorios pedagógicos Agroambientales**	180 días	Sat 01-11-25 7:00
35		Cal agrícola para enmienda de suelos	180 días	Sat 01-11-25 7:00
36		Cascarilla de arroz (Paca prensada), peso aproximado 20 kilogramos	180 días	Sat 01-11-25 7:00
37		Abono orgánico: Compost, o gallinaza tratada. Bulto 50 Kg. Composición Nitrógeno Total (N) = Mínimo 2%- Fosforo total (p2o5) = Mínimo 1,5%- Calcio (Cao)= Mínimo 3%. pH = Mínimo 7 Registro ICA	180 días	Sat 01-11-25 7:00
38		Batea plástica capacidad 100 litros (Recipiente plástico en forma de bóveda-media caneca).	180 días	Sat 01-11-25 7:00
39		2 Lombriz Roja californiana: Lombriz en sustrato	180 días	Sat 01-11-25 7:00
40		Malla plástica. Malla en polipropileno. Color negro. Rollo de 50 metros de largo por 1,8 metros de alto.	180 días	Sat 01-11-25 7:00
41		Posta madera inmunizado, longitud 2 m, diámetro igual o mayor a 10 cm	180 días	Sat 01-11-25 7:00
42		Bandeja multiplicación o germinación semilla. Capacidad Mínima 50 cavidades profundas	180 días	Sat 01-11-25 7:00
43		Cilantro semilla de hortaliza, Sobre de 10 gr. Registro ICA	180 días	Sat 01-11-25 7:00
44		Tomate. Semilla de Hortaliza, sobre de 3 gr. Registro ICA	180 días	Sat 01-11-25 7:00
45		Lechuga. Semilla de Hortaliza, sobre de 7 gr. Registro ICA	180 días	Sat 01-11-25 7:00
46		Cebolla Cabezona. Semilla de Hortalizas, sobre 3 gramos. Registro ICA.	180 días	Sat 01-11-25 7:00
47		Habichuela. Semilla Hortalizas, sobre 25 gramos.Registro ICA.	180 días	Sat 01-11-25 7:00
48		Pepino Cohombro. Semilla de Hortalizas, sobre 3 gramos. Registro ICA	180 días	Sat 01-11-25 7:00
49		Manzanilla. Semilla de Hortali	180 días	Sat 01-11-25 7:00
50		Melaza o Miel de purga . Presentación en Sobra o galón.	180 días	Sat 01-11-25 7:00
51		Roca Fosfórica. Fertilizante Simple. Formula NPK (0-26-0). con 36% de Calcio Presentación bulto 50 kilogramos o su equivalente. Registro ICA	180 días	Sat 01-11-25 7:00
52		Sulfato de Magnesio. 16 % de magnesio (Mg) y 13 % de azufre (S). Presentación bulto 25 kilogra	180 días	Sat 01-11-25 7:00
53		Tubetes para forestales. Peso mlnirno 31 gramos. 20 cm profundidad, ancho superior 6 cm. Profundidad inferior 1,6 cm	180 días	Sat 01-11-25 7:00
54		Bandeja porta tubetes. Peso mínimo 1.000 gramos. Altura minima 15 cm, ancho 35 cm, largo 50 cm.Capacidad mlnima 30 lubete	180 días	Sat 01-11-25 7:00
55		Bolsa para vivero, hechas en Polipropileno de Baja densidad. Color negro;Dimensiones 9 x 18 cm con fuelle. Paquete por 100 unidades	180 días	Sat 01-11-25 7:00
56		Semillas forestales nativas. Certificadas !CA. Especies: Ocobo, Orejera u otras adaptables a la zona	180 días	Sat 01-11-25 7:00
57		Alambre galvanizado, liso calibre No 14. color plateado.Fabricados en acero SAE 1006. Recubrimiento de zinc liviano mínimo 55 g/m2. Resistencia a la tracción Blanda (< 52 kgf mm2). Alambre trefilado con proceso de galvanización en caliente.	180 días	Sat 01-11-25 7:00
58		Caneca Plastica 200 litros. Elaborada en Polipropileno de alta duración	180 días	Sat 01-11-25 7:00
59		Bomba de Espalda (20 l) Bomba fumigadora manual con capacidad mínima de 20 litros con sistemas de inyección y presión hidráulica, con pistón y cámara externos, con capacidad mínima de cámara de 1 litro, y presión de trabajo mínima de 40 psi +/- 10%.	180 días	Sat 01-11-25 7:00

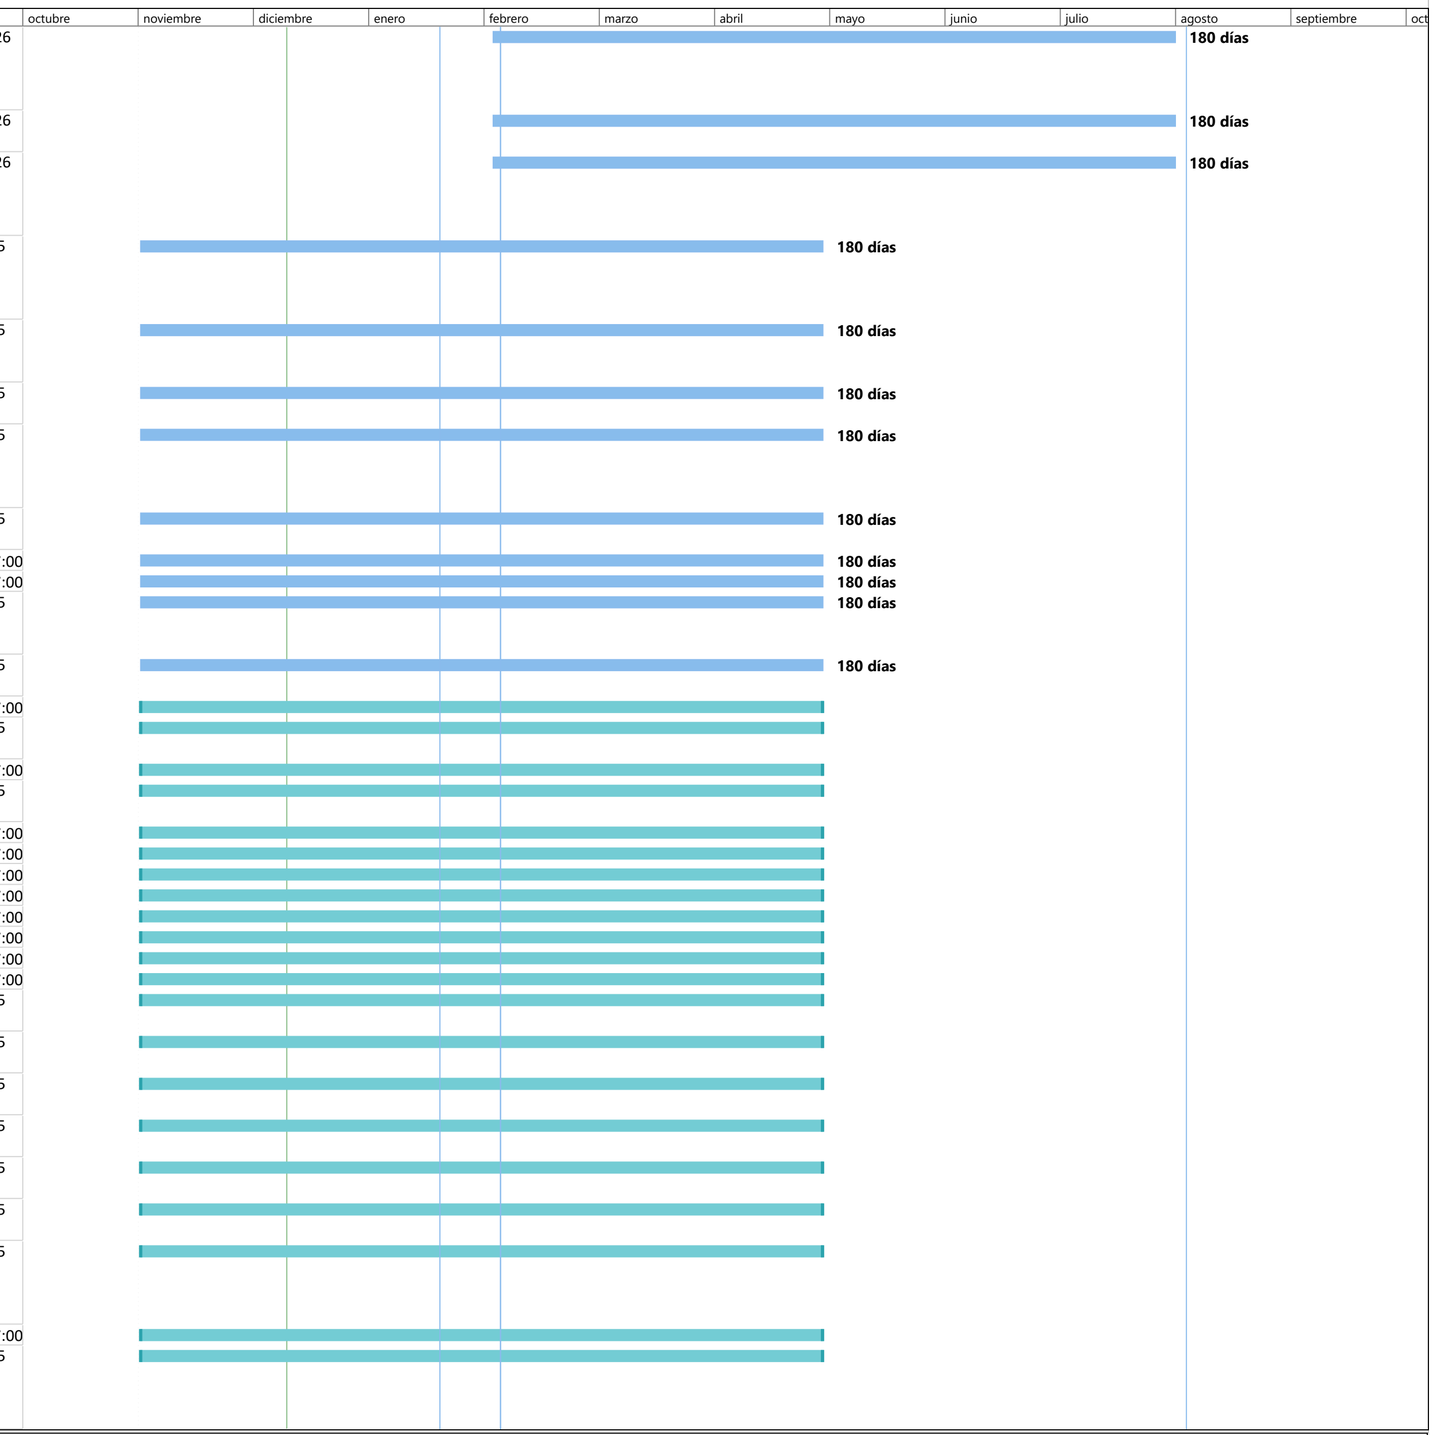

Proyecto: Diagrama de Gantt proyecto ambiental
Fecha: Wed 10-12-25 16:41

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS


octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio

Proyecto: Diagrama de Gantt proyecto ambiental
Fecha: Wed 10-12-25 16:41

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica		
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso		
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual		

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS


	Modo	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
60		Teja Zinc: Ondulada 3.658 x 0.80mt : Cal 35 0.17mm	180 días	Sat 01-11-25 7:00
61		Polisombra: Malla Tejida en polietileno HD con estabilizador U.V, utilizada para generar sombra y protección contra rayos U.V, porcentaje de cubrimiento 90% +-5%	180 días	Sat 01-11-25 7:00
62		Mano de obra para jornales de instalación de Laboratorios pedagógicos Agroambientales: Mano de obra no calificada implementación Laboratorios pedagógicos Agroambientales: Limpieza terreno, trazado, ahoyado, instalación malla y elementos.	180 días	Sat 01-11-25 7:00
63		Servicio de Transporte de Carga para insumos y materiales a entregar mediante Un vehículo tipo camión con capacidad de tres toneladas o más para transporte de carga a todo costo, incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Modelo Iuga	180 días	Sat 01-11-25 7:00
64		**DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN DE CAMBIO CLIMATICO EN LAS AREAS AMBIENTALMENTE ESTRATEGICAS**	180 días	Sun 02-08-26 7:00
65		**DISMINUCION DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ANTROPICAS NO SOSTENIBLES SOBRE AREAS A CONSERVAR**	**180 días**	**Sun 02-08-26 7:00**
66		**Asistencia técnica agropecuaria para implementación de unidades demostrativas agrosostenibles**	**180 días**	**Sun 02-08-26 7:00**
67		ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA:Un profesional (1). Título universitario en Ingenieria Agroforestal, título de especialización. Experiencia profesional de cuatro (4) años, de los cuales se debe acreditar como mínimo tres (3) años de experiencia relacionad	180 días	Sun 02-08-26 7:00
68		ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA:Un profesional (1). Título universitario en Medicina Veterinaria y Zootecnia	180 días	Sun 02-08-26 7:00
69		ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA-:Un profesional (1). Título universitario en Ingenieria Agroindustrial.Experiencia profesional de dos (2) años de los cuales debe acreditar como mínimo un (1) año de experiencia relacionada.	180 días	Sun 02-08-26 7:00
70		ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA - :Un profesional (1). Título universitario en Administración industriales. Experiencia profesional de un año (1) años de los cuales debe acreditar como mínimo seis (6) meses de experiencia relacionada.	180 días	Sun 02-08-26 7:00
71		ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA- DOS (2) TECNOLOGOS O TECNICOS: Título de formación técnica ciencias agropecuarias o ambientales o afines.	180 días	Sun 02-08-26 7:00
72		Record registro visitas asistencia técnica agropecuaria (talonario para 50 visitas en papel químico original,, tamaño carta, dos copias).	180 días	Sun 02-08-26 7:00
73		Servicio de Transporte de personal en vehiculo tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Igual a 2021 o superior (Decreto No 0056 de 2024).	180 días	Sun 02-08-26 7:00
74		**Implementar unidades demostrativas productivas sostenibles (Apicola)**	**60 días**	**Ved 01-04-26 7:0**
75		Colmenas estándar tipo Lanstroth. (Incluyen: Base (piquera), cámara de cría, con cuadros y cera reforzados, tapa interna y techo metálico. Elaboradas en madera encerado externamente cumpliendo normas BPM. Cuadros con alambre acerado y lamina de refuerzo m	60 días	Wed 01-04-26 7:00
76		Alzas estandar Incluye: 10 Cuadros con alambre con láminas de cera.	60 días	Ved 01-04-26 7:0
77		Soporte Metálico Antihormigas: Elaborado en tubo o varilla corrugada para cada colmena individual	60 días	Wed 01-04-26 7:00
78		Porta núcleo: De 4 marcos, empleado en el traslado y captura de enjambres con cuadros y cera.	60 días	Wed 01-04-26 7:00
79		Material Biológico - Núcleo de abejas: 4 marcos, uno de cría abierta, uno de cría operculada y dos cuadros de reservas de alimento, reina fecunda, no incluye el porta núcleo.	60 días	Wed 01-04-26 7:00
80		malla excluidora: rejilla especial colocada entre el nido y la alza y se usa para confinar a la abeja reina en el nido, evitando así que se suba a la alza y haga una cría.	60 días	Wed 01-04-26 7:00
81		Azúcar: Alimento para las abejas en fase inicial.	60 días	Ved 01-04-26 7:0
82		Overol enterizo con careta : Drill super 8 tipo americano.	60 días	Ved 01-04-26 7:0
83		Guantes: En cuero manga larga para apicultura	60 días	Ved 01-04-26 7:0
84		Ahumador mediano: en acero inoxidable con rejilla de protección	60 días	Ved 01-04-26 7:0
85		Palanca en acero inoxidable	60 días	Ved 01-04-26 7:0
86		Cepillo para barrer abejas, elaborado en madera y cerdas de crin.	60 días	Ved 01-04-26 7:0
87		Tenedor desoperculador	60 días	Ved 01-04-26 7:0
88		Centrifuga en acero inoxidable: De tres marcos con soporte metálico, llave de descarga de miel en plástico, canastilla en acero electro soldada, piñones de acero	60 días	Wed 01-04-26 7:00

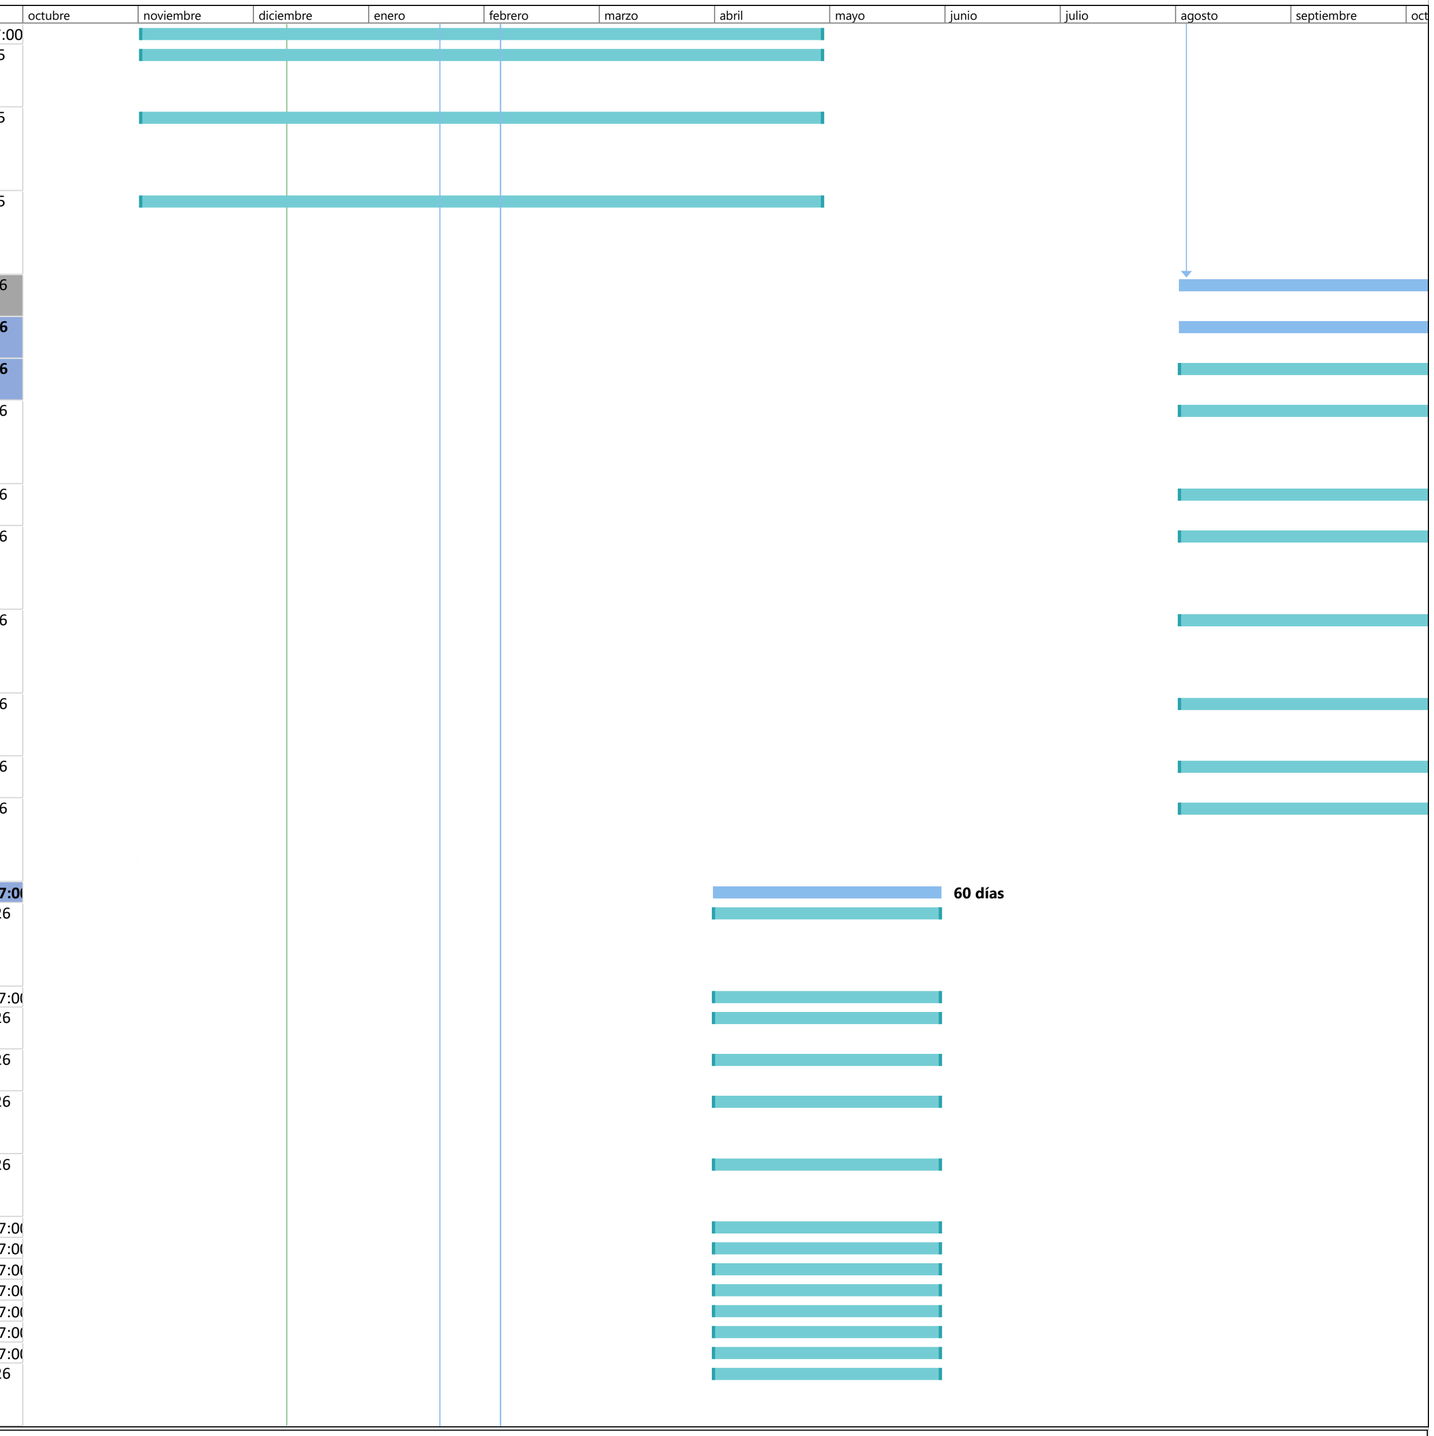

Proyecto: Diagrama de Gantt proyecto ambiental
Fecha: Wed 10-12-25 16:41

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS

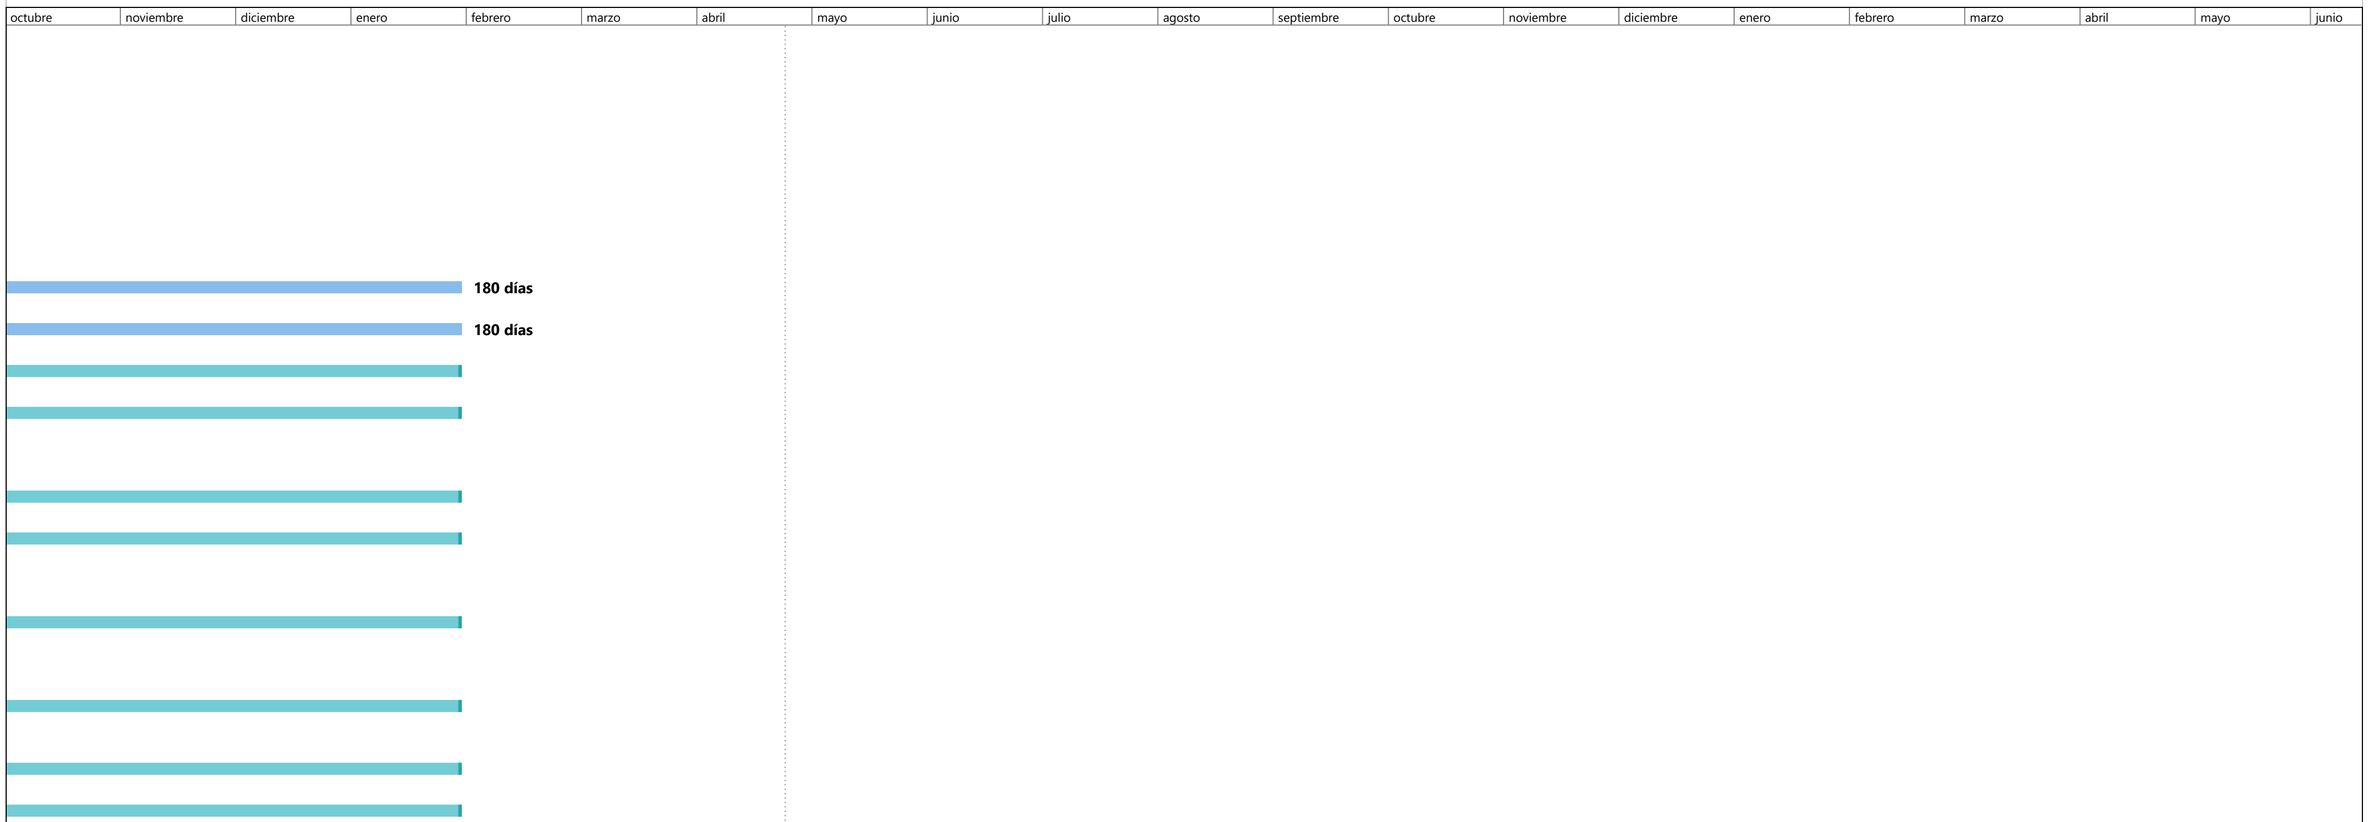


Proyecto: Diagrama de Gantt proyecto ambiental
Fecha: Wed 10-12-25 16:41

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica	
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual	

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS

	Modo	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
89		**Mano de obra para jornales de instalación de unidades Apicolas: Mano de obra no calificada instalación Unidad Apicola: Limpieza terreno, replanteo, limpieza terreno, instalación.**	60 días	Wed 01-04-26 7:00
90		Servicio de Transporte de Carga para insumos y materiales a entregar mediante Un vehículo tipo camión con capacidad de tres toneladas o más para transporte de carga a todo costo, incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Modelo luga	60 días	Wed 01-04-26 7:00
91		**Implementar Unidades Demostrativas Productivas Sostenibles (Estufas Ecoeficientes Moviles).**	**90 días**	**Fri 01-05-26 7:00**
92		Estufa tipo Palermo (4 hornillas de leña con recamara de combustión, Horno 25 ancho x 30 alto x 40 fondo (Leña), Recamaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza, Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable,	90 días	Fri 01-05-26 7:00
93		Suministro de insumos agricolas para huerto leñero (Dendroenergético)	90 días	Fri 01-05-26 7:00
94		Material Vegetal Forestal Nativo: Altura 40 - 50 cm. Incluye resiembra del 10%. Vivero certificado ICA (Plantula) (Según Patrón de costo	90 días	Fri 01-05-26 7:00
95		Fertilizante Compuesto de Síntesis Química NPK (15-15-15) Kilos. Con registro ICA. (Según Patrón de costo 1.2.3.1.2-7)	90 días	Fri 01-05-26 7:00
96		Fertilizante Elementos Menores. Bulto de 46 kg. Formula que contenga: N, P2O5. CaO. MgO, S, B, Cu, Fe, Mn. Mo. Zinc. Registro ICA. (Según Patrón de costo 1.2.3.1.2-7)	90 días	Fri 01-05-26 7:00
97		Corrector de pH: CALFOS (Fertilizante rico en fosforo y calcio). registro ICA. (Según Patrón de costo 1.2.3.1.2-7)	90 días	Fri 01-05-26 7:00
98		Insecticida biologico para control sanitario. Biocontrolador tipo agente microbial para control de plagas. (Según Patrón de costo 1.2.3.1.2-7)	90 días	Fri 01-05-26 7:00
99		Hidroretenedor de uso agrícola: Acondicionador orgánico no húmico sólido para aplicación al suelo - Hidroretenedor. (Según Patrón de costo 1.2.3.1.2-7)	90 días	Fri 01-05-26 7:00
100		Abono orgánico: Compost, o gallinaza tratada. Bulto 50 Kg. Composición Nitrogeno Total (N) = Mínimo 2%- Fostoro total (p2o5) = Mínimo 1,5%- Calcio (Cao)= Mínimo 3%	90 días	Fri 01-05-26 7:00
101		Fertilizante Foliar completo. Registro ICA	90 días	Fri 01-05-26 7:00
102		Coadyuvante agrícola. Registro ICA	90 días	Fri 01-05-26 7:00
103		Mano de obra para jornales de instalación de Estufas ecoeficientes y sostenimiento de huerto leñero o dendroenergetico: Mano de obra no calificada implementación (Limpieza terreno, trazado, ahoyado, siembra, labores culturales, control plagas y enfermedad	90 días	Fri 01-05-26 7:00
104		Aislamiento o cercado del huerto leñero: Instalar aislamiento o cercado perimetral de metros líneales, incluye postas en madera inmunizado o plástico cada 3 metros, cuatro hilos de alambre de púas. (Según Patrón de costo 1.2.3.1.12)	90 días	Fri 01-05-26 7:00
105		Servicio de Transporte de Carga para insumos y materiales a entregar mediante Un vehículo tipo camión con capacidad de tres toneladas o más para transporte de carga a todo costo, incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Modelo luga	90 días	Fri 01-05-26 7:00
106		**AUMENTAR LA INTERACCION INSTITUCIONAL EN LA PROTECCION DE LAS AREAS AMBIENTALES ESTRATEGICAS LOCALES**	**180 días?**	**Mon 02-02-26 7:00**
107		**DESARROLLO DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS**	125 días	Mon 02-02-26 7:00
108		**Construcción y caracterización de la línea base biofísica y socioeconómica actual de las areas ambientalmente estratégicas para la conservación del recurso hídrico en el municipio. Construcción**	**180 días**	**Mon 02-02-26 7:00**
109		Kit de equipo construcción línea báse biofísica de las areas ambientales (según APU 2.1.1.1)	180 días	Mon 02-02-26 7:00
110		Construcción y caracterización de la línea base biofísica y socioeconómica actual de las areas ambientalmente estratégicas para la conservación del recurso hídrico en el municipio y Construcción de la matriz de impactos: conflictos ambientales, tensionant	180 días	Mon 02-02-26 7:00
111		Servicio de Transporte de personal en vehiculo tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Igual a 2021 o superior (Decreto No 0056 de 2024).	180 días	Mon 02-02-26 7:00
112		**Restauración pasiva de areas de conservación**	**60 días**	**Tue 02-06-26 7:00**
113		Restauración pasiva en areas de conservación asociadas al recurso hídrico del municipio (Aislamiento). (Patrón de costo 1.2.3.1.12)	60 días	Tue 02-06-26 7:00
114		**AUMENTO DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL**	420 días	Sat 17-01-26 7:00

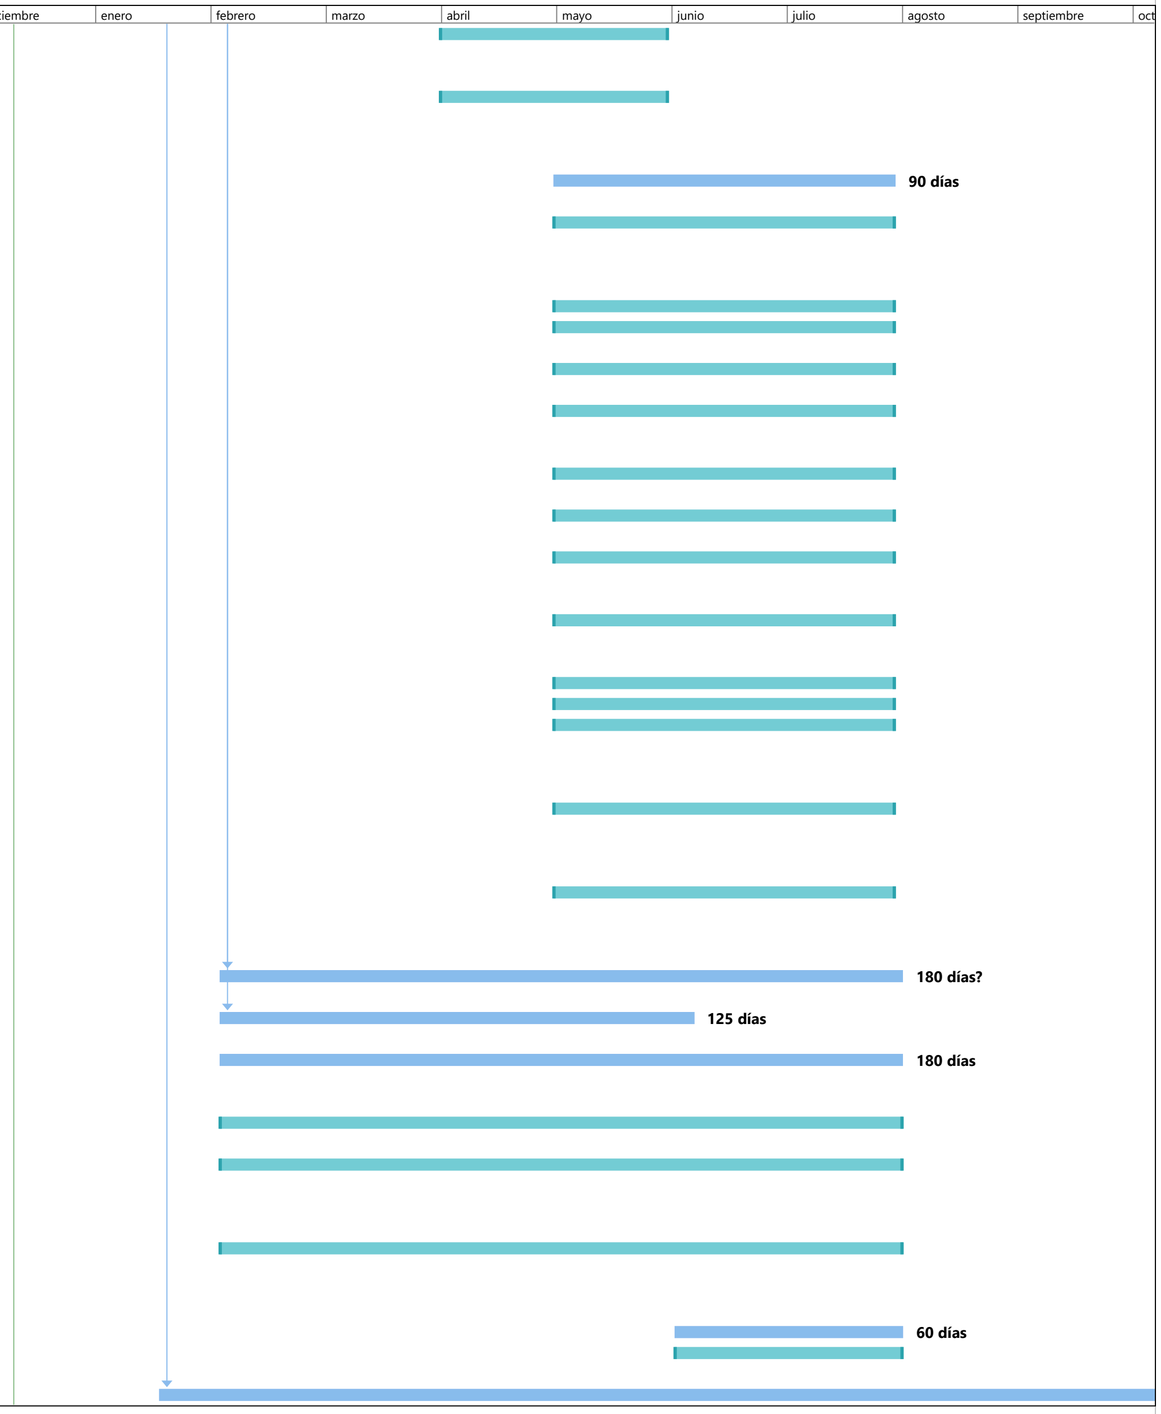

Proyecto: Diagrama de Gantt proyecto ambiental
Fecha: Wed 10-12-25 16:41

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS

octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio

420 días

Proyecto: Diagrama de Gantt proyecto ambiental
Fecha: Wed 10-12-25 16:41

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica		
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso		
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual		

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS


	Modo	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
115		**Monitoreo y seguimiento de áreas de conservación en predios del municipio en ecosistemas estratégicos.**	**180 días**	**Wed 01-07-26 7:00**
116		Asistencia técnica Ambiental para el monitoreo de áreas y predios ambientalmente estratégicos a cargo del municipio de Tauramena (Según APU 2.2.2.1)	180 días	Wed 01-07-26 7:00
117		Materiales e insumos Instalación de parcelas de monitoreo (Según APU 2.2.2.2)	180 días	Wed 01-07-26 7:00
118		Análisis de muestra en laboratorio (pH, C.E., CIC, Carbón Orgánico, Mat. Orgánica, N-mineral (N-NH4+N-NO3), P, K, Ca, Mg, S, Na, Cl, Al, Relaciones Catiónicas,materia orgánica)	180 días	Wed 01-07-26 7:00
119		Servicio de Transporte de personal en vehiculo tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Igual a 2021 o superior (Decreto No 0056 de 2024).	180 días	Wed 01-07-26 7:00
120		Kit Papelería para monitoreos y seguimiento: (Según APU 2.2.2.5)	180 días	Ved 01-07-26 7:0
121		**REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO:FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE GANADERÍA SOSTENIBLE DOBLE PROPÓSITO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNIC**	420 días	Fri 02-01-26 7:00
122		**CIERRE DEL PROYECTO**	30 días	Fri 26-03-27 7:00
123		**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE GANADERÍA SOSTENIBLE DOBLE PROPÓSITO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE**	390 días	Fri 02-01-26 7:00



Proyecto: Diagrama de Gantt proyecto ambiental
Fecha: Wed 10-12-25 16:41

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS

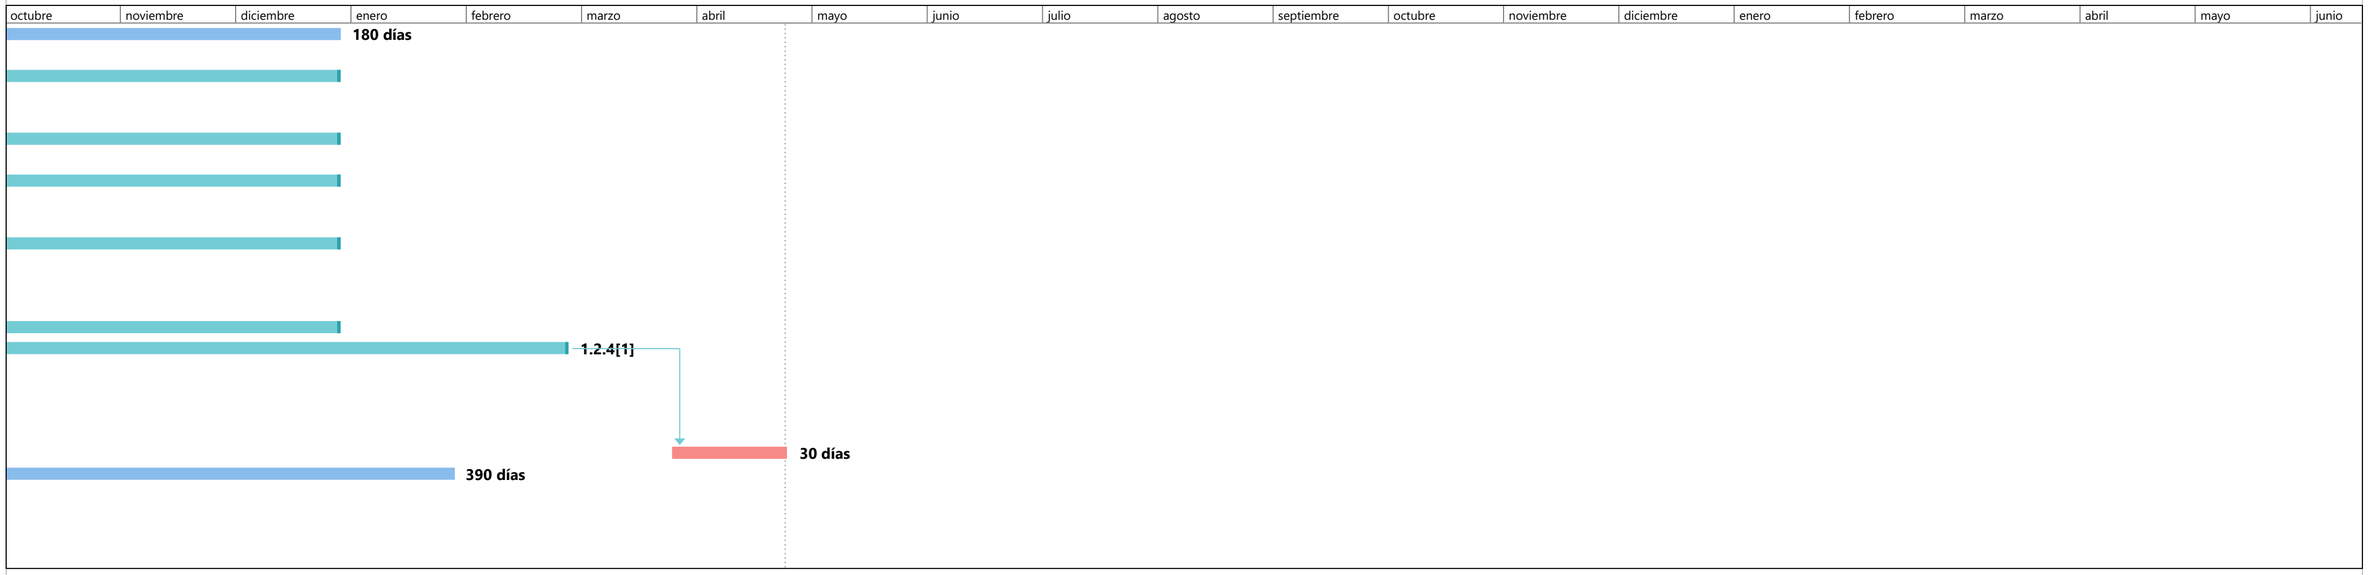

JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
RESPONSABLE GENERAL DEL PROYECTO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

BIBIANA MACHUCA MACHUCA
RESPONSABLE COMPONENTE TECNICO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

HAROLD ALBERTO MARTINEZ MARIÑO
RESPONSABLE COMPONENTE TECNICO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

Proyecto: Diagrama de Gantt proyecto ambiental
Fecha: Wed 10-12-25 16:41

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual
