

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Unidad	Costo fijo
1			**Realizar el mantenimiento y renovación de obras civiles en los bienes inmuebles propiedad del Distrito Lote 2: Mantenimiento y renovación de las unidades sanitarias del CAD**	190 días	jue 20/11/25	sáb 20/06/26				$ 0,00
2			**INICIO DEL PROYECTO**	0 días	jue 20/11/25	jue 20/11/25		3;4;5;6FC+52 días		$ 0,00
3			**Diagnósticos, levantamientos y preliminares documentales**	22 días	jue 20/11/25	dom 14/12/25	2	9;90;171;252;333;414;495;576;1635FC+5 días		$ 0,00
4			Subtotal Inversión Socio Ambiental	135 días	jue 20/11/25	lun 20/04/26	2			$ 9,551,281.00
5			Subtotal pólizas	80 días	jue 20/11/25	mar 17/02/26	2			$ 12,615,190.00
6			Destinación pago de reajustes	80 días	sáb 17/01/26	jue 16/04/26	2FC+52 días			$ 81,432,901.00
7			**PISO 1 - ORIENTAL**	120 días	lun 15/12/25	mar 28/04/26				$ 0,00
8		1,0	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	61 días	lun 15/12/25	vie 20/02/26				$ 0,00
22		NP	**OBRAS EXTRAS**	2 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26				$ 0,00
24		3,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	3 días	dom 22/02/26	mié 25/02/26				$ 0,00
46		2,0	**MAMPOSTERÍA**	6 días	mié 25/02/26	mié 4/03/26				$ 0,00
50		6,0	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	5 días	sáb 28/02/26	vie 6/03/26				$ 0,00
56		5,0	**PISOS**	9 días	vie 10/04/26	lun 20/04/26				$ 0,00
60		4,0	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	5 días	lun 20/04/26	sáb 25/04/26				$ 0,00
68		3,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	3 días	mar 21/04/26	vie 24/04/26				$ 0,00
75		8,0	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26				$ 0,00
84		9,0	**VARIOS**	6 días	mar 21/04/26	mar 28/04/26				$ 0,00
87			**ENTREGA DE PISO 1 - ORIENTAL**	0 días	mar 28/04/26	mar 28/04/26	47;53;58;57;59;55;85			$ 0,00
88			**PISO 2 - ORIENTAL**	121 días	lun 15/12/25	mié 29/04/26				$ 0,00
89		1,0	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	61 días	lun 15/12/25	vie 20/02/26				$ 0,00
103		NP	**OBRAS EXTRAS**	2 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26				$ 0,00
105		3,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	3 días	dom 22/02/26	mié 25/02/26				$ 0,00
127		2,0	**MAMPOSTERÍA**	38 días	mié 25/02/26	mié 8/04/26				$ 0,00
131		6,0	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	39 días	sáb 28/02/26	lun 13/04/26				$ 0,00
137		5,0	**PISOS**	10 días	dom 12/04/26	jue 23/04/26				$ 0,00
141		4,0	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	4 días	vie 24/04/26	mié 29/04/26				$ 0,00
149		3,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	3 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26				$ 0,00
156		8,0	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26				$ 0,00
165		9,0	**VARIOS**	3 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26				$ 0,00
168			**ENTREGA DE PISO 2 - ORIENTAL**	0 días	mié 29/04/26	mié 29/04/26	128;134;136;138;139			$ 0,00
169			**PISO 3 - ORIENTAL**	121 días	lun 15/12/25	mié 29/04/26				$ 0,00
170		1,0	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	61 días	lun 15/12/25	vie 20/02/26				$ 0,00
184		NP	**OBRAS EXTRAS**	2 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26				$ 0,00
186		3,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	3 días	dom 22/02/26	mié 25/02/26				$ 0,00
208		2,0	**MAMPOSTERÍA**	38 días	mié 25/02/26	mié 8/04/26				$ 0,00
212		6,0	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	39 días	sáb 28/02/26	lun 13/04/26				$ 0,00
218		5,0	**PISOS**	10 días	dom 12/04/26	jue 23/04/26				$ 0,00
222		4,0	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	4 días	vie 24/04/26	mié 29/04/26				$ 0,00
230		3,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	3 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26				$ 0,00
237		8,0	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26				$ 0,00
246		9,0	**VARIOS**	3 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26				$ 0,00
249			**ENTREGA DE PISO 3 - ORIENTAL**	0 días	mié 29/04/26	mié 29/04/26	209;215;217;219;220			$ 0,00
250			**PISO 4 - ORIENTAL**	121 días	lun 15/12/25	mié 29/04/26				$ 0,00
251		1,0	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	61 días	lun 15/12/25	vie 20/02/26				$ 0,00
265		NP	**OBRAS EXTRAS**	2 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26				$ 0,00
267		3,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	3 días	dom 22/02/26	mié 25/02/26				$ 0,00
289		2,0	**MAMPOSTERÍA**	38 días	mié 25/02/26	mié 8/04/26				$ 0,00
293		6,0	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	39 días	sáb 28/02/26	lun 13/04/26				$ 0,00
299		5,0	**PISOS**	10 días	dom 12/04/26	jue 23/04/26				$ 0,00
303		4,0	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	4 días	vie 24/04/26	mié 29/04/26				$ 0,00
311		3,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	3 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26				$ 0,00
318		8,0	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26				$ 0,00
327		9,0	**VARIOS**	3 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26				$ 0,00
330			**ENTREGA DE PISO 4 - ORIENTAL**	0 días	mié 29/04/26	mié 29/04/26	290;296;298;300;301			$ 0,00
331			**PISO 5 - ORIENTAL**	121 días	lun 15/12/25	mié 29/04/26				$ 0,00
332		1,0	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	61 días	lun 15/12/25	vie 20/02/26				$ 0,00
346		NP	**OBRAS EXTRAS**	2 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26				$ 0,00
348		3,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	3 días	dom 22/02/26	mié 25/02/26				$ 0,00
370		2,0	**MAMPOSTERÍA**	38 días	mié 25/02/26	mié 8/04/26				$ 0,00
374		6,0	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	39 días	sáb 28/02/26	lun 13/04/26				$ 0,00
380		5,0	**PISOS**	10 días	dom 12/04/26	jue 23/04/26				$ 0,00
384		4,0	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	4 días	vie 24/04/26	mié 29/04/26				$ 0,00
392		3,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	3 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26				$ 0,00
399		8,0	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	1 día	lun 27/04/26	mar 28/04/26				$ 0,00
408		9,0	**VARIOS**	3 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26				$ 0,00
411			**ENTREGA DE PISO 5 - ORIENTAL**	0 días	mié 29/04/26	mié 29/04/26	371;377;379;381;382			$ 0,00
412			**PISO 7 - ORIENTAL**	122 días	lun 15/12/25	jue 30/04/26				$ 0,00
413		1,0	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	61 días	lun 15/12/25	vie 20/02/26				$ 0,00
427		NP	**OBRAS EXTRAS**	2 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26				$ 0,00
429		3,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	3 días	dom 22/02/26	mié 25/02/26				$ 0,00
451		2,0	**MAMPOSTERÍA**	6 días	mié 25/02/26	mié 4/03/26				$ 0,00
455		6,0	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	5 días	jue 16/04/26	mié 22/04/26				$ 0,00
461		5,0	**PISOS**	9 días	dom 12/04/26	mié 22/04/26				$ 0,00
465		4,0	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	4 días	jue 23/04/26	mar 28/04/26				$ 0,00
473		3,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	3 días	jue 23/04/26	lun 27/04/26				$ 0,00
480		8,0	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26				$ 0,00
489		9,0	**VARIOS**	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26				$ 0,00
492			**ENTREGA DE PISO 7 - ORIENTAL**	0 días	jue 30/04/26	jue 30/04/26	452;458;460;462;463			$ 0,00
493			**PISO 8 - ORIENTAL**	122 días	lun 15/12/25	jue 30/04/26				$ 0,00
494		1,0	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	61 días	lun 15/12/25	vie 20/02/26				$ 0,00
508		NP	**OBRAS EXTRAS**	2 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26				$ 0,00
510		3,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	3 días	dom 22/02/26	mié 25/02/26				$ 0,00
532		2,0	**MAMPOSTERÍA**	6 días	mié 25/02/26	mié 4/03/26				$ 0,00
536		6,0	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	5 días	jue 16/04/26	mié 22/04/26				$ 0,00
542		5,0	**PISOS**	9 días	dom 12/04/26	mié 22/04/26				$ 0,00
546		4,0	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	4 días	jue 23/04/26	mar 28/04/26				$ 0,00
554		3,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	3 días	jue 23/04/26	lun 27/04/26				$ 0,00
561		8,0	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	1 día	sáb 25/04/26	lun 27/04/26				$ 0,00
570		9,0	**VARIOS**	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26				$ 0,00
573			**ENTREGA DE PISO 8 - ORIENTAL**	0 días	jue 30/04/26	jue 30/04/26	533;539;541;543;544			$ 0,00
574			**PISO 9 - ORIENTAL**	120 días	lun 15/12/25	mar 28/04/26				$ 0,00
575		1,0	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	61 días	lun 15/12/25	vie 20/02/26				$ 0,00
589		NP	**OBRAS EXTRAS**	2 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26				$ 0,00
591		3,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	3 días	dom 22/02/26	mié 25/02/26				$ 0,00
613		2,0	**MAMPOSTERÍA**	6 días	mié 25/02/26	mié 4/03/26				$ 0,00
617		6,0	**REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	5 días	sáb 28/02/26	vie 6/03/26				$ 0,00
623		5,0	**PISOS**	9 días	vie 10/04/26	lun 20/04/26				$ 0,00
627		4,0	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	5 días	lun 20/04/26	sáb 25/04/26				$ 0,00
635		3,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	3 días	mar 21/04/26	vie 24/04/26				$ 0,00
642		8,0	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26				$ 0,00
651		9,0	**VARIOS**	6 días	mar 21/04/26	mar 28/04/26				$ 0,00
654			**ENTREGA DE PISO 9 - ORIENTAL**	0 días	mar 28/04/26	mar 28/04/26	614;620;622;624;625			$ 0,00
655			**PISO 10 - ORIENTAL**	120 días	lun 15/12/25	mar 28/04/26				$ 0,00
656		1,0	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	61 días	lun 15/12/25	vie 20/02/26				$ 0,00
670		NP	**OBRAS EXTRAS**	2 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26				$ 0,00
672		3,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	3 días	dom 22/02/26	mié 25/02/26				$ 0,00
694		2,0	**MAMPOSTERÍA**	6 días	mié 25/02/26	mié 4/03/26				$ 0,00

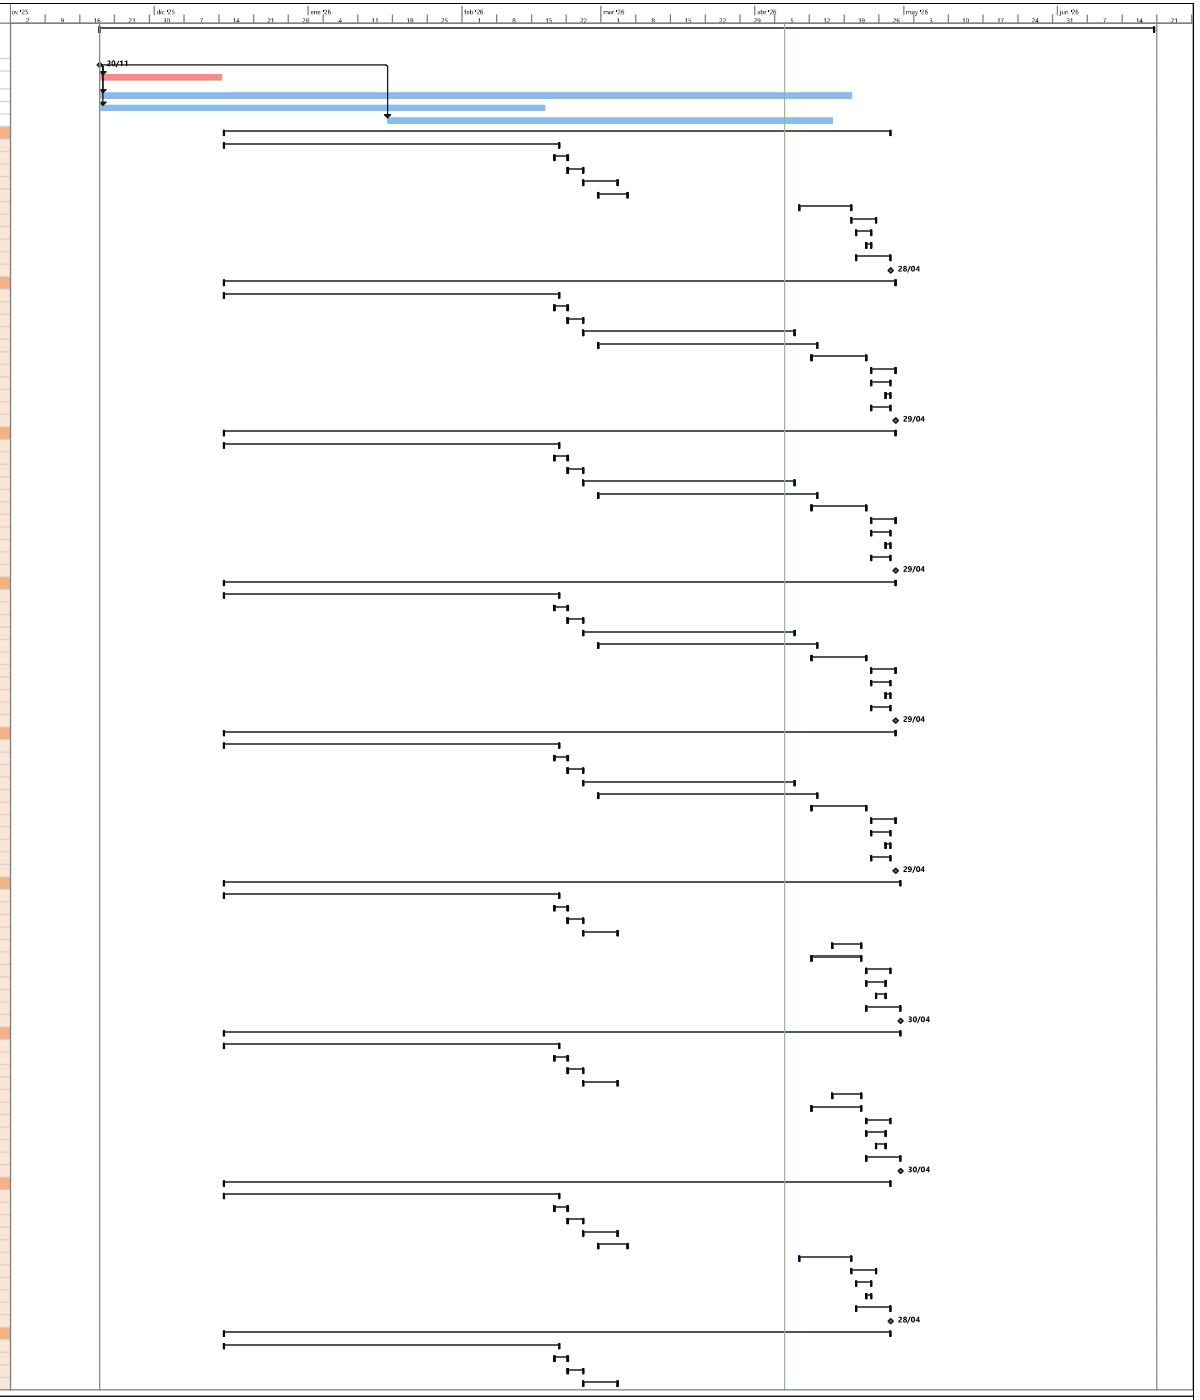

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Unidad	Costo fijo
698		6,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	5 días	sáb 28/02/26	vie 6/03/26				$ 0,00
704		5,0	PISOS	9 días	vie 10/04/26	lun 20/04/26				$ 0,00
708		4,0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	5 días	lun 20/04/26	sáb 25/04/26				$ 0,00
716		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	3 días	mar 21/04/26	vie 24/04/26				$ 0,00
723		8,0	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26				$ 0,00
732		9,0	VARIOS	6 días	mar 21/04/26	mar 28/04/26				$ 0,00
735			ENTREGA DE PISO 10 - ORIENTAL	0 días	mar 28/04/26	mar 28/04/26	695;701;703;705;706			$ 0,00
736			PISO 11 - ORIENTAL	120 días	lun 15/12/25	mar 28/04/26				$ 0,00
737		1,0	RETIROS Y DEMOLICIONES	61 días	lun 15/12/25	vie 20/02/26				$ 0,00
751		NP	OBRAS EXTRAS	2 días	jue 19/02/26	dom 22/02/26				$ 0,00
753		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	3 días	dom 22/02/26	mié 25/02/26				$ 0,00
775		2,0	MAMPOSTERÍA	6 días	mié 25/02/26	mié 4/03/26				$ 0,00
779		6,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	5 días	sáb 28/02/26	vie 6/03/26				$ 0,00
785		5,0	PISOS	9 días	vie 10/04/26	lun 20/04/26				$ 0,00
789		4,0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	5 días	lun 20/04/26	sáb 25/04/26				$ 0,00
797		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	3 días	mar 21/04/26	vie 24/04/26				$ 0,00
804		8,0	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	1 día	jue 23/04/26	vie 24/04/26				$ 0,00
813		9,0	VARIOS	6 días	mar 21/04/26	mar 28/04/26				$ 0,00
816			ENTREGA DE PISO 11 - ORIENTAL	0 días	mar 28/04/26	mar 28/04/26	776;782;784;786;787	819FC+3 días;897FC+3 días;9		$ 0,00
817			PISO 1 - OCCIDENTAL	45 días	vie 1/05/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
818		1,0	RETIROS Y DEMOLICIONES	8 días	vie 1/05/26	dom 10/05/26				$ 0,00
831		NP	OBRAS EXTRAS	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26				$ 0,00
833		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26				$ 0,00
855		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	mar 26/05/26	jue 28/05/26				$ 0,00
858		6,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	8 días	mié 27/05/26	jue 4/06/26				$ 0,00
865		5,0	PISOS	10 días	jue 4/06/26	lun 15/06/26				$ 0,00
869		4,0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	10 días	jue 28/05/26	lun 8/06/26				$ 0,00
877		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	3 días	vie 5/06/26	lun 8/06/26				$ 0,00
881		8,0	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26				$ 0,00
890		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26				$ 0,00
892		9,0	VARIOS	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
894			ENTREGA DE PISO 1 - OCCIDENTAL	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	856;863;864;866;867	1981		$ 0,00
895			PISO 2 - OCCIDENTAL	45 días	vie 1/05/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
896		1,0	RETIROS Y DEMOLICIONES	8 días	vie 1/05/26	dom 10/05/26				$ 0,00
909		NP	OBRAS EXTRAS	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26				$ 0,00
911		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26				$ 0,00
933		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	mar 26/05/26	jue 28/05/26				$ 0,00
936		6,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	8 días	mié 27/05/26	jue 4/06/26				$ 0,00
943		5,0	PISOS	10 días	jue 4/06/26	lun 15/06/26				$ 0,00
947		4,0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	10 días	jue 28/05/26	lun 8/06/26				$ 0,00
955		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	3 días	vie 5/06/26	lun 8/06/26				$ 0,00
961		8,0	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26				$ 0,00
968		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26				$ 0,00
970		9,0	VARIOS	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
972			ENTREGA DE PISO 2 - OCCIDENTAL	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	934;941;942;944;945	1981		$ 0,00
973			PISO 3 - OCCIDENTAL	45 días	vie 1/05/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
974		1,0	RETIROS Y DEMOLICIONES	8 días	vie 1/05/26	dom 10/05/26				$ 0,00
987		NP	OBRAS EXTRAS	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26				$ 0,00
989		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26				$ 0,00
1011		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	mar 26/05/26	jue 28/05/26				$ 0,00
1014		6,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	8 días	mié 27/05/26	jue 4/06/26				$ 0,00
1021		5,0	PISOS	10 días	jue 4/06/26	lun 15/06/26				$ 0,00
1025		4,0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	10 días	jue 28/05/26	lun 8/06/26				$ 0,00
1033		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	3 días	vie 5/06/26	lun 8/06/26				$ 0,00
1039		8,0	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26				$ 0,00
1046		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26				$ 0,00
1048		9,0	VARIOS	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
1050			ENTREGA DE PISO 3 - OCCIDENTAL	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	1012;1019;1020;1022	1981		$ 0,00
1051			PISO 4 - OCCIDENTAL	45 días	vie 1/05/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
1052		1,0	RETIROS Y DEMOLICIONES	8 días	vie 1/05/26	dom 10/05/26				$ 0,00
1065		NP	OBRAS EXTRAS	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26				$ 0,00
1067		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26				$ 0,00
1089		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	mar 26/05/26	jue 28/05/26				$ 0,00
1092		6,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	8 días	mié 27/05/26	jue 4/06/26				$ 0,00
1099		5,0	PISOS	10 días	jue 4/06/26	lun 15/06/26				$ 0,00
1103		4,0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	10 días	jue 28/05/26	lun 8/06/26				$ 0,00
1111		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	3 días	vie 5/06/26	lun 8/06/26				$ 0,00
1117		8,0	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26				$ 0,00
1124		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26				$ 0,00
1126		9,0	VARIOS	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
1128			ENTREGA DE PISO 4 - OCCIDENTAL	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	1090;1097;1098;1100	1981		$ 0,00
1129			PISO 6 - OCCIDENTAL	45 días	vie 1/05/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
1130		1,0	RETIROS Y DEMOLICIONES	8 días	vie 1/05/26	dom 10/05/26				$ 0,00
1143		NP	OBRAS EXTRAS	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26				$ 0,00
1145		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26				$ 0,00
1167		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	mar 26/05/26	jue 28/05/26				$ 0,00
1170		6,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	8 días	mié 27/05/26	jue 4/06/26				$ 0,00
1177		5,0	PISOS	10 días	jue 4/06/26	lun 15/06/26				$ 0,00
1181		4,0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	10 días	jue 28/05/26	lun 8/06/26				$ 0,00
1189		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	3 días	vie 5/06/26	lun 8/06/26				$ 0,00
1195		8,0	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26				$ 0,00
1202		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26				$ 0,00
1204		9,0	VARIOS	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
1206			ENTREGA DE PISO 6 - OCCIDENTAL	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	1168;1175;1176;1178	1981		$ 0,00
1207			PISO 7 - OCCIDENTAL	45 días	vie 1/05/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
1208		1,0	RETIROS Y DEMOLICIONES	8 días	vie 1/05/26	dom 10/05/26				$ 0,00
1221		NP	OBRAS EXTRAS	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26				$ 0,00
1223		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26				$ 0,00
1245		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	mar 26/05/26	jue 28/05/26				$ 0,00
1248		6,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	8 días	mié 27/05/26	jue 4/06/26				$ 0,00
1255		5,0	PISOS	10 días	jue 4/06/26	lun 15/06/26				$ 0,00
1259		4,0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	10 días	jue 28/05/26	lun 8/06/26				$ 0,00
1267		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	3 días	vie 5/06/26	lun 8/06/26				$ 0,00
1273		8,0	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26				$ 0,00
1280		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26				$ 0,00
1282		9,0	VARIOS	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
1284			ENTREGA DE PISO 7 - OCCIDENTAL	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	1246;1253;1254;1256	1981		$ 0,00
1285			PISO 8 - OCCIDENTAL	45 días	vie 1/05/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
1286		1,0	RETIROS Y DEMOLICIONES	8 días	vie 1/05/26	dom 10/05/26				$ 0,00
1299		NP	OBRAS EXTRAS	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26				$ 0,00
1301		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26				$ 0,00
1323		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	mar 26/05/26	jue 28/05/26				$ 0,00
1326		6,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	8 días	mié 27/05/26	jue 4/06/26				$ 0,00
1333		5,0	PISOS	10 días	jue 4/06/26	lun 15/06/26				$ 0,00
1337		4,0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	10 días	jue 28/05/26	lun 8/06/26				$ 0,00
1345		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	3 días	vie 5/06/26	lun 8/06/26				$ 0,00
1351		8,0	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26				$ 0,00
1358		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26				$ 0,00
1360		9,0	VARIOS	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26				$ 0,00

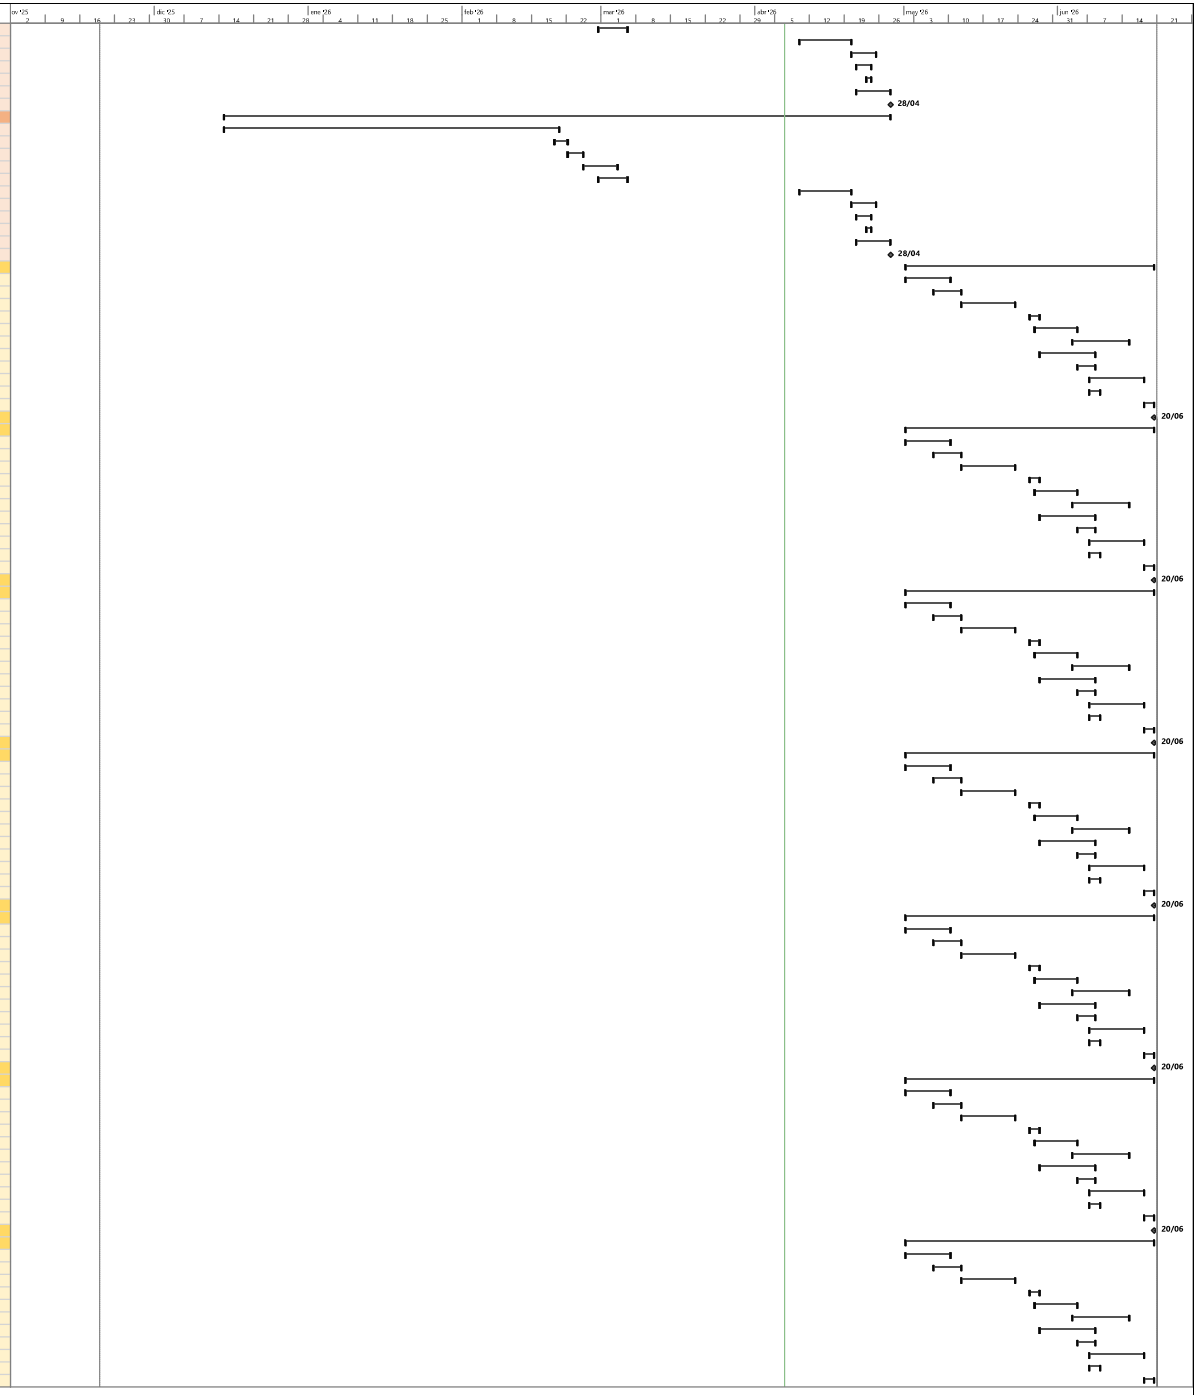

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Unidad	Costo fijo
1362			ENTREGA DE PISO 8 - OCCIDENTAL	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	1324;1331;1332;1334	1981		$ 0,00
1363			PISO 9 - OCCIDENTAL	45 días	vie 1/05/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
1364		1,0	RETIROS Y DEMOLICIONES	8 días	vie 1/05/26	dom 10/05/26				$ 0,00
1377		NP	OBRAS EXTRAS	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26				$ 0,00
1379		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26				$ 0,00
1401		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	mar 26/05/26	jue 28/05/26				$ 0,00
1404		6,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	8 días	mié 27/05/26	jue 4/06/26				$ 0,00
1411		5,0	PISOS	10 días	jue 4/06/26	lun 15/06/26				$ 0,00
1415		4,0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	10 días	jue 28/05/26	lun 8/06/26				$ 0,00
1423		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	3 días	vie 5/06/26	lun 8/06/26				$ 0,00
1429		8,0	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26				$ 0,00
1436		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26				$ 0,00
1438		9,0	VARIOS	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
1440			ENTREGA DE PISO 9 - OCCIDENTAL	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	1402;1409;1410;1412	1981		$ 0,00
1441			PISO 10 - OCCIDENTAL	45 días	vie 1/05/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
1442		1,0	RETIROS Y DEMOLICIONES	8 días	vie 1/05/26	dom 10/05/26				$ 0,00
1455		NP	OBRAS EXTRAS	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26				$ 0,00
1457		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26				$ 0,00
1479		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	mar 26/05/26	jue 28/05/26				$ 0,00
1482		6,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	8 días	mié 27/05/26	jue 4/06/26				$ 0,00
1489		5,0	PISOS	10 días	jue 4/06/26	lun 15/06/26				$ 0,00
1493		4,0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	10 días	jue 28/05/26	lun 8/06/26				$ 0,00
1501		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	3 días	vie 5/06/26	lun 8/06/26				$ 0,00
1507		8,0	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26				$ 0,00
1514		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26				$ 0,00
1516		9,0	VARIOS	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
1518			ENTREGA DE PISO 10 - OCCIDENTAL	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	1480;1487;1488;1490	1981		$ 0,00
1519			PISO 11 - OCCIDENTAL	45 días	vie 1/05/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
1520		1,0	RETIROS Y DEMOLICIONES	8 días	vie 1/05/26	dom 10/05/26				$ 0,00
1533		NP	OBRAS EXTRAS	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26				$ 0,00
1535		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26				$ 0,00
1557		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	mar 26/05/26	jue 28/05/26				$ 0,00
1560		6,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	8 días	mié 27/05/26	jue 4/06/26				$ 0,00
1567		5,0	PISOS	10 días	jue 4/06/26	lun 15/06/26				$ 0,00
1571		4,0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	10 días	jue 28/05/26	lun 8/06/26				$ 0,00
1579		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	3 días	vie 5/06/26	lun 8/06/26				$ 0,00
1585		8,0	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26				$ 0,00
1592		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26				$ 0,00
1594		9,0	VARIOS	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
1596			ENTREGA DE PISO 11 - OCCIDENTAL	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	1558;1565;1566;1568	1981		$ 0,00
1597			SOTANO - CONDUCTORES - CENTRAL	115 días	sáb 20/12/25	mar 28/04/26				$ 0,00
1598		6,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	55 días	sáb 20/12/25	jue 19/02/26				$ 0,00
1605		5,0	PISOS	11 días	mar 14/04/26	lun 27/04/26				$ 0,00
1609		4,0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	62 días	mar 17/02/26	mar 28/04/26				$ 0,00
1617		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	51 días	mar 17/02/26	mié 15/04/26				$ 0,00
1623		8,0	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	5 días	mar 14/04/26	lun 20/04/26				$ 0,00
1630		9,0	VARIOS	2 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26				$ 0,00
1632			ENTREGA SOTANOS - CONDUCTORES - CENTRAL	0 días	mar 28/04/26	mar 28/04/26	1603;1604;1606;1607			$ 0,00
1633			SOTANO - ADMINISTRACIÓN - CENTRAL	115 días	sáb 20/12/25	mar 28/04/26				$ 0,00
1634		6,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	55 días	sáb 20/12/25	jue 19/02/26				$ 0,00
1641		5,0	PISOS	10 días	mié 15/04/26	lun 27/04/26				$ 0,00
1645		4,0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	60 días	mar 17/02/26	sáb 25/04/26				$ 0,00
1653		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	58 días	mar 17/02/26	jue 23/04/26				$ 0,00
1659		8,0	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	5 días	mié 22/04/26	mar 28/04/26				$ 0,00
1666		9,0	VARIOS	2 días	mié 22/04/26	vie 24/04/26				$ 0,00
1668			ENTREGA SOTANOS - ADMINISTRACIÓN - CENTRAL	0 días	mar 28/04/26	mar 28/04/26	1639;1640;1642;1643			$ 0,00
1669			SOTANO 2 - CENTRAL	45 días	lun 20/04/26	mar 9/06/26				$ 0,00
1670		1,0	RETIROS Y DEMOLICIONES	8 días	lun 20/04/26	mié 29/04/26				$ 0,00
1683		NP	OBRAS EXTRAS	5 días	sáb 25/04/26	vie 1/05/26				$ 0,00
1685		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	10 días	vie 1/05/26	mar 12/05/26				$ 0,00
1707		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	jue 14/05/26	dom 17/05/26				$ 0,00
1710		6,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	8 días	vie 15/05/26	lun 25/05/26				$ 0,00
1717		5,0	PISOS	10 días	sáb 23/05/26	mié 3/06/26				$ 0,00
1721		4,0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	10 días	dom 17/05/26	jue 28/05/26				$ 0,00
1729		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	3 días	lun 25/05/26	jue 28/05/26				$ 0,00
1735		8,0	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	10 días	mié 27/05/26	dom 7/06/26				$ 0,00
1742		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26				$ 0,00
1744		9,0	VARIOS	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26				$ 0,00
1746			ENTREGA DE SOTANO 2 - CENTRAL	0 días	mar 9/06/26	mar 9/06/26	1708;1715;1716;1718			$ 0,00
1747			ESCALERAS - CENTRAL	45 días	lun 20/04/26	mar 9/06/26				$ 0,00
1748		1,0	RETIROS Y DEMOLICIONES	8 días	lun 20/04/26	mié 29/04/26				$ 0,00
1761		NP	OBRAS EXTRAS	5 días	sáb 25/04/26	vie 1/05/26				$ 0,00
1763		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	10 días	vie 1/05/26	mar 12/05/26				$ 0,00
1785		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	jue 14/05/26	dom 17/05/26				$ 0,00
1788		6,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	8 días	vie 15/05/26	lun 25/05/26				$ 0,00
1795		5,0	PISOS	10 días	sáb 23/05/26	mié 3/06/26				$ 0,00
1799		4,0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	10 días	dom 17/05/26	jue 28/05/26				$ 0,00
1807		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	3 días	lun 25/05/26	jue 28/05/26				$ 0,00
1813		8,0	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	10 días	mié 27/05/26	dom 7/06/26				$ 0,00
1820		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26				$ 0,00
1822		9,0	VARIOS	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26				$ 0,00
1824			ENTREGA DE ESCALERAS - CENTRAL	0 días	mar 9/06/26	mar 9/06/26	1786;1793;1794;1796			$ 0,00
1825			BATERÍA INNOVACION - PISO 1	45 días	vie 1/05/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
1826		1,0	RETIROS Y DEMOLICIONES	8 días	vie 1/05/26	dom 10/05/26				$ 0,00
1839		NP	OBRAS EXTRAS	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26				$ 0,00
1841		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26				$ 0,00
1863		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	mar 26/05/26	jue 28/05/26				$ 0,00
1866		6,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	8 días	mié 27/05/26	jue 4/06/26				$ 0,00
1873		5,0	PISOS	10 días	jue 4/06/26	lun 15/06/26				$ 0,00
1877		4,0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	10 días	jue 28/05/26	lun 8/06/26				$ 0,00
1885		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	3 días	vie 5/06/26	lun 8/06/26				$ 0,00
1891		8,0	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26				$ 0,00
1898		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26				$ 0,00
1900		9,0	VARIOS	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
1902			ENTREGA DE BATERÍA INNOVACIÓN PISO 1	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	1864;1871;1872;1874	1981		$ 0,00
1903			BATERÍA PISO 4 - CENTRAL	45 días	vie 1/05/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
1904		1,0	RETIROS Y DEMOLICIONES	8 días	vie 1/05/26	dom 10/05/26				$ 0,00
1917		NP	OBRAS EXTRAS	5 días	jue 7/05/26	mar 12/05/26				$ 0,00
1919		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	10 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26				$ 0,00
1941		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	mar 26/05/26	jue 28/05/26				$ 0,00
1944		6,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS	8 días	mié 27/05/26	jue 4/06/26				$ 0,00
1951		5,0	PISOS	10 días	jue 4/06/26	lun 15/06/26				$ 0,00
1955		4,0	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES	10 días	jue 28/05/26	lun 8/06/26				$ 0,00
1963		3,0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	3 días	vie 5/06/26	lun 8/06/26				$ 0,00
1969		8,0	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	10 días	dom 7/06/26	jue 18/06/26				$ 0,00
1976		2,0	MAMPOSTERÍA	2 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26				$ 0,00
1978		9,0	VARIOS	2 días	jue 18/06/26	sáb 20/06/26				$ 0,00
1980			ENTREGA DE BATERÍA PISO 4 CENTRAL	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	1942;1949;1950;1952	1981		$ 0,00
1981			ENTREGA FINAL, DOCUMENTACIÓN Y CIERRE ADMINISTRATIVO	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	894;972;1050;1128;12	1982		$ 0,00

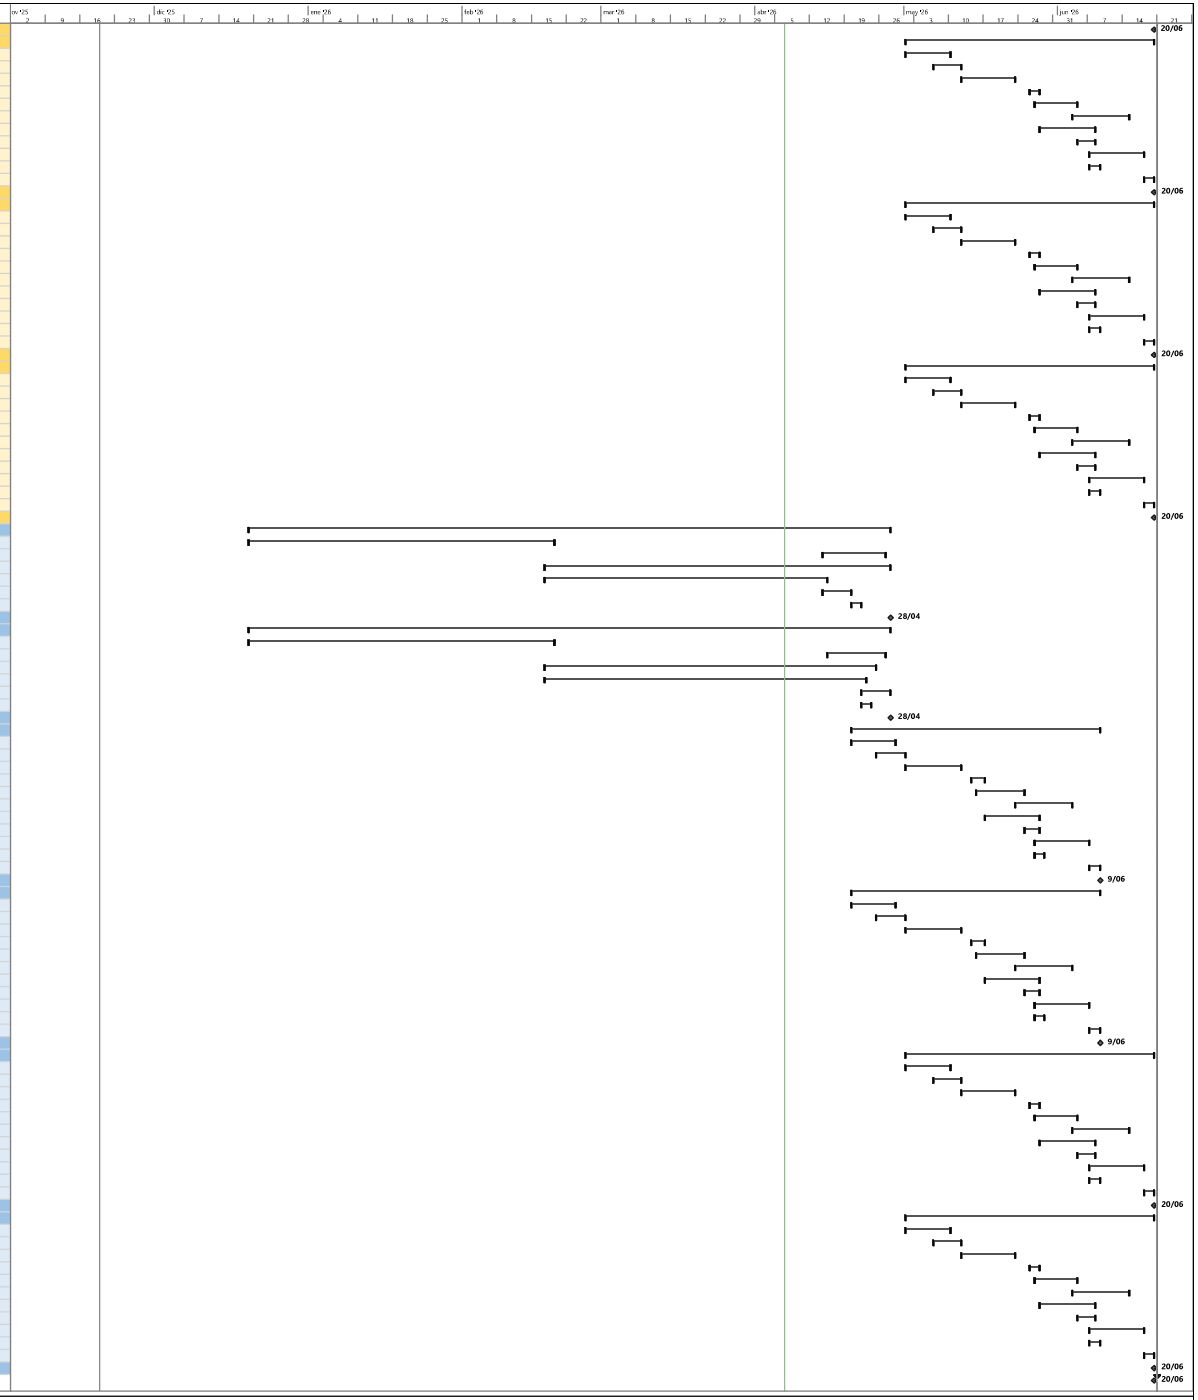

Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · sólo al comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · sólo duración · Resumen manual · sólo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Unidad	Costo fijo
1982			FIN DEL PROYECTO	0 días	sáb 20/06/26	sáb 20/06/26	1981			$ 0,00



Proyecto: Plan de Contingencia
Fecha: mar 7/04/26

Tarea, División, Hito, Resumen, Resumen del proyecto, Tarea inactiva, Hito inactivo, Resumen inactivo, Tarea manual, solo duración, Informe de resumen manual, Resumen manual, solo al comienzo, solo fin, Tareas externas, Hito externo, Fecha límite, Tareas críticas, División crítica, Progreso, Progreso manual
