Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

INFORME DE INTERVENTORÍA MENSUAL No. 5

1. ALCANCE DEL INFORME

PERIODO DEL INFORME

DEL 13 DE MAYO 12 DE JUNIO 2025

DESCRIPCION

NOMBRE DEL PROYECTO

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S."

BPIN

BPIN No.20230214000016.

☐ **FIDUCIA**

☒ **CONVENIO**

CONTRIBUYENTE

CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. COP1.PCCNTR.6741523

OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.

INTERVENTOR

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S B.I.C

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

De conformidad con lo establecido en la resolución vinculación No.001062 del 6 de octubre de 2023 que fue emitida por la Agencia de Renovación del Territorio – ART, la empresa *"(…) CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS., identificado con el NIT No. 900531210-3, presentó la manifestación de interés No.408 del 2 de agosto de 2023, para seleccionar y ejecutar a través de la opción convenio del mecanismo de Obras por Impuestos de que trata el artículo 800-1 del Estatuto Tributario, el proyecto de inversión registrado en el Banco de Proyectos de Obras por Impuestos denominado: "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" identificado con código BPIN No.20230214000016, por un costo total de DIEZ MIL SETENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE. ($10.070.572.631), proyecto que incluye dentro de sus costos el asociado a la interventoría que tendrá la obligación de realizar las actividades de seguimiento y control conducentes al cumplimiento del objeto y alcance viabilizado (…)"*.

RESOLUCIÓN DE VINCULACIÓN (ART)	OBJETO	CÓDIGO BPIN	VALOR
No.001062 del 6 de octubre de 2023	"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA"	No.20230214000016	$10.070.572.631

a. ALCANCE DEL PROYECTO

La Interventoría integral realizará la verificación de la adquisición de insumos, fabricación, despacho, distribución, entrega e instalación de los bienes establecidos en el marco del Convenio No.0007 de 2023 suscrito entre este Ministerio de Educación Nacional, el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca) y CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos SAS, en las instituciones y sedes educativas ubicadas en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), de acuerdo con la distribución establecida en los documentos que hicieron parte integral del proyecto que fue viabilizado y que se identifica con el código BPIN No.20230214000016.

El contratista que resulte seleccionado tendrá pleno conocimiento del Manual de Dotación Escolar que contiene las especificaciones técnicas de los elementos a dotar, de tal forma que se adquieran materias primas que cumplan con las especificaciones técnicas, que se fabriquen los elementos de mobiliario escolar conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional, así como realizar el adecuado seguimiento y control de la distribución en las cantidades establecidas para ser entregadas en cada sede educativa a beneficiar en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), corroborando las entregas con la calidad, cantidad, oportunidad, y exactitud de los bienes contratados para cada una de las sedes señaladas.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Los bienes por dotar y objeto de la presente interventoría se relacionan a continuación:

Ítem	Cantidad
Puesto de trabajo - Aula preescolar	400
Puesto de trabajo - Aula primaria	8437
Puesto de trabajo - Aula secundaria	11283
Tablero (aula)	634
Puesto de Trabajo Docentes	634
Sala de Juntas - Sala Docente	209
Mueble de Almacenamiento Aulas	85
Módulo 10 casilleros Alumnos	2118
Módulo 10 casilleros Docentes	145
Total	**23945**

A continuación, se presentan las sedes educativas beneficiadas con el proyecto en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca.

INSTITUCION EDUCATIVA	CODIGO DANE IE	SEDE	CODIGO DANE SEDE
TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO	176109000842	TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO - SEDE	176109000842
		STELLA DELGADO DE NAVIA	176109001822
		SEIS DE ENERO	376109006084
		OLIMPICO	176109007383
		ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	176109002101
TERMARIT	176109000648	TERMARIT	176109000648
		EL PROGRESO	176109007049
		SAN MARTIN	276109001894
JOSÉ RAMON BEJARANO	176109000516	EL JARDIN	176109015467
		JOSE RAMON BEJARANO	176109000516
		MIRAFLORES	176109007154
		LA COMUNA	176109007421
		SAN BUENAVENTURA	176109001008
LA ANUNCIACIÓN	176109000605	LA ANUNCIACIÓN	176109000605
LAS AMERICAS	176109000311	LAS AMERICAS	176109000311
		BAHIA	176109800024
		CARLOS HOLMES TRUJILLO	176109007341
		DIGNIDAD	376109009181
FRANCISCO JAVIER CISNEROS	276109000235	EL SALTO	276109002866
		BRISAS DEL PACIFICO	276109002441
		HECTOR PERLAZA QUINTERO	276109800011
		FRANCISCO JAVIER CISNERO	276109000235
		LA GRAN COLOMBIA	276109001401
		CARLOS BORREROS SINISTERRA	276109000880
NIÑO JESUS DE PRAGA	276109000464	ESCUELA LA BREA	276109008171
		NIÑO JESUS DE PRAGA	276109000464
		ANTONIO JOSE RUIZ	276109002416
		LAS BRISAS	276109009062
		FRANCISCO ELADIO RAMIREZ	276109000120
		MARINA SOLANO	276109004036

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

INSTITUCION EDUCATIVA	CODIGO DANE IE	SEDE	CODIGO DANE SEDE
PABLO EMILIO CARVAJAL	176109002977	ANIBAL MUÑOZ DUQUE	276109005270
		NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	176109015441
		JORGE ELIECER GAITAN	376109006076
		NUEVO AMANECER	176109011348
		PABLO EMILIO CARVAJAL	176109002977
		NUEVO ESFUERZO	176109016251
		VISTA HERMOSA	176109015459
		MATIAS MULUMBA	176109000290
NESTOR URBANO TENORIO	176109005836	CENTRO DOCENTES CALDAS	176109005828
		CENTRO DOCENTE LUIS CARLOS GALAN	176109005712
		CENTRO DOCENTE LA NUEVA ESPERANZA	276109011377
LICEO DEL PACIFICO	176109000621	LICEO DEL PACIFICO	176109000621
SAN VICENTE	176109000834	SAN VICENTE	176109000834
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	176109000192	FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	176109000192
JOSE MARIA CABAL	176109000800	JOSE MARIA CABAL	176109000800
		EUSEBIO MUÑOZ PERA	176109011291
		RAFAEL URIBE URIBE	176109001245
VASCO NÚÑEZ BALBOA	176109000770	CENTRO DOCENTE DIVINO NIÑO DEL MAR	176109015424
		VASCO NÚÑEZ BALBOA	176109000770
		SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA	376109008001
		JOHN F KENNEDY	176109000630
		LA INMACULADA	176109008550
NACHASIN	276109005709	MESETA	276109010412
		ALFREDO ORTIZ DUPAR	276109009739
		LIZARDO MEJIA PORAIMA	476109009002
		NUEVA ESPERANZA INDIGENA	276109005709
AGROPECUARIO JOSE MARIA CORDOBA	276109005806	INST, AGROPECUARIA JOSE MARIA SEDE PRINCIPAL	276109005806
		SAN CIPRIANO	276109000014
		SANTA ELENA	276109001762
		JORGE ELIECER GAITAN.	276109000979
		PORVENIR	276109007108

b. CRONOGRAMA.

NOTA: Se deberá establecer según cronograma aprobado en la sesión de inicio

Etapa	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Preparación.	**13/01/2025**	**31/01/2025**
Ejecución	**01/02/2025**	**12/06/2025**
Cierre	**01/06/2025**	**12/06/2025**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL CONTRATACIONES DERIVADAS

a. Contrato de Suministro

Objeto del contrato: "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" identificado con código BPIN No. 20230214000016.			
Contratista: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A			
No. contrato	**8000009092**	**Fecha del contrato**	**16/04/2024**
Plazo inicial	**5 meses**	**Prorrogas**	**N/A**
Fecha de inicio	**13/01/2025**	**Fecha de terminación**	**12/06/2025**
Vr. inicial	**$6.093.346.534.87 M/CTE con IVA**		
Vr. Adicional	**$ 453.954.316,85 M/CTE con IVA – REAUSTE PRECIO 7,45%**		
Vr. Final ejecutado	**$6.547.300.851,72 M/CTE con IVA**		

El personal base del contratista **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A** es el siguiente:

PERSONAL BASE MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A		
No.	**NOMBRE**	**CARGO**
1	Jaime Alirio Carreño Moreno	Gerente
2	Paola Zamora	Coordinadora Proyecto
3	Diana Carreño	Asesor Financiero
4	Javier Guzmán	Jefe de producción
5	Charlee Alfonso Castañeda	técnico en campo
6	Santos Marín Torres	técnico en campo

b. Contrato de Interventoría

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.			
Contratista: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC			
No. contrato	**CO1.PCCNTR.6741523**	**Fecha del contrato**	**17/09/2024**
Plazo inicial	**7 meses**	**Prorrogas**	**N/A**
Fecha de inicio	**13/01/2025**	**Fecha de terminación**	**12/08/2025**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Vr. Total	**$311.019.783,00**
Vr. Adicional	**N/A**
Vr. Final ejecutado	**N/A**

Para este contrato Alianza Integral de Proyectos SAS BIC presento el personal base para el seguimiento y entrega para las instituciones educativas de municipio de Buenaventura Valle del Cauca
A continuación, se presenta el cuadro del personal presentado.

PERSONAL BASE CONSORCIO DOTACIÓN JA				
No.	**NOMBRE**	**CARGO**	**TEL**	**CORREO**
1	Hernando Alberto Castellanos Rincón	Director	3112124074	G3director4@jasb.com.co
2	Santiago Paque	Aux. Administrativo y Financiero	3106873789	Proadming3@jasb.com.co
3	Susana Guerra	Apoyo Jurídico	3017054666	juridica@jasb.com.co
5	Juan Diego Guerrero Hernandez	Profesional en Planta	3113569134	Ing.guerrero24@yahoo.com
6	Nesken Mantilla	Técnico en campo	318220564	ingconstruccionesmantilla@gmail.com
7	Marcela Solano	Técnico en campo	3204887201	Marcela.solano@jasb.com.co

Mediante comunicado No. 2024-EE-283592 del 3 de octubre del Ministerio de Educación Nacional, aprobó el personal mínimo requerido, sin embargo, se radico solicitud No. 753-014 para el cambio del profesional en planta, No 753-018 para el cambio de técnico en planta y No. del cual no se ha recibido respuesta por de la entidad. Asi mismo se realiza envio oficio de cambio de director de interventoría con el oficio 753-026 CAMBIO DIRECTOR DE INTERVENTORIA, del cual tampoco se ha tenido respuesta.

c. Plan de trabajo.

El 17 de enero de 2025 por medio de comunicado 753-005, se remite el Plan de trabajo de la Interventoría, con el fin de planificar, ordenar, dar seguimiento y ejecutar el objeto del contrato No COP1.PCCNTR.6741523 del 2024.

3. EJECUCIÓN

3.1 INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL

Contratista: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC

El día 19 de julio de 2024 El Ministerio de Educación Nacional realiza convocatoria pública del proceso de Concurso de Méritos Abierto CM-MEN-02-2024, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.2 y 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015.

OBJETO:
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE *"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA"*, A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

el 20 de agosto de 2024, a las 10:00 a.m., se llevó a cabo el cierre del proceso de convocatoria CM-MEN-02-2024, presentando propuesta las siguientes personas, situación que se puede constatar en la Lista de Oferentes publicada en el SECOP II, así:

1 INSERGROUP - ISG S.A.S
2 ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.
3 ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC
4 SGA CONSULTORES SOCIEDAD DE INTERES COLECTIVO - SAS BIC
5 SCAIPROYEKTA SAS BIC
6 INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA
7 CONSORCIO ARG-BIC 2024

El día 06 de septiembre de 2024 se expide la Resolución No 014192 en la que determina : el proponente **ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC** resultó favorecido con el procedimiento de desempate de la norma citada anteriormente, como se evidencia en el informe de evaluación, por lo cual, el Comité Técnico Evaluador recomendó al ordenador del gasto la adjudicación del proceso **CM-MEN-02-2024** a dicho proponente por el valor total de la oferta económica presentada para el presente proceso de selección y que corresponde a la suma de **TRESCIENTOS ONCE MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($311.019.783)**

3.2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Pólizas Contratista MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A

Póliza de Seguro de Cumplimiento No 73397			
Asegurador	CHUBB		
Tomador	MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A		
Asegurado / Beneficiario	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.		
Estado	Vigente	**Fecha**	14/01/2025
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.024.091.854.60	13/01/2025	12/12/2025
Salarios y Prestaciones Sociales	$ 1.024.091.854.60	13/01/2025	12/06/2028
Calidad y Correcto Funcionamiento	$ 1.024.091.854.60	13/01/2025	12/06/2028

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Pólizas Interventoría Alianza Integral de Proyectos SAS BIC

Póliza de Seguro de Cumplimiento No 11- 44 -101235265			
Asegurador	SEGUROS DEL ESTADO		
Tomador	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS		
Asegurado / Beneficiario	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
Estado	Vigente	Fecha	16/01/2025
Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 62.203.956.60	13/01/2025	12/02/2026
Calidad del servicio	$ 62.203.956.45	13/08/2025	12/02/2026
Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 46.652.967.60	13/01/2025	13/08/2028

3.3 EJECUCIÓN FINANCIERA

Contrato de dotación

MANUFACTURAS SUMAPAZ

Valor del contrato	**$6.093.346.535**	**Valor adiciones**	**N/A**	
Valor anticipo	**N/A**	**Total, amortizado**	**N/A**	
Número y fecha del acta	**Valor del acta**	**Amortización del anticipo**	**Neto para pagar**	**% ejecución financiera**

ENERO 13 A FEBRERO 12 DE 2025

Durante la ejecución del contrato dentro del periodo comprendido del 13 de enero al 31de enero de 2025 la interventoría convocó y realizó 2 mesas de trabajo para definir de manera clara los productos que se requieren para iniciar el proceso de fabricación del mobiliario escolar (cronograma de producción y entregas, ordenes de bienes)

El 13 de enero de 2025, se suscribió el acta de inicio por parte del Ministerio de Educación Nacional y la Alianza Integral de Proyectos SAS BIC. Con plazo de ejecución de 7 meses, es decir, hasta el 12 de agosto de 2025

Entre el 14 y el 17 de enero se realiza la verificación de las especificaciones técnicas de los prototipos del mobiliario escolar a fabricar por parte de Manufacturas SUMAPAZ

El 17 de enero de 2025, se remite a la supervisión del Ministerio de Educación Nacional el informe de Aprobación de prototipos

El 21 de enero de 2025, se remite a la supervisión del Ministerio de Educación Nacional pólizas actualizadas

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

El 23 de enero se remitió a la supervisión del MEN el informe de aprobación del manual de garantía y mantenimiento, presentado por Manufacturas SUMAPAZ

El 29 de enero de 2025 se aprueba el Cronograma de Producción y Entregas, suministrado por Manufacturas SUMAPAZ

El 30 de enero de 2025 se remiten las ordenes de bienes aprobadas para dar inicio con el proceso de fabricación

Los despacho inician según programación con la orden de bien 01, haciendo entregas en la IE Gerardo Valencia Cano en la sede principal, el día 6 de febrero, estas entregas llegan los dias siguientes hasta el 12 del mes con las sedes, Alfonso Lopez Pumarejo, Stella Delgado Navia, sede Olímpico y sede Seis de Enero.

Llegando a un total de 2065 conjuntos entregados de la orden de bien 01, con un porcentaje acumulado de 8,62%.

Dentro de los anexos del presente informe se incluyen el cronograma de producción y el cronograma de entregas para cada una de las sedes, aprobado por interventoría y presentado a la Supervisión MEN, Gerencia del contrato.

Para el presente proyecto de dotación de mobiliario escolar de las instituciones educativas del municipio de Buenaventura Valle del Cauca, se tiene contratado la entrega de 23945 elementos distribuidos en 16 instituciones educativas, con 64 sedes, dentro del mobiliario a entregar se encuentran los siguientes elementos:

- Puesto de trabajo de prescolar (1 mesa y 3 sillas)
- Puesto de trabajo de primaria (1 mesa y 1 silla)
- Puesto de trabajo bachillerato (1 mesa y 1 silla)
- Modulo X 10 casilleros para alumnos
- Puesto de trabajo docente en aula (1 mesa 1 silla)
- Mueble almacenamiento aula TIM
- Mesa sala de juntas docente incluye sillas (1 mesa y 6 sillas)
- Modulo X10 de casilleros docentes

Etapa de verificación de prototipos: Para esta etapa la interventoría de manera permanente realiza las debidas pruebas a los diferentes prototipos de los elementos a entregar en las instituciones educativas de Buenaventura, la verificación y pruebas realizadas a los prototipos se realizaron entre el 14 y 17 de enero de 2025, se remitió la documentación de aprobación de prototipos a la supervisión de Ministerio mediante el comunicado No. 753-006 del 17 de enero 2025, a continuación se presenta un registro fotográfico de las actividades de revisión realizadas a los prototipos.

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

jasb
Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

 	 
Inspección medidas alturas dimensiones	Revisión de calibre y ángulos
 	 
Prueba de cargas y deformación	Revisión de calibre de tubería y de tapones
 	 
Revisión de calibres y ancho	Revisión medidas alturas y superficies

jasb
Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

 	
Revisión calibre perfilería	Prueba de carga y deformación
 	
Revisión de medidas puertas casillero	Inspección técnica grados de inclinación
 	
Revisión de medidas	Prueba de cargas y deformación silla.

Durante el periodo del presente informe no se presentaron devoluciones.

jasb
Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

	% programado	% ejecutado	Avance o retraso
Ejecución durante el periodo reportado	0%	8,62%	8,62% AVANCE
Ejecución acumulada del proyecto	7,6%	8,62%	1,02% AVANCE

TABLA 1 CONSOLIDADO PORCENTAJES A 12 DE FEBRERO DE 2025

AVANCE DE ENTREGAS - ORDEN DE BIENES # 1

FECHA	06--FEBR--2025	06--FEBR--2025	07--FEBR--2025	07--FEBR--2025	08--FEBR--2025	10--FEBR--2025	10--FEBR--2025	10--FEBR--2025	10--FEBR--2025	11--FEBR--2025	12--FEBR--2025	12--FEBR--2025	12--FEBR--2025		
PLACA	VZD 439	SOD 701	ALA 316	THV 551	VIK 504	FDF 049	SQA 319	FDF 049	FDF 049	GNB 833	VZD 439	VZD 439	VZD 439		
CONDUCTOR	DARIO CASTELLANOS	JORGE MARTINEZ	MILTON HERRERA	WILSON BELTRAN	JHONATHAN LEON	MARCO CAGUA	HENRY LEON	MARCO CAGUA	MARCO CAGUA	LUIS CARLOS CASTELLANOS	DARIO CASTELLANOS	DARIO CASTELLANOS	DARIO CASTELLANOS		
REMISION No.	25-001	25-002	25-003	25-004	25-005	25-006	25-007	25-008	25-009	25-010	25-011	25-012	25-013		
COLEGIO / IE	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE PRINCIPAL	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE PRINCIPAL	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE PRINCIPAL	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE PRINCIPAL	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE PRINCIPAL	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE PRINCIPAL	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE STELLA DELGADO DE NAVIA	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE STELLA DELGADO DE NAVIA	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE STELLA DELGADO DE NAVIA	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE OLIMPICO	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE SEIS DE ENERO		
	PARCIAL 1	PARCIAL 2	PARCIAL 3	PARCIAL 4	PARCIAL 5	PARCIAL 6 - SALDO TOTAL	PARCIAL 1	PARCIAL 2 - SALDO TOTAL	PARCIAL 1	PARCIAL 2	PARCIAL 3 - SALDO TOTAL	TOTAL	PARCIAL 1		

CANT.	DETALLE / PRODUCTOS	VALOR UNT.	VALOR TOTAL													TOTAL ENTREGADO DE LA ORDEN 1	% ENTREGADO DE LA ORDEN 1	% ENTREGADO DEL CONT. TOTAL	VALOR UNT.
	CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA																		
1.742	MESA PUESTO DE TRABAJO BASICA PRIMARIA.	$ 145.321	$ 253.149.182						98				193		115		406	23,31%	4,81%	$ 59.000.326
	SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA																		
	CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA																		
2.777	MESA PUESTO DE TRABAJO BASICA SECUNDARIA.	$ 151.798	$ 421.543.046	320		320		320	75	227							1262	45,44%	11,18%	$ 191.569.076
	SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA																		
	ITEM: CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO DOCENTE																		
167	MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE.	$ 248.289	$ 41.464.263				39			5	5	16			6	6	77	46,11%	12,15%	$ 19.118.253
	SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE																		
	CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR																		
99	MESA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR.	$ 252.197	$ 24.967.503											17	8	5	30	30,30%	7,50%	$ 7.565.910
	SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR																		
	CONJUNTO - SALA DE JUNTAS SALA DOCENTE																		
46	MESA DE JUNTAS SALA DOCENTE.	$ 1.776.879	$ 81.736.434				10				4		3		2		19	41,30%	9,09%	$ 33.760.701
	SILLA INTERLOCUTORA SALA DOCENTE																		
	ITEM: PRODUCTO																		
487	MODULO DE 10 CASILLEROS ALUMNOS	$ 587.779	$ 286.248.373		86		28			18	5		25		14	7	183	37,58%	8,64%	$ 107.563.557
	ITEM: PRODUCTO																		
32	MODULO 10 CASILLEROS DOCENTES	$ 726.299	$ 23.241.568				6				3		2		1		12	37,50%	8,28%	$ 8.715.588
	ITEM: PRODUCTO																		
19	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	$ 717.304	$ 13.628.776										3		2		5	26,32%	5,88%	$ 3.586.520
	ITEM: PRODUCTO																		
167	TABLERO	$ 222.062	$ 37.084.354			8		12	19	10			16		6		71	42,51%	11,20%	$ 15.766.402
5.536	100%	SUB	$ 1.183.063.499	320	86	328	83	332	192	260	17	16	242	17	154	18	2.065			$ 446.646.333
		IVA 19%	$ 224.782.065																	$ 84.862.803
		TOTAL	$ 1.407.845.564	MOBILIARIO ENTREGADO EN SITIO													37,30%			$ 531.509.136
																				37,75%

TABLA 2 CONSOLIDADO A 12 DE FEBRERO DE 2025

RESUMEN ORDEN 01 - MES 1		
CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	406	7,33%
CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	1262	22,80%
ITEM: CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	77	1,39%
CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	30	0,54%
CONJUNTO - SALA DE JUNTAS SALA DOCENTE	19	0,34%
MODULO DE 10 CASILLEROS ALUMNOS	183	3,31%
MODULO 10 CASILLEROS DOCENTES	12	0,22%
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	5	0,09%
TABLERO	71	1,28%
	2065	**37,30%**

TABLA 3 PORCENTAJE DE AVANCE ENTREGAS MES 01 – ORDEN DE BIEN 01

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

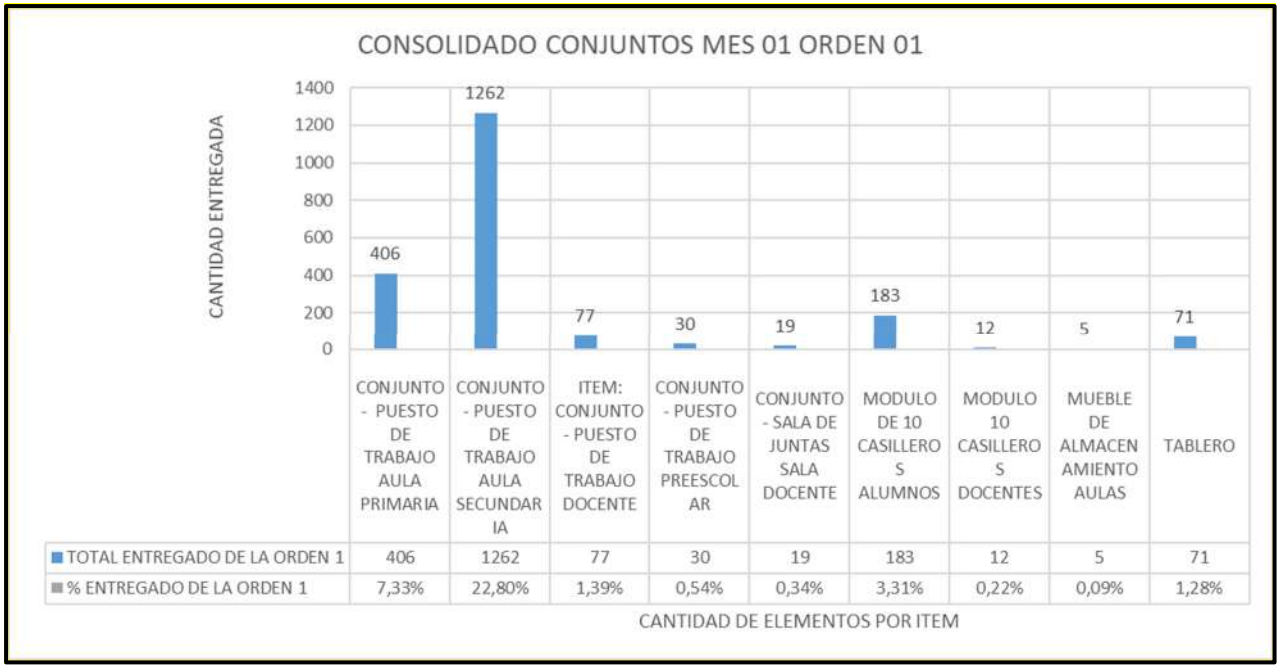


TABLA 4 DE AVANCE POR ÍTEM – IE GERARDO VALENCIA CANO % ORDEN 01

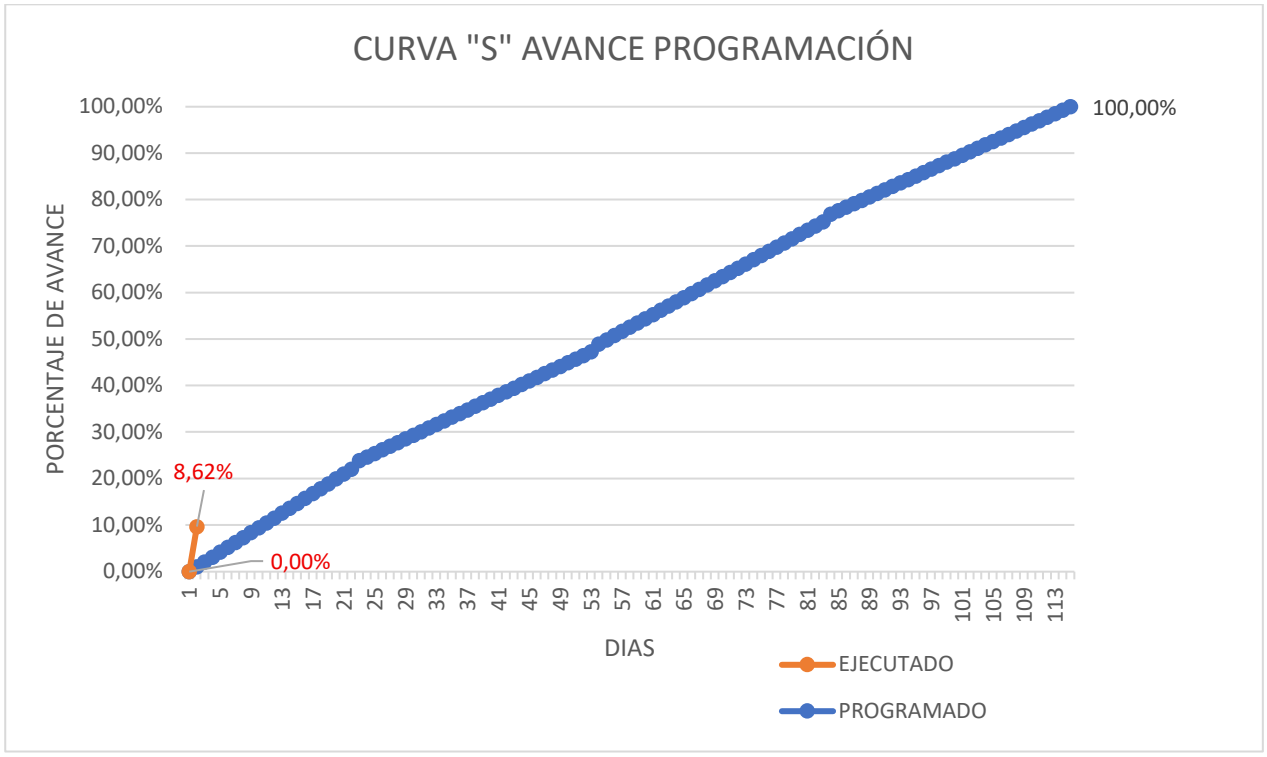


GRÁFICO 1 CURVA "S" MES 01

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

FEBRERO 13 A MARZO 12 DE 2025

El primer comité mensual se efectúa el día 13 de febrero de 2025 de manera virtual, se presenta el avance de cada una de las áreas de la producción, así como el porcentaje de despachos y entregas en sitio a satisfacción hasta la reunión mensual, se hace una descripción detallada de cada uno de los despachos y las cantidades de productos enviados y entregados hasta el momento

Se realiza comité técnico No 2, el día 17 de febrero de 2025 de manera virtual en el cual se presenta por parte de la interventoría los avances realizados por parte del contratista Manufacturas Sumapaz, hasta la fecha del comité se había entregado la totalidad de las 5 sedes de la Institución Educativa Gerardo Valencia Cano, el porcentaje de avance a la fecha era de 15,7% en la totalidad del contrato y de la orden de bienes No. 1 el porcentaje de ejecución es del 68,1%, las cifras presentadas son corroboradas por TF Interventores.

El día 25 de febrero de 2025 se realiza Comité técnico No.3 de manera virtual, la interventoría presenta el ultimo avance de la producción, despacho y entregas del mobiliario escolar en la ciudad de Buenaventura, que corresponde al cierre de la orden de bienes No. 1, con la totalidad de los ítems entregados en las 13 primeras sedes del contrato, el proceso se encuentra con 23.1% de las entregas hasta la fecha de la anteriormente mencionada reunión, lo que indica que el contrato tiene 10 días aproximadamente de adelanto con lo programado

Para el día 27 de febrero de 2025 se inicia el despacho de la orden de bienes No2 con la Institución Educativa LA ANUNCIACION en sus cinco sedes.

Se realiza comité técnico No 4, el día 4 de marzo de 2025 de manera virtual en el cual se presenta por parte de la interventoría los avances realizados por parte del contratista Manufacturas Sumapaz, hasta la fecha del comité se había entregado la totalidad de la sede de la Institución Educativa La Anunciación, el porcentaje de avance a la fecha era de 21.7% en la totalidad del contrato y de la orden de bienes No.2 el porcentaje de ejecución es del 20.7%, las cifras presentadas son corroboradas por TF Interventores.

El día 11 de marzo de 2025 se realiza Comité técnico No.5 de manera virtual, la interventoría presenta el avance de la producción, despacho y entregas del mobiliario escolar en la ciudad de Buenaventura, que corresponde a la orden de bienes No. 2, con 39.7% de las entregas, el proceso se encuentra hasta la fecha de la anteriormente mencionada reunión en un 66.7%, lo que indica que el contrato tiene una semana aproximadamente de adelanto con lo programado.

El segundo comité mensual se efectúa el día 13 de marzo de 2025 de manera virtual, se presenta el avance de cada una de las áreas de la producción, así como el porcentaje de despachos y entregas en sitio a satisfacción hasta la reunión mensual lo que equivale al 39.7% del contrato, equivalente a 9830 kits, se realiza una descripción detallada de cada uno de los despachos y las cantidades de productos enviados y entregados hasta el momento.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

En la fecha de corte de proyecto, se presenta avance teniendo casi terminadas la **ORDEN DE BIEN 01**, teniendo despachos del 13 al 21 de febrero, asi mismo haciendo el recibo de estos entre el 14 y 24 de febrero.

Con las siguientes instituciones, IE Termarit, en sus sedes principal y El Progreso, IE José María Cabal en su sede San Martín de Porres, IE José Ramón Bejarano en su sede principal, sede San Buenaventura, sede El Jardín y sede la Comuna.

Con esto se termina la entrega de bien 01, con un acumulado de 5.536 conjuntos entregados, que corresponden al 100% de esta, asi mismo llegando a un 23,12 % del total del proyecto.

Asi mismo se inicia el despacho de la **ORDEN DE BIEN 02** el 27 de febrero y de la cual, al 12 de marzo, tiene una avance importante llegando al 77,48% de esta. Con un inventario entregado de esta orden de 4.631 conjuntos.

A la fecha del culminación del segundo mes de actividades, al 12 de marzo se tienen 10167 conjuntos, llegando a un 42,46% del total del proyecto, contemplando las siguientes instituciones, IE Anunciación, IE Las Américas en todas sus sedes, IE Francisco Javier Cisneros, en sus sedes principal, La Gran Colombia y Carlos Borrero Sinisterra.

	% programado	% ejecutado	Avance o retraso
Ejecución durante el periodo reportado	18,39%	33,84%	15,45% AVANCE
Ejecución acumulada del proyecto	27,01%	42,46%	15,36% AVANCE

TABLA 5 - CONSOLIDADO PORCENTAJES A 12 DE MARZO DE 2025

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Avance del proceso de fabricación y distribución del mobiliario escolar Buenaventura

AVANCE DE ENTREGAS - ORDEN DE BIENES # 1

| | | |

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

AVANCE DE ENTREGAS - ORDEN DE BIENES # 2

| | | |

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CANT.	DETALLE / PRODUCTOS	TOTAL ENTREGADO DE LA ORDEN 2	% ENTREGADO DE LA ORDEN 2	TOTAL ENTREGADO DE LA ORDEN 1	% ENTREGADO DE LA ORDEN 1	VALOR UNT.
2.010	CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA MESA PUESTO DE TRABAJO BASICA PRIMARIA. SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	1482	73,73%	1742	100%	$ 215.365.722
2.907	CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA MESA PUESTO DE TRABAJO BASICA SECUNDARIA. SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	2483	85,41%	2777	100%	$ 376.914.434
155	ITEM: CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO DOCENTE MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE. SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	82	52,90%	167	100,00%	$ 20.359.698
108	CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR MESA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR. SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	51	47,22%	99	100,00%	$ 12.862.047
50	CONJUNTO - SALA DE JUNTAS SALA DOCENTE MESA DE JUNTAS SALA DOCENTE. SILLA INTERLOCUTORA SALA DOCENTE	30	60,00%	46	100,00%	$ 53.306.370
533	ITEM: PRODUCTO MODULO DE 10 CASILLEROS ALUMNOS	386	72,42%	487	100,00%	$ 226.882.694
36	ITEM: PRODUCTO MODULO 10 CASILLEROS DOCENTES	20	55,56%	32	100,00%	$ 14.525.980
23	ITEM: PRODUCTO MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	11	47,83%	19	100,00%	$ 7.890.344
155	ITEM: PRODUCTO TABLERO	86	55,48%	167	100,00%	$ 19.097.332
5.977		4.631		5.536		$ 947.204.621
						$ 179.968.878
24,96		77,48%		100%		$ 1.127.173.499
		10.167		42,46%		

TABLA 8 PORCENTAJE DE AVANCE ENTREGAS MES 02 ORDEN DE BIEN 01 – 02

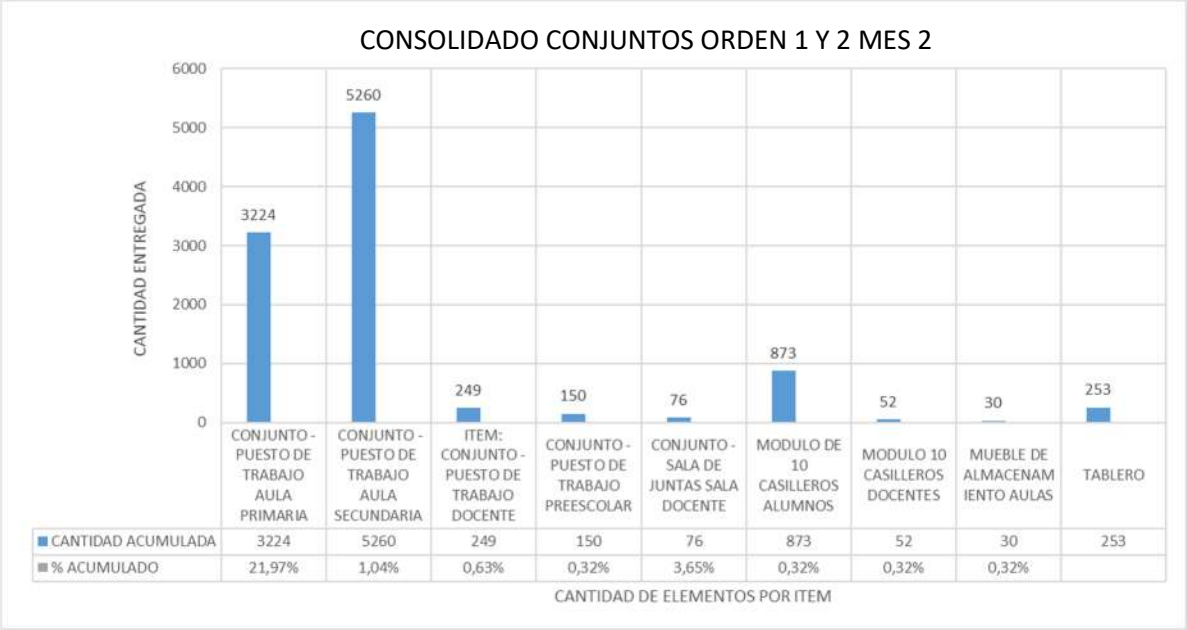


TABLA 9 PORCENTAJE DE AVANCE ENTREGAS MES 02 ORDEN DE BIEN 01 – 02 DEL TOTAL 42,46%

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

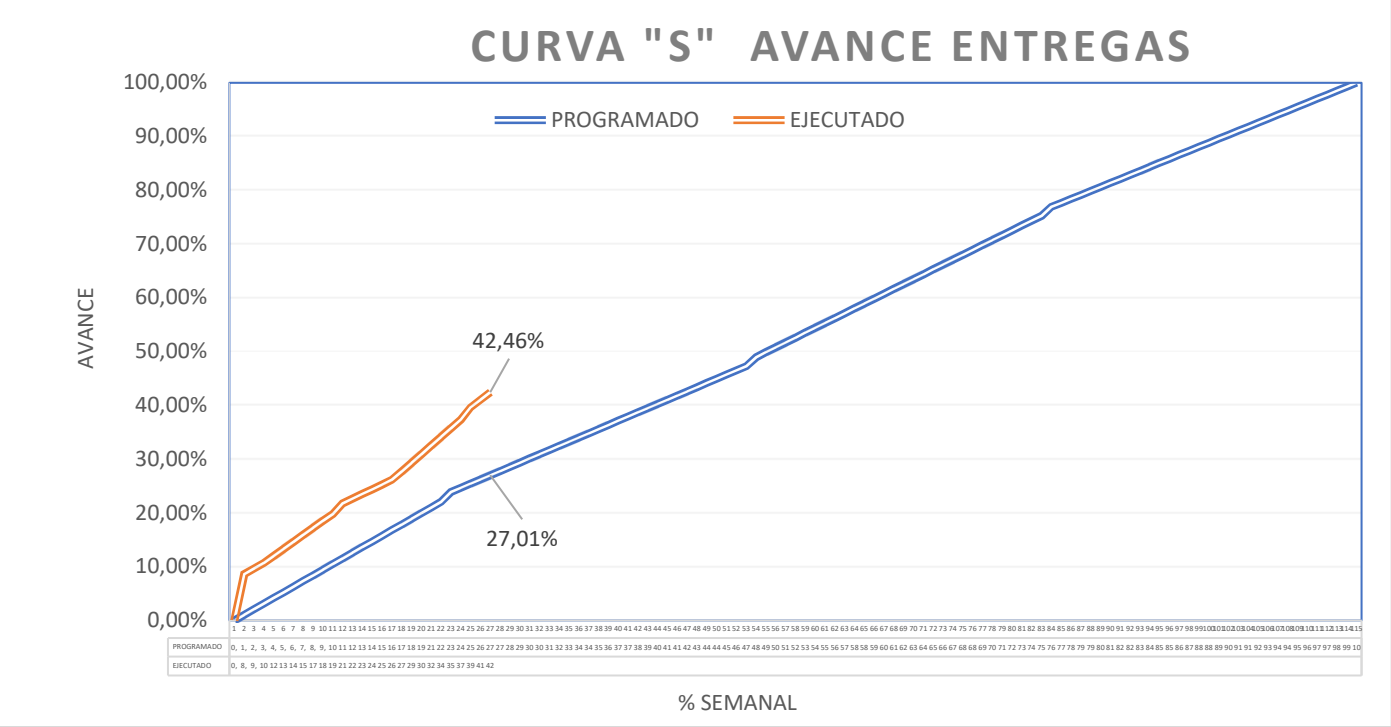


GRÁFICO 2 CURVA "S" MES 02


En la curva "S", se presenta el avance de entregas realizadas por el contratista Manufacturas Sumapaz, donde a la fecha de corte del segundo mes de actividades está programada la entrega de 27,01%, contemplando orden de bien 01 y 01, es asi que a la fecha lo ejecutado corresponde al 42,46%, teniendo un avance de 15% respecto a lo programado y en tiempo de alrededor de 14 dias.



ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

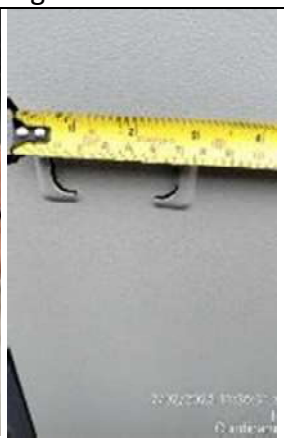Verificación Dimensiones	Revisión de calibre y ángulos
 	 
Verificación Dimensiones	**Verificación Dimensiones**
 	 
Revisión de calibres y ancho	Revisión medidas alturas y superficies
 	

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td> </td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co







	% programado	% ejecutado	Avance o atraso
Ejecución durante el periodo reportado	60%	89,06	29,06% AVANCE
Ejecución acumulada del proyecto	51,69%	71,10%	19,41% AVANCE

TABLA 10 CONSOLIDADO PORCENTAJES A 12 DE ABRIL DE 2025

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

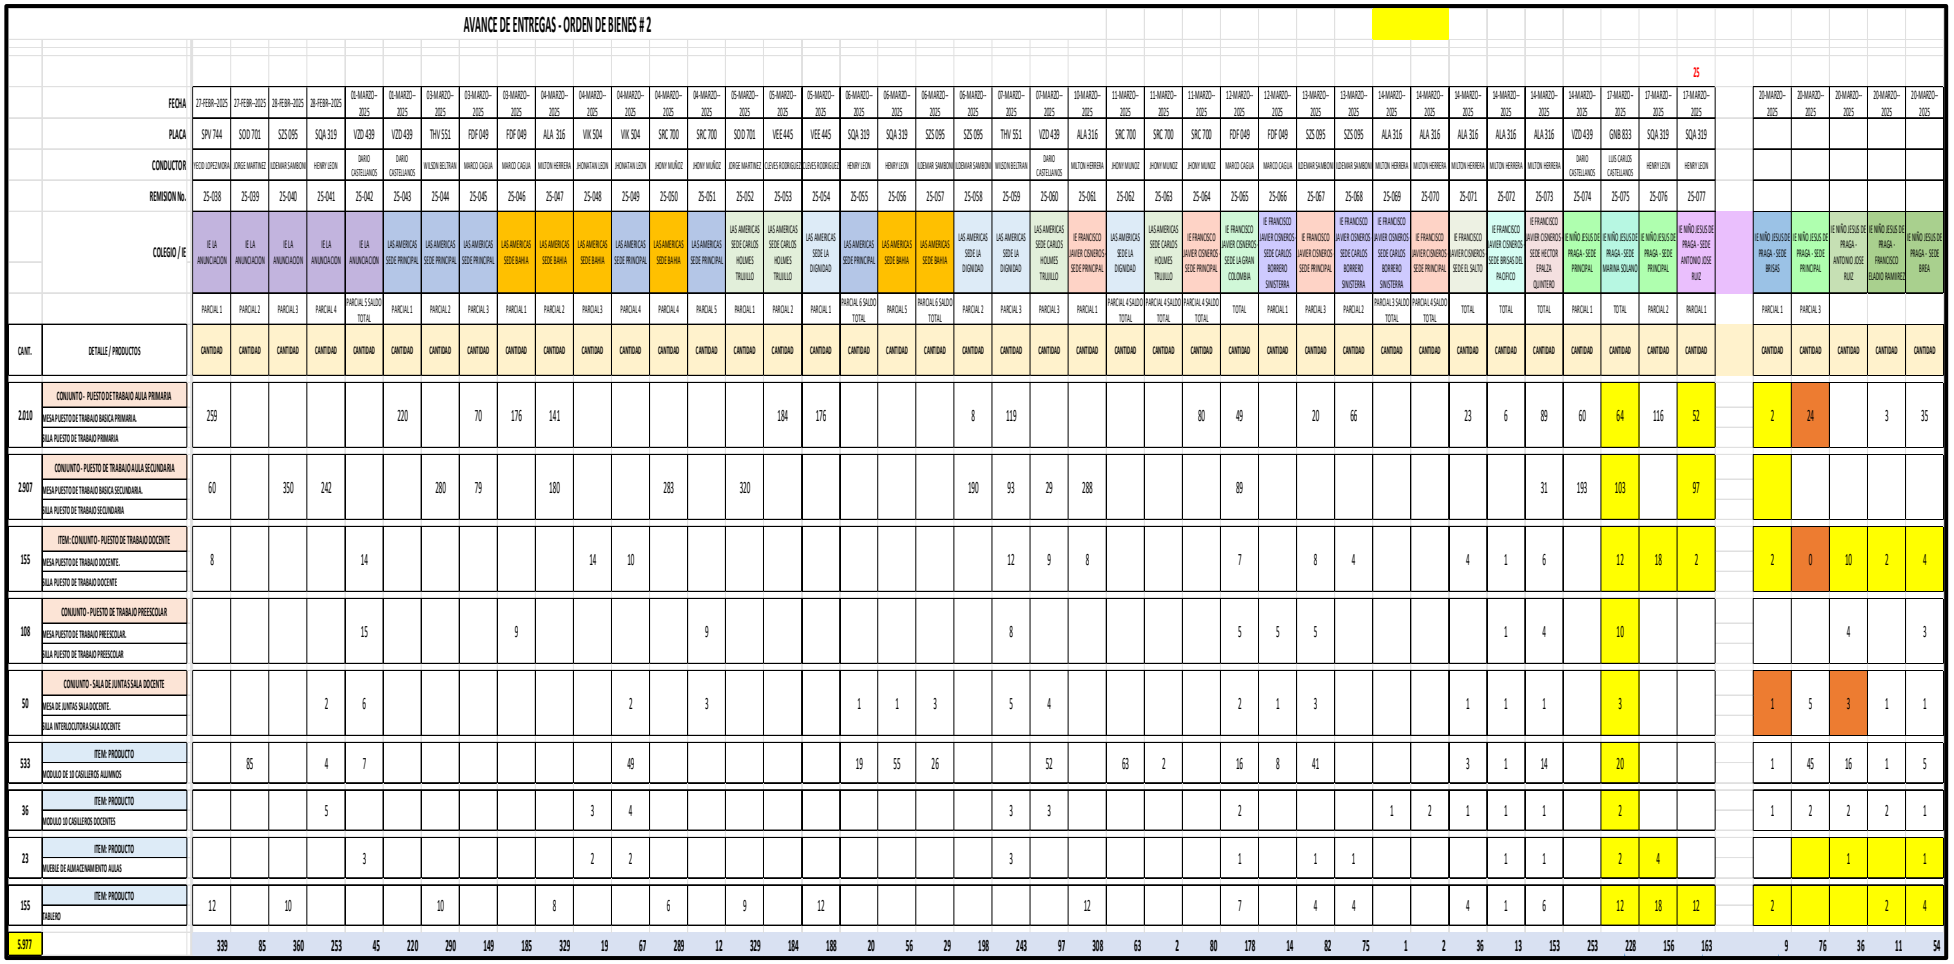


TABLA 11 ENTREGAS ORDEN DE BIEN 02 EN PROCESO AL 100,00% AL 20 DE MARZO DE 2025 ACUMULADO A LA FECHA 48,08%

Durante el periodo del presente informe no se presentaron devoluciones.

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

jasb
Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

AVANCE DE ENTREGAS - ORDEN DE BIENES # 3

| | | |

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

TOTAL ENTREGADO DE LA ORDEN 2	TOTAL ENTREGADO DE LA ORDEN 1	% ENTREGADO DE LA ORDEN 2	% ENTREGADO DEL CONT. TOTAL	VALOR UNT.
2010	1742	100,00%	44,47%	$ 292.095.210
2907	2777	100,00%	50,38%	$ 441.276.786
155	167	100,00%	50,79%	$ 38.484.795
108	99	100,00%	51,75%	$ 27.237.276
50	46	100,00%	45,93%	$ 88.843.950
533	487	100,00%	48,16%	$ 313.286.207
36	32	100,00%	46,90%	$ 26.146.764
23	19	100,00%	49,41%	$ 16.497.992
155	167	100,00%	50,79%	$ 34.419.610
5.977	5.536			$ 1.278.288.590
				$ 242.874.832
100,00%				$ 1.521.163.422

Tabla 13 Consolidado orden de bien No. 1 y No. 2 entregadas al 100 %, acumulado al 48,08%

ORDEN 3	ORDEN 2	ORDEN 1	
TOTAL ENTREGADO DE LA ORDEN 3	TOTAL ENTREGADO DE LA ORDEN 1	TOTAL ENTREGADO DE LA ORDEN 2	VALOR UNT.
2321	1742	2010	$ 882.534.433
2999	2777	2907	$ 1.318.062.034
135	167	155	$ 113.468.073
43	99	108	$ 63.049.250
49	46	50	$ 257.647.455
366	487	533	$ 814.661.694
9	32	36	$ 55.925.023
7	19	23	$ 35.147.896
129	167	155	$ 100.149.962
6.058	5.536	5.977	$ 3.640.645.820
			$ 691.722.706
89,06%	100%	100%	$ 4.332.368.526
73,38%	17571		71,10%

Tabla 14 Consolidado Orden de bien No. 1 (100%), 2(100%), y Orden de bien 3 entregadas al 89,06%, acumulado CONJUNTOS 73,38%; acumulado PRESUPUESTO 71,10%

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

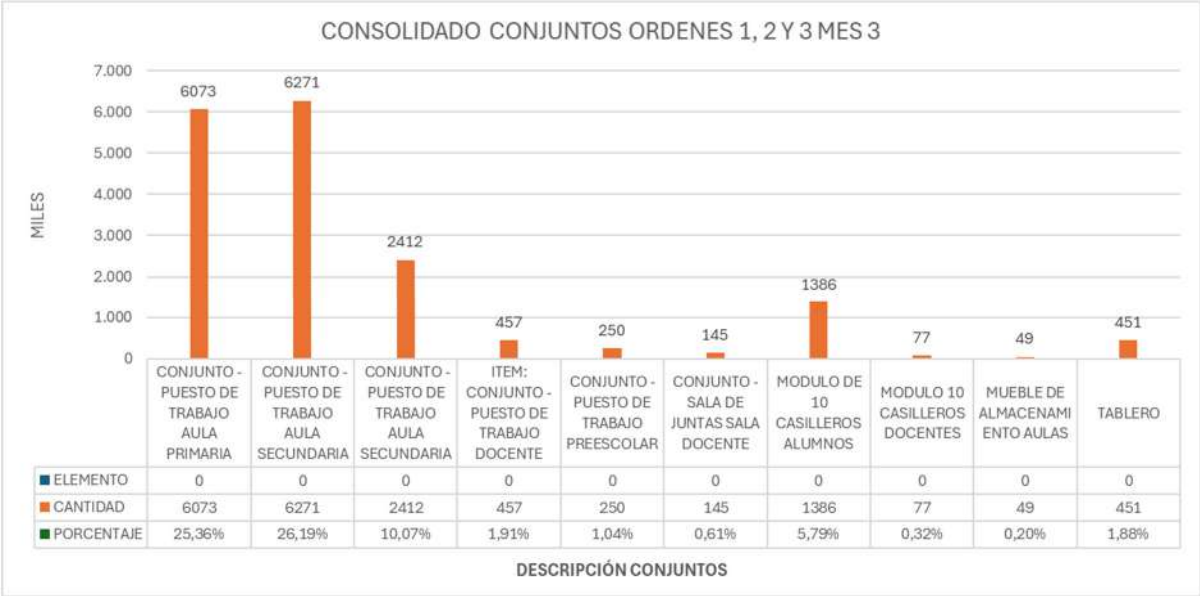


TABLA 15 PORCENTAJE DE AVANCE ENTREGAS MES 03 ORDEN DE BIEN 01-02-03 DEL TOTAL 71,10%

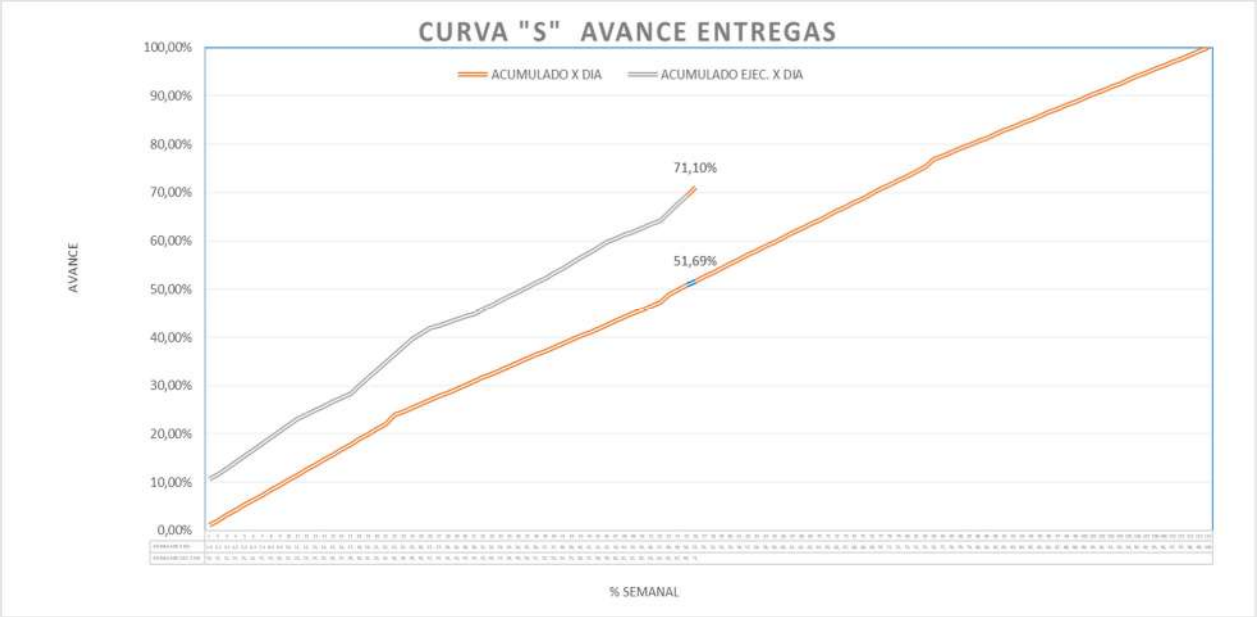


GRÁFICO 3 CURVA "S" MES 03

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

MARZO 13 A ABRIL 12 DE 2025

El segundo comité mensual se efectúa el día 13 de marzo de 2025 de manera virtual, se presenta el avance de cada una de las áreas de la producción, así como el porcentaje de despachos y entregas en sitio a satisfacción hasta la reunión mensual lo que equivale al 39.7% del contrato, equivalente a 9830 kits, se realiza una descripción detallada de cada uno de los despachos y las cantidades de productos enviados y entregados hasta el momento

Se realiza comité técnico No 4, el día 4 de marzo de 2025 de manera virtual en el cual se presenta por parte de la interventoría los avances realizados por parte del contratista Manufacturas Sumapaz, hasta la fecha del comité se había entregado la totalidad de la sede de la Institución Educativa La Anunciación, el porcentaje de avance a la fecha era de 21.7% en la totalidad del contrato y de la orden de bienes No.2 el porcentaje de ejecución es del 20.7%, las cifras presentadas son corroboradas por TF Interventores.

El día 11 de marzo de 2025 se realiza Comité técnico No.5 de manera virtual, la interventoría presenta el avance de la producción, despacho y entregas del mobiliario escolar en la ciudad de Buenaventura, que corresponde a la orden de bienes No. 2, con 39.7% de las entregas, el proceso se encuentra hasta la fecha de la anteriormente mencionada reunión en un 66.7%, lo que indica que el contrato tiene una semana aproximadamente de adelanto con lo programado

El comité técnico No.6 se realiza de manera virtual el día 18 de marzo del presente año, la interventoría presente el avance de ejecución del contrato de mobiliario para el distrito de Buenaventura, según reportes se cuenta con un 44.9% del contrato y un 87.6 de la orden de bienes No 2 con el porcentaje restante en tránsito y próximo a entregarse en la ciudad vallecaucana

Para el día 18 de marzo de 2025 se inicia el despacho de la orden de bienes No 3 con la Institución Educativa Pablo Emilio Carvajal en sus ocho sedes con 5436 unidades

El 26 de marzo de 2025 se realiza el ultimo comité técnico semanal del mes, manteniendo un dialogo constante con TF ingenieros se concuerda con las cifras de ejecución del contrato con Manufacturas Sumapaz, las cuales nos indican que se lleva el 52.1% del total del contrato, la orden de bienes No 2 ha sido entrega a satisfacción en su totalidad y para la orden de bienes No 3 se cuenta con el 14.5% de muebles en las instituciones educativas

El 2 de abril de 2025 se realiza comité técnico No. 8 semanal, manteniendo un dialogo constante con TF ingenieros se concuerda con las cifras de ejecución del contrato con Manufacturas Sumapaz, las cuales nos indican que se lleva el 59,70% del total del contrato, la orden de bienes No 2 ha sido entrega a satisfacción en su totalidad y para la orden de bienes No 3 se cuenta con el 42,69% de muebles en las instituciones educativas.

El 8 de abril de 2025 se realiza comité técnico No. 9 semanal, realizando la supervisión y control del proyecto en todos sus aspectos, y de los cuales se presenta que el avance general de entregas es de 64,20% del total del contrato, la orden de bienes No 3 se cuenta con el 72,02% de muebles recibidos en las instituciones educativas.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Es importante mencionar que las actividades de este mes tuvieron impacto por tiempo de semana santa, lo cual obligo a suspender despachos al 11 de abril, teniendo una semana posterior de no generar despachos.

En este mes se tuvo reunió o comité mensual 03, el 15 de abril donde se presenta lo relacionado en los cuadros e información presentada en el informe.

El avance del proyecto está dado en 17571 conjuntos recibidos, teniendo la orden de bien 01 y 02 culminadas al 100% y la tercera en **89,06%.**
Teniendo avance en las IE Pablo Emilio Carvajal al 96,65%, Liceo del Pacifico al 90,03%, IE Néstor Urbano Tenorio al 83,22% y el IE San Vicente al 77,80%. Lo cual ratifica el porcentaje mencionado.

El avance general del proyecto es de 71,10% ejecutado; programado 51,69%, teniendo un adelanto de 19,41%, asi mismo en tiempo se mantiene las dos semanas de avance, respecto a las fechas de entrega.

En este periodo del mes se revisan y avala la Orden de bien 01, para el pago de Manufacturas Sumapaz, con el oficio 753-033 REMISION ACTAS DE ENTREGA ORDEN DE BIENES No 1, con fecha de 13-03-2025.

Por otra parte, se envía al MEN, oficio respecto a las condiciones planteadas en contrato y las que realmente se tiene en el desarrollo del proyecto, enviado con el consecutivo, 753-036 CONDICIONES DE PERMANENCIA INTERVENTORÍA EN PLANTA Y ENTREGA. esta misma solicitud se vuelve a enviar después de haber realizado reunión con los profesionales del MEN, donde se entrega propuesta al tema indicado, esto don el oficio 753-039 CONDICIONES DE PERMANENCIA INTERVENTORÍA EN PLANTA Y ENTREGA., como retroalimentación de esta situación se envía propuesta el 15 de abril, con el oficio 753-046 PROPUESTA CONDICIONES DE PERMANENCIA INTERVENTORÍA EN PLANTA Y ENTREGA.

Se hace el envio con oficio 753-037 NOTIFICACIÓN CAMBIO DE RL, donde se indica el cambio de representante legal de Alianza Integral de Proyectos S.A.S BIC. Asi como del correo de correspondencia oficial con el consecutivo 753-038 NOTIFICACIÓN Cambio dominio al canal oficial de correspondencia. (@g-proyectos).

El 2 de abril, se hace la aprobación de la documentación de la orden de bien No. 02, con el oficio 753-040 REMISION APROBACION DOCUMENTACION Y ACTAS DE ENTREGA ORDEN DE BIENES N 2, la cual es enviada a la gerencia y al MEN.

El día 4 de abril se hace el envío a la gerencia de las documentación con soporte de aprobación informes 1 y 2 a la gerencia para el respectivo trámite de pago de la Interventoría.

Asi mismo el 9 de abril se envía al MEN, informe mensual 3 de interventoría, para su revisión y aprobación, este es enviado por la plataforma del MEN y por correo a los profesionales de la entidad, esto con el oficio, 753-044 REMISIÓN INFORME MENSUAL No.3 INTERVENTORIA.

jasb
Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Avance del proceso de fabricación y distribución del mobiliario escolar Buenaventura

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>Verificación Dimensiones</td><td>Verificación Dimensiones</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>Verificación Dimensiones</td><td>Verificación Dimensiones</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
</table>

jasb
Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Verificación Dimensiones	Revisión medidas alturas y superficies
 	 
 	
 	 

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

















Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co









Durante el periodo del presente informe no se presentaron devoluciones.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

ABRIL 13 A MAYO 12 DE 2025

El 14 de abril se muestra gran avance en fabricación y entregas de la orden N°3 hasta la fecha se cuenta con un 89.90% de entregas en las instalaciones educativas, hasta la fecha no se ha efectuado ninguna devolución de los insumos entregados.

Se realiza el empalme de datos entre la interventoría y manufacturas Sumapaz el 24 de abril de los cuales se envía en el segundo viaje del día los 22 casilleros de alumnos faltantes para la institución educativa Liceo del Pacifico en su sede principal completando la orden N°3, incluyendo el inicio de despacho del orden N°4 el 21 abril y hasta la fecha se lleva de la orden N°3 un 99.80% de dotación entregada y para la orden N°4 un 29.80% entregado en las instituciones educativas con un avance general del contrato de 83.50%.

Se efectúa el comité numero 11 el día 29 de abril con fecha de corte del lunes 28 de abril para socializar el avance del contrato en el cual se presenta la orden N°3 al 100% sin ninguna eventualidad y un avance de la orden N°4 en un 44.16% ya entregado en las instituciones con un total del contrato hasta la fecha del 86.99%. Se realizan reuniones de trabajo para proponer y determinar las fechas de visitas a las instituciones educativas, en primera instancia se proponen cuatro (4) IE urbanas y tres (3) IE rurales.

Se realiza comité de avance No. 12 el 6 de mayo, donde se tiene ya tres órdenes de bienes terminadas al 100%, y la cuarta orden en un porcentaje de 68,42%, teniendo avance en todas las Instituciones Educativas,

Habiéndose realizado 24 entregas con los siguientes resultados, José María Cabal 40,61%, Vasco Núñez de Balboa 64,60%, Nachasin 67,36%, Agropecuario José María Cordoba 98,40% y IE Francisco José de Caldas 87,70%.

Se realiza corte al 10 de mayo, teniendo de despachos hasta esta fecha y haciendo el recibo el lunes siguiente 12 de mayo, este avance se relaciona en el comité mensual de avance, presentando un avance de **4,959** conjuntos que representan un 88,08%, el acumulado a la fecha es de 22530 conjuntos, el acumulado general de avance es de 94,09 %. Y con un acumulado en presupuesto de 91,66%

Se corrige cantidad y porcentaje respecto al valor presentado.

Se envía correo con prepuesta permanencia Interventoría, el día 15 de abril, para ser revisada por el supervisor del ministerio.

Se hace el envio del oficio de concepto, respecto al reajuste y negociación de este, con radicado 753-045 REMISION SOLICITUD REAJUSTE DE PRECIOS AL CONTRATO 8000009092.

Se envía correo de propuesta visitas a localidades para visita en el mes de mayo, con radicado, 753-049 PROGRAMACIÓN PROPUESTAS VISITA MAYO 21 Y 22 IE BUENAVENTURA. Con fecha 15 de abril de 2025.

Se envía correo de aprobación orden de bien 03, con radicado, 753-050 REMISION APROBACION DOCUMENTACION Y ACTAS DE ENTREGA ORDEN DE BIENES N 3, del 2 de mayo de 2025.

Se realizar entrega de informe mensual 04, 753-053 REMISIÓN INFORME MENSUAL No.4 INTERVENTORIA. El cual tuvo observaciones. Este fue radicado el 6 de mayo de 2025.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Asi mismo se vuelve a enviar documentación a la gerencia determinados por los cambios de mes y consecuente al periodo de facturación.

El 13 de mayo de envio oficio final de programación visita a sitios para verificación entrega mobiliario, con radicado 753-054 PROGRAMACIÓN FINAL PROPUESTA VISITA MAYO 21 Y 22 IE BUENAVENTURA.

	% programado	% ejecutado	Avance o atraso
Ejecución durante el periodo reportado	50%	88,08%	38% AVANCE
Ejecución acumulada del proyecto	78,40%	94,09%	17% AVANCE

TABLA 16 CONSOLIDADO PORCENTAJES A 12 DE ABRIL DE 2025

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

RELACION DE ENTREGAS ODB # 4 - CENIT

| CANT. | DETALLE / PRODUCTOS | VALOR UNT. | VALOR TOTAL | FECHA | PLACA | CONDUCTOR | REMISION No. | COLEGIO / IE | | |

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

	ORDEN 4	ORDEN 3	ORDEN 2	ORDEN 1		
PORENTREGAR	TOTAL ENTREGADO ORDEN 4	TOTAL ENTREGADO ORDEN 3	TOTAL ENTREGADO ORDEN 2	TOTAL ENTREGADO ORDEN 1	VALOR UNT.	VALOR UNT.
2233	2233	2448	1742	2010	$ 1.225.491.993	$ 1.225.491.993
2209	2185	3227	2777	2907	$ 1.684.350.608	$ 1.687.993.700
146	135	161	167	155	$ 353.442.602	$ 156.173.781
83	73	93	99	108	$ [illegible]	$ [illegible]
39	31	57	46	50	$ [illegible]	$ [illegible]
164	132	600	487	533	$ [illegible]	$ [illegible]
17	14	35	32	36	$ 84.976.983	$ 87.155.880
24	17	20	19	23	$ 56.667.016	$ 61.688.144
150	139	161	167	155	$ [illegible]	$ [illegible]
5.065	4.959	6802	5536	5977	$ 4.793.855.791	$ 4.845.418.759
					$ 910.832.600	$ 920.629.564
89,96%	88,08%	100,00%	100%	100%	$ 5.704.688.391	$ 5.766.048.323
24.480		22530			93,62%	94,63%

Tabla 18 Acumulado ordenes de bien 1, 2, 3 y 4, con 4.959 conjuntos entregados en a cuarta orden de bien, llevando un 88,08% de esta, acumulado general es de 22.530 conjuntos con un 94,08%.
En cuanto a presupuesto el acumulado es de 91,66%.


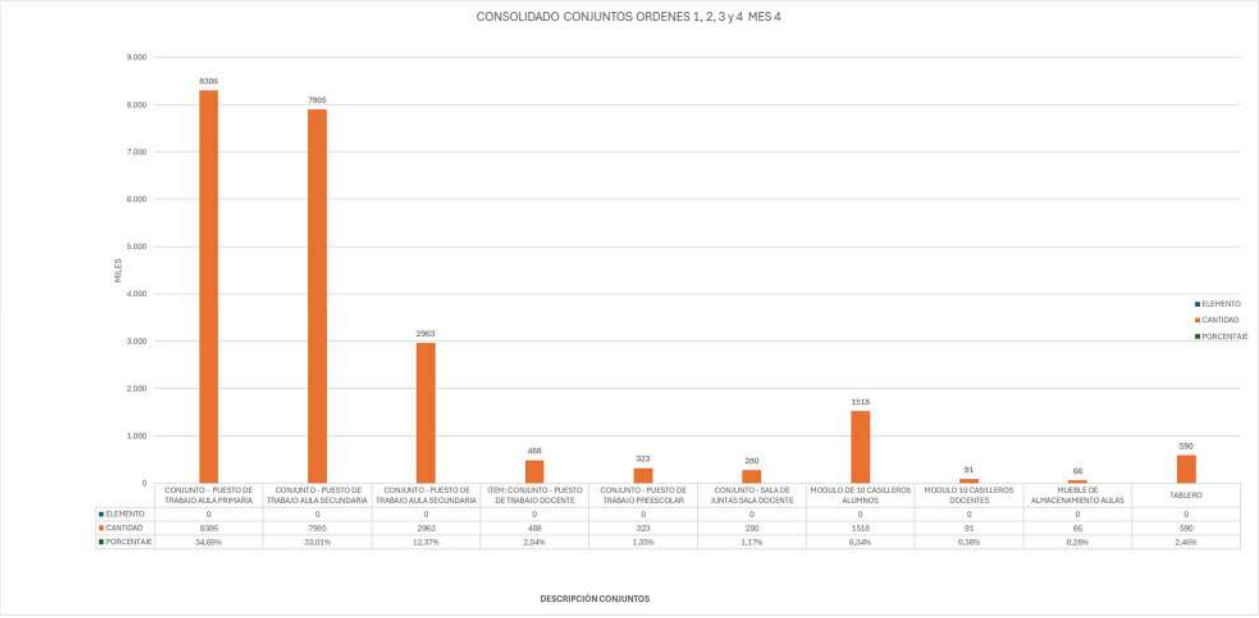


TABLA 19 PORCENTAJE DE AVANCE ENTREGAS MES 04 ORDEN DE BIEN 01-02-03 -04 DEL TOTAL 94,09%

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

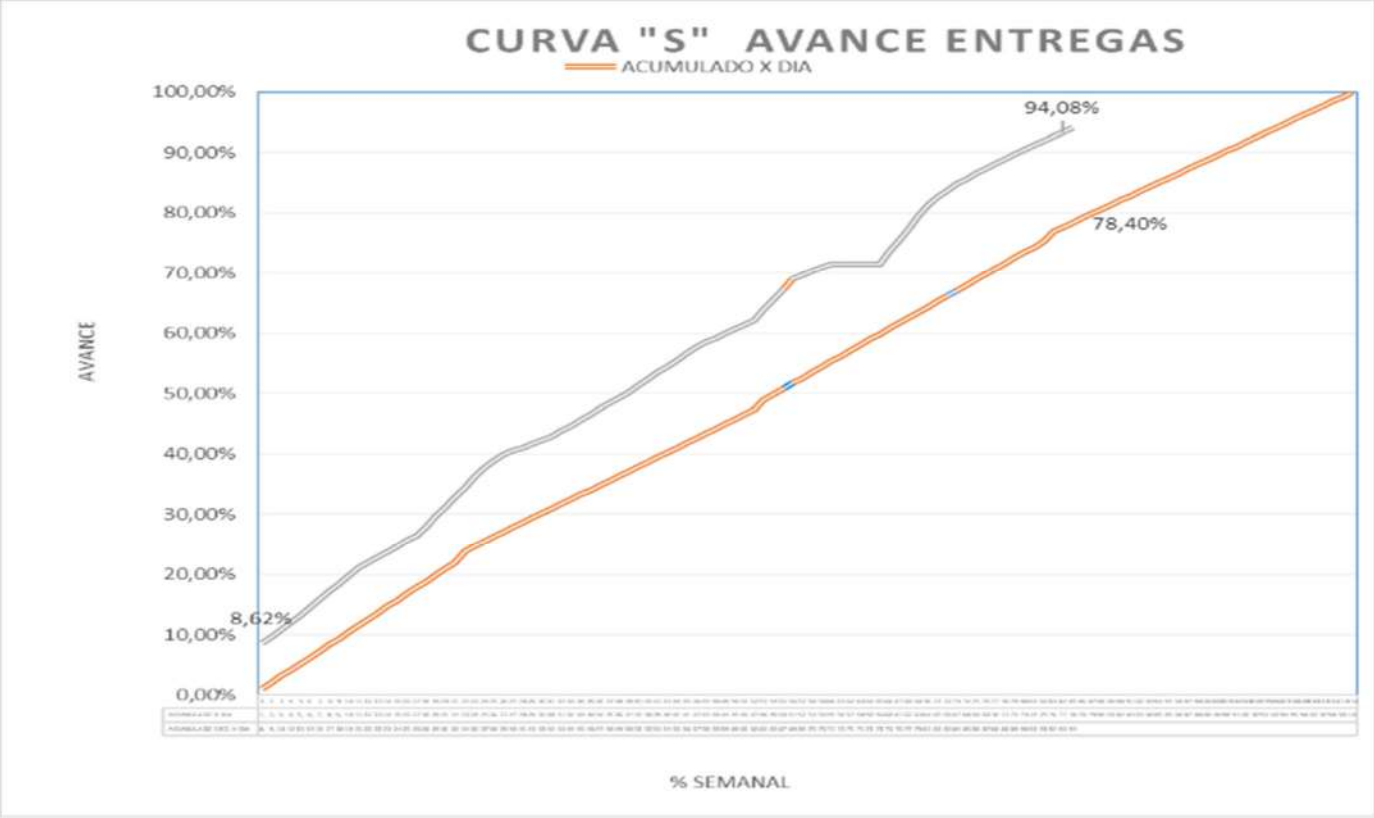

Avance del proceso de fabricación y distribución del mobiliario escolar Buenaventura

jasb
Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

 	  
Verificación Dimensiones	**Verificación Dimensiones**
  	   
Verificación Dimensiones	**Verificación Dimensiones**
   	  
Verificación Dimensiones	Revisión medidas alturas y superficies

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

<table>
<tr><td>  </td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>  </td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co







EVIDENCIA DE ACOPIO DE CASILLEROS PARA DOCENTES







Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

MAYO 13 AL 12 DE JUNIO 2025

Se realiza el comité número 13 de mayo con corte de avance el 12 de mayo, se presenta un avance general del contrato del 94,08% despachado y recibido en las instituciones educativas, la orden No 4 se lleva un avance del 88.08% y un 1.88% en tránsito por parte de la manufacturera Sumapaz socializa que el lote de casilleros puede presentar demora para su despacho por tema de ensamble, pintura y correcciones para su entrega final.

Se hace el envio de una nueva solicitud respecto a la respuesta que debe realizar el MEN, generando el concepto respectivo al reajuste, La comunicación de Interventoría fue enviada el 15 de abril, con el consecutivo 753-045 REMISION SOLICITUD REAJUSTE DE PRECIOS AL CONTRATO 8000009092.

El 19 de mayo se inicia la reunión de avance hasta el 18 de mayo de los ítems recibidos por parte de la interventoría establecida en buenaventura con el 96.10% verificado y entregado en las instituciones educativas pertinentes a la orden No 4, presentando un avance general del contrato del 99.44% hasta la fecha, en el comité se confirma el personal que va a asistir a la revisión junto con el ministerio de educación.

Los dias 21 y 22 de mayo se realizan las visitas a las instituciones educativas, teniendo como itinerario el día 21 las IE rurales, la cuales correspondieron a IE FRANCISCO JAVIER CISNEROS, IE NACHASIN y IE AGROPECUARIO JOSÉ MARÍA CORDOBA.

El segundo día 22 de mayo, se realizan las visitas a la Instituciones educativas Urbanas, l IE SAN VICENTE, IE LICEO DEL PACIFICO, a IE TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO y IE TERMARIT, como parte de las visita se hacen las actas respectivas que corroboran las visitas realizadas.

El 29 de mayo, se hacen entrega de las actas de la orden de bien 04, donde se hace la verificación de los despachos y recibos realizados. Con esta entrega se culmina la entrega de mobiliario escolar en la localidad de Buenaventura.

En el comité numero 14 del 27 de mayo, se confirma la finalización de despacho y el recibido de todos los ítems acordados del contrato al 100%, se designa las fechas estimadas para realizar la facturación de todas las partes y realizar el cierre del contrato.

El 3 de junio, se recibe correo, por parte del supervisor del Ministerio de Educación Nacional, donde indica que se debe realizar el cambio de los informes 1, 2, y 3, con las fechas de ejecución real del proyecto, esto tuvieron cambios sustanciales, en las incidencias, porcentajes y entregas, los cuales fueron entregados el 13 de junio y enviando correo con radicado el 16 de junio.

Por otra parte, el concepto generado por el MEN, respecto al reajuste solicitado por el contratista Manufacturas Sumapaz, tuvo respuesta y se cargó a la plataforma Suifp el 5 de junio de 2025.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

DETALLE / PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL	DEPTO	ETAPAS	ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ORDEN DE BIEN 01	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ORDEN DE BIEN 02	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ORDEN DE BIEN 03	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ORDEN DE BIEN 04
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR	46 753	BUENAVENTURA	FABRICACION	AUSTAMIENTO DE PROVEEDURÍA - MATERIAS PRIMAS	100%	100%	100%	100%	100%
				CORTES DE TUBERÍA, LAMINA, Y PARTES METALICAS. - TROQUELADOS - DESPUNTES - Y DOBLECES	100%	100%	100%	100%	100%
				PREPARACIÓN - MEZCLA DE PRODUCTOS Y COLORES PARA COMPONENTES PLASTICOS E INYECCION DE COMPONENTES	100.0%	100%	100%	100%	100%
				ENCHAPES DE MADERAS - AGLOMERADOS - LAMINADOS DECORATIVOS - CANTOS PVC. CORTES - ETC	100.0%	100%	100%	100%	100%
				SOLDADURAS - PINTURAS - ENSAMBLE	100.0%	100%	100%	100%	100%
				VERIFICACIÓN DE CALIDAD - EMPAQUE Y EMBALAJE	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%
			DISTRIBUCION	TRANSPORTE	100.00%	100.0%	100.00%	100.00%	100.00%
				ENTREGA EN SITIO	100.00%	100.0%	100.00%	100.00%	100.00%

Tabla20 Avance del proceso de fabricación y distribución del mobiliario escolar Buenaventura

	% programado	% ejecutado	Avance o atraso
Ejecución durante el periodo reportado	49%	100%	51 % AVANCE
Ejecución acumulada del proyecto	87,34%	100%	13 % AVANCE

Tabla 21 programado Orden de bien 04 24,72 % ejecutado al 100%



Tabla 22 Consolidado general del proyecto – ejecutado 100% programado 87,34%

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

jasb
Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

RELACION DE ENTREGAS ODB # 4 - CENIT

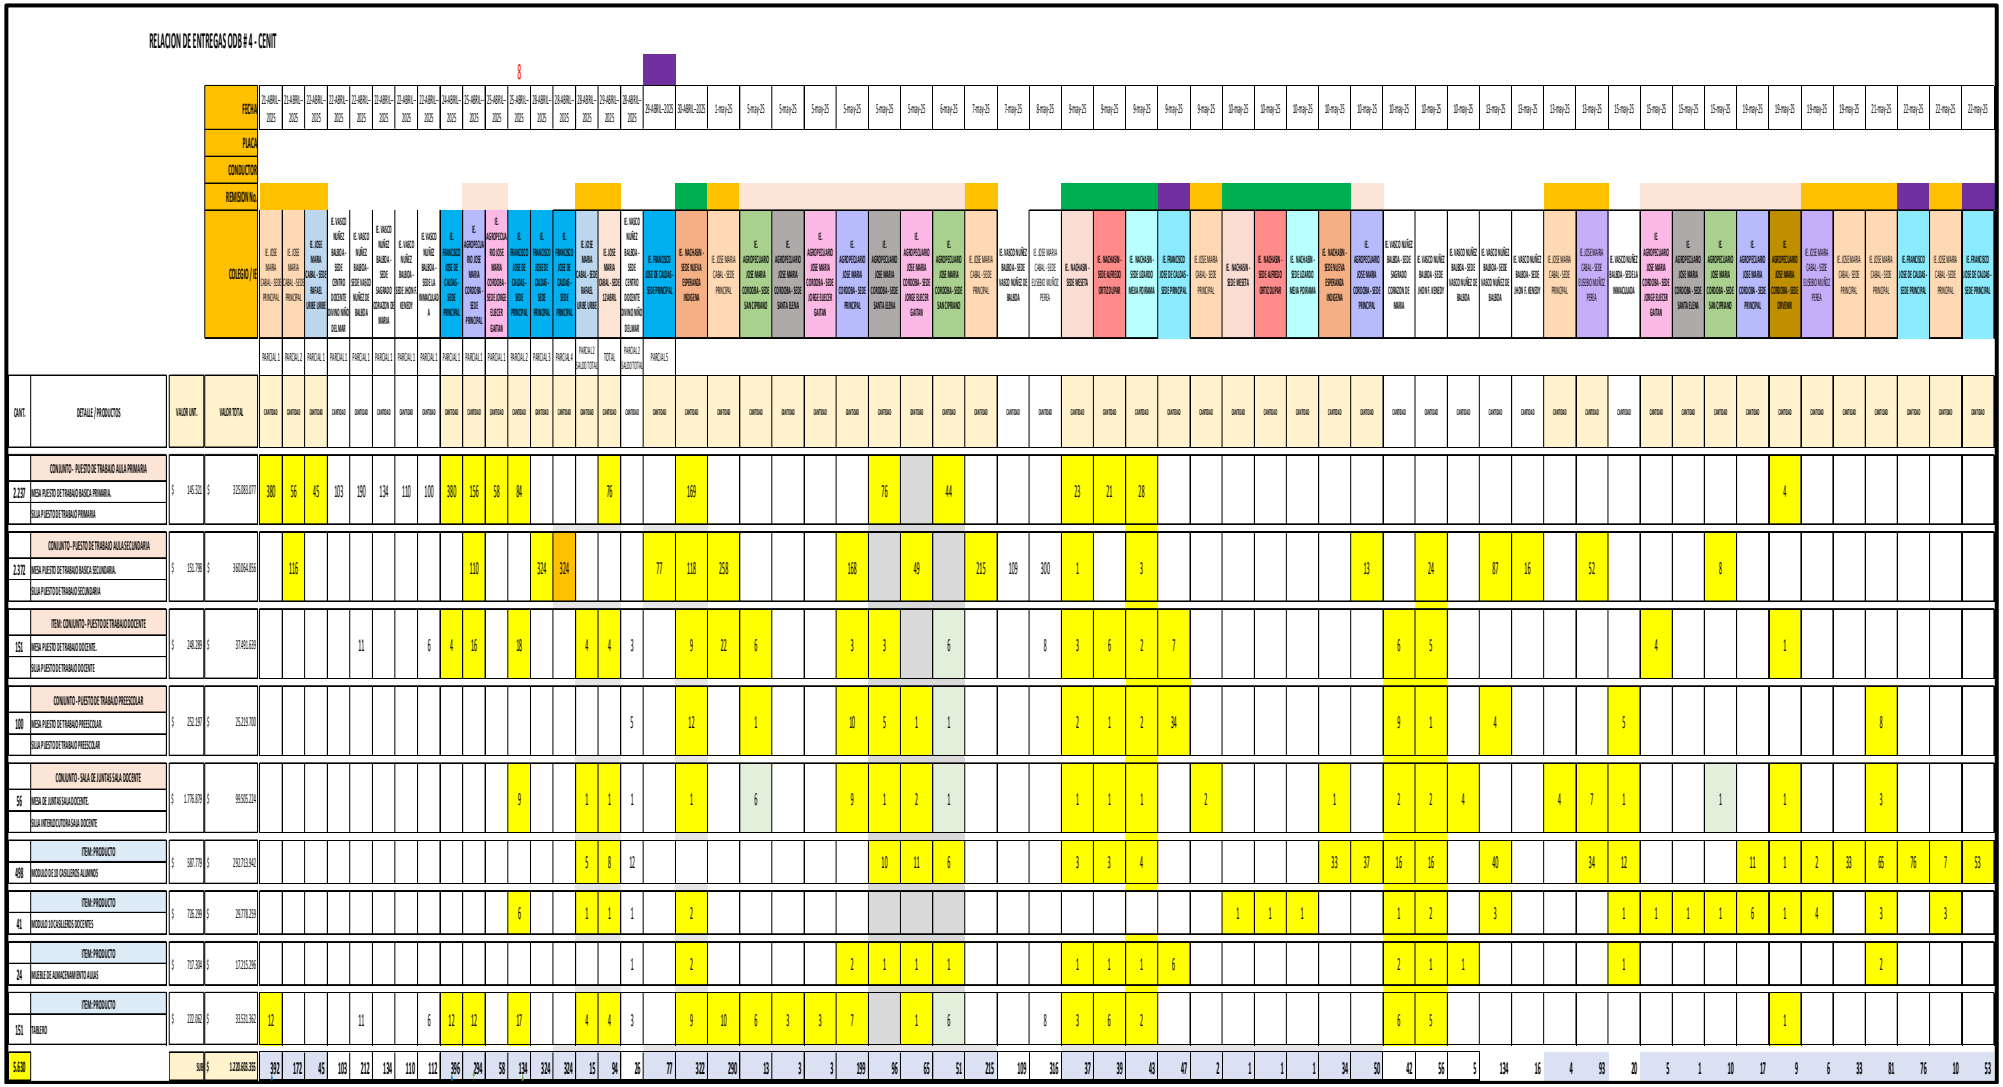


Tabla 23 ENTREGAS ORDEN DE BIEN 04 EN PROCESO AL 100% DEL 13 JUNIO AL 22 DE JUNIO DE 2025 - ACUMULADO TOTAL PROYECTO 100%

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

ORDEN 4	ORDEN 3	ORDEN 2	ORDEN 1				
TOTAL ENTREGADO ORDEN 4	TOTAL ENTREGADO ORDEN 3	TOTAL ENTREGADO ORDEN 2	TOTAL ENTREGADO ORDEN 1	VALOR UNT.	ACUMULADO CONJUNTOS	% POR CONJUNTO	
2237	2448	1742	2010	$ 1.226.073.277	8437	35,23%	
2372	3227	2777	2907	$ 1.712.736.834	11283	47,12%	82,36%
151	161	167	155	$ 157.415.226	634	2,65%	
100	93	99	108	$ 100.878.800	400	1,67%	
56	57	46	50	$ 371.367.711	209	0,87%	
498	600	487	533	$ 1.244.915.922	2118	8,85%	17,64%
41	35	32	36	$ 104.587.056	144	0,60%	
24	20	19	23	$ 61.688.144	86	0,36%	
151	161	167	155	$ 140.787.308	634	2,65%	
5.630	6802	5536	5977	$ 5.120.450.278	23945	100,00%	
				$ 972.885.553			100,00%
100,00%	100,00%	100%	100%	$ 6.093.335.831		100,00%	
	23.945			100,00%			

TABLA 24 RESUMEN ORDEN DE BIENES 1-2-3-4 CULMINAD AL 100%


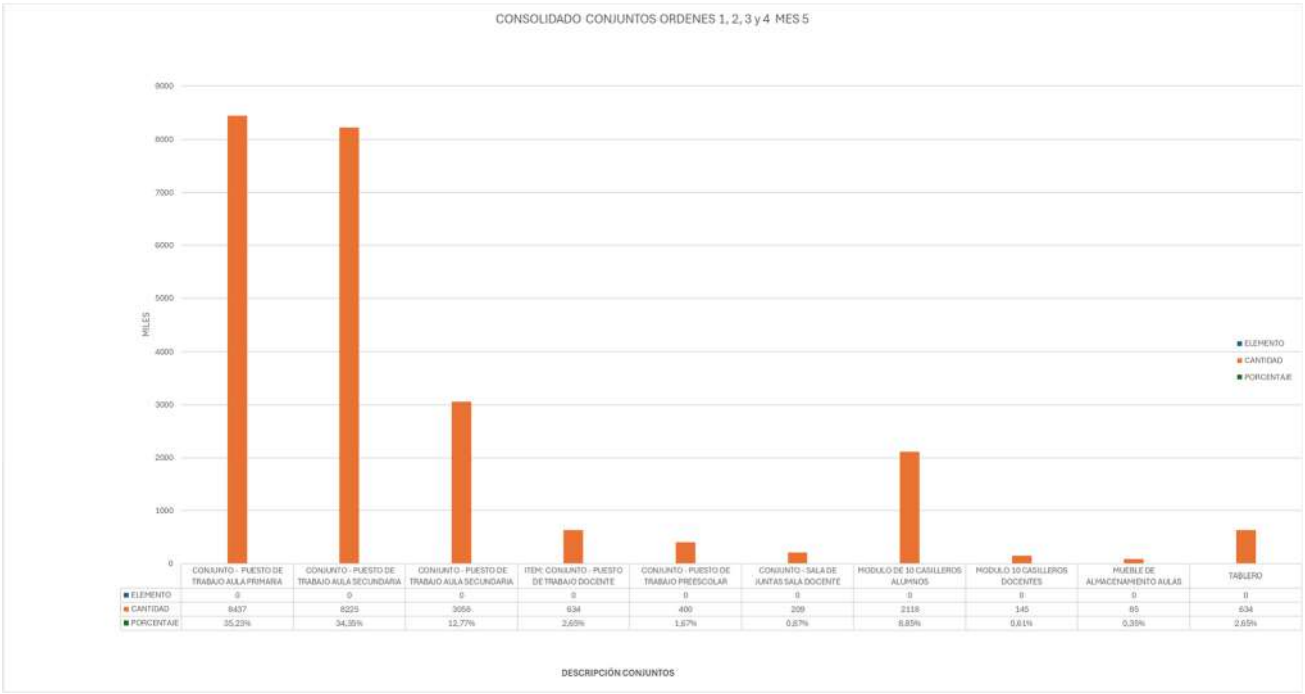


Tabla 25 CANTIDAD DE ELEMENTOS POR ITEM

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co



Tabla 26 Porcentajes de entregas en el desarrollo del proyecto

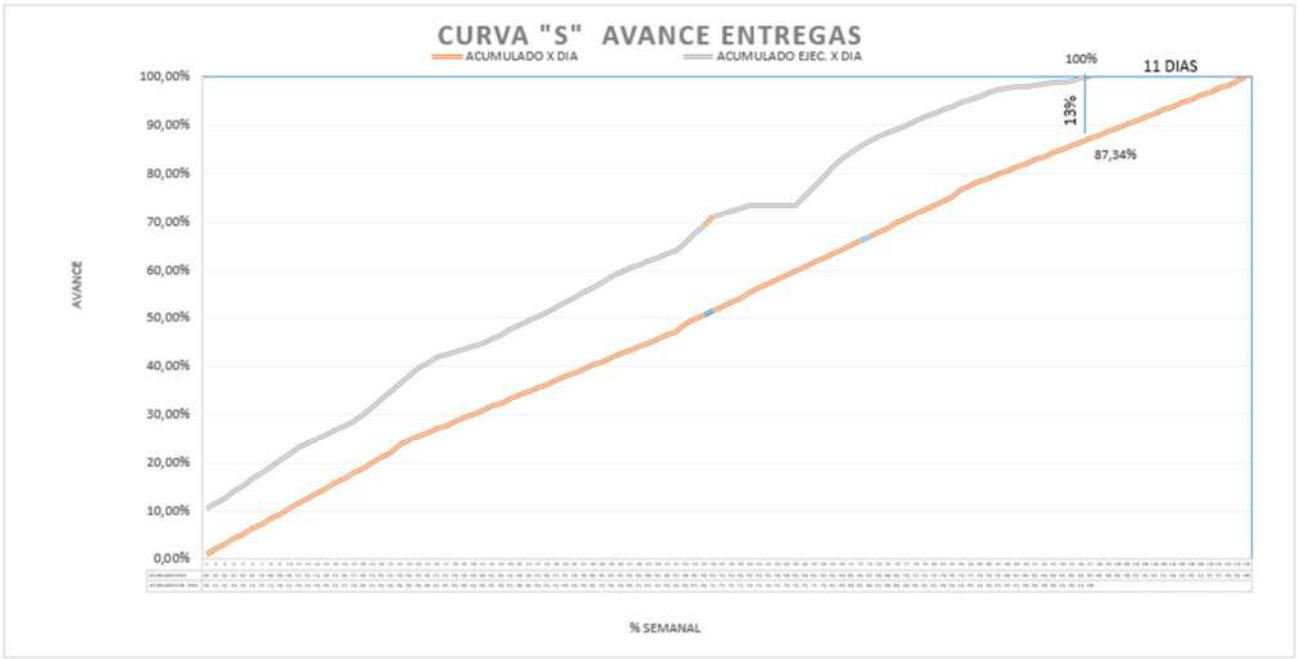

jasb
Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

<table>
<tr><td> </td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co










ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co















ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

jasb
Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

cenit
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC
INFORME DE AVANCE

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 5

7,38%

100,00%		JOSE MARIA CABAL
		EUSEBIO MUÑOZ PEREA
JOSÉ MARÍA CABAL		RAFAEL URIBE URIBE
1768		12 DE ABRIL

4,51%

100,00%		CENTRO DOCENTE DIVINO NIÑO DEL MAR
		VASCO NUÑEZ DE BALBOA
VASCO NUÑEZ BALBOA		SAGRADO CORAZON DE MARIA
1079		JHON F KENEDY
		LA INMACULADA

23,51%
59 ENTREGAS
0 PENDIENTES
100%

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

5,98%
1431
100,00%

SEDES EDUCATIVAS 19

2,00%

100,00%		MESETA
		ALFREDO ORTIZ DUPAR
NACHASIN		LIZARDO MEJIA POIRAMA
478		NUEVA ESPERANZA INDIGENA

3,65%

100,00%	30	INSTITUCIÓN AGROPECUARIA JOSÉ MARÍA - SEDE PRINCIPAL
	31	SAN CIPRIANO
AGROPECUARIO JOSÉ MARÍA CORDOBA	32	SANTA ELENA
	33	JORGE ELIECER GAITAN
874	35	PORVENIR

Avance en comité de avance No 14 – final de mayo

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

4. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA INTERVENTORÍA

N.º	Obligación	Actividades realizadas
	OBLIGACIONES GENERALES	
1	1. Acatar la Constitución Política, la Ley, los principios de la contratación Estatal y las demás normas concordantes y complementarias.	**Descripción del avance**: Desde la convocatoria se cumple con la legislación y la normatividad colombiana para el cumplimento adecuado del objeto del contrato **Entrega producto Si ____No __X** **Evidencia verificable:**
2	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.	**Descripción del avance**: Con la firma del acta de inicio se asumen todas las responsabilidades que conlleva la suscripción de un contrato de carácter público **Entrega producto Si ___ No X** **Evidencia verificable: N/A**
3	Cumplir con los ofrecimientos adicionales que presentó en su oferta, la cual hace parte integral del presente contrato.	**Descripción del avance**: N/A **Entrega producto Si ____No __X** **Evidencia verificable:**
4	Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato.	**Descripción del avance**: Alianza Integral de proyectos cuenta con la infraestructura necesaria para el manejo adecuado de la información que resulte del proyecto
5	Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, debidamente inventariados conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación, que se encontrarán en el instructivo adjunto que hace parte integral del contrato.	**Descripción del avance**: De manera permanente la Interventoría remite al MEN la documentación que requiera su aprobación, en especial en el inicio del contrato. **Entrega producto Si __X_ No** **Evidencia verificable:** Se adjuntan cronogramas, Manual de mantenimiento, informe de prototipos, actas
	Solicitar autorización escrita de EL MINISTERIO para utilizar el nombre, emblema o sello oficial con fines	**Descripción del avance**: N/A

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

6	publicitarios o ajenos a los establecidos en los lineamientos de EL MINISTERIO.	**Entrega producto Si __NO X** **Evidencia verificable: N/A**
7	Cumplir con las normas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, según la normatividad vigente.	**Descripción del avance**: El personal de la interventoría cuenta con la dotación necesaria para realizar su labor
		Entrega producto Si ____No__X **Evidencia verificable: N/A**
8	Certificar la realización de los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), y en caso de incumplimiento total o parcial, responder por las consecuencias y sanciones que disponga la ley	**Descripción del avance**: El personal de la interventoría se encuentra al día con sus aportes al sistema de seguridad social (planillas)
		Entrega producto Si __X_ No_____ **Evidencia verificable: Planillas de pago febrero 2025**
9	EL CONTRATISTA se obliga a no subcontratar las actividades propias del objeto contractual, salvo, que dentro del desarrollo de la propuesta se haya previsto disponer de recurso humano, para lo cual deberá tener en cuenta que no podrá vincular menores de edad, dando aplicación a la Resolución No. 1677 de 2008 del Ministerio de Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños	**Descripción del avance**: No se ha realizado ninguna subcontratación
		Entrega producto Si __ No_____X **Evidencia verificable: N/A**
10	Velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en debida forma tanto del contratista, como de las plantas de producción de proveedores, oficinas, establecimientos educativos a visitar y todos aquellos lugares o medios de transporte que determinen necesaria la presencialidad para la ejecución del contrato	**Descripción del avance**: se verifica con los protocolos de bioseguridad del contratista
		Entrega producto Si ___ No X **Evidencia verificable: N/A**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

11	Entregar a los equipos de trabajo el kit de bioseguridad establecido en el presupuesto, verificando y garantizando su utilización y disponibilidad en la totalidad del plazo de ejecución del contrato.	**Descripción del avance**: Al equipo que se encuentra en planta y en campo se le entrega el equipo de seguridad correspondiente a su labor
		Entrega producto Si _ No X_____ **Evidencia verificable: N/A**
12	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.	**Descripción del avance**: La interventoría asume la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato. Con la aprobacion del lote No 4 de cada uno de los items contratados
		Entrega producto Si __No X **Evidencia verificable:**
13	Dar respuesta a las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias, que sean asignadas, en los términos establecidos en la ley.	**Descripción del avance**: Durante este periodo no se han presentado peticiones, quejas, reclamos o sugerencias
		Entrega producto Si ____No _X___ **Evidencia verificable: N/A**
14	14. Mantenerse actualizado en los términos, condiciones, manuales y guías del SECOP ll, de la página de Colombia Compra Eficiente y operar dicha plataforma en lo que le corresponde, con responsabilidad y transparencia.	**Descripción del avance**: Después de aprobadas las pólizas se cargaron al SECOP
		Entrega producto Si No X **Evidencia verificable:**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

15	15. Verificar el cumplimiento de la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 de 2019, en especial lo referente al registro de antecedentes en bases de datos de la Policía Nacional con relación a agresores sexuales.	**Descripción del avance**: Todos los colaboradores de Alianza integral de Proyectos cuentan con la consulta de inhabilidades por delitos sexuales con concepto negativo **Entrega producto Si ___No ___X_** **Evidencia verificable: N/A**
16	16. No vincular a la ejecución del contrato menores de edad.	**Descripción del avance**: Alianza integral de Proyectos cumple con la legislación laboral colombiana **Entrega producto Si ___No X___** **Evidencia verificable: N/A**
17	17. El contratista se obliga al respeto por los derechos humanos y, en especial, a no ejercer ninguna forma de violencia contra las mujeres y basada en género, actos de racismo o discriminación, y a cumplir a cabalidad con el sistema o Protocolo que se establezca para su prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contra las mujeres y basadas en género y/o discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación.	**Descripción del avance**: Alianza integral de Proyectos es defensora de la constitución política de Colombia **Entrega producto Si ___ No_____** **Evidencia verificable: N/A**
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:		
OBLIGACIONES DE CARÁCTER JURÍDICO		
1	Aplicar y tener en cuenta durante la ejecución del presente contrato, los aspectos regulatorios legales y contractuales relacionados con los contratos de dotación y el mecanismo de pago de obras por impuestos, así como el manual de interventoría del ministerio de educación	**Descripción del avance**: Durante el periodo del presente informe la interventoría aplico y tuvo en cuenta los aspectos regulatorios legales y contractuales relacionados con los contratos de dotación y el mecanismo de pago de obras por impuestos, así como el manual de interventoría del ministerio de educación. **Entrega producto Si ___No _X__**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

		Evidencia verificable: N/A
2	Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos – órdenes de compra suscritos para la adquisición de las dotaciones descritas en el proyecto para las instituciones educativas que serán beneficiarias por este.	**Descripción del avance**: Se firmo el acta de inicio **Se verifican los documentos correspondientes de Manufacturas Sumapaz para la primera facturación** **Entrega producto Si X No_____** **Evidencia verificable:** Actas de inicio Contrato de Suministros e Interventoría Correo de aprobación por parte de la interventoría del Ministerio de Educación a la gerencia del contrato de dotación de mobiliario a Buenaventura Carpeta Orden de bienes
3	Verificar que el(los) contrato(s) objeto de interventoría se desarrolle(n) dentro del plazo, las condiciones y los valores establecidos.	**Descripción del avance**: La ejecución del contrato se viene realizando de acuerdo con la programación del contrato **Entrega producto Si X No_____ Evidencia verificable: Carpeta Actas de Entrega**
4	Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, o cualquier otra modificación a las órdenes de compra, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones técnicas, jurídicas y administrativas pertinentes y el plan de reacción. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.	**Descripción del avance**: **Se emitió concepto a solicitud de reajuste de valor al contrato de suministro** **Entrega producto Si No X** **Evidencia verificable:** **Oficio No. 753-016**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

5	Estudiar a profundidad los contratos de dotación y sus anexos, los términos de referencia y sus anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecución de cada uno de los proyectos.	**Descripción del avance**: Se Estudia de manera meticulosa los contratos de dotación y sus anexos, los términos de referencia y sus anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecución de cada uno de los proyectos.
		Entrega producto Si ____No_X_ **Evidencia verificable: N/A**
6	Actuar de manera diligente y oportuna evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las Partes.	**Descripción del avance**: Por el momento del presente periodo no se han presentado situaciones que generen mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las Partes
		Entrega producto Si ____No_X_ **Evidencia verificable: N/A**
7	Velar porque la ejecución de las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la interventoría no ocasione daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE, la ENTIDAD CONTRATANTE y a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE	**Descripción del avance**: Durante este periodo no se han presentado daños a terceros
		Entrega producto Si ____No X **Evidencia verificable: N/A**
8	Atender las quejas, peticiones, reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los contratistas objeto de Interventoría, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.	**Descripción del avance**: Durante este periodo no se han presentado quejas, peticiones, reclamaciones, sugerencias
		Entrega producto Si _____No X_____ **Evidencia verificable: N/A**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

9	Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de dotación, comunicándole oportunamente esta circunstancia a LA GERENCIA Y A LA ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y proponer el mecanismo de solución que corresponda y resulte más eficaz para la correcta y oportuna ejecución de los proyectos	**Descripción del avance**: Durante el presente periodo no se han presentado ningún incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de dotación **Entrega producto Si ___No_____** **Evidencia verificable: N/A**
10	Asegurar la adecuada documentación y archivo documental durante la ejecución de los proyectos para esto se almacenará la información soporte de cada uno de los informes de Interventoría y documentación alcance del proyecto en el repositorio de información que disponga el Ministerio de Educación Nacional y se otorgará permisos de acceso únicamente al coordinador de Interventoría.	**Descripción del avance**: Hasta el momento no se han generado archivos que requieran la custodia del MEN **Entrega producto Si ___No___X** **Evidencia verificable: N/A**
11	Elaborar y suscribir juntamente con la GERENCIA Y EL CONTRATISTA DE DOTACIÓN, las actas de inicio, ejecución, suspensión, reanudación o cualquier otro documento en el que se deje constancia de la ocurrencia de eventos que afecten el desarrollo de las actividades del proyecto objeto de la interventoría. Todo documento suscrito por la interventoría infiere la obligatoriedad del mismo para éste.	**Descripción del avance**: Se suscribió el acta de inicio el 13 de enero de 2025 **Entrega producto Si ___No X** **Evidencia verificable: N/A**
12	Exigir a los proveedores las pólizas que se establezcan en el respectivo contrato de dotación en el porcentaje y vigencia de plazo establecido de acuerdo con la reglamentación nacional.	**Descripción del avance**: La interventoría exigió al proveedor las pólizas respectivas. **Entrega producto Si __NO X Evidencia verificable: pólizas contratista**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

13	Asesorar a la gerencia y a la Entidad Nacional Competente en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo del proyecto.	**Descripción del avance**: La interventoría está disponible para lo que requiera el correcto desarrollo del contrato, durante el presente periodo no se requirieron asesorías jurídicas.
		Entrega producto Si ____No X **Evidencia verificable: N/A**
14	Avalar las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extraña que afecten el cumplimiento del cronograma general del proyecto aprobado por la Entidad Nacional Competente.	**Descripción del avance**: La interventoría está disponible para lo que requiera el correcto desarrollo del contrato, durante el presente periodo no se presentaron peticiones o quejas
		Entrega producto Si ____No X___ **Evidencia verificable: N/A**
15	Emitir dentro del término que para el efecto señale el Contribuyente una certificación en donde conceptúe sobre sobre las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la situación de fuerza o caso fortuito en cumplimiento de lo establecido en el art. 1.6.5.3.5.2. del decreto 1915 de 2017.	**Descripción del avance**: La interventoría está disponible para lo que requiera el correcto desarrollo del contrato, durante el presente periodo no se presentaron situaciones o casos fortuitos
		Entrega producto Si __ No X_____ **Evidencia verificable: N/A**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO:		
1	Entregar a LA GERENCIA la programación de pagos de los contratistas de dotación y de interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio	**Descripción del avance**: Se realizo la entrega de la documentación requerida **Entrega producto Si __No** **Evidencia verificable:** Orden de Bienes
2	Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación de los documentos que alleguen los proveedores para tal efecto.	**Descripción del avance**: Durante este periodo se está realizando un ajuste al valor del contrato de dotación por parte de CENIT a favor del contratista y se está preparando y organizando la documentación para generar la factura de la orden de bienes No.2 **Entrega producto Si __No X** **Evidencia verificable:**
3	Revisar y aprobar toda la información soporte de cada orden de compra y facturas presentadas por los proveedores.	**Descripción del avance**: En este periodo se realiza la revisión de la documentación respectiva al pago de la orden de bienes No 4 **Entrega producto Si _ No X** **Evidencia verificable:**
4	Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos parciales y final de los contratos objeto de interventoría del contrato, previo visto bueno del supervisor y aprobación de la gerencia.	**Descripción del avance**: Se envía correo de aprobación a la Gerencia del contrato del proceso de facturación de Manufacturas Sumapaz de la orden de bienes No.4 **Entrega producto Si __X__No ____** **Evidencia verificable: Correo 753 /040**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

5	Radicar dentro de los cinco (5) primeros días del mes correspondiente al trámite de pago las facturas electrónicas o documentos equivalentes, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos por LA GERENCIA y la autorización correspondiente de parte de la SUPERVISIÓN	**Descripción del avance**: En este periodo se realiza la revisión de la documentación respectiva al pago de la orden de bienes No 4
		Entrega producto Si ___No X **Evidencia verificable: N/A**
6	Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos a los proveedores del proyecto.	**Descripción del avance**: N/A
		Entrega producto Si __N o X____ **Evidencia verificable:**
7	Contar con una oficina, la cual deberá estar apropiadamente equipada con escritorios, sillas, archivadores, mesas de trabajos, faxes, escáner, computadores, impresoras, sistemas de comunicaciones para llamadas nacionales, cámaras digitales, útiles de oficina, papelería y demás implementos necesarios para ejecutar el CONTRATO en las condiciones pactadas.	**Descripción del avance**: Alianza Integral de Proyectos cuenta con una sede administrativa en la TV 55 A 115 A 06 en la ciudad de Bogotá
		Entrega producto Si __N o X **Evidencia verificable: N/A**
8	Motivar el trámite de las posibles modificaciones que sean necesarias en la ejecución de los contratos y validar el impacto en el presupuesto general del proyecto	**Descripción del avance** Se presenta solicitud para el reajuste del valor del contrato por parte de Manufacturas Sumapaz, además se envía comunicado y sostiene reunión con el Ministerio de Educación para definir la permanencia del personal de interventoría en planta y en campo
		Entrega producto Si X___No **Evidencia verificable: Comunicado No 753-036**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

OBLIGACIONES TECNICAS DOTACION MOBILIARIO		
1	Realizar con plena autonomía técnica, financiera y con sus propios medios la prestación de servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico para cada uno de los proyectos – órdenes de compra de dotación celebrado(s) y aquellos requeridos para el cumplimiento del objeto del proyecto para las dotaciones definidas en el proyecto BPIN 20230214000016, el presente CONTRATO y en sus respectivos anexos. Para lo anterior, deberá conocer y apropiar la documentación del proyecto que soporta el cumplimiento de las obligaciones y los productos establecidos en el contrato – orden de compra de los proveedores, dentro de los tiempos establecidos en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos, el cronograma del proyecto y el manual operativo 2.0 de obras por impuestos o el que este vigente.	**Descripción del avance**: La interventoría conoce y exige el cumplimiento del manual de dotaciones escolares, y realizo el control respectivo en la planta del proveedor a cada uno de los prototipos del mobiliario a entregar **Entrega producto Si __No X** **Evidencia verificable: Aprobación Prototipos entregado antes del informe mensual No. 1, Revisión y aprobación de lotes de envío revisados y aprobados en el informe No. 1**
2	Conocer y exigir el cumplimiento del Manual de Dotaciones Escolares y sus actualizaciones (anexo técnico), para lo cual deberá efectuar controles sobre la fabricación de los elementos a entregar directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicación en la planta del proveedor de un (1) profesional que certificará la calidad del mobiliario y los despachos con el fin de corroborar el ajuste de estos a las especificaciones técnicas.	**Descripción del avance**: *La interventoría conoce y exige el cumplimiento del manual de dotaciones escolares, y realizo el control respectivo en la planta del proveedor a cada uno de los prototipos del mobiliario a entregar* **Durante el mes de mayo se realizó por parte de la interventoría la revisión y aprobación de 11026 unidades de mobiliario escolar correspondientes a la orden de bienes No.4 IE Jose Maria Cabal (4 sedes), IE Vasco Nuñez Balboa (5 sedes), IE Nachasin (4 sedes) y IE Agropecuario Jose Maria Cordoba (5 sedes) y IE Fransisco Jose De Caldas para la ODB No 4 se lleva una entrega total de 11026 unidades despachadas y entregadas a todas las sedes de cada institución.** **Entrega producto Si X__No** **Evidencia verificable:** Carpeta Toma de muestras mayo 2025 Sumapaz lote 5 Carpeta Actas de Entregas
3	Conciliar, ajustar y entregar dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del acta de inicio, los cronogramas de entregas de proveedores de dotación de mobiliario escolar, para la llegada oportuna de los elementos objeto de interventoría	***Descripción del avance**: Durante el periodo se realizaron varias mesas de trabajo entre el contratista y la interventoría para lograr planificar la logística de entregas en el municipio de Buenaventura* ***Entrega producto Si No _X*** Evidencia verificable: Cronograma de producción y Cronograma de entregas

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

4	Presentarle al supervisor del proyecto un plan de trabajo para el desarrollo de la prestación de servicios de interventoría, la metodología del seguimiento, el cronograma de actividades y cronogramas de entregas de las dotaciones contempladas y/o productos alcance del proyecto, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles después de la firma del acta de inicio	**Descripción del avance**: El 17 de enero de 2025, se remite el Plan de trabajo de la Interventoría, con el fin de planificar, ordenar, dar seguimiento y ejecutar el objeto del contrato **Entrega producto Si X___No** **Evidencia verificable:** Plan de trabajo Comunicado No.753-005
5	Advertir oportunamente al contribuyente y a la supervisión del contrato, si las contrataciones adelantadas para el cumplimiento del objeto del proyecto no son concordantes con la viabilidad técnica emitida por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de ser subsanadas oportunamente dentro del plazo de ejecución del proyecto.	**Descripción del avance**: No se presenta ningún inconveniente con las contrataciones adelantadas **Entrega producto Si ____No _X___** **Evidencia verificable: N/A**
6	Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de producción de cada uno de los ítems dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a la firma del acta de inicio al proveedor. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la producción y el inicio de los despachos como máximo en los siguientes cinco (5) días hábiles previos a la aprobación de los prototipos de producción. En caso de que el proveedor requiera ajustar los plazos de entrega pactados en el acta de inicio en el tiempo de ejecución, el proveedor debe notificar a la interventoría y llegar a común acuerdo para acordar un plazo nuevo, lo que será comunicado a la GERENCIA y la SUPERVISIÓN.	**Descripción del avance**: la verificación y pruebas realizadas a los prototipos se realizaron entre el 14 y 17 de enero de 2025, **Entrega producto Si X___No** **Evidencia verificable:** Se remitió la documentación de aprobación de prototipos a la supervisión de Ministerio el día 17 de enero de 2025 mediante el comunicado No. 753-006
7	Realizar, verificar y avalar mediante un acta antes del despacho en planta las pruebas realizadas al mobiliario por cada uno de los lotes, según el anexo técnico Manual de dotaciones escolares.	**Descripción del avance**: A la fecha se han realizado el despacho **de 46753 unidades de mobiliario escolar correspondientes a la orden de bienes No.1, No.2, No.3 y No.4 productos que se han verificado y avalado de manera individual, garantizando su dimensionamiento y calidad** **Entrega producto Si X__No** **Evidencia verificable: Carpeta Toma de muestras No4**
8	Verificar que los bienes hayan sido empacados de acuerdo con lo determinado en el Manual de Dotaciones Escolares y entregados en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectuoso.	**Descripción del avance**: **A la fecha se han realizado el despacho 46753 unidades de mobiliario escolar correspondientes a la orden de bienes No.1, No.2, No.3 y No.4, las cuales se han revisado de manera individual comprobando su empaque y almacenamiento de manera adecuada** **Entrega producto Si ____No X** **Evidencia verificable: Acta de empaque y embalaje No.1, No.2, No.3 y No.4**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

9	Informar oportunamente a la SUPERVISIÓN los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de sanciones, según lo establecido en los contratos objeto y sugerir la imposición de sanciones pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su aplicación, para ello deberá: • Revisar y conceptuar los elementos jurídicos para efectos de solicitar el inicio del debido proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, incumplimientos y demás actuaciones contractuales. En este mismo sentido deberá entregar la relación de los documentos, pruebas o verificaciones necesarias para determinar la viabilidad jurídica de la sanción a imponer. • Presentar fórmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a presentarse en curso de los contratos objeto. • Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento, así como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar • Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de incumplimiento de las posibles situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeño efectivo de las obligaciones. • Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos a los proveedores.	**Descripción del avance**: Durante el periodo no se han presentado atrasos por ninguno de los componentes **Entrega producto Si ___No X___** **Evidencia verificable: N/A**
10	Entregar informes de todas las pruebas realizadas a cada uno de los lotes autorizados para despachar del mobiliario escolar de acuerdo con lo descrito anteriormente, con registro fotográfico de las mismas	**Descripción del avance**: Se realizaron las respectivas pruebas de acuerdo con el manual del Ministerio **Entrega producto Si ___No ___X_** **Evidencia verificable: Carpeta Toma de muestras No 4**
11	Rechazar los bienes que no cumplan con lo establecido en el anexo técnico manual de dotaciones escolares, sus actualizaciones y complementos.	**Descripción del avance**: A la fecha la interventoría de acuerdo con su inspección individual de los productos ha realizado diversos rechazos que han sido reemplazados por el contratista antes del despacho, en especial superficies rayadas o mareadas o el estampado no legible o con deformaciones. **Entrega producto Si ___No __X** **Evidencia verificable: N/A**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

12	Verificar, en caso de cambio, que los bienes sean reemplazados por el contratista dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud que realice el interventor y que los elementos cambiados cumplan con lo establecido por las normas técnicas y con el Manual de dotaciones escolares antes mencionadas.	**Descripción del avance**: El contratista Manufacturas Sumapaz, inmediatamente reemplaza los productos rechazados por unidades que cumplen con las especificaciones del manual **Entrega producto Si ___ No X** **Evidencia verificable:**
13	Aprobar antes del primer despacho de cada uno de los proveedores que se cuente con los manuales de uso, mantenimiento y garantía; verificar que el proveedor entregue una copia impresa de estos documentos por sede beneficiada. Los manuales deberán contener la información relativa a todos los elementos a suministrar, teniendo en cuenta por los menos lo siguiente: a. Cuidados y parámetros de uso. b. Posibilidades de reposición de partes y piezas. c. Identificación del fabricante, indicando nombre, dirección, teléfono y ciudad .	**Descripción del avance:** Se realiza la verificación y ajuste y aprobación del manual de garantía y mantenimiento de cada uno de los productos a entregar **El contratista al finalizar la entrega e instalación del mobiliario en la sede suscribe una remisión de entrega con el rector del colegio, en la que consta la entrega del manual de uso, mantenimiento y garantía Además, el personal del contratista deja en el colegio una serie de repuestos para los accesorios que resulten dañados durante el transporte o por si necesitan en el futuro (Tapones, niveladores, superficies, espaldares)** **Entrega producto Si ___ No X** **Evidencia verificable: Remisión aprobación Comunicado No 753-013** **Carpeta ACTAS DE ENTREGA**
14	Verificar para el proveedor antes del inicio de la producción y durante el proceso, que los materiales e insumos cumplan con las especificaciones y espesores de los bienes objeto de los contratos y sean completamente nuevos, no remanufacturados.	**Descripción del avance**: el profesional y técnico en planta realizan permanentemente la verificación de cada una de las materias primas para los bienes a entregar **Entrega producto Si _X__ No_____** **Evidencia verificable: Registro fotográfico**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

15	Verificar que el empaque y embalaje del mobiliario escolar garantice su conservación durante el transporte a los lugares de destino.	**Descripción del avance**: **A la fecha se han realizado el despacho de 46753 unidades de mobiliario escolar correspondientes a la orden de bienes No.1, No.2, No.3 y No.4, las cuales se han despachado en 104 camiones que se preparan con Cartón, Madera, Plástico de burbujas y vinilpel para garantizar la integridad del mobiliario, a su vez se aseguran con Zuncho y eslingas para evitar el movimiento excesivo de los productos**
		Entrega producto Si _X_ No _____ **Evidencia verificable: EMPAQUE Y EMBALAJE LOTE No 4 MAYO 2025**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

16	Ejercer control sobre los proveedores, con el fin de garantizar la entrega de mobiliario escolar en los sitios específicos (sede beneficiada), cantidades, materiales y con los procedimientos establecidos, verificando por medio de visitas en sitio.	**Descripción del avance**: **Durante el mes de mayo se realizó por parte de la interventoría la revisión y aprobación de 11026 unidades de mobiliario escolar correspondientes a la orden de bienes No.4 IE Jose Maria Cabal (4 sedes), IE Vasco Nuñez Balboa (5 sedes), IE Nachasin (4 sedes) y IE Agropecuario Jose Maria Cordoba (5 sedes) y IE Fransisco Jose De Caldas para la ODB No 4, se lleva una entrega total de 11026 unidades despachadas y entregadas, en los cuales contamos con la presencia del Ing. Nesken Mantilla, oriundo de la ciudad de Buenaventura para la verificación del mobiliario en sitio** **Entrega producto Si _X_ No _____** **Evidencia verificable: Carpeta Actas de Entrega Dotación No.4**
17	Verificar la entrega oportuna distribución en cada establecimiento educativo y la correcta instalación de las dotaciones y/o productos de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato de dotación, reportar los atrasos e inconvenientes y definir las recomendaciones, acciones correctivas y de mejora para la ejecución de los contratos. Así mismo, solicitar a los contratistas de dotación las actas de entrega originales y revisar todos los componentes técnicos y jurídicos de estas. Estas actas deben estar firmadas por el Rector de la IE o quien delegue por escrito en documento físico (en los casos donde instituciones estén ubicadas en zonas de difícil acceso y orden público) y el contratista.	**Descripción del avance**: A la fecha se ha cumplido con toda la programación del cronograma con respecto a la orden de bienes No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4, con un adelanto de dos semanas en el proceso de despachos y entregas **Entrega producto Si X___No _____** **Evidencia verificable: Carpeta Actas de Entrega Dotación No.4**
18	Verificar y aprobar la forma y el contenido de las actas originales solicitadas a los contratistas respecto de las dotaciones para determinar que están firmadas por el rector de la institución educativa o quien delegue, donde se certifique recibo a satisfacción por parte de la sede educativa	**Descripción del avance** Se verifican las actas de entrega con su respectiva suscripción del rector, el contratista y la interventoría **Entrega producto Si X___No _____** **Evidencia verificable: Carpeta Actas de Entrega Dotación No.4**
19	Realizar a partir de la firma del acta de inicio cada quince (15) días un comité seguimiento técnico donde reportar y verificar los avances de los contratos, así como efectuar recomendaciones, observaciones, requerimientos, compromisos y demás acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto de las órdenes de compra. Además, verifique el cronograma de despacho y entregas de cada una de las órdenes de compra de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho.	**Descripción del avance**: Se realiza comité técnico No 14, el día 27 de mayo de 2025 de manera virtual en el cual se presenta por parte de la interventoría los avances realizados por parte del contratista Manufacturas Sumapaz, hasta la fecha del comité se había entregado la totalidad de la sede de la Institución Educativa La Anunciación, el porcentaje de avance a la fecha era de 100% en la totalidad del contrato, las cifras presentadas son corroboradas por TF Interventores. El día 11 de marzo de 2025 se realiza Comité técnico No.5 de

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

	Así mismo, convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periódica con los proveedores de cada uno de los contratos u órdenes de compra.	manera virtual, la interventoría presenta el avance de la producción, despacho y entregas del mobiliario escolar en la ciudad de Buenaventura, que corresponde a la orden de bienes No. 2, con 39.7% de las entregas, el proceso se encuentra hasta la fecha de la anteriormente mencionada reunión en un 66.7%, lo que indica que el contrato tiene una semana aproximadamente de adelanto con lo programado El comité técnico No.6 se realiza de manera virtual el día 18 de marzo del presente año, la interventoría presente el avance de ejecución del contrato de mobiliario para el distrito de Buenaventura, según reportes se cuenta con un 44.9% del contrato y un 87.6 de la orden de bienes No 2 con el porcentaje restante en tránsito y próximo a entregarse en la ciudad vallecaucana Para el día 18 de marzo de 2025 se inicia el despacho de la orden de bienes No 3 con la Institución Educativa Pablo Emilio Carvajal en sus ocho sedes con 5436 unidades El 27 de mayo de 2025 se realiza el ultimo comité técnico semanal del mes, manteniendo un dialogo constante con TF ingenieros se concuerda con las cifras de ejecución del contrato con Manufacturas Sumapaz, las cuales nos indican que se lleva el 52.1% del total del contrato, la orden de bienes No 2 ha sido entrega a satisfacción en su totalidad y para la orden de bienes No 3 se cuenta con el 14.5% de muebles en las instituciones educativas
		Entrega producto Si X__No _____ **Evidencia verificable: Acta de comité No. 04** **Acta de comité No. 05** **Acta de comité No. 06** **Acta de comité No. 07** **Acta de comité No. 08**
20	Programar y llevar a cabo como mínimo, un (1) comité mensual con la Gerencia y Supervisión, o en la frecuencia que sea requerida por la SUPERVISIÓN de acuerdo con la necesidad del proyecto, con el fin de verificar los avances del proyecto, así como efectuar recomendaciones, observaciones, requerimientos, compromisos y demás acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto de este. Estos comités deben quedar debidamente documentados mediante actas suscritas por las partes.	**Descripción del avance**: **El comité mensual se realiza el jueves 27 de mayo de 2025 de manera virtual con la participación de CENIT, CB Ingenieros, TF interventoría, Manufacturas Sumapaz y Alianza Integral de Proyectos**
		Entrega producto Si X__No _____ **Evidencia verificable: Acta comité mensual No 4**
21	Verificar la instalación del ítem de tablero en las sedes educativas beneficiadas, si no es posible se debe presentar autorización firmada en físico por el rector que certifique la razón y aceptación de la no instalación.	**Descripción del avance**: **A la fecha se han entregado e instalado 634 tableros en**: OBD No 1: 189 unidades, ODB No 2: 133 unidades, **OBD No 3: 161 unidades y OBD No 4: 151 unidades, se tiene el avance final de mes con el 100% de unidades instaladas.**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

		Entrega producto Si X No **Evidencia verificable: Registro fotográfico y actas de entrega de bienes.**
22	Realizar las visitas para garantizar la entrega de bienes con el fin de verificar en cada una de las sedes beneficiarias según lo pactado para este contrato, con el fin de verificar y entregar los soportes documentales y evidencias que den constancia del cumplimiento; diligenciar los formatos establecidos con el resultado de cada visita de verificación en sitio, que contenga detalle de la dotación entregada, estado de entrega de este y registro fotográfico de cada una de las sedes beneficiadas. **Nota:** La interventoría tiene un tiempo máximo de 10 días hábiles para realizar la verificación en sitio posterior a la entrega de la dotación por parte del proveedor.	**Descripción del avance**: La interventoría realiza la verificación de los productos inmediatamente son descargados del transporte, garantizando la calidad de los productos antes de la entrega e instalación en el colegio **Entrega producto Si X No _____** **Evidencia verificable: Carpeta Actas de Entrega Dotación No.4**
23	Informar a LA GERENCIA y al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda configurar conflicto de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.	**Descripción del avance**: A la fecha de hoy no se han presentado conflictos de intereses **Entrega producto Si ____No X** **Evidencia verificable: N/A**
24	La coordinación técnica debe acompañar a la supervisión en las visitas de seguimiento a los establecimientos educativos para revisión de estado de ejecución del proyecto. Para el caso de los proyectos de dotaciones se seleccionará aleatoriamente algunas sedes para realizar las visitas de seguimiento, en tres (3) visitas.	**Descripción del avance**: **Entrega producto Si X No _____** **Evidencia verificable: Oficio 753-049 PROGRAMACIÓN PROPUESTAS VISITA MAYO 21 Y 22 IE BUENAVENTURA**
	Entregar a la GERENCIA y al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educación Nacional los siguientes informes de interventoría: • **Informe mensual de Interventoría por cada contrato objeto**: Presentar de forma mensual un informe de interventoría, al mismo se debe adjuntar el informe de actividades mensual presentado por cada contratista objeto, revisado y aprobado por la firma interventora en el que se dé	**Descripción del avance**: Se remite informe mensual No 5 753-044 REMISIÓN INFORME MENSUAL No.5 INTERVENTORIA Aprobado: Radicado No. 2025-EE-111302 2025-04-25 07:18:46 p. m Aprobación informe 5 **Entrega producto Si X No _____** **Evidencia verificable:** informe mensual No 5

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

	cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de cada contratista objeto dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes.	
25	• **Informe mensual de cumplimiento de actividades del INTERVENTOR:** Presentar de forma mensual un informe de interventoría al supervisor del contrato. Este informe debe incluir el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato de Interventoría en sus componentes técnico, administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. **Nota:** El informe debe contener como mínimo los numerales relacionados en el anexo "a) Requisitos informe mensual", así como, el anexo "b) Matriz reporte proyectos OXI". De la misma manera, los informes deben ser acumulativos período a período, es decir, cada informe debe dar parte de los avances totales de la ejecución siendo evidenciable el período de reporte tanto del contrato de interventoría, así como, los contratos objeto de la interventoría.	**Descripción del avance**: Se remite informe mensual No 5 **Entrega producto Si ____No __X__** **Evidencia verificable:** informe mensual No 5 Se anexa informe No. 5 el cual contiene la información solicitada. Se Anexa formato No. 24 matriz de reporte proyectos OXI
	• **Informe final de Interventoría**: Presentar un informe final de Interventoría especificando acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente, elaborar y tramitar el acta de liquidación de los contratos objeto de interventoría junto con los documentos soporte dentro de los (30) días siguientes a la terminación de estos y con anterioridad a la radicación del último pago establecido en la forma de pago.	**Descripción del avance**: a la fecha el contrato se encuentra finalizado, pendiente por facturación de la orden No 4. **Entrega producto Si __X_ No _____** **Evidencia verificable: Correspondencia enviada**
26	Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecución de los contratos u órdenes de compra, dirigidas a los representantes legales de los contratistas de dotación con el objetivo de garantizar la efectiva ejecución de los contratos y copiar a la GERENCIA y a la SUPERVISIÓN.	**Descripción del avance**: Se mantiene comunicación constante por parte de la interventoría con cada uno de los actores involucrados en la ejecución del contrato

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

		Entrega producto Si X__No **Evidencia verificable: Correspondencia enviada**
27	Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la información, productos y servicios de los que tenga conocimiento en desarrollo y ejecución del CONTRATO. El uso de la información para efectos diferentes a los establecidos en este CONTRATO requiere autorización previa y escrita por parte de la GERENCIA y del SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educación Nacional.	**Descripción del avance**: se mantiene confidencialidad y plena reserva de toda la información, productos y servicios de los que tenga conocimiento en desarrollo y ejecución del CONTRATO
		Entrega producto Si ____No __X__ **Evidencia verificable: N/A**
28	Llevar un registro actualizado de las entregas de cada orden de compra y mantenerla a disposición de LA GERENCIA y de la SUPERVISIÓN y hacer entrega de esta una vez finalizado en contrato.	**Descripción del avance**: A la fecha de hoy, se mantiene un contacto permanente con cada uno de los actores que hacen parte del contrato de dotación de mobiliario, se realiza la verificación de las actas, se corrobora los empaques y despachos, así mismo se entrega el seguimiento semanal.
		Entrega producto Si __X_No **Evidencia verificable:** Presentación semanal de comités de avance los días 6, 13, 20, 27 del mes de mayo.
29	Contratar y mantener el personal mínimo requerido para la correcta ejecución del CONTRATO y garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de necesitar el cambio de alguna de las personas propuestas, deberá realizarlo por un perfil igual o superior que la persona ofrecida en la propuesta. Este cambio deberá ser autorizado por el SUPERVISOR. La rotación del personal no puede superar el 50% del personal presentado inicialmente.	**Descripción del avance**: La interventoría cuenta con personal idóneo para ejecutar de manera correcta el contrato en mención
		Entrega producto Si __X_No _____ **Evidencia verificable: Planillas de Aportes al SGSS**
30	Contratar de manera preferente al personal de campo que apoye las labores de interventoría, oriundos de la región donde se ejecutará el proyecto. En caso de que esto no sea posible, se contratará al perfil idóneo para apoyar las labores correspondientes indistintamente de su residencia.	**Descripción del avance** A la fecha de hoy se han realizado entregas en 64 sedes educativas en su totalidad, contemplando las ordenes de bienes 1, 2, 3 y 4 en la orden de bien No. 4 se tiene avance en las cinco instituciones, **JOSÉ MARÍA CABAL 100%, VASCO NUÑEZ BALBOA 100%, AGROPECUARIO JOSÉ MARÍA CORDOBA 100%, FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 100%.** En las cuales ha estado presente nuestro ingeniero Nesken Mantilla, oriundo de la ciudad de Buenaventura quien representa a Alianza Integral de Proyectos en los procesos de recepción y entrega del mobiliario
		Entrega producto Si __X_No _____ **Evidencia verificable: se anexa reportes de entregas y actas firmadas por el personal, asi mismo la planilla de seguridad social y parafiscales que garantice el proceso en sitio.**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

31	Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas de dotación frente al Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de autorizar los pagos y solicitar modificaciones durante la vigencia del CONTRATO, o al momento de liquidarlo, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas, en concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.	**Descripción del avance**: Se envía correo de aprobación de la documentación del contratista para la orden de bienes No 1, 2, de la orden 3 y de la orden No 4 se encuentra en proceso de aprobación para la facturación. **Entrega producto Si __X__No ____** **Evidencia verificable:** **El contratista Manufacturas Sumapaz hace entrega de documentación frente al sistema de seguridad social y pago de parafiscales, para la autorización de pagos.** **753-032 REMISION Aprobación FACTURACIÓN ODB No 1 CONTRATO MARCO PARA LA COMPRA DE BIENES No 8000009092 OBJETO Suministro e instalación de dotación de Mobiliario Escolar CENIT** **753-040 REMISION APROBACION DOCUMENTACION Y ACTAS DE ENTREGA ORDEN DE BIENES N 2** **753-050 REMISION APROBACION DOCUMENTACION Y ACTAS DE ENTREGA ORDEN DE BIENES N 3** **753- REMISION APROBACION DOCUMENTACION Y ACTAS DE ENTREGA ORDEN DE BIENES N 4**
32	EL INTERVENTOR será el responsable de verificar la veracidad de la información registrada por la gerencia del proyecto en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública -SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP, en aspectos tales como: • Actividades de la cadena de valor del proyecto • Reporte Financiero por cada una de las vigencias que contemple el proyecto. • Reporte de indicadores de producto del proyecto • Reporte de indicadores de gestión del proyecto De la verificación a la actualización e información requerida, deberá dar cuenta en los informes mensuales de interventoría.	**Descripción del avance**: la interventoría ha realizado seguimiento a los datos registrados en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública -SPI **Entrega producto Si ____No __X__** **Evidencia verificable: N/A**
33	Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de interventoría, así como las erogaciones necesarias para la ejecución de este. Es entendido que todos los gastos han sido estimados por el interventor al	**Descripción del avance**: la interventoría asume el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de interventoría

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

	momento de la presentación de su propuesta económica.	**Entrega producto Si _X_ No _____** **Evidencia verificable: N/A a la fecha no se tiene documento de pagos, debido a que no se ha podido facturar ningún mes a la fecha del informe. Per o si se tienen las pólizas respectivas cargadas al SECOP. SE ANEXA INFORMACIÓN RESPECTIVA.**
34	Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato y que no se contemplen dentro de las obligaciones ya señaladas.	**Descripción del avance**: La interventoría realizara todas las obligaciones que se requieran para el correcto desarrollo del contrato y que no se contemplen dentro de las obligaciones ya señaladas.
		Entrega producto Si ____No __X__ **Evidencia verificable: N/A**

5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda al contribuyente CENIT seguir con esta buena labor ya que esto genera en los beneficiaros más comodidades para lograr aumentar el rendimiento escolar de la región
- El acompañamiento del Ministerio Nacional de Educación es importante para el cumplimiento y seguimiento de la ejecución de este tipo de contratos.
- Se recomienda realizar el ajuste al valor del contrato con base en los incrementos estipulados por la ley.
- Se recomienda ajustar la permanencia de los equipos en planta y en campo de la interventoría del Ministerio de Educación, debido a que se encuentran laborando por el tiempo de la licitación, sin embargo, se encuentran en la mitad del proceso de fabricación y entrega por parte del contratista

CONCLUSIONES

- Se lograron acuerdos entre las partes para ajustar las ordenes de bienes para el tema de los pagos al contratista
- Se logró la ubicación y el contacto de cada uno de los rectores de las instituciones beneficiadas, lo cual fue de gran ayuda para poder realizar la programacion de los desplazamientos a los sitios de entrega.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

- Cada uno de los elementos que componen el mobiliario entregado cumplieron con los estándares establecidos por el ministerio de Educación, esto se ve reflejado en el flujo continuo de los despachos, sin que la interventoria genere rechazos constantes de los productos fabricados
- El trabajo mancomunado entre el contratista y la interventoria ha logrado que se lo adelante en la programacion, aproximadamente 13 dias, logros que reflejan en la poblacion beneficiada.
- Gracias a la adecuada gestion de cada uno de los actores del convenio y la capacidad de produccion del contratista se logra un adelanto en las entregas en buenaventura, lo que ha permitido que las situaciones de orden publico en la ciudad no generen retrasos en la programacion.
- Los atrasos en la entrega de la informacion para la facturación de la orden de bienes No 1, nos brindan la oportunidad de mejorar y el proceso para facturar la orden de bienes No 2 ya se encuentra en aprobacion de la Gerencia del contrato.

ANEXOS

1. Actas de comité mensual
2. Actas de comités semanales
3. Actas de empaque y embalaje
4. Comunicaciones Enviadas
5. Informe mensual No. 4
6. Anexos obligaciones
   1. JURIDICAS 2. FINANCIERAS 3. TECNICAS

FIRMA


HERNANDO A. CASTELLANOS R.

Arq. HERNANDO A CASTELLANOS R
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S B.I.C

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

ACTAS DE ORDEN DE BIEN 4

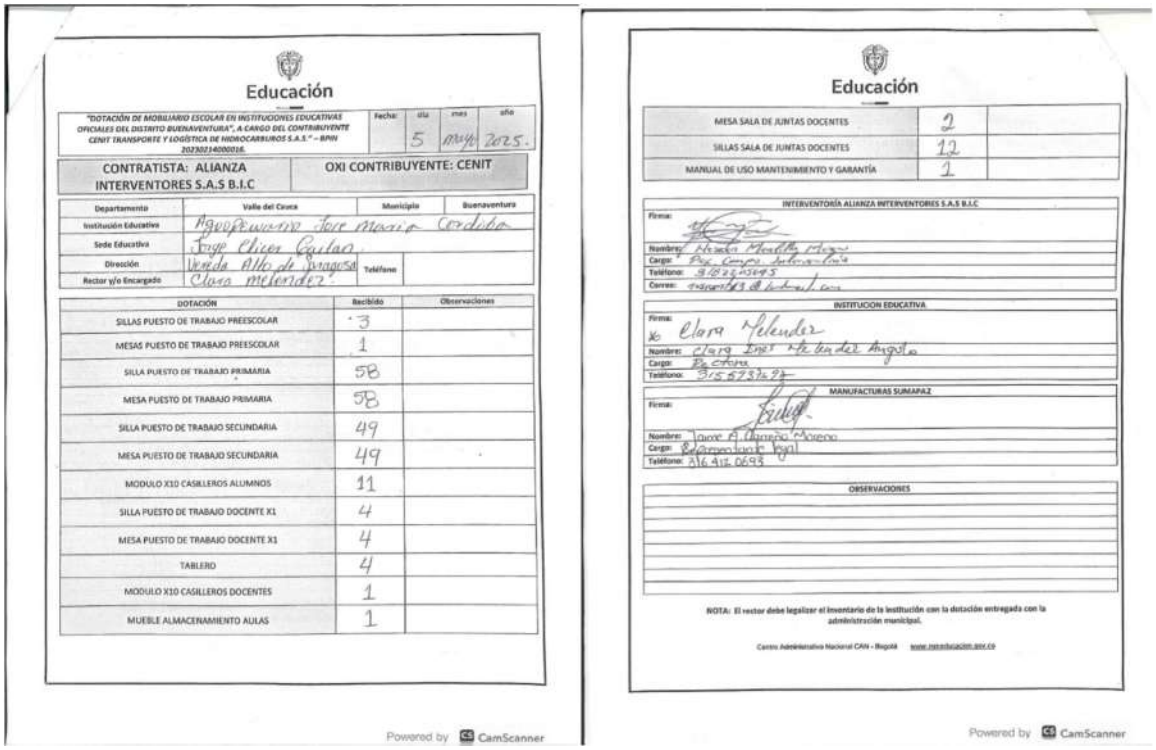

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230314000016.

Fecha: día 5 mes mayo año 2025.

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C

OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Agropecuario José María Córdoba		
Sede Educativa	Jorge Elicer Gaitan		
Dirección	Vereda Alto de Oriagueso	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Clara Meléndez		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	3	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	1	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	58	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	58	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	49	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	49	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	11	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
TABLERO	4	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	2	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	12	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C
Firma:
Nombre: Hender Mosquera Mosquera
Cargo: Prof. Campo Interventoría
Teléfono: 3102263495
Correo: [illegible]

INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Clara Meléndez
Cargo: Rectora
Teléfono: 3156737677

MANUFACTURAS SUMAPAZ
Firma:
Nombre: Javier A. Ramírez Moreno
Cargo: Representante legal
Teléfono: 316 415 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Centro Administrativo Nacional CAN – Bogotá www.mineducacion.gov.co

Powered by CamScanner



Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO JOSE MARIA CORDOBA SEDE JORGE ELIECER GAITAN | ACOPIO DE PUESTOS DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES
PUESTO DE TRABAJO PARA DOCENTES | ACOPIO DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
MESA DE TRABAJO PARA SALA DE JUNTAS | ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.




Educación

ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE | PRESENTACION PUESTOS PARA PREESCOLAR
PRESENTACION DE SALON DE CLASES | PRESENTACION DE SALON DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

jasb
Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

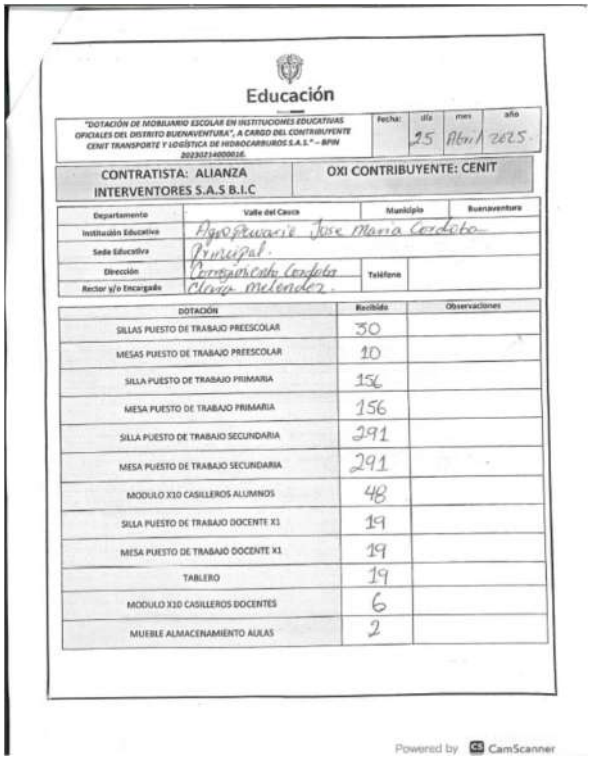

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016

Fecha: día 25 mes Abril año 2025


CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C

OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Agropecuario José María Córdoba		
Sede Educativa	Principal		
Dirección	Corregimiento Cordoba	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Elvira Meléndez		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	30	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	10	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	156	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	156	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	291	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	291	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	48	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	19	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	19	
TABLERO	19	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	6	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	2	

Powered by CamScanner

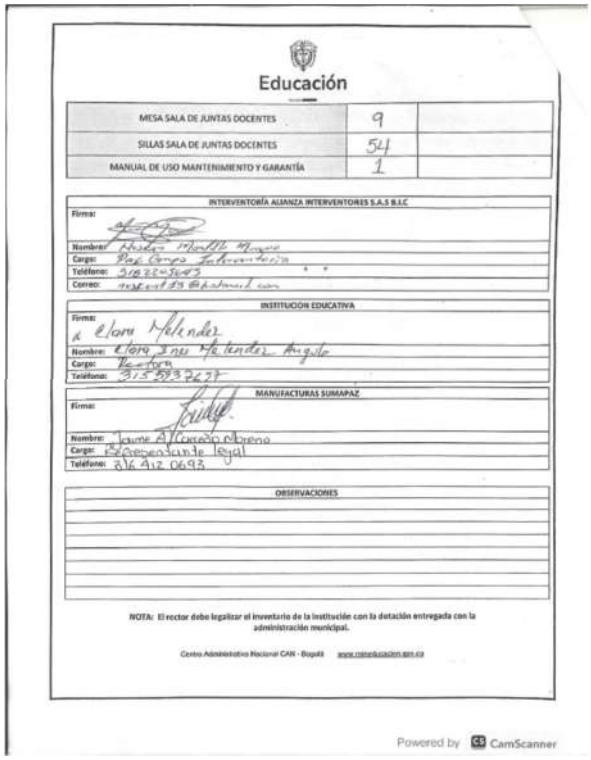

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	9	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	54	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C
Firma:
Nombre: Héctor Manuel Moreno
Cargo: Apoyo Campo Interventoría
Teléfono: 310 322 5683
Correo: hectorm1879@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Elvira Inés Meléndez Augusto
Cargo: Rectora
Teléfono: 315 893 2677

MANUFACTURAS SUMAPAZ
Firma:
Nombre: Jaime Alfonso Moreno
Cargo: Representante legal
Teléfono: 316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Powered by CamScanner



Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIO JOSE Ma CORDOBA SEDE JOSE MARIA

ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION ENTREGADOS PARA LA SEDE

ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION ENTREGADOS PARA LA SEDE

ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION ENTREGADOS PARA LA SEDE

ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION ENTREGADOS PARA LA SEDE

TABLEROS INSTALADOS

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.



Educación

PRESENTACION DE AULA DE PREESCOLAR

ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION ENTREGADOS PARA LA SEDE


PRESENTACION DE SALON DE CLASES

PRESENTACION DE SALON DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

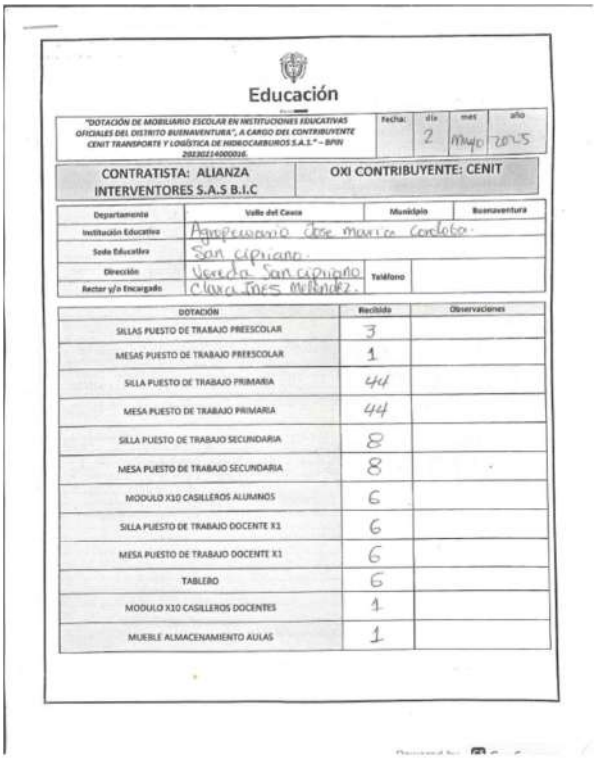

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 2021012140000316


Fecha: día 2 mes Mayo año 2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C

OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Agropecuario José María Córdoba.		
Sede Educativa	San Cipriano.		
Dirección	Vereda San Cipriano	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Clara Inés Meléndez.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	3	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	1	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	44	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	44	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	8	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	8	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	6	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
TABLERO	6	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

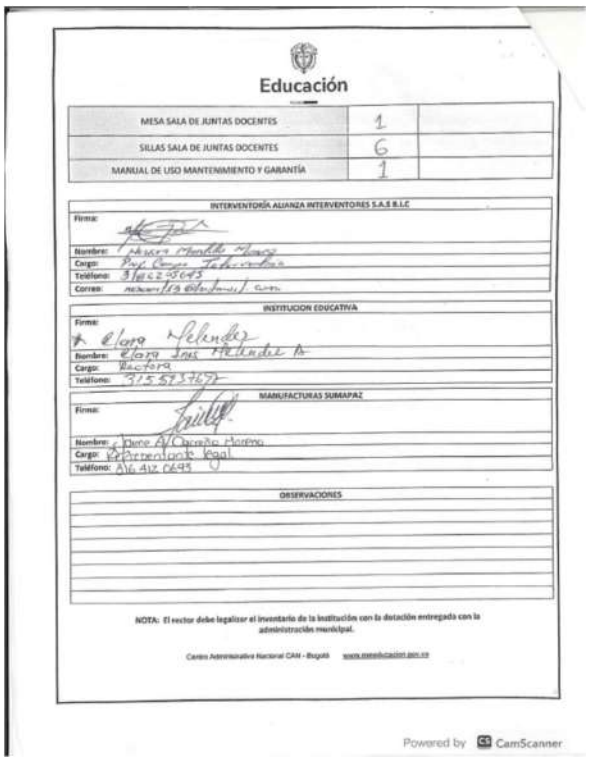

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C
Firma:
Nombre: Mayra Mantilla Mayo
Cargo: Prof. Campo Tecnologías
Teléfono: 3186275643
Correo: mayra1119@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Clara Inés Meléndez M.
Cargo: Rectora
Teléfono: 315.573.7677

MANUFACTURAS SUMAPAZ
Firma:
Nombre: Jhon Alexander Moreno
Cargo: Representante Legal
Teléfono: 316 412 0695

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Centro Administrativo Nacional CAN – Bogotá www.mineducacion.gov.co

Powered by CamScanner



Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO JOSE MARIA CORDOBA SEDE SAN CIPRIANO | TRASLADO POR VIA FERREA DE LA DOTACION A LA SEDE DE SAN CIPRIANO

ACOPIO DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO | PRESENTACION DE PUESTOS DE TRABAJO PREESCOLAR.

PRESENTACION DE PUESTOS DE TRABAJO PREESCOLAR. | CASILLEROS PARA DOCENTES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



Educación


PRESENTACION DE SALA DE JUNTAS DE DOCENTES | PRESENTACION DE SALA DE JUNTAS DE DOCENTES

PRESENTACION DE SALON DE CLASES | PRESENTACION DE SALON DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

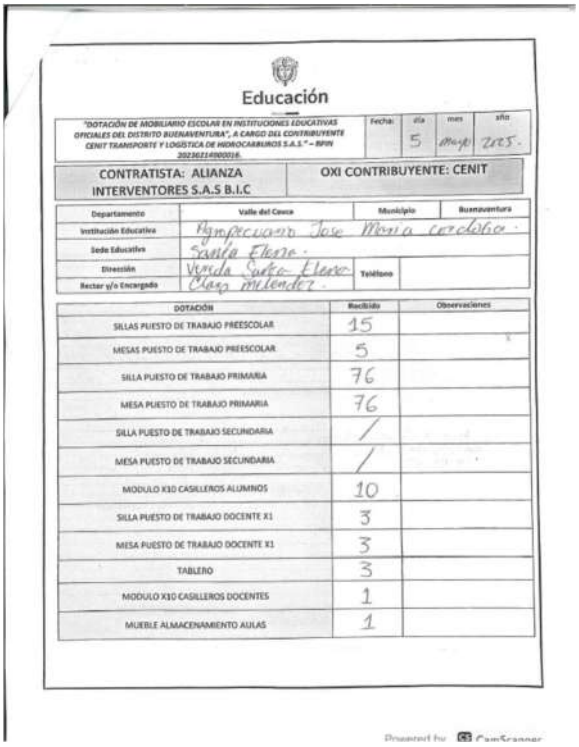

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 2023011490001

Fecha: día 5 mes mayo año 2025


CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C

OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Agropecuario Jose Maria Cordoba.		
Sede Educativa	Santa Elena.		
Dirección	Vereda Sabaletas Elevo.	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Clara Melendez.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	15	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	5	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	76	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	76	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	10	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	3	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	3	
TABLERO	3	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Presented by CamScanner

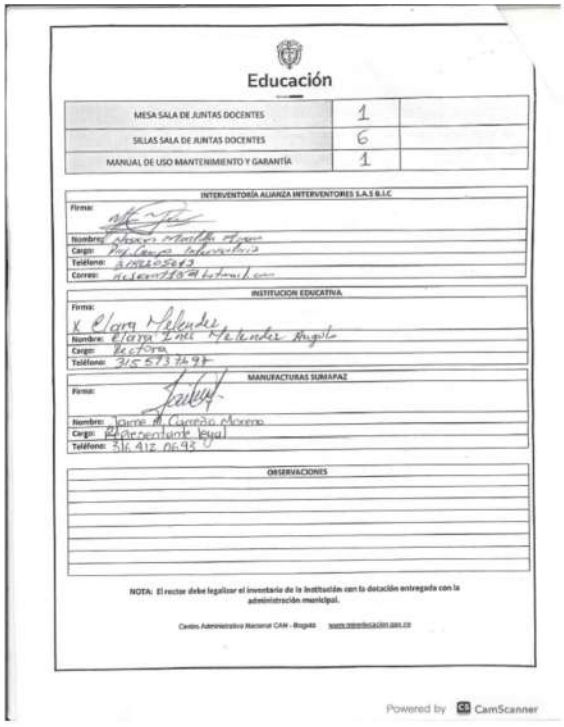

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C
Firma:
Nombre: Alvaro Montilla Ayala
Cargo: Prof. Campo Interventoria
Teléfono: 3158203682
Correo: alvaro7189@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA
Firma: x Clara Melendez
Nombre: Clara Inés Melendez Angulo
Cargo: Rectora
Teléfono: 315 573 7498

MANUFACTURAS SUMAPAZ
Firma:
Nombre: Jaime A. Cuervo Moreno
Cargo: Representante Legal
Teléfono: 316 412 0698

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Powered by CamScanner



Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO JOSE MARIA CORDOBA SEDE SANTA HELENA

PRESENTACION DE CASILLEROS PARA ESTUDIANTES

ACOPIO CASILLEROS PARA DOCENTES

ACOPIO DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO

ACOPIO DE ELEMENTOS DE SALA DE JUNTAS DE DOCENTES

TABLERO INSTALADO EN AULA DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



Educación

PRESENTACION DE SALON DE CLASES

PRESENTACION DE SALON DE CLASES

PRESENTACION DE SALON DE CLASES


PRESENTACION DE SALON DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

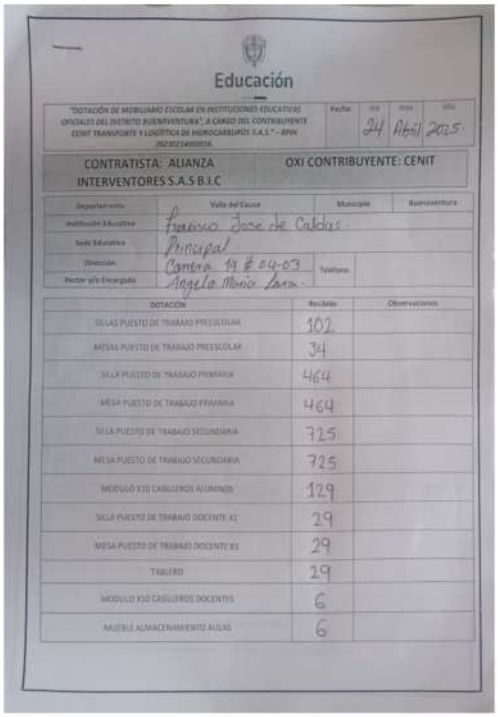

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." - BPIN 2021521400014


Fecha: día 24 mes Abril año 2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C

OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Francisco José de Caldas		
Sede Educativa	Principal		
Dirección	Cantra 19 # 04-03	Teléfono	
Rector o/o Encargado	Angela María Lara		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	102	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	34	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	464	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	464	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	725	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	725	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	129	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	29	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	29	
TABLERO	29	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	6	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	6	

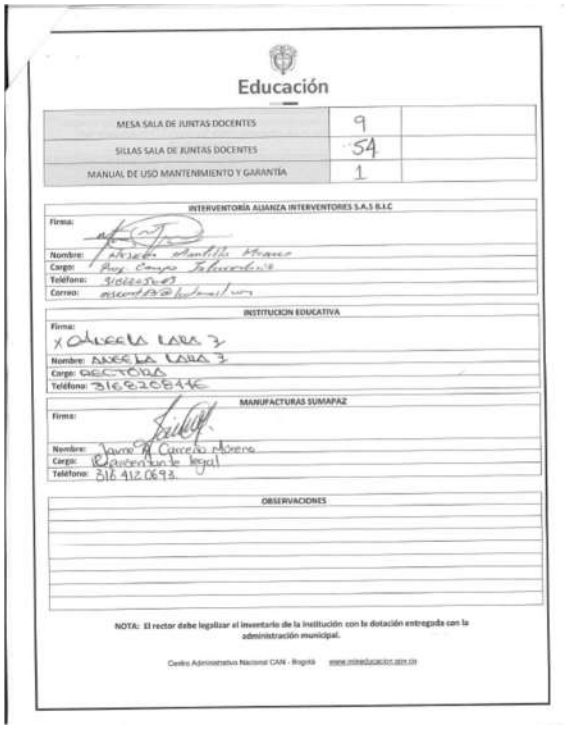

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	9	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	54	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C
Firma:
Nombre:
Cargo:
Teléfono:
Correo:

INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:
Nombre: ANGELA LARA J
Cargo: RECTORA
Teléfono: 3168206446

MANUFACTURAS SUMAPAZ
Firma:
Nombre: Jaime A. Cárdenas Moreno
Cargo: Representante legal
Teléfono: 312 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co



Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS | INICIO DE LA DESCARGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN ESCOLAR
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION ESCOLAR PARA LA SEDE | PRESENTACION DE CASILLEROS PARA DOCENTES
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION ESCOLAR PARA LA SEDE | PRESENTACION DE PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.



Educación


PRESENTACION DE SALON DE CLASES | PRESENTACION DE SALON DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

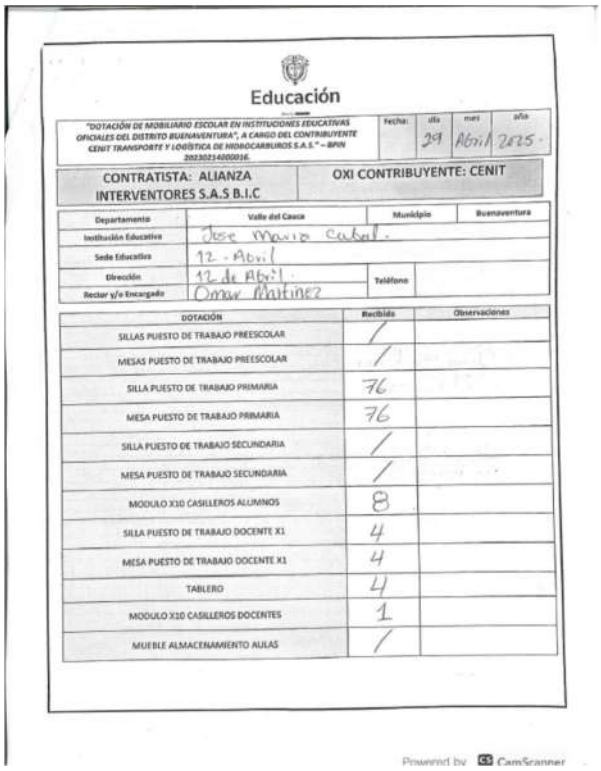

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 2023021400003l6.

Fecha: día 29 mes Abril año 2025


CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C

OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Jose Maria Cabal.		
Sede Educativa	12 - Abril		
Dirección	12 de Abril	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Omar Martinez		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	1	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	1	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	76	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	76	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	1	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	1	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	8	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
TABLERO	4	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

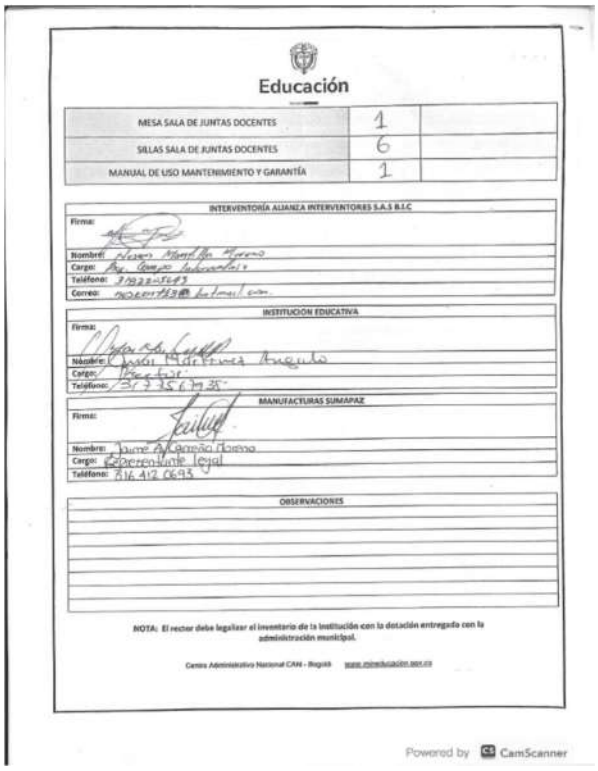

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C
Firma:
Nombre: Oscar Mauricio Moreno
Cargo: Ap. Campo Interventoría
Teléfono: 3192205693
Correo: oscarmm93@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Jose Alfredo Perez Angulo
Cargo: Rector
Teléfono: 3155351735

MANUFACTURAS SUMAPAZ
Firma:
Nombre: Jaime Alexander Ospina
Cargo: Representante legal
Teléfono: 316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregado con la administración municipal.

Centro Administrativo Nacional CAN – Bogotá www.mineducacion.gov.co

Powered by CamScanner



Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CABAL SEDE 12 DE ABRIL | ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE | ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE | ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



Educación


ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE | ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE | ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

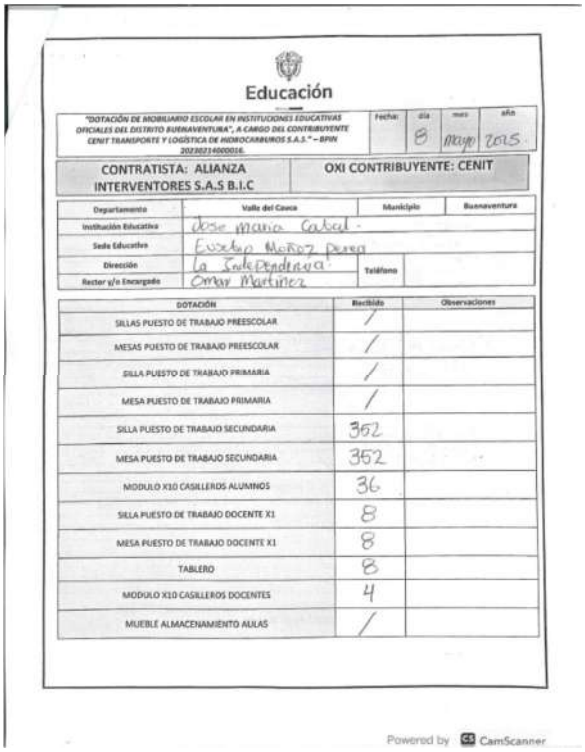

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 2023021490016.

Fecha: día 8 mes mayo año 2025


CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C

OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Jose Maria Cabal		
Sede Educativa	Eusebio Muñoz Perea		
Dirección	La Independencia	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Omar Martinez		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	1	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	1	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	1	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	1	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	352	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	352	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	36	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	8	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	8	
TABLERO	8	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	4	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

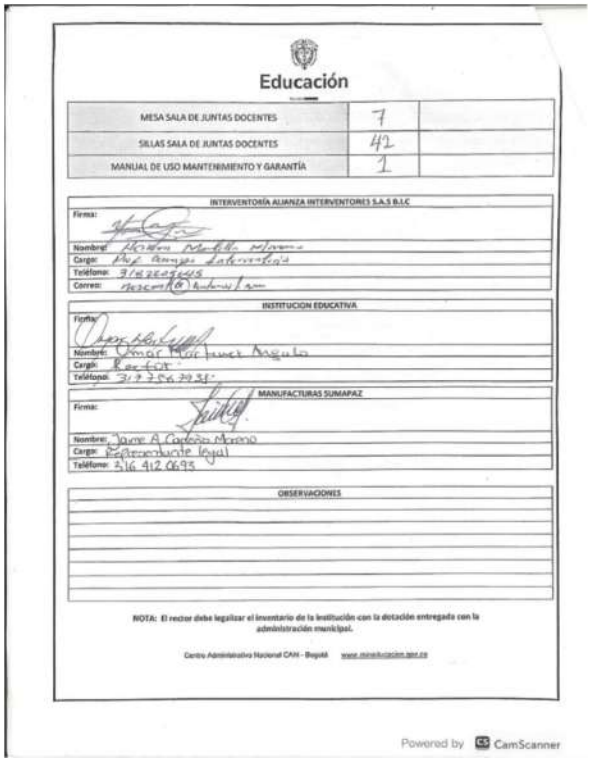

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	42	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C
Firma:
Nombre: Kristen Murillo Moreno
Cargo: Apoyo Logistico
Teléfono: 3162623605
Correo: [illegible]

INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Omar Martinez Angulo
Cargo: Rector
Teléfono: 317 756 2933

MANUFACTURAS SUMAPAZ
Firma:
Nombre: Jaime A Cardozo Moreno
Cargo: Representante legal
Teléfono: 316 912 0695

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Powered by CamScanner



Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CABAL SEDE EUSEBIO MUÑOS PEREA | ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE
CASILLEROS PARA DOCENTES | ACOPIO DE TABLEROS PAR INSTALAR
PRESENTACION DE SALA DE JUNTAS DE DOCENTES | PRESENTACION DE TABLERO INSTALADO EN AULA

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.




Educación

PRESENTACION DE SALON DE CLASES | PRESENTACION DE SALON DE CLASES
PRESENTACION DE SALON DE CLASES | PRESENTACION DE SALON DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

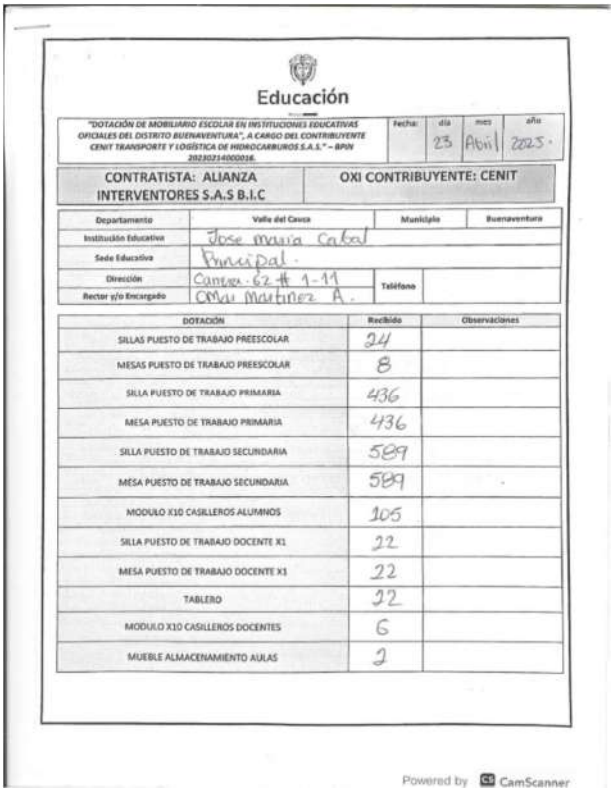

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 2023021400001 6.

Fecha: día 23 mes Abril año 2023


CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C

OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Jose maria Cabal		
Sede Educativa	Principal		
Dirección	Carrera 62 # 1-11	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Omar Martinez A.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	24	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	8	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	436	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	436	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	589	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	589	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	105	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	22	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	22	
TABLERO	22	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	6	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	2	

Powered by CamScanner

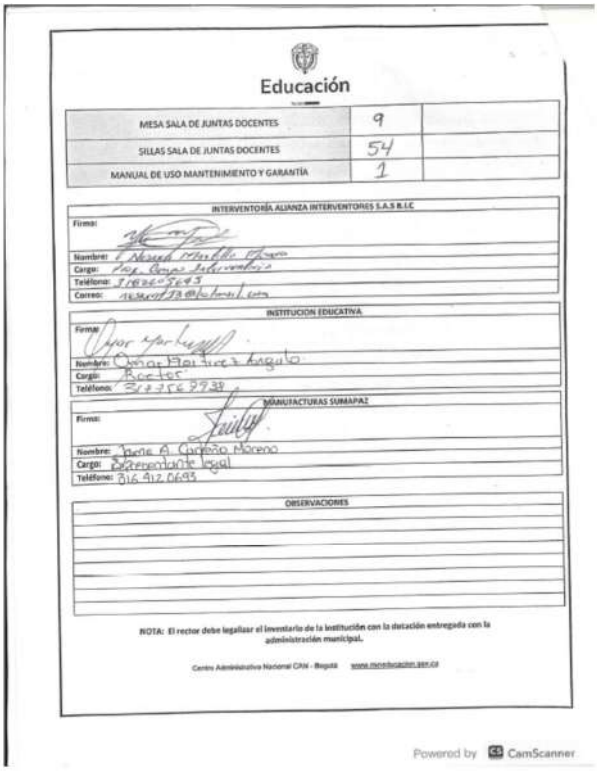

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	9	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	54	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C
Firma:
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]
Teléfono: [illegible]
Correo: [illegible]

INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Omar Martinez Angulo
Cargo: Rector
Teléfono: 3177562938

MANUFACTURAS SUMAPAZ
Firma:
Nombre: Jorge A. Campiño Moreno
Cargo: Representante legal
Teléfono: 316 912 0695

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Powered by CamScanner



Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CABAL SEDE PRONCIPAL | ADOPIO DE ELEMENTOS DE TRABAJO PARA LA SEDE
ADOPIO DE ELEMENTOS DE TRABAJO PARA LA SEDE | ADOPIO DE ELEMENTOS DE TRABAJO PARA LA SEDE
ADOPIO DE ELEMENTOS DE TRABAJO PARA LA SEDE | ADOPIO DE ELEMENTOS DE TRABAJO PARA LA SEDE

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.




Educación

ADOPIO DE ELEMENTOS DE TRABAJO PARA LA SEDE | ADOPIO DE ELEMENTOS DE TRABAJO PARA LA SEDE
PRESENTACION DE SALON DE CLASES | PRESENTACION DE SALON DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

jasb
Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

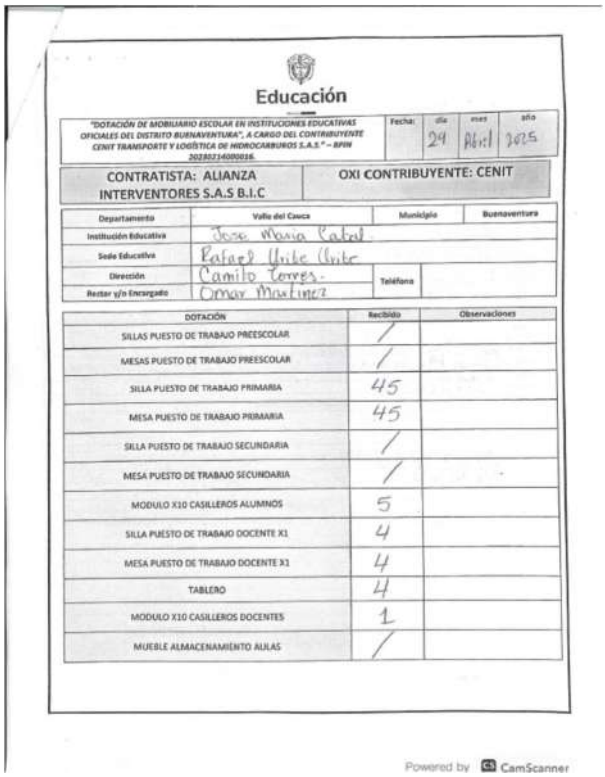

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 2023013140000016

Fecha: día 24 mes Abril año 2025


CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C

OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	José María Cabal		
Sede Educativa	Rafael Uribe Uribe		
Dirección	Camilo Torres.	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Omar Martinez		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	/	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	/	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	45	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	45	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	5	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
TABLERO	4	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	/	

Powered by CamScanner

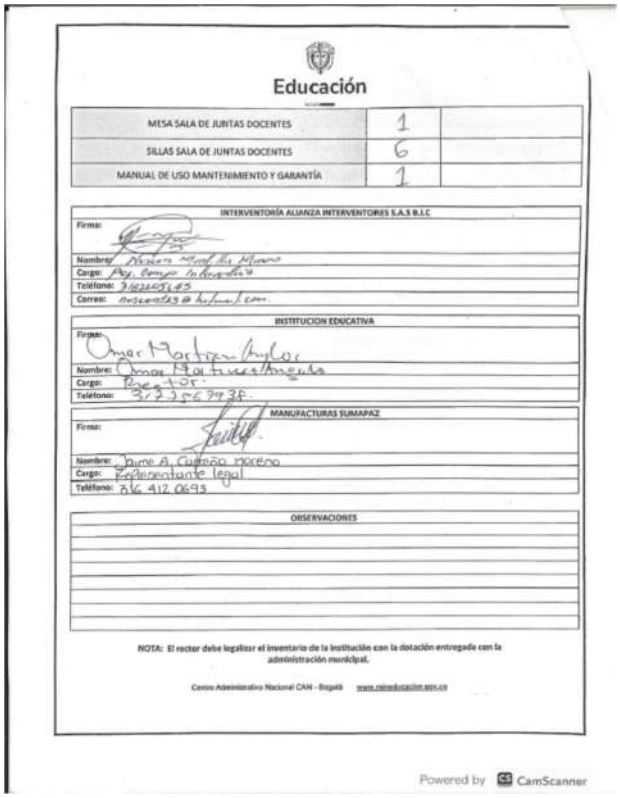

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C
Firma:
Nombre: Oficina Gestión de Proyectos
Cargo: Apy. Compo Interventor
Teléfono: 3164405185
Correo: proyectos3@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Omar Martinez Angulo
Cargo: Rector
Teléfono: 3122567938

MANUFACTURAS SUMAPAZ
Firma:
Nombre: Jaime A. Cubeño Moreno
Cargo: Representante legal
Teléfono: 316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Powered by CamScanner



Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CABAL SEDE RAFAEL URIBE URIBE
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION ESCOLAR PARA LA SEDE
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION ESCOLAR PARA LA SEDE
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION ESCOLAR PARA LA SEDE
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION ESCOLAR PARA LA SEDE
PRESENTACION DE TABLERO INSTALADO EN AULA

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



Educación


ACOPIO DE PUESTOS DE TRABAJO
PRESENTACION DE SALA DE JUNTAS DE DOCENTES
ACOPIO DE CASILLEROS PARA DOCENTES
PRESENTACION DE SALON DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

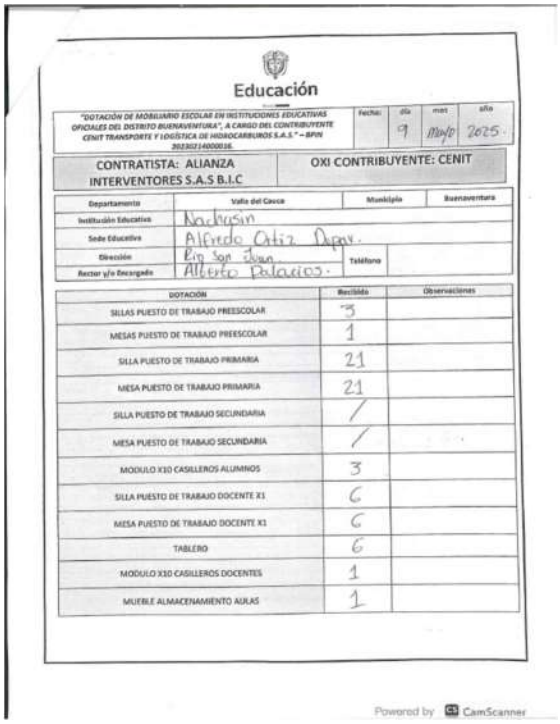

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 2023021400000116.

Fecha: día 9 mes mayo año 2025


CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C

OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Nacional		
Sede Educativa	Alfredo Ortiz Dapr.		
Dirección	Rio San Juan	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Alberto Palacios.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	3	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	1	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	21	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	21	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	3	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
TABLERO	6	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

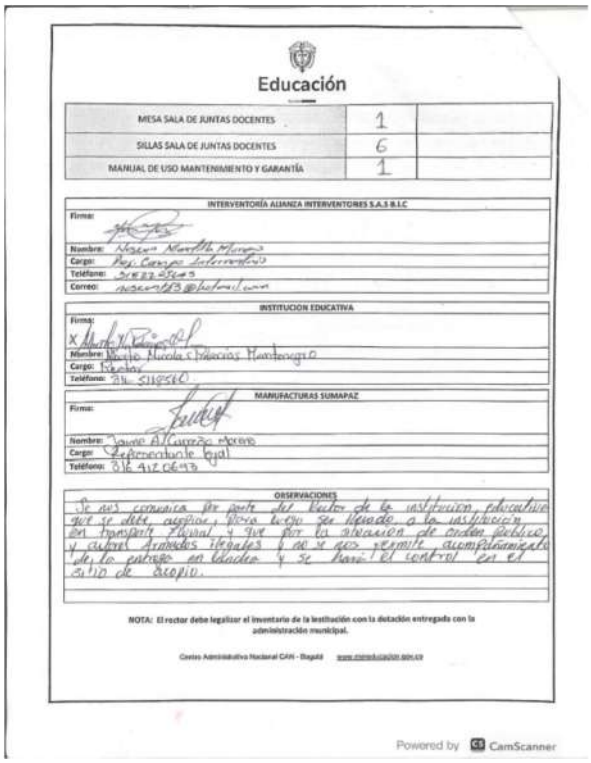

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C
Firma:
Nombre: Mirian Nayibe Munoz
Cargo: Prof. Campo Interventoria
Teléfono: 3183758643
Correo: mirian1183@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Martha Nicolasa Palacios Montenegro
Cargo: Rectora
Teléfono: 316 5119560

MANUFACTURAS SUMAPAZ
Firma:
Nombre: Jaime Alfonso Moreno
Cargo: Representante legal
Teléfono: 316 412 0693

OBSERVACIONES
Se nos comunica por parte del Rector de la institución educativa que se debe asegurar, pero luego se llevado a la institución en transporte Fluvial, y que por la situación de orden público y control Armados ilegales no se nos permite acompañamiento de la entrega en Bladeo y se hará el control en el sitio de acopio.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Powered by CamScanner



Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INICIO DE DESCARGA INSTITUCION EDUCATIVA NACHADIN PAÑA DEDE ALFREDO ORTIZ DJPAR | ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION ESCOLAR

CASILLEROS PARA DOCENTES | PRESENTACION DE PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

PRESENTACION DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO | PRESENTACION DE SALA DE JUNTAS DE DOCENTES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



Educación


PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR | PRESENTACION DE SALON DE CLASES

PRESENTACION DE SALON DE CLASES | PRESENTACION DE SALON DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

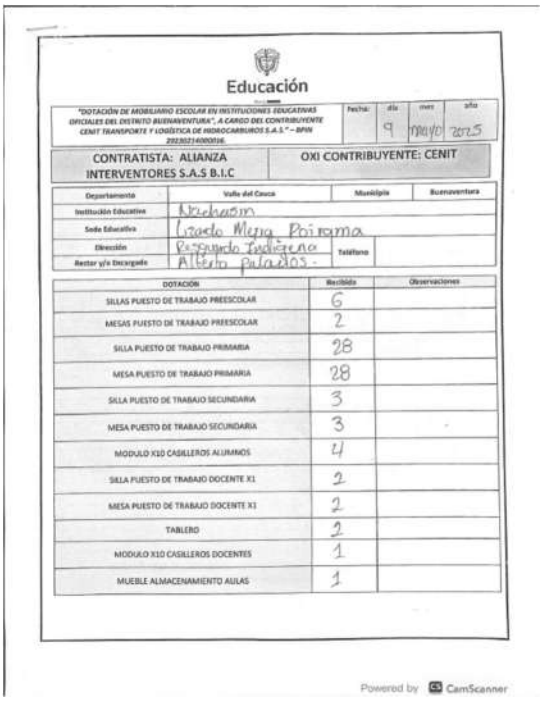

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 2023031490001

Fecha: día 9 mes mayo año 2025


CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C

OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Nacheasin		
Sede Educativa	Lizardo Mejia Poraima		
Dirección	Resguardo Indígena	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Alberto Palacios		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	6	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	2	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	28	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	28	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	3	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	3	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	4	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	2	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	2	
TABLERO	2	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

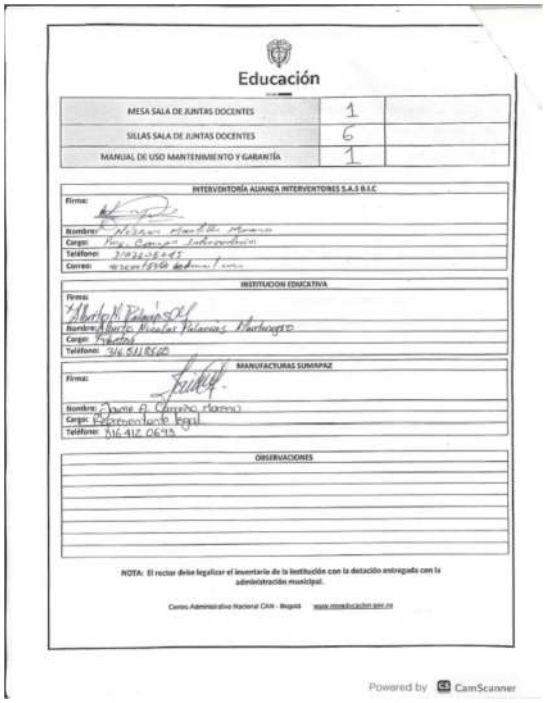

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C
Firma:
Nombre: Nelson Martin Moreno
Cargo: Vice Comité Interventoría
Teléfono: 3102258645
Correo: nelson1590@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Alberto Nicolas Palacios Montenegro
Cargo: Rector
Teléfono: 316 811 8560

MANUFACTURAS SUMAPAZ
Firma:
Nombre: Jaime A. Campos Martinez
Cargo: Representante Legal
Teléfono: 316 412 0695

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Powered by CamScanner



Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCION EDUCATIVA NACHAGIN PARA LA SEDE LIZARDO MEJIA PORAIMA
TRASLADO PARA ACOPIAR Y LUEGO ENVIAR VIA FLUVIAL
DESCARGUE DE ELEMENTOS DE DOTACION EDUCATIVA PARA LA SEDE LIZARDO MEJIA
ACOPIO DE DOTACION EDUCATIVA PARA LA SEDE LIZARDO MEJIA PORAIMA
ACOPIO DE DOTACION EDUCATIVA PARA LA SEDE LIZARDO MEJIA PORAIMA
ACOPIO DE DOTACION EDUCATIVA PARA LA SEDE LIZARDO MEJIA PORAIMA

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.




Educación

ACOPIO DE DOTACION EDUCATIVA PARA LA SEDE LIZARDO MEJIA PORAIMA
ACOPIO DE DOTACION EDUCATIVA PARA LA SEDE LIZARDO MEJIA PORAIMA
ACOPIO DE DOTACION EDUCATIVA PARA LA SEDE LIZARDO MEJIA PORAIMA
ACOPIO DE DOTACION EDUCATIVA PARA LA SEDE LIZARDO MEJIA PORAIMA

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

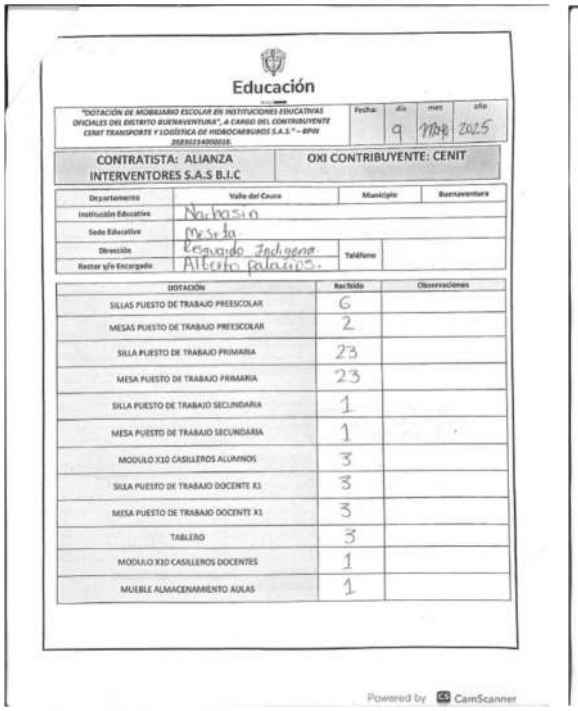

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 2020621240000

Fecha: día 9 mes Mar año 2025


CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C

OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Nacnasin		
Sede Educativa	Mesita		
Dirección	Resguardo Indígena	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Alberto Palacios		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	6	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	2	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	23	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	23	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	1	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	1	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	3	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	3	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	3	
TABLERO	3	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

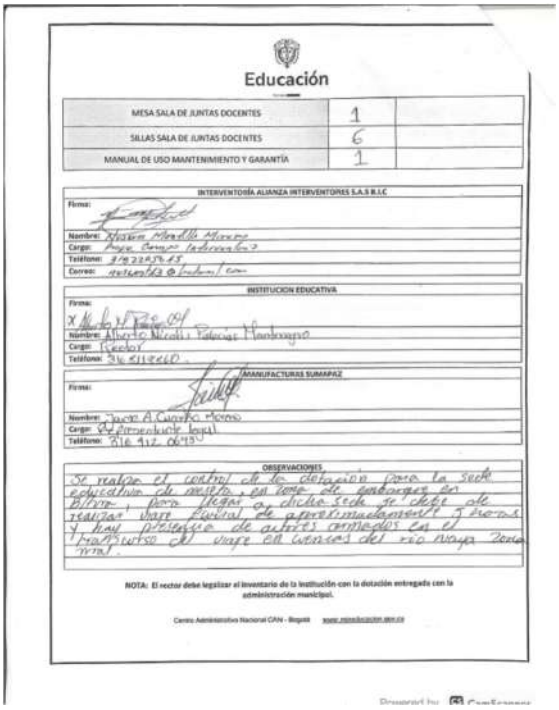

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C
Firma:
Nombre: Yeison Morella Moreno
Cargo: Apoyo Campo Interventor
Teléfono: 3182259455
Correo: interventoria@talentum.com

INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Alberto Nicolás Palacios Mondragón
Cargo: Rector
Teléfono: 316 811 6660

MANUFACTURAS SUMAPAZ
Firma:
Nombre: Jairo A. Cardozo Moreno
Cargo: Representante legal
Teléfono: 316 412 0695

OBSERVACIONES
Se realiza el control de la dotación para la sede educativa de mesita, en temporada de embarques por Bitora, para llegar a dicha sede se debe de realizar viaje fluvial, de aproximadamente 2 horas y una caminata de aprox 45 minutos en el transporte del viaje el vehículo del rio Naya zona rural

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Centro Administrativo Nacional CAN – Bogotá www.mineducacion.gov.co

Powered by CamScanner



Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCION EDUCATIVA NACHASIN SEDE MESETA | TRASIEGO DE MATERIALES DE UN TRANSPORTE A OTRO PARA LLEVAR A SITIO DE ACOPIO
TRASIEGO DE MATERIALES DE UN TRANSPORTE A OTRO PARA LLEVAR A SITIO DE ACOPIO | TRASIEGO DE MATERIALES DE UN TRANSPORTE A OTRO PARA LLEVAR A SITIO DE ACOPIO
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LUEGO LLEVAR A SITIO DE MANERA FLUVIAL | ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LUEGO LLEVAR A SITIO DE MANERA FLUVIAL

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



Educación


ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LUEGO LLEVAR A SITIO DE MANERA FLUVIAL | ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LUEGO LLEVAR A SITIO DE MANERA FLUVIAL
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LUEGO LLEVAR A SITIO DE MANERA FLUVIAL | ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LUEGO LLEVAR A SITIO DE MANERA FLUVIAL

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

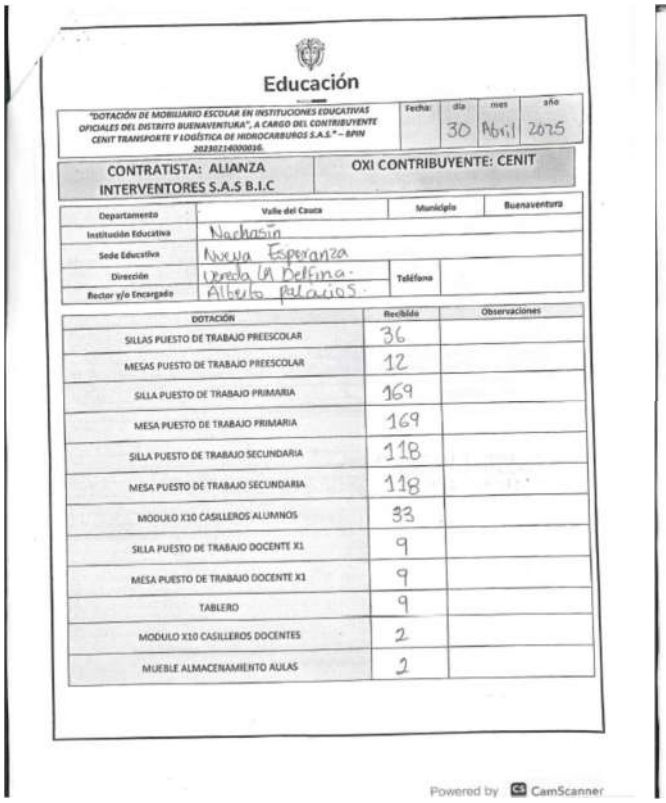

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 2023021400000316.

Fecha: día 30 mes Abril año 2025


CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C

OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Nachasin		
Sede Educativa	Nueva Esperanza		
Dirección	Vereda La Delfina.	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Alberto Palacios.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	36	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	12	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	169	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	169	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	118	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	118	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	33	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	9	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	9	
TABLERO	9	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	2	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	2	

Powered by CamScanner

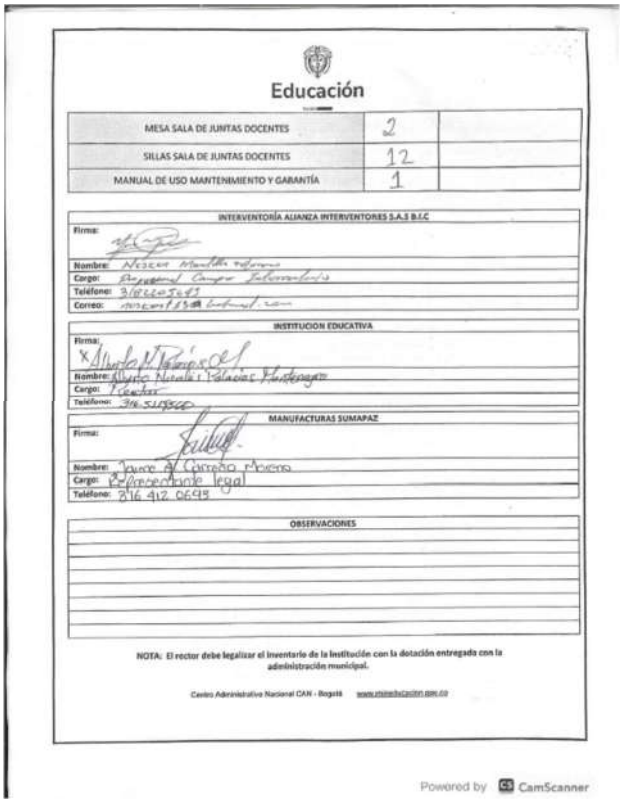

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	2	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	12	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C
Firma:
Nombre: Nestor Manuel Moreno
Cargo: Apoyo Campo Interventoría
Teléfono: 3106205687
Correo: nmoreno1554@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Alberto Manuel Palacios Hurtado
Cargo: Rector
Teléfono: 316 5195560


MANUFACTURAS SUMAPAZ
Firma:
Nombre: Jaime Alberto Correa Moreno
Cargo: Representante legal
Teléfono: 316 412 0695

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Powered by CamScanner

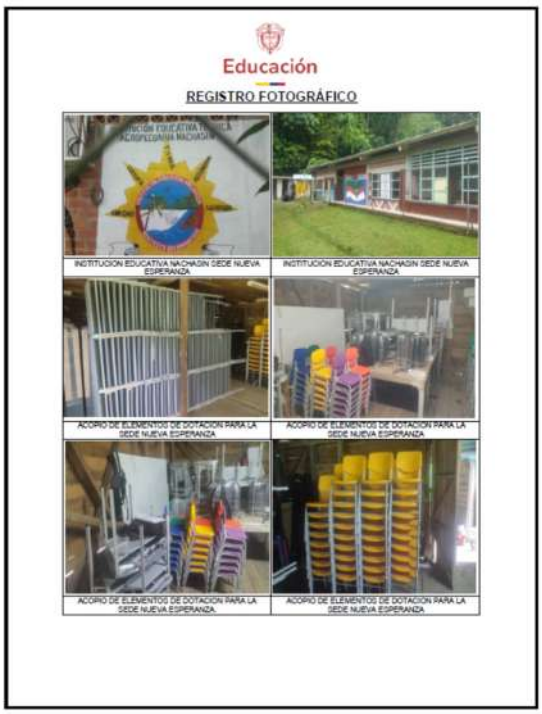

Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCION EDUCATIVA NACHASIN SEDE NUEVA ESPERANZA | INSTITUCION EDUCATIVA NACHASIN SEDE NUEVA ESPERANZA
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE NUEVA ESPERANZA | ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE NUEVA ESPERANZA
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE NUEVA ESPERANZA | ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE NUEVA ESPERANZA

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.



Educación


ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE NUEVA ESPERANZA | ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE NUEVA ESPERANZA
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE NUEVA ESPERANZA | ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE NUEVA ESPERANZA

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

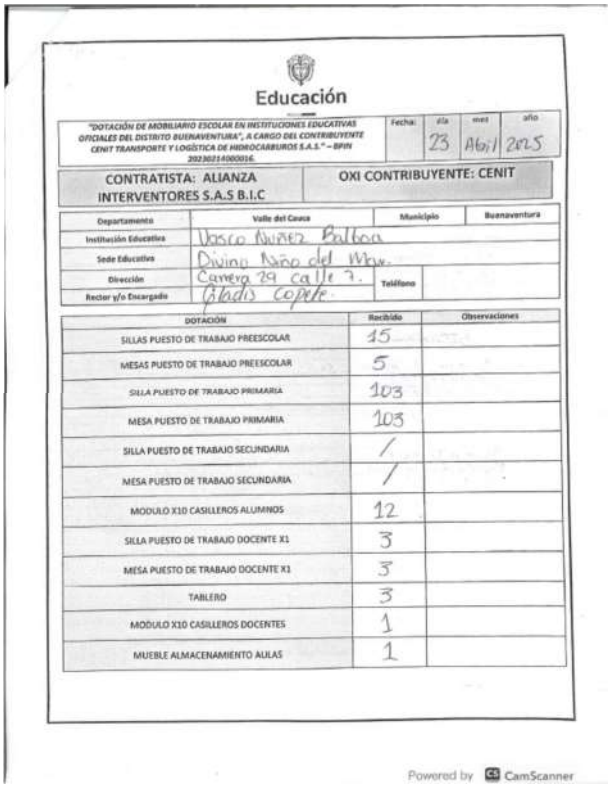

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 2023031400016.

Fecha: día 23 mes Abril año 2025


CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C

OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Vasco Núñez Balboa		
Sede Educativa	Divino Niño del Mar.		
Dirección	Carrera 29 calle 7.	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Gladis Copete.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	15	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	5	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	103	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	103	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	12	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	3	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	3	
TABLERO	3	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

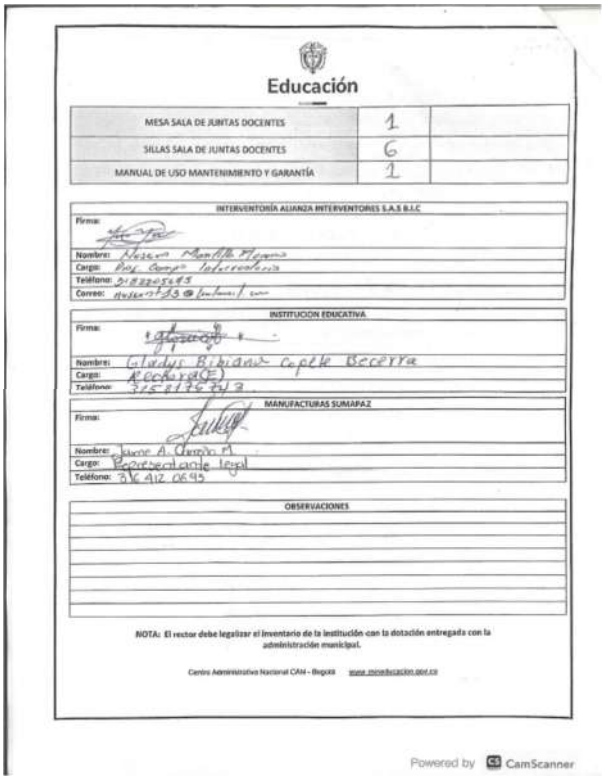

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C
Firma:
Nombre: Alvaro Murillo Moreno
Cargo: Prof. Campo Interventoria
Teléfono: 3182205845
Correo: murillo733@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Gladys Bibiana Copete Becerra
Cargo: Rector(E)
Teléfono: 3158176243

MANUFACTURAS SUMAPAZ
Firma:
Nombre: Jaime A. Chacón M.
Cargo: Representante legal
Teléfono: 316 412 0695

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Centro Administrativo Nacional CAN – Bogotá www.mineducacion.gov.co

Powered by CamScanner



Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCION EDUCATIVA VASCO NUÑEZ BALBOA SEDE CENTRO DOCENTE DIVINO NIÑO DEL MAR
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE
PRESENTACION DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
PRESENTACION DE PUESTOS DE TRABAJO PREESCOLAR

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



Educación


PRESENTACION DE SALON DE CLASES
PRESENTACION DE SALA DE JUNTAS DE DOCENTES
PRESENTACION DE SALON DE CLASES
PRESENTACION DE SALON DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

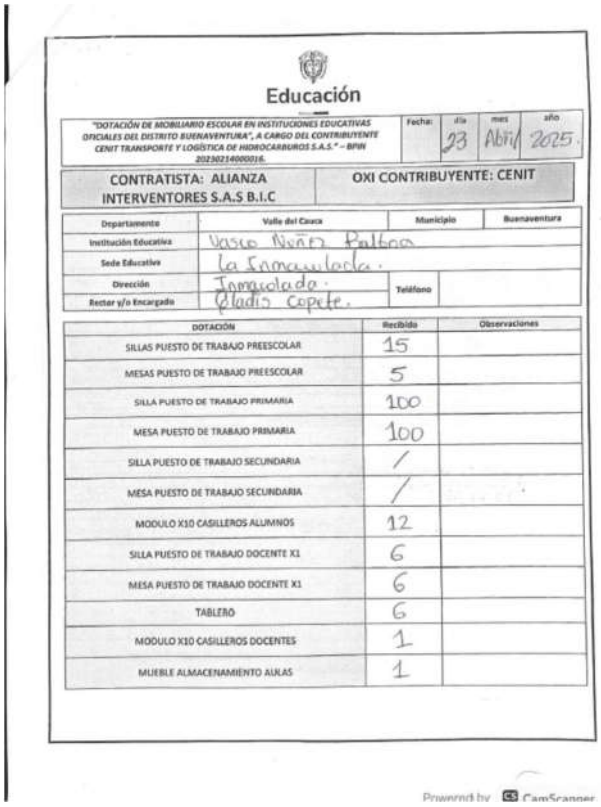

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.

Fecha: día 23 mes Abril año 2025


CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C

OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Vasco Nuñez Balboa		
Sede Educativa	La Inmaculada.		
Dirección	Inmaculada.	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Gladis Copete.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	15	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	5	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	100	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	100	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	12	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
TABLERO	6	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

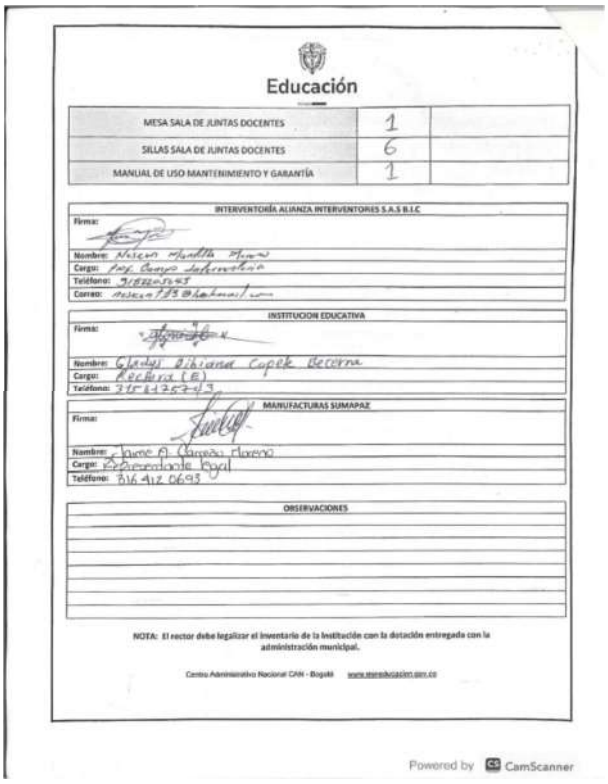

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C
Firma:
Nombre: Nelson Mantilla Mora
Cargo: Prof. Campo Interventoría
Teléfono: 3138207145
Correo: nelson1975@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Gladys Bibiana Copete Becerra
Cargo: Rectora (E)
Teléfono: 3154257493

MANUFACTURAS SUMAPAZ
Firma:
Nombre: Jaime A. Garzón Moreno
Cargo: Representante Legal
Teléfono: 316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Powered by CamScanner



Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCION EDUCATIVA VASCO NÚÑEZ BALBOA SEDE INMACULADA | INICIO DE LA DESCARGA DE LOS ELEMENTOS DE DOTACION ESCOLAR
ADOPCI DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE | ADOPCI DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE
ADOPCI DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE | ADOPCI DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



Educación


ADOPCI DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE | PRESENTACION DE PUESTO DE TRABAJO DOCENTE
PRESENTACION DE SALON DE CLASES | PRESENTACION DE SALON DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

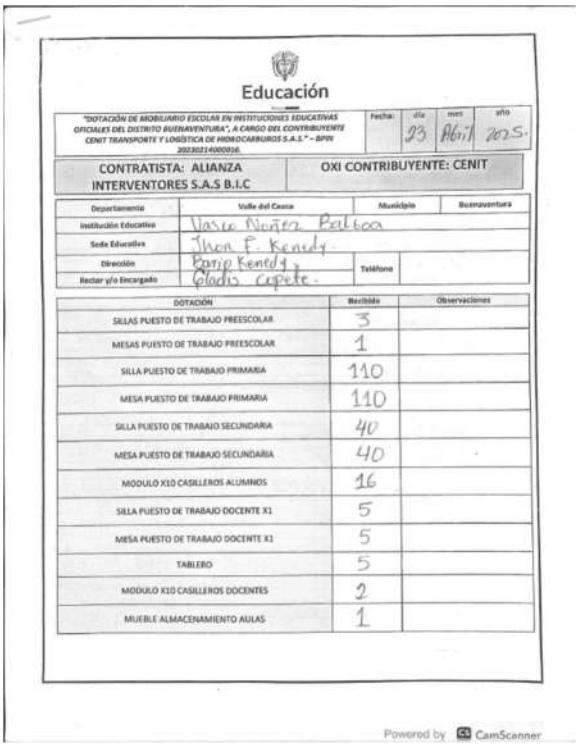

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S " – BPIN 2023021400016.

Fecha: día 23 mes Abril año 2025


CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C

OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Vasco Núñez Balboa		
Sede Educativa	Jhon F. Kennedy		
Dirección	Barrio Kennedy	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Gladis Cepeda.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	3	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	1	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	110	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	110	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	40	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	40	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	16	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	5	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	5	
TABLERO	5	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	2	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

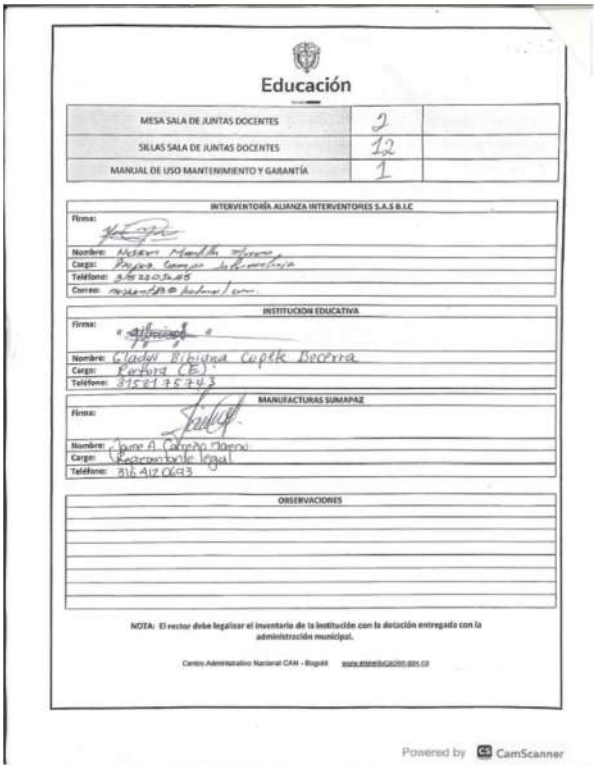

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	2	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	12	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C
Firma:
Nombre: Nataly Montilla Moreno
Cargo: Apoyo Campo Interventoría
Teléfono: 316 220 3405
Correo: nataly0704@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Gladys Ribigna Cepeda Becerra
Cargo: Rectora (E)
Teléfono: 3152175243

MANUFACTURAS SUMAPAZ
Firma:
Nombre: Jaime A. Cepeda Nieto
Cargo: Representante legal
Teléfono: 316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregado con la administración municipal.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Powered by CamScanner



Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCION EDUCATIVA VASCO NUÑEZ BALBOA SEDE JHON F KENNEDY
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



Educación


ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA SEDE
PRESENTACION DE SALON DE CLASES
PRESENTACION DE SALON DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

jasb
Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

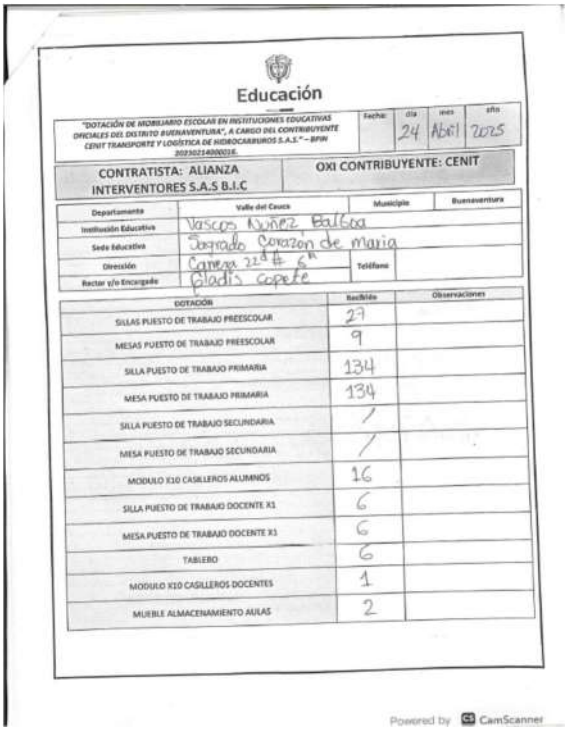

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016

Fecha: día 24 | mes Abril | año 2025


CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C

OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Vasco Nuñez Balboa		
Sede Educativa	Sagrado Corazon de Maria		
Dirección	Carrera 22 # 6 A	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Gladis Copete		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	27	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	9	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	134	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	134	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	1	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	1	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	16	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
TABLERO	6	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	2	

Powered by CamScanner

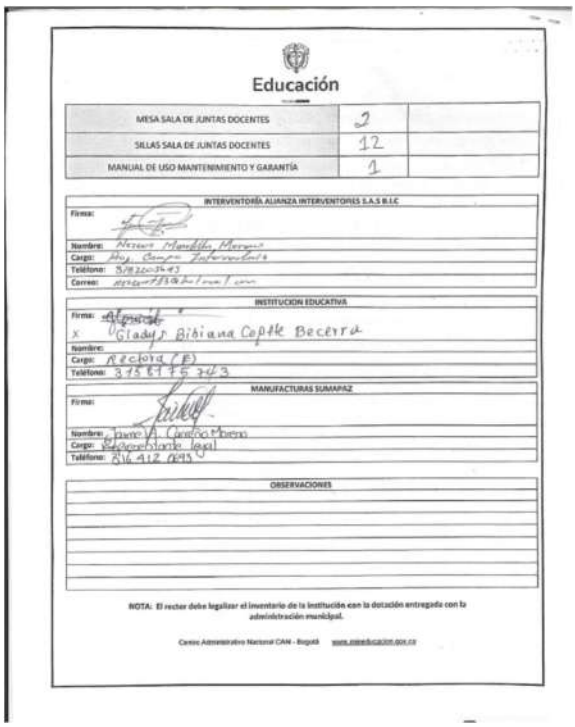

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	2	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	12	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C

Firma:
Nombre: Nestor Mondillo Moreno
Cargo: Prof. Campo Interventoria
Teléfono: 3182203443
Correo: nestor7788@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:
Nombre: Gladys Bibiana Copete Becerra
Cargo: Rectora (E)
Teléfono: 3158975743

MANUFACTURAS SUMAPAZ

Firma:
Nombre: Diana M. Cantor Moreno
Cargo: Representante Legal
Teléfono: 316 912 0895

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Canino Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co



Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUCION EDUCATIVA VASCOS NUÑEZ BALBOA SEDE SAGRADO CORAZON DE MARIA | SEDE SAGRADO CORAZON DE MARIA

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA SEDE | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA SEDE

ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA SEDE | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA SEDE

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



Educación


ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA SEDE | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION PARA SEDE

PRESENTACION DE MESA DE JUNTA PARA DOCENTES | TABLEROS INSTALADOS

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

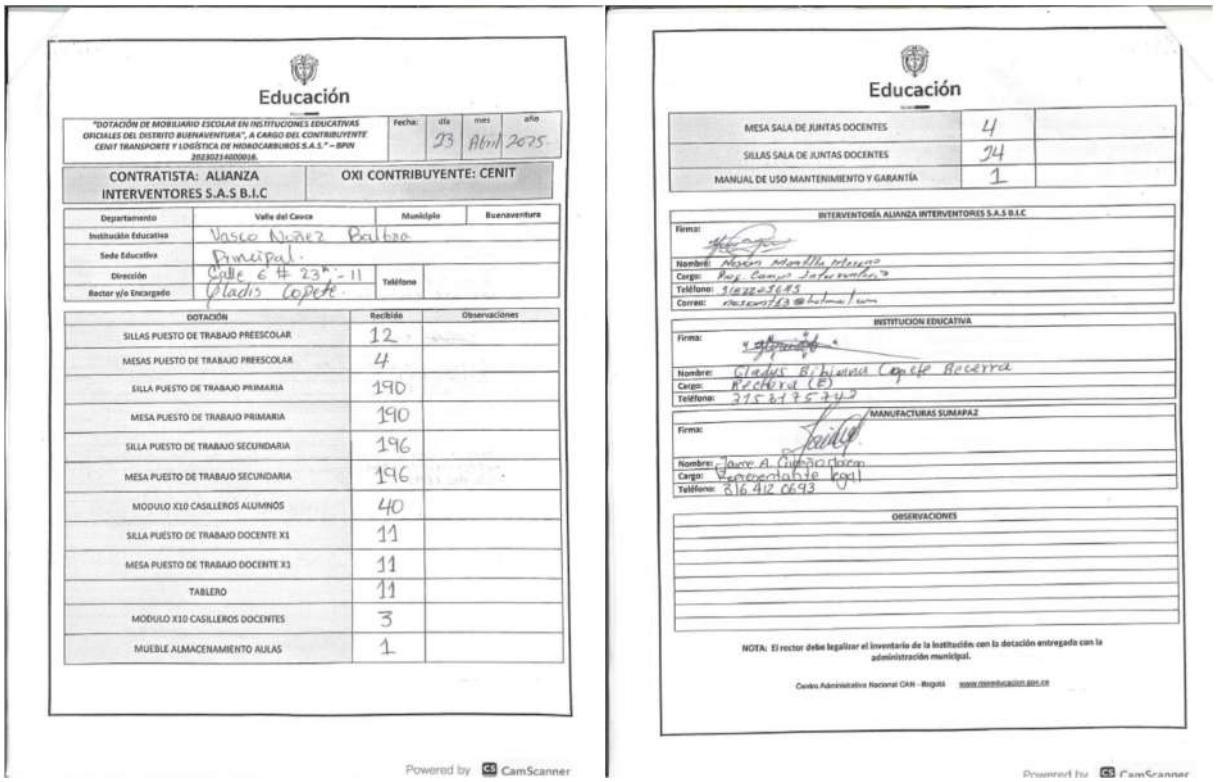

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016

Fecha: día 23 mes Abril año 2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C

OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Vasco Núñez Balboa		
Sede Educativa	Principal		
Dirección	Calle 6 # 23 - 11	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Gladis Lopeté		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	12	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	4	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	190	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	190	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	196	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	196	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	40	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	11	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	11	
TABLERO	11	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	3	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	4	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	34	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C
Firma:
Nombre: Nelson Murillo Moreno
Cargo: Prof. Campo Interventoría
Teléfono: 3122545845
Correo: nelsonmm13@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Gladys Bibiana Lopeté Becerra
Cargo: Rectora (E)
Teléfono: 3152175742

MANUFACTURAS SUMAPAZ
Firma:
Nombre: Jaime A. Cubillos Garcia
Cargo: Representante Legal
Teléfono: 316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregado con la administración municipal.

Centro Administrativo Nacional CAN - Bogotá www.mineducacion.gov.co

Powered by CamScanner

ACTA DE COMITÉ DEL CONVENIO 007 de 2023 - PROYECTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS BPIN 20230214000016

Comité No.	3	CONVENIO 007 de 2023	**FECHA:**	28	4	2025
				(Fecha de realización del comité dd-mm-aa)		

CONTRIBUYENTE	CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS
GERENCIA	CB INGENIEROS S.A.S

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	EMPRESA / ENTIDAD□	FIRMA
Beatriz Elena Yara Arias	CENIT/CONTRIBUYENTE	
German Rodrigo Gómez Vega	MEN	
Marcelino Ruiz Montaño	SECRETARIA DE EDUCACIÓN BUENAVENTURA	
Christian Camilo Hernández	CB INGENIEROS SAS	

II. OBJETO

Seguimiento al proyecto "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS
BPIN 20230214000016

III. RESUMEN


La reunión del Comité Técnico Número Tres en Buenaventura contó con la asistencia de Marcelino Ruiz Montaño, Beatriz Elena Yara Arias, Germán Gómez y Christian Camilo Hernández. Se socializó el avance del proyecto de dotación, que alcanza un 83,4 %, superando lo programado.

Se programarán visitas a las instituciones educativas entre el 19 y el 23 de mayo. Por tal motivo, se convocará una reunión a la 1:30 p. m. del día de hoy para definir la ruta de dichas visitas y coordinar con la interventoría, el municipio y un representante del contribuyente.

IV. TEMAS TRATADOS

El Comité Técnico Número Tres del convenio inició con la confirmación de la asistencia de los participantes. Asistieron Marcelino Ruiz Montaño (líder de Planeación Educativa del municipio), Beatriz Elena Yara Arias (supervisora del convenio por parte de CENIT), Germán Gómez (Ministerio de Educación) y Christian Camilo Hernández (Gerencia).


Se presentaron los tiempos de ejecución de cada uno de los contratos que intervienen en el proyecto. Se destacó que la fecha de inicio de la ejecución es el 13 de enero de 2025 y la fecha de finalización de la dotación es el 12 de junio de 2025, sin que hasta la fecha se hayan presentado variaciones.

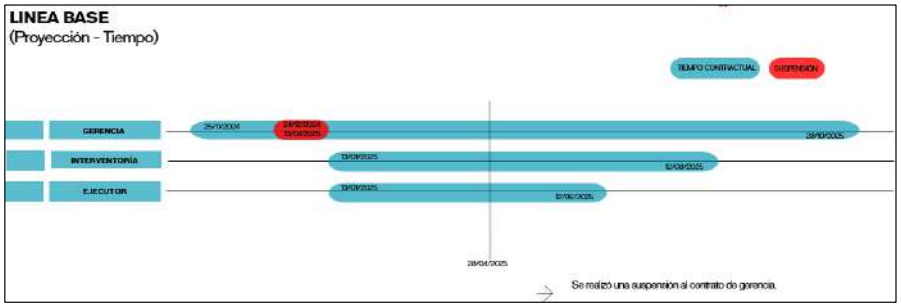

ACTA DE COMITÉ DEL CONVENIO 007 de 2023 - PROYECTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS BPIN 20230214000016

Comité No. 3 | CONVENIO 007 de 2023 | **FECHA:** 28 | 4 | 2025
(Fecha de realización del comité dd-mm-aa)

Adicionalmente, se presenta la distribución de las entregas en cuatro órdenes de bienes, con base en la cual se definió un cronograma de ejecución, cuya fecha de inicio fue el 15 de febrero de 2025 y cuya fecha de finalización está prevista para el 8 de junio de 2025.

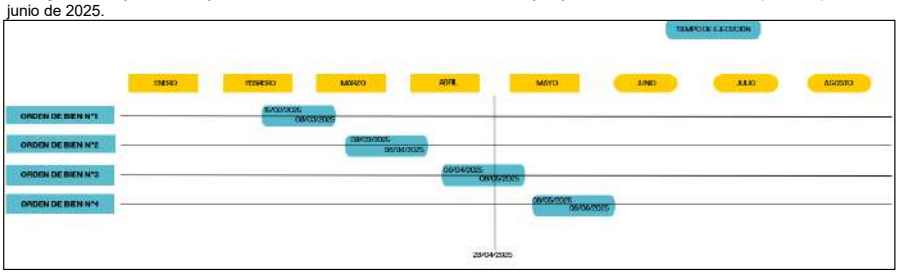

Se presentan los avances del proyecto de dotación, el cual se encuentra dividido en cuatro órdenes de bienes. Las órdenes uno y dos se encuentran completadas; la orden tres presenta un avance del 99,66 %, y la orden cuatro registra un avance del 29,77 %.


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ENTREGADO	POR ENTREGAR
1	PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR (1 MESA Y 3 SILLAS)	93	$ 252.197,00	$ 23.454.321,00	93	0
2	PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	2448	$ 145.321,00	$ 355.745.808,00	2448	0
3	PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	2223	$ 151.798,00	$ 337.446.954,00	2223	0
4	PUESTO DE AULA MEDIA (1 MESA Y 1 SILLA)	1004	$ 151.798,00	$ 152.405.192,00	1004	0
5	TABLERO PARA AULAS	161	$ 222.062,00	$ 35.751.982,00	161	0
6	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (1 MESA Y 1 SILLA)	161	$ 248.289,00	$ 39.974.529,00	161	0
7	SALA DE JUNTAS (1 MESA Y 6 SILLAS)	57	$ 1.776.879,00	$ 101.282.103,00	57	0
8	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	19	$ 717.304,00	$ 13.628.776,00	19	0
9	MODULO CASILLERO ALUMNOS	600	$ 587.779,00	$ 352.667.400,00	578	-22
10	MODULO CASILLERO DOCENTES	36	$ 726.299,00	$ 26.146.764,00	35	-1

% PROGRAMADO	84%
% EJECUTADO	99,66%
DIFERENCIA	16,06%



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ENTREGADO	POR ENTREGAR
1	PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR (1 MESA Y 3 SILLAS)	100	$ 252.197,00	$ 25.219.700,00	0	-100
2	PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	2237	$ 145.321,00	$ 325.083.077,00	1498	-739
3	PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	1821	$ 151.798,00	$ 276.424.158,00	116	-1705
4	PUESTO DE AULA MEDIA (1 MESA Y 1 SILLA)	551	$ 151.798,00	$ 83.640.698,00	0	-551
5	TABLERO PARA AULAS	151	$ 222.062,00	$ 33.531.362,00	0	-151
6	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (1 MESA Y 1 SILLA)	151	$ 248.289,00	$ 37.491.639,00	21	-130
7	SALA DE JUNTAS (1 MESA Y 6 SILLAS)	56	$ 1.776.879,00	$ 99.505.224,00	0	-56
8	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	24	$ 717.304,00	$ 17.215.296,00	0	-24
9	MODULO CASILLERO ALUMNOS	498	$ 587.779,00	$ 292.713.942,00	0	-498
10	MODULO CASILLERO DOCENTES	41	$ 726.299,00	$ 29.778.259,00	41	0


% PROGRAMADO	0%
% EJECUTADO	29,77%
DIFERENCIA	29,77%



Se presenta el avance total del proyecto el cual corrresponde al 83.39%, superando el programado en un 19%.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENTREGADO	POR ENTREGAR
1	PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR (1 MESA Y 3 SILLAS)	400	300	100
2	PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	8437	7698	739
3	PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	8225	6520	1705
4	PUESTO DE AULA MEDIA (1 MESA Y 1 SILLA)	3058	2507	551
5	TABLERO PARA AULAS	634	483	151
6	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (1 MESA Y 1 SILLA)	634	504	130
7	SALA DE JUNTAS (1 MESA Y 6 SILLAS)	209	153	56
8	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	85	61	24
9	MODULO CASILLERO ALUMNOS	2118	1598	520
10	MODULO CASILLERO DOCENTES	145	144	1

% PROGRAMADO	63,72%
% EJECUTADO	83,39%
DIFERENCIA	19,67%

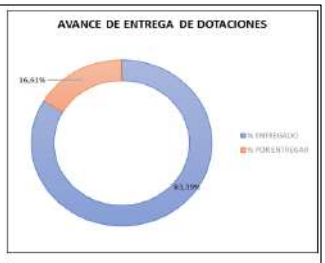

ACTA DE COMITÉ DEL CONVENIO 007 de 2023 - PROYECTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS BPIN 20230214000016

Comité No. 3 | CONVENIO 007 de 2023 | **FECHA:** 28 / 4 / 2025 (Fecha de realización del comité dd-mm-aa)

V. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso
1	La Gerencia programó una reunión para la 1:30 p. m. del día de hoy, con el fin de definir la ruta de las visitas y coordinar, junto con la interventoría, el municipio y un representante del contribuyente, las sedes a visitar.
2	La gerencia compartirá la presentación del presente comité a todos los asistentes.
3	
4	

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 26 (DIA) 5 (MES) 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIOCHO (Día en letras) **28** (Día en números) días del mes de **ABRIL** (Mes en que se firma el acta) de **2025** (Año de firma del acta)

(Firma)

Carolina Jackeline Barbanti Mansilla
Gerente del proyecto

ACTA DE COMITÉ DEL CONVENIO 007 de 2023 - PROYECTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS BPIN 20230214000016

Comité No. 4 | CONVENIO 007 de 2023 | **FECHA:** 26 | 5 | 2025
(Fecha de realización del comité dd-mm-aa)

CONTRIBUYENTE CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

GERENCIA CB INGENIEROS S.A.S

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	EMPRESA / ENTIDAD□	FIRMA
Beatriz Elena Yara Arias	CENIT/CONTRIBUYENTE	
German Rodrigo Gómez Vega	MEN	
Marcelino Ruiz Montaño	SECRETARIA DE EDUCACIÓN BUENAVENTURA	
Christian Camilo Hernández	CB INGENIEROS SAS	

II. OBJETO


Seguimiento al proyecto "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS
BPIN 20230214000016

III. RESUMEN


La reunión del Comité Técnico Número Cuatro contó con la asistencia de Marcelino Ruiz Montaño, Beatriz Elena Yara Arias, Germán Gómez y Christian Camilo Hernández. Durante el encuentro, se socializó el avance del proyecto de dotación, el cual alcanzó el 100,00 %, superando lo programado. Asimismo, se socializaron los recorridos realizados a varias instituciones educativas durante la semana anterior.

IV. TEMAS TRATADOS

Se socializó el avance del Convenio 007 de 2023, el cual se encuentra dentro de los tiempos previstos, sin que se hayan generado prórrogas. La ejecución de la orden de bien número cuatro finalizó los despachos la semana pasada, y se está a la espera de la confirmación por parte de la interventoría sobre la entrega total de las dotaciones, la cual se espera para el próximo Comité Técnico. Se reportó un avance del 100 % en la ejecución, frente a un 88,50 % programado, lo que representa un adelanto del 11,5 % en el proyecto.

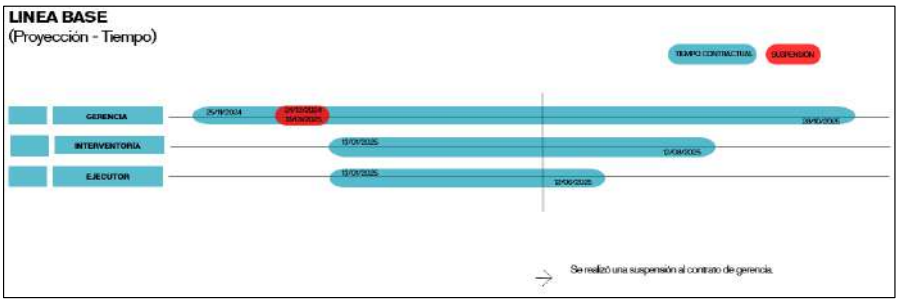

Adicionalmente, se presenta la distribución de las entregas en cuatro órdenes de bienes, a partir de la cual se estableció un cronograma de entregas con fecha de inicio el 15 de febrero de 2025 y fecha de finalización el 8 de junio de 2025.

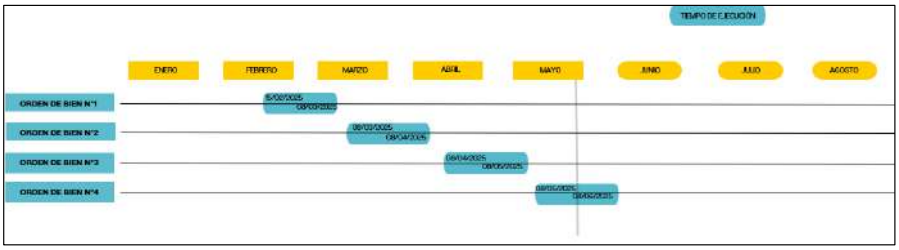

Se reportó un avance del 100 % en la ejecución, frente a un 88,50 % programado, lo que representa un adelanto del 11,5 % en el proyecto.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENTREGADO	POR ENTREGAR	% ENTREGADO	% POR ENTREGAR
1	PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR (1 MESA Y 2 SILLAS)	400	400	0	100,00%	0,00%
2	PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	8437	8437	0	100,00%	0,00%
3	PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	8225	8225	0	100,00%	0,00%
4	PUESTO DE AULA MEDIA (1 MESA Y 1 SILLA)	3058	3058	0	100,00%	0,00%
5	TABLERO PARA AULAS	654	654	0	100,00%	0,00%
6	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (1 MESA Y 1 SILLA)	654	654	0	100,00%	0,00%
7	SALA DE JUNTAS (1 MESA Y 6 SILLAS)	209	209	0	100,00%	0,00%
8	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	85	85	0	100,00%	0,00%
9	MODULO CASILLERO ALUMNOS	2118	2118	0	100,00%	0,00%
10	MODULO CASILLERO DOCENTES	145	145	0	100,00%	0,00%
		23045	23045	0	100,00%	0,00%



% PROGRAMADO	88,50%
% EJECUTADO	100,00%
DIFERENCIA	11,50%

URBANAS
I.E. Técnico Industrial Gerardo Valencia Cano
I.E. San Vicente
I.E. Liceo del Pacífico
I.E. Termarit
RURALES
I.E. Francisco Javier Cisneros
I.E. Nachasin
I.E. José María Córdoba

En la Institución Educativa Francisco Javier Cisneros, se verificó que las cantidades entregadas correspondían a lo contratado. Sin embargo, se identificó una novedad relacionada con la afectación de la marcación en los tableros, atribuida al uso de alcohol para borrarlos. Esta situación ya está siendo gestionada con la interventoría y el ejecutor.

En la Institución Educativa Nachasín, la dotación entregada también coincidía con lo previsto, se encontraba en buen estado y estaba en uso. No obstante, el rector informó que aún había dotación almacenada pendiente de distribución.

Condiciones similares se evidenciaron en la Institución Educativa Agropecuario José María Córdoba, donde también se presentó el inconveniente de la marcación borrada en los tableros.

En las Instituciones Educativas San Vicente, Liceo del Pacífico, Técnico Industrial Gerardo Valencia Cano y Termarit, se constató que las cantidades de dotación entregadas correspondían a lo contratado, se encontraban en uso y en óptimas condiciones. No obstante, se observó nuevamente la novedad recurrente de la marcación borrada en los tableros.

Beatriz Elena Yara Arias señaló que en el Liceo del Pacífico se identificaron aulas con mobiliario nuevo, pero con tableros antiguos. Lorena Castañeda confirmó que ya se había solicitado la corrección de esta situación. Asimismo, se observó que los casilleros de estudiantes no estaban presentes en todas las aulas visitadas, por lo que se generó la respectiva observación para su subsanación, solicitándose además un registro fotográfico del mobiliario completo.

Beatriz Elena Yara Arias también manifestó que los casilleros apilados representaban un riesgo para la seguridad, razón por la cual se solicitó que no fueran colocados uno encima del otro.

VISITA IE FRANCISCO JAVIER CISNEROS


Reunión inicial Participantes - Rector


Inspección de Casilleros




Vista de puestos de trabajo - instalados en aula

VISITA IE NACHASIN


Reunión inicial Participantes - Rector


Inspección de puestos trabajo preescolar


Inspección marcación P.T. preescolar


Inspección P.T. primaria en uso

ACTA DE COMITÉ DEL CONVENIO 007 de 2023 - PROYECTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS BPIN 20230214000016

Comité No. 4 CONVENIO 007 de 2023 **FECHA:** 26 | 5 | 2025
(Fecha de realización del comité dd-mm-aa)

VISITA IE AGROPECUARIO JOSÉ MARÍA CORDOBA



Vista de puestos de trabajo secundaria instalados en aula



Vista de puestos de trabajo primaria — Tableros instalados en aula

REGISTRO FOTGRÁFICO
IE SAN VICENTE



Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado



Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado – casilleros alumnos

IE LICEO DEL PACIFICO



Vista de aula secundaria con mobiliario entregado



Vista de aula secundaria con mobiliario entregado

IE TECNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO



Reunion con Rectora de la Institucion educativa



Vista de aulas terminadas con mobiliario entregado – casilleros alumnos

IE TERMARIT



Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado – casilleros instalados



Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado – casilleros y tablero instalados

V. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso
1	La gerencia compartirá la presentación del presente comité a todos los asistentes.
2	
3	
4	

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 26 (DIA) | 5 (MES) | 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIOCHO (Día en letras) **28** (Día en números) días del mes de **ABRIL** (Mes en que se firma el acta) de **2025** (Año de firma del acta)

(Firma)

Carolina Jackeline Barbanti Mansilla
Gerente del proyecto

ACTA DE COMITÉ DEL CONVENIO 007 de 2023 - PROYECTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS BPIN 20230214000016

Comité No. 5 | CONVENIO 007 de 2023 | **FECHA:** 26 | 6 | 2025
(Fecha de realización del comité dd-mm-aa)

CONTRIBUYENTE CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS

GERENCIA CB INGENIEROS S.A.S

I. PARTICIPANTES

NOMBRE	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Beatriz Elena Yara Arias	CENIT/CONTRIBUYENTE	
German Rodrigo Gómez Vega	MEN	
Marcelino Ruiz Montaño	SECRETARIA DE EDUCACIÓN BUENAVENTURA	
Christian Camilo Hernández	CB INGENIEROS SAS	

II. OBJETO

Seguimiento al proyecto "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS
BPIN 20230214000016

III. RESUMEN


El Comité revisó los avances del Convenio 007 de 2023, incluyendo la finalización de la ejecución del proyecto y la entrega de 23.945 conjuntos de dotaciones en Buenaventura, verificados por la interventoría, el Ministerio y la Gerencia.

Durante la sesión, se discutió la continuidad mensual de los comités hasta el cierre del convenio y de los contratos asociados. Asimismo, se abordaron temas relacionados con la revisión de pagos e informes, incluyendo la recopilación y consolidación de los mismos.

El próximo Comité se programó para el 4 de agosto, con el fin de tratar asuntos relacionados con el cierre de contratos y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

IV. TEMAS TRATADOS


Se socializó el avance del Convenio 007 de 2023, el cual se encuentra dentro de los tiempos previstos, sin haberse generado prórrogas. La ejecución del proyecto se completó al 100 % dentro del plazo establecido, incluyendo la entrega de 23.945 conjuntos de dotaciones, verificados en campo por la interventoría, el Ministerio y la Gerencia. Las dotaciones fueron distribuidas en 64 sedes educativas del distrito de Buenaventura.

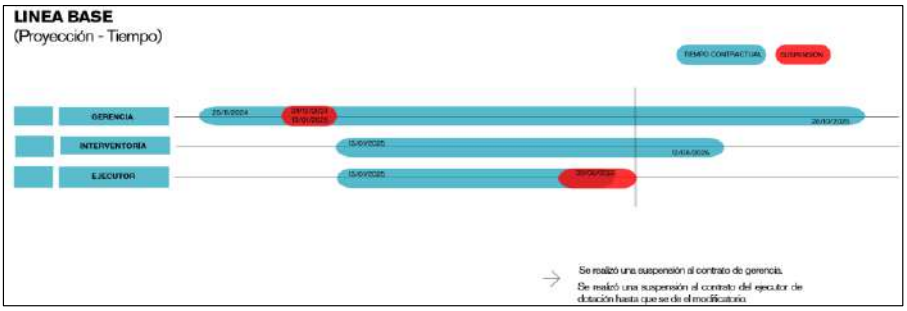

ACTA DE COMITÉ DEL CONVENIO 007 de 2023 - PROYECTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS BPIN 20230214000016


Comité No.	5	CONVENIO 007 de 2023	FECHA:	26	6	2025
				(Fecha de realización del comité dd-mm-aa)		

Adicionalmente, se presenta la distribución de las entregas en cuatro órdenes de bienes, a partir de la cual se estableció un cronograma con fecha de inicio el 15 de febrero de 2025 y fecha de finalización el 8 de junio de 2025.

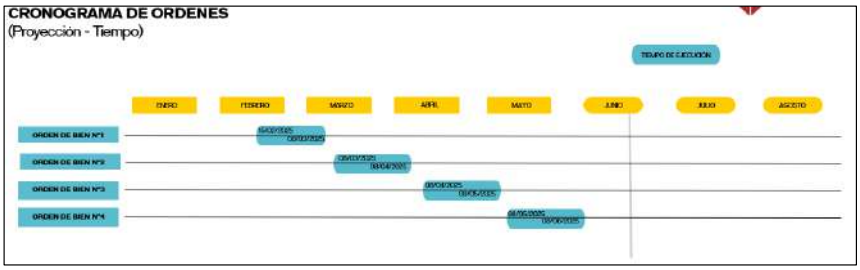

Se reportó un avance del 100 %, con un total de 23.945 conjuntos entregados.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ENTREGADO	POR ENTREGAR	% ENTREGADO	% POR ENTREGAR
1	PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR (1 MESA Y 3 SILLAS)	400	400	0	100,00%	0,00%
2	PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	8437	8437	0	100,00%	0,00%
3	PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA (1 MESA Y 1 SILLA)	8225	8225	0	100,00%	0,00%
4	PUESTO DE AULA MEDIA (1 MESA Y 1 SILLA)	3058	3058	0	100,00%	0,00%
5	TABLERO PARA AULAS	634	634	0	100,00%	0,00%
6	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE (1 MESA Y 1 SILLA)	634	634	0	100,00%	0,00%
7	SALA DE JUNTAS (1 MESA Y 6 SILLAS)	209	209	0	100,00%	0,00%
8	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	85	85	0	100,00%	0,00%
9	MODULO CASILLERO ALUMNOS	2118	2118	0	100,00%	0,00%
10	MODULO CASILLERO DOCENTES	345	345	0	100,00%	0,00%
		23945	23945	0	100,00%	0,00%



% PROGRAMADO	100,00%
% EJECUTADO	100,00%
DIFERENCIA	0,00%

Se destacó que no se han recibido observaciones por parte de las instituciones respecto a la calidad de los insumos entregados. Sin embargo, se mantiene el seguimiento con la interventoría del Ministerio para identificar posibles observaciones o solicitudes adicionales. Cualquier comentario futuro será comunicado a todas las partes involucradas.

La ENC (ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE) aclaró que los comités deben continuar reuniéndose mensualmente hasta que el convenio y los contratos estén vigentes, con el fin de cumplir con las obligaciones y documentar adecuadamente el proceso de liquidación.

Desde la Gerencia se solicitó colaboración para la firma de las actas de comités previos y se comprometió a compartir el acta del presente comité.

El MEN (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL) indicó que no existen inconvenientes con la aprobación de los informes de la interventoría, y que se están ajustando las aprobaciones de pagos. Se iniciará la revisión de los costos variables, las actas de entrega del mobiliario, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales. La ENC (ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE) enfatizó la importancia de recopilar los informes del proyecto para el proceso de cierre.

VISITA IE FRANCISCO JAVIER CISNEROS


Reunión inicial Participantes - Rector


Inspección de Casilleros


Vista de puestos de trabajo - instalados en aula



VISITA IE NACHASIN


Reunión inicial Participantes - Rector


Inspección de puestos trabajo preescolar


Inspección marcación P.T. preescolar


Inspección P.T. primaria en uso

ACTA DE COMITÉ DEL CONVENIO 007 de 2023 - PROYECTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" ASIGNADO A CENIT – TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS BPIN 20230214000016

Comité No. 5 CONVENIO 007 de 2023 **FECHA:** 26 | 6 | 2025
(Fecha de realización del comité dd-mm-aa)

VISITA IE AGROPECUARIO JOSÉ MARÍA CORDOBA



Vista de puestos de trabajo secundaria instalados en aula



Vista de puestos de trabajo primaria — Tableros instalados en aula

REGISTRO FOTGRÁFICO
IE SAN VICENTE



Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado



Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado – casilleros alumnos

IE LICEO DEL PACIFICO



Vista de aula secundaria con mobiliario entregado



Vista de aula secundaria con mobiliario entregado

IE TECNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO



Reunion con Rectora de la Institucion educativa



Vista de aulas terminadas con mobiliario entregado – casilleros alumnos

IE TERMARIT



Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado – casilleros instalados



Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado – casilleros y tablero instalados

V. COMPROMISOS PACTADOS

No.	Descripción del compromiso
1	La gerencia compartirá la presentación del presente comité a todos los asistentes.
2	
3	
4	

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 4 (DIA) | 8 (MES) | 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTISEIS (Día en letras) **26** (Día en números) días del mes de **junio** (Mes en que se firma el acta) de **2025** (Año de firma del acta)

(Firma)

Carolina Jackeline Barbanti Mansilla
Gerente del proyecto

Educación

Radicado No.
2025-EE-111302
2025-04-25 07:18:46 p. m.

Bogotá, D.C., 25 de abril de 2025

Arquitecto
HERNANDO ALBERTO CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC
info@jasb.com.co

Asunto: Aprobación tercer informe mensual del contrato de interventoría No. COP1.PCCNTR.6741523, "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA".

Respetado Arquitecto Hernando:

En atención a la comunicación al Ministerio de Educación Nacional con el consecutivo OFICIO 753-044 del 09 de 2025, por medio de la cual se allegó el tercer informe mensual del contrato de interventoría **No. COP1.PCCNTR.6741523,** suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la firma ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S B.I.C (identificado con el NIT No. **901.506.750-7**), que tiene por objeto *REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", por el mecanismo obras por impuestos*, a cargo del contribuyente, *CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.* para el período comprendido entre el 1 de marzo de 2025 al 31 marzo de 2025; esta supervisión se permite informar lo siguiente:

En conjunto con el grupo de apoyo a la supervisión de este Ministerio, se revisó el informe con sus respectivos anexos, de conformidad con las condiciones contractuales establecidas, evidenciando que cumple con los requisitos y condiciones necesarias para emitir la aprobación requerida para tramitar ante la FIDUCIARIA (previa aprobación de la gerencia - contribuyente, quien contrató las obras), el pago No.3 del contrato relacionado en el asunto.

Por lo anterior, el valor que puede ser cobrado para el período en comento, es el siguiente:

Costos fijos:
Por la suma de TREINTA Y UN MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ $31.101.978,30) M/CTE.

Costos variables (avance de visitas):
Para este periodo no se realiza pago por este concepto, lo anterior teniendo en cuenta la forma de pago de los costos variables

"(...) Los pagos por costos variables se realizarán con la radicación de las respectivas actas de visita originales con registro fotográfico y la verificación y aprobación por parte del supervisor de las actas para tramite de pago de órdenes de compra objeto de interventoría. (...)"

Porcentaje de avance físico acumulado del proyecto = 33.8%.
Porcentaje de avance físico para este periodo = 23.1 %
Costo variable asociado al primer informe, NO APLICA PARA ESTE PERIODO.

En conclusión, el valor que puede ser cobrado para el primer período (fijo + variable), es por la suma de TREINTA Y UN MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($31.101.978,30) M/CTE. (incluido IVA).

Cordialmente,



Firmado digitalmente por:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
25/04/2025 7:18:49 p. m.

DIANA MILENA MALDONADO TORRES
Profesional Especializado
Oficina de Infraestructura Educativa

Folios: 3
Anexos: 1
Nombre anexos: 7. INFORME DE INTERVENTORÍA MENSUAL MARZO 2025.pdf

Copia externa:
CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. - Carolina Parra - Apoyo Contribuyente - carolina.parra.externo@cenit-transporte.com
CB INGENIEROS - - MIGUEL ANGEL SALGADO - APOYO A LA GERENCIA - info@jasb.com.co

Elaboró:
GERMAN RODRIGO GOMEZ VEGA
Contratista
Oficina de Infraestructura Educativa

Aprobó:
DIANA MILENA MALDONADO TORRES
Profesional Especializado
Oficina de Infraestructura Educativa

Educación

Radicado No.
2025-EE-241237
2025-08-21 03:06:43 p. m.

Bogotá, D.C., 21 de agosto de 2025

Arquitecto
HERNANDO ALBERTO CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC
info@jasb.com.co

Asunto: Aprobación cuarto informe mensual del contrato de interventoría No. COP1.PCCNTR.6741523, "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA".

Respetado Arquitecto Hernando:

En atención a la comunicación al Ministerio de Educación Nacional con el consecutivo OFICIO 753-069 del 17 de junio de 2025, por medio de la cual se allegó el cuarto informe mensual del contrato de interventoría **No. COP1.PCCNTR.6741523,** suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la firma ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S B.I.C (identificado con el NIT No. **901.506.750-7**), que tiene por objeto *REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", por el mecanismo obras por impuestos*, a cargo del contribuyente, *CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.* para el período comprendido entre el 13 de abril de 2025 al 12 de mayo de 2025; esta supervisión se permite informar lo siguiente:

En conjunto con el grupo de apoyo a la supervisión de este Ministerio, se revisó el informe con sus respectivos anexos, de conformidad con las condiciones contractuales establecidas, evidenciando que cumple con los requisitos y condiciones necesarias para emitir la aprobación requerida para tramitar ante la FIDUCIARIA (previa aprobación de la gerencia - contribuyente, quien contrató las obras), el pago No.4 del contrato relacionado en el asunto.

Por lo anterior, el valor que puede ser cobrado para el período en comento, es el siguiente:

Costos fijos:

Por la suma de TREINTA Y UN MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ $31.101.978,30) M/CTE.

Costos variables (avance de visitas):
Para este periodo no se realiza pago por este concepto, lo anterior teniendo en cuenta la forma de pago de los costos variables

"(...) Los pagos por costos variables se realizarán con la radicación de las respectivas actas de visita originales con registro fotográfico y la verificación y aprobación por parte del supervisor de las actas para tramite de pago de órdenes de compra objeto de interventoría. (...)"

Porcentaje de avance físico programado del proyecto = 78.40 %.
Porcentaje de avance físico ejecutado del proyecto = 94.09 %

Costo variable asociado al primer informe, NO APLICA PARA ESTE PERIODO.

En conclusión, el valor que puede ser cobrado para el primer período (fijo + variable), es por la suma de TREINTA Y UN MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($31.101.978,30) M/CTE. (incluido IVA).

Con el presente se da alcance a la comunicación con radicado 2025-EE-054415 con la cual se aprueba al pago No 4 del presente contrato, lo anterior ya que se corrige el concepto de avance total del proyecto, el cual se ratifica en 94.09 %

Cordialmente,



Firmado digitalmente por:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
21/08/2025 3:06:46 p. m.

DIANA MILENA MALDONADO TORRES
Profesional Especializado
Oficina de Infraestructura Educativa

Folios: 3
Anexos:
Nombre anexos:

Copia externa:
CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. - Carolina Parra - Apoyo Contribuyente - carolina.parra.externo@cenit-transporte.com
CB INGENIEROS - MIGUEL ANGEL SALGADO - APOYO A LA GERENCIA - miguel.salgado@cbingenieros.com

Elaboró:
GERMAN RODRIGO GOMEZ VEGA
Contratista
Oficina de Infraestructura Educativa

Aprobó:
DIANA MILENA MALDONADO TORRES
Profesional Especializado
Oficina de Infraestructura Educativa

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		15	Mar	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Francisco Javier Cisneros		
Sede Educativa	El salto		
Dirección	Zona Rural.	Teléfono	3166641385
Rector y/o Encargado	Robei Herrera Valdes		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	/	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	/	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	23	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	23	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	3	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
TABLERO	4	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	/	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Manrique Moreno
Cargo:	Dpr. Campo Interventoría
Teléfono:	3182225645
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Robert Herrera J.
Cargo:	Rector
Teléfono:	3166441385

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		17	Mar	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Francisco Javier Cisneros		
Sede Educativa	Hector Epalza Quintero		
Dirección	Zona Rural.	Teléfono	316 664 1385
Rector y/o Encargado	Rober Herrera Valdes.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	12 -	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	4 -	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	89 -	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	89 -	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	31 -	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	31 -	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	14 -	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6 -	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6 -	
TABLERO	6 -	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1 -	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1 -	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Hoskes Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205643
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Robert Hernandez.
Cargo:	Rector.
Teléfono:	3166413847

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		13	Mar	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Francisco Javier Cisneros.		
Sede Educativa	La Gran Colombia		
Dirección	la Delfina.	Teléfono	316 664 1385
Rector y/o Encargado	Rober Herrera Valdes		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	15	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	5	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	49	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	49	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	89	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	89	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	16	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	7	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	7	
TABLERO	7	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	2	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	2	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	12	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Manrique Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoria
Teléfono:	3182205643
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Robert Herrera.
Cargo:	Rector
Teléfono:	3166441385

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	3164120693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		10	Mar	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Francisco Javier Cisneros		
Sede Educativa	Principal		
Dirección	Corregimiento de Cisneros	Teléfono	3166441385
Rector y/o Encargado	Rober Herrera Valdes.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	15	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	5	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	100	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	100	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	288	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	288	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	41	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	16	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	16	
TABLERO	16	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	2	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	3	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	18	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nocen Mantilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoria
Teléfono:	3182205645
Correo:	n

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Rose Herrera.
Cargo:	Rc-tev.
Teléfono:	3166441381

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal.
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		17	Mar	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Francisco Javier Cisneros		
Sede Educativa	Brisas del Pacífico.		
Dirección	Zona Rural.	Teléfono	3166641385
Rector y/o Encargado	Rober Herrera Valdes		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	3	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	1	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	6	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	6	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	1	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	1	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	1	
TABLERO	1	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Heiken Mantilla Moreno
Cargo:	Prof. Compo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Robe Hernández
Cargo:	Rector
Teléfono:	316 644 1385

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316. 412. 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		14	Mar	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Francisco Javier Cisneros		
Sede Educativa	Carlos Borrero Sinisterra		
Dirección	Vereda Triana Km 43	Teléfono	3166641385
Rector y/o Encargado	Rober Herrera Valdes.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	15	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	5	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	66	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	66	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	8	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
TABLERO	4	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1'	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6'	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nesmen Mantilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Rolfe Heinz V.
Cargo:	Rector
Teléfono:	3166441385

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal.
Teléfono:	316.412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		28	feb	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	La Anunciación.		
Sede Educativa	Principal.		
Dirección	Calle 7# 29-50.	Teléfono	3184507730.
Rector y/o Encargado	Janeth Riascos Hurtado.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	15	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	45	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	259	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	259	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	652	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	652	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	96	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	22	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	22	
TABLERO	22	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	5	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	3	
MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	8	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	48	

MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Hesbon Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoria
Teléfono:	3182205645
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Marcela Orozco Hurtado
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3148507730

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime Alino Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		06	Mar	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Las Americas		
Sede Educativa	Carlos Holmes Trujillo.		
Dirección		Teléfono	
Rector y/o Encargado	Juan Demetrio Panameño.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	/	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	/	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	184	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	184	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	349	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	349	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	54	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	9	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	9	
TABLERO	9	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	3	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	/	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	4	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	24	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Montilla Moreno
Cargo:	Prof Campo Interventoria
Teléfono:	3182205645
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Juan D. Panameño
Cargo:	Rector
Teléfono:	3162328700.

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante Legal.
Teléfono:	316.412.0693.

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		10	Mar	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Las Americas.		
Sede Educativa	Dignidad.		
Dirección		Teléfono	
Rector y/o Encargado	Juan Demetrio Paramento.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	48	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	16	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	295	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	295	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	283	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	283	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	63	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	12	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	12	
TABLERO	12	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	3	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	3	
MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	5	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	30	

MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Alvaro D. Panameño
Cargo:	Rector
Teléfono:	3162328700

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal.
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		04	mar	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Las Americas.		
Sede Educativa	Principal.		
Dirección	Carrera 65 # 69-00	Teléfono	3162328900
Rector y/o Encargado	Juan Demetrio Panameño		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	27	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	9	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	290	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	290	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	359	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	359	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	68	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	10	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	10	
TABLERO	10	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	4	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	2	
MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	36	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nescah Martilla Moreno
Cargo:	Prof Campo Interventoria
Teléfono:	3192205695
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Iván D. Panameño
Cargo:	Rector
Teléfono:	3162329700

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		03	mar	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Las Americas		
Sede Educativa	Bahía.		
Dirección		Teléfono	
Rector y/o Encargado	Juan Demetrio Panameño.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	27	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	9	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	317	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	317	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	463	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	463	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	81	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	14	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	14	
TABLERO	14	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	3	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	2	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	4	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	24	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C
Firma:
Nombre: Nestor Montilla Moreno
Cargo: Prof. Campo Interventoría
Teléfono: 3182205645
Correo:

INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Juan Demetrio Paramo V.
Cargo: Rector
Teléfono: 3162328700

MANUFACTURAS SUMAPAZ
Firma:
Nombre: Jaime A. Carreño Moreno
Cargo: Representante legal
Teléfono: 316 412 0693.

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		19	Mar	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Niño Jesus de Praga.		
Sede Educativa	Antonio Jose Ruiz		
Dirección	Crucero Bajo Calima Km 9	Teléfono	3155621170
Rector y/o Encargado	Mirian Angulo Mosquera		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	6 ✓	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	2 ✓	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	52 ✓	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	52 ✓	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	97 -	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	97 -	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	16 ✓	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	12 ✓	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	12 ✓	
TABLERO	12 ✓	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	2 ✓	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1 ✓	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	3 ✓	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	18 ✓	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Hasler Marlith Moreno
Cargo:	Prof. Apoyo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Hinan Angulo Mosquera
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3155621170

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal.
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		20	Mar	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Niño Jesus de praga.		
Sede Educativa	Escuela la Brea		
Dirección	Vereda la Brea	Teléfono	3155621170
Rector y/o Encargado	Mirian Angulo Mosquera		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	9	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	3	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	35	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	35	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	5	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
TABLERO	4	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Manrique Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoria
Teléfono:	3182205645
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Hernan Angulo Mosquera
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3155621170

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno.
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	3164120693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		21	Mar	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Niño Jesus de Praga.		
Sede Educativa	Francisco Eladio Ramirez.		
Dirección	Vereda Camila Bajo.	Teléfono	3155621170
Rector y/o Encargado	Miriam Angulo Mosquera		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	/	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	/	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	3	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	3	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	1	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	2	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	2	
TABLERO	2	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	/	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Montilla
Cargo:	Prof. Apoyo Interventoría
Teléfono:	3182203645
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Hiran Angulo Hoyos
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3155621170

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal.
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		22	Mar	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Niño Jesus de Praga.		
Sede Educativa	las Brisas		
Dirección	Comunidad las brisas	Teléfono	3155621170.
Rector y/o Encargado	Mirian Angulo Mosquera		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	/	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	/	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	2	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	2	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	1	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	2	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	2	
TABLERO	2	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	/	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Wilson Morillo M
Cargo:	Prof. Apoyo Interventoría
Teléfono:	3187205649
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Hernan Angulo M.
Cargo:	Rector
Teléfono:	3155621170

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante Legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		19	mar	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Niño Jesus de Praga		
Sede Educativa	Marina Solano.		
Dirección	vereda villa estela Km.2	Teléfono	3155621170
Rector y/o Encargado	Mirian Angolo Mosquera		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	30 ✓	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	10 ✓	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	64 ✓	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	64 ✓	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	103 ✓	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	103 ✓	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	20 ✓	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	12 ✓	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	12 ✓	
TABLERO	12 ✓	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	2 ✓	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	2 ✓	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	3	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	18	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Neskar Mauricio M.
Cargo:	Prof. Apoyo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Homan Angulo Hosquera
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3155621120

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal.
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		17	Mar	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Niño Jesus de Praga.		
Sede Educativa	Principal.		
Dirección	Bajo calima la colonia	Teléfono	3155621170.
Rector y/o Encargado	Miriam Angulo mosquera		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	72	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	24	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	176	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	176	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	193	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	193	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	45	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	18	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	18	
TABLERO	18	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	3	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	4	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	5 ✓	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	30 ✓	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C
Firma:
Nombre: Nestor Montilla M.
Cargo: Prof. Apoyo Interventoria
Teléfono: 3182208645
Correo:

INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Hernan Angulo Hosguera
Cargo: Rectora
Teléfono: 3155621170

MANUFACTURAS SUMAPAZ
Firma:
Nombre: Jaime A. Carreño Moreno.
Cargo: Representante Legal.
Teléfono: 316.412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

cenit TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS · MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C NIT 901.506.750-7 **FORMATO DE VISITA**	Ministerio de Educación

LUGAR DE REUNIÓN: Buenaventura	HORA DE INICIO: 8:00 a.m.
FECHA: 22 de mayo de 2025	HORA DE TERMINACIÓN: 2:00 PM
ELABORADO POR: Alianza Integral de Proyectos S.A.S B.I.C	VISITA A INSTITUCIONES DEUCATIVAS DIA 2
TIPO DE VISITA TÉCNICO [X]	GERENCIA [ ]


OBJETIVOS DE LA VISITA	
1	• Realizar el recorrido en las cuatro instituciones educativas que fueron escogidas para realizar la inspección visual del mobiliario entregado en las sedes urbanas

AGENDA PROPUESTA	
2	*. Punto de encuentro IE San Vicente, socialización y propósito de la visita al dirigida al rector y personal encargado. Recorrido por las aulas del colegio verificando los elementos entregados.* *. Recorrido y Visita a la segunda IE Pacífico, socialización y propósito de la visita al dirigida al rector y personal encargado. Recorrido por las aulas del colegio verificando los elementos entregados* *. Recorrido y Visita a la segunda IE TI Gerardo Valencia Cano, socialización y propósito de la visita al dirigida al rector y personal encargado. Recorrido por las aulas del colegio verificando los elementos entregados.* *. Recorrido y Visita a la segunda IE Termarit, socialización y propósito de la visita al dirigida al rector y personal encargado. Recorrido por las aulas del colegio verificando los elementos entregados.*

La visita de campo se realiza con la participación de los siguientes profesionales:

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA O CONTRATISTA	FIRMA
1	German Rodrigo Gómez Vega	Oficina de infraestructura Educativa	MEN	
1	Camilo Hernández	Gerencia contrato	CB IINGENIEROS	
2	Charlie Alfonso Castañeda	Entrega Mobiliario Sumapaz	MANUFACTURAS SUMAPAZ	
3	Donny Paul Valentierra A.	Profesional visitas de entrega	TF AUDITORES	
4	Marcelino Ruiz Montaño	Líder de Planeación educativa	SECRETARIA DE EDUCACIÓN BUENAVENTURA	

5	Beatriz Helena Yara Arias	Cenit - Transporte	CENIT	
7	Jaime Oswaldo Gil Silva	Apoyo Jurídico OXI - Cenit	CENIT	
8	Hernando A. Castellanos	Director de Interventoría	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. B.I.C.	



Se inicia la visita con todos los representantes de las entidades participantes, teniendo como punto de encuentro e inicio de las visitas el **IE SAN VICENTE** en la localidad de Buenaventura, a esta Visita estuvo presente el señor Rector Carlos Aníbal Riascos, a quien se le hizo la presentación de los participantes y el objetivo de esta asi mismo el acompañó el recorrido en las aulas que fueron inspeccionadas como parte de la verificación de la que fue objeto de entrega del mobiliario escolar.

Se hizo la inspección de conjuntos de mobiliario (puesto de trabajo), de silla y mesa en área de secundaria, asi como de salones de primaria y preescolar, se verifica casilleros alumnos, casilleros docentes y de almacenamiento aula, muebles de docente y sala de juntas e instalación de tableros.

La segunda visita se realiza en la **IE LICEO DEL PACIFICO**, donde fuimos recibidos por la señora rectora Claudia Nayibe Patiño Hurtado y los representantes de su institución, donde se realiza la presentación de los participantes de la visita. **NOTA**: en esta institución se instalaron tableros en su totalidad, teniendo asi mismo entregas de puestos de trabajo, que fueron superiores en cantidad a la totalidad de los tableros, por esta razón se presentan aulas con dotación de puestos de trabajo, alumnos y docente, asi como de gabinetes para alumnos, pero el tablero que se tiene es el existente.

Se hizo la inspección de conjuntos de mobiliario (puesto de trabajo), de silla y mesa en área de secundaria, asi como de salones de primaria y preescolar, se verifica casilleros alumnos, casilleros docentes y de almacenamiento aula, muebles de docente y sala de juntas e instalación de tableros.

La tercera visita se realiza en la **IE TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO**, donde se realizó la presentación de los participantes de la visita a la señora Rectora Beatriz Panchano, quien con su grupo de trabajo realizó el acompañamiento a las aulas de secundaria y primaria.

Se hizo la inspección de conjuntos de mobiliario (puesto de trabajo), de silla y mesa en área de secundaria, asi como de salones de primaria y preescolar, se verifica casilleros alumnos, casilleros docentes y de almacenamiento aula, muebles de docente y sala de juntas e instalación de tableros.

Finalmente se realiza la cuarta visita en **LA IE TERMARIT**, donde se realizó la presentación de los participantes de la visita a la señora Rectora Hermelia Tobar, quien con su grupo de trabajo realizó el acompañamiento a las aulas de secundaria, primaria y p

Se hizo la inspección de conjuntos de mobiliario (puesto de trabajo), de silla y mesa en área de secundaria, asi como de salones de primaria y preescolar, se verifica casilleros alumnos, casilleros docentes y de almacenamiento aula, muebles de docente y sala de juntas e instalación de tableros.

Fin de la visita.


REGISTRO FOTGRÁFICO
IE SAN VICENTE




Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado




Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado – casilleros alumnos

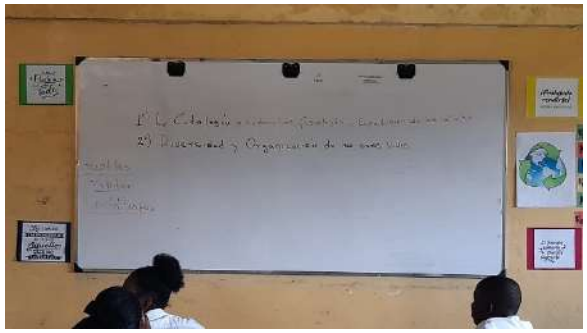



Tablero instalado - Vista de aula secundaria con mobiliario entregado




Vista de aulas secundaria con mobiliario entregado – puestos de trabajo preescolar



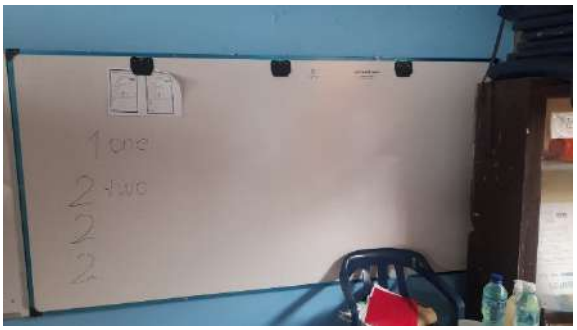

Puesto de trabajo docente – tablero instalado



Profesionales de visita – rector de la institución educativa

IE LICEO DEL PACIFICO




Vista de aula secundaria con mobiliario entregado




Vista de aula secundaria con mobiliario entregado




Vista de gabinetes alumnos



Profesionales de visita – rectora de la institución educativa

IE TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO



Reunión con Rectora de la Institución educativa





Vista de aulas primaria con mobiliario entregado – casilleros alumnos





Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado – Tablero instalado




Vista de aulas secudaría con mobiliario entregado – Tablero instalado




Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado – casilleros instalados




Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado – casilleros instalados




Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado – puesto de trabajo docente

IE TERMARIT




Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado – casilleros instalados




Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado – casilleros y tablero instalados




Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado





Vista de aulas secundaría con casillero y tablero instalados




Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado – tablero instalado




Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado – tablero instalado




Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado




Vista de aulas secundaría con mobiliario entregado

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		11	feb	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Tecnico Industrial Gerardo Valencia Cano.		
Sede Educativa	Alfonzo Lopez Pumarejo.		
Dirección	Korrera 47d # 17	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Beatriz Panchano Mena.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	1	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	1	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	1	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	1	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	227	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	227	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	23	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	10	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	10	
TABLERO	10	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	3	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	4	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	24	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Yesica Mantilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Patricia Pacheco Ruiz
Cargo:	Rectora.
Teléfono:	3152830813.

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	JAIME A. CARREÑO MORENO
Cargo:	Representante Legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO - SEDE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO - ALFONSO LOPEZ PUMAREJO
	
DESCARGUE Y UBICACIÓN DE MOBILIRIAO ESCOLAR EN LAS RESPECTIVAS AULAS	SILLAS DE TRABAJO DESCARGADOS EN LAS AULAS
	
PUESTOS DE TRABAJO EN AREA HABILITADA	PUESTOS Y SILLAS DE TRABAJO (PREESCOLAR) DESCARGADAS

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		13	feb	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Tecnico Industrial Gerardo Valencia Cano		
Sede Educativa	Olimpico.		
Dirección	Kamera 47d # 17	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Beatriz Panchano Mena		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	24	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	8	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	115	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	115	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	14	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
TABLERO	6	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	2	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	2	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	12	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C

Firma:

Nombre: Nestor Montilla Moreno
Cargo: Inf. Campo Interventoría
Teléfono: 3182205645
Correo:

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Nombre: Beatriz Randano Mena
Cargo: Rectora
Teléfono: 3152830813

MANUFACTURAS SUMAPAZ

Firma:

Nombre: JAIME A. CARREÑO MORENO
Cargo: Representante Legal
Teléfono: 316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		14	feb	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Tecnico Industrial Gerardo Valencia Cano.		
Sede Educativa	6 de Enero		
Dirección	Karrera 47d # 17	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Beatriz. Panchano Mena.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	15	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	5	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	100	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	100	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	12	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
TABLERO	6	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	2	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Manfolio Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoria
Teléfono:	3182205645
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Beatriz Pancho Mina
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3152830813

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	JAIME A. CARREÑO MORENO
Cargo:	Representante Legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		13	feb	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Tecnico Industrial Gerardo Valencia Cano		
Sede Educativa	Olimpico.		
Dirección	Kamera 47d # 17	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Beatriz Panchano Mena		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	24	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	8	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	115	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	115	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	14	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
TABLERO	6	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	2	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	2	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	12	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C

Firma:

Nombre: Nestor Montilla Moreno
Cargo: Inf. Campo Interventoría
Teléfono: 3182205645
Correo:

INSTITUCION EDUCATIVA

Firma:

Nombre: Beatriz Randano Mena
Cargo: Rectora
Teléfono: 3152830813

MANUFACTURAS SUMAPAZ

Firma:

Nombre: JAIME A. CARREÑO MORENO
Cargo: Representante Legal
Teléfono: 316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO - SEDE OLIMPICO	SE DA INICIO AL DESCARGUE Y UBICACIÓN DE MOBILIARIO SEDE OLIMPICO
	
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION ESCOLAR	SILLAS DE TRABAJO Y CASILLEROS PRESENTADOS
	
PRESENTACION DE AULA DE CLASES	PUESTOS Y SILLAS DE TRABAJO UBICADAS EN LAS AULAS

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		10	feb	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Tecnico Industrial Gerardo Valencia Cano.		
Sede Educativa	Principal		
Dirección	Kamera 55c # 7 -18ª	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Beatriz Panchano Mena.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	/	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	/	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	98	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	98	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	1.035	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	1.035	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	114	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	39	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	39	
TABLERO	39	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	6	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	/	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	10	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	60	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nescen Mantilla Moreno
Cargo:	prof. Campo Interventoria
Teléfono:	3187203645
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Beatriz Ranchano Olaya.
Cargo:	Rector
Teléfono:	3152830813

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	JAIME A. CARREÑO MORENO
Cargo:	
Teléfono:	

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO - SEDE PRINCIPAL	**TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO - SEDE PRINCIPAL**
	
INICIO DE LA DESCARGA	**PUESTOS DE TRABAJO DESCARGADOS**
	
SILLAS DE TRABAJO DESCARGADAS	**SILLAS DE TRABAJO DESCARGADAS**

	
INSTALACIÓN DE TABLEROS	**DISTRIBUCIÓN EN AULAS DE CLASES**
	
DISTRIBUCIÓN EN AULAS DE CLASES	**DISTRIBUCIÓN EN AULAS DE CLASES**

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		14	Feb	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Tecnico Industrial Gerardo Valencia Cano.		
Sede Educativa	6 de Enero		
Dirección	Kariero 47d # 17	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Beatriz Panchano Mena		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	15	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	5	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	100	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	100	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	12	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
TABLERO	6	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Manuel Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Beatriz Pancho Mena
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3152830813

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	JAIME A. CARREÑO MORENO
Cargo:	Representante Legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		22	feb	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Jose Ramon Bejarano.		
Sede Educativa	Miraflores.		
Dirección	Carrera 44 # 7b-07	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Carmen Helena Quiñonez		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	15	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	5	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	86	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	86	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	11	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	5	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	5	
TABLERO	5	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Mantilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Carmen Elena Quiñones C
Cargo:	RECTORA
Teléfono:	3183602124

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	JAIME A. CARREÑO MORENO
Cargo:	Representante Legal
Teléfono:	16 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		21	Feb	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Jose Ramon Bejarano.		
Sede Educativa	San B/tura		
Dirección	Calle 9a # 50-09	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Carmen Helena Quiñonez		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	33	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	11	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	183	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	183	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	210	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	210	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	43	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	9	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	9	
TABLERO	9	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	2	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	2	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	3	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	18	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Manfilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3152205645
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	CARMEN ELENA QUIÑONES C.
Cargo:	RECTORA
Teléfono:	3183602124

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	JAIME A. CARREÑO MORENO
Cargo:	Representante Legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		24	Feb	2023

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Jose Ramon Bejarano.		
Sede Educativa	Comuna		
Dirección	Carrera 47 # 7ª – 44	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Carmen Helena Quiñonez.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	12	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	4	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	95	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	95	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	11	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
TABLERO	6	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Montilla Moreno
Cargo:	prof. Campo Interventoria
Teléfono:	3182205645
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	CARMEN ELENA QUIÑONES C.
Cargo:	RECTORA
Teléfono:	3183602124

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	JAIME A. CARREÑO MORENO
Cargo:	Representante Legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES
El mobiliario de la sede comuna, como sillas, pupitres, tableros, etc. se deja en el colegio en un solo salon en estado de acomulacion, ya que la sede esta en obras de remodelacion de planta fisica, igual las directivas optan por dejarlas en ese estado, para luego de concluirse la obra, se puedan repartir. Gracias.

NOTA: El rector debe legalizar el invéntario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		22	feb	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Jose Ramon Bejarano.		
Sede Educativa	El Jardin.		
Dirección	Carrera 37 c11 7ª-38	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Carmen. Helena Quiñonez		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	27	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	9	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	100	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	100	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	13	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
TABLERO	4	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	2	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	2	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	12	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nesken Mantilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoria
Teléfono:	3187205645
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	CARMEN ELENA QUIÑONES
Cargo:	RECTORA
Teléfono:	3183602124

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	JAIME A. CARREÑO MORENO
Cargo:	Representante Legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		18	feb	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Termavit		
Sede Educativa	Progreso.		
Dirección		Teléfono	
Rector y/o Encargado	Hermelia Tovar Cuero.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	18	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	6	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	72	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	72	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	9	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	10	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	10	
TABLERO	10	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Hesren Mantilla Moreno
Cargo:	Proy. Campo Interventorías
Teléfono:	3182205645
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Herthelia Tobar
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3165336267

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	JAIME A. CARRENO MORENO
Cargo:	Representante Legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		17	feb	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Termarit		
Sede Educativa	Principal.		
Dirección	Calle 4ta Kanera 53-72	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Hermelia Tovar Cuero		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	48	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	16	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	340	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	340	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	840	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	840	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	123	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	16	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	16	
TABLERO	16	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	6	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	3	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	9	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	5tf	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.1.C	
Firma:	
Nombre:	Hesicors Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoria
Teléfono:	3182205643
Correo:	

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	HERMELIA TOBAR
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3165336267

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	JAME A. CARREÑO MORENO
Cargo:	Representante Legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar él Inventario de la Institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
INSTITUCION EDUCATIVA ANUNCIACIÓN SEDE PRINCIPAL	INICIO DE LA DESCARGA DE DOTACIONES
	
EVIDENCIA DE DESCARGAS DE DOTACIONES Y ACOPIO PUESTOS DE TRABAJO	EVIDENCIA DE DESCARGAS DE DOTACIONES PUESTOS DE TRABAJO
	
PUESTOS Y SILLAS DE TRABAJO DESCARGADAS	PUESTOS, SILLAS DE TRABAJO Y CASILLEROS DESCARGADAS

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		18	Feb	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Fermarín		
Sede Educativa	San Martín de Porres.		
Dirección	Calle 113 # 7-80 p 12.	Teléfono	3177567938
Rector y/o Encargado	Omar Martínez Angulo.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	18	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	6	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	105	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	105	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	13	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	9	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	9	
TABLERO	9	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	2	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	
MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	2	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	12	

Powered by CamScanner

MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nesten Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Comp Interventoria
Teléfono:	3182205645
Correo:	nesten113@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Omar Martinez Angulo
Cargo:	Rector
Teléfono:	3177567938

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	JAIME A. CARREÑO MORENO
Cargo:	Representante Legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		17	feb.	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Tecnico Industrial Gerardo Valencia Cano.		
Sede Educativa	Stella Delgado De Navia.		
Dirección	Karrera 55c # 7-50	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Beatriz Panchano Mena.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	51	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	17	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	193	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	193	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	25	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	16	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	16	
TABLERO	16	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	2	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	3	
MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	3	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	18	

MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Mauricio Moreno
Cargo:	Prof. de Campo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	NESKEST13@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Beatriz Bohorquez Mena
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3152830813

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime Barrero M.
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO - SEDE STELLA DELGADO DE NAVIA	TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO - SEDE STELLA DELGADO DE NAVIA
	
SE INICIA LA UBICACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR	ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION ESCOLAR EN LAS AULAS DE CLASE.
	
UBICACIÓN DE CASILLEROS ESTUDIENTES EN AULAS DE CLASE.	ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION ESCOLAR EN LOS SALONES DE CLASE

	
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION ESCOLAR EN LAS AULAS DE CLASE.	UBICACIÓN DE DOTACION ESCOLAR EN LAS AULAS DE CLASE.
	
PRESENTACION Y ENTREGA DE DOTACION ESCOLAR DE SALON EN CLASES.	UBICACIÓN E INSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO PREESCOLAR.

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		19	Feb	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Jose Ramon Bejarano.		
Sede Educativa	Principal		
Dirección	Carrera 41 # 7-05	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Carme Helena Coiñones		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	36	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	12	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	255	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	255	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	465	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	465	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	76	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	31	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	31	
TABLERO	31	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	5	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	7	
MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	7	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	42	

MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Neskon Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoria
Teléfono:	3182205695
Correo:	neskent13@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	CARMEN ELENA QUIÑONES CACERES
Cargo:	RECTORA
Teléfono:	3183602124

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime Alirio Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal.
Teléfono:	316 412 0693.

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE RAMON BEJARANO – SEDE PRINCIPAL	**INSTITUCION EDUCATIVA JOSE RAMON BEJARANO – SEDE PRINCIPAL**
	
ACOPIO DE PUESTOS DE TRABAJO SECUNDARIA	**ACOPIO DE PUESTOS DE TRABAJO PRIMARIA**
	
ACOPIO DE CASILLEROS	**DISTRIBUCIÓN EN AULAS DE CLASES**

	
DISTRIBUCIÓN EN AULAS DE CLASES Y TABLEROS INSTALADOS	**DISTRIBUCIÓN EN AULAS DE CLASES E INSTALACION DE TABLEROS**
	
DISTRIBUCIÓN EN AULAS DE CLASES	**ACOPIO DE PUESTOS DE TRABAJO**

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		9	Abril	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	I.E.D. San Vicente		
Sede Educativa	Principal.		
Dirección	Av. Simon Bolivar.	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Carlos Aníbal Riascos.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	39	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	13	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	362	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	362	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	859	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	859	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	126	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	33	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	33	
TABLERO	33	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	7	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	2	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	11	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	66	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Hesten Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Apoyo Compa Interventoria
Teléfono:	3/822056435
Correo:	hesrent13@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Carlos Anibal Rivscos Hurtado
Cargo:	Rector (E)
Teléfono:	3183900939

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Correño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316. 412. 0693.

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
INSTITUCION EDUCATIVA SAN VICENTE	PRESENTACION DE PUESTO DE TRABAJO DOCENTE
	
CASILLEROS PARA DOCENTES	PRESENTACION DE PUESTO DE TRABAJO DOCENTE
	
PRESENTACION DE PUESTOS DE TRABAJO PREESCOLAR.	PRESENTACION DE SALA DE JUNTAS DE DOCENTES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

	
ACOPIO DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	PRESENTACION DE SALA DE JUNTAS DE DOCENTES
	
PRESENTACION DE SALON DE CLASES	PRESENTACION DE SALON DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		31	Mar	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Pablo Emilio Carvajal.		
Sede Educativa	Anibal Muñoz Duque.		
Dirección	Vereda Citronela.	Teléfono	3128765694
Rector y/o Encargado	Marlon Alexis Posso		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	6	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	2	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	159	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	159	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	20	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	20	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	19	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	7	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	7	
TABLERO	7	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	2	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	12	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Hesken Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182203643
Correo:	[illegible]

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Marlon Alexis Posso Varela
Cargo:	Rector
Teléfono:	3137948473

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Cardeño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
PRESENTACION INSTITUCION PAULO EMILIO CARVAJAL SEDE ANIBAL MUÑOS DUQUE	PUSTOS DE TRABAJO PRE-ESCOLAR
	
PRESENTACION DE TRABAJO DE DOCENTES	PRESENTACION DE AULAS DE CLASES
	
PRESENTACION DE CASILLEROS PARA DOCENTES	PRESENTACION DE CASILLEROS PARA ESTUDIANTES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

	
PRESENTACION DE AULAS DE CLASES	PRESENTACION DE AULAS DE CLASES
	
PRESENTACION AULA DE CLASES	PUESTO DE TRABAJO PARA DOCENTES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		31	Mar	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Pablo Emilio Carvajal.		
Sede Educativa	Jorge Eliecer Gaitan.		
Dirección	Sector 1 manzana 2	Teléfono	3128765694
Rector y/o Encargado	Marlon Alexis Posso		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	/	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	/	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	71	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	71	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	35	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	35	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	11	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	5	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	5	
TABLERO	5	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	/	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	2	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	12	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nelson Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	nelsonmont23@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Marlon Alexis Posso Varela
Cargo:	Rector
Teléfono:	3137948473

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693.

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
INSTITUCION EDUCATIVA PAULO EMILIO CARVAJAL SEDE JORGE ELIECER GAITAN	PRESENTACION SALON DE CLASES
	
EVIDENCIA DE ACOPIO DE SILLAS PARA ESTUDIANTES	EVIDENCIA DE ACOPIO DE SILLAS PARA ESTUDIANTES
	
EVIDENCIA DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	EVIDENCIA DE ACOPIO DE CASILLEROS PARA DOCENTES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

	
PRSENTACION DE SALON DE CLASES	PRSENTACION DE SALON DE CLASES
	
PRSENTACION DE SALON DE CLASES	PUESTO PARA DOCENTE

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		31	Mar	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Pablo Emilio Carvajal.		
Sede Educativa	Matias Mulumba.		
Dirección	Carrera 81 # 2.	Teléfono	3128765694.
Rector y/o Encargado	Marlon Alexis Posso		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	24	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	8	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	159	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	159	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	238	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	238	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	42	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	10	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	10	
TABLERO	10	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	2	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	2	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	4	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	24	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Martha Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182456405
Correo:	Nestor13@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Marlon Alexis Posso Varela
Cargo:	Rector
Teléfono:	3137948473

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
INSTITUCION EDUCATIVA PAULO EMILIO CARVAJAL SEDE MATTIAS MULUMBA	DESCARGA DE ELEMENTOS DE DOTACION
	
ACOPIO DE PUESTOS DE TRABAJO PARA ESTUDIATES.	ACOPIO DE TABLEROS
	
ACOPIO DE PUESTOS DE TRABAJO PARA ESTUDIATES.	PRESENTACION DE SALA DE JUNTAS DE DOCENTES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

	
ACOPIO DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	ACOPIO DE CASILLEROS
	
PRESENTACION DE SALON DE CLASES	PRESENTACION DE SALON DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		26	Mar	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Pablo Emilio Carvajal.		
Sede Educativa	Nuestra Señora de la Misericordia.		
Dirección	Manzana 2 # 16-30.	Teléfono	3128765694.
Rector y/o Encargado	Marlon Alexis Posso		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	15	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	5	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	134	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	134	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	172	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	172	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	32	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
TABLERO	6	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	2	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	3	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	18	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	nescont23@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Marlon Alexis Posso Varela
Cargo:	Rector
Teléfono:	3137949173

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Correño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
INSTITUCION EDUCATIVA PABLO EMILIO CARVAJAL SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	DESCARGA DE LOS ELEMENTOS DE DOTACION
	
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION	ACOPIO DE SILLAS PARA DOCENTES
	
ACOPIO DE MESAS PARA DOCENTES	ACOPIO DE PUESTOS DE TRABAJO

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

	
PRSENTACION DE CASILLEROS DE ESTUDIANTES	ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION
	
PRESENTACION DE SALON DE CLASES	PRESENTACION DE SALON DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		31	Mar	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Pablo Emilio Carvajal		
Sede Educativa	Nuevo Amanecer.		
Dirección	Transversal 92 # 11-01	Teléfono	3128765694
Rector y/o Encargado	Marlon Alexis Posso.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	15	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	5	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	108	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	108	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	37	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	37	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	16	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	7	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	7	
TABLERO	7	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	2	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	12	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205643
Correo:	nestor13@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Marlon Alexis Posso Varela
Cargo:	Rector
Teléfono:	3137941473

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante Legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
INSTITUCION EDUCATIVA PABLO EMILIO CARVAJAL SEDE NUEVO AMANECER	INICIO DE LA DESCARGA DE ELEMENTOS
	
ACOPIO DE CASILLEROS DE ESTUDIANTES	ACOPIO DE CASILLEROS DE DOCENTES
	
ACOPIO DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	ACOPIO DE SILLAS PARA SALA DE JUNTA DE DOCENTES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

	
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION ESCOLAR	ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION ESCOLAR
	
PRESENTACION DE SALON DE CLASES	PRESENTACION DE SALON DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		28	Mar	2025.

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Pablo Emilio Carvajal.		
Sede Educativa	Nuevo Esfuerzo		
Dirección	Vereda el Esfuerzo.	Teléfono	3128765694
Rector y/o Encargado	Marlon Alexis Posso		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	12	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	4	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	223	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	223	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	12	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	12	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	25	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	5	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	5	
TABLERO	5	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nescen Manuel Ms Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205443
Correo:	nescen63@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Marlon A. Posso V.
Cargo:	Rector
Teléfono:	3137948473

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal.
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
INICIO DE DESCARGA INSTITUCION EDUCATIVA PABLO EMILIO CARVAJA SEDE NUEVO ESFUERZO	INSTITUCION EDUCATIVA PABLO EMILIO CARVAJA SEDE NUEVO ESFUERZO
	
ACOPIO DE CASILLEROS PARA DOCENTES.	ACOPIO DE CASILLEROS PARA ESTUDIANTES
	
PRESENTACION DE SALA DE DOCENTES	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

	
PRESENTACION DE TABLERO INSTALADO.	ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION ESCOLAR
	
PRESENTACION DE SALON DE CLASES	PRESENTACION DE SALON DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		20	Marzo	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Pablo Emilio Carvajal.		
Sede Educativa	Principal.		
Dirección	Trv. 87 # 3S-40.	Teléfono	3128765694.
Rector y/o Encargado	Marlon Alexis Posso.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	54	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	18	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	396	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	396	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	537	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	537	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	99	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	13	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	13	
TABLERO	13	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	5	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	3	
MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	8	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	48	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Manuel Ha Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	nestor Manuel Moreno

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Marlon Alexis Posso Varela
Cargo:	Rector
Teléfono:	3137943473

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal.
Teléfono:	3164120693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
INSTITUCION EDUCATIVA PABLO EMILIO CARVAJAL SEDE PRINCIPAL	ACOPIO DE ELEMENTOS DE PUESTOS DE TRABAJO
	
ACOPIO ELEMENTOS DE PUESTOS DE TRABAJO PRE ESCOLAR.	ACOPIO DE ELEMENTOS DE PUESTOS DE TRABAJO
	
ACOPIO DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	PRESENTACION DE MUEBLE DE SALA DE JUNTAS

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

	
ACOPIO DE CASILLEROS DE ESTUDIANTES	ACOPIO DE CASILLEROS DE DOCENTE
	
PRESENTACION DE AUA DE CLASES	PRESENTACION DE AUA DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		1	Abril	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Pablo Emilio Carvajal.		
Sede Educativa	Vista Hermosa		
Dirección	Vereda la cascana.	Teléfono	3128765694
Rector y/o Encargado	Marlon Alexis posso.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	12	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	4	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	23	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	23	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	4	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
TABLERO	4	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nexen Mayllin Moreno
Cargo:	Prof Campo Interventoria
Teléfono:	3182205645
Correo:	nexen13@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Marlon Alexis Posso Varela
Cargo:	Rector
Teléfono:	3137911 8473


MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Correño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

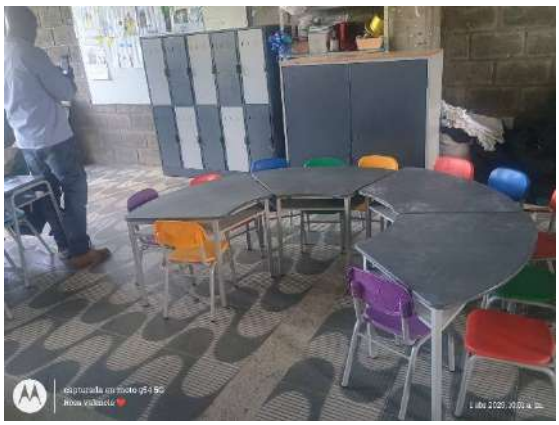	
INSTITUCION EDUCATIVA PABLO EMILIO CARVAJAL SEDE VISTA HERMOSA	EVIDENCIA DE DESCARGAS DE PUESTOS DE TRABAJO
	
ACOPIO DE CASILLEROS PARA ESTUDIANTES.	PRESENTACION DE LA MESA DE JUNTAS
	
ACOPIO DE CASILLEROS PARA DOCENTES.	PRESENTACION DE PUESTOS DE TRABAJOS DE PRE-ESCOLAR

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

	
PRESENTACION DE PUESTO DE TRABAJO DE DOCENTE.	PRESENTACION DE AULA DE CLASES
	
PRESENTACION DE AULA DE CLASES	PRESENTACION DE AULA DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		1	Abril	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Nestor Ulibano Lenorio		
Sede Educativa	Centro Docente El Caldas.		
Dirección	Transversal 81 # 42	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Gloria Maria Casquete.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	24	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	8	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	153	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	153	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	65	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	65	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	25	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
TABLERO	6	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	2	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	2	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	12	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Hesken Montilla Moreno
Cargo:	Profe. Campo Interventoría
Teléfono:	3782205643
Correo:	neskent13@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	Gloria Ma Casquete V.
Nombre:	Gloria María Casquete V.
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3127378594

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante Legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
PRESENTACION INSTITUCION NESTOR URBANO TENORIO SEDE CALDAS	PUSTOS DE TRABAJO PRE-ESCOLAR
	
PRESENTACION DE CASILLEROS DE DOCENTES	PRESENTACION DE CASILLEROS DE ESTUDIANTES
	
PRESENTACION DE TABLEROS INSTALADOS	PRESENTACION DE TABLEROS INSTALADOS

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

	
PUESTO DE TRABAJO PARA DOCENTES	PRESENTACION DE CASILLEROS DE ESTUDIANTES
	
PRESENTACION AULA DE CLASES	PRESENTACION AULA DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		4	Abril	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Nestor Urbano Tenorio		
Sede Educativa	Alfonzo michelsen.		
Dirección	Carrera 83 # 73-49	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Gloria Casquete V.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	18	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	6	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	127	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	127	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	108	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	108	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	26	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	11	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	11	
TABLERO	11	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	2	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	3	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	18	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Martinez Moreno
Cargo:	Prof. Compo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	nescont13@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Gloria María Casquete V.
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3127378594

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Correño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
INSTITUCION EDUCATIVA NESTOR URBANO TENORIO SEDE ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	INICIO DE LA DESCARGA DE ELEMENTOS
	
ACOPIO DE SILLAS DE ESTUDIANTES	ACOPIO DE SILLAS DE ESTUDIANTES
	
ACOPIO DE PUESTOS DE TRABAJO DE PREESCOLAR	ACOPIO DE CASILLEROS DE ESTUDIANTES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

	
PRESENTACION DE SALA DE JUNTAS	ACOPIO DE PUESTOS DE TRABAJO DE DOCENTE
	
PRESENTACION DE SALON DE CLASES	PRESENTACION DE SALON DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		21	Abril	2025.

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Nestor Urbano Tenorio.		
Sede Educativa	la Nueva Esperanza		
Dirección	Vereda la Gloria.	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Gloria María Casquete.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	9	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	3	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	65	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	65	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	29	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	29	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	11	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	9	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	9	
TABLERO	9	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	2	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	3	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	18	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Hector Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	hescont13@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Gloria María Casquete V.
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3127378594

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.


Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
INSTITUCION EDUCATIVA NESTOR URBANO TENORIO SEDE NUEVA ESPERANZA	DESCARGA DE ELEMENTOS DE DOTACION
	
ACOPIO DE PUESTOS DE CASILLEROS	ACOPIO DE ELEMENTOS DE PUESTOS DE TRABAJO
	
ACOPIO DE TABLEROS	PRESENTACION DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

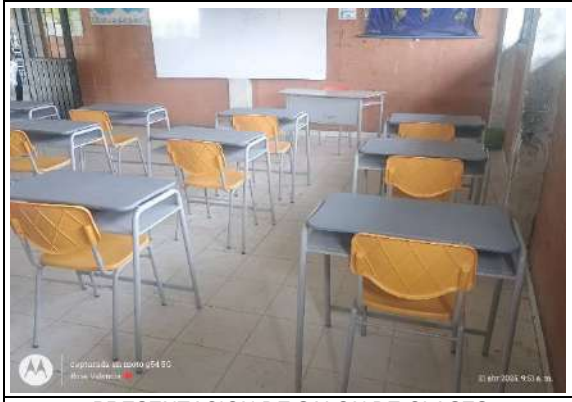	
ACOPIO DE SILLAS DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES	PRESENTACION DE SALA DE JUNTAS
	
PRESENTACION DE SALON DE CLASES	PRESENTACION DE SALON DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		3	Abril	2025.

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Nestor Urbano Penorio.		
Sede Educativa	Centro Docente Luis Carlos Galan.		
Dirección	Carrera 82 calle 2A poste 41	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Gloria Maria Casquete.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	12	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	4	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	159	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	159	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	17	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	5	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	5	
TABLERO	5	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	2	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	12	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Neskeen Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3162205645
Correo:	neskeen13@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Gloria María Casquete V.
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3127378594

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
INSTITUCION EDUCATIVA PAULO NESTOR URBANO TENORIO SEDE LUIS CARLOS GALAN	ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION ESTUDIANTIL
	
EVIDENCIA DE PUESTO DE TRABAJO PARA DOCENTE	ACOPIO DE PUESTOS DE TRABAJO PARA PRESCOLAR
	
EVIDENCIA DE ACOPIO DE CASILLEROS PARA ESTUDIANTES	EVIDENCIA DE ACOPIO DE CASILLEROS PARA DOCENTES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

	
TABLEROS INSTALADOS EN AULA	ACOPIO DE PUESTOS DE TRABAJO PARA DOCENTES
	
EVIDENCIA DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	PRESENTACION DE AULA DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		5	Abril	2025.

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Nestor Urbano Tenorio		
Sede Educativa	Sede principal.		
Dirección	Carrera 84 #23-12	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Gloria María Casquete.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	/	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	/	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	/	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	152	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	152	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	16	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
TABLERO	6	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	2	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	/	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	2	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	12	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C
Firma:
Nombre: Nestor Mandiles Moreno
Cargo: Prof Campo Interventoría
Teléfono: 3182205645
Correo: Nestor813@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA
Firma:
Nombre: Gloria María Casquete V.
Cargo: Rectora
Teléfono: 3127378594

MANUFACTURAS SUMAPAZ
Firma:
Nombre: Jaime A. Correa Moreno
Cargo: Representante legal
Teléfono: 316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
INSTITUCION EDUCATIVA NESTOR URBANO TENORIO SEDE PRINCIPAL	PRESENTACION DE SALA DE JUNTAS DE DOCENTES
	
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION	PUESTO DE TRABAJO PARA DOCENTES
	
ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION	ACOPIO DE CASILLEROS PARA ALUMNOS

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

	
PRSENTACION DE AULA DE CLASES	INSTALACION DE TABLEROS
	
PRESENTACION DE SALON DE CLASES	PRESENTACION DE SALON DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		7	Abril	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	I.E.D. Liceo del pacifico.		
Sede Educativa	Principal.		
Dirección	Av. Simon Bolivar Km 9.	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Claudia Nayibe Patiño.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	39	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	13	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	309	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	309	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	963	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	963	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	131	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	34	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	34	
TABLERO	34	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	7	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	2	

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	11	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	66	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Hesder Martillo Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	hesicert13@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Claudia Nayive Patiño Hurtado
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3128100950

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal.
Teléfono:	Fla. 316. 412. 0693.

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DEL PACIFICO	ACOPIO DE ELEMENTOS DE DOTACION
	
INSTALACION DE TABLEROS EN AULAS	CASILLERO DE ESTUDIANTES
	
ACOPIO DE MUEBLE DE ALMACENAMIENTO	ACOPIO DE CASILLEROS DE DOCENTES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

	
PRESENTACION DE SALA DE JUNTAS DE DOCENTES	PUESTOS DE TRABAJO PREESCOLAR
	
PRESENTACION DE SALON DE CLASES	PRESENTACION DE SALON DE CLASES

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		19	Mayo	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Agropecuario Jose Maria Cordoba.		
Sede Educativa	Porvenir.		
Dirección	Vereda altos de Zaragoza	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Clara Melendez.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	/	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	/	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	4	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	4	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	1	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	1	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	1	
TABLERO	1	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	/	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Compe Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	nestor103@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
	x Clara Melendez
Nombre:	Clara Ines Melendez Angulo
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3155937697

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal.
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		25	Abril	2025.

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Agropecuario Jose Maria Cordoba-		
Sede Educativa	Principal.		
Dirección	Corregimiento Cordoba	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Clever melendez.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	30	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	10	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	156	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	156	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	291	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	291	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	48	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	19	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	19	
TABLERO	19	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	6	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	2	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	9	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	54	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Heskeen Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	neskent13@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Clara Inés Melendez Angulo
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3155937697

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		2	Mayo	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Agropecuario Jose maria Cordoba.		
Sede Educativa	San cipriano.		
Dirección	Vereda San cipriano	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Clara Ines Melendez.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	3	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	1	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	44	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	44	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	8	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	8	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	6	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
TABLERO	6	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	nescen713@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Clara Ines Melendez A
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3155937697

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal.
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		5	mayo	2025.

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Agropecuario Jose Maria cordoba.		
Sede Educativa	Santa Elena.		
Dirección	Vereda Sta Elena	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Clara melendez.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	15	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	5	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	76	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	76	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	10	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	3	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	3	
TABLERO	3	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205643
Correo:	nestor123@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
	X Clara Melendez
Nombre:	Clara Ines Melendez Augusto
Cargo:	Rectora
Teléfono:	315 593 7697

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		5	mayo	2025.

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Agropecuario Jose Maria Cordoba		
Sede Educativa	Jorge Elicer Gaitan.		
Dirección	Vereda Alto de Saragosa	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Clara melendez.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	3	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	1	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	58	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	58	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	49	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	49	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	11	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
TABLERO	4	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	2	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	12	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo. Interventoría
Teléfono:	3182285695
Correo:	[illegible]

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Clara Inés Melendez Angulo
Cargo:	Rectora
Teléfono:	3155937697

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		24	Abril	2025.

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Francisco Jose de Caldas.		
Sede Educativa	Principal.		
Dirección	Carrera 19 # 04-03	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Angela Maria Lara.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	102	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	34	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	464	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	464	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	725	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	725	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	129	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	29	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	29	
TABLERO	29	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	6	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	6	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	9	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	54	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Hesbon Mantilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	hesbont13@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
	X ANGELA LARA T
Nombre:	ANGELA LARA T
Cargo:	RECTORA
Teléfono:	3168208446.

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693.

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		8	mayo	2025.

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Jose maria Cabal.		
Sede Educativa	Eusebio Moñoz perea		
Dirección	La Independencia.	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Omar Martinez		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	/	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	/	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	/	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	352	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	352	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	36	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	8	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	8	
TABLERO	8	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	4	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	/	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	7	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	42	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Heidon Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	Mescent@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Omar Martinez Angulo
Cargo:	Rector.
Teléfono:	3177567938

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la Institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		23	Abril	2025.

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Jose maria Cabal		
Sede Educativa	Principal.		
Dirección	Carrera. 62 # 1-11	Teléfono	
Rector y/o Encargado	OMar Martinez A.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	24	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	8	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	436	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	436	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	589	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	589	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	105	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	22	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	22	
TABLERO	22	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	6	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	2	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	9	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	54	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Martillo Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	nestor13@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Omar Martinez Angulo.
Cargo:	Rector.
Teléfono:	317-756-7938

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		29	Abril	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Jose Maria Cabal.		
Sede Educativa	Rafael Uribe Uribe		
Dirección	Camilo Torres.	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Omar Martinez		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	1	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	1	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	45	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	45	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	1	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	1	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	5	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
TABLERO	4	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Manf. Ms Moreno
Cargo:	Prof. Compo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	nestent13@hotmail.com.

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Omar Martinez Angulo
Cargo:	Rector.
Teléfono:	3172567938.

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Cadreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		29	Abril	2025.

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Jose Maria Cubal.		
Sede Educativa	12 - Abril		
Dirección	12 de Abril.	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Omar Martinez		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	1	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	1	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	76	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	76	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	1	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	1	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	8	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	4	
TABLERO	4	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nelson Martinez Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoria
Teléfono:	3182205643
Correo:	neskent123@hotmail.com.

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Omar Martinez Angulo
Cargo:	Rector.
Teléfono:	3177256935.

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693.

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		9	Mayo	2025.

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Nachasin		
Sede Educativa	Alfredo Ortiz Dapav.		
Dirección	Rio San Joan.	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Alberto Palacios.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	3	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	1	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	21	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	21	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	3	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
TABLERO	6	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Manuel Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182228643
Correo:	nestorm13@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Alberto Nicolás Palacios Montenegro
Cargo:	Rector
Teléfono:	316-5118560.

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 4120693

OBSERVACIONES
Se nos comunica por parte del Rector de la institución educativa que se debe acopiar, para luego ser llevado a la institución en transporte Fluvial y que por la situación de orden público y autores Armados ilegales y no se nos permite acompañamiento de la entrega en lancha y se hará el control en el sitio de acopio.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		9	mayo	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Nacheasin		
Sede Educativa	Lizardo Mejia Poirama		
Dirección	Resguardo Indigena	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Alberto palacios.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	6	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	2	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	28	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	28	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	3	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	3	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	4	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	2	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	2	
TABLERO	2	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Heskeh Mantilla Moreno
Cargo:	Proy. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	heskeh1993@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Alberto Nicolas Palacios Montenegro
Cargo:	Rector
Teléfono:	3165118560

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		9	Mayo	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Nachasin		
Sede Educativa	Meseta.		
Dirección	Resguardo Indigena.	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Alberto palacios.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	6	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	2	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	23	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	23	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	1	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	1	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	3	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	3	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	3	
TABLERO	3	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3192295615
Correo:	nestor113@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Alberto Nicolás Palacios Montenegro
Cargo:	Rector
Teléfono:	3165115560.

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal.
Teléfono:	316 912. 0693

OBSERVACIONES
Se realiza el control de la dotación para la sede educativa de meseta, en zona de embarque en Bitora, para llegar a dicha sede se debe de realizar viaje fluvial de aproximadamente 5 horas y hay presencia de autores armados en el transcurso del viaje en cuencas del río Naya zona rural.

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la Institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		30	Abril	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Nachasin		
Sede Educativa	Nueva Esperanza		
Dirección	Vereda LA Delfina.	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Alberto palacios.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	36	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	12	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	169	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	169	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	118	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	118	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	33	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	9	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	9	
TABLERO	9	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	2	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	2	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	2	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	12	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Neskren Manjilla Moreno
Cargo:	Profesional Campo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	neskenf13@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Alberto Nicolás Palacios Montenegro
Cargo:	Rector
Teléfono:	316-5118560

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		23	Abril	2025.

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Vasco Nuñez Balboa		
Sede Educativa	Jhon F. Kenedy.		
Dirección	Barrio Kenedy.	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Gladis Copete.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	3	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	1	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	110	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	110	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	40	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	40	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	16	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	5	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	5	
TABLERO	5	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	2	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	2	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	12	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Neskeen Montilla Moreno
Cargo:	Profes. Campo Interventoría
Teléfono:	3152205645
Correo:	neskent13@hotmail.com.

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Gladys Bibiana Copete Becerra
Cargo:	Rectora (E).
Teléfono:	3158175743

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno.
Cargo:	Representante legal.
Teléfono:	3164120693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		23	Abril	2025.

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Vasco Nuñez Balboa		
Sede Educativa	la Inmaculada.		
Dirección	Inmaculada.	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Gladis Copete.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	15	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	5	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	100	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	100	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	12	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
TABLERO	6	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nescen Martilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205643
Correo:	nescen713@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Gladys Bibiana Copek Becerra
Cargo:	Rectora (E)
Teléfono:	3158175743

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		23	Abril	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Vasco Nuñez Balboa		
Sede Educativa	Principal.		
Dirección	Calle 6 # 23A - 11	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Gladis Copete.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	12	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	4	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	190	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	190	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	196	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	196	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	40	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	11	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	11	
TABLERO	11	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	3	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	4	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	24	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182203645
Correo:	nestont13@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Gladys Bibiana Cepeda Becerra
Cargo:	Rectora (E)
Teléfono:	3158175743

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Cubeño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		24	Abril	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Vascos Nuñez Balboa		
Sede Educativa	Sagrado Corazón de maria		
Dirección	Carrera 22d # 6A	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Gladis Copete		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	27	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	9	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	134	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	134	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	1	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	1	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	16	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	6	
TABLERO	6	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	2	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	2	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	12	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoria
Teléfono:	3182205645
Correo:	nestor1313@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	~~Aprobó~~
X	Gladys Bibiana Coptle Becerra
Nombre:	
Cargo:	Rectora (E)
Teléfono:	3158175743

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño Moreno
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S." – BPIN 20230214000016.	Fecha:	día	mes	año
		23	Abril	2025

CONTRATISTA: ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	OXI CONTRIBUYENTE: CENIT

Departamento	Valle del Cauca	Municipio	Buenaventura
Institución Educativa	Vasco Nuñez Balboa		
Sede Educativa	Divino Niño del Mar.		
Dirección	Carrera 29 calle 7.	Teléfono	
Rector y/o Encargado	Gladis Copete.		

DOTACIÓN	Recibido	Observaciones
SILLAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	15	
MESAS PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	5	
SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	103	
MESA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	103	
SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MESA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	/	
MODULO X10 CASILLEROS ALUMNOS	12	
SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	3	
MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE X1	3	
TABLERO	3	
MODULO X10 CASILLEROS DOCENTES	1	
MUEBLE ALMACENAMIENTO AULAS	1	

Powered by CamScanner

Educación

MESA SALA DE JUNTAS DOCENTES	1	
SILLAS SALA DE JUNTAS DOCENTES	6	
MANUAL DE USO MANTENIMIENTO Y GARANTÍA	1	

INTERVENTORÍA ALIANZA INTERVENTORES S.A.S B.I.C	
Firma:	
Nombre:	Nestor Montilla Moreno
Cargo:	Prof. Campo Interventoría
Teléfono:	3182205645
Correo:	nestor413@hotmail.com

INSTITUCION EDUCATIVA	
Firma:	
Nombre:	Gladys Bibiana Copete Becerra
Cargo:	Rectora(E)
Teléfono:	3158175743

MANUFACTURAS SUMAPAZ	
Firma:	
Nombre:	Jaime A. Carreño M.
Cargo:	Representante legal
Teléfono:	316 412 0693

OBSERVACIONES

NOTA: El rector debe legalizar el inventario de la institución con la dotación entregada con la administración municipal.

Powered by CamScanner

Educación

Radicado No.
2025-EE-068031
2025-03-13 10:28:24 p. m.

Bogotá, D.C., 13 de marzo de 2025

Arquitecto
HERNANDO ALBERTO CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC
info@jasb.com.co

Asunto: Aprobación segundo informe mensual del contrato de interventoría No. COP1.PCCNTR.6741523, "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA".

Respetado Arquitecto Hernando:

En atención a la comunicación al Ministerio de Educación Nacional con el consecutivo OFICIO 753-028 del 04 de marzo de 2025, por medio de la cual se allegó el segundo informe mensual del contrato de interventoría **No. COP1.PCCNTR.6741523,** suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la firma ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S B.I.C (identificado con el NIT No. **901.506.750-7**), que tiene por objeto *REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", por el mecanismo obras por impuestos*, a cargo del contribuyente, *CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.* para el período comprendido entre el 13 de enero al 31 enero de 2025; esta supervisión se permite informar lo siguiente:

En conjunto con el grupo de apoyo a la supervisión de este Ministerio, se revisó el informe con sus respectivos anexos, de conformidad con las condiciones contractuales establecidas, evidenciando que cumple con los requisitos y condiciones necesarias para emitir la aprobación requerida para tramitar ante la FIDUCIARIA (previa aprobación de la gerencia - contribuyente, quien contrató las obras), el pago No.2 del contrato relacionado en el asunto.

Por lo anterior, el valor que puede ser cobrado para el período en comento, es el siguiente:

Costos fijos:

Por la suma de TREINTA Y UN MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($31.101.978,30) M/CTE.

Costos variables (avance de visitas):
Para este periodo no se realiza pago por este concepto, lo anterior teniendo en cuenta la forma de pago de los costos variables

"(…) Los pagos por costos variables se realizarán con la radicación de las respectivas actas de visita originales con registro fotográfico y la verificación y aprobación por parte del supervisor de las actas para tramite de pago de órdenes de compra objeto de interventoría. (…)"

Porcentaje de avance físico acumulado del proyecto = 33.8%.
Porcentaje de avance físico para este periodo = 23.1 %

Costo variable asociado al primer informe, NO APLICA PARA ESTE PERIODO.

En conclusión, el valor que puede ser cobrado para el primer período (fijo + variable), es por la suma de TREINTA Y UN MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($31.101.978,30) M/CTE. (incluido IVA).

Cordialmente,



Firmado digitalmente por:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
13/03/2025 10:28:27 p. m.

DIANA MILENA MALDONADO TORRES
Profesional Especializado
Oficina de Infraestructura Educativa

Folios: 3
Anexos: 2
Nombre anexos: 7. INFORME DE INTERVENTORÍA MENSUAL FEBRERO 1 AL 28 2025.pdf
753-028 REMISIÓN INFORME MENSUAL No.2 INTERVENTORIA.pdf

Copia externa:
CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. - CAROLINA PARRA - APOYO AL CONTRIBUYENTE - carolina.parra.externo@cenit-transporte.com
CB INGENIEROS - - MIGUEL ANGEL SALGADO - APOYO A LA GERENCIA - miguel.salgado@cbingenieros.com

Elaboró:
GERMAN RODRIGO GOMEZ VEGA
Contratista
Oficina de Infraestructura Educativa

Aprobó:
DIANA MILENA MALDONADO TORRES
Profesional Especializado
Oficina de Infraestructura Educativa

Educación

Radicado No.
2025-EE-211780
2025-07-24 08:35:15 a. m.

Bogotá, D.C., 24 de julio de 2025

Arquitecto
HERNANDO ALBERTO CASTELLANOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC
info@jasb.com.co

Asunto: Aprobación quinto informe mensual del contrato de interventoría No. COP1.PCCNTR.6741523, "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA".

Respetado Arquitecto Hernando:

En atención a la comunicación al Ministerio de Educación Nacional con el consecutivo OFICIO 753-070 del 19 de junio de 2025, por medio de la cual se allegó el quinto informe mensual del contrato de interventoría **No. COP1.PCCNTR.6741523,** suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la firma ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S B.I.C(identificado con el NIT No. **901.506.750-7**), que tiene por objeto *REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA", por el mecanismo obras por impuestos*, a cargo del contribuyente, *CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.* para el período comprendido entre el 13 de mayo de 2025 al 12 de junio de 2025; esta supervisión se permite informar lo siguiente:

En conjunto con el grupo de apoyo a la supervisión de este Ministerio, se revisó el informe con sus respectivos anexos, de conformidad con las condiciones contractuales establecidas, evidenciando que cumple con los requisitos y condiciones necesarias para emitir la aprobación requerida para tramitar ante la FIDUCIARIA (previa aprobación de la gerencia - contribuyente), el pago No.5 del contrato relacionado en el asunto.

Por lo anterior, el valor que puede ser cobrado para el período en comento, es el siguiente:

Costos fijos:

Por la suma de TREINTA Y UN MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($31.101.978,30) M/CTE.

Costos variables (avance de visitas):
Para este periodo no se realiza pago por este concepto, lo anterior teniendo en cuenta la forma de pago de los costos variables

"(…) Los pagos por costos variables se realizarán con la radiación de las respectivas actas de visita originales con registro fotográfico y la verificación y aprobación por parte del supervisor de las actas para tramite de pago de órdenes de compra objeto de interventoría. (…)"

Porcentaje de avance físico acumulado del proyecto = 100 %.
Porcentaje de avance físico para este periodo = 100 %

Costo variable asociado al primer informe, NO APLICA PARA ESTE PERIODO.

En conclusión, el valor que puede ser cobrado para el primer período (fijo + variable), es por la suma de TREINTA Y UN MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 31.101.978,30) M/CTE. (incluido IVA).

Cordialmente,



Firmado digitalmente por:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
24/07/2025 8:35:21 a. m.

DIANA MILENA MALDONADO TORRES
Profesional Especializado
Oficina de Infraestructura Educativa

Folios: 3
Anexos: 2
Nombre anexos: 7. INFORME DE INTERVENTORÍA MENSUAL 13 DE MAYO A 12 JUNIO 2025.pdf
ANEXO No. 24 REPORTE DE SEDES BENEFICIADAS OXI.zip

Copia externa:
CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. - Carolina Parra - Apoyo Contribuyente - carolina.parra.externo@cenit-transporte.com
CB INGENIEROS - MIGUEL ANGEL SALGADO - APOYO A LA GERENCIA - miguel.salgado@cbingenieros.com

Elaboró:
GERMAN RODRIGO GOMEZ VEGA
Contratista
Oficina de Infraestructura Educativa

Aprobó:
DIANA MILENA MALDONADO TORRES
Profesional Especializado
Oficina de Infraestructura Educativa

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

INFORME DE INTERVENTORÍA MENSUAL No. 6

1. ALCANCE DEL INFORME

PERIODO DEL INFORME

DEL 13 DE JUNIO 12 DE JULIO 2025

DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S."

BPIN

BPIN No.20230214000016.

☐ **FIDUCIA**

☒ **CONVENIO**

CONTRIBUYENTE

CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. COP1.PCCNTR.6741523

OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.

INTERVENTOR

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S B.I.C

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

De conformidad con lo establecido en la resolución vinculación No.001062 del 6 de octubre de 2023 que fue emitida por la Agencia de Renovación del Territorio – ART, la empresa *"(…) CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS., identificado con el NIT No. 900531210-3, presentó la manifestación de interés No.408 del 2 de agosto de 2023, para seleccionar y ejecutar a través de la opción convenio del mecanismo de Obras por Impuestos de que trata el artículo 800-1 del Estatuto Tributario, el proyecto de inversión registrado en el Banco de Proyectos de Obras por Impuestos denominado: "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" identificado con código BPIN No.20230214000016, por un costo total de DIEZ MIL SETENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE. ($10.070.572.631), proyecto que incluye dentro de sus costos el asociado a la interventoría que tendrá la obligación de realizar las actividades de seguimiento y control conducentes al cumplimiento del objeto y alcance viabilizado (…)"*.

RESOLUCIÓN DE VINCULACIÓN (ART)	OBJETO	CÓDIGO BPIN	VALOR
No.001062 del 6 de octubre de 2023	"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA"	No.20230214000016	$10.070.572.631

a. ALCANCE DEL PROYECTO

La Interventoría integral realizará la verificación de la adquisición de insumos, fabricación, despacho, distribución, entrega e instalación de los bienes establecidos en el marco del Convenio No.0007 de 2023 suscrito entre este Ministerio de Educación Nacional, el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca) y CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos SAS, en las instituciones y sedes educativas ubicadas en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), de acuerdo con la distribución establecida en los documentos que hicieron parte integral del proyecto que fue viabilizado y que se identifica con el código BPIN No.20230214000016.

El contratista que resulte seleccionado tendrá pleno conocimiento del Manual de Dotación Escolar que contiene las especificaciones técnicas de los elementos a dotar, de tal forma que se adquieran materias primas que cumplan con las especificaciones técnicas, que se fabriquen los elementos de mobiliario escolar conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional, así como realizar el adecuado seguimiento y control de la distribución en las cantidades establecidas para ser entregadas en cada sede educativa a beneficiar en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), corroborando las entregas con la calidad, cantidad, oportunidad, y exactitud de los bienes contratados para cada una de las sedes señaladas.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Los bienes por dotar y objeto de la presente interventoría se relacionan a continuación:

Ítem	Cantidad
Puesto de trabajo - Aula preescolar	400
Puesto de trabajo - Aula primaria	8437
Puesto de trabajo - Aula secundaria	11283
Tablero (aula)	634
Puesto de Trabajo Docentes	634
Sala de Juntas - Sala Docente	209
Mueble de Almacenamiento Aulas	85
Módulo 10 casilleros Alumnos	2118
Módulo 10 casilleros Docentes	145
Total	**23945**

A continuación, se presentan las sedes educativas beneficiadas con el proyecto en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca.

INSTITUCION EDUCATIVA	CODIGO DANE IE	SEDE	CODIGO DANE SEDE
TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO	176109000842	TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO - SEDE	176109000842
		STELLA DELGADO DE NAVIA	176109001822
		SEIS DE ENERO	376109006084
		OLIMPICO	176109007383
		ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	176109002101
TERMARIT	176109000648	TERMARIT	176109000648
		EL PROGRESO	176109007049
		SAN MARTIN	276109001894
JOSÉ RAMON BEJARANO	176109000516	EL JARDIN	176109015467
		JOSE RAMON BEJARANO	176109000516
		MIRAFLORES	176109007154
		LA COMUNA	176109007421
		SAN BUENAVENTURA	176109001008
LA ANUNCIACIÓN	176109000605	LA ANUNCIACIÓN	176109000605
LAS AMERICAS	176109000311	LAS AMERICAS	176109000311
		BAHIA	176109800024
		CARLOS HOLMES TRUJILLO	176109007341
		DIGNIDAD	376109009181
FRANCISCO JAVIER CISNEROS	276109000235	EL SALTO	276109002866
		BRISAS DEL PACIFICO	276109002441
		HECTOR PERLAZA QUINTERO	276109800011
		FRANCISCO JAVIER CISNERO	276109000235
		LA GRAN COLOMBIA	276109001401
		CARLOS BORREROS SINISTERRA	276109000880
NIÑO JESUS DE PRAGA	276109000464	ESCUELA LA BREA	276109008171
		NIÑO JESUS DE PRAGA	276109000464
		ANTONIO JOSE RUIZ	276109002416
		LAS BRISAS	276109009062
		FRANCISCO ELADIO RAMIREZ	276109000120
		MARINA SOLANO	276109004036

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

INSTITUCION EDUCATIVA	CODIGO DANE IE	SEDE	CODIGO DANE SEDE
PABLO EMILIO CARVAJAL	176109002977	ANIBAL MUÑOZ DUQUE	276109005270
		NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	176109015441
		JORGE ELIECER GAITAN	376109006076
		NUEVO AMANECER	176109011348
		PABLO EMILIO CARVAJAL	176109002977
		NUEVO ESFUERZO	176109016251
		VISTA HERMOSA	176109015459
		MATIAS MULUMBA	176109000290
NESTOR URBANO TENORIO	176109005836	CENTRO DOCENTES CALDAS	176109005828
		CENTRO DOCENTE LUIS CARLOS GALAN	176109005712
		CENTRO DOCENTE LA NUEVA ESPERANZA	276109011377
LICEO DEL PACIFICO	176109000621	LICEO DEL PACIFICO	176109000621
SAN VICENTE	176109000834	SAN VICENTE	176109000834
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	176109000192	FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	176109000192
JOSE MARIA CABAL	176109000800	JOSE MARIA CABAL	176109000800
		EUSEBIO MUÑOZ PERA	176109011291
		RAFAEL URIBE URIBE	176109001245
VASCO NÚÑEZ BALBOA	176109000770	CENTRO DOCENTE DIVINO NIÑO DEL MAR	176109015424
		VASCO NÚÑEZ BALBOA	176109000770
		SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA	376109008001
		JOHN F KENNEDY	176109000630
		LA INMACULADA	176109008550
NACHASIN	276109005709	MESETA	276109010412
		ALFREDO ORTIZ DUPAR	276109009739
		LIZARDO MEJIA PORAIMA	476109009002
		NUEVA ESPERANZA INDIGENA	276109005709
AGROPECUARIO JOSE MARIA CORDOBA	276109005806	INST, AGROPECUARIA JOSE MARIA SEDE PRINCIPAL	276109005806
		SAN CIPRIANO	276109000014
		SANTA ELENA	276109001762
		JORGE ELIECER GAITAN.	276109000979
		PORVENIR	276109007108

b. CRONOGRAMA.

NOTA: Se deberá establecer según cronograma aprobado en la sesión de inicio

Etapa	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Preparación.	**13/01/2025**	**31/01/2025**
Ejecución	**01/02/2025**	**12/06/2025**
Cierre	**01/06/2025**	**12/06/2025**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL CONTRATACIONES DERIVADAS

a. Contrato de Suministro

Objeto del contrato: "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA" identificado con código BPIN No. 20230214000016.			
Contratista: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A			
No. contrato	**8000009092**	**Fecha del contrato**	**16/04/2024**
Plazo inicial	**5 meses**	**Prorrogas**	**N/A**
Fecha de inicio	**13/01/2025**	**Fecha de terminación**	**12/06/2025**
Vr. inicial	**$6.093.346.534.87 M/CTE con IVA**		
Vr. Adicional	**$ 453.954.316,85 M/CTE con IVA – REAUSTE PRECIO 7,45%**		
Vr. Final ejecutado	**$6.547.300.851,72 M/CTE con IVA**		

El personal base del contratista **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A** es el siguiente:

PERSONAL BASE MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A		
No.	**NOMBRE**	**CARGO**
1	Jaime Alirio Carreño Moreno	Gerente
2	Paola Zamora	Coordinadora Proyecto
3	Diana Carreño	Asesor Financiero
4	Javier Guzmán	Jefe de producción
5	Charlee Alfonso Castañeda	técnico en campo
6	Santos Marín Torres	técnico en campo

b. Contrato de Interventoría

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA", A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.			
Contratista: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC			
No. contrato	**CO1.PCCNTR.6741523**	**Fecha del contrato**	**17/09/2024**
Plazo inicial	**7 meses**	**Prorrogas**	**N/A**
Fecha de inicio	**13/01/2025**	**Fecha de terminación**	**12/08/2025**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Vr. Total	**$311.019.783,00**
Vr. Adicional	**N/A**
Vr. Final ejecutado	**N/A**

Para este contrato Alianza Integral de Proyectos SAS BIC presento el personal base para el seguimiento y entrega para las instituciones educativas de municipio de Buenaventura Valle del Cauca
A continuación, se presenta el cuadro del personal presentado.

PERSONAL BASE CONSORCIO DOTACIÓN JA				
No.	**NOMBRE**	**CARGO**	**TEL**	**CORREO**
1	Hernando Alberto Castellanos Rincón	Director	3112124074	G3director4@jasb.com.co
2	Santiago Paque	Aux. Administrativo y Financiero	3106873789	Proadming3@jasb.com.co
3	Susana Guerra	Apoyo Jurídico	3017054666	juridica@jasb.com.co
5	Juan Diego Guerrero Hernandez	Profesional en Planta	3113569134	Ing.guerrero24@yahoo.com
6	Nesken Mantilla	Técnico en campo	318220564	ingconstruccionesmantilla@gmail.com
7	Marcela Solano	Técnico en campo	3204887201	Marcela.solano@jasb.com.co

Mediante comunicado No. 2024-EE-283592 del 3 de octubre del Ministerio de Educación Nacional, aprobó el personal mínimo requerido, sin embargo, se radico solicitud No. 753-014 para el cambio del profesional en planta, No 753-018 para el cambio de técnico en planta y No. del cual no se ha recibido respuesta por de la entidad. Asi mismo se realiza envio oficio de cambio de director de interventoría con el oficio 753-026 CAMBIO DIRECTOR DE INTERVENTORIA, del cual tampoco se ha tenido respuesta.

c. Plan de trabajo.

El 17 de enero de 2025 por medio de comunicado 753-005, se remite el Plan de trabajo de la Interventoría, con el fin de planificar, ordenar, dar seguimiento y ejecutar el objeto del contrato No COP1.PCCNTR.6741523 del 2024.

3. EJECUCIÓN

3.1 INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL

Contratista: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC

El día 19 de julio de 2024 El Ministerio de Educación Nacional realiza convocatoria pública del proceso de Concurso de Méritos Abierto CM-MEN-02-2024, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.2 y 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015.

OBJETO:
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE *"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA"*, A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

el 20 de agosto de 2024, a las 10:00 a.m., se llevó a cabo el cierre del proceso de convocatoria CM-MEN-02-2024, presentando propuesta las siguientes personas, situación que se puede constatar en la Lista de Oferentes publicada en el SECOP II, así:

1 INSERGROUP - ISG S.A.S
2 ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.
3 ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC
4 SGA CONSULTORES SOCIEDAD DE INTERES COLECTIVO - SAS BIC
5 SCAIPROYEKTA SAS BIC
6 INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA
7 CONSORCIO ARG-BIC 2024

El día 06 de septiembre de 2024 se expide la Resolución No 014192 en la que determina : el proponente **ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC** resultó favorecido con el procedimiento de desempate de la norma citada anteriormente, como se evidencia en el informe de evaluación, por lo cual, el Comité Técnico Evaluador recomendó al ordenador del gasto la adjudicación del proceso **CM-MEN-02-2024** a dicho proponente por el valor total de la oferta económica presentada para el presente proceso de selección y que corresponde a la suma de **TRESCIENTOS ONCE MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($311.019.783)**

3.2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Pólizas Contratista MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A

Póliza de Seguro de Cumplimiento No 73397			
Asegurador	CHUBB		
Tomador	MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A		
Asegurado / Beneficiario	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.		
Estado	Vigente	**Fecha**	14/01/2025
Amparos	**Valor Asegurado**	**Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.024.091.854.60	13/01/2025	12/12/2025
Salarios y Prestaciones Sociales	$ 1.024.091.854.60	13/01/2025	12/06/2028
Calidad y Correcto Funcionamiento	$ 1.024.091.854.60	13/01/2025	12/06/2028

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Pólizas Interventoría Alianza Integral de Proyectos SAS BIC

Póliza de Seguro de Cumplimiento No 11- 44 -101235265			
Asegurador	SEGUROS DEL ESTADO		
Tomador	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS		
Asegurado / Beneficiario	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		
Estado	Vigente	Fecha	16/01/2025
Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 62.203.956.60	13/01/2025	12/02/2026
Calidad del servicio	$ 62.203.956.45	13/08/2025	12/02/2026
Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 46.652.967.60	13/01/2025	13/08/2028

3.3 EJECUCIÓN FINANCIERA

Contrato de dotación

MANUFACTURAS SUMAPAZ

Valor del contrato	**$6.093.346.535**	**Valor adiciones**	**N/A**	
Valor anticipo	**N/A**	**Total, amortizado**	**N/A**	
Número y fecha del acta	**Valor del acta**	**Amortización del anticipo**	**Neto para pagar**	**% ejecución financiera**

ENERO 13 A FEBRERO 12 DE 2025

Durante la ejecución del contrato dentro del periodo comprendido del 13 de enero al 31de enero de 2025 la interventoría convocó y realizó 2 mesas de trabajo para definir de manera clara los productos que se requieren para iniciar el proceso de fabricación del mobiliario escolar (cronograma de producción y entregas, ordenes de bienes)

El 13 de enero de 2025, se suscribió el acta de inicio por parte del Ministerio de Educación Nacional y la Alianza Integral de Proyectos SAS BIC. Con plazo de ejecución de 7 meses, es decir, hasta el 12 de agosto de 2025

Entre el 14 y el 17 de enero se realiza la verificación de las especificaciones técnicas de los prototipos del mobiliario escolar a fabricar por parte de Manufacturas SUMAPAZ

El 17 de enero de 2025, se remite a la supervisión del Ministerio de Educación Nacional el informe de Aprobación de prototipos

El 21 de enero de 2025, se remite a la supervisión del Ministerio de Educación Nacional pólizas actualizadas

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

El 23 de enero se remitió a la supervisión del MEN el informe de aprobación del manual de garantía y mantenimiento, presentado por Manufacturas SUMAPAZ

El 29 de enero de 2025 se aprueba el Cronograma de Producción y Entregas, suministrado por Manufacturas SUMAPAZ

El 30 de enero de 2025 se remiten las ordenes de bienes aprobadas para dar inicio con el proceso de fabricación

Los despacho inician según programación con la orden de bien 01, haciendo entregas en la IE Gerardo Valencia Cano en la sede principal, el día 6 de febrero, estas entregas llegan los dias siguientes hasta el 12 del mes con las sedes, Alfonso Lopez Pumarejo, Stella Delgado Navia, sede Olímpico y sede Seis de Enero.

Llegando a un total de 2065 conjuntos entregados de la orden de bien 01, con un porcentaje acumulado de 8,62%.

Dentro de los anexos del presente informe se incluyen el cronograma de producción y el cronograma de entregas para cada una de las sedes, aprobado por interventoría y presentado a la Supervisión MEN, Gerencia del contrato.

Para el presente proyecto de dotación de mobiliario escolar de las instituciones educativas del municipio de Buenaventura Valle del Cauca, se tiene contratado la entrega de 23945 elementos distribuidos en 16 instituciones educativas, con 64 sedes, dentro del mobiliario a entregar se encuentran los siguientes elementos:

- Puesto de trabajo de prescolar (1 mesa y 3 sillas)
- Puesto de trabajo de primaria (1 mesa y 1 silla)
- Puesto de trabajo bachillerato (1 mesa y 1 silla)
- Modulo X 10 casilleros para alumnos
- Puesto de trabajo docente en aula (1 mesa 1 silla)
- Mueble almacenamiento aula TIM
- Mesa sala de juntas docente incluye sillas (1 mesa y 6 sillas)
- Modulo X10 de casilleros docentes

Etapa de verificación de prototipos: Para esta etapa la interventoría de manera permanente realiza las debidas pruebas a los diferentes prototipos de los elementos a entregar en las instituciones educativas de Buenaventura, la verificación y pruebas realizadas a los prototipos se realizaron entre el 14 y 17 de enero de 2025, se remitió la documentación de aprobación de prototipos a la supervisión de Ministerio mediante el comunicado No. 753-006 del 17 de enero 2025, a continuación se presenta un registro fotográfico de las actividades de revisión realizadas a los prototipos.

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

 	 
Inspección medidas alturas dimensiones	Revisión de calibre y ángulos
 	 
Prueba de cargas y deformación	Revisión de calibre de tubería y de tapones
 	 
Revisión de calibres y ancho	Revisión medidas alturas y superficies

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

 	
Revisión calibre perfilería	Prueba de carga y deformación
 	
Revisión de medidas puertas casillero	Inspección técnica grados de inclinación
 	
Revisión de medidas	Prueba de cargas y deformación silla.

Durante el periodo del presente informe no se presentaron devoluciones.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

	% programado	% ejecutado	Avance o retraso
Ejecución durante el periodo reportado	0%	8,62%	8,62% AVANCE
Ejecución acumulada del proyecto	7,6%	8,62%	1,02% AVANCE

TABLA 1 CONSOLIDADO PORCENTAJES A 12 DE FEBRERO DE 2025

AVANCE DE ENTREGAS - ORDEN DE BIENES # 1

FECHA			06--FEBR--2025	06--FEBR--2025	07--FEBR--2025	07--FEBR--2025	08--FEBR--2025	10--FEBR--2025	10--FEBR--2025	10--FEBR--2025	10--FEBR--2025	11--FEBR--2025	12--FEBR--2025	12--FEBR--2025	12--FEBR--2025		
PLACA			VZD 439	SOD 701	ALA 316	THV 551	VIK 504	FDF 049	SQA 319	FDF 049	FDF 049	GNB 833	VZD 439	VZD 439	VZD 439		
CONDUCTOR			DARIO CASTELLANOS	JORGE MARTINEZ	MILTON HERRERA	WILSON BELTRAN	JHONATHAN LEON	MARCO CAGUA	HENRY LEON	MARCO CAGUA	MARCO CAGUA	LUIS CARLOS CASTELLANOS	DARIO CASTELLANOS	DARIO CASTELLANOS	DARIO CASTELLANOS		
REMISION No.			25-001	25-002	25-003	25-004	25-005	25-006	25-007	25-008	25-009	25-010	25-011	25-012	25-013		
COLEGIO / IE			GERARDO VALENCIA CANO - SEDE PRINCIPAL	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE PRINCIPAL	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE PRINCIPAL	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE PRINCIPAL	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE PRINCIPAL	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE PRINCIPAL	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE STELLA DELGADO DE NAVIA	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE STELLA DELGADO DE NAVIA	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE STELLA DELGADO DE NAVIA	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE OLIMPICO	GERARDO VALENCIA CANO - SEDE SEIS DE ENERO		
			PARCIAL 1	PARCIAL 2	PARCIAL 3	PARCIAL 4	PARCIAL 5	PARCIAL 6 - SALDO TOTAL	PARCIAL 1	PARCIAL 2 SALDO TOTAL	PARCIAL 1	PARCIAL 2	PARCIAL 3 - SALDO TOTAL	TOTAL	PARCIAL 1		
CANT.	DETALLE / PRODUCTOS	VALOR UNT.	VALOR TOTAL														
	CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA																
1.742	MESA PUESTO DE TRABAJO BASICA PRIMARIA.	$ 145.321	$ 253.149.182						98			193		115			
	SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA																
	CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA																
2.777	MESA PUESTO DE TRABAJO BASICA SECUNDARIA.	$ 151.798	$ 421.543.046	320		320		320	75	227							
	SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA																
	ITEM: CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO DOCENTE																
167	MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE.	$ 248.289	$ 41.464.263				39			5	5	16		6	6		
	SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE																
	CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR																
99	MESA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR.	$ 252.197	$ 24.967.503										17	8	5		
	SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR																
	CONJUNTO - SALA DE JUNTAS SALA DOCENTE																
46	MESA DE JUNTAS SALA DOCENTE.	$ 1.776.879	$ 81.736.434				10				4		3		2		
	SILLA INTERLOCUTORA SALA DOCENTE																
	ITEM: PRODUCTO																
487	MODULO DE 10 CASILLEROS ALUMNOS	$ 587.779	$ 286.248.373		86		28			18	5		25		14	7	
	ITEM: PRODUCTO																
32	MODULO 10 CASILLEROS DOCENTES	$ 726.299	$ 23.241.568				6				3		2		1		
	ITEM: PRODUCTO																
19	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	$ 717.304	$ 13.628.776										3		2		
	ITEM: PRODUCTO																
167	TABLERO	$ 222.062	$ 37.084.354			8		12	19	10			16		6		
5.536	100%	SUB	$ 1.183.063.499	320	86	328	83	332	192	260	17	16	242	17	154	18	
		IVA 19%	$ 224.782.065														
		TOTAL	$ 1.407.845.564	MOBILIARIO ENTREGADO EN SITIO													

TOTAL ENTREGADO DE LA ORDEN 1	% ENTREGADO DE LA ORDEN 1	% ENTREGADO DEL CONT. TOTAL	VALOR UNT.
406	23,31%	4,81%	$ 59.000.326
1262	45,44%	11,18%	$ 191.569.076
77	46,11%	12,15%	$ 19.118.253
30	30,30%	7,50%	$ 7.565.910
19	41,30%	9,09%	$ 33.760.701
183	37,58%	8,64%	$ 107.563.557
12	37,50%	8,28%	$ 8.715.588
5	26,32%	5,88%	$ 3.586.520
71	42,51%	11,20%	$ 15.766.402
2.065			$ 446.646.333
			$ 84.862.803
37,30%			$ 531.509.136
			37,75%

TABLA 2 CONSOLIDADO A 12 DE FEBRERO DE 2025

RESUMEN ORDEN 01 - MES 1

CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	406	7,33%
CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	1262	22,80%
ITEM: CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	77	1,39%
CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	30	0,54%
CONJUNTO - SALA DE JUNTAS SALA DOCENTE	19	0,34%
MODULO DE 10 CASILLEROS ALUMNOS	183	3,31%
MODULO 10 CASILLEROS DOCENTES	12	0,22%
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	5	0,09%
TABLERO	71	1,28%
	2065	**37,30%**

TABLA 3 PORCENTAJE DE AVANCE ENTREGAS MES 01 – ORDEN DE BIEN 01

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

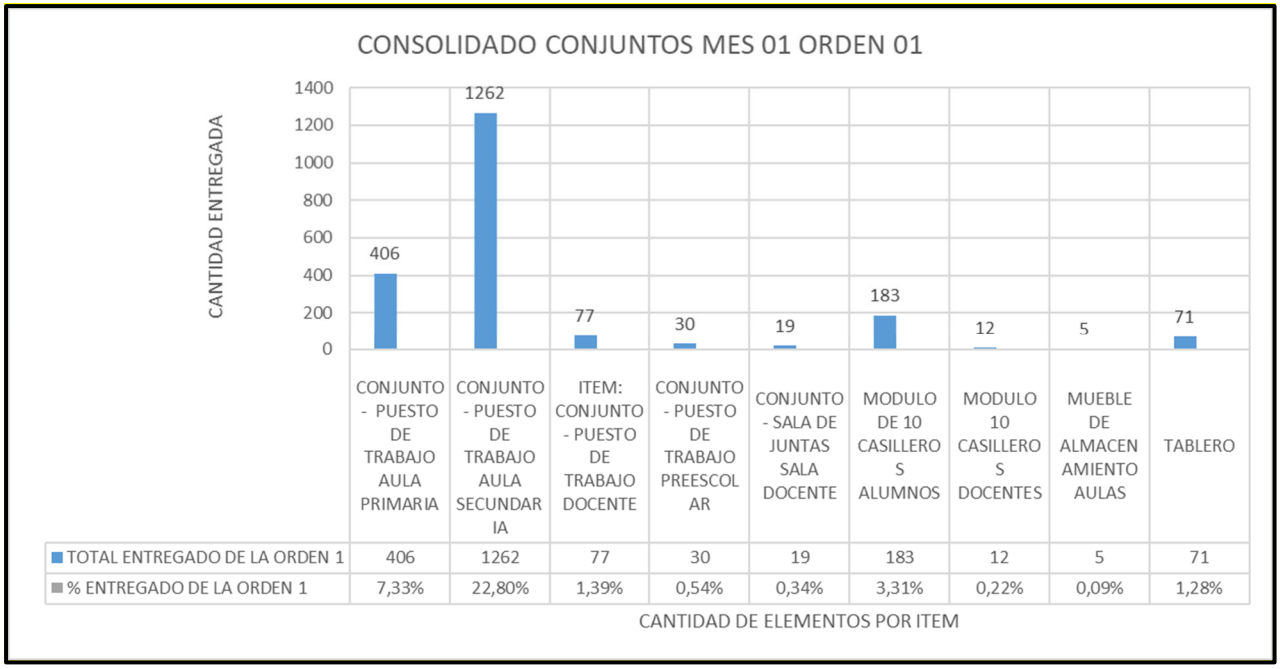


TABLA 4 DE AVANCE POR ÍTEM – IE GERARDO VALENCIA CANO % ORDEN 01

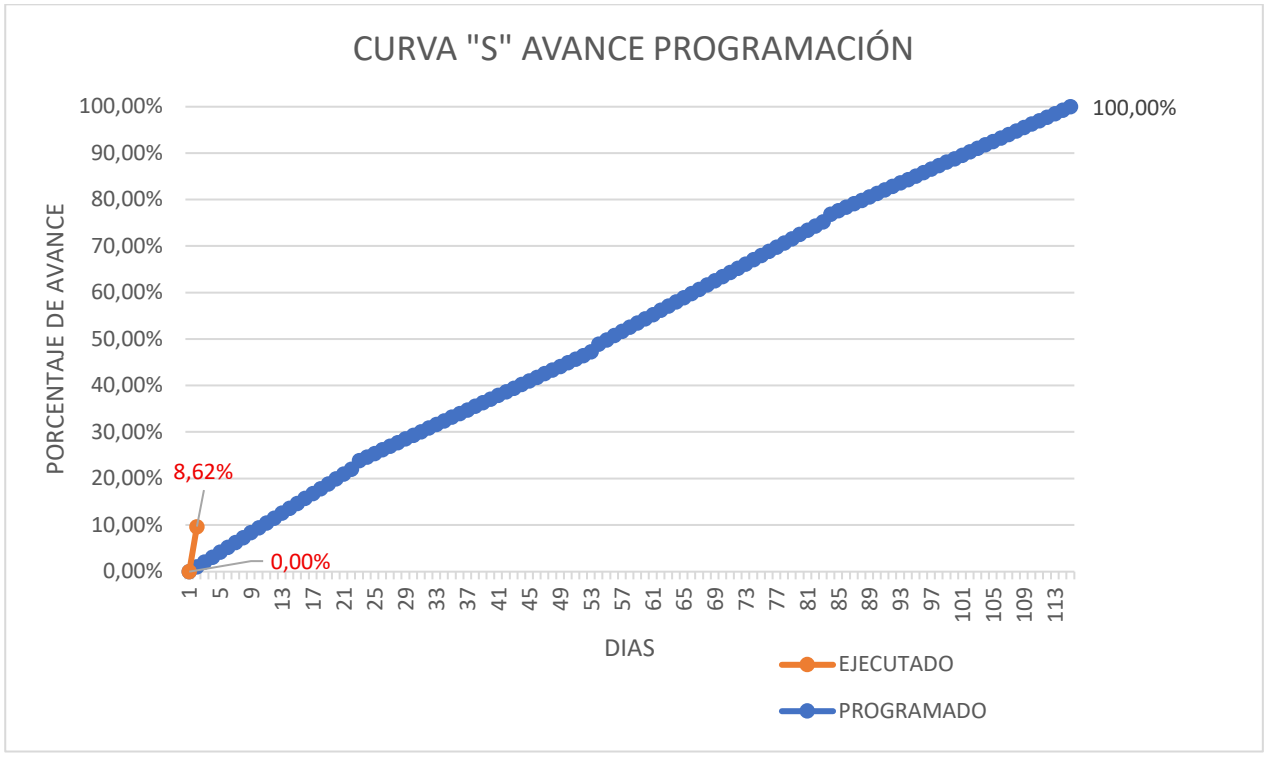


GRÁFICO 1 CURVA "S" MES 01

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

FEBRERO 13 A MARZO 12 DE 2025

El primer comité mensual se efectúa el día 13 de febrero de 2025 de manera virtual, se presenta el avance de cada una de las áreas de la producción, así como el porcentaje de despachos y entregas en sitio a satisfacción hasta la reunión mensual, se hace una descripción detallada de cada uno de los despachos y las cantidades de productos enviados y entregados hasta el momento

Se realiza comité técnico No 2, el día 17 de febrero de 2025 de manera virtual en el cual se presenta por parte de la interventoría los avances realizados por parte del contratista Manufacturas Sumapaz, hasta la fecha del comité se había entregado la totalidad de las 5 sedes de la Institución Educativa Gerardo Valencia Cano, el porcentaje de avance a la fecha era de 15,7% en la totalidad del contrato y de la orden de bienes No. 1 el porcentaje de ejecución es del 68,1%, las cifras presentadas son corroboradas por TF Interventores.

El día 25 de febrero de 2025 se realiza Comité técnico No.3 de manera virtual, la interventoría presenta el ultimo avance de la producción, despacho y entregas del mobiliario escolar en la ciudad de Buenaventura, que corresponde al cierre de la orden de bienes No. 1, con la totalidad de los ítems entregados en las 13 primeras sedes del contrato, el proceso se encuentra con 23.1% de las entregas hasta la fecha de la anteriormente mencionada reunión, lo que indica que el contrato tiene 10 días aproximadamente de adelanto con lo programado

Para el día 27 de febrero de 2025 se inicia el despacho de la orden de bienes No2 con la Institución Educativa LA ANUNCIACION en sus cinco sedes.

Se realiza comité técnico No 4, el día 4 de marzo de 2025 de manera virtual en el cual se presenta por parte de la interventoría los avances realizados por parte del contratista Manufacturas Sumapaz, hasta la fecha del comité se había entregado la totalidad de la sede de la Institución Educativa La Anunciación, el porcentaje de avance a la fecha era de 21.7% en la totalidad del contrato y de la orden de bienes No.2 el porcentaje de ejecución es del 20.7%, las cifras presentadas son corroboradas por TF Interventores.

El día 11 de marzo de 2025 se realiza Comité técnico No.5 de manera virtual, la interventoría presenta el avance de la producción, despacho y entregas del mobiliario escolar en la ciudad de Buenaventura, que corresponde a la orden de bienes No. 2, con 39.7% de las entregas, el proceso se encuentra hasta la fecha de la anteriormente mencionada reunión en un 66.7%, lo que indica que el contrato tiene una semana aproximadamente de adelanto con lo programado.

El segundo comité mensual se efectúa el día 13 de marzo de 2025 de manera virtual, se presenta el avance de cada una de las áreas de la producción, así como el porcentaje de despachos y entregas en sitio a satisfacción hasta la reunión mensual lo que equivale al 39.7% del contrato, equivalente a 9830 kits, se realiza una descripción detallada de cada uno de los despachos y las cantidades de productos enviados y entregados hasta el momento.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

En la fecha de corte de proyecto, se presenta avance teniendo casi terminadas la **ORDEN DE BIEN 01**, teniendo despachos del 13 al 21 de febrero, asi mismo haciendo el recibo de estos entre el 14 y 24 de febrero.

Con las siguientes instituciones, IE Termarit, en sus sedes principal y El Progreso, IE José María Cabal en su sede San Martín de Porres, IE José Ramón Bejarano en su sede principal, sede San Buenaventura, sede El Jardín y sede la Comuna.

Con esto se termina la entrega de bien 01, con un acumulado de 5.536 conjuntos entregados, que corresponden al 100% de esta, asi mismo llegando a un 23,12 % del total del proyecto.

Asi mismo se inicia el despacho de la **ORDEN DE BIEN 02** el 27 de febrero y de la cual, al 12 de marzo, tiene una avance importante llegando al 77,48% de esta. Con un inventario entregado de esta orden de 4.631 conjuntos.

A la fecha del culminación del segundo mes de actividades, al 12 de marzo se tienen 10167 conjuntos, llegando a un 42,46% del total del proyecto, contemplando las siguientes instituciones, IE Anunciación, IE Las Américas en todas sus sedes, IE Francisco Javier Cisneros, en sus sedes principal, La Gran Colombia y Carlos Borrero Sinisterra.

	% programado	% ejecutado	Avance o retraso
Ejecución durante el periodo reportado	18,39%	33,84%	15,45% AVANCE
Ejecución acumulada del proyecto	27,01%	42,46%	15,36% AVANCE

TABLA 5 - CONSOLIDADO PORCENTAJES A 12 DE MARZO DE 2025

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

jasb Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Avance del proceso de fabricación y distribución del mobiliario escolar Buenaventura

AVANCE DE ENTREGAS - ORDEN DE BIENES # 1

| | | |

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

AVANCE DE ENTREGAS - ORDEN DE BIENES # 2

| | | |

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CANT.	DETALLE / PRODUCTOS	TOTAL ENTREGADO DE LA ORDEN 2	% ENTREGADO DE LA ORDEN 2	TOTAL ENTREGADO DE LA ORDEN 1	% ENTREGADO DE LA ORDEN 1	VALOR UNT.
2.010	CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA MESA PUESTO DE TRABAJO BASICA PRIMARIA. SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	1482	73,73%	1742	100%	$ 215.365.722
2.907	CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA MESA PUESTO DE TRABAJO BASICA SECUNDARIA. SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	2483	85,41%	2777	100%	$ 376.914.434
155	ITEM: CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO DOCENTE MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE. SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	82	52,90%	167	100,00%	$ 20.359.698
108	CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR MESA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR. SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	51	47,22%	99	100,00%	$ 12.862.047
50	CONJUNTO - SALA DE JUNTAS SALA DOCENTE MESA DE JUNTAS SALA DOCENTE. SILLA INTERLOCUTORA SALA DOCENTE	30	60,00%	46	100,00%	$ 53.306.370
533	ITEM: PRODUCTO MODULO DE 10 CASILLEROS ALUMNOS	386	72,42%	487	100,00%	$ 226.882.694
36	ITEM: PRODUCTO MODULO 10 CASILLEROS DOCENTES	20	55,56%	32	100,00%	$ 14.525.980
23	ITEM: PRODUCTO MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS	11	47,83%	19	100,00%	$ 7.890.344
155	ITEM: PRODUCTO TABLERO	86	55,48%	167	100,00%	$ 19.097.332
5.977		4.631		5.536		$ 947.204.621
						$ 179.968.878
24,96		77,48%		100%		$ 1.127.173.499
		10.167		42,46%		

TABLA 8 PORCENTAJE DE AVANCE ENTREGAS MES 02 ORDEN DE BIEN 01 – 02

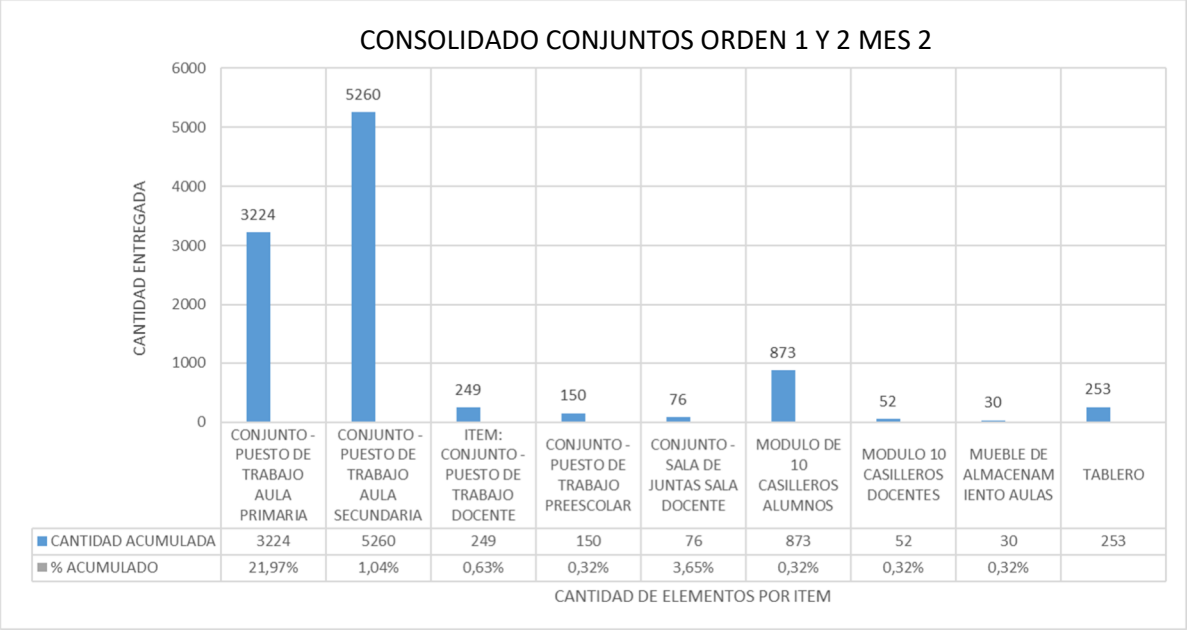


TABLA 9 PORCENTAJE DE AVANCE ENTREGAS MES 02 ORDEN DE BIEN 01 – 02 DEL TOTAL 42,46%

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

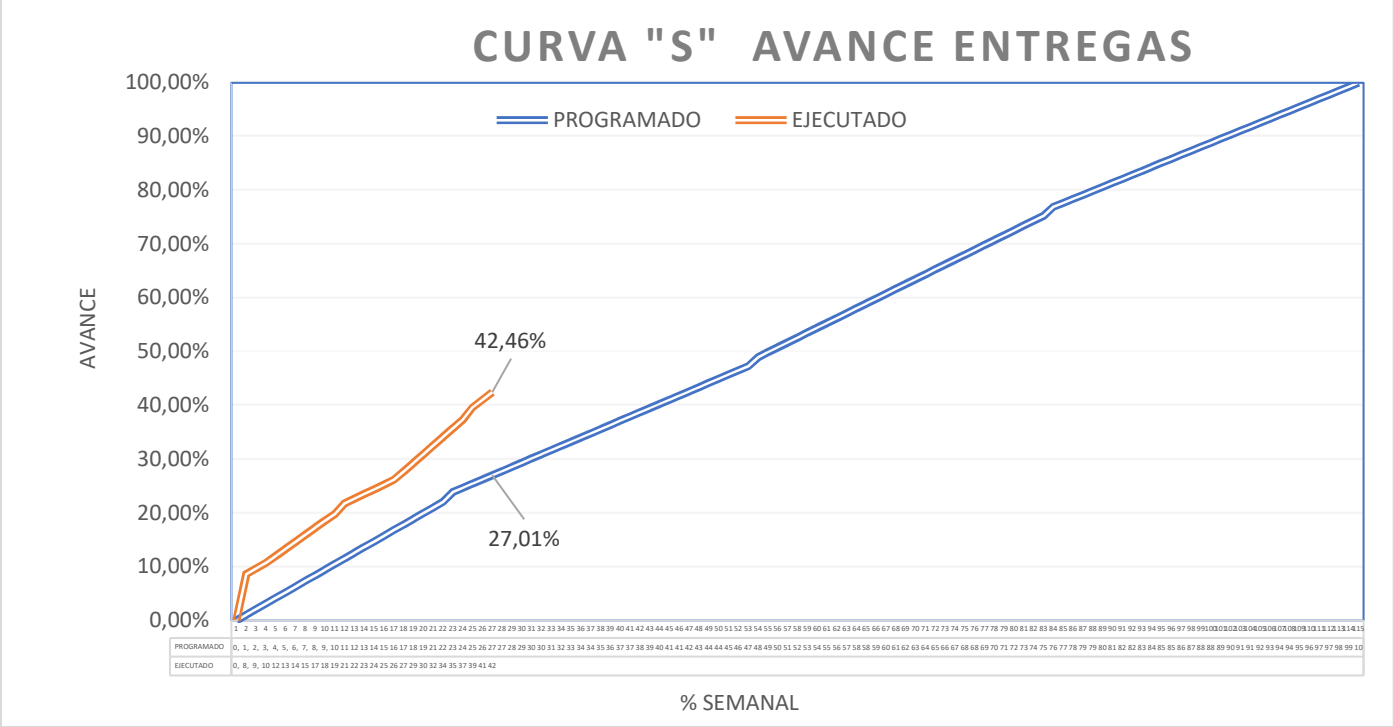


GRÁFICO 2 CURVA "S" MES 02

En la curva "S", se presenta el avance de entregas realizadas por el contratista Manufacturas Sumapaz, donde a la fecha de corte del segundo mes de actividades está programada la entrega de 27,01%, contemplando orden de bien 01 y 01, es asi que a la fecha lo ejecutado corresponde al 42,46%, teniendo un avance de 15% respecto a lo programado y en tiempo de alrededor de 14 dias.



jasb
Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Verificación Dimensiones	Revisión de calibre y ángulos
 	 
Verificación Dimensiones	**Verificación Dimensiones**
 	 
Revisión de calibres y ancho	Revisión medidas alturas y superficies
 	

jasb
Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co







	% programado	% ejecutado	Avance o atraso
Ejecución durante el periodo reportado	60%	89,06	29,06% AVANCE
Ejecución acumulada del proyecto	51,69%	71,10%	19,41% AVANCE

TABLA 10 CONSOLIDADO PORCENTAJES A 12 DE ABRIL DE 2025

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

AVANCE DE ENTREGAS - ORDEN DE BIENES # 2

CANT.	DETALLE / PRODUCTOS	27-FEBR-2025	27-FEBR-2025	28-FEBR-2025	28-FEBR-2025	01-MARZO-2025	01-MARZO-2025	03-MARZO-2025	03-MARZO-2025	03-MARZO-2025	04-MARZO-2025	04-MARZO-2025	04-MARZO-2025	04-MARZO-2025	04-MARZO-2025	05-MARZO-2025	05-MARZO-2025	05-MARZO-2025	06-MARZO-2025	06-MARZO-2025	06-MARZO-2025	06-MARZO-2025	07-MARZO-2025	07-MARZO-2025	10-MARZO-2025	11-MARZO-2025	11-MARZO-2025	11-MARZO-2025	12-MARZO-2025	12-MARZO-2025	13-MARZO-2025	13-MARZO-2025	14-MARZO-2025	14-MARZO-2025	14-MARZO-2025	14-MARZO-2025	14-MARZO-2025	17-MARZO-2025	17-MARZO-2025	17-MARZO-2025	20-MARZO-2025	20-MARZO-2025	20-MARZO-2025	20-MARZO-2025	20-MARZO-2025
	FECHA																																												
	PLACA	SPV 744	SOD 701	SZS 095	SQA 319	VZD 439	VZD 439	THV 551	FDF 049	FDF 049	ALA 316	WK 504	WK 504	SRC 700	SRC 700	SOD 701	VEE 445	VEE 445	SQA 319	SQA 319	SZS 095	SZS 095	THV 551	VZD 439	ALA 316	SRC 700	SRC 700	SRC 700	FDF 049	FDF 049	SZS 095	SZS 095	ALA 316	ALA 316	ALA 316	ALA 316	ALA 316	VZD 439	GNB 833	SQA 319	SQA 319					
	CONDUCTOR	YESID LOPEZ MORA	JORGE MARTINEZ	LIZEHAR SAMBONI	HENRY LEON	DIARO CASTELLANOS	DARIO CASTELLANOS	WILSON BELTRAN	MARCO CAGUA	MARCO CAGUA	MILTON HERRERA	JHONATAN LEON	JHONATAN LEON	JHONY MUÑOZ	JHONY MUÑOZ	JORGE MARTINEZ	CLEVES RODRIGUEZ	CLEVES RODRIGUEZ	HENRY LEON	HENRY LEON	LIZEHAR SAMBONI	LIZEHAR SAMBONI	WILSON BELTRAN	DIARO CASTELLANOS	MILTON HERRERA	JHONY MUNOZ	JHONY MUNOZ	JHONY MUNOZ	MARCO CAGUA	MARCO CAGUA	LIZEHAR SAMBONI	LIZEHAR SAMBONI	MILTON HERRERA	MILTON HERRERA	MILTON HERRERA	MILTON HERRERA	DIARO CASTELLANOS	LUIS CARLOS CASTELLANOS	HENRY LEON	HENRY LEON					
	REMISION No.	25-038	25-039	25-040	25-041	25-042	25-043	25-044	25-045	25-046	25-047	25-048	25-049	25-050	25-051	25-052	25-053	25-054	25-055	25-056	25-057	25-058	25-059	25-060	25-061	25-062	25-063	25-064	25-065	25-066	25-067	25-068	25-069	25-070	25-071	25-072	25-073	25-074	25-075	25-076	25-077					
	COLEGIO / IE	IE LA ANUNCIACION	IE LA ANUNCIACION	IE LA ANUNCIACION	IE LA ANUNCIACION	IE LA ANUNCIACION	LAS AMERICAS SEDE PRINCIPAL	LAS AMERICAS SEDE PRINCIPAL	LAS AMERICAS SEDE PRINCIPAL	LAS AMERICAS SEDE BAHIA	LAS AMERICAS SEDE BAHIA	LAS AMERICAS SEDE BAHIA	LAS AMERICAS SEDE PRINCIPAL	LAS AMERICAS SEDE BAHIA	LAS AMERICAS SEDE PRINCIPAL	LAS AMERICAS SEDE CARLOS HOLMES TRUJILLO	LAS AMERICAS SEDE CARLOS HOLMES TRUJILLO	LAS AMERICAS SEDE LA DIGNIDAD	LAS AMERICAS SEDE PRINCIPAL	LAS AMERICAS SEDE BAHIA	LAS AMERICAS SEDE BAHIA	LAS AMERICAS SEDE LA DIGNIDAD	LAS AMERICAS SEDE LA DIGNIDAD	LAS AMERICAS SEDE CARLOS HOLMES TRUJILLO	IE FRANCISCO JAVIER CONEROS SEDE PRINCIPAL	LAS AMERICAS SEDE LA DIGNIDAD	LAS AMERICAS SEDE CARLOS HOLMES TRUJILLO	IE FRANCISCO JAVIER CONEROS SEDE PRINCIPAL	IE FRANCISCO JAVIER CONEROS SEDE LA GRAN COLOMBIA	IE FRANCISCO JAVIER CONEROS SEDE CARLOS BORRERO SINISTERRA	IE FRANCISCO JAVIER CONEROS SEDE PRINCIPAL	IE FRANCISCO JAVIER CONEROS SEDE CARLOS BORRERO SINISTERRA	IE FRANCISCO JAVIER CONEROS SEDE CARLOS BORRERO SINISTERRA	IE FRANCISCO JAVIER CONEROS SEDE PRINCIPAL	IE FRANCISCO JAVIER CONEROS SEDE PRINCIPAL	IE FRANCISCO JAVIER CONEROS SEDE EL SALTO	IE FRANCISCO JAVIER CONEROS SEDE BRISAS DEL PACIFICO	IE FRANCISCO JAVIER CONEROS SEDE HECTOR EFRAIN QUINTERO	IE NIÑO JESUS DE PRAGA - SEDE PRINCIPAL	IE NIÑO JESUS DE PRAGA - SEDE MARINA SOLANO	IE NIÑO JESUS DE PRAGA - SEDE PRINCIPAL	IE NIÑO JESUS DE PRAGA - SEDE ANTONIO JOSE RUIZ	IE NIÑO JESUS DE PRAGA - SEDE BRISAS	IE NIÑO JESUS DE PRAGA - SEDE PRINCIPAL	IE NIÑO JESUS DE PRAGA - ANTONIO JOSE RUIZ	IE NIÑO JESUS DE PRAGA - FRANCISCO ELADIO RAMIREZ	IE NIÑO JESUS DE PRAGA - SEDE BREA
		PARCIAL 1	PARCIAL 2	PARCIAL 3	PARCIAL 4	PARCIAL 5 SALDO TOTAL	PARCIAL 1	PARCIAL 2	PARCIAL 3	PARCIAL 1	PARCIAL 2	PARCIAL 3	PARCIAL 4	PARCIAL 4	PARCIAL 5	PARCIAL 1	PARCIAL 2	PARCIAL 1	PARCIAL 6 SALDO TOTAL	PARCIAL 5	PARCIAL 6 SALDO TOTAL	PARCIAL 2	PARCIAL 3	PARCIAL 3	PARCIAL 1	PARCIAL 4 SALDO TOTAL	PARCIAL 4 SALDO TOTAL	PARCIAL 4 SALDO TOTAL	TOTAL	PARCIAL 1	PARCIAL 3	PARCIAL 2	PARCIAL 3 SALDO TOTAL	PARCIAL 4 SALDO TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	PARCIAL 1	TOTAL	PARCIAL 2	PARCIAL 1	PARCIAL 1	PARCIAL 3				
		CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
2.010	CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA MESA PUESTO DE TRABAJO BASICA PRIMARIA. SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	259					220		70	176	141						184	176				8	119					80	49		20	66			23	6	89	60	64	116	52	2	24		3	35
2.907	CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA MESA PUESTO DE TRABAJO BASICA SECUNDARIA. SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	60		350	242			280	79		180			283		320						190	93	29	288				89								31	193	103		97					
155	ITEM: CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO DOCENTE MESA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE. SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	8				14						14	10										12	9	8				7		8	4			4	1	6		12	18	2	2	0	10	2	4
108	CONJUNTO - PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR MESA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR. SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR					15				9					9								8						5	5	5					1	4		10				4		3
50	CONJUNTO - SALA DE JUNTAS SALA DOCENTE MESA DE JUNTAS SALA DOCENTE. SILLA INTERLOCUTORA SALA DOCENTE				2	6						2			3				1	1	3		5	4					2	1	3				1	1	1		3			1	5	3	1	1
533	ITEM: PRODUCTO MODULO DE 10 CASILLEROS ALUMNOS		85		4	7							49						19	55	26			52		63	2		16	8	41				3	1	14		20			1	45	16	1	5
36	ITEM: PRODUCTO MODULO 10 CASILLEROS DOCENTES				5							3	4										3	3					2				1	2		1	1	1		2			1	2	2	2	1
23	ITEM: PRODUCTO MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULAS					3						2	2										3						1		1	1				1	1		2	4				1		1
155	ITEM: PRODUCTO TABLERO	12		10				10			8			6		9		12							12				7		4	4			4	1	6		12	18	12	2			2	4
5.977		339	85	360	253	45	220	290	149	185	329	19	67	289	12	329	184	188	20	56	29	198	243	97	308	63	2	80	178	14	82	75	1	2	36	13	153	253	228	156	163	9	76	36	11	54

TABLA 11 ENTREGAS ORDEN DE BIEN 02 EN PROCESO AL 100,00% AL 20 DE MARZO DE 2025 ACUMULADO A LA FECHA 48,08%

Durante el periodo del presente informe no se presentaron devoluciones.

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

jasb
Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

AVANCE DE ENTREGAS - ORDEN DE BIENES # 3

| | | |

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

TOTAL ENTREGADO DE LA ORDEN 2	TOTAL ENTREGADO DE LA ORDEN 1	% ENTREGADO DE LA ORDEN 2	% ENTREGADO DEL CONT. TOTAL	VALOR UNT.
2010	1742	100,00%	44,47%	$ 292.095.210
2907	2777	100,00%	50,38%	$ 441.276.786
155	167	100,00%	50,79%	$ 38.484.795
108	99	100,00%	51,75%	$ 27.237.276
50	46	100,00%	45,93%	$ 88.843.950
533	487	100,00%	48,16%	$ 313.286.207
36	32	100,00%	46,90%	$ 26.146.764
23	19	100,00%	49,41%	$ 16.497.992
155	167	100,00%	50,79%	$ 34.419.610
5.977	5.536			$ 1.278.288.590
				$ 242.874.832
100,00%				$ 1.521.163.422

Tabla 13 Consolidado orden de bien No. 1 y No. 2 entregadas al 100 %, acumulado al 48,08%

ORDEN 3	ORDEN 2	ORDEN 1	
TOTAL ENTREGADO DE LA ORDEN 3	TOTAL ENTREGADO DE LA ORDEN 1	TOTAL ENTREGADO DE LA ORDEN 2	VALOR UNT.
2321	1742	2010	$ 882.534.433
2999	2777	2907	$ 1.318.062.034
135	167	155	$ 113.468.073
43	99	108	$ 63.049.250
49	46	50	$ 257.647.455
366	487	533	$ 814.661.694
9	32	36	$ 55.925.023
7	19	23	$ 35.147.896
129	167	155	$ 100.149.962
6.058	5.536	5.977	$ 3.640.645.820
			$ 691.722.706
89,06%	100%	100%	$ 4.332.368.526
73,38%	17571		71,10%

Tabla 14 Consolidado Orden de bien No. 1 (100%), 2(100%), y Orden de bien 3 entregadas al 89,06%, acumulado CONJUNTOS 73,38%; acumulado PRESUPUESTO 71,10%

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

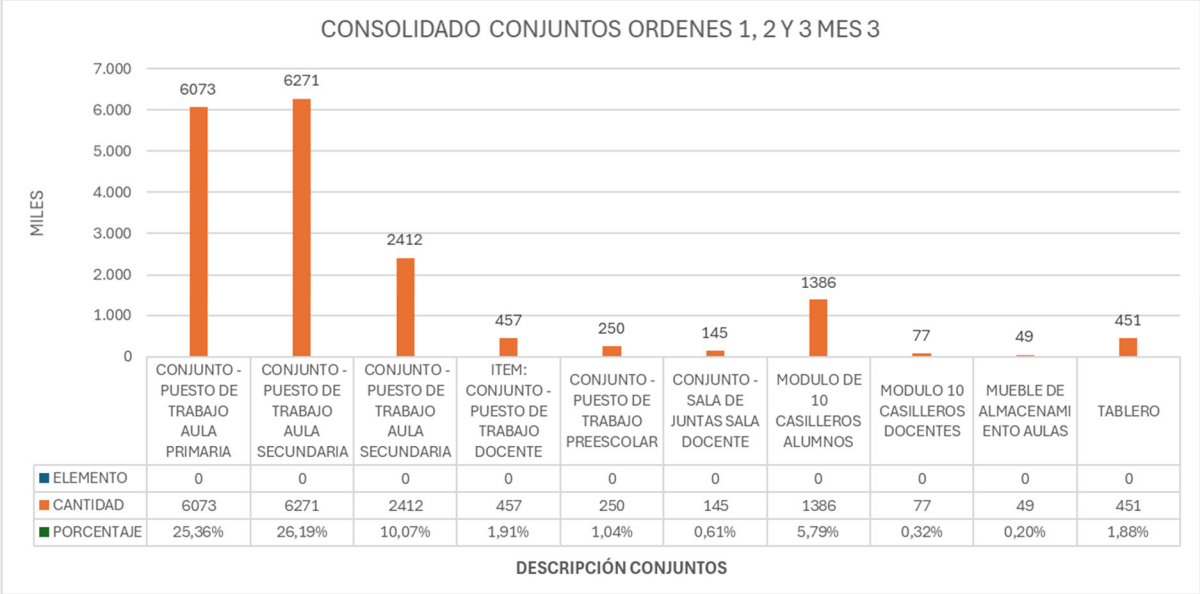


TABLA 15 PORCENTAJE DE AVANCE ENTREGAS MES 03 ORDEN DE BIEN 01-02-03 DEL TOTAL 71,10%

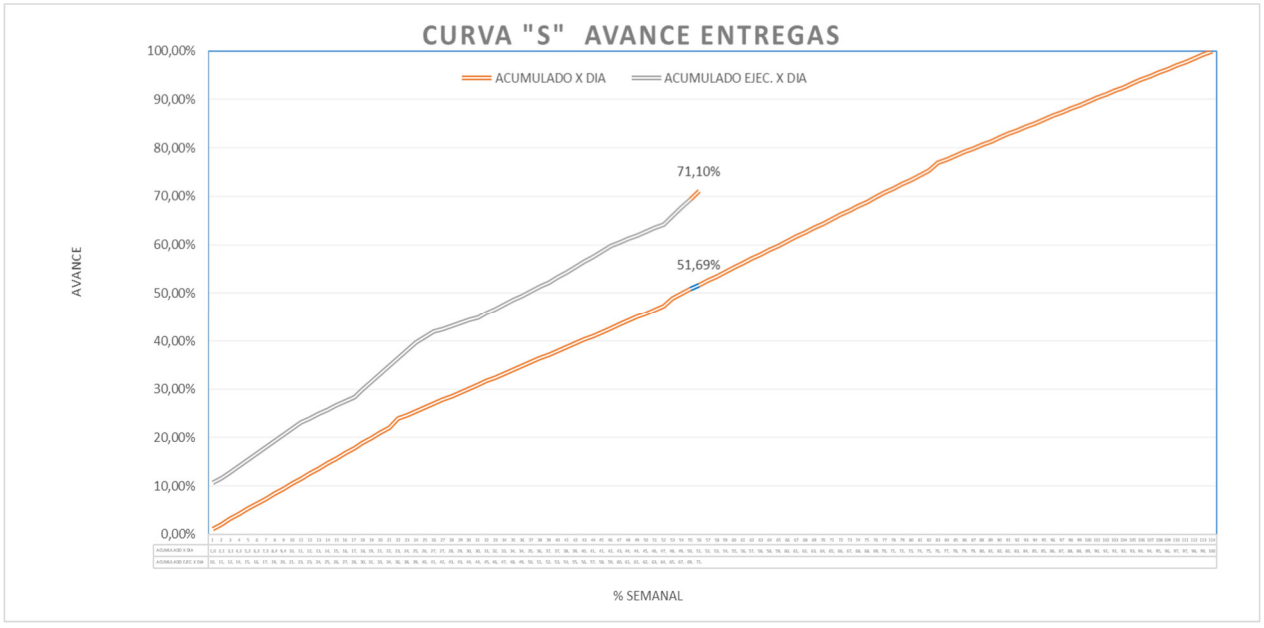


GRÁFICO 3 CURVA "S" MES 03

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

MARZO 13 A ABRIL 12 DE 2025

El segundo comité mensual se efectúa el día 13 de marzo de 2025 de manera virtual, se presenta el avance de cada una de las áreas de la producción, así como el porcentaje de despachos y entregas en sitio a satisfacción hasta la reunión mensual lo que equivale al 39.7% del contrato, equivalente a 9830 kits, se realiza una descripción detallada de cada uno de los despachos y las cantidades de productos enviados y entregados hasta el momento

Se realiza comité técnico No 4, el día 4 de marzo de 2025 de manera virtual en el cual se presenta por parte de la interventoría los avances realizados por parte del contratista Manufacturas Sumapaz, hasta la fecha del comité se había entregado la totalidad de la sede de la Institución Educativa La Anunciación, el porcentaje de avance a la fecha era de 21.7% en la totalidad del contrato y de la orden de bienes No.2 el porcentaje de ejecución es del 20.7%, las cifras presentadas son corroboradas por TF Interventores.

El día 11 de marzo de 2025 se realiza Comité técnico No.5 de manera virtual, la interventoría presenta el avance de la producción, despacho y entregas del mobiliario escolar en la ciudad de Buenaventura, que corresponde a la orden de bienes No. 2, con 39.7% de las entregas, el proceso se encuentra hasta la fecha de la anteriormente mencionada reunión en un 66.7%, lo que indica que el contrato tiene una semana aproximadamente de adelanto con lo programado

El comité técnico No.6 se realiza de manera virtual el día 18 de marzo del presente año, la interventoría presente el avance de ejecución del contrato de mobiliario para el distrito de Buenaventura, según reportes se cuenta con un 44.9% del contrato y un 87.6 de la orden de bienes No 2 con el porcentaje restante en tránsito y próximo a entregarse en la ciudad vallecaucana

Para el día 18 de marzo de 2025 se inicia el despacho de la orden de bienes No 3 con la Institución Educativa Pablo Emilio Carvajal en sus ocho sedes con 5436 unidades

El 26 de marzo de 2025 se realiza el ultimo comité técnico semanal del mes, manteniendo un dialogo constante con TF ingenieros se concuerda con las cifras de ejecución del contrato con Manufacturas Sumapaz, las cuales nos indican que se lleva el 52.1% del total del contrato, la orden de bienes No 2 ha sido entrega a satisfacción en su totalidad y para la orden de bienes No 3 se cuenta con el 14.5% de muebles en las instituciones educativas

El 2 de abril de 2025 se realiza comité técnico No. 8 semanal, manteniendo un dialogo constante con TF ingenieros se concuerda con las cifras de ejecución del contrato con Manufacturas Sumapaz, las cuales nos indican que se lleva el 59,70% del total del contrato, la orden de bienes No 2 ha sido entrega a satisfacción en su totalidad y para la orden de bienes No 3 se cuenta con el 42,69% de muebles en las instituciones educativas.

El 8 de abril de 2025 se realiza comité técnico No. 9 semanal, realizando la supervisión y control del proyecto en todos sus aspectos, y de los cuales se presenta que el avance general de entregas es de 64,20% del total del contrato, la orden de bienes No 3 se cuenta con el 72,02% de muebles recibidos en las instituciones educativas.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Es importante mencionar que las actividades de este mes tuvieron impacto por tiempo de semana santa, lo cual obligo a suspender despachos al 11 de abril, teniendo una semana posterior de no generar despachos.

En este mes se tuvo reunió o comité mensual 03, el 15 de abril donde se presenta lo relacionado en los cuadros e información presentada en el informe.

El avance del proyecto está dado en 17571 conjuntos recibidos, teniendo la orden de bien 01 y 02 culminadas al 100% y la tercera en **89,06%.**
Teniendo avance en las IE Pablo Emilio Carvajal al 96,65%, Liceo del Pacifico al 90,03%, IE Néstor Urbano Tenorio al 83,22% y el IE San Vicente al 77,80%. Lo cual ratifica el porcentaje mencionado.

El avance general del proyecto es de 71,10% ejecutado; programado 51,69%, teniendo un adelanto de 19,41%, asi mismo en tiempo se mantiene las dos semanas de avance, respecto a las fechas de entrega.

En este periodo del mes se revisan y avala la Orden de bien 01, para el pago de Manufacturas Sumapaz, con el oficio 753-033 REMISION ACTAS DE ENTREGA ORDEN DE BIENES No 1, con fecha de 13-03-2025.

Por otra parte, se envía al MEN, oficio respecto a las condiciones planteadas en contrato y las que realmente se tiene en el desarrollo del proyecto, enviado con el consecutivo, 753-036 CONDICIONES DE PERMANENCIA INTERVENTORÍA EN PLANTA Y ENTREGA. esta misma solicitud se vuelve a enviar después de haber realizado reunión con los profesionales del MEN, donde se entrega propuesta al tema indicado, esto don el oficio 753-039 CONDICIONES DE PERMANENCIA INTERVENTORÍA EN PLANTA Y ENTREGA., como retroalimentación de esta situación se envía propuesta el 15 de abril, con el oficio 753-046 PROPUESTA CONDICIONES DE PERMANENCIA INTERVENTORÍA EN PLANTA Y ENTREGA.

Se hace el envio con oficio 753-037 NOTIFICACIÓN CAMBIO DE RL, donde se indica el cambio de representante legal de Alianza Integral de Proyectos S.A.S BIC. Asi como del correo de correspondencia oficial con el consecutivo 753-038 NOTIFICACIÓN Cambio dominio al canal oficial de correspondencia. (@g-proyectos).

El 2 de abril, se hace la aprobación de la documentación de la orden de bien No. 02, con el oficio 753-040 REMISION APROBACION DOCUMENTACION Y ACTAS DE ENTREGA ORDEN DE BIENES N 2, la cual es enviada a la gerencia y al MEN.



El día 4 de abril se hace el envío a la gerencia de las documentación con soporte de aprobación informes 1 y 2 a la gerencia para el respectivo trámite de pago de la Interventoría.

Asi mismo el 9 de abril se envía al MEN, informe mensual 3 de interventoría, para su revisión y aprobación, este es enviado por la plataforma del MEN y por correo a los profesionales de la entidad, esto con el oficio, 753-044 REMISIÓN INFORME MENSUAL No.3 INTERVENTORIA.

jasb
Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Avance del proceso de fabricación y distribución del mobiliario escolar Buenaventura
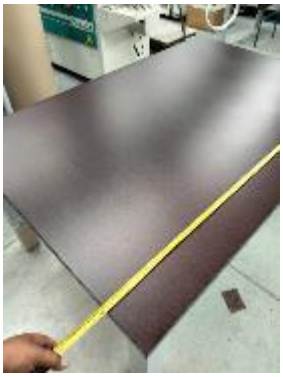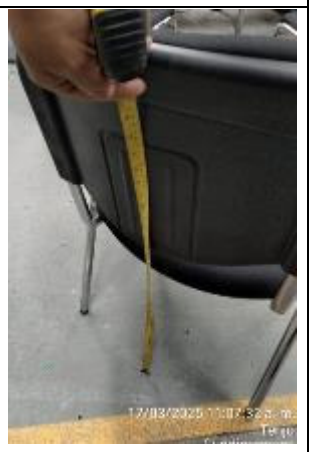
<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>Verificación Dimensiones</td><td>Verificación Dimensiones</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>Verificación Dimensiones</td><td>Verificación Dimensiones</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
</table>

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Verificación Dimensiones	Revisión medidas alturas y superficies
	
	
	

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

jasb
Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

















Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co









Durante el periodo del presente informe no se presentaron devoluciones.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

ABRIL 13 A MAYO 12 DE 2025

El 14 de abril se muestra gran avance en fabricación y entregas de la orden N°3 hasta la fecha se cuenta con un 89.90% de entregas en las instalaciones educativas, hasta la fecha no se ha efectuado ninguna devolución de los insumos entregados.

Se realiza el empalme de datos entre la interventoría y manufacturas Sumapaz el 24 de abril de los cuales se envía en el segundo viaje del día los 22 casilleros de alumnos faltantes para la institución educativa Liceo del Pacifico en su sede principal completando la orden N°3, incluyendo el inicio de despacho del orden N°4 el 21 abril y hasta la fecha se lleva de la orden N°3 un 99.80% de dotación entregada y para la orden N°4 un 29.80% entregado en las instituciones educativas con un avance general del contrato de 83.50%.

Se efectúa el comité numero 11 el día 29 de abril con fecha de corte del lunes 28 de abril para socializar el avance del contrato en el cual se presenta la orden N°3 al 100% sin ninguna eventualidad y un avance de la orden N°4 en un 44.16% ya entregado en las instituciones con un total del contrato hasta la fecha del 86.99%. Se realizan reuniones de trabajo para proponer y determinar las fechas de visitas a las instituciones educativas, en primera instancia se proponen cuatro (4) IE urbanas y tres (3) IE rurales.

Se realiza comité de avance No. 12 el 6 de mayo, donde se tiene ya tres órdenes de bienes terminadas al 100%, y la cuarta orden en un porcentaje de 68,42%, teniendo avance en todas las Instituciones Educativas,

Habiéndose realizado 24 entregas con los siguientes resultados, José María Cabal 40,61%, Vasco Núñez de Balboa 64,60%, Nachasin 67,36%, Agropecuario José María Cordoba 98,40% y IE Francisco José de Caldas 87,70%.

Se realiza corte al 10 de mayo, teniendo de despachos hasta esta fecha y haciendo el recibo el lunes siguiente 12 de mayo, este avance se relaciona en el comité mensual de avance, presentando un avance de **4,959** conjuntos que representan un 88,08%, el acumulado a la fecha es de 22530 conjuntos, el acumulado general de avance es de 94,09 %. Y con un acumulado en presupuesto de 91,66%

Se corrige cantidad y porcentaje respecto al valor presentado.

Se envía correo con prepuesta permanencia Interventoría, el día 15 de abril, para ser revisada por el supervisor del ministerio.

Se hace el envio del oficio de concepto, respecto al reajuste y negociación de este, con radicado 753-045 REMISION SOLICITUD REAJUSTE DE PRECIOS AL CONTRATO 8000009092.

Se envía correo de propuesta visitas a localidades para visita en el mes de mayo, con radicado, 753-049 PROGRAMACIÓN PROPUESTAS VISITA MAYO 21 Y 22 IE BUENAVENTURA. Con fecha 15 de abril de 2025.

Se envía correo de aprobación orden de bien 03, con radicado, 753-050 REMISION APROBACION DOCUMENTACION Y ACTAS DE ENTREGA ORDEN DE BIENES N 3, del 2 de mayo de 2025.

Se realizar entrega de informe mensual 04, 753-053 REMISIÓN INFORME MENSUAL No.4 INTERVENTORIA. El cual tuvo observaciones. Este fue radicado el 6 de mayo de 2025.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Asi mismo se vuelve a enviar documentación a la gerencia determinados por los cambios de mes y consecuente al periodo de facturación.

El 13 de mayo de envio oficio final de programación visita a sitios para verificación entrega mobiliario, con radicado 753-054 PROGRAMACIÓN FINAL PROPUESTA VISITA MAYO 21 Y 22 IE BUENAVENTURA.

	% programado	% ejecutado	Avance o atraso
Ejecución durante el periodo reportado	50%	88,08%	38% AVANCE
Ejecución acumulada del proyecto	78,40%	94,09%	17% AVANCE

TABLA 16 CONSOLIDADO PORCENTAJES A 12 DE ABRIL DE 2025

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

RELACION DE ENTREGAS ODB # 4 - CENIT

| CANT. | DETALLE / PRODUCTOS | VALOR UNT. | VALOR TOTAL | FECHA | PLACA | CONDUCTOR | REMISION No. | COLEGIO / IE | | |

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

	ORDEN 4	ORDEN 3	ORDEN 2	ORDEN 1		
PORENTREGAR	TOTAL ENTREGADO ORDEN 4	TOTAL ENTREGADO ORDEN 3	TOTAL ENTREGADO ORDEN 2	TOTAL ENTREGADO ORDEN 1	VALOR UNT.	VALOR UNT.
2233	2233	2448	1742	2010	$ 1.225.491.993	$ 1.225.491.993
2209	2185	3227	2777	2907	$ 1.684.350.608	$ 1.687.993.700
146	135	161	167	155	$ 353.442.602	$ 156.173.781
83	73	93	99	108	$ [illegible]	$ [illegible]
39	31	57	46	50	$ [illegible]	$ [illegible]
164	132	600	487	533	$ [illegible]	$ [illegible]
17	14	35	32	36	$ 84.976.983	$ 87.155.880
24	17	20	19	23	$ 56.667.016	$ 61.688.144
150	139	161	167	155	$ [illegible]	$ [illegible]
5.065	4.959	6802	5536	5977	$ 4.793.855.791	$ 4.845.418.759
					$ 910.832.600	$ 920.629.564
89,96%	88,08%	100,00%	100%	100%	$ 5.704.688.391	$ 5.766.048.323
24.480		22530			93,62%	94,63%

Tabla 18 Acumulado ordenes de bien 1, 2, 3 y 4, con 4.959 conjuntos entregados en a cuarta orden de bien, llevando un 88,08% de esta, acumulado general es de 22.530 conjuntos con un 94,08%. En cuanto a presupuesto el acumulado es de 91,66%.


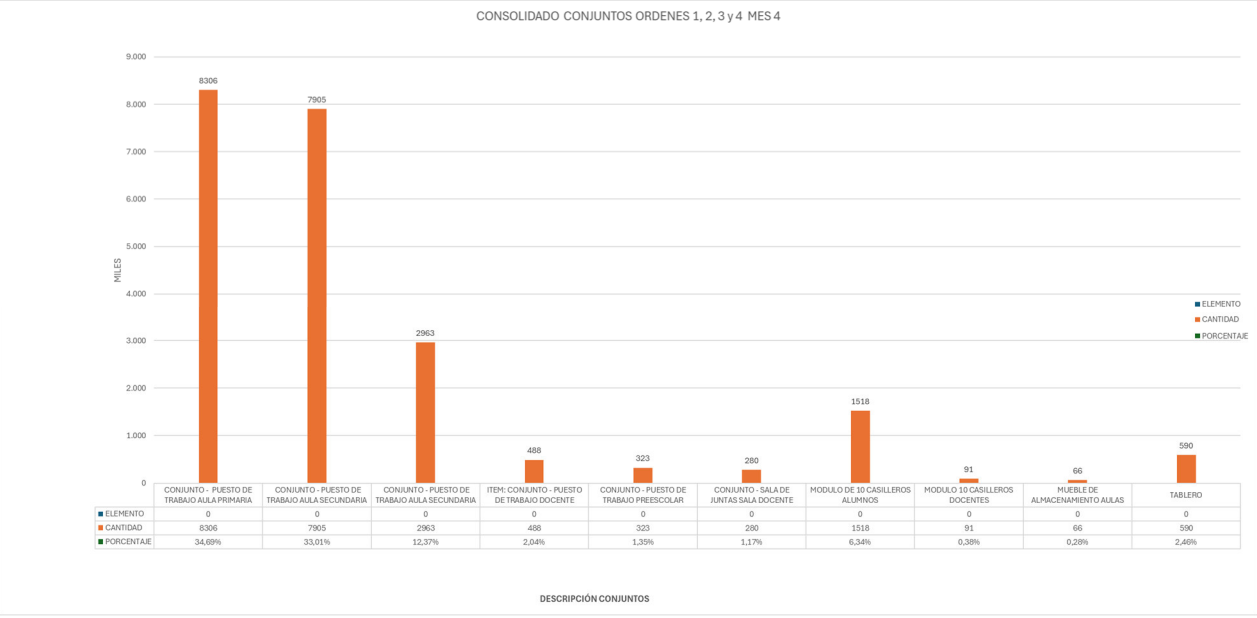


TABLA 19 PORCENTAJE DE AVANCE ENTREGAS MES 04 ORDEN DE BIEN 01-02-03 -04 DEL TOTAL 94,09%

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos


Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

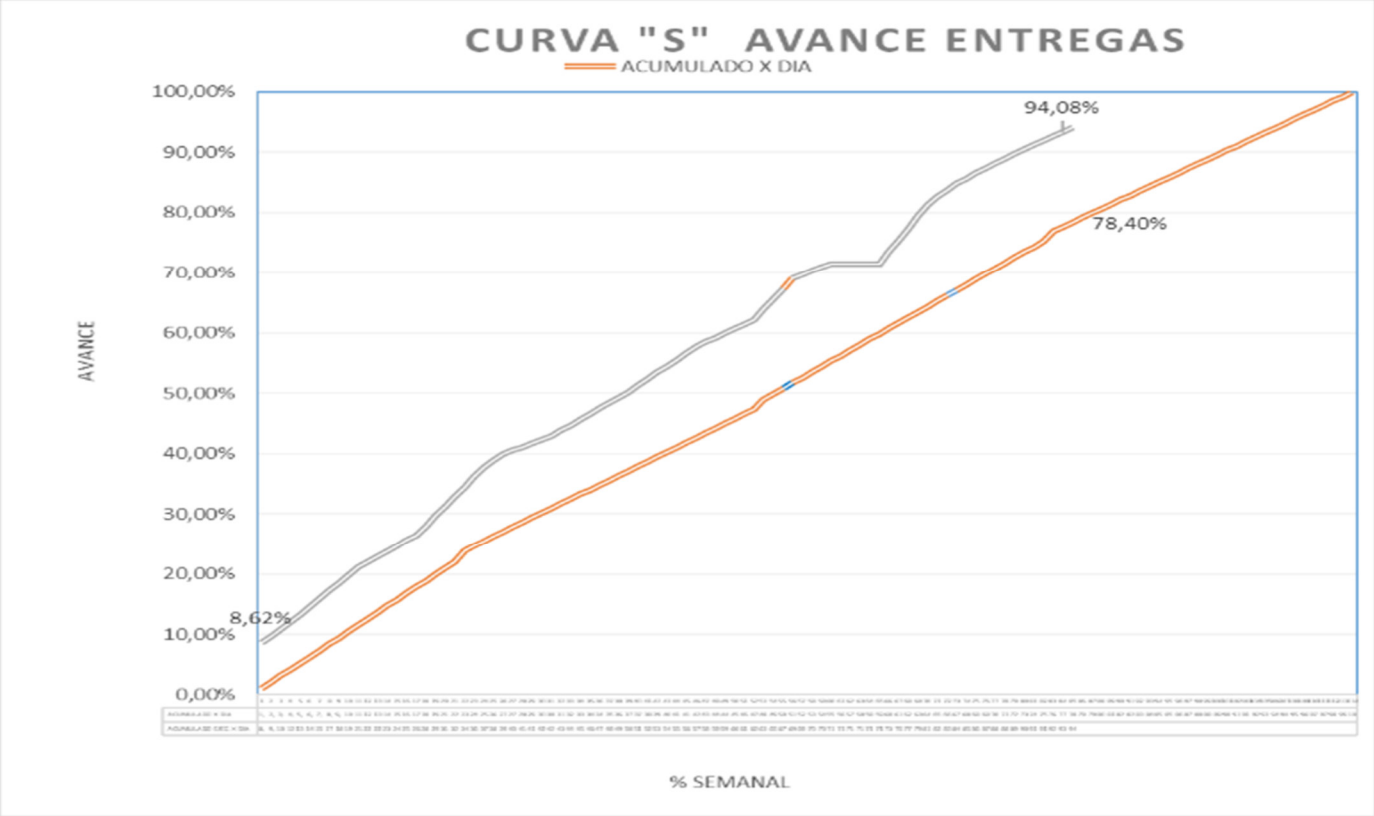

Avance del proceso de fabricación y distribución del mobiliario escolar Buenaventura

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

 	  
Verificación Dimensiones	Verificación Dimensiones
  	   
Verificación Dimensiones	Verificación Dimensiones
   	  
Verificación Dimensiones	Revisión medidas alturas y superficies

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co












Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co







EVIDENCIA DE ACOPIO DE CASILLEROS PARA DOCENTES







Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

MAYO 13 AL 12 DE JUNIO 2025

Se realiza el comité número 13 de mayo con corte de avance el 12 de mayo, se presenta un avance general del contrato del 94,08% despachado y recibido en las instituciones educativas, la orden No 4 se lleva un avance del 88.08% y un 1.88% en tránsito por parte de la manufacturera Sumapaz socializa que el lote de casilleros puede presentar demora para su despacho por tema de ensamble, pintura y correcciones para su entrega final.

Se hace el envio de una nueva solicitud respecto a la respuesta que debe realizar el MEN, generando el concepto respectivo al reajuste, La comunicación de Interventoría fue enviada el 15 de abril, con el consecutivo 753-045 REMISION SOLICITUD REAJUSTE DE PRECIOS AL CONTRATO 8000009092.

El 19 de mayo se inicia la reunión de avance hasta el 18 de mayo de los ítems recibidos por parte de la interventoría establecida en buenaventura con el 96.10% verificado y entregado en las instituciones educativas pertinentes a la orden No 4, presentando un avance general del contrato del 99.44% hasta la fecha, en el comité se confirma el personal que va a asistir a la revisión junto con el ministerio de educación.

Los dias 21 y 22 de mayo se realizan las visitas a las instituciones educativas, teniendo como itinerario el día 21 las IE rurales, la cuales correspondieron a IE FRANCISCO JAVIER CISNEROS, IE NACHASIN y IE AGROPECUARIO JOSÉ MARÍA CORDOBA.

El segundo día 22 de mayo, se realizan las visitas a la Instituciones educativas Urbanas, l IE SAN VICENTE, IE LICEO DEL PACIFICO, a IE TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO y IE TERMARIT, como parte de las visita se hacen las actas respectivas que corroboran las visitas realizadas.

El 29 de mayo, se hacen entrega de las actas de la orden de bien 04, donde se hace la verificación de los despachos y recibos realizados. Con esta entrega se culmina la entrega de mobiliario escolar en la localidad de Buenaventura.

En el comité numero 14 del 27 de mayo, se confirma la finalización de despacho y el recibido de todos los ítems acordados del contrato al 100%, se designa las fechas estimadas para realizar la facturación de todas las partes y realizar el cierre del contrato.

El 3 de junio, se recibe correo, por parte del supervisor del Ministerio de Educación Nacional, donde indica que se debe realizar el cambio de los informes 1, 2, y 3, con las fechas de ejecución real del proyecto, esto tuvieron cambios sustanciales, en las incidencias, porcentajes y entregas, los cuales fueron entregados el 13 de junio y enviando correo con radicado el 16 de junio.

Por otra parte, el concepto generado por el MEN, respecto al reajuste solicitado por el contratista Manufacturas Sumapaz, tuvo respuesta y se cargó a la plataforma Suifp el 5 de junio de 2025.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

DETALLE / PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL	DEPTO	ETAPAS	ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ORDEN DE BIEN #1	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ORDEN DE BIEN # 2	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ORDEN DE BIEN # 3	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ORDEN DE BIEN # 4
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR	46 753	BUENAVENTURA	FABRICACION	AUSTAMIENTO DE PROVEEDURÍA - MATERIAS PRIMAS	100%	100%	100%	100%	100%
				CORTES DE TUBERÍA, LAMINA, Y PARTES METALICAS. - TROQUELADOS - DESPUNTES - Y DOBLECES	100%	100%	100%	100%	100%
				PREPARACIÓN - MEZCLA DE PRODUCTOS Y COLORES PARA COMPONENTES PLASTICOS E INYECCION DE COMPONENTES	100.0%	100%	100%	100%	100%
				ENCHAPES DE MADERAS - AGLOMERADOS - LAMINADOS DECORATIVOS - CANTOS PVC. CORTES - ETC	100.0%	100%	100%	100%	100%
				SOLDADURAS - PINTURAS - ENSAMBLE	100.0%	100%	100%	100%	100%
				VERIFICACIÓN DE CALIDAD - EMPAQUE Y EMBALAJE	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%
			DISTRIBUCION	TRANSPORTE	100.00%	100.0%	100.00%	100.00%	100.00%
				ENTREGA EN SITIO	100.00%	100.0%	100.00%	100.00%	100.00%

Tabla20 Avance del proceso de fabricación y distribución del mobiliario escolar Buenaventura

	% programado	% ejecutado	Avance o atraso
Ejecución durante el periodo reportado	49%	100%	51 % AVANCE
Ejecución acumulada del proyecto	87,34%	100%	13 % AVANCE

Tabla 21 programado Orden de bien 04 24,72 % ejecutado al 100%

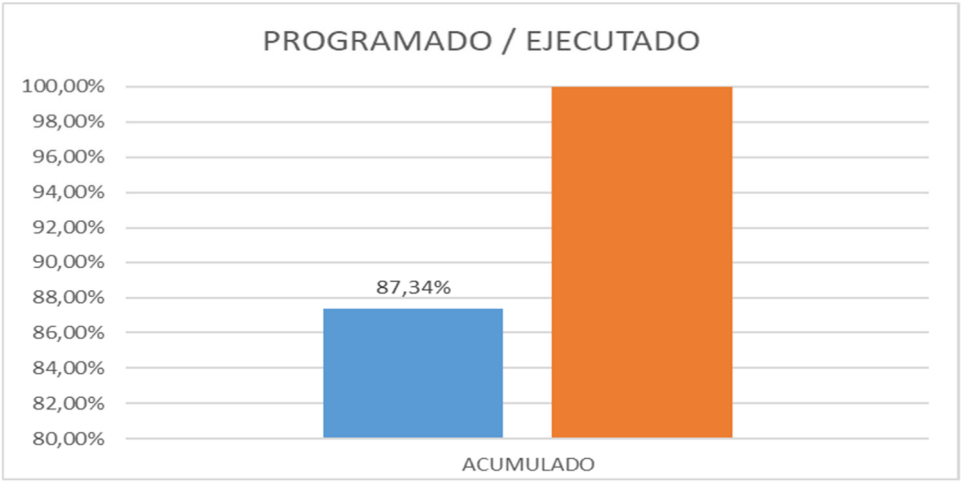


Tabla 22 Consolidado general del proyecto – ejecutado 100% programado 87,34%

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

RELACION DE ENTREGAS ODB # 4 - CENIT

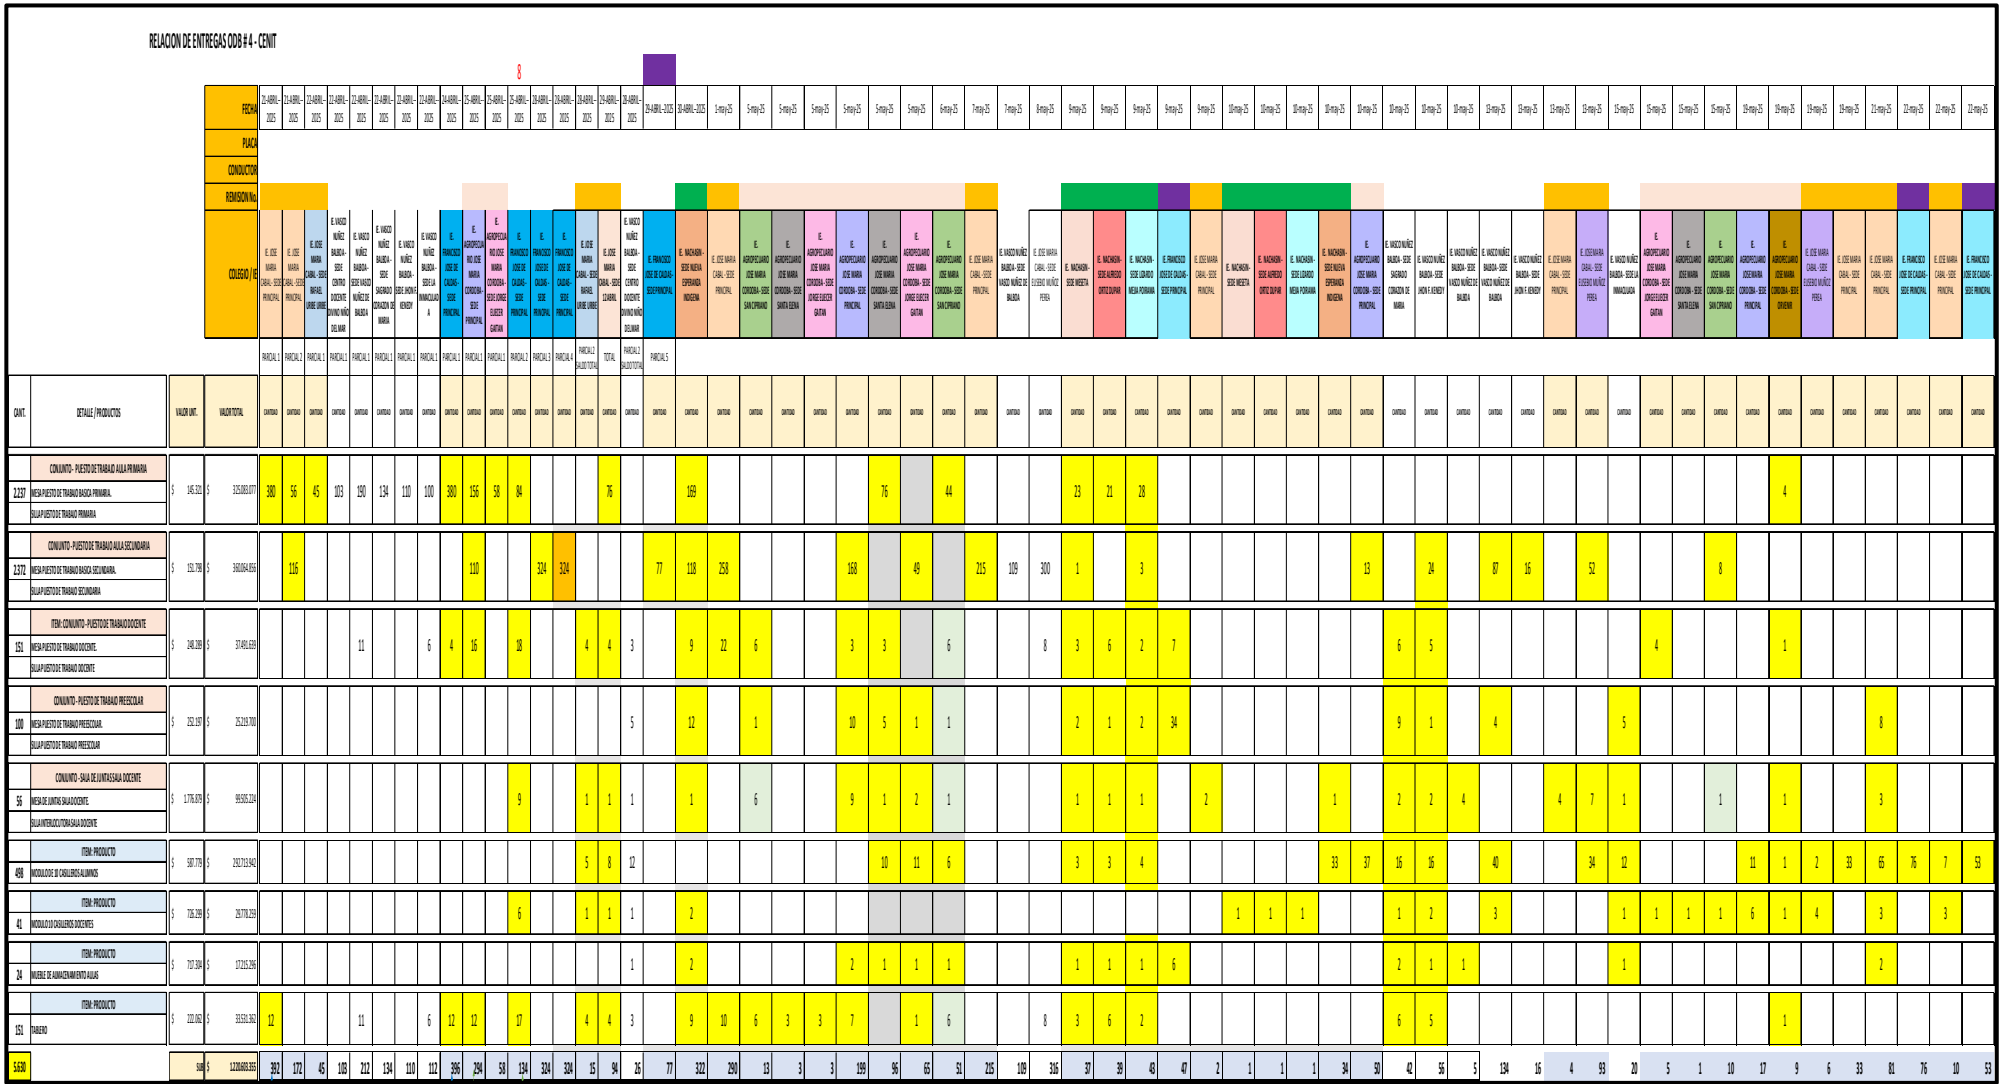


Tabla 23 ENTREGAS ORDEN DE BIEN 04 EN PROCESO AL 100% DEL 13 JUNIO AL 22 DE JUNIO DE 2025 - ACUMULADO TOTAL PROYECTO 100%

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

ORDEN 4	ORDEN 3	ORDEN 2	ORDEN 1				
TOTAL ENTREGADO ORDEN 4	TOTAL ENTREGADO ORDEN 3	TOTAL ENTREGADO ORDEN 2	TOTAL ENTREGADO ORDEN 1	VALOR UNT.	ACUMULADO CONJUNTOS	% POR CONJUNTO	
2237	2448	1742	2010	$ 1.226.073.277	8437	35,23%	82,36%
2372	3227	2777	2907	$ 1.712.736.834	11283	47,12%	
151	161	167	155	$ 157.415.226	634	2,65%	
100	93	99	108	$ 100.878.800	400	1,67%	
56	57	46	50	$ 371.367.711	209	0,87%	17,64%
498	600	487	533	$ 1.244.915.922	2118	8,85%	
41	35	32	36	$ 104.587.056	144	0,60%	
24	20	19	23	$ 61.688.144	86	0,36%	
151	161	167	155	$ 140.787.308	634	2,65%	
5.630	6802	5536	5977	$ 5.120.450.278	23945	100,00%	
				$ 972.885.553			100,00%
100,00%	100,00%	100%	100%	$ 6.093.335.831		100,00%	
	23.945			100,00%			

TABLA 24 RESUMEN ORDEN DE BIENES 1-2-3-4 CULMINAD AL 100%

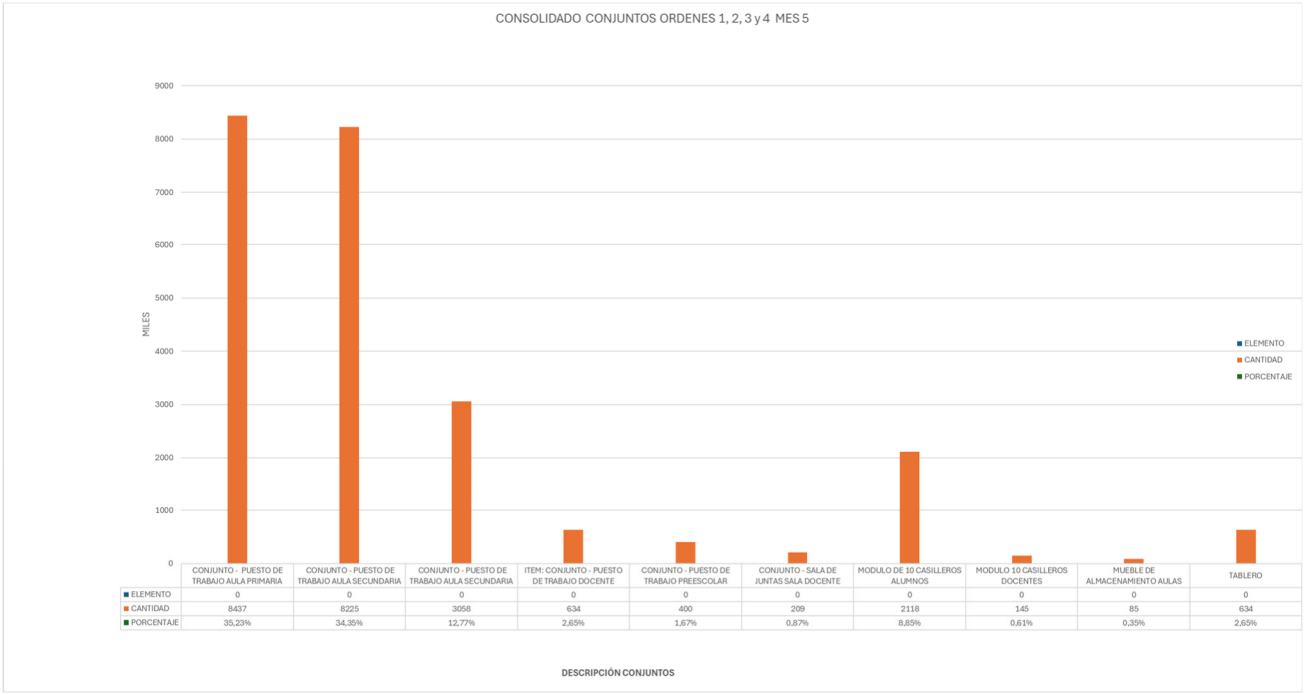


Tabla 25 CANTIDAD DE ELEMENTOS POR ITEM

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co



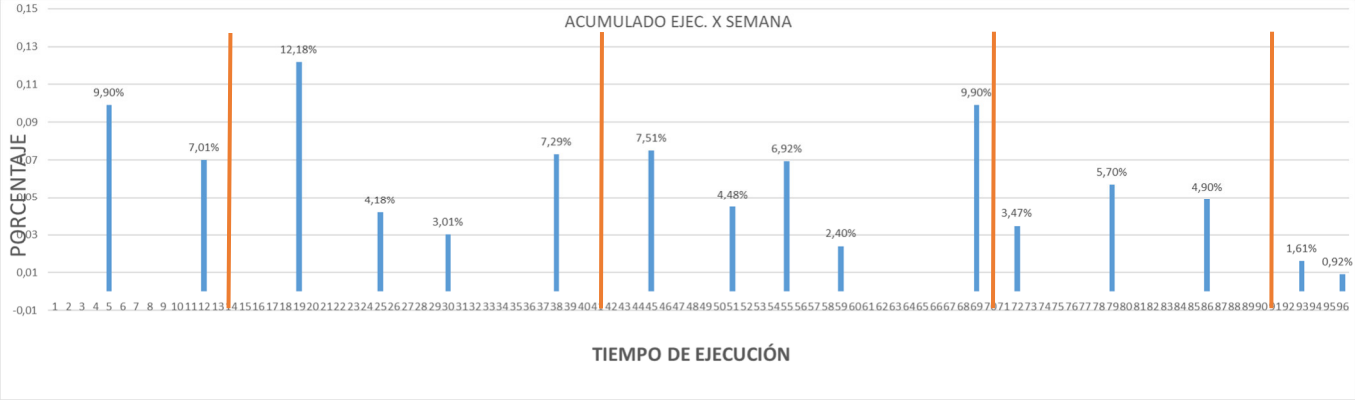


Tabla 26 Porcentajes de entregas en el desarrollo del proyecto

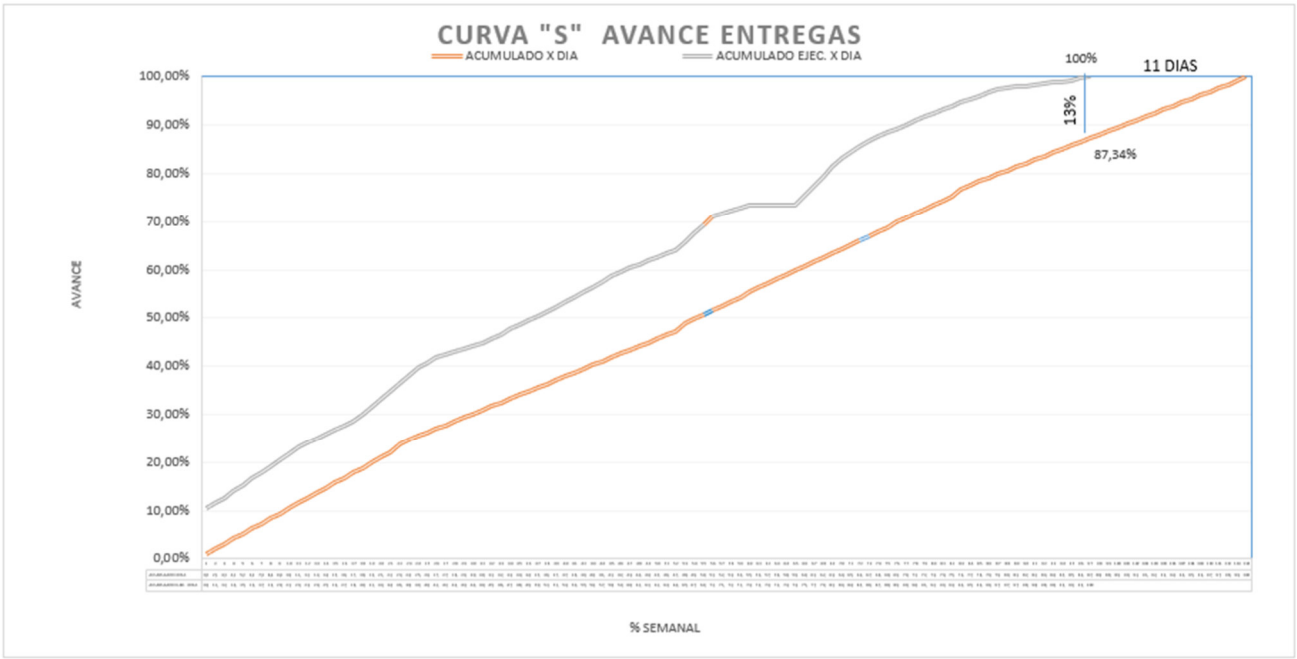

jasb
Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

<table>
<tr><td> </td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos


Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

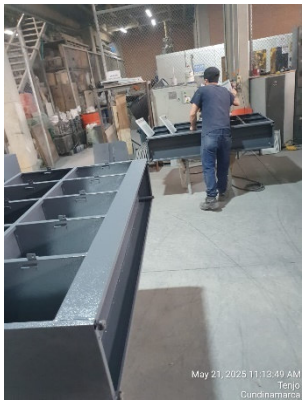










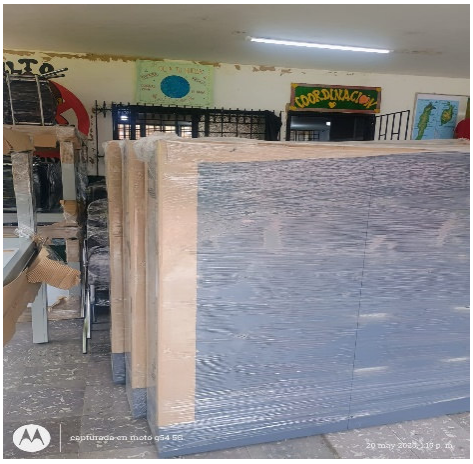



ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. B.I.C
NIT 901.506.750-7

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos


Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co










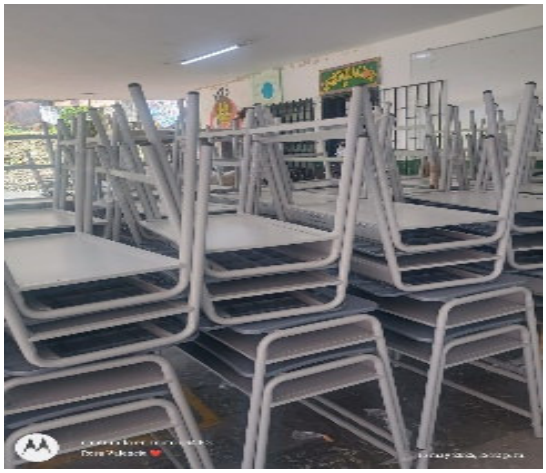



jasb Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

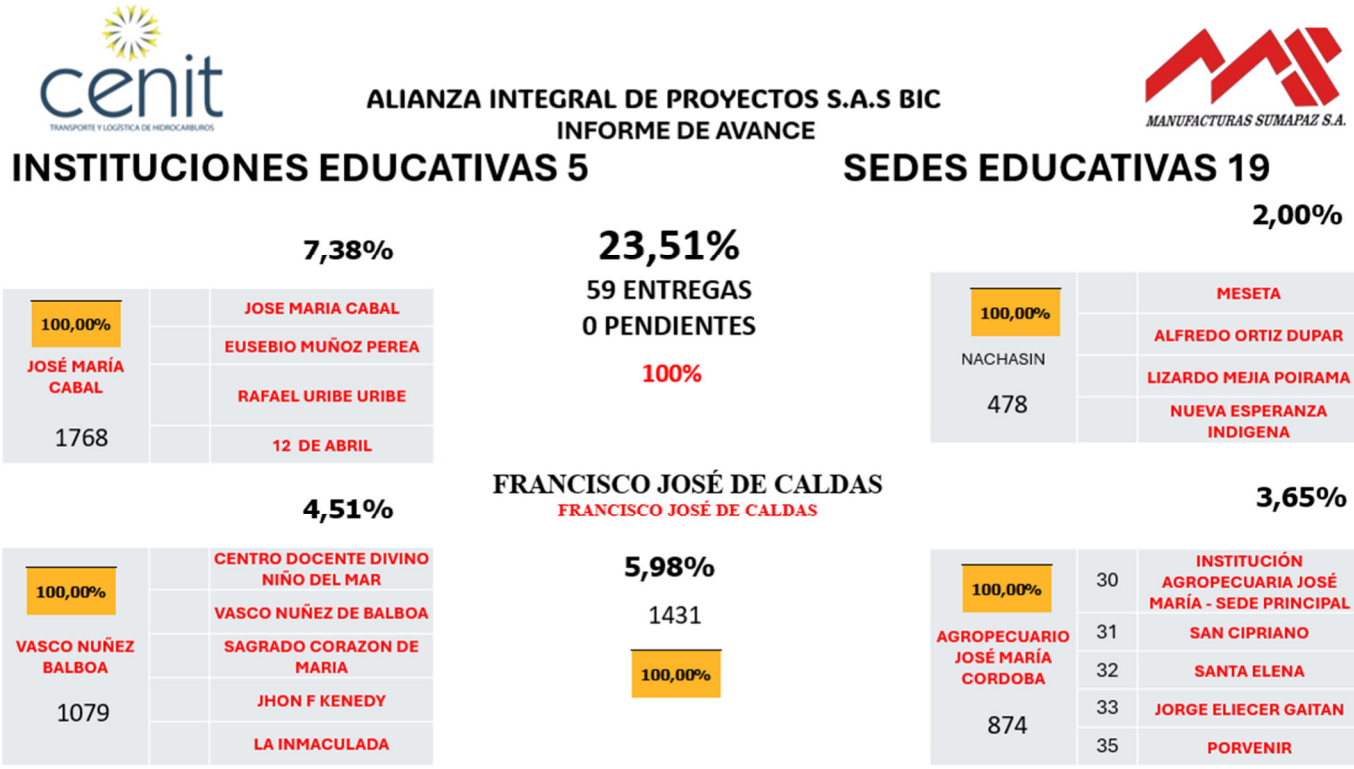

Avance en comité de avance No 14 – final de mayo

JUNIO 13 AL 12 DE JULIO 2025

En el desarrollo de las actividades del mes se realizan las actividades de recibo y aprobación de actas, asi mismo se entrega el certificado al contribuyente, donde se indica que el proyecto de suministro ha culminado sus actividades, teniendo en cuenta que los oficios de aceptación de las actas de orden de bien ya fueron entregados a la gerencia y al MEN.

El contratista Manufacturas Sumapaz entrega nuevamente radicación para el acta de aprobación de la orden de bien No. 4, teniendo en cuenta que por temas de flujo caja que se deje una IE (Nachasin), la cual quedará para liquidación final del contrato. Se genera oficio de aprobación por parte de Interventoría el 16-06-2025.

Para estas mismas fechas se hace la entrega de la corrección de los informes 1, 2 y 3, donde se actualizan fechas e información particular de cada informe, esto solicitado por el MEN.

Se hace entrega de las actas de recibo de las ordenes de bienes No. 1, 2, 3 y 4. Habiéndose realizado la total de la visitas en sitio (64 sedes), la cuales están soportadas por el formato ANEXO No. 24 REPORTE DE SEDES BENEFICIADAS OXI.

Los informes de gestión de interventoría, de los meses 4 y 5, se entregan ya teniendo la totalidad de las entregas realizadas del contrato, estos fueron radicados el 17 y 19 de junio.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Asi mismo se recibe las actas de aprobación de los informes de interventoría 1,2 y 3 con los siguientes radicados.

-2025-EE-176161-Correspondencia_de_salida-14516580.pdf_2025-EE-176161
-2025-EE-178497-Correspondencia de salida-14526345.pdf_2025-EE-178497
-2025-EE-178485-Correspondencia_de_salida-14527117.pdf_2025-EE-178485

LINEA DE TIEMPO ACTIVIDADES CONTRATISTA		
1	Firma de Contrato	16/04/2024
2	Entrega de Pólizas Iniciales para el Contrato.	25/04/2024
3	Entrega de Pólizas sobre el acta de inicio	14/01/2025
4	Firma de Acta de Inicio, de fecha enero 13 de 2025.	13/01/2025
5	Entrega de Anexos de Pólizas - Actualización para Acta de Inicio. Anexo 2 Póliza de Cumplimiento.	14/01/2025
6	Aprobación de Prototipos.	17/01/2025
7	Aprobación de la Marcación	21/01/2025
8	Aprobación por parte de la Interventoría del MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO Y GARANTÍA.	23/01/2025
9	Manufacturas Sumapaz, solicitó formalmente reajuste de precios	24/01/2025
10	Aprobación por parte de la Interventoría del CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y CRONOGRAMA DE PRODUCCION.	29/01/2025
11	Se iniciaron los despachos para las Instituciones Educativas de la orden de Bien No. 1 del contrato.	06/02/2025
12	Aprobación por parte de la Interventoría de las 4 órdenes de Bienes	12/02/2025
13	Se termino de despachar la Orden de Bien No. 1 del contrato	21/02/2025
14	Se iniciaron los despachos para las Instituciones Educativas de la orden de Bien No. 2 del contrato.	27/02/2025
15	Se termino de despachar la Orden de Bien No. 2 del contrato	18/03/2025
16	Se iniciaron los despachos para las Instituciones Educativas de la orden de Bien No. 3 del contrato.	18/03/2025
17	Se iniciaron los despachos para las Instituciones Educativas de la orden de Bien No. 4 del contrato.	21/04/2025
18	Se termino de despachar la Orden de Bien No. 3 del contrato	24/04/2025
19	Se termino de despachar la Orden de Bien No. 4 del contrato	21/05/2025
20	Suspensión del contrato	09/06/2025
21	Otrosí No. 1 – Ajuste de Tarifas	26/06/2025
22	Acta de reinicio	03/07/2025

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Esta información se radica a la gerencia del proyecto, el día 24-06-2025

El día 2 de julio de 2025, se entrega al MEN, la aprobación de la documentación del otrosí del contrato de Manufacturas Sumapaz, donde se justifica el proceso soportada técnica, jurídica y financieramente.

El 7 de julio, se envía la documentación de facturación de interventoría donde con las facturas de los meses 1,2 y 3.

La terminación del contrato de Manufacturas Sumapaz dio termino el 12 de junio de 2025, ya teniendo terminadas las entregas, ya generados las aprobaciones de actas y documentación.

Se genera una suspensión el cual inicio el 9 de junio de 2025, la cual se tuvo hasta el 3 de julio, conformada por el acta de reinicio.

FACTURACIÓN

En el proceso del contrato se generaron hasta la fecha la siguiente facturación de las ordenes de bienes.

PENDIENTE POR FACTURAR CONTRA LIQUIDACION: INSTITUCION EDUCATIVA NACHASIN CON SUS 4 SEDES, El saldo pendiente por facturar de este Contrato, equivale al **1,98%** que corresponde a la suma de: **Ciento Veintinueve Millones Doscientos Cuarenta y Nueve mil Cuatrocientos Sesenta y dos Pesos M/Cte ($129.249.462).**

FACTURA	FECHA RADICACION	FECHA DE PAGO AL CORTE DEL MES	PAGADO
Factura ODB No. 1 FEMS 758 $1.407.845.563,81	18/03/2025	22-04-2025	$ 1.326.805.714
Factura ODB No. 2 FEMS 766 $1.521.163.422,10	14/04/2025	08-05-2025	$ 1.433.600.653
Factura ODB No. 3 FEMS 779 $1.711.819.556,51	15/05/2025	12-06-2025	$ 1.613.282.045
Factura ODB No. 4 PAGO 1 FEMS 810 $1.323.268.531	09/07/2025	NO SE HA PAGADO A LA FECHA DE CORTE	
Factura al OTROSÍ FEMS 811 $450.907.643	09/07/2025	NO SE HA PAGADO A LA FECHA DE CORTE	

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

COMPONENTE JURIDICO DEL CONTRATO

OTROSI

El contrato por solicitud del contratista Manufacturas Sumapaz tuvo un incremento en valor, debido a la justificación de cambio de año y los factores netamente económicos que esto determinó por el inicio tardío del contrato, hasta 2025. Lo cual genero las consultas respectivas y aprobaciones por parte de la interventoría quien avalo dicho concepto, asi mismo el contribuyente realizó la negociación del incremento con el contratista Manufacturas Sumapaz, quien acepto los términos del incremento el cual estuvo dado por un 7,4% del valor del Contrato el cual es de CINCO MIL CIENTO VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS (COP $5.120.459.273) sin IVA. El reajuste solicitado por valor de COP $378.913.986 sin incluir IVA, incrementa el valor total del contrato a COP $5.499.373.259 sin IVA, este se encuentra debidamente soportada técnica, jurídica y financieramente.

SUSPENSIÓN Y REINICIO DE CONTRATO

En la etapa final del contrato se generó una suspensión del contrato, este tuvo como objeto la ejecución de común acuerdo entre las partes, Esta decisión respondió a la necesidad de suscribir Otrosí No. 1 con el fin ajustar las tarifas. Las fechas de este proceso fueron las siguientes:

Suspensión del contrato	09/06/2025
Acta de reinicio	03/07/2025

POLIZAS

En el término del contrato desde su inicio hasta su finalización, teniendo en cuenta el proceso de Otrosí del contrato y el tiempo de suspensión de este se solicitó al contratista la generación de la respectivas pólizas, que son garantía en el proceso de las cuales enunciamos de la siguiente forma.

- Garantías del contrato
- Garantías a la firma del contrato
- Garantías a la firma del acta de inicio
- Garantías al acta de suspensión
- Garantías al acta de reinicio y otrosí.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

N° CONTRATO 8000009092: OBJETO: CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO SUSCRITO ENTRE CENIT-TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS Y MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	
VALOR DEL CONTRATO SIN INCLUIR IVA:	**$ 5.499.373.259**
Objeto del contrato: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, de acuerdo con lo definido en Anexo 1. Especificación Técnica, Anexo 1.1 Cantidades de Mobiliario, Anexo 2 Manual de Dotación Escolar y los demás anexos que componen el presente Contrato.	

GARANTÍAS A LA FIRMA DEL CONTRATO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO –
No. 73397 (Póliza Inicial) Anexo 0 – Chubb Seguros Colombia S.A.

COBERTURAS	VALOR	Vigencia Desde - Hasta
Cumplimiento del Contrato	$1.024.091.854,60	17/04/2024 – 17/03/2025
Prestaciones Sociales Estatal	$1.024.091.854,60	17/04/2024 – 17/09/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	$1.024.091.854,60	17/09/2024 – 17/09/2027

GARANTÍAS A LA FIRMA DEL CONTRATO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO –
No. 73397 (Póliza Inicial) Anexo 1 – Chubb Seguros Colombia S.A.

COBERTURAS	VALOR	Vigencia Desde - Hasta
Cumplimiento del Contrato	$1.024.091.854,60	17/04/2024 – 17/03/2025
Prestaciones Sociales Estatal	$1.024.091.854,60	17/04/2024 – 17/09/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	$1.024.091.854,60	17/09/2024 – 17/09/2027

OBJETO DE LA GARANTIA: CON EL PRESENTE CERTIFICADO SE ACLARA LOS ASEGURADOS/ BENEFICIARIOS ADICIONALES: EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y DISTRITO DE BUENAVENTURA LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

GARANTÍAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO –
No. 73397 (Póliza Inicial) Anexo 2 – Chubb Seguros Colombia S.A.

AMPAROS	Valor	Vigencia: Desde - Hasta
Cumplimiento del Contrato	$1.024.091.854,60	13/01/2025 – 12/12/2025
Prestaciones Sociales Estatal	$1.024.091.854,60	13/01/2025 – 06/12/2028
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	$1.024.091.854,60	13/01/2025 – 06/12/2028

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

GARANTÍAS AL ACTA DE SUSPENCIÓN		
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO – No. 73397 (Póliza Inicial) Anexo 3 – Chubb Seguros Colombia S.A.		
AMPAROS	**Valor**	**Vigencia: Desde - Hasta**
Cumplimiento del Contrato	**$1.024.091.854,60**	**13/01/2025 – 12/12/2025**
Prestaciones Sociales Estatal	**$1.024.091.854,60**	**13/01/2025 – 06/12/2028**
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	**$1.024.091.854,60**	**13/01/2025 – 06/12/2028**
OBJETO DE LA GARANTIA: POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO, LA COMPAÑIA ACEPTA TENER CONOCIMIENTO DEL ACTA DE SUSPECIÓN DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2025. DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES.		
GARANTÍAS AL ACTA DE REINICIO Y OTROSÍ		
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO – No. 73397 (Póliza Inicial) Anexo 6 – Chubb Seguros Colombia S.A.		
AMPAROS	**Valor**	**Vigencia: Desde - Hasta**
Cumplimiento del Contrato	**$1.099.874.651,80**	**13/01/2025 – 07/01/2026**
Prestaciones Sociales Estatal	**$1.099.874.651,80**	**13/01/2025 – 07/07/2028**
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	**$1.099.874.651,80**	**13/01/2025 – 07/07/2028**
OBJETO DE LA GARANTIA: POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE ACUERDO A LO PACTADO EN EL OTOR SI N° 1. ADICIONAL, DE ACUERDO AL ACTA DE REINICIO, SE ESTABLECE COMO NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN EL 07/07/2025. DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES		

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

4. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA INTERVENTORÍA

N.º	Obligación	Actividades realizadas
	OBLIGACIONES GENERALES	
1	1. Acatar la Constitución Política, la Ley, los principios de la contratación Estatal y las demás normas concordantes y complementarias.	**Descripción del avance**: Desde la convocatoria se cumple con la legislación y la normatividad colombiana para el cumplimento adecuado del objeto del contrato **Entrega producto Si ____No __X** **Evidencia verificable:**
2	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.	**Descripción del avance**: Con la firma del acta de inicio se asumen todas las responsabilidades que conlleva la suscripción de un contrato de carácter público **Entrega producto Si __X__ No** **Evidencia verificable: acta de inicio** **Acta Inicio Convenio Buenaventura - 13.01.2025.doc** **CN_FT_39_V6 Acta Inicio Interv_Conv OXI Buenav firmada**
3	Cumplir con los ofrecimientos adicionales que presentó en su oferta, la cual hace parte integral del presente contrato.	**Descripción del avance**: N/A **Entrega producto Si ____No __X** **Evidencia verificable:**
4	Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato.	**Descripción del avance**: Alianza Integral de proyectos cuenta con la infraestructura necesaria para el manejo adecuado de la información que resulte del proyecto
5	Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, debidamente inventariados conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación, que se encontrarán en el instructivo adjunto que hace parte integral del contrato.	**Descripción del avance**: De manera permanente la Interventoría remite al MEN la documentación que requiera su aprobación, en especial en el inicio del contrato. **Entrega producto Si __X_ No** **Evidencia verificable:** Se adjuntan cronogramas, Manual de mantenimiento, informe de prototipos, actas, documentación semanal del avance del proyecto.
	Solicitar autorización escrita de EL MINISTERIO para utilizar el nombre, emblema o sello oficial con fines	**Descripción del avance**: N/A

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

6	publicitarios o ajenos a los establecidos en los lineamientos de EL MINISTERIO.	**Entrega producto Si __NO X** **Evidencia verificable: N/A**
7	Cumplir con las normas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, según la normatividad vigente.	**Descripción del avance**: El personal de la interventoría cuenta con la dotación necesaria para realizar su labor
		Entrega producto Si ____No__X **Evidencia verificable: N/A**
8	Certificar la realización de los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), y en caso de incumplimiento total o parcial, responder por las consecuencias y sanciones que disponga la ley	**Descripción del avance**: El personal de la interventoría se encuentra al día con sus aportes al sistema de seguridad social (planillas)
		Entrega producto Si __X_ No_____ **Evidencia verificable: Planillas de pago de junio de 2025**
9	EL CONTRATISTA se obliga a no subcontratar las actividades propias del objeto contractual, salvo, que dentro del desarrollo de la propuesta se haya previsto disponer de recurso humano, para lo cual deberá tener en cuenta que no podrá vincular menores de edad, dando aplicación a la Resolución No. 1677 de 2008 del Ministerio de Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños	**Descripción del avance**: No se ha realizado ninguna subcontratación
		Entrega producto Si __ No_____X **Evidencia verificable: N/A**
10	Velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en debida forma tanto del contratista, como de las plantas de producción de proveedores, oficinas, establecimientos educativos a visitar y todos aquellos lugares o medios de transporte que determinen necesaria la presencialidad para la ejecución del contrato	**Descripción del avance**: se verifica con los protocolos de bioseguridad del contratista
		Entrega producto Si _X_ No **Evidencia verificable: Registro fotográfico.**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

11	Entregar a los equipos de trabajo el kit de bioseguridad establecido en el presupuesto, verificando y garantizando su utilización y disponibilidad en la totalidad del plazo de ejecución del contrato.	**Descripción del avance**: En el momento del informe ya no se presenta personal en planta. **Entrega producto Si _ No X_____** **Evidencia verificable: N/A**
12	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.	**Descripción del avance**: La interventoría asume la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato. Con la aprobacion todas las ordenes e bien de cada uno de los items contratados **Entrega producto Si __No X** **Evidencia verificable: se tienen informes mensuales, presentación de avance semanal**
13	Dar respuesta a las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias, que sean asignadas, en los términos establecidos en la ley.	**Descripción del avance**: Durante este periodo no se han presentado peticiones, quejas, reclamos o sugerencias **Entrega producto Si ____No _X___** **Evidencia verificable: N/A**
14	14. Mantenerse actualizado en los términos, condiciones, manuales y guías del SECOP ll, de la página de Colombia Compra Eficiente y operar dicha plataforma en lo que le corresponde, con responsabilidad y transparencia.	**Descripción del avance**: Después de aprobadas las pólizas se cargaron al SECOP **Entrega producto Si No X** **Evidencia verificable:**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

15	15. Verificar el cumplimiento de la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 de 2019, en especial lo referente al registro de antecedentes en bases de datos de la Policía Nacional con relación a agresores sexuales.	**Descripción del avance**: Todos los colaboradores de Alianza integral de Proyectos cuentan con la consulta de inhabilidades por delitos sexuales con concepto negativo **Entrega producto Si ___No ___X_** **Evidencia verificable: N/A**
16	16. No vincular a la ejecución del contrato menores de edad.	**Descripción del avance**: Alianza integral de Proyectos cumple con la legislación laboral colombiana **Entrega producto Si ___No X ___** **Evidencia verificable: N/A**
17	17. El contratista se obliga al respeto por los derechos humanos y, en especial, a no ejercer ninguna forma de violencia contra las mujeres y basada en género, actos de racismo o discriminación, y a cumplir a cabalidad con el sistema o Protocolo que se establezca para su prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contra las mujeres y basadas en género y/o discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación.	**Descripción del avance**: Alianza integral de Proyectos es defensora de la constitución política de Colombia **Entrega producto Si ___ No_____** **Evidencia verificable: N/A**
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:		
OBLIGACIONES DE CARÁCTER JURÍDICO		
1	Aplicar y tener en cuenta durante la ejecución del presente contrato, los aspectos regulatorios legales y contractuales relacionados con los contratos de dotación y el mecanismo de pago de obras por impuestos, así como el manual de interventoría del ministerio de educación	**Descripción del avance**: Durante el periodo del presente informe la interventoría aplico y tuvo en cuenta los aspectos regulatorios legales y contractuales relacionados con los contratos de dotación y el mecanismo de pago de obras por impuestos, así como el manual de interventoría del ministerio de educación. **Entrega producto Si ___No _X__**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

		Evidencia verificable: N/A
2	Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos – órdenes de compra suscritos para la adquisición de las dotaciones descritas en el proyecto para las instituciones educativas que serán beneficiarias por este.	**Descripción del avance**: Se firmo el acta de inicio **Se verifican los documentos correspondientes de Manufacturas Sumapaz desde la orden de bien 01 a 04 facturación** **Entrega producto Si X No_____** **Evidencia verificable:** Actas de inicio Contrato de Suministros e Interventoría Correo de aprobación por parte de la interventoría del Ministerio de Educación a la gerencia del contrato de dotación de mobiliario a Buenaventura Carpeta Orden de bienes
3	Verificar que el(los) contrato(s) objeto de interventoría se desarrolle(n) dentro del plazo, las condiciones y los valores establecidos.	**Descripción del avance**: La ejecución del contrato se realizó de acuerdo con la programación del contrato **Entrega producto Si X__No_____ Evidencia verificable: Carpeta Actas de Entrega,** **Presentación de seguimiento semanal**
4	Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, o cualquier otra modificación a las órdenes de compra, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones técnicas, jurídicas y administrativas pertinentes y el plan de reacción. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.	**Descripción del avance**: **Se emitió concepto a solicitud de reajuste de valor al contrato de suministro** **Entrega producto Si _X_ No** **Evidencia verificable:** **753-016 REMISION SOLICITUD DE REAJUSTE PRECIOS CONTRATO DE SUMINISTRO** **753-045 REMISION SOLICITUD REAJUSTE DE PRECIOS AL CONTRATO 8000009092** **753-057 REMISION SOLICITUD REAJUSTE DE PRECIOS AL CONTRATO 8000009092** **El contrato tuvo de Manufacturas Sumapaz tuvo o se generó suspensión, debido al tema de aprobación del Otrosí, esto no afecto el proceso de ejecución y supervisión del contrato debido que la fecha de interventoría no se vio afectada. Aunque el proceso de suministro terminó de en el mes anterior el efecto de los pagos y reajustes determinaron el tiempo presentado desuspensión y su reinicio.**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

5	Estudiar a profundidad los contratos de dotación y sus anexos, los términos de referencia y sus anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecución de cada uno de los proyectos.	**Descripción del avance**: Se Estudia de manera meticulosa los contratos de dotación y sus anexos, los términos de referencia y sus anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecución de cada uno de los proyectos.
		Entrega producto Si ____No_X_ **Evidencia verificable: N/A**
6	Actuar de manera diligente y oportuna evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las Partes.	**Descripción del avance**: Por el momento del presente periodo no se han presentado situaciones que generen mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las Partes
		Entrega producto Si ____No_X_ **Evidencia verificable: N/A**
7	Velar porque la ejecución de las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza la interventoría no ocasione daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE, la ENTIDAD CONTRATANTE y a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE	**Descripción del avance**: Durante este periodo no se han presentado daños a terceros
		Entrega producto Si ____No X **Evidencia verificable: N/A**
8	Atender las quejas, peticiones, reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los contratistas objeto de Interventoría, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.	**Descripción del avance**: Durante este periodo no se han presentado quejas, peticiones, reclamaciones, sugerencias
		Entrega producto Si _____No X_____ **Evidencia verificable: N/A**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

9	Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de dotación, comunicándole oportunamente esta circunstancia a LA GERENCIA Y A LA ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y proponer el mecanismo de solución que corresponda y resulte más eficaz para la correcta y oportuna ejecución de los proyectos	**Descripción del avance**: Durante el presente periodo no se han presentado ningún incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de dotación **Entrega producto Si ___No_____** **Evidencia verificable: N/A**
10	Asegurar la adecuada documentación y archivo documental durante la ejecución de los proyectos para esto se almacenará la información soporte de cada uno de los informes de Interventoría y documentación alcance del proyecto en el repositorio de información que disponga el Ministerio de Educación Nacional y se otorgará permisos de acceso únicamente al coordinador de Interventoría.	**Descripción del avance**: Hasta el momento no se han generado archivos que requieran la custodia del MEN **Entrega producto Si X No Evidencia verificable: Se tiene almacenada toda la información al repositorio de sistema de información.**
11	Elaborar y suscribir juntamente con la GERENCIA Y EL CONTRATISTA DE DOTACIÓN, las actas de inicio, ejecución, suspensión, reanudación o cualquier otro documento en el que se deje constancia de la ocurrencia de eventos que afecten el desarrollo de las actividades del proyecto objeto de la interventoría. Todo documento suscrito por la interventoría infiere la obligatoriedad del mismo para éste.	**Descripción del avance**: Se suscribió el acta de inicio el 13 de enero de 2025 **Entrega producto Si ___No X** **Evidencia verificable:** **Acta Inicio Convenio Buenaventura - 13.01.2025.doc** **CN_FT_39_V6 Acta Inicio Interv_Conv OXI Buenav firmada** **Acta Comité No.1 28-01-2025**
12	Exigir a los proveedores las pólizas que se establezcan en el respectivo contrato de dotación en el porcentaje y vigencia de plazo establecido de acuerdo con la reglamentación nacional.	**Descripción del avance**: La interventoría exigió al proveedor las pólizas respectivas. **Entrega producto Si __NO X Evidencia verificable:** **Pólizas contratista Póliza 73397 - Acta de Inicio** **Póliza contratista 21007339700003 suspensión** **Póliza contratista 21007339700006 reinicio y otrosí**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

13	Asesorar a la gerencia y a la Entidad Nacional Competente en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo del proyecto.	**Descripción del avance**: La interventoría está disponible para lo que requiera el correcto desarrollo del contrato, durante el presente periodo no se requirieron asesorías jurídicas.
		Entrega producto Si ____No X **Evidencia verificable: N/A**
14	Avalar las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extraña que afecten el cumplimiento del cronograma general del proyecto aprobado por la Entidad Nacional Competente.	**Descripción del avance**: La interventoría está disponible para lo que requiera el correcto desarrollo del contrato, durante el presente periodo no se presentaron situaciones de fuerza mayor
		Entrega producto Si ____No X___ **Evidencia verificable: N/A**
15	Emitir dentro del término que para el efecto señale el Contribuyente una certificación en donde conceptúe sobre sobre las razones técnicas, financieras y jurídicas que sustentan la situación de fuerza o caso fortuito en cumplimiento de lo establecido en el art. 1.6.5.3.5.2. del decreto 1915 de 2017.	**Descripción del avance**: La interventoría está disponible para lo que requiera el correcto desarrollo del contrato, durante el presente periodo no se presentaron situaciones o casos fortuitos
		Entrega producto Si __ No X_____ **Evidencia verificable: N/A**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO:		
1	Entregar a LA GERENCIA la programación de pagos de los contratistas de dotación y de interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio	**Descripción del avance**: **Se realizo la entrega de la documentación requerida** **Entrega producto Si __No** **Evidencia verificable: Orden de Bienes 1, 2, 3 y 4**
2	Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación de los documentos que alleguen los proveedores para tal efecto.	**Descripción del avance**: Durante este periodo se está realizando un ajuste al valor del contrato de dotación por parte de CENIT a favor del contratista y se está preparando y organizando la documentación para generar la factura de la orden de bienes No.4 **Entrega producto Si _X_ No** **Evidencia verificable: CONSOLIDADO DE PAGOS MANUFACTURAS SUMAPAZ.XLSX**
3	Revisar y aprobar toda la información soporte de cada orden de compra y facturas presentadas por los proveedores.	**Descripción del avance**: En este periodo se realiza la revisión de la documentación respectiva al pago de la orden de bienes No 4, las ordenes 1, 2, 3 y 4 ya fueron objeto de pago. **Entrega producto Si X No** **Evidencia verificable:** Se envían correos de aprobación actas de orden de bien. Se entrega archivo con la información de los pagos realizados
4	Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos parciales y final de los contratos objeto de interventoría del contrato, previo visto bueno del supervisor y aprobación de la gerencia.	**Descripción del avance**: Se envía correo de aprobación a la Gerencia del contrato del proceso de facturación de Manufacturas Sumapaz de la orden de bienes No.4 **Entrega producto Si __X__No ____** **Evidencia verificable: Correo 753-029 REMISIÓN APROBACION ENVIO DE BORRADOR DE FACTURACIÓN ODB No 1 CONTRATO MARCO PARA LA COMPRA DE BIENES No 8000009092 OBJETO Suministro e instalación de dotación de Mobiliario Escolar CENIT** - **753-040 REMISION APROBACION DOCUMENTACION Y ACTAS DE ENTREGA ORDEN DE BIENES N 2** - **753-050 REMISION APROBACION DOCUMENTACION Y ACTAS DE ENTREGA ORDEN DE BIENES N 3** - **753-062 REMISION APROBACION DOCUMENTACION Y ACTAS DE ENTREGA ORDEN DE BIENES N 4** - **753-068 REMISION APROBACION DOCUMENTACION Y ACTAS DE ENTREGA ORDEN DE BIENES N 4 ACTUALIZADA** - **753-072 REMISION APROBACIÓN DOCUMENTACION**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

		OTRO SÍ No. 1 AL CONTRATO No. 8000009092 - **753-074 REMISION APROBACIÓN DOCUMENTACION DE FACTURACIÓN SOBRE LA LIQUIDACION - CONTRATO MARCO PARA LA COMPRA DE BIENES No. 8000009092 OBJETO Suministro e instalación de dotación de Mobiliario Escolar – CENIT** - **753-076 REMISION Aprobación del informe final Manufacturas Sumapaz**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

5	Radicar dentro de los cinco (5) primeros días del mes correspondiente al trámite de pago las facturas electrónicas o documentos equivalentes, con los soportes y documentos requeridos para ello, de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos por LA GERENCIA y la autorización correspondiente de parte de la SUPERVISIÓN	**Descripción del avance**: En este periodo se La aprobación de los inofrmes 1,2 y 3, los cuales fueron aprobados Enel mes de junio Los informes 4 y 5 estan siendo objeto de actualización y entrega al supervisor del contato por parte del MEN y la gerencia **Entrega producto Si __X__No** **Evidencia verificable:** -2025-EE-176161-Correspondencia_de_salida-14516580.pdf_2025-EE-176161 - 2025-EE-178497-Correspondencia de salida-14526345.pdf_2025-EE-178497 - 2025-EE-178485-Correspondencia_de_salida-14527117.pdf_2025-EE-178485
6	Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos a los proveedores del proyecto.	**Descripción del avance**: N/A **Entrega producto Si __N o X____** **Evidencia verificable:**
7	Contar con una oficina, la cual deberá estar apropiadamente equipada con escritorios, sillas, archivadores, mesas de trabajos, faxes, escáner, computadores, impresoras, sistemas de comunicaciones para llamadas nacionales, cámaras digitales, útiles de oficina, papelería y demás implementos necesarios para ejecutar el CONTRATO en las condiciones pactadas.	**Descripción del avance**: Alianza Integral de Proyectos cuenta con una sede administrativa en la TV 55 A 115 A 06 en la ciudad de Bogotá **Entrega producto Si __N o X** **Evidencia verificable: N/A**
8	Motivar el trámite de las posibles modificaciones que sean necesarias en la ejecución de los contratos y validar el impacto en el presupuesto general del proyecto	**Descripción del avance** Se presenta solicitud para el reajuste del valor del contrato por parte de Manufacturas Sumapaz, además se envía comunicado y sostiene reunión con el Ministerio de Educación para definir la permanencia del personal de interventoría en planta y en campo **Entrega producto Si X___No** **Evidencia verificable: Comunicado No 753-036**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

OBLIGACIONES TECNICAS DOTACION MOBILIARIO		
1	Realizar con plena autonomía técnica, financiera y con sus propios medios la prestación de servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico para cada uno de los proyectos – órdenes de compra de dotación celebrado(s) y aquellos requeridos para el cumplimiento del objeto del proyecto para las dotaciones definidas en el proyecto BPIN 20230214000016, el presente CONTRATO y en sus respectivos anexos. Para lo anterior, deberá conocer y apropiar la documentación del proyecto que soporta el cumplimiento de las obligaciones y los productos establecidos en el contrato – orden de compra de los proveedores, dentro de los tiempos establecidos en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos, el cronograma del proyecto y el manual operativo 2.0 de obras por impuestos o el que este vigente.	**Descripción del avance**: La interventoría conoce y exige el cumplimiento del manual de dotaciones escolares, y realizo el control respectivo en la planta del proveedor a cada uno de los prototipos del mobiliario a entregar **Entrega producto Si __No X** **Evidencia verificable: Aprobación Prototipos entregado antes del informe mensual No. 1, Revisión y aprobación de lotes de envío revisados y aprobados en el informe No. 1**
2	Conocer y exigir el cumplimiento del Manual de Dotaciones Escolares y sus actualizaciones (anexo técnico), para lo cual deberá efectuar controles sobre la fabricación de los elementos a entregar directamente en la planta de los proveedores mediante la ubicación en la planta del proveedor de un (1) profesional que certificará la calidad del mobiliario y los despachos con el fin de corroborar el ajuste de estos a las especificaciones técnicas.	**Descripción del avance**: *La interventoría conoce y exige el cumplimiento del manual de dotaciones escolares, y realizo el control respectivo en la planta del proveedor a cada uno de los prototipos del mobiliario a entregar* **Durante el mes de junio - julio se realizó por parte de la interventoría la revisión de la ordenes en su totalidad y de la facturación solicitada, enfocados en el otrosi del contrato y la entrega de documentación final del proceso para el pago parcial 4, donde se deja un saldo menor el cual se relacionara en el siguiente mes.** **Entrega producto Si X__No** **Evidencia verificable:** Carpeta Toma de muestras mayo 2025 Sumapaz lote 5 Carpeta Actas de Entregas
3	Conciliar, ajustar y entregar dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del acta de inicio, los cronogramas de entregas de proveedores de dotación de mobiliario escolar, para la llegada oportuna de los elementos objeto de interventoría	***Descripción del avance**: Durante el periodo se realizaron varias mesas de trabajo entre el contratista y la interventoría para lograr planificar la logística de entregas en el municipio de Buenaventura* ***Entrega producto Si No _X*** Evidencia verificable: Cronograma de producción y Cronograma de entregas

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

4	Presentarle al supervisor del proyecto un plan de trabajo para el desarrollo de la prestación de servicios de interventoría, la metodología del seguimiento, el cronograma de actividades y cronogramas de entregas de las dotaciones contempladas y/o productos alcance del proyecto, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles después de la firma del acta de inicio	**Descripción del avance**: El 17 de enero de 2025, se remite el Plan de trabajo de la Interventoría, con el fin de planificar, ordenar, dar seguimiento y ejecutar el objeto del contrato **Entrega producto Si X___No** **Evidencia verificable: Plan de trabajo Comunicado No.**753-005
5	Advertir oportunamente al contribuyente y a la supervisión del contrato, si las contrataciones adelantadas para el cumplimiento del objeto del proyecto no son concordantes con la viabilidad técnica emitida por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de ser subsanadas oportunamente dentro del plazo de ejecución del proyecto.	**Descripción del avance**: No se presenta ningún inconveniente con las contrataciones adelantadas **Entrega producto Si ____No _X___** **Evidencia verificable: N/A**
6	Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo de producción de cada uno de los ítems dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a la firma del acta de inicio al proveedor. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la producción y el inicio de los despachos como máximo en los siguientes cinco (5) días hábiles previos a la aprobación de los prototipos de producción. En caso de que el proveedor requiera ajustar los plazos de entrega pactados en el acta de inicio en el tiempo de ejecución, el proveedor debe notificar a la interventoría y llegar a común acuerdo para acordar un plazo nuevo, lo que será comunicado a la GERENCIA y la SUPERVISIÓN.	**Descripción del avance**: la verificación y pruebas realizadas a los prototipos se realizaron entre el 14 y 17 de enero de 2025, **Entrega producto Si X___No** **Evidencia verificable:** Se remitió la documentación de aprobación de prototipos a la supervisión de Ministerio el día 17 de enero de 2025 mediante el comunicado No. 753-006
7	Realizar, verificar y avalar mediante un acta antes del despacho en planta las pruebas realizadas al mobiliario por cada uno de los lotes, según el anexo técnico Manual de dotaciones escolares.	**Descripción del avance**: Las entregas finalizaron en el periodo anterior, donde quedo toda la evidencia relacionada a los despachos y recibos en sitio, ya culminadas la entrgas 1, 2, 3 y 4 **Entrega producto Si X__No** **Evidencia verificable: Carpeta Toma de muestras No4**
8	Verificar que los bienes hayan sido empacados de acuerdo con lo determinado en el Manual de Dotaciones Escolares y entregados en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectuoso.	**Descripción del avance**: **en este periodo no se genero empauques, la dotación terminó en el periodo anterior, con la totalidad de las entregas.** **Entrega producto Si ____No X** **Evidencia verificable: Acta de empaque y embalaje No.1, No.2, No.3 y No.4**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

9	Informar oportunamente a la SUPERVISIÓN los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de sanciones, según lo establecido en los contratos objeto y sugerir la imposición de sanciones pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales definidas para su aplicación, para ello deberá: • Revisar y conceptuar los elementos jurídicos para efectos de solicitar el inicio del debido proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, incumplimientos y demás actuaciones contractuales. En este mismo sentido deberá entregar la relación de los documentos, pruebas o verificaciones necesarias para determinar la viabilidad jurídica de la sanción a imponer. • Presentar fórmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que llegasen a presentarse en curso de los contratos objeto. • Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento, así como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar • Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de incumplimiento de las posibles situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeño efectivo de las obligaciones. • Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos a los proveedores.	**Descripción del avance**: El suministro de mobiliario culmino antes de la fecha indicada contractualmente. Por lo tanto se tuvo un adelanto importante el cual permitió generar la entrega de ordenes de bienes con tiempo suficiente y para realizar las demás actividades que contemplaron el otrosí y otras disposiciones. **Entrega producto Si ___No X___** **Evidencia verificable: N/A**
10	Entregar informes de todas las pruebas realizadas a cada uno de los lotes autorizados para despachar del mobiliario escolar de acuerdo con lo descrito anteriormente, con registro fotográfico de las mismas	**Descripción del avance**: En este periodo no re realizaron pruebas, debido a que la totalidad del mobiliario fue entregado. **Entrega producto Si ___No ___X_** **Evidencia verificable: Carpeta Toma de muestras No 1, 2 3 y 4**
11	Rechazar los bienes que no cumplan con lo establecido en el anexo técnico manual de dotaciones escolares, sus actualizaciones y complementos.	**Descripción del avance**: N/A **Entrega producto Si ___No __X** **Evidencia verificable: N/A**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

12	Verificar, en caso de cambio, que los bienes sean reemplazados por el contratista dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud que realice el interventor y que los elementos cambiados cumplan con lo establecido por las normas técnicas y con el Manual de dotaciones escolares antes mencionadas.	**Descripción del avance**: El contratista Manufacturas Sumapaz, inmediatamente reemplazó los productos rechazados por unidades que cumplieron con las especificaciones del manual **Entrega producto Si ___ No X** **Evidencia verificable: Registro fotográfico de C/orden de bien**
13	Aprobar antes del primer despacho de cada uno de los proveedores que se cuente con los manuales de uso, mantenimiento y garantía; verificar que el proveedor entregue una copia impresa de estos documentos por sede beneficiada. Los manuales deberán contener la información relativa a todos los elementos a suministrar, teniendo en cuenta por los menos lo siguiente: a. Cuidados y parámetros de uso. b. Posibilidades de reposición de partes y piezas. c. Identificación del fabricante, indicando nombre, dirección, teléfono y ciudad .	**Descripción del avance:** Se realiza la verificación y ajuste y aprobación del manual de garantía y mantenimiento de cada uno de los productos a entregar **El contratista al finalizar la entrega e instalación del mobiliario en la sede suscribe una remisión de entrega con el rector del colegio, en la que consta la entrega del manual de uso, mantenimiento y garantía Además, el personal del contratista deja en el colegio una serie de repuestos para los accesorios que resulten dañados durante el transporte o por si necesitan en el futuro (Tapones, niveladores, superficies, espaldares)** **Entrega producto Si ___ No X** **Evidencia verificable: Remisión aprobación Comunicado No 753-013** **Carpeta ACTAS DE ENTREGA**
14	Verificar para el proveedor antes del inicio de la producción y durante el proceso, que los materiales e insumos cumplan con las especificaciones y espesores de los bienes objeto de los contratos y sean completamente nuevos, no remanufacturados.	**Descripción del avance**: el profesional y técnico en planta realizó permanentemente la verificación de cada una de las materias primas para los bienes a entregar **Entrega producto Si _X__ No_____** **Evidencia verificable: Registro fotográfico**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

15	Verificar que el empaque y embalaje del mobiliario escolar garantice su conservación durante el transporte a los lugares de destino.	**Descripción del avance: en este periodo no se realizó esta actividad, mobilario entregado .**
		Entrega producto Si __ No X____ **Evidencia verificable:**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

16	Ejercer control sobre los proveedores, con el fin de garantizar la entrega de mobiliario escolar en los sitios específicos (sede beneficiada), cantidades, materiales y con los procedimientos establecidos, verificando por medio de visitas en sitio.	**Descripción del avance**: **Mobiliario entregado ne periodo anterior** **Entrega producto Si _X_ No _____** **Evidencia verificable:**
17	Verificar la entrega oportuna distribución en cada establecimiento educativo y la correcta instalación de las dotaciones y/o productos de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato de dotación, reportar los atrasos e inconvenientes y definir las recomendaciones, acciones correctivas y de mejora para la ejecución de los contratos. Así mismo, solicitar a los contratistas de dotación las actas de entrega originales y revisar todos los componentes técnicos y jurídicos de estas. Estas actas deben estar firmadas por el Rector de la IE o quien delegue por escrito en documento físico (en los casos donde instituciones estén ubicadas en zonas de difícil acceso y orden público) y el contratista.	**Descripción del avance**: Despachos y recibos finalizado el periodo anterior. **Entrega producto Si X___No _____** **Evidencia verificable:**
18	Verificar y aprobar la forma y el contenido de las actas originales solicitadas a los contratistas respecto de las dotaciones para determinar que están firmadas por el rector de la institución educativa o quien delegue, donde se certifique recibo a satisfacción por parte de la sede educativa	**Descripción del avance** Se verifican las actas de entrega con su respectiva suscripción del rector, el contratista y la interventoría **Entrega producto Si X___No _____** **Evidencia verificable: Carpeta Actas de Entrega Dotación**
19	Realizar a partir de la firma del acta de inicio cada quince (15) días un comité seguimiento técnico donde reportar y verificar los avances de los contratos, así como efectuar recomendaciones, observaciones, requerimientos, compromisos y demás acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto de las órdenes de compra. Además, verifique el cronograma de despacho y entregas de cada una de las órdenes de compra de acuerdo con los lotes aprobados de producción y despacho. Así mismo, convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periódica con los proveedores de cada uno de los contratos u órdenes de compra.	**Descripción del avance**: Se presentan actas de comité semanal Se presentan actas de comité mensual. Presentaciones de avance semanal. Aprobación de de ordenes de bien 1, 2, 3 y 4 **Entrega producto Si X___No _____** **Evidencia verificable: Acta de comité No. 1 a 14**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

20	Programar y llevar a cabo como mínimo, un (1) comité mensual con la Gerencia y Supervisión, o en la frecuencia que sea requerida por la SUPERVISIÓN de acuerdo con la necesidad del proyecto, con el fin de verificar los avances del proyecto, así como efectuar recomendaciones, observaciones, requerimientos, compromisos y demás acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto de este. Estos comités deben quedar debidamente documentados mediante actas suscritas por las partes.	**Descripción del avance**: **El comité mensual se realiza el jueves 27 de mayo de 2025 de manera virtual con la participación de CENIT, CB Ingenieros, TF interventoría, Manufacturas Sumapaz y Alianza Integral de Proyectos** **Entrega producto Si X__No _____** **Evidencia verificable: Acta comité mensual No 4**
21	Verificar la instalación del ítem de tablero en las sedes educativas beneficiadas, si no es posible se debe presentar autorización firmada en físico por el rector que certifique la razón y aceptación de la no instalación.	**Descripción del avance**: **A la fecha se han entregado e instalado 634 tableros en**: OBD No 1: 189 unidades, ODB No 2: 133 unidades, **OBD No 3: 161 unidades y OBD No 4: 151 unidades, se tiene el avance final de mes con el 100% de unidades instaladas.** **Entrega producto Si X__No** **Evidencia verificable: Registro fotográfico y actas de entrega de bienes.**
22	Realizar las visitas para garantizar la entrega de bienes con el fin de verificar en cada una de las sedes beneficiarias según lo pactado para este contrato, con el fin de verificar y entregar los soportes documentales y evidencias que den constancia del cumplimiento; diligenciar los formatos establecidos con el resultado de cada visita de verificación en sitio, que contenga detalle de la dotación entregada, estado de entrega de este y registro fotográfico de cada una de las sedes beneficiadas. **Nota:** La interventoría tiene un tiempo máximo de 10 días hábiles para realizar la verificación en sitio posterior a la entrega de la dotación por parte del proveedor.	**Descripción del avance**: La interventoría realiza la verificación de los productos inmediatamente son descargados del transporte, garantizando la calidad de los productos antes de la entrega e instalación en el colegio **Entrega producto Si X___No _____** **Evidencia verificable: Carpeta Actas de Entrega Dotación No.4**
23	Informar a LA GERENCIA y al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley pueda configurar conflicto de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.	**Descripción del avance**: A la fecha de hoy no se han presentado conflictos de intereses **Entrega producto Si ____No __X__** **Evidencia verificable: N/A**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

24	La coordinación técnica debe acompañar a la supervisión en las visitas de seguimiento a los establecimientos educativos para revisión de estado de ejecución del proyecto. Para el caso de los proyectos de dotaciones se seleccionará aleatoriamente algunas sedes para realizar las visitas de seguimiento, en tres (3) visitas.	**Descripción del avance**: Se realiza visita a las instituciones educativas los dias 21 y 22 de mayo. **Entrega producto Si X No _____** **Evidencia verificable:** **753-061 ACTAS DE VISITA A SEDES EDUCATIVAS BUENAVENTURA** **Acta_Visita I E Buenaventura dia 1** **Acta_Visita 2 E Buenaventura dia 2**
25	Entregar a la GERENCIA y al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educación Nacional los siguientes informes de interventoría: • **Informe mensual de Interventoría por cada contrato objeto**: Presentar de forma mensual un informe de interventoría, al mismo se debe adjuntar el informe de actividades mensual presentado por cada contratista objeto, revisado y aprobado por la firma interventora en el que se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de cada contratista objeto dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes.	**Descripción del avance**: Se remite informe mensual No 6 753-044 REMISIÓN INFORME MENSUAL No.5 INTERVENTORIA Aprobado: Radicado No. 2025-EE-111302 2025-04-25 07:18:46 p. m Aprobación informe 5 **Entrega producto Si X__No _____** **Evidencia verificable:** informe mensual No 6
	• **Informe mensual de cumplimiento de actividades del INTERVENTOR:** Presentar de forma mensual un informe de interventoría al supervisor del contrato. Este informe debe incluir el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato de Interventoría en sus componentes técnico, administrativo, financiero y legal, con sus respectivos soportes dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. **Nota:** El informe debe contener como mínimo los numerales relacionados en el anexo “a) Requisitos informe mensual”, así como, el anexo “b) Matriz	**Descripción del avance**: Se remite informe mensual No 6 **Entrega producto Si ____No __X__** **Evidencia verificable:** informe mensual No 6 Se anexa informe No. 6 el cual contiene la información solicitada. Se Anexa formato No. 24 matriz de reporte proyectos OXI en los meses anteriores

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

	reporte proyectos OXI". De la misma manera, los informes deben ser acumulativos período a período, es decir, cada informe debe dar parte de los avances totales de la ejecución siendo evidenciable el período de reporte tanto del contrato de interventoría, así como, los contratos objeto de la interventoría.	
	• **Informe final de Interventoría**: Presentar un informe final de Interventoría especificando acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente, elaborar y tramitar el acta de liquidación de los contratos objeto de interventoría junto con los documentos soporte dentro de los (30) días siguientes a la terminación de estos y con anterioridad a la radicación del último pago establecido en la forma de pago.	**Descripción del avance**: a la fecha el contrato se encuentra finalizado, pendiente por facturación de la orden No 4 y 5. Pendiente por hacer entrega de informe final **Entrega producto Si __X_ No _____** **Evidencia verificable: Correspondencia enviada**
26	Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecución de los contratos u órdenes de compra, dirigidas a los representantes legales de los contratistas de dotación con el objetivo de garantizar la efectiva ejecución de los contratos y copiar a la GERENCIA y a la SUPERVISIÓN.	**Descripción del avance**: Se mantiene comunicación constante por parte de la interventoría con cada uno de los actores involucrados en la ejecución del contrato **Entrega producto Si X___No** **Evidencia verificable: Correspondencia enviada**
27	Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la información, productos y servicios de los que tenga conocimiento en desarrollo y ejecución del CONTRATO. El uso de la información para efectos diferentes a los establecidos en este CONTRATO requiere autorización previa y escrita por parte de la GERENCIA y del SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educación Nacional.	**Descripción del avance**: se mantiene confidencialidad y plena reserva de toda la información, productos y servicios de los que tenga conocimiento en desarrollo y ejecución del CONTRATO **Entrega producto Si ____No __X__** **Evidencia verificable: N/A**
28	Llevar un registro actualizado de las entregas de cada orden de compra y mantenerla a disposición de LA GERENCIA y de la SUPERVISIÓN y hacer entrega de esta una vez finalizado en contrato.	**Descripción del avance**: A la fecha de hoy, se mantiene un contacto permanente con cada uno de los actores que hacen parte del contrato de dotación de mobiliario, se realiza la verificación de las actas, se corrobora los empaques y despachos, así mismo se entrega el seguimiento semanal. **Entrega producto Si __X_No** **Evidencia verificable:** Presentación semanal de comités de avance los días 6, 13, 20, 27 del mes de mayo.

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

29	Contratar y mantener el personal mínimo requerido para la correcta ejecución del CONTRATO y garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso de necesitar el cambio de alguna de las personas propuestas, deberá realizarlo por un perfil igual o superior que la persona ofrecida en la propuesta. Este cambio deberá ser autorizado por el SUPERVISOR. La rotación del personal no puede superar el 50% del personal presentado inicialmente.	**Descripción del avance**: La interventoría cuenta con personal idóneo para ejecutar de manera correcta el contrato en mención **Entrega producto Si __X__ No ____** **Evidencia verificable: Planillas de Aportes al SGSS**
30	Contratar de manera preferente al personal de campo que apoye las labores de interventoría, oriundos de la región donde se ejecutará el proyecto. En caso de que esto no sea posible, se contratará al perfil idóneo para apoyar las labores correspondientes indistintamente de su residencia.	**Descripción del avance** a la fecha del informe ya no se tiene personal de campo, las actividades que se realizan son específicamente administrativas. **Entrega producto Si __X No ____** **Evidencia verificable:**
31	Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas de dotación frente al Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de parafiscales en el momento de autorizar los pagos y solicitar modificaciones durante la vigencia del CONTRATO, o al momento de liquidarlo, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas, en concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.	**Descripción del avance**: Se envía correo de aprobación de la documentación del contratista respeto a la aprobación del otrosí del contrato y facturación del mismo. **Entrega producto Si __X__ No ____** **Evidencia verificable:** **El contratista Manufacturas Sumapaz hace entrega de documentación frente al sistema de seguridad social y pago de parafiscales, para la autorización de pagos.** **753-063 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CONTRATO No 8000009092 DE 2024** **753-064 REMISION APROBACION ACTAS DE ENTREGA ORDEN DE BIEN 1-2-3-4** **753-068 REMISION APROBACION DOCUMENTACION Y ACTAS DE ENTREGA ORDEN DE BIENES N 4 ACTUALIZADA** **753-072 REMISION APROBACIÓN DOCUMENTACION OTRO SÍ No. 1 AL CONTRATO No. 8000009092** **753-074 REMISION APROBACIÓN DOCUMENTACION DE FACTURACIÓN SOBRE LA LIQUIDACION - CONTRATO MARCO PARA LA COMPRA DE BIENES No. 8000009092 OBJETO Suministro e instalación de dotación de Mobiliario Escolar – CENIT** **753-075 SOLICITUD DE INFORMES CONTRATO DE PAGOS POR IMPUESTOS A CARGO DE CENIT MEN**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

32	EL INTERVENTOR será el responsable de verificar la veracidad de la información registrada por la gerencia del proyecto en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública -SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP, en aspectos tales como: • Actividades de la cadena de valor del proyecto • Reporte Financiero por cada una de las vigencias que contemple el proyecto. • Reporte de indicadores de producto del proyecto • Reporte de indicadores de gestión del proyecto De la verificación a la actualización e información requerida, deberá dar cuenta en los informes mensuales de interventoría.	**Descripción del avance**: la interventoría ha realizado seguimiento a los datos registrados en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública -SPI La primeta netega de informe finacioero sera entegado el 15 de agosto de 2025 **Entrega producto Si ____No __X__** **Evidencia verificable: N/A** **753-075 SOLICITUD DE INFORMES CONTRATO DE PAGOS POR IMPUESTOS A CARGO DE CENIT MEN**
33	Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de interventoría, así como las erogaciones necesarias para la ejecución de este. Es entendido que todos los gastos han sido estimados por el interventor al momento de la presentación de su propuesta económica.	**Descripción del avance**: la interventoría asume el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato de interventoría **Entrega producto Si _X_No _____** **Evidencia verificable: N/A a la fecha no se tiene documento de pagos, debido a que no se ha podido facturar ningún mes a la fecha del informe. Pero o si se tienen las pólizas respectivas cargadas al SECOP. SE ANEXA INFORMACIÓN RESPECTIVA.**
34	Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato y que no se contemplen dentro de las obligaciones ya señaladas.	**Descripción del avance**: La interventoría realizara todas las obligaciones que se requieran para el correcto desarrollo del contrato y que no se contemplen dentro de las obligaciones ya señaladas. **Entrega producto Si ____No __X__** **Evidencia verificable: N/A**

Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda al contribuyente CENIT seguir con esta buena labor ya que esto genera en los beneficiaros más comodidades para lograr aumentar el rendimiento escolar de la región
- El acompañamiento del Ministerio Nacional de Educación es importante para el cumplimiento y seguimiento de la ejecución de este tipo de contratos.
- Se recomienda realizar el ajuste al valor del contrato con base en los incrementos estipulados por la ley.
- Es de importancia la generación oportuna de la información par que los procesos fluyan de forma constante.


CONCLUSIONES

- Se lograron acuerdos entre las partes para ajustar las ordenes de bienes para el tema de los pagos al contratista
- Las entegas de orden de buen fueron remitidas de forma constante y a tiempo, por lo cual no se tuvo reprocesos en su desarrollo.
- Los procesos despues de la finalización de las entregas de orden de bien, fueron un porco mas prolongados de los esperado, lo que determinó los tiempos de suspensión y reinicio, situación que incertuidumbre en el contratista, es de importancia depurar estos procesos y que los tramites permitan mayor diligencia en sus consultas y decisiones, para no afectar las partes del proceso.


ANEXOS


1. Comunicaciones Enviadas
2. Informe mensual No. 6
3. Anexos obligaciones
   1. JURIDICAS 2. FINANCIERAS 3. TECNICAS


FIRMA



Arq. HERNANDO A CASTELLANOS R
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S B.I.C

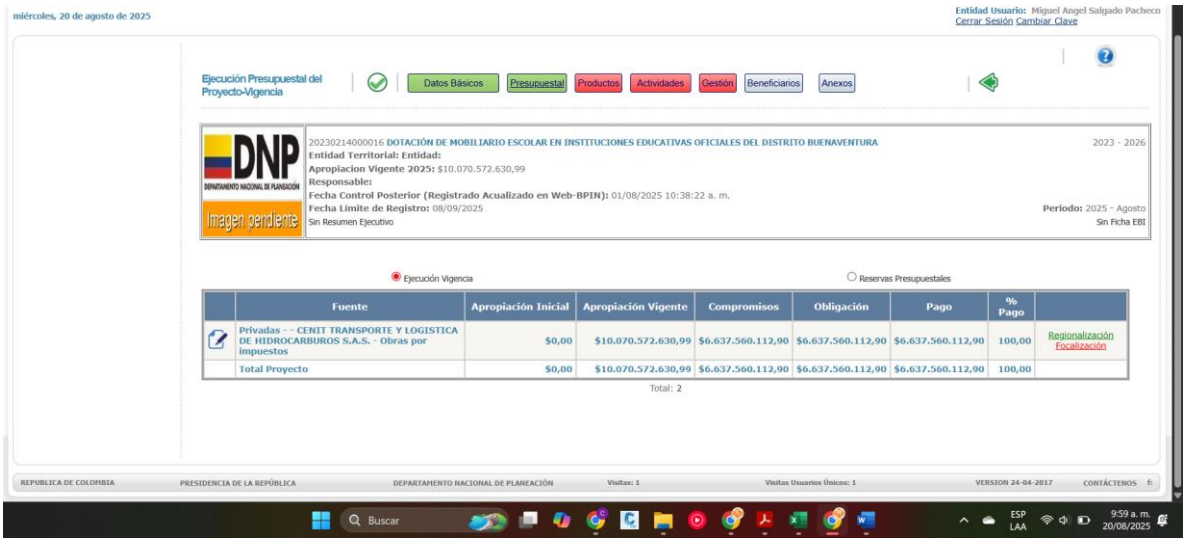
miércoles, 20 de agosto de 2025
Entidad Usuario: Miguel Angel Salgado Pacheco
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Ejecución Presupuestal del Proyecto-Vigencia
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
20230214000016 DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA
2023 - 2026
Entidad Territorial: Entidad:
Apropiacion Vigente 2025: $10.070.572.630,99
Responsable:
Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 01/08/2025 10:38:22 a. m.
Fecha Límite de Registro: 08/09/2025
Periodo: 2025 - Agosto
Sin Resumen Ejecutivo
Sin Ficha EBI
Ejecución Vigencia
Reservas Presupuestales
Fuente
Apropiación Inicial
Apropiación Vigente
Compromisos
Obligación
Pago
% Pago
Privadas - - CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. - Obras por impuestos
$0,00
$10.070.572.630,99
$6.637.560.112,90
$6.637.560.112,90
$6.637.560.112,90
100,00
Regionalización Focalización
Total Proyecto
$0,00
$10.070.572.630,99
$6.637.560.112,90
$6.637.560.112,90
$6.637.560.112,90
100,00
Total: 2
REPUBLICA DE COLOMBIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Visitas: 1
Visitas Usuarios Únicos: 1
VERSION 24-04-2017
CONTÁCTENOS
Buscar
ESP LAA
9:59 a. m. 20/08/2025

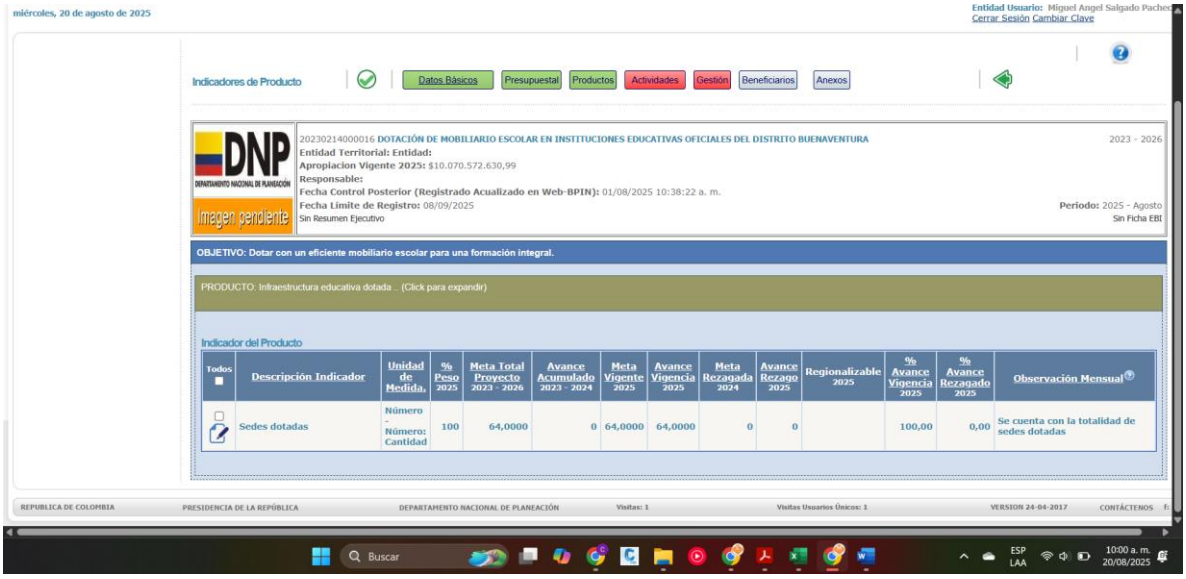
miércoles, 20 de agosto de 2025
Entidad Usuario: Miguel Angel Salgado Pacheco
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Indicadores de Producto
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
20230214000016 DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA
2023 - 2026
Entidad Territorial: Entidad:
Apropiacion Vigente 2025: $10.070.572.630,99
Responsable:
Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 01/08/2025 10:38:22 a. m.
Fecha Límite de Registro: 08/09/2025
Periodo: 2025 - Agosto
Sin Resumen Ejecutivo
Sin Ficha EBI
OBJETIVO: Dotar con un eficiente mobiliario escolar para una formación integral.
PRODUCTO: Infraestructura educativa dotada .. (Click para expandir)
Indicador del Producto
Todos
Descripción Indicador
Unidad de Medida
% Peso 2025
Meta Total Proyecto 2023 - 2026
Avance Acumulado 2023 - 2024
Meta Vigente 2025
Avance Vigencia 2025
Meta Rezagada 2024
Avance Rezago 2025
Regionalizable 2025
% Avance Vigencia 2025
% Avance Rezagado 2025
Observación Mensual
Sedes dotadas
Número - Número: Cantidad
100
64,0000
0
64,0000
64,0000
0
0
100,00
0,00
Se cuenta con la totalidad de sedes dotadas
REPUBLICA DE COLOMBIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Visitas: 1
Visitas Usuarios Únicos: 1
VERSION 24-04-2017
CONTÁCTENOS
Buscar
ESP LAA
10:00 a. m. 20/08/2025

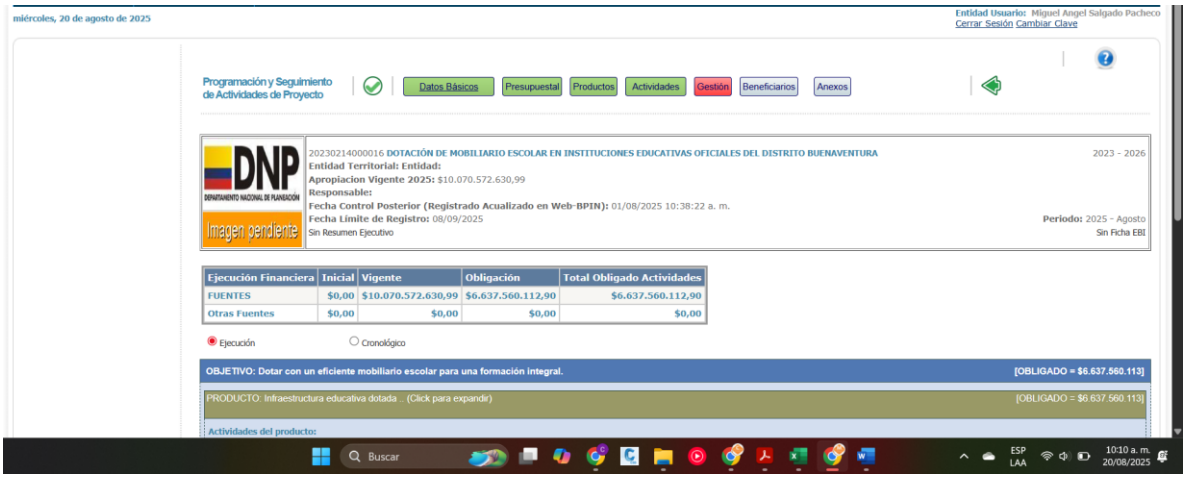
miércoles, 20 de agosto de 2025
Entidad Usuario: Miguel Angel Salgado Pacheco
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Programación y Seguimiento de Actividades de Proyecto
Datos Básicos
Presupuestal
Productos
Actividades
Gestión
Beneficiarios
Anexos
20230214000016 DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA
2023 - 2026
Entidad Territorial: Entidad:
Apropiacion Vigente 2025: $10.070.572.630,99
Responsable:
Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 01/08/2025 10:38:22 a. m.
Fecha Límite de Registro: 08/09/2025
Periodo: 2025 - Agosto
Sin Resumen Ejecutivo
Sin Ficha EBI
Ejecución Financiera
Inicial
Vigente
Obligación
Total Obligado Actividades
FUENTES
$0,00
$10.070.572.630,99
$6.637.560.112,90
$6.637.560.112,90
Otras Fuentes
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
Ejecución
Cronológico
OBJETIVO: Dotar con un eficiente mobiliario escolar para una formación integral.
[OBLIGADO = $6.637.560.113]
PRODUCTO: Infraestructura educativa dotada .. (Click para expandir)
[OBLIGADO = $6.637.560.113]
Actividades del producto:
Buscar
ESP LAA
10:10 a. m. 20/08/2025



Ejecución Financiera	Inicial	Vigente	Obligación	Total Obligado Actividades
FUENTES	$0,00	$10.070.572.630,99	$6.637.560.112,90	$6.637.560.112,90
Otras Fuentes	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

Ejecución Cronológico

OBJETIVO: Dotar con un eficiente mobiliario escolar para una formación integral. [OBLIGADO = $6.637.560.113]


PRODUCTO Infraestructura educativa dotada .. (Click para expandir) [OBLIGADO = $6.637.560.113]

Actividades del producto:

Todos	Actividad	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Pólizas	$86.127.628,00		
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: RUBRO CONTINGENTE 10%	$848.038.567,74		
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Compra Mobiliario escolar zona urbana y rural	$8.584.264.630,00	$6.544.254.178,00	Se cuenta con la totalidad de sedes dotadas
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Interventoria al proyecto mobiliario escolar mobiliario escolar zona rural 3%	$312.970.882,00	$93.305.934,90	La obligación corresponde al pago de 3 periodos de la interventoria
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: fiducia 0.18%	$62.706.148,25		
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: gerencia de proyecto 1,59%	$175.212.891,00		
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Gravamen financiero que paga única y exclusivamente la fiducia en el mecanismo 1	$1.251.884,00		
	Total Producto	$10.070.572.630,99	$6.637.560.112,90	

Total: 7

REPUBLICA DE COLOMBIA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Visitas: 1 Visitas Usuarios Únicos: 1 VERSION 24-04-2017 CONTÁCTENOS

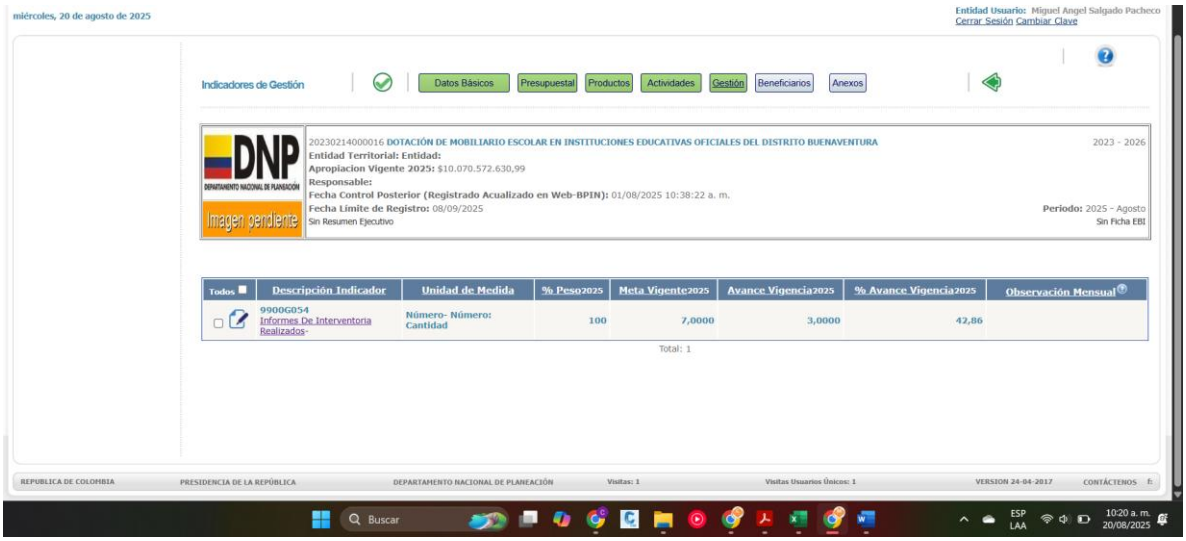

miércoles, 20 de agosto de 2025

Entidad Usuario: Miguel Angel Salgado Pacheco
Cerrar Sesión Cambiar Clave

Indicadores de Gestión | Datos Básicos | Presupuestal | Productos | Actividades | Gestión | Beneficiarios | Anexos

DNP DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Imagen pendiente

20230214000016 **DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA** 2023 - 2026
Entidad Territorial: Entidad:
Apropiacion Vigente 2025: $10.070.572.630,99
Responsable:
Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 01/08/2025 10:38:22 a. m.
Fecha Límite de Registro: 08/09/2025 **Periodo:** 2025 - Agosto
Sin Resumen Ejecutivo Sin Ficha EBI

Todos	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso2025	Meta Vigente2025	Avance Vigencia2025	% Avance Vigencia2025	Observación Mensual
	9900G054 Informes De Interventoria Realizados-	Número- Número: Cantidad	100	7,0000	3,0000	42,86	

Total: 1

REPUBLICA DE COLOMBIA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Visitas: 1 Visitas Usuarios Únicos: 1 VERSION 24-04-2017 CONTÁCTENOS



miércoles, 20 de agosto de 2025

Entidad Usuario: Miguel Angel Salgado Pacheco
Cerrar Sesión Cambiar Clave

Ver Anexos | Datos Básicos | Presupuestal | Productos | Actividades | Gestión | Beneficiarios | Anexos

DNP DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Imagen pendiente


20230214000016 **DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA** 2023 - 2026
Entidad Territorial: Entidad:
Apropiacion Vigente 2025: $10.070.572.630,99
Responsable:
Fecha Control Posterior (Registrado Acualizado en Web-BPIN): 01/08/2025 10:38:22 a. m.
Fecha Límite de Registro: 08/09/2025 **Periodo:** 2025 - Agosto
Sin Resumen Ejecutivo Sin Ficha EBI

Anexar Documento (El tamaño de los anexos disponible para este periodo es: 42,46 Mb)

Seleccionar	Vigencia	Periodo	Fecha	Descripción	Descarga	Tamaño
	2025	8	20/08/2025	Informe N°1 13 de enero al 12 de febrero de 2025	8. INFORME DE INTERVENTORÍA MENSUAL ENERO 13 AL FEBRERO 12 DE 2025.pdf	1,590 Mb
	2025	8	20/08/2025	Informe N°2 13 de febrero al 12 de marzo de 2025	8. INFORME DE INTERVENTORÍA MENSUAL FEBRERO 13 A MARZO 12 2025.pdf 2025-EE-178497.pdf	2,193 Mb
	2025	8	20/08/2025	Informe N°3 13 de marzo al 12 de abril de 2025	8. INFORME DE INTERVENTORIA MENSUAL MARZO 13 - ABRIL 12 2025.pdf 2025-EE-178485.pdf	3,757 Mb

Total: 3

REPUBLICA DE COLOMBIA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Visitas: 1 Visitas Usuarios Únicos: 1 VERSION 24-04-2017 CONTÁCTENOS

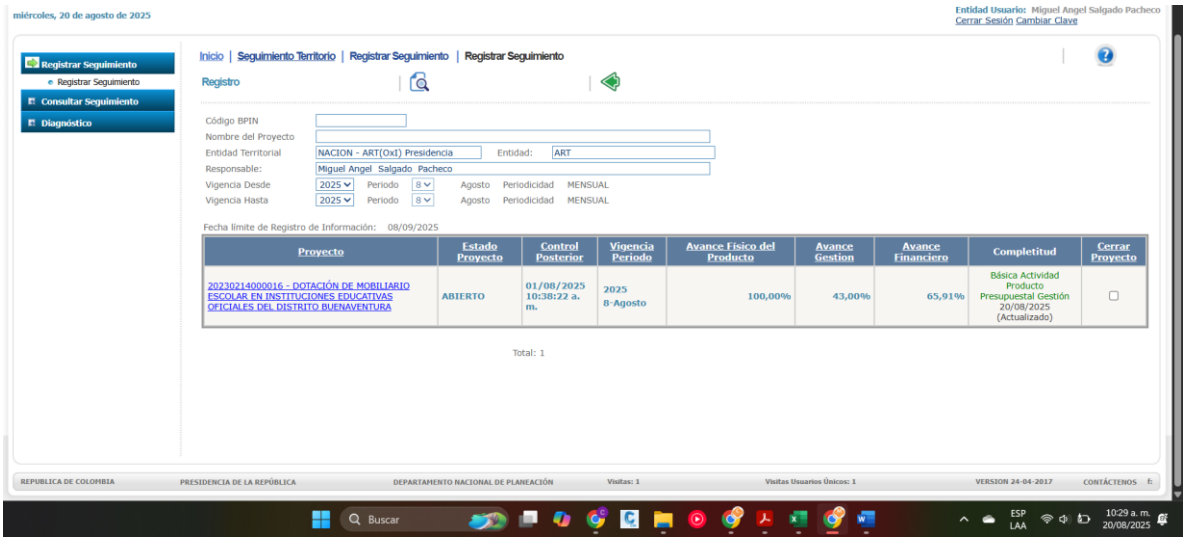
miércoles, 20 de agosto de 2025
Entidad Usuario: Miguel Angel Salgado Pacheco
Cerrar Sesión Cambiar Clave
Registrar Seguimiento
Registrar Seguimiento
Consultar Seguimiento
Diagnóstico
Inicio | Seguimiento Territorio | Registrar Seguimiento | Registrar Seguimiento
Registro
Código BPIN
Nombre del Proyecto
Entidad Territorial NACION - ART(Oxl) Presidencia Entidad: ART
Responsable: Miguel Angel Salgado Pacheco
Vigencia Desde 2025 Periodo 8 Agosto Periodicidad MENSUAL
Vigencia Hasta 2025 Periodo 8 Agosto Periodicidad MENSUAL
Fecha límite de Registro de Información: 08/09/2025
Proyecto
Estado Proyecto
Control Posterior
Vigencia Periodo
Avance Físico del Producto
Avance Gestion
Avance Financiero
Completitud
Cerrar Proyecto
20230214000016 - DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO BUENAVENTURA
ABIERTO
01/08/2025 10:38:22 a. m.
2025 8-Agosto
100,00%
43,00%
65,91%
Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 20/08/2025 (Actualizado)
Total: 1
REPUBLICA DE COLOMBIA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Visitas: 1
Visitas Usuarios Únicos: 1
VERSION 24-04-2017
CONTÁCTENOS
Buscar
ESP LAA
10:29 a. m. 20/08/2025
