ACTA No. GEE - 208			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ASESORIA DE SEGUIMIENTO A LA PUESTA EN MARCHA EMPRESA FE CRIA, LEVANTE, CEBA Y COMERCIALIZACION DE CERDOS EN PIE EL RENACER			
CIUDAD Y FECHA:	Maicao, 31 de marzo de 2026	**HORA INICIO:** 02:00 P.M.	**HORA FIN:** 3:00 PM.
LUGAR Y/O ENLACE:	https://goo.su/ikys	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira, Centro Agroempresarial y acuícola	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Saludo de Bienvenida
2. Seguimiento a la validación de avances de la puesta en marcha

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Realizar seguimiento puesta en marcha CRIA, LEVANTE, CEBA Y COMERCIALIZACION DE CERDOS EN PIE EL RENACER

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Inicio y desarrollo de la reunión

Participantes

En la reunión participó la emprendedora Angelina Rincón Cuartas y el orientador de Emprendimiento Rafael José García Cujia, Por parte del Centro de Desarrollo Empresarial del SENA.

Desarrollo de la Agenda

Aspectos Generales:

Datos de la emprendedora:

Nombre: Angelina Rincón Cuartas

E – mail: angeelina69@gmail.com

Teléfono: 3206581702

Estado civil: Casada

Población: ninguna

Dirección residencia: Finca la Buena Vista Vereda el Mamey

Ciudad: Dibulla

Se da inicio al seguimiento, dando saludo de bienvenida, a la emprendedora Angelina Rincón Cuartas quien es la Líder de la asociación, con la cual se desarrolla el siguiente seguimiento: se realiza visita mensual con el fin de verificar las condiciones de las operaciones, el estado de avance en la ejecución del plan de negocio y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría.

1. Lugar de Operaciones:

Se evidenció que la emprendedora cargó en la plataforma los documentos correspondientes a la sana posesión, contrato de arrendamiento y certificado de uso de suelo, los cuales fueron revisados y aprobados, validando la idoneidad del lugar para el desarrollo de las actividades productivas del proyecto.

2. Acondicionamiento del Lugar:

Una vez aprobado el lugar de operaciones, se orientó a la emprendedora sobre la necesidad de cargar oportunamente la documentación requerida en la plataforma para dar inicio a las adecuaciones de las cochineras y demás infraestructura productiva.

Se deja constancia de que estas adecuaciones presentan retrasos significativos, por lo cual se requiere su ejecución de manera urgente, dado que su no cumplimiento impedirá la aprobación de los demás componentes del proyecto.

3. Maquinaria y Equipos:

Se encuentra pendiente el cargue y aprobación de la documentación en la plataforma para iniciar el proceso de adquisición.

Es importante resaltar que la compra de maquinaria y equipos está sujeta a la finalización y validación de las adecuaciones del lugar de operaciones.

4. Semovientes:

La adquisición de los cerdos (semovientes) se encuentra en espera de la culminación de las adecuaciones de las cochineras y la respectiva aprobación en plataforma.

El retraso actual en infraestructura está afectando directamente este proceso.

5. Insumos:

La compra de insumos está condicionada a la finalización de las etapas anteriores y a la aprobación de la documentación correspondiente en la plataforma.

6. Publicidad y Mercadeo:

La emprendedora deberá cumplir con la realización de siete (7) eventos de mercadeo, conforme a lo establecido en el plan de negocio.

7. Capacidad de Producción:

El proyecto tiene proyectada una producción de 136 cerdos en pie. A la fecha, no se han iniciado operaciones productivas.

8. Capacidad de Comercialización:

Se proyectan ventas por valor de $122.400.000 en el primer año. A la fecha, no se registran avances en comercialización debido a que el proyecto no ha iniciado operaciones.
(Se ajusta el valor a una cifra coherente; si deseas mantener la original, lo corregimos)

9. Información Tributaria y Contable:
No se ha presentado información tributaria ni contable, teniendo en cuenta que la empresa fue constituida en abril de 2025 y aún no inicia operaciones.

10. Generación de Empleo:
La emprendedora tiene el compromiso de generar tres (3) empleos: un administrador, un líder de producción y un operario agropecuario. A la fecha, no se han vinculado empleados.

11. Ejecución Presupuestal y Contrapartidas:
El proyecto no ha iniciado la ejecución del presupuesto ni ha realizado aportes por concepto de contrapartidas.

12. Asistencia Técnica:
Se recomienda el acompañamiento de un instructor especialista en manejo de porcinos, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas del proyecto. El orientador se compromete a gestionar la respectiva solicitud de asistencia técnica.

CONCLUSIONES

De acuerdo con la visita de seguimiento realizada, se concluye que, si bien el proyecto presenta avances en la etapa documental y en la aprobación del lugar de operaciones, existen retrasos críticos en la fase de adecuación de infraestructura productiva (cochineras), los cuales constituyen actualmente el principal cuello de botella para la puesta en marcha efectiva del negocio.

Estas adecuaciones son un requisito habilitante y condicionante para la continuidad del proceso, ya que de su correcta ejecución y validación dependen directamente las siguientes etapas: Aprobación y adquisición de maquinaria y equipos, Compra de semovientes, Adquisición de insumos, Inicio de la producción y comercialización. En este sentido, se evidencia un riesgo alto de incumplimiento de los tiempos establecidos en el cronograma del proyecto, lo que puede derivar en retrasos en la ejecución de los recursos, afectación en los indicadores de gestión y, eventualmente, posibles observaciones por parte de la interventoría o entidad financiadora.


ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	**FECHA**	**RESPONSABLE**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Terminar adecuaciones urgentemente	10 de abril del 2026	Angelina Rincón Cuartas	Participación virtual

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	**DEPENDENCIA/ EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Angelina Rincón Cuartas	Empresaria	SI	No hay observaciones	Participación Virtual
Rafael José García	Orientador de Emprendimiento – SBDC Maicao	SI	No hay observaciones	Participación Virtual

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Evidencias Fotográficas:
Seguimiento Empresa Puesta En Marcha F.E. Cría, levante, ceba y comercialización de cerdos en pie el renacer

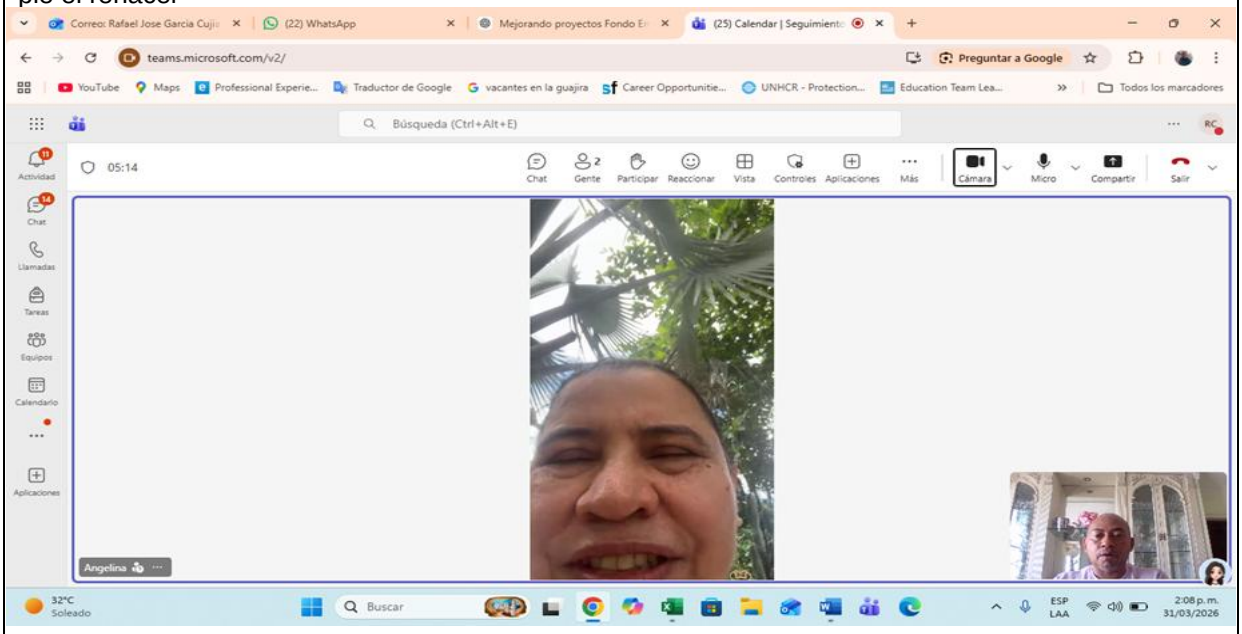

Fuente: García, R. (31 de marzo 2026) Emprendimiento Regional Guajira. SENA
