Gmail

s-planeacioneinfraestructura @valparaiso-caqueta.gov.co <s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co>

Oficio Respuesta a requerimiento de documentación y condiciones previas al inicio de actividades – Contrato de Obra Pública

1 mensaje

Eduardo Salguero <norsuringenieriaytopografiazs@gmail.com> 14 de abril de 2026 a las 14:45
Para: "s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co" <s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co>

Un cordial saludo
Adjunto por parte de la empresa **NORSUR INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA ZOMAC S.A.S,** el oficio respuesta a requerimiento de documentación y condiciones previas al
inicio de actividades – Contrato de Obra Pública, del **Contrato No. SAMC-001-2026**, cuyo objeto es: **"Reposición de la red de alcantarillado sanitario de la carrera 8, entre calle 8 y calle 4 del casco urbano del municipio de Valparaíso, Caquetá."**

--

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
NIT: 901187919-4
Carrera 7 #17 - 24 Brr 7 de Agosto
norsuringenieriaytopografiazs@gmail.com
Eduardo Salguero Riveros
3204912919

Oficio de Respuesta.pdf
4071K

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFÍA

NORSUR

INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

Nit: 901187919-4

Valparaíso, Caquetá, 02 de abril de 2026

Señora:
YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO
Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura
Municipio de Valparaíso, Caquetá

Asunto: Respuesta a requerimiento de documentación y condiciones previas al inicio de actividades – Contrato de Obra Pública

Cordial saludo,

En atención al requerimiento realizado por la Secretaría de Planeación, Desarrollo e Infraestructura del Municipio de Valparaíso, relacionado con el contrato cuyo objeto es la **"REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ"**, me permito dar respuesta formal, en calidad de representante legal de **NORSUR INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA ZOMAC S.A.S.**, indicando lo siguiente:

1. **Presupuesto detallado y APU:** Se adjunta el presupuesto detallado de la obra, incluyendo el análisis de precios unitarios (APU), debidamente firmado, el cual respalda técnica y financieramente la propuesta presentada y aceptada.

2. **Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales:** Se adjuntan los soportes de afiliación activa al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales), del personal Profesional.

3. **Cronograma de ejecución de obra:** Se adjunta el cronograma detallado de ejecución de obra, estructurado por actividades y plazos, el cual servirá como herramienta base para el seguimiento técnico y financiero del contrato.

4. **Pólizas de garantía:** Se adjuntan las pólizas de garantía debidamente expedidas, firmadas y vigentes, que amparan el cumplimiento del objeto contractual, la estabilidad y calidad de la obra, el pago de salarios y

prestaciones sociales, así como la responsabilidad civil extracontractual, conforme a lo exigido contractualmente.

5. **Bitácora de obra:** Se informa que la bitácora de obra se encuentra disponible en el sitio de ejecución del proyecto y será diligenciada diariamente conforme a las directrices establecidas por el equipo de supervisión.

Adicionalmente, se informa que **se realizó el pago correspondiente a las estampillas requeridas para la suscripción del Acta de Inicio**, cuyos soportes también se adjuntan, dando cumplimiento a los requisitos establecidos para la legalización del contrato.

También se informa que acorde a lo descripto en el oficio, se proyecta realizar la reunión de socialización con la comunidad el día Jueves 16 de abril de 2026 a las 10:00 A.M, en el sitio de la obra, con el fin de dar a conocer el alcance del proyecto.

De esta manera, se da cumplimiento a la totalidad de los requisitos previos exigidos para el inicio de las actividades contractuales, quedando atentos a la programación de la respectiva acta de inicio y demás indicaciones por parte de la supervisión.

Agradecemos la atención prestada y reiteramos nuestro compromiso con la ejecución adecuada, oportuna y conforme a la normatividad vigente del proyecto.

Cordialmente,

EDUARDO SALGUERO RIVEROS
C.C. 1.110.460.707 de Ibagué Tolima
Representante legal
NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

NORSUR

INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

Nit: 901.187.919-4

OFERTA ECONÓMICA

Señores
ALCALDIA DE VALPARAISO
Calle 11 No. 3-50
Valparaíso Caquetá.

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. SAMC-001-2026, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: **REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ**

En mi calidad de Representante Legal de **NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S**, presento oferta económica para el proceso de la referencia, por la suma de **TRECIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS** ($325.496.955) M/cte.

CONCEPTO DE OFERTA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	**REPOSICION DE TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO**				
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	329,00	$ 4.678,45	$ 1.539.210,00
1,2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLE. INCLUYE CORTE ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM.	M2	443,90	$ 18.216,00	$ 8.086.082,00
1,3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO SIN RETIRO, INCLUYE PERFILADO MANUAL	M3	420,28	$ 33.674,00	$ 14.152.509,00
1,4	EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO SIN RETIRO	M3	261	$ 58.498,00	$ 15.267.978,00
1,5	PROTECCION DE TALUDES (ENTIBADO EN MADERA)	M2	177,10	$ 50.370,00	$ 8.920.527,00
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE ARENA DE APOYO DE TUBERÍA	M3	34,55	$ 182.492,00	$ 6.305.099,00
1,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT 8"	M	329,00	$ 93.415,00	$ 30.733.535,00
1,8	INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA SANITARIA 8" X 6"	UND	61,00	$ 768.624,00	$ 46.886.064,00
1,9	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	61,00	$ 543.904,00	$ 33.178.144,00
1,10	DEMOLICION ANDEN E=0.10	M2	128,10	$ 20.891,00	$ 2.676.137,00
1,11	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	128,10	$ 123.244,00	$ 15.787.556,00
1,12	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 M.	UND	6,00	$ 3.866.130,28	$ 23.196.782,00
1,13	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	327,01	$ 40.060,00	$ 13.100.021,00
1,14	RELLENO CON MATERIAL SELECIONADO DE RIO	M3	92,12	$ 216.160,00	$ 19.912.659,00

Dirección: Carrera 7 N.° 17-24 Barrio Siete de Agosto, Florencia - Caquetá.
Nit: 901187919 – 4, Teléfono móvil: 3204912919
Correo: norsuringenieriaytopografiazs@gmail.com
Eduardo Salguero Riveros – Topógrafo

1,15	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	M3	158,81	$ 43.110,00	$ 6.846.299,00
				SUBTOTAL CAP. 1 REPOSICION DE TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO:	**$ 246.588.602,00**

	VALOR COSTOS DIRECTOS	**$ 246.588.602,00**
COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL		
COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACION	27,0%	$ 66.578.923,00
IMPREVISTOS	1,0%	$ 2.465.886,00
UTILIDAD	4,0%	$ 9.863.544,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 78.908.353,00**
	VALOR TOTAL ITEM	**$ 325.496.955,00**

Para los efectos de la presente oferta económica declaro que:

1. El objeto ofertado cumple con las condiciones técnicas previstas en los estudios previos correspondientes al proceso de contratación de la referencia y contienen lo mínimo que necesita la Entidad para satisfacer el bien objeto del presente proceso de selección.

2. El valor aquí ofertado incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que estos se entienden por cuenta de la firma que represento.

3. La oferta económica tiene una vigencia de: ... (90 días MÍNIMO)

Atentamente,

Nombre del Proponente NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

Nombre del representante legal EDUARDO SALGUERO RIVEROS

C. C. No. 1.110.460.707 de Ibagué

Dirección Cl 13 4 A – 24

Correo electrónico: norsuringenieriaytopografiazs@gmail.com

Ciudad Morelia, Caquetá

[Firma del Proponente o de su representante Legal]

NORSUR

INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

Nit: 901.187.919-4

Desagregación del AIU.

DESCRIPCION	UND.	MESES	DEDICACION	V. UNITARIO	PORCENTAJE	V. TOTAL
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (Incl. Prestaciones Sociales)						
Director de Obra	un	2,00	20,00%	$4.500.000,00	0,73%	$1.800.000,00
Residente de Obra	un	2,00	50,00%	$3.500.000,00	1,42%	$3.500.000,00
Siso	un	2,00	100,00%	$2.222.220,00	1,80%	$4.444.440,00
					Subtotal	**$ 9.744.440,00**
COSTOS ADMINISTRATIVO Y OTROS						
OFICINA, PAPELERIA Y OTROS						
Costos de arriendo de Oficina y Almacen	un	2,00	100,00%	$350.000,00	0,28%	$700.000,00
Costos de Papeleria, Fotocopias, Polizas	un	2,00	100,00%	$150.000,00	0,12%	$300.000,00
Costos alquiler de equipos Oficina	un	2,00	100,00%	$250.000,00	0,20%	$500.000,00
					Subtotal	**$ 1.500.000,00**
DESCUENTO SOBRE EL TOTAL DEL CONTRATO (CARGA TRIBUTARIA)						
	UND	**PORCENTAJE**		**VALOR TOTAL CONTRATO**	**PORCENTAJE ESTIMADO SOBRE TOTAL DEL CONTRATO**	
Estampilla Pro Deporte 2.5%	un	2,50%		$325.496.955,00	3,30%	$ 8.137.424,00
Cultura 0,6%	un	0,60%		$325.496.955,00	0,79%	$ 1.952.982,00
S. Social 0,1%	un	0,10%		$325.496.955,00	0,13%	$ 325.497,00
Biblioteca 0,1%	un	0,10%		$325.496.955,00	0,13%	$ 325.497,00
Pasivo Pensional 0,2%	un	0,20%		$325.496.955,00	0,26%	$ 650.994,00
Estampilla Pro Adulto Mayor 4%	un	4,00%		$325.496.955,00	5,28%	$ 13.019.878,00

Dirección: Carrera 7 N.° 17-24 Barrio Siete de Agosto, Florencia - Caquetá,
Nit: 901187919 – 4, Teléfono móvil: 3204912919
Correo: norsuringenieriaytopografiazs@gmail.com
Eduardo Salguero Riveros – Topógrafo

Estampilla Pro Universidad de la Amazonia 0,5%	un	0,50%		$325.496.955,00	0,66%	$ 1.627.485,00
Estampilla Justicia Familiar 2%	un	2,00%		$325.496.955,00	2,64%	$ 6.509.939,00
Ley 418/98-Fondo Seguridad C FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPIO DE VALPARAISO 5% - Contratos de Obra.	un	5,00%		$325.496.955,00	6,60%	$ 16.274.848,00
PRO-ELECTRIFICACION RURAL	un	2,00%		$325.496.955,00	2,64%	$ 6.509.939,00
					Subtotal	**$ 55.334.483,00**
TOTAL ADMINISTRACIÓN						**$ 66.578.923**
TOTAL OBRA CIVIL COSTO DIRECTO						**$ 246.588.602**
PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN						**27,0%**

VALOR OBRA CIVIL COSTO DIRECTO		**$ 246.588.602,00**
ADMINISTRACIÓN	27,0%	$ 66.578.923,00
IMPREVISTOS	1,00%	$ 2.465.886,00
UTILIDAD	4,00%	$ 9.863.544,00
VALOR TOTAL COSTO INDIRECTO	**32,00%**	**$ 78.908.353,00**

Atentamente,

EDUARDO SALGUERO RIVEROS
C.C. 1.110.460.707 de Ibagué Tolima
Representante legal
NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
Nit: 901.187.919-4

APU

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
MEZCLA CONCRETO 1:3:5 2000 PSI-14 MPA	**BASICO**	**M3**	

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M3	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
AGUA	LT	150		100,00	15.000,00
ARENA LAVADA DE RIO	M3	0,55		55.000,00	30.250,00
GRAVA TRITURADA	M3	0,92		100.000,00	92.000,00
CEMENTO GRIS inc. Transp	KG	230		900,00	207.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**344.250,00**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M3 / DIA	VR. UNIT
M.O. 5 AYUDANTES + 1 OFICIAL	472.486	185%	874.099	7,00	124.871,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**124.871,00**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
MEZCLADORA CONCRETO		DIA	0,3	83.300,00	24.990,00
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	10%	124.871,00	12.487,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**37.477,00**

TRANSPORTES	M3 ó Ton.	DISTANCIA	Cant. x Dist.	TARIIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE MAT. ARENA DESDE MORELIA		M3-KM	24,75	2.000,00	49.500,00
TRANSPORTE MAT. GRAVA TRITURADA DESDE MORELIA		M3-KM	41,4	2.000,00	82.800,00
				SUBTOTAL TRANSPORTES	**132.300,00**

	COSTO DIRECTO	**638.898,00**

OBSERVACIONES:

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
Nit: 901.187.919-4

APU

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI - 22,0 Mpa			**BASICO**	**M3**	
MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M3	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
AGUA	LT	180		100,00	18.000,00
ARENA LAVADA DE RIO	M3	0,56		55.000,00	30.800,00
GRAVA TRITURADA	M3	0,84		100.000,00	84.000,00
CEMENTO GRIS inc. Transp	KG	350		900,00	315.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**447.800,00**
MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M3 / DIA	VR. UNIT
M.O. 5 AYUDANTES + 1 OFICIAL	472.486	185%	874.099	6,00	145.683,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**145.683,00**
EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
MEZCLADORA DE CONCRETO		DIA	0,35	83.300,00	29.155,00
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	10,0%	145.683,00	14.568,00
			SUBTOTAL EQUIPO		**43.723,00**
TRANSPORTES	M3 ó Ton.	DISTANCIA	Cant. x Dist.	TARIIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE MAT. ARENA DESDE MORELIA		M3-KM	25,2	2.000,00	50.400,00
TRANSPORTE MAT. GRAVA TRITURADA DESDE MORELIA		M3-KM	37,8	2.000,00	75.600,00
			SUBTOTAL TRANSPORTES		**126.000,00**
	COSTO DIRECTO				**763.206,00**

OBSERVACIONES:

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
Nit: 901.187.919-4

APU

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
MORTERO 1:2			**BASICO**	**M3**	
MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M3	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
AGUA	LT	200		100,00	20.000,00
ARENA LAVADA DE RIO	M3	0,95		55.000,00	52.250,00
CEMENTO GRIS inc. Transp	KG	600		900,00	540.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**612.250,00**
MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M3 / DIA	VR. UNIT
M.O. 2 AYUDANTES	219.465	185%	406.010	5,00	81.202,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**81.202,00**
EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
MEZCLADORA DE CONCRETO		DIA	0,21	83.300,00	17.493,00
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	10%	81.202,00	8.120,00
			SUBTOTAL EQUIPO		**25.613,00**
TRANSPORTES	M3 ó Ton.	DISTANCIA	Cant. x Dist.	TARIIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE MAT. ARENA DESDE MORELIA		M3-KM	42,75	2.000,00	85.500,00
			SUBTOTAL TRANSPORTES		**85.500,00**
	COSTO DIRECTO				**804.565,00**

OBSERVACIONES:

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
Nit: 901.187.919-4

APU

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	**1.1**	**ML**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
CUARTON 5CM X 10 CM X 3M	UND	0,05		18.000,00	900,00
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0,01		6.545,00	65,45
PIOLA GRUESA 50 METROS	ROLLO	0,01		3.500,00	35,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**1.000,45**

MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT.
M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	256.890	185%	475.246	250,00	1.900,00
M.O. TOPOGRAFIA 1 CADENERO + 1 TOPOG.	390.492	185%	722.410	500,00	1.444,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**3.344,00**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	10%	3.344,00	334,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**334,00**

TRANSPORTES	M3 ó Ton.	DISTANCIA	Cant. x Dist.	TARIIFA	VR. UNIT.
				SUBTOTAL TRANSPORTES	**-**

	COSTO DIRECTO	**4.678,45**

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
Nit: 901.187.919-4

APU

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ

DESCRIPCION			ITEM		UND. ITEM
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLE. INCLUYE CORTE ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM.			**1.2**		**M2**
MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
			SUBTOTAL MATERIALES		**-**
MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT.
M.O. 2 AYUDANTES	143.730	185%	265.901	23,00	11.560,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**11.560,00**
EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	10%	11.560,00	1.156,00
CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO A GASOLINA 4T Y 2T		DIA	55.000	0,10	5.500,00
			SUBTOTAL EQUIPO		**6.656,00**
TRANSPORTES	M3 ó Ton.	DISTANCIA	Cant. x Dist.	TARIIFA	VR. UNIT.
			SUBTOTAL TRANSPORTES		**-**
		COSTO DIRECTO			**18.216,00**

NOR SUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA	NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S Nit: 901.187.919-4

APU

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO SIN RETIRO, INCLUYE PERFILADO MANUAL	**1.3**	**M3**	

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M3	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
				SUBTOTAL MATERIALES	**-**

MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. M3 / DIA	VR. UNIT.
M.O. 1 AYUDANTE	71.865	185%	132.950	30,00	4.431,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**4.431,00**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
RETROEXCAVADORA DE LLANTA		H	0,18	160.000,00	28.800,00
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	10,0%	4.431,00	443,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**29.243,00**

TRANSPORTES	M3 ó Ton.	DISTANCIA	Cant. x Dist.	TARIIFA	VR. UNIT.
				SUBTOTAL TRANSPORTES	**-**
			COSTO DIRECTO		**33.674,00**

OBSERVACIONES:

NOR SUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA	NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S Nit: 901.187.919-4

APU

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE ARENA DE APOYO DE TUBERÍA			**1.6**	**M3**	
MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M3	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
ARENA LAVADA DE RIO	M3	1	5	55.000,00	57.750,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**57.750,00**
MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. M3 / DIA	VR. UNIT.
M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	256.890	185%	475.247	25,00	19.009,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**19.009,00**
EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
APISONADOR COMPACTADOR MANUAL - TIPO CANGURO O RANA		DIA	0,155	89.250,00	13.833,00
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	10%	19.009,00	1.900,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**15.733,00**
TRANSPORTES	M3 ó Ton.	DISTANCIA	Cant. x Dist.	TARIIFA	VR. UNIT.
TRANSPORTE MAT. ARENA DESDE MORELIA		M3-KM	45	2.000,00	90.000,00
			SUBTOTAL TRANSPORTES		90.000,00
			COSTO DIRECTO		**182.492,00**
OBSERVACIONES:					

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
Nit: 901.187.919-4

APU

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAPORT 8" , INC ATRAQUE Y NIVELACIÓN			1.7	ML	
MATERIALES	UNIDAD	CANT. / ML	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
TUBO SAN. PVC CORRUGADO - 8" 200 MM S-4 Inc. Transp	M	1		60.000,00	60.000,00
HIDROSELLO	UND	0,5		13.000,00	6.500,00
LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,013		40.500,00	526,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**67.026,00**
MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M / DIA	VR. UNIT
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	204.428	185%	378.192	25,00	15.127,00
M.O. 2 AYUDANTES	143.730	185%	265.901	30,00	8.863,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**23.990,00**
EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	10,0%	23.990,00	2.399,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**2.399,00**
TRANSPORTES	M3 ó Ton.	DISTANCIA	Cant. x Dist.	TARIIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTES	-
	COSTO DIRECTO				**93.415,00**
OBSERVACIONES:					

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
Nit: 901.187.919-4

APU

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO SIN RETIRO			**1.4**	**M3**	
MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M3 / DIA	VR. UNIT
M.O. 2 AYUDANTE	143.730	185%	265.901	5,00	53.180,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**53.180,00**
EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	10%	53.180,00	5.318,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**5.318,00**
TRANSPORTES	M3 ó Ton.	DISTANCIA	Cant. x Dist.	TARIIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTES	-
				COSTO DIRECTO	**58.498,00**

OBSERVACIONES:

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
Nit: 901.187.919-4

APU

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
PROTECCION DE TALUDES (ENTIBADO EN MADERA)			**1.5**	**M2**	
MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0,15		6.545,00	981,00
TABLA ORDINARIA 3 X 30 X 300	UND	0,8		33.000,00	26.400,00
CUARTON 5 CM X 10 CM X 3M	UND	1		18.000,00	18.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**45.381,00**
MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. ML / DIA	VR. UNIT
M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	256.890	185%	475.247	100	4.752,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**4.752,00**
EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	4.752,00	237,00
			SUBTOTAL EQUIPO		**237,00**
TRANSPORTES	M3 ó Ton.	DISTANCIA	Cant. x Dist.	TARIIFA	VALOR UNITARIO
			SUBTOTAL TRANSPORTES		**-**
		COSTO DIRECTO			**50.370,00**

OBSERVACIONES:

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
Nit: 901.187.919-4

APU

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA SANITARIA 8" X 6"			**1.8**	**UND**	
MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
TUBO SAN PVC 6" tipo pesado	ML	8	0	48.000,00	384.000,00
CODO SAN 45 - 160MM	UND	1	0	70.000,00	70.000,00
KIT SILLA YEE TIPO NOVAF 200X160MM INC ACCESORIOS	UND	1	0	170.000,00	170.000,00
LUBRICANTE TUB PVC 500GR	UND	0,01	0	40.500,00	405,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**624.405,00**
MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M / DIA	VR. UNIT
M.O. HIDROSANIT. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	283.481	185%	524.439	4,00	131.109,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**131.109,00**
EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	10,0%	131.109,00	13.110,00
			SUBTOTAL EQUIPO		**13.110,00**
TRANSPORTES	M3 ó Ton.	DISTANCIA	Cant. x Dist.	TARIIFA	VALOR UNITARIO
			SUBTOTAL TRANSPORTES		-
		COSTO DIRECTO			**768.624,00**

OBSERVACIONES:

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
Nit: 901.187.919-4

APU

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ

DESCRIPCION				ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]				**1.9**	**UND**	
MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.		VALOR UNITARIO
ALAMBRE NEGRO	KG	0,2		8.000,00		1.600,00
ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	10		7.000,00		70.000,00
TABLA 3 X 27 X 300 CM	UND	1,5		33.000,00		49.500,00
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 210 MPa	M3	0,28		763.206,00		213.697,00
				SUBTOTAL MATERIALES		**334.797,00**
MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M / DIA		VR. UNIT
M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	256.890	185%	475.247	2,50		190.098,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA			**190.098,00**
EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA		VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	10,0%	190.098,00		19.009,00
				SUBTOTAL EQUIPO		**19.009,00**
TRANSPORTES	M3 ó Ton.	DISTANCIA	Cant. x Dist.	TARIIFA		VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTES		**-**
			COSTO DIRECTO			**543.904,00**

OBSERVACIONES:

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA	NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S Nit: 901.187.919-4

APU

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
DEMOLICION ANDEN E=0.10			**1.10**	**M2**	
MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MATERIALES	-
MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M / DIA	VR. UNIT
M.O. 2 AYUDANTES	143.730	185%	265.901	14,00	18.992,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**18.992,00**
EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	10,0%	18.992,00	1.899,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.899,00**
TRANSPORTES	M3 ó Ton.	DISTANCIA	Cant. x Dist.	TARIIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTES	-
			COSTO DIRECTO		**20.891,00**
OBSERVACIONES:					

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
Nit: 901.187.919-4

APU

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI			**1.11**	**M2**	
MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
CUARTON 5 CM X 10 CM X 3M	UND	0,25		18.000,00	4.500,00
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LBS	0,05		6.545,00	327,00
TABLA ORDINARIA 3 X 30 X 300	UND	0,5		33.000,00	16.500,00
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 210 MPa	M3	0,105		763.206,00	80.136,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**101.463,00**
MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M / DIA	VR. UNIT
M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	256.890	185%	475.247	24,00	19.801,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**19.801,00**
EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	10,0%	19.801,00	1.980,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.980,00**
TRANSPORTES	M3 ó Ton.	DISTANCIA	Cant. x Dist.	TARIIFA	VALOR UNITARIO
			SUBTOTAL TRANSPORTES		**-**
		COSTO DIRECTO			**123.244,00**
OBSERVACIONES:					

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
Nit: 901.187.919-4

APU

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA			**1.13**	**M3**	
MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M3	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
AGUA	LT	7		100,00	700,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**700,00**
MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M3 / DIA	VR. UNIT
M.O. 2 AYUDANTES	143.730	185%	265.901	8,00	33.237,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**33.237,00**
EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
APISONADOR COMPACTADOR MANUAL - TIPO CANGURO O RANA		DIA	0,05	89.250,00	4.462,00
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	33.237,00	1.661,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**6.123,00**
TRANSPORTES	M3 ó Ton.	DISTANCIA	Cant. x Dist.	TARIIFA	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL TRANSPORTES	-
			COSTO DIRECTO		**40.060,00**

OBSERVACIONES:

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
Nit: 901.187.919-4

APU

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
RELLENO CON MATERIAL SELECIONADO DE RIO	**1.14**	**M3**	

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M3	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
MATERIAL SELECIONADO DE RIO	M3	1,3		46.000,00	59.800,00
			SUBTOTAL MATERIALES		59.800,00

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M3 / DIA	VR. UNIT
M.O. 2 AYUDANTES	143.730	185%	265.901	8,00	33.237,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**33.237,00**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
APISONADOR COMPACTADOR MANUAL - TIPO CANGURO O RANA		DIA	0,05	89.250,00	4.462,00
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	33.237,00	1.661,00
			SUBTOTAL EQUIPO		**6.123,00**

TRANSPORTES	M3 ó Ton.	DISTANCIA	Cant. x Dist.	TARIIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE MAT. AFIRMADO DE RIO DESDE MORELIA		M3-KM	58,5	2.000,00	117.000,00
			SUBTOTAL TRANSPORTES		**117.000,00**

	COSTO DIRECTO	**216.160,00**

OBSERVACIONES:

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
Nit: 901.187.919-4

APU

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.			**1.15**	**M3**	
MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M3 / DIA	VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE	71.865	185%	132.950	75,00	1.772,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**1.772,00**
EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
RETROEXCAVADORA DE ORUGA		H	0,075	294.000,00	22.050,00
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	1.772,00	88,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**22.138,00**
TRANSPORTES	M3 ó Ton.	DISTANCIA	Cant. x Dist.	TARIIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE MATERIAL SOBRANTES DE EXVACACION VOLQUETA 6 M3		VIAJE	0,16	120.000,00	19.200,00
				SUBTOTAL TRANSPORTES	19.200,00
			COSTO DIRECTO		**43.110,00**
OBSERVACIONES:					

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
Nit: 901.187.919-4

APU

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ

DESCRIPCION			ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 M.			**1.12**	**UND**	
MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
TABLA ORDINARIA 3 X 30 X 300	UND	1,5		33.000,00	49.500,00
CUARTON 5 CM X 10 CM X 3M	UND	2		18.000,00	36.000,00
HIERRO 60.000 PSI 420 MPA	KG	100		7.000,00	700.000,00
ALAMBRE NEGRO	KG	2		8.000,00	16.000,00
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 210 MPa	M3	1,7		763.206,00	1.297.450,00
ARO TAPA	UND	1		580.000,00	580.000,00
MORTERO 1:2	M3	0,15		804.565,00	120.684,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**2.799.634,00**
MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT
M.O. 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	256.890	185%	475.247	0,70	678.924,28
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**678.924,28**
EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	10%	678.924,28	67.892,00
FORMALETA CAMARA INSPECCION INTERNA - EXTERNA		DIA	1,8	75.000,00	135.000,00
VIBRADOR CONCRETO		DIA	1,8	47.600,00	85.680,00
			SUBTOTAL EQUIPO		**288.572,00**
TRANSPORTES	M3 ó Ton.	DISTANCIA	Cant. x Dist.	TARIIFA	VALOR UNITARIO
TRANSPORTE FORMALETA, EQUIPOS			0,33	300.000,00	99.000,00
			SUBTOTAL TRANSPORTES		**99.000,00**
		COSTO DIRECTO			**3.866.130,28**
OBSERVACIONES:					

EDUARDO SALGUERO RIVEROS
C.C. 1.110.460.707 de Ibagué Tolima
Representante legal
NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

CER_AFI_2026026059178

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA identificado con CC. 16185320 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR

Nombres y/o Razón Social	NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901187919

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL

Fecha de Inicio de Cobertura	2026/04/14	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5711001

Esta certificación se expide a los 13 días del mes de abril del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC13042026N16185320A16779047.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

CER_AFI_2026026058725

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

Hacienda

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

JULIO ERNESTO LOZANO BERNAL identificado con CC. 79382648 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR			
Nombres y/o Razón Social	NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901187919

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/04/14	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5711001

Esta certificación se expide a los 13 días del mes de abril del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC13042026N79382648A16778612.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

CER_AFI_2026026060336

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Kelly Johanna España Ordoñez identificado con CC. 1117969414 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR

Nombres y/o Razón Social	NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S	**Tipo y Numero de Documento**	NI - 901187919

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL

Fecha de Inicio de Cobertura	2026/04/14	**Tipo de Vinculación**	Dependiente
Estado de Afiliación	Activa	**Fecha Retiro**	No registra
Clase de Riesgo	5	**Código Actividad Económica**	5711001

Esta certificación se expide a los 13 días del mes de abril del 2026.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC13042026N1117969414A16780188.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **16.185.320**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 13 de Abril del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Protección

Una empresa sura

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **LOZANO BERNAL JULIO ERNESTO** identificado(a) con **CC** número **79.382.648** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 31 de octubre de 1994 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 60% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN CONSERVADOR
2. El 40% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 13 de abril de 2026.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customer0001.wolkvox.com/proteccion/index.php**

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

KELLY JOHANNA ESPAÑA ORDOÑEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.117.969.414**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 13 de Abril del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	16185320
NOMBRES	JAIRO ALBERTO
APELLIDOS	GOMEZ ROA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	CAQUETA
MUNICIPIO	FLORENCIA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	CONTRIBUTIVO	01/05/2020	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	04/13/2026 16:56:24	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	79382648
NOMBRES	JULIO ERNESTO
APELLIDOS	LOZANO BERNAL
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	HUILA
MUNICIPIO	NEIVA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	CONTRIBUTIVO	17/03/2022	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	04/13/2026 16:55:43	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1117969414
NOMBRES	KELLY JOHANNA
APELLIDOS	ESPAÑA ORDOÑEZ
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	CAQUETA
MUNICIPIO	FLORENCIA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	CONTRIBUTIVO	11/07/2018	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	04/13/2026 16:52:36	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**,

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
Nit: 901.187.919-4

CRONOGRAMA DE OBRA

PROYECTO	REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ	FECHA:	FEBRERO 2026

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	MES 1				MES 2			
						S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
	REPOSICION DE TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO												
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	329,00	$ 4.678,45	$ 1.539.210,00	384.802,5	384.802,5	384.802,5	384.802,5				
						25%	25%	25%	25%				
1,2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLE. INCLUYE CORTE ESPESOR PROMEDIO DE 16 CM.	M2	443,96	$ 18.216,80	$ 8.086.082,00	2.021.520,5	2.021.520,5	2.021.520,5	2.021.520,5				
						25%	25%	25%	25%				
1,3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO SIN RETIRO, INCLUYE PERFILADO MANUAL	M3	420,28	$ 33.674,00	$ 14.152.509,00	3.538.127,3	3.538.127,3	3.538.127,3	3.538.127,3				
						25%	25%	25%	25%				
1,4	EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO SIN RETIRO	M3	261	$ 58.498,00	$ 15.267.978,00	3.816.994,5	3.816.994,5	3.816.994,5	3.816.994,5				
						25%	25%	25%	25%				
1,5	PROTECCION DE TALUDES (ENTIBADO EN MADERA)	M2	177,1	$ 50.370,00	$ 8.920.527,00	2.230.131,8	2.230.131,8	2.230.131,8	2.230.131,8				
						25%	25%	25%	25%				
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMA DE ARENA DE APOYO DE TUBERÍA	M3	34,55	$ 182.492,00	$ 6.305.099,00		1.576.274,8	1.576.274,8	1.576.274,8	1.576.274,8			
							25%	25%	25%	25%			
1,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT 8"	M	329	$ 93.415,00	$ 30.733.535,00		7.683.383,8	7.683.383,8	7.683.383,8	7.683.383,8			
							25%	25%	25%	25%			
1,8	INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA SANITARIA 8"X 6"	UND	61	$ 768.624,00	$ 46.886.064,00		11.721.516,0	11.721.516,0	11.721.516,0	11.721.516,0			
							25%	25%	25%	25%			
1,9	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	61	$ 543.904,00	$ 33.178.144,00		8.294.536,0	8.294.536,0	8.294.536,0	8.294.536,0			
							25%	25%	25%	25%			
1,10	DEMOLICION ANDEN E=0.10	M2	128,1	$ 20.891,00	$ 2.676.137,00					1.338.068,5	1.338.068,5		
										50%	50%		
1,11	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	128,1	$ 123.244,00	$ 15.787.556,00					7.893.778,0	7.893.778,0		
										50%	50%		
1,11	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1,50-2,80 M.	M2	6,00	$ 3.866.130,28	$ 23.196.782,00				7.732.260,7	7.732.260,7	7.732.260,7		
									59%	59%	59%		
1,13	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	327,01	$ 40.060,00	$ 13.100.021,00				4.366.673,7	4.366.673,7	4.366.673,7		
									33%	33%	33%		
1,14	RELLENO CON MATERIAL SELECIONADO DE RIO	M3	92,12	$ 216.160,00	$ 19.912.659,00					6.637.553,0	6.637.553,0	6.637.553,0	
										33%	33%	33%	
1,15	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	M3	158,81	$ 43.110,00	$ 6.846.299,00								6.846.299,0
													100%
	SUBTOTAL CAP. REPOSICION DE TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO:				246.588.602,00								

	VALOR COSTOS DIRECTOS		246.588.602,00	11.991.577	41.267.287	41.267.287	53.366.221	57.244.044	27.968.333	6.637.553	6.846.299
COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL											
COSTOS INDIRECTOS											
ADMINISTRACION	27,0%		66.578.923,00	3.237.726,00	11.142.168,00	11.142.168,00	14.408.880,00	15.455.892,00	7.551.450,00	1.792.139,00	1.848.501,00
IMPREVISTOS	1,0%		2.465.886,00	119.916,00	412.673,00	412.673,00	533.662,00	572.440,00	279.683,00	66.376,00	68.463,00
UTILIDAD	4,0%		9.863.544,00	479.663,00	1.650.691,00	1.650.691,00	2.134.649,00	2.289.762,00	1.118.733,00	265.502,00	273.852,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS			78.908.353,00	3.837.305,00	13.205.532,00	13.205.532,00	17.077.191,00	18.318.094,00	8.949.866,00	2.124.017,00	2.190.816,00
VALOR TOTAL ITEM			325.496.955,00	15.828.881,50	54.472.819,00	54.472.819,00	70.443.412,00	75.562.138,00	36.918.199,00	8.761.570,00	9.037.115,00

% EJECUCION SEMANAL	4,86%	16,74%	16,74%	21,64%	23,21%	11,34%	2,69%	2,78%
% EJECUCION ACUMULADO	4,86%	21,60%	38,33%	59,98%	83,19%	94,53%	97,22%	100,00%

EDUARDO SALQUERO RIVEROS
C.C. 1.110.460.707 de Ibague Tolima
Representante legal
NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: t+/owFJnkKW3d4RPwcvjtQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100048977	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	100155685	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/03/2026	24:00 Horas Del	30/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.AS.	No. DOC. IDENTIDAD	901187919-4
DIRECCIÓN	CL 13 4 25	TELÉFONO	3204912919
ASEGURADO	MUNICIPIO DE VALPARAISO	No. DOC. IDENTIDAD	800050407-1
DIRECCIÓN	CALLE 11 NO. 3 - 50	TELÉFONO	4304052
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE VALPARAISO	No. DOC. IDENTIDAD	800050407-1
DIRECCIÓN	CALLE 11 NO. 3 - 50	TELÉFONO	4304052

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.001 DE 2026 , CUYO OBJETO ES

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ

ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE VALPARAÍSO NIT. 800.050.407-1

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/03/2026	24:00 Horas Del 30/11/2026	32.549.695,50	39.327,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/03/2026	24:00 Horas Del 30/05/2029	16.274.847,75	77.384,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/05/2026	24:00 Horas Del 30/05/2031	32.549.695,50	293.108,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 81.374.238,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	409.819,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	409.819,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	78.816,00
TOTAL A PAGAR	$	493.635,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/03/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100048977	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	100155685	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/03/2026	24:00 Horas Del	30/05/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CCS-100048977** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.AS.** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE VALPARAISO / MUNICIPIO DE VALPARAISO** , expedida por la Compañía en **31/03/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN CALI SUR a los **31** días del mes **MARZO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Boleta de Pago No. :20260100159619

Tienda
FAP MUNDIAL

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
31 de marzo de 2026 a las 4:16 p. m.

CUS
184377127

¿Cuánto?
$ 638.871,00

Factura de comercio
4991793119636461

Tu plata salió de:



Disponible

Detalle del pago

Transaction ID:

17589b60-3ec7-4bf7-a0c3-206d03ad432b

Creado: 3/31/26, 9:15 PM | Actualizado: 3/31/26, 9:16 PM

País: CO

Estado: READY_TO_P

Subestado: SYNC

Cliente: NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S

Descripción : **Boleta de Pago No. :** 20260100159619
Polizas: 100010648-0, 100048977-0

Correo:

Valor venta

$638,871.00

Descargar Cerrar

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ejlrLyIB7h3IoZDgw1r8MQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100010648	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	100155687	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/03/2026	24:00 Horas Del	30/05/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.AS.	No. DOC. IDENTIDAD	901187919-4
DIRECCIÓN	CL 13 4 25	TELÉFONO	3204912919
ASEGURADO	NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.AS.	No. DOC. IDENTIDAD	901187919-4
DIRECCIÓN	CL 13 4 25	TELÉFONO	3204912919
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.001 DE 2026 , CUYO OBJETO ES

REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO, CAQUETÁ

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EL MUNICIPIO DE VALPARAISO NIT. 800.050.407-1. COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.AS., EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE EL MUNICIPIO DE VALPARAISO NIT. 800.050.407-1.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	117.047,00
PATRONAL	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 350.181.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	117.047,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	117.047,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	23.189,00
TOTAL A PAGAR	$	145.236,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/03/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CCS-100010648	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	100155687	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/03/2026	SUC. EXPEDIDORA	CEN CALI SUR

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/03/2026	24:00 Horas Del	30/05/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Boleta de Pago No. :20260100159619

Tienda
FAP MUNDIAL

Estado de la transacción
Transacción éxitosa


Fecha de la transacción
31 de marzo de 2026 a las 4:16 p. m.

CUS
184377127

¿Cuánto?
$ 638.871,00

Factura de comercio
4991793119636461

Tu plata salió de:



Disponible

Detalle del pago

Transaction ID:

17589b60-3ec7-4bf7-a0c3-206d03ad432b

Creado: 3/31/26, 9:15 PM | Actualizado: 3/31/26, 9:16 PM

País: CO

Estado: READY_TO_P

Subestado: SYNC

Cliente: NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA S.A.S

Descripción : **Boleta de Pago No. :** 20260100159619
Polizas: 100010648-0, 100048977-0

Correo:

Valor venta


$638,871.00

Descargar Cerrar

NORSUR

INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

Nit: 901187919-4

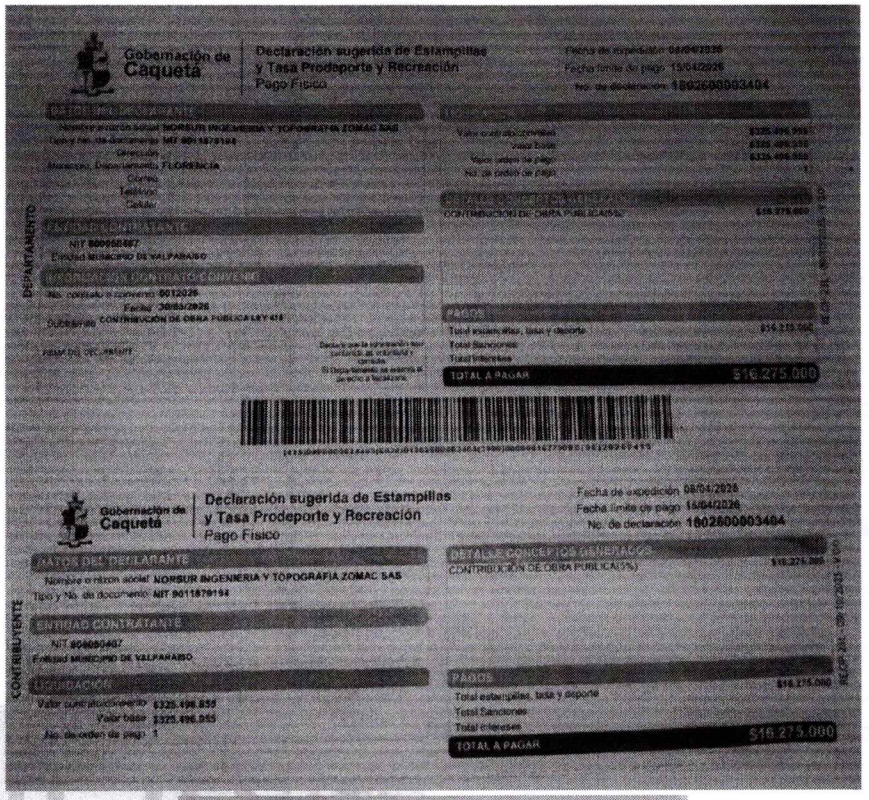
Gobernación de Caquetá

Declaración sugerida de Estampillas y Tasa Prodeporte y Recreación
Pago Físico

Fecha de expedición 08/04/2026
Fecha límite de pago 15/04/2026
No. de declaración 1802600903404

DATOS DEL DECLARANTE

Nombre o razón social NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC SAS
Tipo y No. de documento NIT 901187919-4
Dirección
Municipio, Departamento FLORENCIA
Correo
Teléfono
Celular

ENTIDAD CONTRATANTE

NIT 800650407
Entidad MUNICIPIO DE VALPARAISO

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

No. contrato o convenio 0012026
Fecha 28/03/2026
Objeto/Obra CONTRIBUCION DE OBRA PUBLICA LEY 418
Valor del CTO/CONV

LIQUIDACIÓN

Valor contrato/convenio $325.498.855
Valor base $325.498.855
No. de orden de pago 1

DETALLE DEL CONCEPTO GRAVADO


CONTRIBUCIÓN DE OBRA PUBLICA(5%) $16.274.900

PAGOS

Total estampillas, tasa y deporte $16.275.000
Total Sanciones
Total Intereses
TOTAL A PAGAR $16.275.000

DEPARTAMENTO

CONTRIBUYENTE

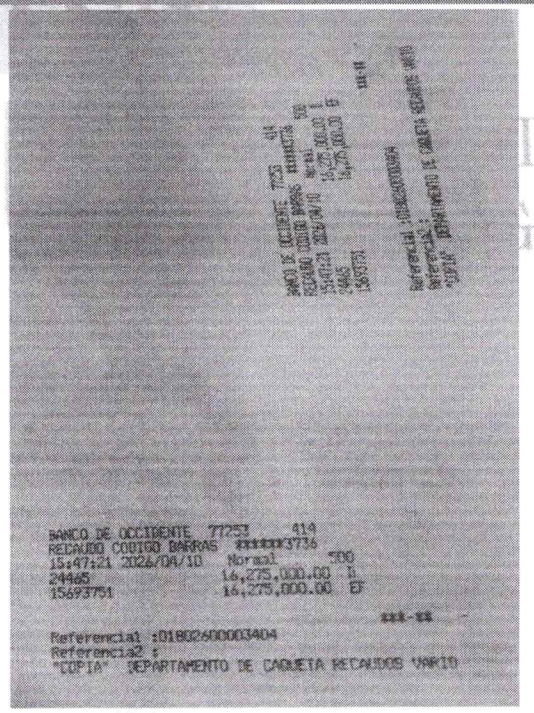
BANCO DE OCCIDENTE 77253 414
RECAUDO CODIGO BARRAS 3736
15:47:21 2026/04/10 Normal 500
24465 16,275,000.00 D
15693751 16,275,000.00 EF

Referencia1 :018026000003404
Referencia2 :
"COPIA" DEPARTAMENTO DE CAQUETA RECAUDOS VARIO


NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFÍA

Dirección: Carrera 7 N.º 17-24 Barrio Siete de Agosto, Florencia - Caquetá,
Nit: 901187919-4, Teléfono móvil: 3204912919
Correo: norsuringenieriaytopografiazsmail.com
Eduardo Salguero Riveros Topógrafo

NORSUR

INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

Nit: 901187919-4

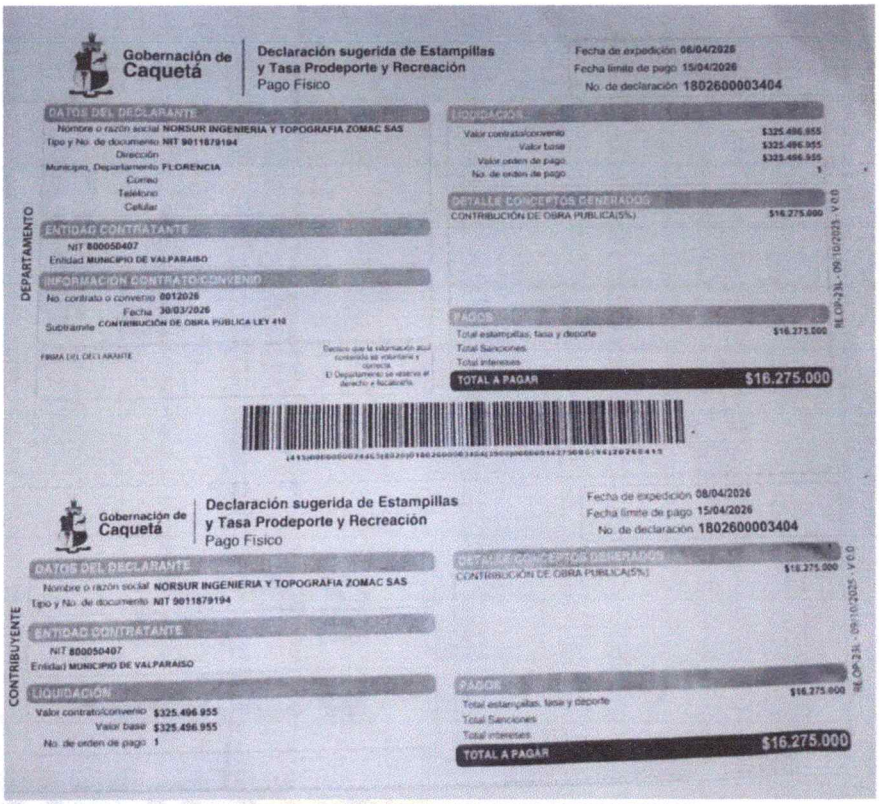

Gobernación de Caquetá

Declaración sugerida de Estampillas y Tasa Prodeporte y Recreación
Pago Físico

Fecha de expedición 08/04/2026
Fecha límite de pago 15/04/2026
No. de declaración 1802600003404

DEPARTAMENTO

DATOS DEL DECLARANTE
Nombre o razón social NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC SAS
Tipo y No. de documento NIT 901187919-4
Dirección
Municipio, Departamento FLORENCIA
Correo
Teléfono
Celular

ENTIDAD CONTRATANTE
NIT 800050407
Entidad MUNICIPIO DE VALPARAISO

INFORMACIÓN CONTRATO/CONVENIO
No. contrato o convenio 0012026
Fecha 30/03/2026
Subtramite CONTRIBUCIÓN DE OBRA PUBLICA LEY 418

FIRMA DEL DECLARANTE

Declaro que la información aquí contenida es voluntaria y correcta.
El Departamento se reserva el derecho a fiscalizarla.

LIQUIDACIÓN

Valor contrato/convenio	$325.496.955
Valor base	$325.496.955
Valor orden de pago	$325.496.955
No. de orden de pago	1

DETALLE CONCEPTOS GENERADOS

CONTRIBUCIÓN DE OBRA PUBLICA(5%)	$16.275.000

PAGOS

Total estampillas, tasa y deporte	$16.275.000
Total Sanciones	
Total intereses	
TOTAL A PAGAR	$16.275.000

RLOP-28L - 09/10/2025 - V 6.0

Gobernación de Caquetá

Declaración sugerida de Estampillas y Tasa Prodeporte y Recreación
Pago Físico

Fecha de expedición 08/04/2026
Fecha límite de pago 15/04/2026
No. de declaración 1802600003404

CONTRIBUYENTE

DATOS DEL DECLARANTE
Nombre o razón social NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC SAS
Tipo y No. de documento NIT 901187919-4

ENTIDAD CONTRATANTE
NIT 800050407
Entidad MUNICIPIO DE VALPARAISO

LIQUIDACIÓN

Valor contrato/convenio	$325.496.955
Valor base	$325.496.955
No. de orden de pago	1


DETALLE CONCEPTOS GENERADOS

CONTRIBUCIÓN DE OBRA PUBLICA(5%)	$16.275.000

PAGOS

Total estampillas, tasa y deporte	$16.275.000
Total Sanciones	
Total intereses	
TOTAL A PAGAR	$16.275.000

RLOP-28L - 09/10/2025 - V 6.0

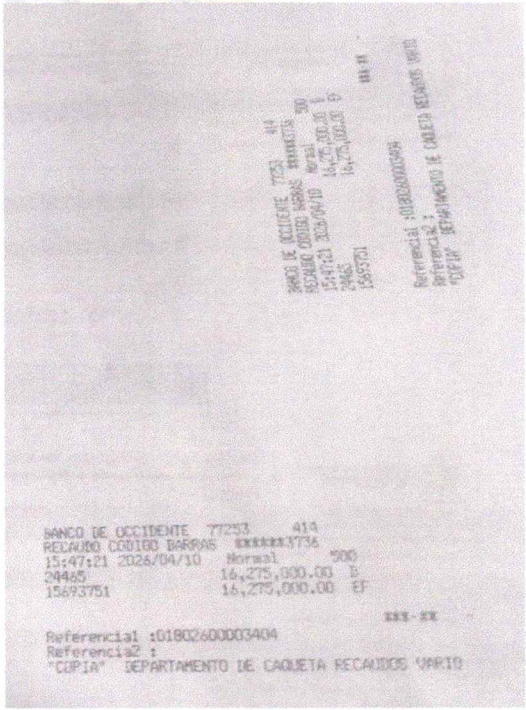

BANCO DE OCCIDENTE 77253 414
RECAUDO CODIGO BARRAS xxxxxx1736
15:47:21 2026/04/10 Normal 500
20465 16,275,000.00 E
15693751 16,275,000.00 EF

Referencia1 :0180260000340
Referencia2 :
"COPIA" DEPARTAMENTO DE CAQUETA RECAUDOS VARIO

Dirección: Carrera 7 N.º 17-24 Barrio Siete de Agosto, Florencia - Caquetá,
Nit: 901187919-4, Teléfono móvil: 3204912919
Correo: norsuringenieriaytopografiazsmail.com
Eduardo Salguero Riveros Topógrafo
