SOLICITUD ADICION Y/O PRORROGA

Fecha:	31 DE MARZO DE 2026			
Solicitante:	LUZ AIDA RODRIGUEZ ATEHORTÚA			
No. De contrato:	ODS05 -2026	**Proceso de contratación**	CO1.NTC.9976514	
Contratista:	Robinson Iral Cardenas			
Objeto del contrato:	Recuperación de la capacidad hidráulica de la quebrada La Brizuela para evitar taponamiento de las estructuras que componen el sistema de tratamiento de agua potable			
Valor inicial:	$26.263.575	**Inversión**		
		Funcionamiento		x
		Proyecto	2.1 Planeación Institucional	
		Rubro	02.2.3.2.01.01.001.03.08.02 Mejoramiento y adecuación al sistema de acueducto	
Plazo de ejecución inicial:	Tres (3) meses desde la suscripción del acta de inicio			
Fecha de inicio:	30-01-2026	**Fecha de terminación:**	30-04-2026	
Supervisor y/o interventor:	Luz Aida Rodríguez Atehortúa Técnica Operativa Acueducto y Alcantarillado			
Tipo de solicitud:	ADICION			
ADICIÓN	**Inversión**	x	**FUNCIONAMIENTO**	
	Proyecto	2.1 Planeación Institucional		
	Rubro:	02,2.3.2.01.01.001.03.08.02 Mejoramiento y adecuación al sistema de acueducto		
	Valor de la adición:	$13.131.787		
	Valor cdp:	$13.131.787		
	No. y fecha CDP:	161 del 31/03/2026		
	Nuevo valor total:	$ 39.395.362		
Prórroga del plazo de ejecución	**Tiempo a prorrogar:**	N/A		
	Fecha de terminación final:	30-04-2026		

DATOS DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. N/A	**FECHA**	N/A
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Aclaración**
$ N/A	**Tiempo:** N/A	N/A
Nuevo Valor: $ N/A	**Fecha de Terminación final:** N/A	

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMMLV

Las actividades objeto del presente contrato se derivan de la necesidad de prevenir y atender los posibles eventos de inundaciones, rebose y/o taponamiento de la bocatoma, debido a que se han encontrado acumulación de árboles, troncos y algunas tupias que utilizan los bañistas para represar el agua. se hace necesario la adición económica de contrato en mención, por un valor de trece millones ciento treinta y un mil setecientos ochenta y siete pesos ($13.131.787) que equivale a un 50%, del valor inicial del mismo, por lo tanto, no es contrario a lo estipulado en el manual de contratación.

SOLICITUD ADICION Y/O PRORROGA

DESARROLLO, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El contratista ha realizado de manera satisfactoria la Orden de Servicio Nº 05 Recuperación de la capacidad hidráulica de la quebrada La Brizuela para evitar taponamiento de las estructuras que componen el sistema de tratamiento de agua potable.
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL

SOLICITUD ADICION Y/O PRORROGA

Como Supervisora del contrato de la Orden de Servicio No. 05 de 2026 y considerando que:

A. El cumplimiento del contratista hasta la fecha no ha tenido no conformidades
B. Debido al tipo de contrato de Orden de Servicio No. 05, se requiere continuar con el mantenimiento y la recuperación de la capacidad hidráulica de la quebrada La Brizuela para evitar taponamiento de las estructuras que componen el sistema de tratamiento de agua potable.
C. Que de conformidad con la solicitud por parte del contratista el mismo menciona entre otros, lo siguiente:

" Por medio de la presente le informo que las actividades de Recuperación de la capacidad hidráulica de la microcuenca La Brizuela en un tramo de 800 metros a partir de la Bocatoma estan por culminar. En esta nos hemos encontrado gran acumulación de arboles, troncos y algunas " tupias" que utilizan los bañistas:
(ver imagen en solicitud)

Estas actividades de corte y apeo de arboles no estaba contemplada y aumenta los costos de la obras, pero por el riesgo de arrastre y de avenida torrencial con " empalizada" y posible taponamiento decidimos retirarlas dentro de la actividad.

Ya acercándonos a los 800 metros de mantenimiento decidimos hacer un recorrido aguas arriba y encontramos mas acumulación de troncos y arboles:
(ver imagen en solicitud)

Estas fotos corresponden a un cruce cerca al sector chamorros. 400 metros arriba del final de la obra.
(ver imagen en solicitud)

Están hacen parte del recorrido de 800 a los 1200 metros.

En ortofoto se muestran los 2 tramos:

Tramo objeto del contrato:
(ver imagen en solicitud)

Tramo recorrido aguas arriba de 800 metros:
(ver imagen en solicitud)

A pesar del mantenimiento que se realiza todavía se tienen riesgo de arrastre aguas arriba. Por ello para realizar una obra adecuada solicitamos se revise la posibilidad de hacer un otrosí y poder realizar un tramo mas amplio para una recuperación mas completa y disminuir el riesgo sobre la infraestructura o si no es posible informarnos para proceder a entregar informe de ejecución de la actividad.
El valor adicional del manteamiento seria:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR MANTENIMIENTO

SOLICITUD ADICION Y/O PRORROGA

1	Limpieza Manual del cauce y zonas aledañas. Incluye 1l retiro de sedimentos del fondo sin afectar el lecho del cauce, esta actividad se realiza en puntos específicos determinados por la supervisión y la dirección de acueducto y alcantarillado. 2. extracción, separación en la fuente, empacado, transporte interno (trasiego) y disposición del material extraído (residuos no aprovechables, se debe manejar un ancho promedio de 0 a 10 metros	*Ml*	*400*	*18.481*	*7.392.400*
2	*Rocería y limpieza, incluye cargue, transporte interno (trasiego) y disposición adecuada dentro de la misma zona sin afectar la llanura de inundación*	*ml*	*400*	*12.200*	*4.880*
3	*Recolección y disposición de materiales y disposiciones proveniente de mantenimiento*	*M3*	*37%*	*22.917*	*859.387*
	Total				*13.131.787"*

D. Es importante manifestar que lo solicitado, obedece a cantidades adicionales a las inicialmente estipuladas, para mejorar las condiciones establecidas en el contrato inicial y poder así realizar más metros adicionales.
E. Las actividades del objeto del presente contrato se derivan de la necesidad de prevenir y atender los posibles eventos de inundaciones, rebose y/o taponamiento de la bocatoma, debido a que se ha encontrado acumulación de árboles, troncos y algunas tupias que utilizan los bañistas para represar el agua .
F. La adición del contrato permite continuar con la mayor eficiencia de los procesos a cargo de la entidad Aquaterra E.S.P.

Por lo anterior solicito de manera formal adición a la Orden de Servicios No. 05 de 2026, con el ánimo de seguir realizando una labor eficiente que redunde en el cumplimiento de los procesos de la entidad.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
Descripción	**Porcentaje**	**Valor**
Valor inicial del contrato		$26.263.575
Valor con adiciones		$ 39.395.362
Porcentaje ejecutado a la fecha	87% aproximado	

SOLICITUD ADICION Y/O PRORROGA

Porcentaje total facturado a la fecha	0%	$0
Porcentaje y Valor total pagado a la fecha	0%	$0
Porcentaje y valor del Saldo por ejecutar	13% aproximado	$3.414.264
ANEXOS DE LA SOLICITUD		
Certificado de disponibilidad presupuestal No. 161 del 31 de marzo de 2026		
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor____ Supervisor__x__ solicito la aprobación de la modificación del Contrato		
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Luz Aida Rodríguez Atehortúa Técnica Operativa Acueducto y Alcantarillado	
FIRMA AUTORIZACION	Luz Aida Rodriguez	

Guarne, marzo 18 de 2026


Doctora
ORIANA HINCAPIE IRAL
Gerente
LUZ AIDA RODRIGUEZ
Supervisora
AQUATERRA ESP

ASUNTO: Avance orden de servicio 05 de 2026 y hallazgos aguas arriba.


Cordial saludo,

Por medio de la presente le informo que las actividades de Recuperación de la capacidad hidráulica de la microcuenca La Brizuela en un tramo de 800 metros a partir de la Bocatoma están por culminar. En esta nos hemos encontrado gran acumulación de árboles, troncos y algunas "tupias" que utilizan los bañistas:



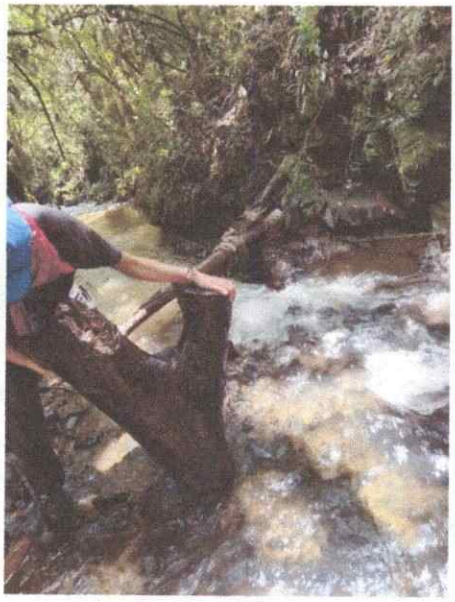




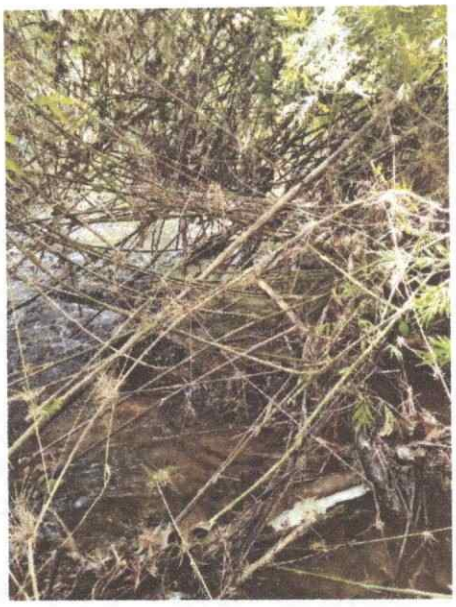

Estas actividades de corte y apeo de árboles no estaba contemplada y aumenta los costos de la obras, pero por el riesgo de arrastre y de avenida torrencial con "empalizada" y posible taponamiento decidimos retirarlas dentro de la actividad.


Ya acercándonos a los 800 metros de mantenimiento decidimos hacer un recorrido aguas arriba y encontramos más acumulación de troncos y árboles:



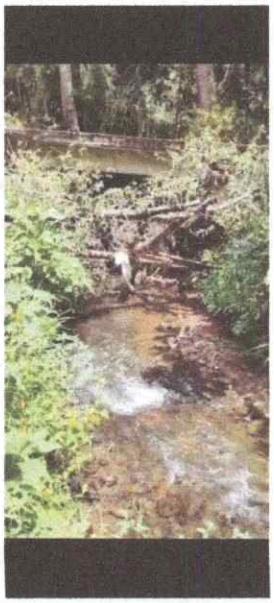

Estas fotos corresponden a un cruce cerca al sector Chamorros. 400 metros arriba del final de la obra.



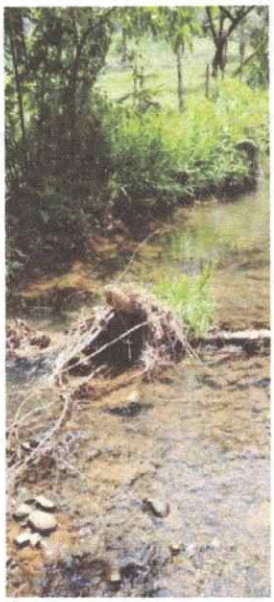

Estas hacen parte del recorido de 800 a los 1200 metros.

En ortofoto se muestran los 2 tramos:

Tramo objeto del contrato:



Tramo recorrido aguas arriba de 800 metros:



A pesar del mantenimiento que se realiza todavía se tienen riesgo de arrastre aguas arriba. Por ello para realizar una obra adecuada solicitamos se revise la posibilidad de hacer un otrosi y poder realizar un tramo más amplio para una recuperación mas completa y disminuir el riesgo sobre la infraestructura o si no es posible informarnos para proceder a entregar informe de ejecución de la actividad.

El valor adicional del mantenimiento sería:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR POR MANTENIMIENTO
1	**Limpieza Manual del cauce y zonas aledañas. Incluye 1l retiro de sedimentos del fondo sin afectar el lecho del cauce, esta actividad se realizaen puntos especificos detreminados por la supervisión y la direccion de acueducto y alcantarillado. 2. extracción, separación en la fuente, empacado, transporte interno (trasiego) y disposición del material extraido (residuos no aprovechables, se debe manejar un ancho promedio de 0 a 10 metros.**	ml	4<<<<<<00	18.481	7.392.400

2	roceria y limpieza, incluye cargue, ~~transporte interno (trasiego)~~ y disposicion adecuada dentro de la misma zona sin afectar la llanura de inundación	ml	400	12.200	4.880.00
3	Recolección y disposición de materiales proveniente de mantenimiento	m3	37,%	22.917	859.387
	TOTAL				13.131.787

Por su atención, muchas gracias,

Atentamente,

ROBINSON IRAL CARDENAS
Contratista
Email: robiniral@hotmail.com
