INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE ACTIVIDADES

1. Información General del Contrato

CONTRATO No.:	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 00615 DE 2025		
CONTRATISTA:	UT LA CAÑADA		
Nit o C.C. No.	901.950.503-7		
OBJETO:	ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HÍDRICA QUEBRADA LA CAÑADA Y SUS TRIBUTARIOS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER.		
VALOR INICIAL:	$657.154.201,18		
VALOR ADICIONAL:	$0.00		
PLAZO CONTRATO:	SIETE (7) MESES		
PLAZO ADICIONAL:	N/A		
SUPERVISOR:	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ		
CARGO SUPERVISOR	SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL		
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	30/05/2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN		**No Aplica**	X
FECHA DE REINICIO		**No Aplica**	X
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	29/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN 2 (Si aplica)	N/A		
VALOR A PAGAR	CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS ($ 187.422.709) M/CTE.		
ACTA A PAGAR:	1		
PAGO No: (En Números)	1		

2. Información Financiera del Contrato

A continuación, se presenta el balance económico del contrato a la fecha:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 657.154.201,18	
VALOR PAGO ACTUAL:		$ 187.422.709
VALOR PAGADO (A la fecha del informe)		$ 0,00

VALOR POR EJECUTAR		$ 469.731.492,18
SUMAS IGUALES	$657.154.201,18	$657.154.201,18

3. Control Pago de Seguridad Social.

Director: IBAN BLANCO (se vinculó desde el 30 de mayo)
Salario: $6,521,487
Dedicación: 80%
Numero de meses: 7

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSION	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
MAYO/2025	9487615906	$7.000	$35.500	$9.700	$44.600
JUNIO/2025	9488889568	$208,700	$834,800	$227.000	$1.270.500
JULIO/2025	9491081162	$208,700	$834,800	$227.000	$1.270.500
AGOSTO/2025	9491425741	$208,700	$834,800	$227.000	$1.270.500

Experto en recurso hidrología: PEDRO MUÑOZ (se vinculó desde el 01 de julio) Cabe aclarar que para este cargo se presentó inicialmente en el proceso licitatorio al Ing Abner Alexey Rincón Suárez, pero al momento de la contratación, no estaba disponible para vincularse.
Salario: $ 5,537,902
Dedicación: 80%
Numero de meses: 6

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSION	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
JULIO/2025	9491081162	$177.300	-	$192.800	$370.100
AGOSTO/2025	9491425741	$177.300	-	$192.800	$370.100

Profesional ambiental: VALENTINA BLANCO (se vinculó desde el 01 de julio)
Salario: $ 4,374,489
Dedicación: 100%
Numero de meses: 6

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSION	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
JUNIO/2025	9488889568	$175.000	$700.000	$190.300	$1.605.300
JULIO/2025	9491081162	$175.000	$700.000	$190.300	$1.605.300
AGOSTO/2025	9491425741	$175.000	$700.000	$190.300	$1.605.300

Profesional de campo: SHEILA SANABRIA (se vinculó desde el 01 de junio) RETIRADA
Salario: $ 2,258,174
Dedicación: 100%
Numero de meses: 4

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSION	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
JUNIO/2025	9488889568	$90.400	$361.400	$98.300	$550.100

Profesional de campo: KAROL ALMEYDA (se vinculó desde el 01 de julio) fue reemplazada por la Ing. Sheila Catalina debido a que tuvo que retirarse por nombramiento por concurso de la Comisión Nacional del servicio civil RETIRADA
Salario: $ 2,258,174
Dedicación: 100%
Numero de meses: 4

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSION	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
JULIO/2025	9491081162	$90.400	$361.400	$98.300	$550.100

Profesional de campo: MICHAEL CARVAJAL (se vinculó desde el 01 de agosto) fue reemplazado por la Ing. Karol Almeyda, debido a renuncia voluntaria.
Salario: $ 2,258,174
Dedicación: 100%
Numero de meses: 4

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSION	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
AGOSTO/2025	9491425741	$90.400	$361.400	$98.300	$550.100

Profesional de campo: VALENTINA TURIZO (se vinculó desde el 01 de junio)
Salario: $ 2,258,174
Dedicación: 100%
Numero de meses: 4

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSION	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
JUNIO/2025	9488889568	$90.400	$361.400	$98.300	$550.100
JULIO/2025	9491081162	$90.400	$361.400	$98.300	$550.100
AGOSTO/2025	9491425741	$90.400	$361.400	$98.300	$550.100

Profesional de campo: LYDA VARGAS (se vinculó desde el 01 de junio)
Salario: $ 2,258,174
Dedicación: 100%
Numero de meses: 4

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSION	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
JUNIO/2025	9488889568	$90.400	$361.400	$98.300	$550.100
JULIO/2025	9491081162	$90.400	$361.400	$98.300	$550.100
AGOSTO/2025	9491425741	$90.400	$361.400	$98.300	$550.100

Profesional de campo: IVONNE MARTINEZ (se vinculó desde el 01 de julio) RETIRADA
Salario: $ 2,258,174
Dedicación: 100%
Numero de meses: 4

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSION	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
JULIO/2025	9491081162	$90.400	$361.400	$98.300	$550.100

Profesional de campo: CARLOS GOMEZ (se vinculó desde el 01 de agosto) fue reemplazada por la Ing. Ivonne Martínez, debido a renuncia voluntaria.
Salario: $ 2,258,174
Dedicación: 100%
Numero de meses: 4

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSION	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
AGOSTO/2025	9491425741	$90.400	$361.400	$98.300	$550.100

Profesional de campo: JORGE ACEVEDO (se vinculó desde el 01 de julio)
Salario: $ 2,258,174
Dedicación: 100%
Numero de meses: 4

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSION	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
JULIO/2025	9491081162	$90.400	$361.400	$98.300	$550.100
AGOSTO/2025	9491425741	$90.400	$361.400	$98.300	$550.100

Profesional de campo: MARIA LILIANA SANABRIA
Salario: $ 2,258,174
Dedicación: 100%
Numero de meses: 4

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSION	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
JULIO/2025	9491081162	$90.400	$361.400	$98.300	$550.100
AGOSTO/2025	9491425741	$90.400	$361.400	$98.300	$550.100

Auxiliar administrativo: CRISTIAN GOMEZ
Salario: $ 2,100,318
Dedicación: 60%
Numero de meses: 7

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSION	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
MAYO/2025	9487615906	$1.900	$7.600	$2.100	$11.600
JUNIO/2025	9488889568	$57.000	$227.800	$62.000	$346.800
JULIO/2025	9491081162	$57.000	$227.800	$62.000	$346.800
AGOSTO/2025	9491425741	$57.000	$227.800	$62.000	$346.800

4. Obligaciones Contractuales.

Por medio del presente se deja constancia que las actividades realizadas durante el periodo de pago son:

Actividades y cantidades ejecutadas					
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Documento de análisis de información existente	1	UND	$12.499.847,21	$12.499.847,21
2	Documento de recopilación de información hidrometeorológica	1	UND	$ 6.249.923,6	$ 6.249.923,6
3	Documento y GDB base cartográfica	1	UND	$ 6.249.923,6	$ 6.249.923,6
4	Documento de identificación preliminar de usuarios	1	UND	$18.749.770,81	$18.749.770,81
5	Documento de identificación de conflictos del recurso hídrico	1	UND	$ 6.249.923,6	$ 6.249.923,6

Actividades y cantidades ejecutadas					
No.	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
6	Plan operativo	1	UND	$ 6.249.923,6	$ 6.249.923,6
7	Visita ocular y censo de usuarios	1	UND	$101.248.762,37	$101.248.762,37

5. Balance Financiero

VALOR DEL CONTRATO:	$ 657.154.201,18
DURACIÓN DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO	30/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	29/12/2025
VALOR ACTA RECIBO No. 1	$ 187.422.709
SALDO POR PAGAR:	$ 469.731.492,18

El valor total ejecutado a la fecha equivale a **CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS ($ 187.422.709) M/CTE.** correspondiente a una ejecución física y financiera del 28,5% del objeto contractual.

Así mismo, bajo la gravedad de juramento el SUPERVISOR certifica que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y el pago de los aportes al sistema de seguridad social y Fondo de Pensiones, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002**. Anexo informe contable y planillas de pago Seguridad social.**

6. Seguimiento al Control Ambiental:

IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA	MEDIDA DE CONTROL REALIZADA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO

7. Seguimiento al Control de Riesgos:

RIESGOS Y PELIGROS EN EL PROYECTO	MEDIDAS DE CONTROL SOLCITADAS	MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO

En consecuencia, con base en los informes presentados por el Contratista, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander, el INTERVENTOR CERTIFICA el cumplimiento del contrato a satisfacción, en el periodo mencionado, y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de San Gil, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año 2025.

SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACIÓN INGENIERÍA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO – INGENIART

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1**
Proceso de Contratacion: CM2-001-2025		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 20/07/2025 — **ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCIÓN**

CONTRATO No: 00615 DE 2025 — **TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA**

CONTRATISTA: UT LA CAÑADA

Nit o C.C. No. **901950503-7** — **No. DE INFORME: 1**

OBJETO: **ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS SOPORTE PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS EN LA CORRIENTE HÍDRICA QUEBRADA LA CAÑADA Y SUS TRIBUTARIOS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER.**

VALOR INICIAL: $657.154.201,18 — **VALOR ADICIONAL: $0,00**

PLAZO CONTRATO: SIETE (7) MESES — **PLAZO ADICIONAL:** **NA**

SUPERVISOR: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

CARGO SUPERVISOR: SUBDIRECTOR (E) DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

INTERVENTOR: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO

FECHA INICIO DEL CONTRATO: **2025-05-30**

FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA	**X**	**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	
FECHA DE REINICIO:	NO APLICA	**X**	**TIEMPO DE PRORROGAS:**	
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	**2025-12-29**	**2025-12-29**	**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	

PERIODO DEL INFORME: 30/05/2025 - 29/06/2025

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
FASE I DECLARATORIA Y ACTIVIDADES PREVIAS Documento de análisis de información existente Documento de Recopilación de información hidrometereológica Documento y GDB base cartográfica Documento de identificación preliminar de usuarios Documento de identificación de conflictos del Recurso Hídrico Plan Operativo Declaratoria Aviso mapa inicial de usuarios del recurso hídrico a partir de información secundaria (suministrada por la CAS	$ 657,154,201.18	$ 0.00	$ 0.00	SIETE (7) MESES	Un (1) mes	10.19%	0.00%

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHADEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
	ACTA DE INICIO	2025-05-30	94-44-101197333	2025-12-29	$ 0.00	$ 657,154,201.18	$ 0.00	

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

1) Durante el periodo de ejecución del Contrato de Consultoría “Actualización de los estudios soporte para la reglamentación del uso de las aguas en la corriente hídrica quebrada la cañada y sus tributarios en jurisdicción del municipio de Los Santos, Santander”, se han desarrollado cinco (5) reuniones de seguimiento con las CAS y la Interventoría que permiten conocer el avance de las fases que comprende el proyecto. A continuación se mencionan los espacios desarrollados:

Acta No. 1 - 10 de junio de 2025- Seguimiento Contrato de Consultoría 00615-2025
Acta No. 2 - 11 de junio de 2025- Realizar la recolección de información disponible en los archivos de la sede principal de la Corporación Autónoma Regional de Santander.
Acta No. 3 - 13 de junio de 2025- Comité técnico Contrato de Consultoría 00615-2025
Acta No. 4 - 17 de junio de 2025- Visita ocular quebrada La Cañada – Los Santos (Santander)
Acta No. 5 - 20 de junio de 2025- Mesa Técnica de Seguimiento Contractual – Contratos 615-2025 y 616-2025.

2) Con el presente informe de avance, la UT La Cañada realiza la entrega de los productos de la Fase I – Declaratoria y actividades previas, que comprende la localización del cuerpo de agua, recopilación de información existente, redes hidrometereológicas, y cartografía base, así como la identificación preliminar de usuarios, revisión de conflictos del recurso hídrico, y finalmente la formulación del plan operativo. De acuerdo al cronograma del proyecto el avance de ejecución a la fecha es 10,19%.

3) La CAS en conjunto con la UT La Cañada, han desarrollado actividades en el área de estudio en relación con una visita ocular y un espacio de participación con las Juntas de Acción Comunal -JAC, con el objetivo de conocer e interactuar con los actores involucrados en el proceso de actualización de la reglamentación, así como los diferentes aspectos que convergen para el desarrollo de cada de una de las fases.

SANDRA JUDITH CASILLO PATIÑO
CORPORACIÓN INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO
INTERVENTOR

EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
SUBDIRECTOR (E) DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

Apoyo a la supervisión **Ing. RODOLFO SANCHEZ RUIZ**
Ing. MARIA ANGELICA MOLINA
Ing. OSCAR JAVIER LEAL GUERRERO


ANEXO: SOPORTE DE AVANCE


1) Desarrollo de mesas técnicas











2) Entrega productos de la Fase I – Declaratoria y actividades previas

UT LA CAÑADA

LC-007-2025

Bucaramanga, 03 de julio de 2025.


Señores
CORPORACIÓN INGENIERÍA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO – INGENIART
Att. Sandra Judith Castillo Patiño
Representante Legal
Interventoría Contrato de Consultoría No 00615-2025

Asunto: Entrega del informe de Avance Mensual No. 1 - Contrato de Consultoría No 00615-2025.

Cordial saludo,

En el marco del desarrollo del Contrato de Consultoría No. 00615-2025, cuyo objeto es la ***"Actualización de los estudios soporte para la reglamentación del uso de las aguas en la corriente hídrica quebrada La Cañada y sus tributarios en jurisdicción del municipio de Los Santos, Santander"***, la Unión Temporal LA CAÑADA se permite informar a la Interventoría INGENIART la entrega del **Informe de Avance Mensual No. 1**, correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de mayo y el 29 de junio de 2025, el cual incluye los productos de la **Fase I – Declaratoria y Actividades Previas**.

El informe, junto con sus respectivos anexos, puede ser consultado en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1LHrTjCzcAQLxEzUo31o2zu2XZRvbfCQG?usp=sharing



UT LA CAÑADA
Correo: utlacanadacas@gmail.com
Contacto: 3167101815

UT LA CAÑADA

Los documentos anexos que hacen parte de este primer informe son los siguientes:

- Anexo 1 – Seguridad Social
- Anexo 2 – Actas del Contrato de Consultoría
- Anexo 3 – Relación de Correspondencia
- Anexo 4 – Documento de Análisis de Información Existente
- Anexo 5 – Documento de Recopilación de Información Hidrometeorológica
- Anexo 6 – Documento y GDB Base Cartográfica
- Anexo 7 – Documento de Identificación Preliminar de Usuarios
- Anexo 8 – Documento de Identificación de Conflictos del Recurso Hídrico
- Anexo 9 – Plan Operativo
- Anexo 10 – Documento de Declaratoria
- Anexo 11 – Aviso
- Anexo 12 – Mapa Inicial de Usuarios del Recurso Hídrico
- Anexo 13 - Cronograma


Para cualquier duda, observación o sugerencia, quedamos atentos a través del número de contacto 300 223 8891 o al correo electrónico utlacanadacas@gmail.com.


Atentamente,

DIEGO ALEJANDRO GARCIA MONSALVE
Representante Legal
UT La Cañada

UT LA CAÑADA
Correo: utlacanadacas@gmail.com
Contacto: 3167101815









Bucaramanga 5A

Este trabajo se realizó con especialistas en movilidad y será gratis

Expertos entregarán estudio para mejorar operación de **Metrolínea**


Una propuesta técnica y con el propósito de salvar lo poco que queda de Metrolínea y hacer de este sistema de transporte público masivo un servicio real, eficiente y beneficio para los usuarios.

Por una migración digna y segura en todo el mundo

Día Mundial del Refugiado se conmemoró en Bucaramanga

Garantías de derechos y políticas públicas en Bucaramanga

Universidades apoyaron **Comité de Discapacidad**

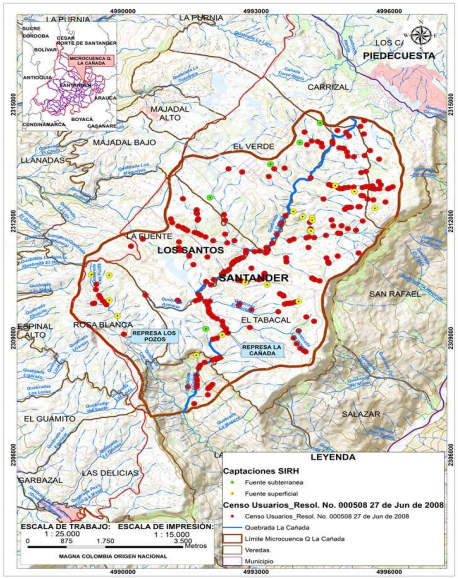

3) Visita ocular y un espacio de participación con las Juntas de Acción Comunal -JAC







Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co
