CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG

CONTRATO DE OBRA No. LP-005-2023.

CONTRATISTA:



CONTRATO No. LP-005-2023.

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".

INFORME MES DE FEBRERO DE 2026

FEBRERO 2026.

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE POR:	NÚMERO DE REVISIÓN		
	0	1	2
Elaboración	Ing. Edilberto G. Roys Corzo.		
			
	Residente de Obra		
Revisión	Ing. Ángel M. Vizcaíno Escobar.		
			
	Director de Obra		
Aprobación	Ing. Francisco A. Fernández Saltaren.		
			
	Director de Interventoría		

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DEPENDENCIA	No. COPIAS	FECHA DE ENVÍO	OBSERVACIONES
CORPAMAG	1		
Interventores e ingeniería S.A.S	1		

CUADRO DE MODIFICACIONES

ÍNDICE DE REVISIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

1. INTRODUCCIÓN 6
1.1 Estado detallado del contrato 6
1.2 Estado de las garantías del proyecto 6
1.3 información técnica general 7
2. FICHA PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 8
3. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 11
3.1 Localización general 11
3.2 Localización general del sector a intervenir 12
3.2.1 Localización del caño El Salado 12
4. ALCANCE CONTRACTUAL DE LAS ACTIVIDADES 13
4.1 Movilización y desmovilización. 13
4.2 Remoción mecánica de sedimentos incluye trazado y replanteo 13
4.3 Localización, trazado y replanteo topográfico 13
4.4 Excavación manual. Incluye cargue, retiro y explanación lateral del material de excavación. 13
4.5 Concreto F'c 3.000 PSI (21 MPa) para solado de limpieza y nivelación de fondo de cimentación e=0.05m. Incluye: Transporte de materiales. 14
4.6 Construcción de box culvert en concreto reforzado de 4.000 PSI (28 MPa) con baja permeabilidad 14
4.7 Suministro, corte, figuración y armado de acero de refuerzo grado 60 con Fy 60.000 PSI (420 Mpa). Incluye: Transporte. 14
4.8 Concreto F'c 4.000 PSI (28 MPa) para construcción de losas de aproximación. Incluye: formaletería, desencofre, y transporte de materiales. 14
4.9 Aislamiento al área de objeto de la restauración ecológica. 14
4.10 Establecimiento de la estrategia de restauración ecológica. 15
4.11 Mantenimiento al material vegetal establecido. 15
4.12 Salvamento de fauna acuática y terrestre. 15
4.13 Implementación de estrategia de sensibilización y participación ambiental dirigido a la comunidad en la zona de influencia del proyecto. 15
4.14 Mantenimiento preventivo de estación de monitoreo. 15
4.15 Actividades proyectadas para el año 2025. 15
5. AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO EN LA VIGENCIA 2025. 16
6. MODIFICACIONES 17
6.1 Diseño 17
6.2 Valor de obra 18
7. RECURSOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE 18
7.1 Personal 18

7.1.1 Personal previo al inicio de la ejecución de los trabajos 19
7.2 Maquinaria y equipos 19
7.3 Equipo de contingencia 20
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 20
8.1 Levantamiento topográfico..... 20
8.2 Informe de gestión ambiental..... 20
8.3 Informe de seguridad y salud en el trabajo (SST)..... 20
8.4 Informe de gestión social 20
8.5 Salvamento de fauna acuática y terrestre..... 20
8.6 Informe de jornadas de sensibilización 20
9. ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO..... 20
10. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO 21
10.1 Actividades generales 21
10.1.1 Ítem 1.1 Movilización y desmovilización de equipos, unidad: unidad. 21
10.1.2 Ítem 4.2 Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto. Unidad: unidad……..21
10.2 Actividades de obra 22
10.2.1 ÍTEM 2.2, Remoción mecánica de sedimentos, Unidad: m3 22
10.2.2 ÍTEM 2.10, Localización, trazado y replanteo topográfico. 22
10.2.3 ÍTEM 2.11, Excavación manual. Incluye: Cargue, retiro y explanación lateral del material de excavación. 22
10.2.4 ÍTEM 2.12, Concreto F’c 3.000 psi (21 MPa) para solado de limpieza y nivelación de fondo de cimentación e=0.05m. Incluye transporte de materiales... 23
10.2.5 ÍTEM 2.13, Construcción de box culvert en concreto reforzado de 4.000 psi (28 Mpa) con baja permeabilidad (Incluye: transporte de materiales. No incluye: Acero de refuerzo)..... 23
10.2.6 ÍTEM 2.14, Suministro, corte, figuración y armado de acero de refuerzo grado 60 con Fy 60.000 psi (420 Mpa). Incluye transporte. 23
10.2.7 ÍTEM 2.15, Concreto de F’c 4.000 psi (28 Mpa) para construcción de losas de aproximación. Incluye: Formaletería, desencofre y transporte de materiales. . 23
10.2.8 ÍTEM 3.1, Aislamiento del área de objeto de la restauración ecológica, Unidad: Ha……..24
10.2.8 ÍTEM 3.2, Establecimiento de la estrategia de restauración ecológica, Unidad: Ha……..24
10.2.9 ÍTEM 3.3, Mantenimiento de material vegetal establecido, Unidad: Ha. 24

10.2.10 ÍTEM 4.5, Mantenimiento preventivo de estación de monitoreo, Unidad: Ha……24
10.2.11 ÍTEM 4.1, Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre, Unidad: Mes. 25
10.3 Tiempo transcurrido..... 25

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Detalle de garantías del proyecto en la vigencia 2025. 7
Tabla 2. Información Técnica General 7
Tabla 3. Ficha programa de Intervención Inicial Vigencia 2025. 8
Tabla 4. Ficha programa de Intervención Vigencia 2024. 9
Tabla 5. Cantidades actualizadas en acta de mayores y menores cantidades. 10
Tabla 6. Cantidades de obra actualizadas de vigencia 2024. 16
Tabla 7. Cantidades de obra actualizadas para vigencia 2025. 16
Tabla 8. Avance financiero programado vs ejecutado en la vigencia 2025. 17
Tabla 9. Presupuesto inicial del contrato. 18
Tabla 10. Personal empleado durante la vigencia 2025..... 19
Tabla 11. Dedicación del personal empleado durante la vigencia 2025..... 19
Tabla 12. Maquinaria y equipos durante la vigencia 2025. 19

ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1. Localización General Ciénaga Grande de Santa Marta. 11
Ilustración 2. Caño Hondo Localización general 12

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Avance Programado Vs Ejecutado 21

1. INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, suscribió con CONSORCIO CGSM4 el Contrato de Obra No. LP-005-2023 para realizar las obras de “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES” Igualmente, celebró el Contrato de interventoría No. CM-008-2023 con INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S., para realizar la Interventoría al presente proyecto; como Supervisor del Contrato, fue designada la ingeniera Katty Paola Amaya Brieva funcionaria de CORPAMAG.

El contrato consta de una duración de 146 meses, por lo cual se desarrollará por medio de vigencias que se renovarán anualmente en año calendario, en este informe de obra se registra las actividades desarrolladas por el CONSORCIO CGSM4 en el periodo del mes de febrero de 2026, correspondiente a la vigencia 2025, acorde a la programación de actividades emitida por CORPAMAG.

Hasta la fecha el Contrato no ha tenido adiciones, otrosí o modificaciones.

1.1 Estado detallado del contrato

A fecha de elaboración del presente informe se han presentado los siguientes cambios:

- Suspensiones: No se han presentado suspensiones en el contrato.
- Reinicios: No se han presentado reinicios en el contrato.
- Prórrogas: No se han aprobado prórrogas para el contrato.
- Adiciones: No se han realizado adiciones.

1.2 Estado de las garantías del proyecto

A fecha de elaboración del presente informe las garantías del proyecto se encuentran actualizadas. En la tabla 1 se presenta el detalle de las garantías del proyecto, correspondientes a la vigencia 2025.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO			
Póliza de cumplimiento	CG-1064217		
Expedida por	Compañía Mundial de Seguros S.A		
Fecha de expedición	7/05/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha inicial	Fecha final	
Cumplimiento de Contrato	11/03/2025	30/09/2026	$ 757.582.566,70
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	11/03/2025	11/03/2029	$ 378.791.283,35
Estabilidad de las obras	11/03/2026	11/03/2028	$ 236.718.812,00
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual	400063973		
Expedida por	Nacional de Seguros		
Fecha de expedición	8/05/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha inicial	Fecha final	
Responsabilidad Civil Extracontractual	11/03/2025	11/03/2026	$ 711.750.000,00

Tabla 1. Detalle de garantías del proyecto en la vigencia 2025.

1.3 información técnica general

CONTRATO DE OBRA:	No. LP-005-2023
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".
LOCALIZACIÓN:	Departamento del Magdalena
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATISTA:	Consorcio CGSM4
INTERVENTORÍA:	Interventores e Ingeniería S.A.S
NIT CONSORCIO CGSM4:	901.782.967-1
VALOR INICIAL:	$ 340.466.351.223,00
PLAZO INICIAL:	146 meses
FIRMA DEL CONTRATO:	26 de diciembre de 2023
ACTA DE INICIO:	11 de marzo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 de mayo de 2036
VALOR A EJECUTAR VIGENCIA 2025:	$ 7.575.825.667,00
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO:	15,19%
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO VIGENCIA 2025:	75,01%
PRORROGA:	NINGUNA

Tabla 2. Información Técnica General

2. FICHA PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

CORPAMAG, realizó el siguiente cuadro resumen de la intervención para el Contrato No. LP-005-2023 del 26 de diciembre de 2023 de los Principales Ítems de pago.

A continuación, se presentan las actividades correspondientes a condiciones iniciales para la vigencia 2025.

AÑO 2 (2025)

AÑO 2025			
ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**PRELIMINARES**		
1.1	Movilización y desmovilización de equipos	und	2,00
2	**MANTENIMIENTO HIDRÁULICO**		
2.1	Remoción Hidráulica de Sedimentos Mediante el uso de Draga Cortadora de Succión y Disposición de material en piscina de sedimentos por medio de tubería. Incluye: Seguimiento y Control Topobatimétrico.	m3	77.713,01
2.2	Remoción Mecánica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora Brazo Largo y Explanación Lateral del Material sobrante de la Remoción. Incluye: Seguimiento y Control Topobatimétrico.	m3	20.000,00
2.3	Cargue, Retiro y Disposición Final de Material proveniente del Dragado y Excavaciones. Incluye: Disposición en Escombrera Autorizada.	m3	34.560,00
2.5	Limpieza de vegetación flotante y/o macrófitas. Incluye explaneación lateral de material vegetal.	m2	10.000,00
2.6	Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil. Incluye: Relleno con Material Proveniente de la Excavación, Formaletería y Costuras.	m3	7.245,00
2.7	Manto Antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye: Inyección de Arena proveniente de la excavación en Lastre Inferior.	m2	2.700,00
2.8	Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50.	m2	8.437,50
2.9	Geotextil Tejido de Poliéster.	m2	6.187,50
3	**REHABILITACIÓN ECOLÓGICA**		
3.1	Aislamiento al Área Objeto de la Restauración Ecológica.	ha	20,00
3.2	Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica.	ha	20,00
3.3	Mantenimiento al Material Vegetal Establecido.	ha	40,00
4	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**		
4.1	Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre	mes	8,00
4.2	Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto.	und	1,00
4.5	Mantenimiento Preventivo Estación de Monitoreo.	und	5,00

Tabla 3. Ficha programa de Intervención Inicial Vigencia 2025.

Durante la vigencia 2023 - 2024 (Año 1) se realizaron actividades relacionadas en la tabla 4.

AÑO 1 (2023 - 2024):

AÑO 2024			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**PRELIMINARES**		
1.1	Movilización y desmovilización de equipos	und	2,00
2	**MANTENIMIENTO HIDRÁULICO**		
2.1	Remoción Hidráulica de Sedimentos Mediante el uso de Draga Cortadora de Succión y Disposición de material en piscina de sedimentos por medio de tubería. Incluye: Seguimiento y Control Topobatimétrico.	m3	0,00
2.2	Remoción Mecánica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora Brazo Largo y Explanación Lateral del Material sobrante de la Remoción. Incluye: Seguimiento y Control Topobatimétrico.	m3	151.799,53
2.3	Cargue, Retiro y Disposición Final de Material proveniente del Dragado y Excavaciones. Incluye: Disposición en Escombrera Autorizada.	m3	0,00
2.6	Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil. Incluye: Relleno con Material Proveniente de la Excavación, Formaletería y Costuras.	m3	1.740,00
2.7	Manto Antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye: Inyección de Arena proveniente de la excavación en Lastre Inferior.	m2	800,00
2.8	Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50.	m2	2.964,00
2.9	Geotextil Tejido de Poliéster.	m2	1.280,00
3	**REHABILITACIÓN ECOLÓGICA**		
3.1	Aislamiento al Área Objeto de la Restauración Ecológica.	ha	20,00
3.2	Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica.	ha	20,00
3.3	Mantenimiento al Material Vegetal Establecido.	ha	0,00
4	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**		
4.1	Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre	mes	1,00
4.2	Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto.	und	1,00
4.3	Estación Hidrológica de Monitoreo Automática.	und	1,00
4.5	Mantenimiento Preventivo Estación de Monitoreo.	und	4,00

Tabla 4. Ficha programa de Intervención Vigencia 2024.

El día 21 de octubre se suscribió el acta de mayores y menores cantidades para la vigencia 2025, obteniendo las siguientes cantidades actualizadas.

AÑO 2024			
ITEM DE PAGO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
3	**REHABILITACIÓN ECOLÓGICA**		
3.3	Mantenimiento al Material Vegetal Establecido.	Ha	20,00
AÑO 2025			
1	**PRELIMINARES**		
1.1	Movilización y desmovilización de equipos	und	2,00
2	**MANTENIMIENTO HIDRÁULICO**		
2.2	Remoción Mecánica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora Brazo Largo y Explanación Lateral del Material sobrante de la Remoción. Incluye: Seguimiento y Control Topobatimétrico.	m3	113.159,10
2.10	Localización, trazado y replanteo topográfico	m2	937,00
2.11	Excavación manual. Incluye: Cargue, retiro y explanación lateral del material de excavación.	m3	522,65
2.12	Concreto F'c 3.000 PSI (21 Mpa) para solado de limpieza y nivelación de fondo de cimentación e=0,05m. Incluye transporte de materiales.	m2	971,65
2.13	Construcción de Box Culvert en concreto reforzado de 4.000 PSI (28 Mpa) con baja permeabilidad. (Incluye: transporte de materiales. No incluye: Acero de refuerzo)	m3	770,67
2.14	Suministro, corte, figuración y armado de acero de refuerzo grado 60 con Fy 60.000 PSI (420 PSI). Incluye transporte.	kg	74.268,12
2.15	Concreto F'c 4.000 PSI (28 Mpa) para construcción de losas de aproximación. Incluye: Formaletería, desencofre, y transporte de materiales.	m3	20,00
3	**REHABILITACIÓN ECOLÓGICA**		
3.1	Aislamiento al Área Objeto de la Restauración Ecológica.	ha	20,00
3.2	Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica.	ha	20,00
3.3	Mantenimiento al Material Vegetal Establecido.	ha	40,00
4	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**		
4.1	Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre	mes	6,00
4.2	Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto.	und	1,00
4.5	Mantenimiento Preventivo Estación de Monitoreo.	und	4,00

Tabla 5. Cantidades actualizadas en acta de mayores y menores cantidades.

3. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

3.1 Localización general

La Ciénaga Grande de Santa Marta se localiza al norte del país en el extremo noroccidental del departamento del Magdalena, su área de influencia está comprendida entre el nacimiento del caño Schiller en la Ciénaga de Cerro de San Antonio al sur, el río Magdalena por el oeste, el Mar Caribe al norte y al este por la desembocadura de los ríos Fundación, Aracataca, Sevilla y Frío que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

La ciénaga Grande de Santa Marta es la laguna costera más grande del país con una extensión lagunar de 430 km2, cuenta con una sola conexión con el mar Caribe a través del puente de la barra y está conectada al complejo lagunar del pajaral por intermedio de caños que permiten a su vez intercomunicación con el río Magdalena.

Ilustración 1. Localización General Ciénaga Grande de Santa Marta.



3.2 Localización general del sector a intervenir

Específicamente el área de la Ciénaga Grande que se pretende intervenir durante la vigencia del año 2025 es el caño Hondo, localizado en el Municipio de Salamina (Magdalena).

El municipio de Salamina se localiza en Colombia, en el Departamento del Magdalena, pertenece a la región geográfica de la ciénaga Grande del Magdalena, fue fundado en 1765, se encuentra ubicado al Centro del departamento del Magdalena, localizado a los 10° 29`25" de latitud norte y 74° 47`38" de longitud al oeste de Greenwich, comprende una extensión de 175 Km2 que equivale al 0.75% del área departamental y al 0.015% del total nacional, su altura sobre el nivel del mar es de 3m, dista 173.3 Km con la ciudad de Santa Marta (Capital del Departamento) y a 75.5 Km del distrito de Barranquilla. Su relieve está caracterizado por poseer un territorio bajo plano y cenagoso, bañado por algunos caños convirtiéndose en una inmensa llanura de inundaciones que contienen depósitos de terraza aluvial generándose una terraza ligeramente inclinada.

3.2.1 Localización del caño El Salado

El caño Hondo es un conector del Río Magdalena y del complejo Estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta, el cual se localiza en el delta exterior del río Magdalena, en el municipio de Salamina sobre la margen derecha del Rio Magdalena, a unos 1,9 kilómetros de distancia, aguas abajo, de la Cabecera municipal de Salamina y con una longitud aproximada de 17.5 kilómetros desde su embocadura sobre el río Magdalena, hasta su intercepción con el caño Martinica.

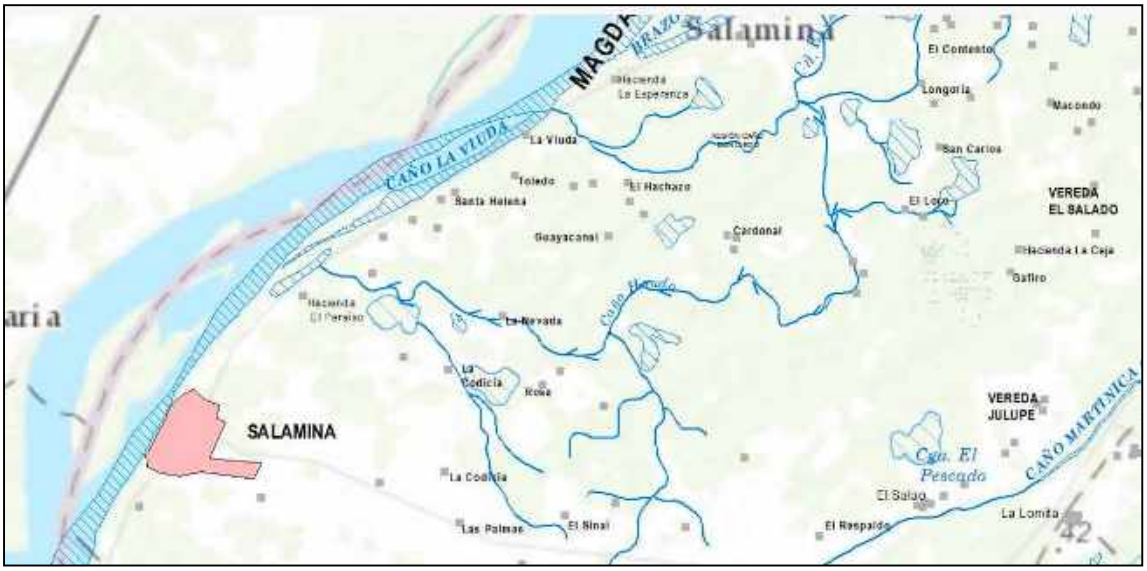


Ilustración 2. Caño Hondo Localización general

4. ALCANCE CONTRACTUAL DE LAS ACTIVIDADES

Las principales actividades y/o obras a ejecutar son las siguientes, las cuales incluyen tanto las contempladas en el presupuesto inicial como aquellas incorporadas mediante el acta de mayores y menores cantidades en los ítems no previstos:

4.1 Movilización y desmovilización.

Se suministra el equipo necesario en los frentes de trabajo, para realizar las obras, cuyo transporte se realiza por vía terrestre o vía fluvial; por vía terrestre utilizando las vías de acceso que intercomunican la ciudad de origen de las máquinas con el frente de trabajo y por vía fluvial utilizando los ríos y caños que permitan el acceso de la maquinaria. Para la desmovilización o retiro de toda la maquinaria o equipo del frente de trabajo, se utilizan los medios de transporte descritos anteriormente.

4.2 Remoción mecánica de sedimentos incluye trazado y replanteo.

Se realiza la ubicación, nivelación y control topográfico permanente de las obras por ejecutar, siguiendo lo establecido en los planos de diseño suministrados al proyecto, de tal manera que ocupen la posición indicada con relación a las obras existentes y los accidentes topográficos, una vez materializado el trazado se realiza la extracción de los sedimentos, del lecho o cauce del caño mediante procesos mecánico, aumentando la sección hidráulica de los mismos, utilizando para esta labor equipo retroexcavadoras, dando así un estricto cumplimiento a los diseños, especificaciones técnicas, plan de dragado y Plan de Manejo Ambiental.

4.3 Localización, trazado y replanteo topográfico

Consiste en todas las actividades de precisión la que permiten la localización planimétrica y altimétrica de las obras objeto del contrato, con el fin de establecer los puntos y ejes dados como referencia necesarios para la correcta ejecución de los diseños, así como la nivelación y control topográfico inicial de las obras por ejecutar, siguiendo las referencias del proyecto suministrado, de tal manera que ocupen la posición indicada con relación a las obras existentes y los accidentes topográficos.

4.4 Excavación manual. Incluye cargue, retiro y explanación lateral del material de excavación.

Esta actividad comprende la ejecución de toda clase de excavaciones manuales necesarias para la construcción de las obras de acuerdo con las líneas, pendientes y profundidades indicadas en los planos o requeridas durante el proceso constructivo.

4.5 Concreto F'c 3.000 PSI (21 MPa) para solado de limpieza y nivelación de fondo de cimentación e=0.05m. Incluye: Transporte de materiales.

Esta actividad contempla el suministro, transporte y colocación de concreto de limpieza con bajo contenido de cemento, puede ser premezclado o mezclado en obra; que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger, emparejar y mantener limpias las superficies del piso de cimentación de cualquier tipo de contaminación o la alteración de las condiciones iníciales del terreno. Este elemento se construye en una capa de concreto de 5.0 cm de espesor.

4.6 Construcción de box culvert en concreto reforzado de 4.000 PSI (28 MPa) con baja permeabilidad.

Esta actividad se refiere a la Construcción de Box Culvert en Concreto Reforzado de 4.000 Psi (28MPa) con Baja Permeabilidad (Incluye: Transporte de Materiales. No incluye Acero de Refuerzo), en los lugares donde los planos estructurales así lo indiquen; el concreto se colocará en capas horizontales que no excedan una altura de cincuenta (50) centímetros con una continuidad tal que las superficies de concreto aun no terminadas no se endurezcan ni se permita la aparición de grietas en las uniones.

4.7 Suministro, corte, figuración y armado de acero de refuerzo grado 60 con Fy 60.000 PSI (420 Mpa). Incluye: Transporte.

En esta actividad se realizará el suministro, corte, figuración, amarre y colocación del acero de refuerzo de 60.000 PSI para los elementos estructurales en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. Se incluye en esta actividad el alambre de amarrar.

4.8 Concreto F'c 4.000 PSI (28 MPa) para construcción de losas de aproximación. Incluye: formaletería, desencofre, y transporte de materiales.

Esta actividad se refiere a la losa de aproximación en Concreto Reforzado de 4.000 Psi (28MPa) con Baja Permeabilidad (Incluye: Formaletería, desencofre y Transporte de Materiales. No incluye Acero de Refuerzo), en los lugares donde los planos estructurales así lo indiquen; el concreto se colocará en capas horizontales que no excedan una altura de cincuenta (50) centímetros con una continuidad tal que las superficies de concreto aun no terminadas no se endurezcan ni se permita la aparición de grietas en las uniones.

4.9 Aislamiento al área de objeto de la restauración ecológica.

Delimitar con algún tipo de barrera física a las zonas objeto de restauración, restringiendo el tráfico de personas, vehículos o animales. Generalmente las barreras de aislamiento son realizadas a partir de cercas de alambre de púas, para las cuales se colocan estacones cada cierta distancia.

4.10 Establecimiento de la estrategia de restauración ecológica.

Esta estrategia contempla la siembra de individuos arbóreos, es usada principalmente cuando la sucesión vegetal presenta algunos factores que impiden su natural desarrollo y por lo tanto se emplea la misma para acelerar o apoyar dicho proceso.

4.11 Mantenimiento al material vegetal establecido.

Realizar labores silviculturales como la limpieza, plateo, podas de formación, control fitosanitario y fertilización, con el fin de favorecer y dar seguimiento a los individuos plantados. Esta actividad se pretende realizar cada tres meses paras las actividades antes mencionadas y para la fertilización, durante un periodo de nueve (9) meses después de la siembra, dichos mantenimientos están ubicados de acuerdo con el cronograma en el mes 6, mes 9 y mes 12. Se contempla también la actividad de riego para la plantación cuando se encuentren ausentes las lluvias.

Luego de estos nueve (9) meses de mantenimiento, se espera que los individuos se muestren vigorosos y alcancen una altura prudente que les permita competir con pastos u otras plantas que desarrollen un rápido crecimiento.

4.12 Salvamento de fauna acuática y terrestre.

Esta actividad consiste en el ahuyentamiento y salvamento de la fauna que se encuentre amenazada durante la ejecución de las obras. Las actividades del dragado que se desarrollan sobre ecosistemas estratégicos (Manglares, eneales), pueden tener etapas como el descapote, remoción de la capa vegetal, remoción del suelo y procesos del dragado que pueden influir negativamente en la supervivencia de las especies.

4.13 Implementación de estrategia de sensibilización y participación ambiental dirigido a la comunidad en la zona de influencia del proyecto.

Es un componente que acompaña a los proyectos de restauración Hidráulica y Ambiental que se ejecutan desde la Corporación Autónoma Regional del Magdalena. Este contempla jornadas educativo-ambiental, que buscan promover la conservación y protección de los cuerpos de agua, utilizando como mecanismo la educación ambiental no formal.

4.14 Mantenimiento preventivo de estación de monitoreo.

Esta actividad consiste en la revisión, calibración, ajustes, limpieza y descarga de información de cada uno de los equipos que se encuentran en las estaciones de monitoreo, a las cuales se les realizará el mantenimiento preventivo.

4.15 Actividades proyectadas para el año 2025.

Durante la vigencia 2024 no se ejecutó el Ítem "*Mantenimiento al Material Vegetal Establecido*", correspondiente al costo total de $76.647.470,00, que representa un

1,39% del valor del contrato en el año 2024. Este valor será adicionado para ejecución en la presente vigencia.

A continuación, se muestra las cantidades de obra actualizadas para la presente vigencia.

AÑO 2024							MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ÍTEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	+ ó -	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR PARCIAL ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
III. REHABILITACIÓN ECOLÓGICA						$ 58.531.860,00			$ 58.531.860,00		$ 58.531.860,00
3.3	P - 3.3	Mantenimiento al material vegetal establecido	ha	20,0	$ 2.926.593,0	$ 58.531.860,00	0,00	20,00	$ 58.531.860,00	20,00	$ 58.531.860,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 58.531.860,00			$ 58.531.860,00		$ 58.531.860,00
		Administración			23,00%	$ 13.462.328,00			$ 13.462.328,00		$ 13.462.328,00
		Imprevistos			2,00%	$ 1.170.637,00			$ 1.170.637,00		$ 1.170.637,00
		Utilidad			5,00%	$ 2.926.593,00			$ 2.926.593,00		$ 2.926.593,00
		IVA (19%) sobre la Utilidad			19,00%	$ 556.052,67			$ 556.052,67		$ 556.052,67
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 18.115.610,67			$ 18.115.610,67		$ 18.115.610,67
		VALOR PPTO OBRA DEL PERÍODO 2024				$ 76.647.470,00			$ 76.647.470,00		$ 76.647.470,00

Tabla 6. Cantidades de obra actualizadas de vigencia 2024.

AÑO 2025							MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ÍTEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	+ ó -	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR PARCIAL ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
I. PRELIMINARES						$ 49.999.844,00			$ 49.999.844,00		$ 49.999.844,00
1.1	P - 1.1	Movilización y Desmovilización de Equipos	und	2,0	$ 24.999.922,0	$ 49.999.844,00	0,00	2,00	$ 49.999.844,00	2,00	$ 49.999.844,00
II. MANTENIMIENTO HIDRÁULICO						$ 4.757.183.011,00			$ 4.804.622.102,00		$ 4.804.622.102,32
2.2	P - 2.2	Remoción Mecánica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora Brazo Largo y Explanación Lateral del Material sobrante de la Remoción. Incluye: Seguimiento y Control Topobatimétrico.	m3	20.000,00	$ 19.639,00	$ 392.780.000,00	93.159,10	113.159,10	$ 2.222.331.531,00	113.159,10	$ 2.222.331.531,00
OBRAS DURAS											
2.10	NP - 2.10	Localización, Trazado y Replanteo Topográfico	m2	0,00	$ 4.319,00	$ 0,00	937,00	937,00	$ 4.046.903,00	937,00	$ 4.046.903,00
2.11	NP - 2.11	Excavación manual. Incluye: Cargue, Retiro y Explanación lateral del Material de Excavación	m3	0,00	$ 60.215,00	$ 0,00	522,65	522,65	$ 31.471.370,00	522,65	$ 31.471.370,00
2.12	NP - 2.12	Concreto de F'c 3.000 PSI (21 Mpa) para solado de limpieza y nivelación de fondo de cimentación e = 0.05 m. Incluye transporte de materiales	m2	0,00	$ 66.533,00	$ 0,00	971,65	971,65	$ 64.646.789,00	971,65	$ 64.646.789,00
2.13	NP - 2.13	Construcción de Box Culvert en Concreto Reforzado de 4.000 PSI (28 Mpa) Con Baja Permeabilidad (Incluye: Transporte de Materiales. No incluye Acero de Refuerzo	m3	0,00	$ 2.313.980,00	$ 0,00	770,67	770,67	$ 1.783.314.966,60	770,67	$ 1.783.314.966,60
2.14	NP - 2.14	Suministro, Corte, Figuración y armado de Acero de Refuerzo Grado 60 con Fy 60.000 PSI (420 PSI). Incluye Transporte	kg	0,00	$ 8.956,00	$ 0,00	74.268,12	74.268,12	$ 665.145.282,72	74.268,12	$ 665.145.282,72
2.15	NP - 2.15	Concreto de F'c 4.000 PSI (28 Mpa) para construcción de losas de aproximación. Incluye: Formaletería, desencofre y Transporte de Materiales	m3	0,00	$ 1.683.263,00	$ 0,00	20,00	20,00	$ 33.665.260,00	20,00	$ 33.665.260,00

ÍTEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	+ ó -	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR PARCIAL ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
III. REHABILITACIÓN ECOLÓGICA						$ 418.523.000,00			$ 418.523.000,00		$ 418.523.000,00
3.1	P - 3.1	Aislamiento al Área Objeto de la Restauración Ecológica	ha	20	$ 4.806.217,00	$ 96.124.340,00	0,00	20,00	$ 96.124.340,00	20,00	$ 96.124.340,00
3.2	P - 3.2	Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica	ha	20	$ 9.917.137,00	$ 198.342.740,00	0,00	20,00	$ 198.342.740,00	20,00	$ 198.342.740,00
3.3	P - 3.3	Mantenimiento al Material Vegetal Establecido	ha	40	$ 3.101.398,00	$ 124.055.920,00	0,00	40,00	$ 124.055.920,00	40,00	$ 124.055.920,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 5.225.705.855,00			$ 5.331.676.806,00		$ 5.331.676.806,00
		Administración			23,00%	$ 1.201.912.347,00			$ 1.226.285.665,00		$ 1.226.285.665,00
		Imprevistos			2,00%	$ 104.514.117,00			$ 106.633.536,00		$ 106.633.536,00
		Utilidad			5,00%	$ 261.285.293,00			$ 266.583.840,00		$ 266.583.840,00
		IVA (19%) sobre la Utilidad			19,00%	$ 49.644.206,00			$ 50.650.930,00		$ 50.650.930,00
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 1.617.355.963,00			$ 1.650.153.971,00		$ 1.650.153.971,00
		VALOR PPTO OBRA DEL PERÍODO 2025				$ 6.843.061.818,00			$ 6.981.830.777,00		$ 6.981.830.777,00
IV. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						$ 551.358.302,00			$ 499.155.370,00		$ 499.155.370,00
4.1	P - 4.1	Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre	mes	8,00	$ 19.004.991,00	$ 152.039.928,00	-2,00	6,00	$ 114.029.946,00	6,00	$ 114.029.946,00
4.2	P - 4.2	Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto	und	1,00	$ 328.353.624,00	$ 328.353.624,00	0,00	1,00	$ 328.353.624,00	1,00	$ 328.353.624,00
4.5	P - 4.5	Mantenimiento Preventivo Estación de Monitoreo	und	5,00	$ 14.192.950,00	$ 70.964.750,00	-1,00	4,00	$ 56.771.800,00	4,00	$ 56.771.800,00
		IVA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			19,00%	$ 104.758.077,00			$ 94.839.520,00		$ 94.839.520,00
		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CON IVA				$ 656.116.379,00			$ 593.994.890,00		$ 593.994.890,00
		VALOR PPTO OBRA DEL PERÍODO 2025				$ 7.499.178.197,00			$ 7.575.825.667,00		$ 7.575.825.667,00

Tabla 7. Cantidades de obra actualizadas para vigencia 2025.

5. AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO EN LA VIGENCIA 2025.

En la tabla No.9 se presenta el avance financiero programado para la vigencia 2025, de acuerdo con el programa de inversiones del proyecto.

PERIODO	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO			AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		
	Valor Programado	%Periodo	%Acumulado	Valor Ejecutado	%Periodo	%Acumulado
Marzo	$ -	0,00%	0,00%	$ -	0,00%	0,00%
Abril	$ 11.279.952,69	0,15%	0,15%	$ 11.279.953,00	0,15%	0,15%
Mayo	$ 14.269.204,11	0,19%	0,34%	$ 14.269.205,00	0,19%	0,34%
Junio	$ -	0,00%	0,34%	$ -	0,00%	0,34%
Julio	$ 17.861.424,16	0,24%	0,57%	$ 17.861.424,00	0,23%	0,57%
Agosto	$ 330.714.565,61	4,37%	4,94%	$ 330.714.566,00	4,37%	4,94%
Septiembre	$ 470.455.692,66	6,21%	11,15%	$ 470.455.691,00	6,21%	11,15%
Octubre	$ 410.459.826,32	5,42%	16,57%	$ 604.693.422,00	7,98%	19,13%
Noviembre	$ 951.103.209,61	12,55%	29,12%	$ 1.383.421.628,90	18,26%	37,39%
Diciembre	$ 841.645.768,76	11,1%	40,23%	$ 416.957.530,08	5,50%	42,90%
Enero	$ 2.260.108.138,63	29,8%	70,06%	$ 1.282.155.412,95	16,92%	59,82%
Febrero	$ 1.701.590.755,00	22,46%	92,52%	$ 1.150.802.063,00	15,19%	75,01%
Marzo	$ 566.337.129,30	7,48%	100,00%			

Tabla 8. Avance financiero programado vs ejecutado en la vigencia 2025.

6. MODIFICACIONES

6.1 Diseño

Durante el desarrollo del proyecto no se ha generado modificación alguna al diseño específico de las obras, conservando el trazado natural del caño y los lineamientos establecidos contractualmente fundamentados.

Sin embargo, realizó un balance general de las actividades y cantidades del contrato, considerando el levantamiento topográfico de predragado y el PGAR *“Hacia un Territorio Saludable y Sostenible” 2013–2027. El análisis evidenció la crítica situación del Caño Hondo, un cuerpo de agua clave para la Ciénaga Grande de Santa Marta, que actualmente no aporta caudal debido a la alta sedimentación y a obstrucciones en tramos sin mantenimiento y en cruces con vías terciarias. Para restablecer la conectividad hidráulica entre el río Magdalena y la CGSM, se requiere la construcción de cinco box culvert.
Las condiciones encontradas generaron variaciones en las cantidades de varios ítems contractuales relacionados con dragado, remoción de sedimentos, manejo de material, limpieza de vegetación y obras con geosintéticos. Adicionalmente, se identificó la necesidad de crear nuevos ítems asociados a trabajos topográficos, excavaciones, obras en concreto, acero de refuerzo y manejo de agua para la construcción de los box culvert.

En consecuencia, se solicita la elaboración del acta de mayores y menores cantidades del contrato LP 005 de 2023, aclarando que el ajuste no implica recursos adicionales.

6.2 Valor de obra

Por tratarse de un contrato cuya vigencia es de doce años, se aplicará lo relacionado con la indivisibilidad de la garantía, consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.3 del decreto 1082 de 2015. Por lo anterior, cada periodo contractual será de un año. Para efectos de suficiencias o cuantías a asegurar, se deberán tener en cuenta los valores detallados en la tabla 10.

RESUMEN DEL CONTRATO	
AÑO	**PRESUPUESTO**
2023	$ 373.831.754,00
2024	$ 5.157.831.143,00
2025	$ 7.499.178.197,00
2026	$ 9.288.760.538,00
2027	$ 10.844.940.805,00
2028	$ 12.798.878.393,00
2029	$ 18.695.134.989,00
2030	$ 22.064.785.300,00
2031	$ 40.643.579.127,00
2032	$ 45.323.780.165,00
2033	$ 49.656.838.902,00
2034	$ 55.823.229.009,00
2035	$ 62.295.582.901,00
TOTAL	**$ 340.466.351.223,00**

Tabla 9. Presupuesto inicial del contrato.

7. RECURSOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE

Para llevar a cabo el correcto desarrollo de las obras dentro de los términos de referencia se exige como mínimo el siguiente personal y equipo el cual se implementará acorde a necesidades y exigencias del trabajo a desarrollar.

7.1 Personal

CARGO	DEDICACIÓN	CANTIDAD
Gerente de obra	50%	1
Director de obra	50%	1

Ingeniero Residente	100%	1
Especialista hidráulico	50%	1
Ingeniero Topográfico	100%	1
Especialista ambiental	50%	1
Profesional SST	100%	1
Profesional en Trabajo social	100%	1

Tabla 10. Personal empleado durante la vigencia 2025.

7.1.1 Personal previo al inicio de la ejecución de los trabajos

Personal	Dedicación	Cantidad
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.	100%	1
Profesional En Trabajo Social	100%	1
Vigía HSE	100%	1
Personal Técnico, Operadores, Mecánicos.	100%	8
Mano de obra No Calificada debe ser local de Marinos, vigilantes y demás.	100%	10

Tabla 11. Dedicación del personal empleado durante la vigencia 2025.

7.2 Maquinaria y equipos

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Excavadora con brazo Largo de 18 m o superior.	Excavadora sobre oruga con potencia de motor de 175 HP y capacidad de balde igual o superior a 0.8 m3.	4
Equipo de topografía completo	Debe Incluir: Sistema de posicionamiento global satelital - GPS - Estación Total, Nivel de Precisión, Ecosonda, Software de levantamiento y procesamiento Hidrotopográfico debidamente licenciado.	1
Drones	Drones Phantom 4 pro	1
Cámara fotográfica	Digital camera Kodak Pixpro FZ51	1

Tabla 12. Maquinaria y equipos durante la vigencia 2025.

7.3 Equipo de contingencia

Para suplir cualquier eventualidad de daño a maquinaria mínima exigida se dispone permanentemente de Dos (2) excavadoras con potencia de motor de 175 HP y capacidad de balde igual o superior a 0.8 m3, las cuales se encuentran ubicadas en nuestras instalaciones en el municipio de Barranquilla – Atlántico.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Las obras incluidas dentro de los Estudios Previos, página 53, nota 3, y en las Medidas de Manejo ambiental, en la página 18, numeral 28, se registran a continuación.

8.1 Levantamiento topográfico
Durante el periodo actual se han realizado levantamientos topográficos.

8.2 Informe de gestión ambiental
Durante el período actual, se llevaron a cabo las actividades planteadas en las Medidas de Manejo Ambiental del contrato

8.3 Informe de seguridad y salud en el trabajo (SST)
Durante el período actual, se llevaron a cabo todas las actividades planteadas en el área de seguridad y salud en el trabajo.

8.4 Informe de gestión social
Durante el periodo actual se llevaron a cabo todas las actividades planteadas en la gestión social.

8.5 Salvamento de fauna acuática y terrestre
Durante el periodo se realizaron actividades del ítem.

8.6 Informe de jornadas de sensibilización
Durante el periodo no se realizaron actividades del ítem, la actividad ya se ejecutó al 100%.

9. ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO

En la tabla No.9 se presenta el avance financiero programado para la vigencia 2025, de acuerdo con el programa de inversiones del proyecto.

10. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO

Para este periodo se realiza reprogramación de obra posterior a la aprobación del acta de mayores y menores cantidades el día 21 de octubre de 2025. Se tenía programado 22,46% de avance, obteniendo 15,19% de ejecución. En la siguiente gráfica se presenta el avance.



Gráfica 1. Avance Programado Vs Ejecutado

Para este periodo CONSORCIO CGSM4 presentó el siguiente avance para las condiciones contractuales, relacionadas así:

10.1 Actividades generales

10.1.1 Ítem 1.1 Movilización y desmovilización de equipos, unidad: unidad.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, ejecutó actividades de este ítem, a la fecha se presenta un 100,00% de avance acumulado para la vigencia 2025.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Movilización y desmovilización de equipos	Und	1,00
TOTAL		**2,00**

10.1.2 Ítem 4.2 Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto. Unidad: unidad

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, no ejecutó actividades de este ítem, a la fecha se presenta un 100,00% de avance acumulado para la vigencia 2025.

10.2 Actividades de obra

10.2.1 ÍTEM 2.2, Remoción mecánica de sedimentos, Unidad: m3

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, ejecutó actividades de este ítem.

- Se intervino las secciones del Box No. 5, para un avance de 330,64 metros cúbicos en el periodo actual.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Remoción Mecánica de Sedimentos excavación de box 5.	m3	330,64
TOTAL		**113.159,10**

El volumen ejecutado en el periodo representa un avance del 0.29% del ítem y se llega a un acumulado de 113.159,10 m3, lo que equivale a un avance total acumulado del 100,00% del ítem.

10.2.2 ÍTEM 2.10, Localización, trazado y replanteo topográfico.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, ejecutó actividades de este ítem, a la fecha se presenta un 100,00% de avance acumulado para la vigencia 2025.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Localización, trazado y replanteo	m2	187,40
TOTAL		**937,00**

10.2.3 ÍTEM 2.11, Excavación manual. Incluye: Cargue, retiro y explanación lateral del material de excavación.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, ejecutó actividades de este ítem, a la fecha se presenta un 80,00% de avance acumulado para la vigencia 2025.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Excavación manual	m3	159,15
TOTAL		**418,12**

10.2.4 ÍTEM 2.12, Concreto F'c 3.000 psi (21 MPa) para solado de limpieza y nivelación de fondo de cimentación e=0.05m. Incluye transporte de materiales.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, no ejecutó actividades de este ítem, a la fecha se presenta un 46,59% de avance acumulado para la vigencia 2025.

10.2.5 ÍTEM 2.13, Construcción de box culvert en concreto reforzado de 4.000 psi (28 Mpa) con baja permeabilidad (Incluye: transporte de materiales. No incluye: Acero de refuerzo)

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, ejecutó actividades de este ítem, a la fecha se presenta un 51,71% de avance acumulado para la vigencia 2025.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Construcción de Box Culvert en concreto reforzado de 4.000 PSI	m3	218,45
TOTAL		**398,55**

Se tomaron cilindros de concreto moldeado y se realizaron ensayos de resistencia a la compresión de las muestras. En el Anexo 13 se encuentran los resultados de estos ensayos.

10.2.6 ÍTEM 2.14, Suministro, corte, figuración y armado de acero de refuerzo grado 60 con Fy 60.000 psi (420 Mpa). Incluye transporte.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, ejecutó actividades de este ítem, a la fecha se presenta un 55,88% de avance acumulado para la vigencia 2025.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro, corte, figuración y armado de acero de refuerzo grado 60 con Fy 60.000 PSI	kg	14.211,29
TOTAL		**41.498,38**

10.2.7 ÍTEM 2.15, Concreto de F'c 4.000 psi (28 Mpa) para construcción de losas de aproximación. Incluye: Formaletería, desencofre y transporte de materiales.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, no ejecutó actividades de este ítem.

10.2.8 ÍTEM 3.1, Aislamiento del área de objeto de la restauración ecológica, Unidad: Ha.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, ejecutó actividades de este ítem, a la fecha se presenta un 60,00% de avance acumulado para la vigencia 2025.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Aislamiento al área objeto de la restauración ecológica	Ha	12,00
TOTAL		**12,00**

10.2.8 ÍTEM 3.2, Establecimiento de la estrategia de restauración ecológica, Unidad: Ha.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, ejecutó actividades de este ítem, a la fecha se presenta un 48,90% de avance acumulado para la vigencia 2025.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica.	Ha	5,25
TOTAL		**9,78**

10.2.9 ÍTEM 3.3, Mantenimiento de material vegetal establecido, Unidad: Ha.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, ejecutó actividades de este ítem, a la fecha se presenta un 8,24% de avance acumulado para la vigencia 2025.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Mantenimiento al material vegetal establecido	Ha	8,24
TOTAL		**8,24**

10.2.10 ÍTEM 4.5, Mantenimiento preventivo de estación de monitoreo, Unidad: Ha.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, ejecutó actividades de este ítem, a la fecha se presenta un 100,00% de avance acumulado para la vigencia 2025.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Mantenimiento preventivo estación de monitoreo	und	4,00
TOTAL		**4,00**

10.2.11 ÍTEM 4.1, Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre, Unidad: Mes.

Para este periodo CONSORCIO CGSM4, ejecutó actividades de este ítem, a la fecha se presenta un 100,00% de avance acumulado para la vigencia 2025.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre	mes	1,00
TOTAL		**6,00**

10.3 Tiempo transcurrido

A la fecha de elaboración del Informe de avance No. 12, del período de febrero de 2026, han transcurrido 51 semanas de desarrollo del proyecto, para un porcentaje de 98,07% del plazo de la vigencia 2025 (52 semanas).

10.4 Conclusiones

- Durante la ejecución del proyecto se han presentado inconvenientes para la obtención de los permisos de ingreso de equipos para realizar la excavación de las aletas de los box culvert No.4 y No.5.

- Para la ejecución del mantenimiento de las 20 hectáreas sembradas durante las actividades de rehabilitación ecológica de la vigencia 2024, en el predio “Doña María”, los hermanos Castañeda, dueños de predio, no dimensionaron el área que estaban cediendo para dicha actividad y señalaron que actualmente se ven afectados, ya que requieren el pasto del terreno para la alimentación de su ganado, lo que dificultó la obtención del permiso para el ingreso del personal encargado de realizar las labores de mantenimiento.

- La ubicación de las obras duras representa otra dificultad, dado que estas se encuentran a más de 60 kilómetros de las plantas de producción de concreto más cercanas. A esto se suma que las condiciones de las vías de acceso dificultan el ingreso de los camiones que transportan el concreto, motivo por el cual las empresas concreteras se negaron a prestar el servicio, por lo cual

el Consorcio CGSM4 alquiló camiones mixer para transportar el concreto desde dichas plantas de producción.

- Para la ejecución de las actividades de rehabilitación ecológica de la vigencia 2025, se presentaron dificultades para obtener los permisos de uso de los predios ubicados dentro de los polígonos donde se desarrollan estas intervenciones. Varios propietarios manifestaron su preocupación al considerar que dichas actividades podrían afectar el desarrollo normal de sus labores agropecuarias.

- Las situaciones anteriormente mencionadas, fueron causales del retraso en el inicio de las actividades de la vigencia 2025, por lo cual no se logrará ejecutar 100% el presupuesto.

ANEXOS

ANEXO 1

Registro fotográfico.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Armado losa inferior de Box Culvert #1
Foto No 1: 05 de febrero de 2026	



Foto No 2: Fundida de aleta de Box Culvert #3 – 06 de febrero de 2026



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Fundida de losa de Box Culvert #2

Foto No 3: 07 de febrero de 2026



Foto No 4: Fundida de muro de Box Culvert #4 – 09 de febrero de 2026



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Fundida de muros de Box Culvert #1
Foto No 5: 10 de febrero de 2026	



Foto No 6: Armado de muro de aleta de Box Culvert #2 – 11 de febrero de 2026



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Fundida de zapata de aleta de Box Culvert #3
Foto No 7: 12 de febrero de 2026	



Foto No 8: Fundida Aleta zapata Box culvert #2 – 13 de febrero de 2026



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Fundida de muro de Box Culvert #2
Foto No 9: 19 de febrero de 2026	



Foto No 10: Armado de zapata de aleta de Box culvert #2 – 20 de febrero de 2026



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Fundida de muro de aleta de Box culvert #4
Foto No 11: 20 de febrero de 2026	



Foto No 12: Fundida muro intermedio de Box culvert #3 – 21 de febrero de 2026



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Fundida zapata de aletas de Box #2
Foto No 13: 24 de febrero de 2026	



Foto No 14: Formaleta de losa superior de Box #1 – 24 de febrero de 2026



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Encofrado de muros de box #3
Foto No 13: 25 de febrero de 2026	



Foto No 14: Encofrado de muro de box #3 – 26 de febrero de 2026



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Armado de losa superior de box #1

Foto No 15: 27 de febrero de 2026



Foto No 16: Fundida de muro aleta Box #3 – 28 de febrero de 2026



REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CONSORCIO CGSM4	
Actividad:	Fundida de zapata de box #1
Foto No 17: 28 de febrero de 2026	



ANEXO 2

Bitácora de obra.

Domingo, 01 de febrero de 2026' Clima' Día soleado - Seco. Sin precipitaciones. Actividades: No se realizaron actividades.

Jorge Hernandez - Residente Interventoría Edilberto Reys - Residente de Obra.

Semana No. 48 (02 de febrero de 2026 - 08 de febrero de 2026).

Lunes. 02 de febrero de. 2026: clima: Inicia el día nublado y luego se presentaron lluvias fuertes por la tarde. Actividades: Se continúan con las actividades de rehabilitación ecológica y se realiza la limpieza manual de la vegetación, trazado y ahoyado. Personal: (1) Director de Obra. (1) Ingeniera Ambiental, (1) Profesional social, (1) Ingeniero residente, (1) Profesional SSF, (1) profesional social, (1) Profesional SISO, (1) Esp Ambiental de obra, (2) Operadores (18) maniro, (2) maestro de obra, (1) Coordinador de obra, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Esp. Hidráulico de Interventoría, (1) profesional social de Interventoría (1) Ingeniera Ambiental de Interventoría (1) Inspector de Interventoría. (1) Coordinador de Intenventoría. Equipos: Computador portatil de Obra e Interventoría, Vehiculo de Obra e Interventoría, Equipos de topografía, - (1) RTK, Retroexcavadora (1). machete, palas, martillo, pantillas, metro.

Jorge Hernandez - Residente: Interventoría Edilberto Reys - Residente Obra.

Martes, 03 de febrero de 2026: Clima: Día soleado - seco, Sin precipitaciones. Actividades: Se continuan con las actividades de rehabilitación ecologica y se realiza el trazado y ahoyado. En la construcción de box Bulvert debido a las lluvias se realizaron actividades de evacuación de aguas lluvias del día anterior. Se realizaron Charlas Sobre Capacitaciones prevercón de lesiones osteo musculares. Personal: (1) Ingeniena Ambiental, (1) Profesional social, (1) ingeniero residente, (1) profesional SSF, (1) profesional social, (1) profesional SISO (1) Esp. Ambiental de Obra, (1) Esp. Hidráulico de Obra (1) ing. Topografo de Obia (2) operadores (35) manno (1) Coordinador de Obra (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría. (1) Esp.

Ambiental de Interventoría. (1) profesional social de interventoría. (1) Ingeniera ambiental de interventoría. (1) Inspector de interventoría. (1) Coordinador de interventoría. **Equipos:** Computador portatil de Obra e Interventoría. Vehiculo de Obra e Interventoría. Equipos de topografía - (1) RTK. Retroexcavadora (4) machete, palas, martillo, pantillas, metro

Jorge Hernandez - Residente Interventoría. : Edilberto Reys - Residente Obra

Miercoles, 04 de febrero de 2026: Clima: Dia soleado - seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se continúan con las actividades de rehabilitación ecológica y se realiza el trazado y ahoyado. En la construcción de box coolvert se trabajó en el no. 2 y 3, en el que se realiza, el encofrado e instalación de acero de refuerzo para la fundida de losa inferior, muros y zapatas. Se realizaron charlas sobre Día mundial contra el cáncer. **Personal:** (1) Ingeniera Ambiental (1) profesional Social, (1) ingeniero residente, (1) Profesional SST, (1) profesional Social (1) profesional Sieo (1), Esp. Hidraulico de obra, (1) Ing. Topógrafo de Obra, (2) operadores, (35) mannos, (2) maestro de obra, (1) Coordinador de obra. (1) Residente de interventoria, (1) Esp. Ambiental de interventoría (1) Profesional social de Interventoría (1) Ing. Ambiental de Interventoría. (1) Inspector de interventoría, (1) Coordinador de Interventoría. **Equipos:** Computador portatil de Obra e Interventoría, Vehiculo de obra e interventoría, Equipos de topografía (1) RTK, Retro excavadora (4), machete, palas, martillo, Pantillas, metro

Jorge Hernandez - Residente Interventoría Edilberto Reys - Residente Obra

Jueves, 05 de febrero de 2026: Clima: Dia Soleado - seco, Sin precipitaciones. **Actividades:** Se continúan con las actividades de rehabilitaciones ecologica y se realiza el trazado y ahoyado, y se realizó el levantamiento del polígono con el fin de determinar el area Sembrada En la construcción de box culvert Se trabajó en el No. 2 en el que Se continuo con el armado de acero para fundida de la losa

Jorge Hernandez - Residente Interventoría Edilberto Reys - Residente Obra

Inferior y armado de zapatas, y en el No. 3 Se continua Con el armado de acero para los muros y Se desencofra la placa Inferior. Se realizaron Charlas Sobre procedimiento en caso de ataque de abejas africanas. Personal: (1) Director de obra (1) Ingeniera ambiental (1) profesional social, (1) Ingeniero Residente (1) Profesiona SST (1) Profesional social (1) profesional SISO (1) Esp. Hidraulico de Obra (1) Ing. Topografo de obra (2) operadores (38) maano (3) Maestro de obra (1) Coordinador de obra (1) Residente de Interventoria (1) Esp. hidraulico de Interventoria, (1) Profesional de Interventoria (1) Coordinador de Interventoria. Equipos: Computador portatil de Obra e Interventoria, Vehiculo de Obra e Interventoria, Equipos de topografia - (1) RTK, Retroexcavadora (2), machete, palas, martillo, puntillas, metro.

Jorge Hernandez - Residente Interventoria

Edilberto Rays - Residente Obra

Viernes, 06 de febrero de 2016: Clima: Dia soleado - Seco, Sin precipitaciones Actividades: Se Continua Con las actividades de rehabilitacion ecologica y Se realiza limpieza manual de la vegetacion y levantamiento del poligono con el fin de determinar el área Sembrada. En la Construccion de box Coulvert se trabajo en el no. 2 en el que Se culmina Con el armado de acero para fundida de la losa inferior, y en el no. 3 Se realiza la fundida de zapatas en ambas margenes. Se realizaron charlas Sobre riesgo Cardiovascular - factores de riesgo. Personal: (1) Ingeniera ambiental (1) profesional Social (1) Ingeniero residente, (1) profesional SST, (1) profesional Social, (1) profesional Siso, (1) ing topografo de obra (1) Esp. hidraulico de obra, (1) operador, (38) maano (3) maestros de obra (1) Coordinador de obra, (1) Residente de interventoria (1) profesional Social de Interventoria, (1) Ingeniera ambiental de Interventoria, (1) topografo, (1) Inspector de interventoria, (1) Coordinador de Interventoria. Equipos: Computador portatil de Obra e Interventoria, Vehiculo de Obra e Interventoria, Equipos de topografia (1) RPK. Retroexcavadora (1) Machete, palas, martillo, puntillas. metro.

Jorge Hernandez – Residente Interventoría Edilberto Roys - Residente Obra

Sabado, 07 de febrero de 2026: Clima: Día soleado - seco, Sin precipitaciones. Actividades: Se continúan con las actividades de rehabilitación ecologica y se realiza el mejoramiento cerca perimetral mediante la instalación de los postes requeridos y el tendido del alambre para la cerca eléctrica. En la construcción de box coulvert se trabajó en el no. 2 se ejecutó la fundida de losa inferior y toma de muestras de cilindros. ; y en el no. 3 Se realiza la fundida de parte de las zapatas y muros. Personal: (1) Ingeniera ambiental (1) profesional social. (1) Ingeniero residente, (1) profesional SST (1) profesional Social (1) profesional SISO (1) Operadores (38) Maano (3) maestro de obra. (1) Coordinador de obra, (1) Residente de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría (1) topógrafo, (1) Inspector de Interventoría. (1) Coordinador de interventoría. Equipos: Computador portatil de obra e Interventoría. Vehiculo de obra e Interventoría Equipos de topografía - (1) RTK, Retro excavadora (1) machete, palas, martillo, puntillas, metro.

Jorge, Hernandez - Residente Interventoría Edilberto Roys - Residente Obra

Domingo, 08 de febrero de 2026: Clima: Día Soleado - seco, Sin precipitaciones. Actividades: No se realizaron actividades.

Jorge Hernandez - Residente Interventoría Edilberto Roys - Residente Obra

Semana No. 49 (09 de febrero de 2026 - 15 de febrero de 2026).

Lunes, 09 de febrero de 2026: Clima: Día Soleado - seco, sin precipitaciones. Actividades: Se Continúan actividades de rehabilitación ecológica y se realiza el mejoramiento cerca perimetral, mediante la instalación de postes requenclos y el tendido de alambre para la cerca electrica. En la construcción de box coulvert se

trabajó en el no. 2. Se continua con el armado de acero en zapatas y en el no. 3 Se realizo el desencofre de las zapatas y en el no. 4 Se inicia con la fundida de muros intermedios en concreto de 4000 psi y la toma de muestras de cilindro. Se realizaron charlas Sobre politica de seguridad operacional y proteccion del medio ambiente. Personal: (1) Director de obra (1) Ingeniera ambiental (1) Profesional social (1) Ingeniero residente (1) profesiona SST. (1) profesional social (1) Esp. hidraulico de obra (1) Ing. Topografo de Obra (1) profesional siso. (1) Operador. (28) Manno, (3) maestros de obras. (1) Coordinador de obra (1) Residente de Interventoria. (1) Ing. topógrafo (1) Ingeniera ambiental de interventoria. (1) topógrafo (1) Inspector de Interventoria (1) Coordinador de interventoria (1) profesional Social de Interventona. Equipos: Computador portatil de obra e Interventoria Vehiculo de obra e Interventoria, Equipos de topografia (1) RTK. Retroexcavadora (1), machete, palas, martillo, pantilla s, metro.

Jorge Alexander - Residente Interventoria

Edilberto Roys - Residente Obra

Martes, 10 de febrero de 2026: Clima: Dia Soleado Seco Sin precipitaciones. Actividades: Se continuan Con las actividades de rehabilitacion ecológica y Se realiza el mejoramiento cerca perimetral, mediante la instalacion de los postes reciclados y el tendido del alambre, para la cerca electrica. En la Construccion de box Coulvert Se trabajó en el no. 2. Se Continua Con el armado de acero en las zapatas y en el no. 3 Se realiza el desencofre de las zapatas. y en el no. 4 Se inicia Con la fundida de muros intermedios en Concretos de 4000 psi y la toma de muestras de cilindros. Se realizaron charlas Sobre importancia del uso de las gafas de Seguridad - de que me protege. Personal: (1) Director de obra (1) Ingeniera ambiental (1) Profesional social (1) Ingeniero residente. (1) profesional SST (1) profesional Social (1) Esp. Ambiental de Obra (1) Ing. topógrafo de obra (1) profesional siso (1) operador (38) manos, (3) maestros de obra (1) Coordinador de Obra (1) Director de Interventoria (1) residente de interventoria (1) Ing topógrafo (1) Ingeniera ambiental de interventoria (1) inspector de

Interventoría (1) Coordinador de Interventoría. (1) Profesional Social de Interventoría **Equipos:** Computador portatil de Obra e Interventoría. Vehiculo de Obra e Interventoría, Equipos de topografía -(1) RTK, Retroexcavadora (1), machete, palas, martillo, punthla metro.

Jorge Hernandez - Residente Interventoría

Edilberto Roys - Residente Obra

Miercoles, 11 de febrero de 2026 :Clima: Dia Soleado - Seco. Sin precipitaciones, **Actividades** Se continua con las actividades de rehabilitación ecológica. y se realiza el mejoramiento cerca perimetral. mediante la instalación de los postes requendos y el tendido del alambre. para la cerca electrica en la construcción de box coulvert se trabajó en el no. 2 Se continua con el armado de acero en las zapatas y los muros y en el no. 3 se realiza armado de acero de refuerzo para fundida y en el no. 4 se realiza el encofrado de una de los muros para fundida. Se realizaron charlas Sobre el alcohol y la conducción. **Personal:** (1) ingeniera ambiental, (1) profesional social (1) Ingeniero residente, (1) profesional SST (1) profesional social (1) Esp. ambiental de obra (1) profesional SISO (1) Operadores. (38) mannos, (2) maestros de obra, (1) Coordinador de obra. (1) Residente de interventoría, (1) ing. topografo, (1) ingeniera ambiental de interventoría (1) topógrafo, (1) Esp. hidráulico de Interventoría **Equipos:** Computador portátil de obra e Interventoría, Vehiculo de Obra e Interventoría Equipos de topografía (1) RTK, Retroexcavadora (1) machete, palas, martillo. panthlas, metro

Jorge Hernandez - Residente Interventoría

Edilberto Roys - Residente Obra.

Jueves, 12 de febrero de 2026: Clima: Dia soleado - Seco. sin precipitaciones. **Actividades:** Se Continuan Con las actividades de rehabilitación Ecológica y Se realize la georeferenciación de plantulas sembradas Aislamiento perimetral mediante la instalación de postes

y Conformación de cercas. En la construcción de box coulvert Se trabajó en el no 2. Se Continua Con el armado de acero en las zapatas y los muros, y en el no 3. Se realiza la fundida de zapatas y la toma de muestras de cilindros, y en el no 4 Se realizo la instalación de acero de refuerzo en los muros. Se realizaron charlas sobre En caso de ataque de abejas africanas.
Personal: (1) Director de obra, (1) Ingeniero ambiental (1) profesional Social (1) Ingeniero Residente, (1) Profesional sst (1) Profesional Social (1) Esp. ambiental de obra (1) Esp. hidráulico de obra (1) Ing. topógrafo. (1) profesional siso (1) Operadores (36) marino. (2) maestro de obra. (1) Coordinador de obra (1) Director de Interventoría (1) Residente de interventoría: (1) Ingeniero topógrafo (1) Ingeniera ambiental de interventoría (1) Esp. ambiental de Interventoría (1) topografo (1) Esp. hidráulico de interventoría (1) inspector de Interventoría, (1) coordinador de interventoría (1) profesional Social de interventoría - Equipos: Computador portatil de obra e Interventoría, Vehiculo de obra e Interventoría. Equipos de topografia - (1) RTK, Retroexcavadora (1), machete, palas, martillo, pantillas, metro

Jorge Hernandez - Residente Interventoría Edilberto Reys. Residente Obra

Viernes, 13 de febrero de 2026; Clima: Dia soleado - Seco, Sin precipitaciones. Actividades: Se continuan con las actividades de rehabilitación ecológica y se realiza el aislamiento perimetral mediante la instalacion de postes y conformacion de cercas, la limpieza mecánica de vegetación y el abonado en los puntos Sembrados. En la Construcción de box coulvert se trabajo en el no. 2. Se realiza la fundida de las zapatas en el no. 3 Se realiza en figurado de acero para el armado en los muros laterales e Intermedios, y en el no. 4 se realiza la fundida de muros laterales. Se realizaron charlas sobre Dia sin Pitillo. Personal: (1) Ingeniera ambiental (1) profesional Social (1) Ingeniero residente (1) Profesional SST (1) profesional social (1) Esp. hidráulico de obra (1) ing. Topografo. (1) profesional siso (1) Operador (36) marinos (2) maestros de obra (1) Coordinador de obra (1) Director de interventoría (1) Residente de.

Interventoria (1) Inspector de interventoria, (1)ing topógrafo.
(1) Ing Ambiental de interventoria, (1) Esp. hidraulico de Interventoria
(1) Coordinador de Interventoria. (1) profesional Social de Interventoria
Equipos. Computador portatil de obra e Interventoria, Vehiculo de obra e interventoria. Equipos de topografia - (1) RTK. Retroexcavadora (1) machete, palas, martillos, punttillas, metro.

Jorge Hernandez - Residente de Interventoria — Edilberto Reys - Residente Obra

Sabado, 14 de febrero de 2026: Clima: Dia soleado - Seco, sin precipitaciones. **Actividades:** Se continúan con las actividades de rehabilitaciones ecologica y se realizo el cerramiento perimetral mediante la instalacion de postes y conformacion de cercas y el riesgo manual como labores de mantenimiento. En la construccion de box coulvert se trabajó en el no. 4. Con el desencofre. de los muros funoldos. Se realizaron Charlas sobre Consumo de alcohol - efecte.
Personal: (1) Ingeniera ambiental (1) profesional Social (1) Ingeniero residente (1) profesional SST (1) profesional socia (1) Esp. hidraulico de obra (1) Ing. Topografo (1) profesional s.so, (1) Operadores (22) manno (2) maestro de Obra (1) Coordinador de Obra (1) Director de Interventoria (1) residente de interventoria (1) ing. topografo (1) Ingeniera ambiental de Interventoria (1) Esp hidraulico de interventoria (1) Inspector de interventoria (1) Coordinador de interventoria **Equipos:** Computador portatil de Obra e Interventoria, Vehiculo de obra e Interventoria, Equipos de topografia (1) RTK. Retroexcavadora (1) machete, palas martillo, puntillas, metro.

Jorge Hernandez - Residente Interventoria — Edilberto Reys - Residente Obra

Domingo, 15 de febrero de 2026: Clima: Dia Soleado - Seco, sin Precipitaciones. Actividades: no se realizaron actividades.

Jorge Hernandez - Residente Interventoría Edilberto Roys - Residente Obra

Semana No. 50 (16 de febrero de 2026 - 22 de febrero de 2026):

Lunes, 16 de febrero de 2026: Clima: Día soleado - seco, sin precipitaciones. Actividades: No se realizaron actividades.

Jorge Hernández - Residente de Interventoría Edilberto Roys - Residente de obra

Martes, 17 de febrero de 2026: Clima: Día soleado - seco, sin precipitaciones. Actividades: En la construcción de box coulvert se trabajó en el No. 4 y se realizó el armado del acero de refuerzo del muro de la aleta en la margen derecha.
Se realizaron charlas sobre Riesgo Público.
Personal: (1) Ingeniera ambiental, (1) Profesional social, (1) Ingeniero: residente, (1) Profesional SST, (1) Profesional social, (1) Esp. hidráulico de obra, (1) Esp. ambiental de obra, (1) Profesional SISO, (1) Operador, (16) Marino, (2) Maestros de obra, (1) Coordinador de obra, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de interventoría, (1) Ing. Topógrafo, (1) Ingeniera ambiental de interventoría, (1) Esp. ambiental de interventoría, (1) Inspector de Interventoría, (1) Coordinador de interventoría, (1) Profesional social de interventoría.
Equipos: Computador portatil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, equipos de topografía - (1) RTK, Retroexcavadora (1); machete, palas, martillo, puntillas, metro.

Jorge Hernández - Residente de interventoría Edilberto Roys - Residente de obra.

Miercoles, 18 de febrero de 2026: Clima: Día soleado - seco, sin precipitaciones. Actividades: Se continúan con las actividades de rehabilitación ecológica y se realiza el trazado y ahoyado de los puntos de siembra para las plántulas. En la construcción de box coulvert se trabajó en el No. 4 con el encofrado del muro de la aleta en la margen derecha aguas arriba. Se realizaron charlas sobre Estandar de seguridad vial para ciclistas.
Personal: (1) director de obra, (1) Ingeniera ambiental, (1) Profesional social, (1) Ingeniero residente, (1) profesional SST, (1) profesional social, (1) Ing. Topógrafo de obra, (1) Profesional SISO, (2) operadores, (41) marino, (3) Maestros de obra, (1) Coordinador de obra, (1) Director

de interventoría, (1) Residente de interventoría, (1) Ing. topógrafo, (1) Ingeniera ambiental de interventoría, (1) Esp. ambiental de interventoría, (1) Inspector de interventoría, (1) coordinador de interventoría (1) Profesional social de interventoría.

Equipos: Computador portatil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, equipos de topografía - (1) RTK, Retroexcavadora (2), machete, palas, martillo, puntillas, metro.

Jorge Hernández - Residente de Interventoría — Edilberto Roys Residente de obra

Jueves, 19 de febrero de 2026: Clima: Día Soleado - seco, sin precipitaciones.

Actividades: Se continúan con las actividades de rehabilitación ecológica y se realizan las siembras de plántulas y se realiza la georreferenciación. En la construcción de box coulvert, se trabajó en el No. 2 y se realiza la fundida de muros en concreto de 4000 Psi. Se realizaron charlas sobre Procedimiento en caso de atentado terrorista.

Personal: (1) Director de obra, (1) Ingeniera ambiental, (1) Profesional social, (1) Ingeniero residente, (1) Profesional SST, (1) Profesional social, (1) Ing. Topógrafo de obra, (1) Esp. ambiental de obra, (1) Esp. hidráulico de obra, (1) profisional SISO, (2) operadores, (39) Marino, (3) Maestros de obra, (1) Coordinador de obra, (1) Director de interventoría (1) Residente de interventoría, (1) Ing. topógrafo, (1) Ingeniera ambiental de interventoría, (1) Esp. ambiental de interventoría, (1) Inspector de interventoría, (1) Coordinadora de interventoría, (1) Profesional social de interventoría.

Equipos: Computadar portatil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, equipos de topografía - (1) RTK, Retroexcavadora (2), machete, palas, martillo, puntillas

Jorge Hernández - Residente de Interventoría — Edilberto Roys - Residente de obra

Viernes, 20 de febrero de 2026: Clima: Día soleado - seco; sin precipitaciones.

Actividades: Se continúan con actividades de rehabilitación ecológica y se realiza el ahoyado para la preparación de siembra y el riego con abono para la Fertilización. En la construcción de box coulvert se trabajó en el No. 2 y se realiza el desencofre de los muros, en el No. 1 la fundida de muro de la aleta de la margen derecha aguas arriba en concreto de 4000 Psi y en el No. 5 se inicia con las excavaciones mecánicas de aleta y solera. Se realizaron charlas sobre la seguridad es realmente nuestra prioridad - Procedimiento de reporte de incidentes y accidentes.

Personal: (1) Director de obra, (1) Ingeniera ambiental, (1) Profesional social, (1) Ingeniero residente, (1) profesional SST, (1) profesional social, (1) Ing. topógrafo, (1) esp. ambiental de obra, (1) Esp. hidráulico de obra, (1) Profesional SISO, (2) Operadores, (40) Marino, (3) Maestro de obra, (1) Coordinador de obra, (1) Director de interventoría, (1) Residente de interventoría, (1) Ing. topógrafo de interventoría, (1) Ingeniera ambiental de interventoría, (1) Inspector de interventoría, (1) coordinador de interventoría.

Equipos: Computador portátil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, equipos de topografía - (1) RTK, retroexcavadora (2), machete, palas, martillo, puntillas, metro.

Jorge Hernández - Residente de interventoría

Edilberto Roys - Residente de obra

Sábado, 21 de febrero de 2026: Clima: Día soleado - seco, sin precipitaciones.

Actividades: Se continuán con las actividades de rehabilitación ecológica y se realiza el ahoyado para la preparación de siembra y el riego con abono para la fertilización. En la construcción de box coulvert se trabajo en el No. 4 con el desencofrado del muro de la aleta en la margen derecha aguas arriba, y en el No. 5 se continúa con las excavaciones mecánicas de aletas y solera.

Se realizaron charlas sobre protección de la Biodiversidad.

Personal: (1) Director de obra, (1) Ingeniera ambiental, (1) Profesional social, (1) Ingeniero residente, (1) Profesional SST, (1) Profesional social, (1) Ing. topógrafo de obra, (1) Esp. ambiental de obra, (1) Esp. hidráulico de obra, (1) profisional SISO, (2) Operadores, (40) Marino, (3) Maestros de obra, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de interventoría, (1) Residente de interventoría, (1) Ing. topógrafo, (1) Ingeniera ambiental de interventoría, (1) Inspector de Interventoría, (1) Coordinador de Interventoría.

Equipos: Computador portatil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, equipos de topografia - (1) RTK, Retroexcavadora (2), machete, palas, martillo, puntillas, metro.

Jorge Hernández - Residente de interventoría

Edilberto Roys - Residente de obra

Domingo, 22 de febrero de 2026: Clima: Día soleado - seco, sin precipitaciones.

Actividades: No se realizaron actividades.

Jorge Hernández - Residente de interventoría

Edilberto Roys - Residente de obra

Semana No. 51 (23 de febrero de 2026 - 01 de marzo de 2026)

Lunes, 23 de febrero de 2026: Clima: Se presentaron lluvias fuertes. Actividades: Se continúan con las actividades de rehabilitación ecológica y se realiza la siembra de plántulas y la aplicación de riego. En la construcción de box coulvert se trabajó en el No. 1 con el encofrado de la placa superior; en el No. 3, con el encofrado de los muros laterales y en el No. 5 se continúa con la excavaciones mecánicas de aletas y solera. Se realizaron charlas sobre: ¿Qué es COCOLA? ¿Cómo se eligen sus miembros? ¿Quiénes lo conforman?

Personal: (1) Ingeniera ambiental, (1) Profesional social, (1) Ingeniero residente, (1) profesional SST, (1) Profesional Social, (1) Esp. ambiental, de obra, (1) Profesional HSEQ, (2) Operadores, (40) Marino, (3) Maestros de obra, (1) Coordinador de obra, (1) Residente de interventoría, (1) Ing. Topógrafo, (1) Ingeniera ambiental, de interventoría, (1) Topógrafo, (1) Inspector de interventoría, (1) Esp. ambiental de interventoría (1) topógrafo (1) Coordinador de interventoría

Equipos: Computador portatil de obra e interventoría, vehículo obra e interventoría equipo de topografía - (1) RTK, Retroexcavadora (2), machete, palas, martillo, puntillas, meta

Jorge Hernández - Residente de Interventoría

Edilberto Roys - Residente de Obra

Martes, 24 de febrero de 2026: Clima: Día soleado, seco, sin precipitaciones.

Actividades: Se continúan con las actividades de rehabilitación ecológica y se realiza la siembra de plántulas y la georeferenciacaciónón de las mismas. En la construcción de box coulvert se trabajó en el No. 1 con el encofrado de la placa superior, en el No. 3 con el encofrado de los muros laterales y en el No. 5 se continúa con las excavaciones mecánicas de aleta y solera.

Se realizaron charlas sobre: ¿Cómo prevenir lesiones en las manos?

Personal: (1) Director de obra, (1) Ingeniera ambiental, (1) Profesional social, (1) Esp. ambiental de obra, (1) Especialista hidráulico de obra, (1) Esp. hidráulico de obra, (1) Ing. topógrafo de obra, (1) Profesional SISO, (2) Operadores, (40) Marino, (3) Maestros de Obra, (1) Coordinador de obra, (1) Residente de obra, (1) Ing. Topógrafo, (1) Ingeniera ambiental, de interventoria, (1) Topógrafo, (2) Coordinador de interventoría, (1) Ingeniera residente, de interventoria, (1) Profesional SST.

Equipos: Computador portatil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría,

Retroexcavadora (2), machete, palas, martillo, puntillas, metro.

Jorge Hernández - Residente de interventoría

Edilberto Roys - Residente de obra.

Miercoles, 25 de febrero de 2026: Clima: Día soleado - seco, sin precipitaciones.

Actividades: Se continuán con las actividades de rehabilitación ecológica y se realiza el trazado, ahoyado, Fertilización con abono, aplicación de hidroretenedor y siembra. En la construcción de box coulvert se trabajó en el No. 1 con el encofrado de la placa superior, en el No. 3 con el armado de acero de los muros y en el No. 5 continua con las excavaciones mecánicas de aletas y solera.

Se realizó una reunión en la Alcaldía de Salamina con el Secretario de Planeación para la revisión del avance del proyecto. En la reunión participaron, la supervisora técnica de Corpamag, el equipo de interventoría y el equipo de obra. Posteriormente, se efectuó visita técnica al box coulvert No. 1 para verificar el avance de obra en campo.

Se realizaron charlas sobre: Estandar de seguridad vial para peatones.

Personal: (1) Director de obra, (1) Ingeniera ambiental, (1) Profesional social, (1) Ingeniero residente, (1) Profesional SST, (1) Profesional social, (1) Ing. topógrafo de obra, (1) Profesional SISO, (2) Operadores, (40) Marino, (3) Maestro de obra, (1) Coordinador de obra, (1) Director de interventoría, (1) Residente de interventoría, (1) Ing topógrafo, (1) Ingeniera ambiental de interventoría, (1) topógrafo, (1) Inspector de interventoría, (1) Esp. hidraulico de interventoría, (1) profesional social de interventoría, (1) Coordinador de interventoría.

Equipos: Computador portatil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, Equipos de topografía - (1) R/K, retroexcavadora (2), machete, palas, martillo, puntillar, metro.

Jorge Hernández - Residente de interventoría

Edilberto Roys - Residente de obra

Jueves, 26 de febrero de 2026: Clima: Día soleado - seco, sin precipitaciones.

Actividades: Se continúan con las actividades de rehabilitación ecológica y se realiza el trasado, ahoyado, fertilización con abono, aplicación de hidroretenedor y siembra. En la construcción de box coulvert se trabajó en el No. 1. Con la fundida de muro de aletas y en el No. 3 con la Fundida de muros laterales, lo anterior en concreto de 3000 Psi y la toma de muestras de cilindro. En el No. 5, se continúa con las excavaciones mecánicas de aletas y solera. Se realizaron charlas sobre: En caso de atentado terrorista.

Personal: (1) Director de obra, (2) Ingeniera ambiental, (1) Profesional social, (1) Ingeniero

residente, (1) profesional SST, (1) Profesional Social, (1) Ing. Topógrafo de obra, (1) Esp. ambiental de obra, (1) Profesional SISO, (2) Operadores, (40) Manno, (3) Maestros de obra (1) Coordinador de obra, (1) Director de interventoría, (1) Residente de interventoría, (1) Ing. Topógrafo, (1) Ingeniero ambiental de interventoría, (1) Topógrafo, (1) Inspector de Interventoría, (1) Esp. hidráulico de interventoría, (1) Profesional social de interventoría, (1) Coordinador de interventoría.

Equipos: Computador portatil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría. Equipos de topografía -(1) RTK, Retroexcavadora (2), machete, palas, martillo, puntillas

Jorge Hernández - Residente de Interventoría

Edilberto Rays - Residente de Obra

Viernes, 27 de Febrero de 2026: Clima: Día soleado - seco, sin precipitaciones.

Actividades: Se continúan con las actividades de rehabilitación ecológica y se ejecutó el cercado, con el objetivo de delimitar y proteger el área destinada para siembra. En la construcción del box coulvert se trabajó en el No. 1. Con el desencofre de muro de aletas y en el No. 3 con el desencofre de muros laterales, en el No. 4 se realizó la fundida de aletas y en el No. 5 se continúa con las excavaciones mecánicas de aletas y solera. Se realizaron charlas sobre buen uso de la dotación.

Personal: (1) Ingeniera ambiental, (1) Profesional social, (1) Ingeniero residente, (1) profesional SST, (1) Profesional Social, (1) Esp. hidráulico, de obra, (1) Profesional SISO, (2) Operadores, (40) Manno, (3) Maestros de obra (1) Coordinador de obra, (1) Director de interventoría, (1) Residente de interventoría, (1) Ing. topógrafo, (1) Ingeniera ambiental de interventoría, (1) Topógrafo, (1) Inspector de interventoría, (1) Profesional social de interventoría, (1) Coordinador de interventoría.

Equipos: Computador portatil de obra e interventoría, vehículos de obra e interventoría, Equipos de topografía -(1) RTK, Retroexcavadora (2), machete, palas, martillo, puntillas, metro.

Jorge Hérnandez - Residente de Interventoria

Edilberto Rays - Residente de Obra

Sábado, 28 de Febrero de 2026: Clima: Día soleado - seco, sin precipitaciones.

Actividades: Se continuán con las actividades de rehabilitación ecológica y se realizó el cercado y los huecos para la siembra. En la construcción de box coulvert se trabajó en el No. 1 con el armado de acero de la losa superior, en el No. 3 con la

Fundida de muro de la aleta en la margen izquierda aguas abajo y en el No. 5 se continua con las excavaciones mecánicas de aletas y solera.

Se realizaron charlas sobre política de control de alcohol, drogas y tabaco.

Personal: (1) Ingeniera ambiental, (1) Profesional social, (1) Ingeniero Residente, (1) Profesional SST, (1) Profesional social, (1) Esp. hidráulico de obra, (1) Residente de interventoría, (1) Profesional SISO, (2) Operadores, (40) Manos, (3) Maestros de obra, (1) Coordinador de obra, (1) Ing. topógrafo, (1) Esp. Ambiental de interventoria, (1) Ingeniera topógrafo, (1) Inspector de interventoría, (1) Profesional social de interventoría, (1) Coordinador de interventoría.

Equipos: Computador portatil de obra e interventoría, vehículo de obra e interventoría, equipos de topografía - (2) Rík, Retroexcavadora (2), machete, palas, martillo, puntillas.

Jorge Hernández - Residentes de Interventoría

Edilberto Roys - Residente de Obra

ANEXO 3

Informe de gestión ambiental.

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL



CONTRATISTA:

CONTRATO No. LP-005-2023

OBJETO: “MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES”.

FEBRERO 2026

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE POR:	NÚMERO DE REVISIÓN		
	0	1	2
Elaboración	Ing. Yurani Acevedo		
			
	Residente Ambiental		
Revisión	Ing. Yurani Acevedo		
			
	Residente Ambiental		
Aprobación	Ing. Ángel Vizcaino Escobar		
			
	Director de Proyecto		

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DEPENDENCIA	No. COPIAS	FECHA DE ENVÍO	OBSERVACIONES
CORPAMAG	1		
Interventores e Ingeniería S.A.S	1		

CUADRO DE MODIFICACIONES

ÍNDICE DE REVISIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 5
2.1 Objetivo General 5
Objetivos Específicos 5
3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 6
Localización 6
Localización Del Sector A Intervenir 6
Localización De Caño Hondo 7
Zonas De Intervención 8
4. FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 10
PROGRAMAS DEL MEDIO ABIÓTICO 11
4.2.1 P-MA-P1 Programa De Control De Calidad De Aire Y Ruido 11
4.2.3 P-MA-P3 Programa De Manejo Del Recurso Hídrico Para El Manejo De Residuos Líquidos 20
4.3 PROGRAMAS DEL MEDIO BIÓTICO 24
4.3.1 P-MB-P1 Programa De Protección De Fauna Y Flora. 24
PROGRAMAS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 27
4.4.1 P-MS-P1 Programa Socioeconómico Y Cultural. 27
4.4.2 P-MS-P2 Programa Manejo De Residuos. 31
5. MEDIDA DE COMPENSACIÓN 35
Establecimiento De La Estrategia De Restauración Ecológica. 35
6. OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES 39
Salvamento De Fauna Acuática Y Terrestre 39
Implementación De Estrategia De Sensibilización Y Participación Ambiental Dirigido A La Comunidad En La Zona De Influencia Del Proyecto. 39
Mantenimiento Preventivo De Estación De Monitoreo. 39

1. INTRODUCCIÓN

En atención a los lineamientos establecidos por la **Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG**, el presente documento expone la formulación y puesta en marcha de las **Medidas de Manejo Ambiental** correspondientes al proyecto *"Obras de mantenimiento para la Ciénaga Grande de Santa Marta en vigencias futuras"*, enmarcado en el **Contrato de Obra No. LP-005-2023**, cuyo objeto es el *"Mantenimiento y recuperación de las condiciones ambientales del complejo delta estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta mediante la intervención de los cuerpos de agua y otras estrategias adicionales"*.

Estas medidas han sido definidas con el propósito de **prevenir, evitar, controlar, mitigar y compensar** los impactos ambientales que puedan generarse durante la ejecución de las obras, garantizando la sostenibilidad de los procesos y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

El documento integra una descripción general de las actividades desarrolladas, organizadas en fichas de manejo ambiental, donde se relacionan las acciones ejecutadas de acuerdo con el contrato. Cada ficha está acompañada de un registro fotográfico y de los soportes correspondientes, que evidencian la gestión realizada en el marco del cumplimiento ambiental del proyecto.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Definir y aplicar las medidas de manejo ambiental necesarias para **prevenir, evitar, controlar, mitigar y compensar** los impactos ambientales y sociales potenciales derivados de las actividades contempladas en la ejecución del proyecto *"Mantenimiento y recuperación de las condiciones ambientales del complejo delta estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta, mediante la intervención de los cuerpos de agua y otras estrategias adicionales"*.

Objetivos Específicos

- Identificar los posibles impactos ambientales y sociales negativos asociados a las actividades previstas durante la ejecución del proyecto.
- Diseñar e implementar medidas de manejo orientadas a prevenir, mitigar, controlar, minimizar y compensar los efectos adversos de las obras sobre el entorno natural y las comunidades.
- Garantizar la protección y conservación de los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos presentes en el área de influencia durante el desarrollo de las intervenciones.

3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Localización

La Ciénaga Grande de Santa Marta se localiza al norte del país en el extremo noroccidental del departamento del Magdalena, su área de influencia está comprendida entre el nacimiento del caño Schiller en la Ciénaga de Cerro de San Antonio al sur, el río Magdalena por el oeste, el Mar Caribe al norte y al este por la desembocadura de los ríos Fundación, Aracataca, Sevilla y Frío que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

La ciénaga Grande de Santa Marta es la laguna costera más grande del país con una extensión lagunar de 430 km2, cuenta con una sola conexión con el mar Caribe a través del puente de la barra y está conectada al complejo lagunar del pajaral por intermedio de caños que permiten a su vez intercomunicación con el río Magdalena.

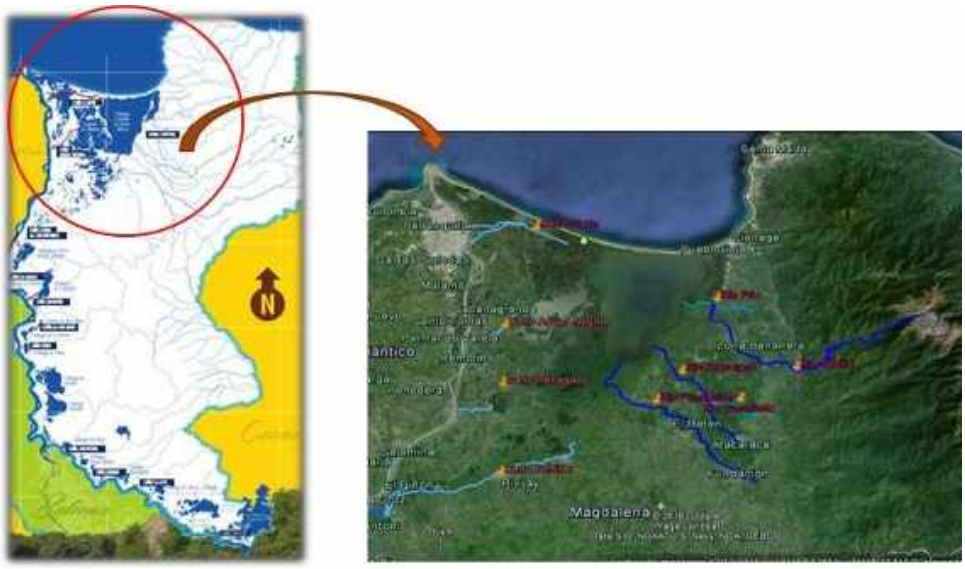


Imagen No 1. Localización General Ciénaga Grande de Santa Marta.

Localización Del Sector A Intervenir

El municipio de Salamina se localiza en Colombia, en el Departamento del Magdalena, pertenece a la región geográfica de la ciénaga Grande del Magdalena, fue fundado en 1765, se encuentra ubicado al Centro del departamento del Magdalena, localizado a los 10° 29`25" de latitud norte y 74° 47`38" de longitud al oeste de Greenwich, comprende una extensión de 175 Km2 que equivale al 0.75% del área departamental y al 0.015% del total nacional, su altura sobre el nivel del mar es de 3m, dista 173.3 Km con la ciudad

de Santa Marta (Capital del Departamento) y a 75.5 Km del distrito de Barranquilla. Su relieve está caracterizado por poseer un territorio bajo plano y cenagoso, bañado por algunos caños convirtiéndose en una inmensa llanura de inundaciones que contienen depósitos de terraza aluvial generándose una terraza ligeramente inclinada.

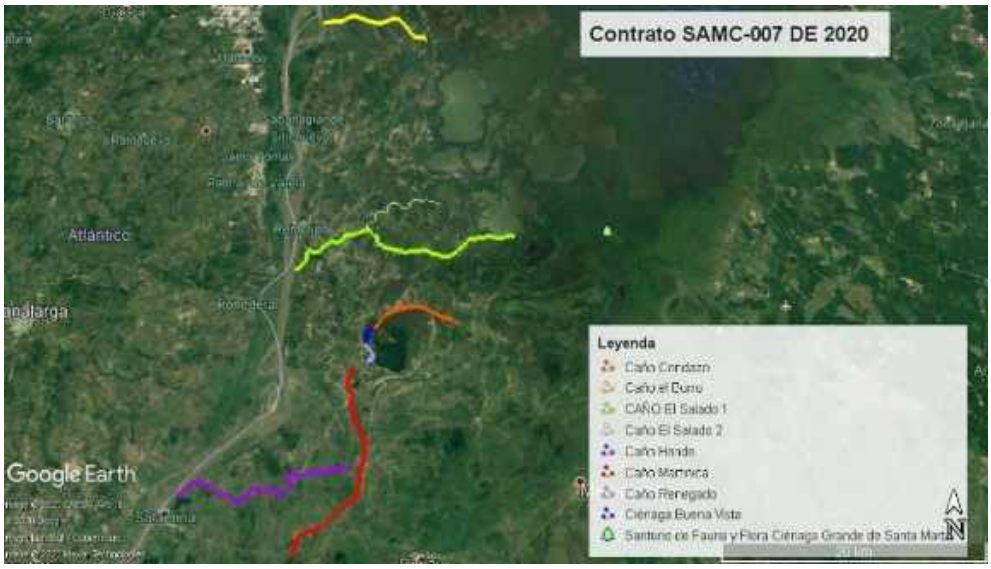


Imagen No 2. Localización del sector a intervenir. Caño Hondo

Localización De Caño Hondo

El caño Hondo es un conector del Río Magdalena y del complejo Estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta, el cual se localiza en el delta exterior del río Magdalena, en el municipio de Salamina sobre la margen derecha del Rio Magdalena, a unos 1,9 kilómetros de distancia, aguas abajo, de la Cabecera municipal de Salamina y con una longitud aproximada de 17.5 kilómetros desde su embocadura sobre el río Magdalena, hasta su intercepción con el caño Martinica.



Imagen No 3. Localización de Caño Hondo

Zonas De Intervención

Los cuerpos de agua a intervenir serán definidos año a año por la entidad, soportado en el informe de INVEMAR y/o IDEAM, así como en el concepto expedido por la INTERVENTORÍA.

La entidad sugiere de manera preliminar priorizar las intervenciones en los siguientes cuerpos de agua:

✓ CAÑO EL BURRO
✓ CAÑO SALADO
✓ CAÑO CLARIN VIEJO
✓ CAÑO CLARIN NUEVO
✓ CAÑO CALETA DEL TAMBOR
✓ CAÑO BRISTOL
✓ CAÑO CERRO DE SAN ANTONIO
✓ CAÑO TORNO, ALIMENTADOR Y ALMENDROS
✓ CAÑO REAL DEL OBISPO
✓ CAÑO AGUAS NEGRAS
✓ CAÑO MARTINICA
✓ CAÑO CONDAZO
✓ CAÑO RENEGADO
✓ CIENAGA BUENAVISTA
✓ CAÑO HONDO

Para la vigencia del año 2025, se tiene prevista realizar la intervención en el sector de "Caño Hondo", que incluirá la remoción mecánica de sedimentos a lo largo de 1.300 metros (ver ilustración No. 4), con el objetivo de conectar Caño Hondo con Caño Martinica. Durante la ejecución de estas actividades, se llevará a cabo el salvamento de fauna acuática y terrestre, como medida de protección ambiental.



Imagen No 4. Eje de remoción mecánica de sedimentos

Dentro del componente de rehabilitación ecológica, se contempla el aislamiento del área objeto de intervención, la implementación de una estrategia de restauración ecológica y el mantenimiento del material vegetal previamente establecido.

4. FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

Las medidas dirigidas a la prevención, control, mitigación, protección, recuperación o compensación de los impactos que se generen durante las actividades del proyecto, se presentan dentro de una serie de actividades y/o obras a ejecutar como programas descritos en las fichas de manejo ambiental.

A continuación, se relacionan los programas ambientales y sus respectivas fichas de seguimiento las cuales aplican al contrato en curso:

COMPONENTE	FICHA	NOMBRE
PROGRAMAS DEL MEDIO ABIÓTICO	P-MA-P1	Programa de control de calidad de aire y ruido.
	P-MA-P2	Programa de protección de suelos.
	P-MA-P3	Programa de manejo del recurso hídrico para el manejo de residuos líquidos
PROGRAMAS DEL MEDIO BIÓTICO	P-MB-P1	Programa de protección de fauna y flora.
PROGRAMAS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO	P-MS-P1	Programa socioeconómico y cultural.
	P-MS-P2	Programa manejo de residuos.

Tabla No 1. Fichas de manejo ambiental

PROGRAMAS DEL MEDIO ABIÓTICO

4.2.1 P-MA-P1 Programa De Control De Calidad De Aire Y Ruido

Medidas Para El Control De La Alteración De La Calidad Del Aire:

- Durante este periodo se realizó desmovilización de maquinaria
- Durante este periodo ser realizaron mantenimientos correctivos y/o preventivos a las maquinarias presentes en el frente de obra. (**Ver Anexo No. 1 - Mantenimiento correctivo/preventivo)**
- El vehículo de apoyo (camioneta de placas HQM 275) cuenta con revisión técnico–mecánica vigente y con aprobación de prueba de emisiones de gases, así como con la totalidad de sus documentos soporte. **(Ver Anexo No. 2 – Documentos del vehículo**).
- Se prohíbe realizar incineración de desperdicios en el área de influencia del proyecto

Medidas Para El Control En La Generación De Olores Molestos:

- La camioneta asignada al proyecto, con placa HQM 275, cuenta con revisión técnico-mecánica vigente, lo que garantiza el cumplimiento de los estándares de emisión de gases para este tipo de vehículo.
- Los residuos sólidos generados durante las actividades de los Box Culvert se almacena temporalmente y se dispone con los proveedores autorizados. **Ver Anexo No 3 – Proveedores Ambientales**
- Se prohíbe realizar quemas/incineración de desperdicios en el área de influencia del proyecto.

Medidas Para El Control Del Incremento De Los Niveles De Ruido:

- Los trabajos se realizan en una única jornada diurna.
- Se realizaron mantenimientos preventivos y/o correctivos

  - **Nota:** En el informe de SST se puede verificar las inspecciones realizadas a las señalizaciones, equipos de emergencia



Imagen No 5. desmovilización de equipo Retro Phd05.



Imagen No 6. Desmovilización de equipo Retro Cat 325BL.



Imagen No 7. Movilización de la Retro Cat 320d Phd05, desde Caño el Salado hasta Caño Hondo - Box #5



Imagen No 8. Instalación de Punto ecológico para la disposición de los residuos



Imagen No 9. Señalización ambiental en la prohibición de quemas en la zona

Actividades del periodo:

ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
	Si	No	No Aplica	Observación
Mantenimientos a maquinaria y equipo de trabajo	X			Se realizaron las actividades programadas para su cumplimiento
Control de material particulado	X			
Lugares adecuados para manejo de los materiales y/o insumos	X			
Prohibición incineración	X			
Velocidad máxima de 15 Km/hora	X			
Puntos ecológicos en campo	X			
Disposición adecuada de residuos	X			
Prohibición quemas	X			
Proveer equipos de protección personal auditiva a trabajadores que lo requieran	X			

Indicadores:

INDICADOR	META
$Mantenimientos = \frac{\text{Mantenimientos ejecutados}}{Mantenimientos\ programados}\ x\ 100$	100%


RESULTADO

INDICADOR MANTENIMIENTOS

FORMULA DEL INDICADOR: (Mantenimientos Ejecutados/Mantenimientos programados) * 100

META: 100%

MES	MANTENIMIENTOS EJECUTADOS	MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	% CUMPLIMIENTO
Julio	-	-	-
Agosto	-	-	-
Septiembre	2	2	100%
Octubre	4	4	100%
Noviembre	2	2	100%
Diciembre	1	1	100%
Enero	3	3	100%
Febrero	1	1	100%

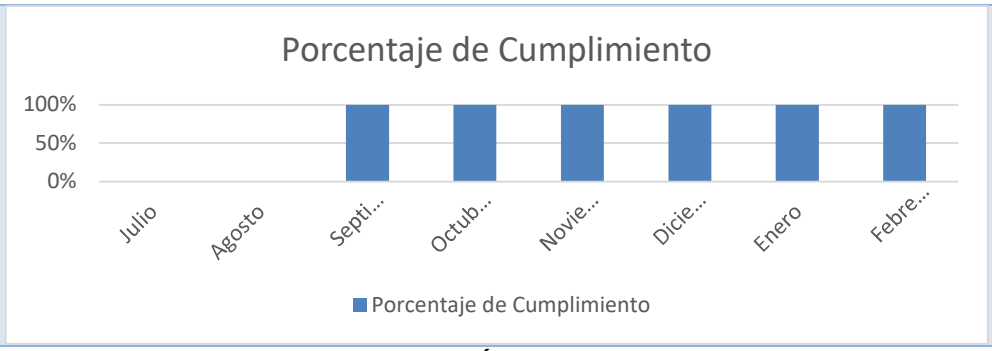


ANÁLISIS

Se ejecuto el programa de acuerdo con los mantenimientos programados

INDICADOR	
$\textbf{Cumplimiento actividades} = \frac{\textbf{Actividades ejecutadas en el periodo}}{\textit{Actividades que aplican al período}} \; x\; 100$	100%

RESULTADO

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES			
FORMULA DEL INDICADOR: (Actividades ejecutadas en el periodo/Actividades que aplican al periodo) * 100			
META: 100%			
MES	**ACTIVIDADES EJECUTADOS**	**ACTIVIDADES QUE APLICAN**	**% CUMPLIMIENTO**
Julio	-	-	-
Agosto	-	-	-
Septiembre	9	9	100%
Octubre	9	9	100%
Noviembre	9	9	100%
Diciembre	9	9	100%
Enero	9	9	100%
Febrero	9	9	100%

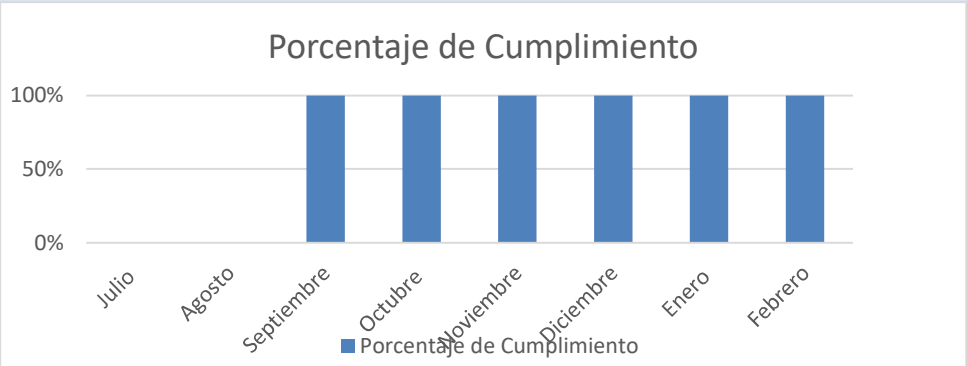

ANÁLISIS

Se ejecutaron las actividades de acuerdo con lo establecido y ejecutado en cada periodo

4.2.2 P-Ma-P2 Programa De Protección De Suelos

Medidas para la conservación de suelos (erosión y sedimentación):

- Durante el presente periodo se realizaron actividades de excavaciones en el box No 5.

- Durante este tiempo de ejecución del proyecto durante el movimiento de tierra y remoción del material no se presentó escorrentías

Medidas para el control de la compactación de suelos:

- La mayor cantidad de operaciones se realizaron durante días soleados, se presentaron lluvias aisladas

- En la zona de operaciones solo circulan vehículos, maquinaria y equipos de trabajo para la de ejecución del proyecto.

Medidas para controlar la contaminación del suelo:

- Se realizo mantenimientos correctivo y preventivo en este periodo como se menciona en el programa 4.2.1 P-MA-P1 Programa De Control De Calidad De Aire Y Ruido

- Durante este periodo no se realizó suministro de combustible.

- Se mantiene el almacenamiento temporal de las sustancias químicas con su respectivo dique y se realiza rotulación de estos

- Durante el tiempo de jornada el personal realiza actividades de orden y aseo para prevenir alguna contaminación en el suelo

- Se realiza disposición final de residuos peligrosos con el proveedor de RECITRAC. **Ver Anexo No. 3 - Proveedores Ambientales**

- Durante este período se realizó charla relacionado al programa protección del suelo. **Ver Anexo No. 4 Charlas y/o Capacitaciones**

- Se cuenta con kit control de derrames en el proyecto. **Ver Anexo No. 5 Inspección Kit Control derrames**

- **Nota:** En el informe de SST se puede verificar las inspecciones realizadas a las señalizaciones, equipos de emergencia

FECHA	TIPO DE FORMACIÓN	NOMBRE DE LA FORMACIÓN
6-feb-26	Charla	Implicaciones de la contaminación en el suelo y agua

Tabla No 2. Educación Ambiental



Imagen No 10. Excavación Box No 5



Imagen No 11. Retiro de agua lluvia en box



Imagen No 12. Arreglo de vía por presencia de lluvia



Imagen No 13. Excavación del material Box



Imagen No 14. Presencia de lluvias en la zona de trabajo Box No 5



Imagen No 15. Kits control de derrames



Imagen No 16. Almacenamiento temporal sustancias químicas



Imagen No 17. Orden y Aseo

Actividades del Periodo:


ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
	Si	No	No Aplica	Observación
Mantenimientos a maquinaria y equipos de trabajo	X			Se realizaron las actividades programadas para su cumplimiento
Manejo apropiado de combustibles y lubricantes	X			
Kits control derrames en obra	X			
Atención apropiada de derrames			X	
Disposición de residuos por derrame			X	

Formación del personal en temas relacionados	X			

Indicadores:


INDICADOR	META
$Formación = \frac{Formación\ ejecutada}{Formación\ programada}\ x\ 100$	100%
RESULTADO	

FORMACION			
FORMULA DEL INDICADOR: (Formación ejecutada/Formación programada) * 100			
META: 100%			
MES	**FORMACION EJECUTADA**	**FORMACION PROGRAMADA**	**% CUMPLIMIENTO**
Julio	-	-	-
Agosto	-	-	-
Septiembre	5	4	125%
Octubre	3	3	100%
Noviembre	6	6	100%
Diciembre	4	4	100%
Enero	2	2	100%
Febrero	1	1	100%

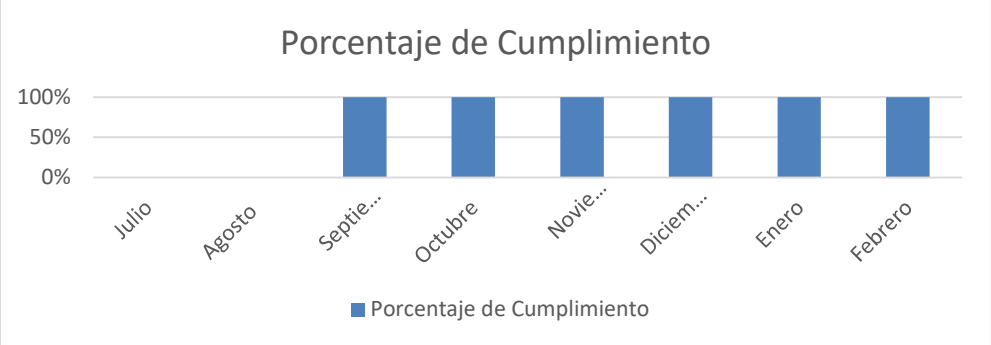

ANÁLISIS	
Para este periodo se ejecutó las capacitaciones programadas de acuerdo con la programación de charlas y capacitaciones HSEQ 2025	
$Derrames = \frac{Derrames\ atendidos\ en\ el\ periodo}{Derrames\ ocurridos\ en\ el\ período}\ x\ 100$	100%
RESULTADO	

DERRAME			
FORMULA DEL INDICADOR: (Derrames atendidos en el periodo/Derrames ocurridos en el periodo) * 100			
META: 100%			
MES	DERRAMES ATENDIDOS	DERRAMES OCURRIDOS	% CUMPLIMIENTO
Noviembre	1	1	100%

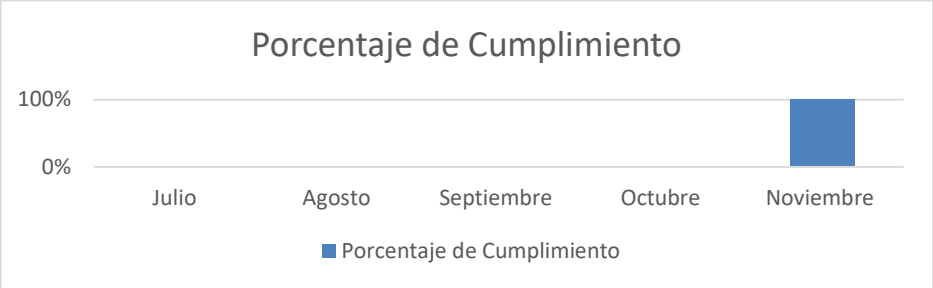


ANÁLISIS

Durante este periodo no se presentó derrames en la zona de trabajo

Cumplimiento actividades $= \frac{\textbf{Actividades ejecutadas en el periodo}}{\textbf{Actividades que aplican al período}} \textbf{ x 100}$	100%

RESULTADO

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			
CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES: (Actividades ejecutadas en el periodo/Actividades que aplican al periodo) * 100			
META: 100%			
MES	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FORMACION PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO
Julio	-	-	-
Agosto	-	-	-
Septiembre	6	6	100%
Octubre	6	6	100%
Noviembre	6	6	100%
Diciembre	6	6	100%
Enero	6	6	100%
Febrero	6	6	100%

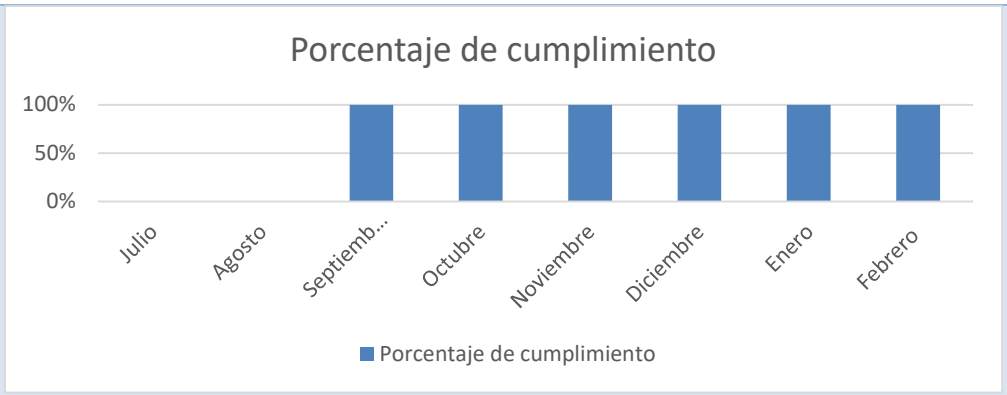

ANÁLISIS
Las actividades relacionadas se llevaron a cabo de manera satisfactoria

4.2.3 P-MA-P3 Programa De Manejo Del Recurso Hídrico Para El Manejo De Residuos Líquidos

Medidas para mitigar la alteración del régimen de drenaje de las aguas:

- Está prohibido el vertimiento de basura, o cualquier otro tipo de desecho (troncos, maderas, hierba, etc.) que puedan represar las aguas de escorrentías.
- Se realizo circulación mínima de los equipos en los sitios de trabajo con el fin de evitar la compactación innecesaria de suelos ya que se impermeabilizan y aumenta la escorrentía.
- Durante la ejecución de las actividades no se afectó el flujo superficial y subterráneo
- Se almacena los materiales pétreos lejos del flujo de las aguas pluviales **Ver Anexo No. 6. Documentación Cantera**

Medidas para el control de la alteración del nivel freático local:

- Se trabaja sobre el caño sin obstaculizar la infiltración natural de las aguas superficiales.

Medidas para mitigar el deterioro de la calidad de las aguas superficiales:

- Se cuenta con los proveedores para realizar la adecuada disposición de residuos sólidos

- Se cuenta con kits control derrame en zona de trabajo, así como equipos de emergencia, como se menciona en el -P-MA-P2 Programa de protección de suelos- de este mismo documento. Ver Informe de SST para verificar las inspecciones a los kits de emergencia

Medidas para mitigar el deterioro de la calidad de las aguas por la actividad de dragado:

- Se realizo mantenimiento preventivo y/o correctivo a las maquinas presente en los frentes de obra

- El 4 de febrero se llevó a cabo el monitoreo fisicoquímico final del agua superficial en Caño Hondo, en tres puntos del eje de dragado mecánico (punto inicial, intermedio y final). Actualmente, se encuentra pendiente la entrega de los resultados por parte del laboratorio.

  - **Nota:** En el informe de SST se puede verificar las inspecciones realizadas a las señalizaciones, equipos de emergencia



Imagen No 18. Toma de muestra agua – Caño Hondo



Imagen No 19. Toma de muestra agua – Caño Hondo



Imagen No 20. Excavación del box #5. repaleo de material y conformación de dique provisional

Actividades del periodo:


ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
	Si	No	No Aplica	Observación
No se obstruirán pasos de agua	X			
Manejo de aguas sanitarias			X	Se realizo el retiro del baño portátil que se encontraba en el dragado mecánico
Disposición de residuos sólidos y líquidos	X			
Disponer de kit de emergencias en obra	X			
Sanitarios portátiles			X	El proveedor realizo retiro del baño
Señalización en zona de trabajo	X			
Atención de derrames en obra			X	
Supervisión suministro de combustibles			X	En este periodo no se realizo suministro de combustible
Monitoreo a la calidad del agua superficial y sedimentos	X			
Movilización y desmovilización de equipos	X			

Indicadores:

INDICADOR	META
$Monitoreos\ caño = \frac{Monitoreos\ \text{ejecutados}}{Monitoreos\ programados}\ x\ 100$	100%

RESULTADO

MONITOREOS			
MONITOREOS CAÑO: (Monitoreos ejecutados/Monitoreos Programados) * 100			
META: 100%			
MES	**MONITOREOS EJECUTADOS**	**MONITOREOS PROGRAMADOS**	**% CUMPLIMIENTO**
Julio	1	1	100%
Febrero	1	1	100%

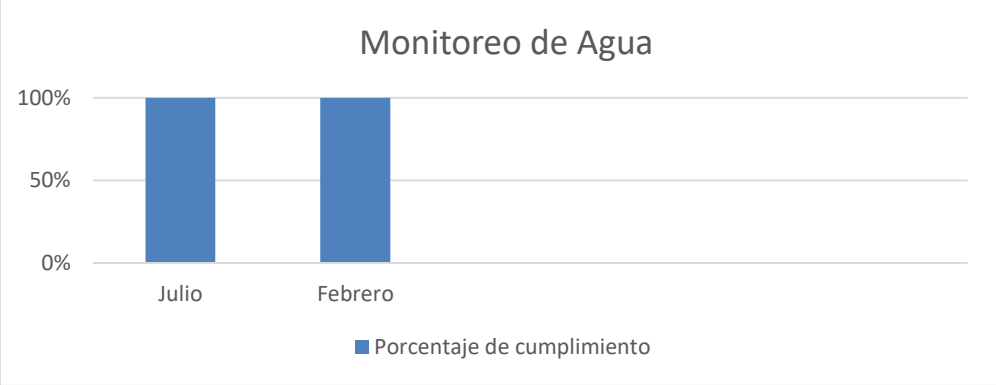

ANÁLISIS


Se realizo en este periodo el monitoreo de agua final en caño hondo.

$\textbf{Cumplimiento actividades} = \frac{\textbf{Actividades ejecutadas en el periodo}}{Actividades\ que\ aplican\ al\ período}\ x\ 100$	100%

RESULTADO

CUMPLIMIENTOS ACTIVIDADES			
CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES: (Actividades ejecutadas en el periodo/Actividades que aplican al periodo) * 100			
META: 100%			
MES	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**ACITIVDADES QUE APLICAN**	**% CUMPLIMIENTO**
Julio	1	1	100%
Agosto	-	-	-
Septiembre	9	9	100%

Octubre	9	9	100%
Noviembre	8	8	100%
Diciembre	7	7	100%
Enero	7	7	100%
Febrero	6	6	100%

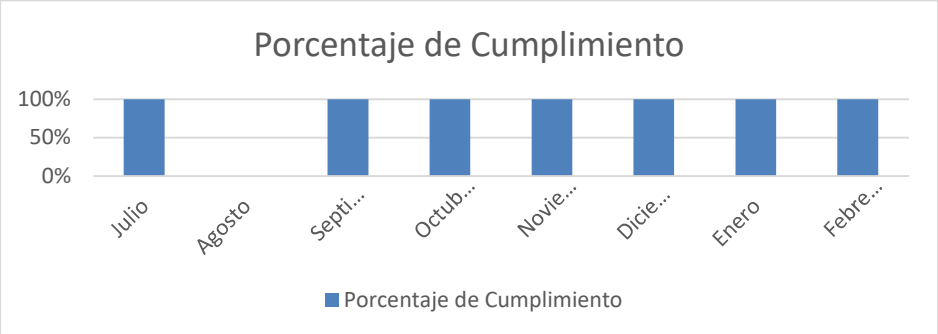

ANÁLISIS

Se cumplieron con las actividades programadas durante el periodo reportado

4.3 PROGRAMAS DEL MEDIO BIÓTICO

4.3.1 P-MB-P1 Programa De Protección De Fauna Y Flora.

Medidas para mitigar la afectación de la flora presente en el área de influencia directa del proyecto:

- En el proyecto se tiene instalado sensibilización visual por medio de letreros de prohibición.
- La biomasa vegetal producto de la tarea es aprovechado, esta fue utilizada al suelo para su aprovechamiento en el enriquecimiento de este.
- Durante la ejecución del proyecto se operó con el equipo móvil de mínimo deterioro a la vegetación

Medidas para el control a la perturbación de la fauna silvestre:

- Para las operaciones se maneja una única jornada diurna.
- Se evito realizar ruidos innecesarios por silbatos, bocinas sirenas, pitos, motores encendidos, etc.

Medidas para el control al incremento de la cacería furtiva:

- En la obra está prohibida la práctica de cacería furtiva y el porte de armas.

Medidas para el rescate y salvamento de especies:

- Antes de inicio de actividades se realiza ahuyenta miento de fauna silvestre
    - **Nota:** En el informe SALVAMENTO DE FAUNA ACUÁTICA Y TERRESTRE para profundizar de las actividades realizadas.



Imagen No 21. Pinza herpetológica en campo



Imagen No 22. Educación ambiental

Actividades del periodo:


ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
	Si	No	No Aplica	Observación
Demarcación de zona de trabajo	X			
Evitar acumular la biomasa vegetal en sitios no autorizados, mezclarla con el suelo para su aprovechamiento	X			Se realizaron las actividades programadas para su cumplimiento
En caso de poda debe realizarse con personal capacitado con las herramientas que corresponden y según las indicaciones del cliente.			X	
Realizar labores de preferencia en horarios diurnos, en caso de que sea necesaria la operación nocturna dirigir las luces hacia los sitios específicos de trabajo,	X			

evitando la iluminación de los hábitats de la fauna				
Mantenimientos a maquinaria y equipos de trabajo	X			
Evitar los ruidos innecesarios por silbatos, bocinas sirenas, pitos, motores encendidos, etc.	X			
Prohibir a los trabajadores la práctica de cacería furtiva.	X			
Educación ambiental para los trabajadores sobre protección de los recursos naturales.	X			
Salvamento de fauna acuática: equipo de personas y elementos para manejo de fauna.	X			
Ahuyenta miento, reubicación y rescate de especies	X			

Indicadores:

INDICADOR	META
$\textbf{Cumplimiento Actividades} = \frac{\textbf{Actividades ejecutadas en el periodo}}{\textbf{Actividades que aplican al período}} \textbf{ x 100}$	100%
RESULTADO	

CUMPLIMIENTOS ACTIVIDADES			
CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES: (Actividades ejecutadas en el periodo/Actividades que aplican al periodo) * 100			
META: 100%			
MES	ACTIVIDADES EJECUTADAS	ACITIVDADES QUE APLICAN	% CUMPLIMIENTO
Julio	-	-	-
Agosto	-	-	-
Septiembre	9	9	100%
Octubre	9	9	100%
Noviembre	9	9	100%
Diciembre	9	9	100%
Enero	9	9	100%
Febrero	9	9	100%

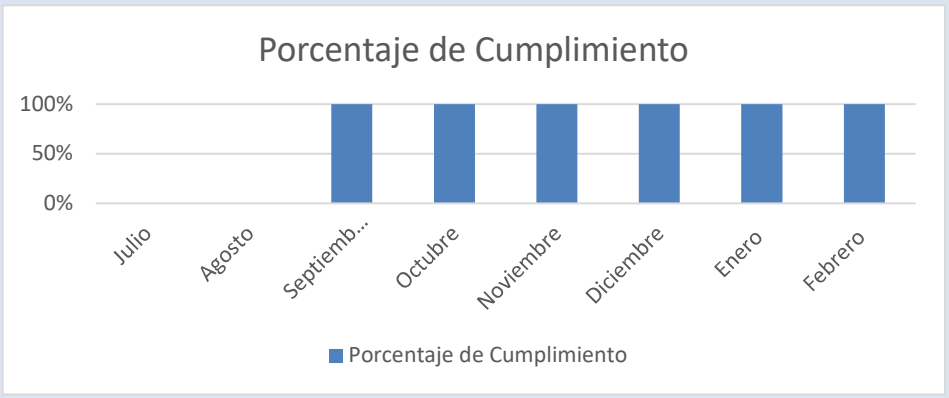

ANÁLISIS
Se cumplieron con las actividades programadas durante el periodo reportado

PROGRAMAS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO

4.4.1 P-MS-P1 Programa Socioeconómico Y Cultural.

Medidas para reducir el incremento en el riesgo de accidentes laborales:

- Se realizo la formación ambiental en los temas relacionados con las fichas de manejo Ambiental.

FECHA	TIPO DE FORMACIÓN	NOMBRE DE LA FORMACIÓN
5-feb-26	Socialización	Procedimiento en caso de ataque de abejas africanas
6-feb-26	Charla	Implicaciones de la contaminación en el suelo y agua.
12-feb-26	Ejercicio practico	En caso de ataque de abejas africanas
13-feb-26	Charla	Dia Sin Pitillo
21-feb-26	Capacitación	Protección de la biodiversidad

Tabla No 3. Educación Ambiental

- El personal vinculado conto con su dotación y elementos de protección individual

- Se prohibió el consumo de bebidas alcohólicas.

- Todo el personal conto con afiliación a una entidad prestadora del servicio de salud (EPS) y a la aseguradora de riesgos profesionales (ARP). Ver Informe HSE

- Ver informe Social para la visualización de la valla informativa

- Se prohíbe realizar fuego en área de influencia del proyecto.

Medidas para controlar la migración y el establecimiento de asentamientos humanos:

- Para la contratación de mano de obra local. Ver Informe Gestión Social del periodo.

- Se ejecutan trabajos en las zonas específicas del contrato donde hay restricción del personal externo.

    - **Nota**: En el informe de SST se puede verificar y ampliar información de charlas/capacitaciones al personal en temas de sustancias químicas, Seguridad y salud en el trabajo



Imagen No 23. Entrega de EPP



Imagen No 24. Entrega de EPP



Imagen No 25. Educación Ambiental



Imagen No 26. Ejercicio práctico ataque de abejas



Imagen No 27. Valla informativa

Actividades del periodo:

ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO			
	Si	No	No Aplica	Observación
Educación y formación ambiental en los temas relacionados con las fichas de manejo ambiental.	X			Se realizaron las actividades programadas para su cumplimiento
Uso de los elementos de protección individual	X			
Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas	X			
Prohibido hacer fuego en el área de influencia del proyecto	X			
Afiliación del personal a EPS y ARP	X			


Asistencia a reuniones de socialización			X	
Contar con valla del proyecto	X			
Restricción de personal no contratado en zona de trabajo	X			

Indicadores:

INDICADOR	META
$\textbf{Cumplimiento actividades} = \frac{\textbf{Actividades ejecutadas en el periodo}}{\textit{Actividades que aplican al período}}\ x\ 100$	100%

RESULTADO

CUMPLIMIENTOS ACTIVIDADES			
CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES: (Actividades ejecutadas en el periodo/Actividades que aplican al periodo) * 100			
META: 100%			
MES	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**ACITIVDADES QUE APLICAN**	**% CUMPLIMIENTO**
Julio	-	-	-
Agosto	-	-	-
Septiembre	7	7	100%
Octubre	7	7	100%
Noviembre	7	7	100%
Diciembre	7	7	100%
Enero	7	7	100%
Febrero	7	7	100%

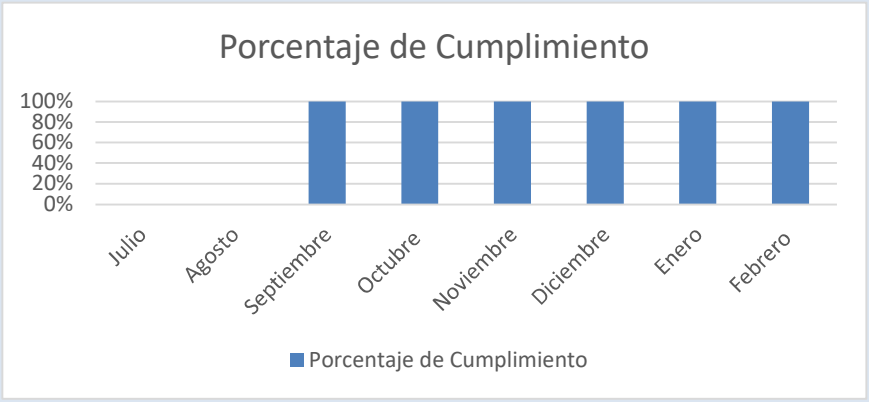

ANÁLISIS

Se cumplieron con las actividades programadas durante cada periodo de la vigencia

4.4.2 P-MS-P2 Programa Manejo De Residuos.

Manejo de residuos sólidos:

- Los residuos aprovechables y no aprovechables en las actividades de la construcción de los boxs se dispusieron con la fundación ECOPALERMO, para su aprovechamiento y su disposición final. **Ver Anexo No 3. Documentos del proveedor**

Fecha	Residuo	Cantidad Kg
18 julio 2025	Residuo no aprovechable	17.8
	Plástico	15.9
	PET	1.8
	Cartón	0,4
	Pasta	0,8
	Hierro	0,4
15 agosto -2025	Plástico	10.6
26 septiembre -2025	Residuos No aprovechables	47,3
	PVC	3.1
	PET	1
	Cartón	3,1
	Pasta	2,4
	Hierro	8
	Cartón color	3,4
	Archivo	2,3
24 octubre - 2025	Residuos no aprovechables	19
	PVC	2,3
	Tetrapak	1,4
	Plástico	5,1
28 noviembre - 2025	Residuos No aprovechables	20,5
	Plástico	50,6
	PET	5,6
4 diciembre - 2025	Residuos No aprovechables	10,4
	Plástico	35,7
	PET	9,8
	Residuos No aprovechables	78,2
	Pasta	0,2

20 enero – 2026	Cartón	3
	Plástico	78,5
	PET	5
28 febrero - 2026	Residuos No aprovechables	37,4
	Cartón	0,3
	Plástico	34
	PET	2,8

Tabla No 4. Cantidad de generación de residuos solidos

- Manejo de residuos líquidos:

- Durante esté no se registraron disposición final debido a que el baño fue retirado a finales del mes de enero.

Fecha	Cantidad (m3)
Octubre	0,080 m3
Noviembre	0,120 m3
Diciembre	0,120 m3

Tabla No 5. Cantidad de generación de residuos líquidos

Manejo De Residuos Peligrosos:

- Durante este periodo se generó residuos peligrosos estos fueron entregados al proveedor RECITRAC, el proveedor se encuentra pendiente de la generación y el envío del certificado de disposición final del mes de febrero, se adjunta en el (**Anexo No 3. Documentos del proveedor**) el manifiesto que consta que los residuos generados durante este periodo fueron entregados a dicho proveedor.

- La cantidad generada mes a mes es de:

Fecha	Tipo de residuo	Cantidad	Ud. Medida
12 – sept – 2025	Filtro de aire	9,50	Kg
08-oct-2025	Respel	6,85	Kg
31-oct-2025	Aceite usado	5	Gal
	Cartón contaminado	1,80	Kg
	Filtros de	7,25	Kg

	aceite		
	Mangueras	3,75	Kg
	RESPEL	7,70	Kg
28 nov-2025	Arenas contaminadas	2.50	Kg
17 diciembre	Papel contaminado	5	Kg
	Plástico contaminado	6	Kg
	Respel	6	Kg
	Filtros de aceite	1	Kg
	Aserrín	3	Kg
9 enero	RESPEL	15,9	Kg
30 enero	RESPEL	3,8	Kg
20 febrero	RESPEL	3	Kg

Tabla No 6. Cantidad de generación de residuos peligrosos

Almacenamiento de Residuos Peligrosos:

- Se mantiene los centros de acopio temporales de los residuos.



Imagen No 28. Retiro de retiro de residuos aprovechables de los Box



Imagen No 29. Retiro de residuos peligrosos del dragado



Imagen No 30. Almacenamiento temporal de residuos



Imagen No 31. Punto Ecologico

5. MEDIDA DE COMPENSACIÓN

Establecimiento De La Estrategia De Restauración Ecológica.

- Durante este período se continuó con las actividades de restauración ecológica, las cuales incluyen:

1. Descargue de individuos arbóreos y del abono orgánico.
2. Actividades de siembra.
3. Actividades de riego.
4. Instalación de tutores a los individuos arbóreos.
5. Refuerzo de las trincheras.
6. Actividades de georreferenciación
7. Inspección y control fitosanitario

- **Nota:** Ver en el informe de ESTRATEGIA DE RESTAURACION ECOLOGICA para profundizar de las actividades realizadas.



Imagen No 32. Descargue de individuos arbóreos



Imagen No 33. Descargue de individuos arbóreos



Imagen No 34. Actividades de hoyado



Imagen No 35. Actividades de limpieza



Imagen No 36. Actividades de siembra



Imagen No 37. Actividades de siembra



Imagen No 38. Actividades de siembra



Imagen No 39. Actividades de riego



Imagen No 40. Instalación de cercado



Imagen No 41. Instalación de cercado



Imagen No 42. Actividades de verificación de polígonos



Imagen No 43. Inspección y control fitosanitario

6. OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES

Salvamento De Fauna Acuática Y Terrestre

- Las actividades contempladas en este ítem se pueden verificar en el programa 4.3.1 P-MB-P1 Programa De Protección De Fauna Y Flora y en el informe de Salvamento De Fauna Acuática Y Terrestre

Implementación De Estrategia De Sensibilización Y Participación Ambiental Dirigido A La Comunidad En La Zona De Influencia Del Proyecto.

- Se culmino la estrategia de sensibilización de esta vigencia

Mantenimiento Preventivo De Estación De Monitoreo.

- Para este periodo no se realizó mantenimiento a las estaciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10025946235

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
HQM275	NISSAN	NP300 FRONTIER	2017

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.488	BLANCO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
YD25-648191P	N	3N6CD33B1ZK365175

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3N6CD33B1ZK365175	N	3N6CD33B1ZK365175	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING

IDENTIFICACIÓN

NIT 806003450

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 161

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482016000225433

VE: I

FECHA IMPORT.: 17/06/2016

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
26/07/2016	28/04/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

U TEC CONT/VIG/ REG TTOYTTE SANTA MARTA

LT02007060731

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185780305

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: REVICAR LA 46

NIT: 900206601

No. de Certificado de Acreditación: 13-OIN-026-001

Fecha de expedición: 2025/12/04

Fecha de vencimiento: 2026/12/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA: HQM275

CLASE: CAMIONETA

MARCA: NISSAN

MODELO: 2017

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2488

NRO. MOTOR: YD25-648191P

NRO. CHASIS: 3N6CD33B1ZK365175

VIN: 3N6CD33B1ZK365175

LÍNEA: NP300 FRONTIER

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

RUDBER ORLANDO RAMIREZ RAMIREZ

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO | MES | DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)
2025-08-05	2025-08-09	2026-08-08

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1508006395611000	HQM275	CAMPEROS O CAMIONET	PARTICULAR	2488	2017

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
5	NISSAN	NP300 FRONTIER	DOBLE CABINA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
YD25648191P	3N6CD33B1ZK365175	3N6CD33B1ZK365175	1.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PANAMERICAN DREDGING Y ENGINEERING,	*******404	NI	8060034509	BARRANQUILLA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	13543	0	PEREIRA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 618900	$ 321800	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 943100

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

[1] **Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.**

[2] **Para las demás tarifas no citadas en (1).**

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

ECOPALERMO
CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO DE RESIDUOS

CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO DE RESIDUOS PALERMO
NIT: 901610538-6

Asunto: **Certificación de Donación de Materiales Aprovechables**

La Fundación de Recicladores **ECOPALERMO**, organización sin ánimo de lucro dedicada a la labor de aprovechamiento y gestión integral de residuos sólidos reciclables, por medio del presente certifica que la empresa **CONSORCIO CGSM4**. Con Nit. 901782967-1, ubicada en el corregimiento de Palermo, ha realizado la **donación voluntaria de materiales aprovechables** a nuestra Fundación, en el marco de las actividades de recolección selectiva implementadas en el territorio. En una cantidad total de 74,5 kilos, descritos así: La donación comprendió los siguientes materiales:

RESIDUOS	CANTIDAD X KILOS
RESIDUOS NO APROVECHABLE	**37,4**
CARTON COLOR	0,3
PLASTICO	34
PET	2,8
TOTAL, ENTREGA.	**74,5**

Estos materiales fueron entregados en el mes de **FEBRERO** del 2026, cumpliendo con las condiciones adecuadas de separación en la fuente, y han sido aprovechados en los procesos de reciclaje gestionados por nuestra Fundación, beneficiando directamente a las familias recicladoras vinculadas a **ECOPALERMO.**

Agradecemos profundamente su compromiso ambiental y su valiosa colaboración con nuestra labor social. Esta acción no solo contribuye a la protección del medio ambiente, sino que también fortalece el trabajo digno de los recicladores de oficio en nuestro corregimiento.

Se expide la presente certificación a los 02 días del mes de marzo a solicitud de la parte interesada, para los fines que considere pertinentes.

Cordialmente,



Atte._____

Olga Isabel Rangel corrales
CC32825725 de soledad
Administradora

Dirección: Calle: 2ª # 7- 35 Barrio el Progreso Celular: 323 2856589 – 314 5034917
Correo: ecopalermoambiental@hotmail.com Facebook: eco Palermo Instagram: ecopalermo

BARRANQUILLA VERDE

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

RESOLUCION No 2064
FECHA: 26 SEP. 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA A LA SOCIEDAD RECITRAC S.A.S AUTORIZACION DE UNOS VEHICULOS PARA LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

La Directora General del establecimiento público BARRANQUILLA VERDE, en uso de sus funciones legales y estatutarias conferidas por la Ley 768 de 2002, la Ley 99 de 1.993, Decreto 1076 de 2.015 y el Decreto Acordal No. 0842 de Diciembre 6 de 2016, expedido por el Alcalde Distrital de Barranquilla, y

CONSIDERANDO

Que Mediante resolución No 1310 de Septiembre 17 de 2018, el EPA BARRANQUILLA VERDE, autorizó a la Sociedad RECITRAC S.A.S, ubicada en la Carrera 20 No 30-51 de este Distrito, unos vehiculos para la recoleccion y transporte de residuos peligrosos por el Término de (12) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

Que Mediante escrito radicado bajo el No 6356 de Septiembre 18 de 2019, el Señor LUIS ACOSTA GAUT en calidad de representante legal de la Sociedad denominada RECITRAC S.A.S Con Nit No 900.273.802-6 ubicada en la Carrera 20 No 30-51 de este Distrito, solicitó al EPA BARRANQUILLA VERDE, renovacion de la autorizacion de los vehiculos para la recoleccion y transporte de RESPEL .

Que funcionarios adscritos al Grupo de Inspección Vigilancia y Control del EPA BARRANQUILLA VERDE, realizaron visita de inspección técnica a las instalaciones de la Sociedad RECITRAC S.A.S, ubicada en la Carrera 20 No 30-51 de éste Distrito, emitiendo Concepto Técnico No 0001827 de Septiembre 24 de 2019, en el cual se establece lo siguiente:

ASPECTOS ENCONTRADOS.

Los vehículos a utilizar son:

Matricula	Marca	Modelo	Color	Tipo	Carroceria
BDA 193	CHEVROLET	1993	BLANCO CALMA	CAMION	FURGON
SBE 463	MERCURY	1959	BLANCO ROJO	CAMION	TANQUE
JFE 078	FORD	1969	ROJO	CAMION	TANQUE
TAQ 977	JAC	2015	BLANCO	CAMION	ESTACA

El vehiculo presenta las siguientes caracteristicas:

Kit de carreteras
Kit derrame (pala anti chispas, cinta, demarcación, material aboserbente)
Tanque de lixiviado.
Presentan logo un rombo NFPA
Luces laterales con sistema reflectivo.
E.P.P (mascarillas guantes, gafas de seguridad botas entre otros)
Plan de contingencia en ruta.
Sistema de poleas de aseguramiento para tanques.
Extintores
Dispositivo sonoro de marcha en reversa.
Equipos de comunicación.
Tecnicomecanica soat y documentos de transito.

Scanned by CamScanner

RESOLUCION No 0 6 4
FECHA: 26 SEP. 2019

EVALUACIÓN

La auoridad ambiental del EPA BARRANQUILLA VERDE, realiza inspeccion técnica a este tipo de vehiculos de empresas encargadas de la recoleccion y transporte de residuos peligrosos con el fin de verificar que estos vehiculos cumplan con normas de seguridad y contingencias requeridas para el transporte de residuos peligrosos.

Luego de la inspeccion realizada al vehiculo presentando por la Sociedad denominada RECITRAC S.A.S, se pudo corroborar que este cuenta con las caracteristicas técnicas estblecidas en la normatividad ambiental Decreto 1609 de 2002 y Articulo 2.2.6.1.3.6 obligaciones del transportador de residuos o desechos peligrosos Decreto 1076 de 2015 en lo referente a las obligaciones del transportador de resiudos o desechos peligrosos por carretera.

Lo anterior debido a que estos vehiculos inspeccionados por el EPA BARRANQUILLA VERDE, esta dotado con elementos de protección adecuados y cumplen con las caracteristicas externas e internas del medio de transporte en lo concerniente a medidas de seguridad y contingencias.

Este Despacho considera procedente autorizar los vehiculos BDA 193 marca chevrolet modelo 1993, SBE 463 Marca Mercury modelo 1959, JFE 078 Marca Ford modelo 1969 y TAQ Marca Jac modelo 2015, a la Sociedad denominada RECITRAC S.A.S, ubicada en la Carrera 20 No 30-51 de este Distrito, para la recoleccion y transporte de aceite usados y aguas oleosas, por el término de (24) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

Que la Ley 99 de 1993 creó las autoridades ambientales en Colombia y les asignó unas competencias dentro de las cuales se encuentra la de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales o renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, éstas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

Que el articulo 338 de la Constitución Politica de Colombia establece que la ley, las Ordenanzas y los Acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen las tarifas de las tasas y contribuciones, que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que le presten.

Que el EPA BARRANQUILLA VERDE, expidió la Resolución 1215 de octubre 31 de 2017, por medio del cual se establece el procedimiento y tarifas de cobro de servicios de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

Que el Decreto Acordal No. 0842 de Diciembre 6 de 2016, expedido por el Alcalde Distrital de Barranquilla, erigió al Establecimiento Público Ambiental BARRANQUILLA VERDE, como máxima autoridad ambiental en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, confiriéndole dentro de sus atribuciones la de recaudar, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y fijar montos con base a las tarifas y sistemas de cálculo que fije la Ley.

En mérito de lo expuesto

Scanned by CamScanner

RESOLUCION No 0 6 4
FECHA: 26 SEP. 2019

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la Sociedad denominada RECITRAC S.A.S, Con Nit No 900.273.802-6, ubicada en la Carrera 20 No 30-51 de este Distrito, la recoleccion y transporte de aceite usados y aguas oleosas por el término de (24) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, los siguientes vehiculos:

Matricula	Marca	Modelo	Color	Tipo	Carroceria
BDA 193	CHEVROLET	1993	BLANCO CALMA	CAMION	FURGON
SBE 463	MERCURY	1959	BLANCO ROJO	CAMION	TANQUE
JFE 078	FORD	1969	ROJO	CAMION	TANQUE
TAQ 977	JAC	2015	BLANCO	CAMION	ESTACA

ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad denominada RECITRAC S.A.S, Con Nit No 900.273.802-6, ubicada en la Carrera 20 No 30-51 de éste Distrito deberá darle cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Brindar un manejo adecuado y seguro de los residuos y desechos recepcionados para realizar una o varias de las etapas de manejo, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.

2. Expedir con el personal que tenga la formacion y capacitacion adecuada para el manejo dde los residuos peligrosos.

3. Contar con el personal que tenga la formacion y capacitacion adecuada para el manejo de los residuos peligrosos.

4. indicar el tipo de actividad, tipo de residuos o desechos peligrosos que esta autorizado a manejar.

5. Garantizar la gestion y manejo integral de los resiudos o desechos peligrosos que recibe para transportar.

6. Dar cumpliminento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancias peligrosas por carretera o aquella norma que la modifique o sustituya.

7. Entregar la totalidad de los residuos o desechos peligrosos recibidos de un generrador al receptor debidamente autorizado designado por dicho generador.

8. En casos que el transportador preste el servicio de embalado y etiquetado de residuos o desechos peligrosos a un generador debe realizar estas actividades de acuerdo con los requsitos establecidos en la normatividad vigente.

9. En ningún momento movilizar en un mismo vehiculo residuos o desechos peligrosos que sean incompatibles.

10. Realizar actividades de lavado de vehiculos que hayan transportados residuos o desechos peligrosos o sustancias o productos que pueden conducir a la generación de los mismos solamente en sitios que cuenten con los permisos ambientales a que haya lugar.

11. Responsabilizarse solidariamente con el remitente de los residuos en caso de contingencia, por el derrame o esparcimiento de residuos o desechos peligrosos en las actividades de cargue, transporte y descargue de los mismos.

Scanned by CamScanner

RESOLUCION No 2064
FECHA: 26 SEP. 2019

ARTICULO TERCERO: La sociedad denominada RECITRAC S.A ubicada en la Carrera 20 No 30-51 de este Distrito, deberá avisar al ESTABLECIMIENTO PÙBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE, cualquier cambio que realice con respecto a su actividad productiva, dirección o política ambiental.

ARTICULO CUARTO: La sociedad denominada RECITRAC S.A.S ubicada en la Carrera 20 No 30-51 de este Distrito, será responsable civilmente ante la Nación y/o terceros, por la contaminación y/o daños que puedan ocasionar sus actividades.

ARTICULO QUINTO: EL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE, se reserva el derecho de realizar visitas en las instalaciones de la sociedad denominada RECITRAC S.A, ubicada en la Carrera 20 No 30-51 de este Distrito, cuando lo considere necesario.

ARTICULO SEXTO: Ordénese a la sociedad denominada RECITRAC S.A.S ubicada en la Carrera 20 No 30-51 de éste Distrito, través de su representante legal la cancelación de los costos por concepto de Costos de Evaluación para expedición de la autorizacion de vehiculos para la recolección y transporte de residuos peligrosos, la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($ 3.850.000.oo.), los cuales deberá pagar en la cuenta de Ahorro No 027000088016 del Banco Davivienda de ésta Ciudad, Numero de convenio 1173707 (Referencia 1) Número de identificación (cedula o Nit del usuario), (Referencia 2) Número de factura o recibo indicada por la Subdirección Administrativa y Financiera, del ESTABLECIMIENTO PÙBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE, cancelados dentro de los cinco (05) días hábiles a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar el contenido de la presente providencia al representante legal de la sociedad denominada RECITRAC S.A.S, ubicada en la Carrera 20 No 30-51 de éste Distrito, o a su apoderado debidamente constituido, según los Artículos 66 y 69 del C.PA.C.A.

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia solo procede el Recurso de Reposición ante la Directora General del Establecimiento Público BARRANQUILLA VERDE, dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la Notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en el Numeral 1 del artículo 74 del CPA.C.A.

NOTIFÍQUESE YCUMPLASE

Dada en Barranquilla, a los 26 SEP. 2019

SARA BÉLEN RODRIGUEZ MANZUR
DIRECTORA GENERAL – BARRANQUILLA VERDE

Proyectó: Milena Caballero Abogado Contratista
Revisó: Rita Navarro

Scanned by CamScanner

BARRANQUILLA VERDE

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial Industrial y Portuario

RESOLUCION No 2064
FECHA:
26 SEP. 2019

DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN

En Barranquilla D.E.I.P. a los 02 días del mes 10 de 2019, se notificó personalmente del contenido de la presente Resolución No 2064 de fecha 26 SEP/19 al Señor Luis Acosta Gavt identificado con cédula de ciudadanía No 15512170 de Cartagena a quien luego de leerla, se le entrego copia íntegra, autentica y gratuita de la mencionada Resolución y se le informo que contra esta procede legalmente el Recurso de Reposición ante el Director General del Establecimiento Público Ambiental BARRANQUILLA VERDE, dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la Notificación personal, según lo establecido en el Numeral 1 del artículo 74 del CPA .C.A.

Luis Acosta
15.512.170
EL NOTIFICADO

Gustavo Bulla
EL NOTIFICADOR.

Scanned by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socialización			

Fecha: 05/02/2026	**Lugar:** Reforestación
Expositor: Yesmith Polo Navarro	**Hora Inicio:** 7:40am **Hora Final:** 7:55am
Temas: Procedimiento en caso de bloque de abejas africanas	**Obra:** CBS44 - Cerro Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Carlos Gomez	1083 572 789	Consorcio	Ayudante	Carlos Gomez
2.	Carlos Alvarez	1079913769	Consorcio	Ayudante	Carlos Alvarez
3.	Jesus David MANOTAS	1079914724	Consorcio	Ayudante	Jesus D MANOTAS
4.	Jose CuBallERO	1079974636	consorcio	Ayudante	JoseCuBallERO
5.	Brayan David	1004121831	Consorcio	Ayudante	Brayan
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5	**Firma del Expositor (es):** Yesmith Polo Navarro

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Seguridad vial			

Fecha: 1/08/2024 **Lugar:** Box culvert #4

Expositor: Yesuth Polo Cuevas **Hora Inicio:** 7:40am **Hora Final:** 8:55am

Temas: Prevención en caso de atropellamiento de trabajadores **Obra:** CBSM4 - Centro Hermida

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Edwin Carbello	1079916894	R.F.	Oficial	Edwin C
2.	Reinaldo Martinez P	5078217	R.F	Ay. de obra	
3.	Leonel Ternera	1079913169	RF	AYUDANTE	Leonel
4.	Miguel Leiva	1.199316578	RF	Ayudante	Miguel Leiva
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 4 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socializa ción			

Fecha: 05/02/2026 **Lugar:** Boxculvert #3

Expositor: yesuth polo navarro **Hora Inicio:** 10:20am **Hora Final:** 10:35am

Temas: Procedimiento en caso de ataque de abejas africanas **Obra:** CGSM4- Cauce Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Adolfo Bonett	5078316	RF	cafetaz	
2.	manuel Pasion	5078804	RF	obrero	manuel Pasion
3.	Jadrivan Orozco	9877310	Rf	ayudante	Jadrivan Orozco
4.	Orlando Carrillo	85479893	Rf	maestro	
5.	Germans Borja.	5078169	RF	oficial	Germ
6.	Kevin Alvarez	1004723782	Rf	ayudante de obra.	Kevin A
7.	Sebastián Anillo	17955049	R.F	Aido	
8.	Luis escorcia S	1081027248	Rf	A d o	
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 8 **Firma del Expositor (es):** yesuth Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socialización			

Fecha: 05/02/2026 **Lugar:** Box cubículo # 2

Expositor: Yesenia polo navarro **Hora Inicio:** 01:00 pm **Hora Final:** 01:15 Pm

Temas: Procedimiento en caso de atraque de abejas africanas **Obra:** CPSMU - Caño Hondo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Eduardo Castillo	1.09.3498	M H.	Ayudante	
2. Gilberto Alvarez	85479599	M H	ayudante	Gilberto Alvarez
3. Carlos Mercado Rodas	1028883345	M H	ayudante	Carlos Mercado
4. Yaser Gamez	1004129111	M H	ayudante	Yaser Gamez
5. Jesus Orozco	1195[illegible]106	M H	ayudante	Jesus Orozco
6. Alfredo Herrera	5078498	M H	Oficial	
7. Daniel Ricardo	8506100	M H	oficial	
8. Davinson Tordino	1079912738	M H	Ayudante	Davinson Tordino
9. Reinaldo	7595150	M H	Ayudante	Reinaldo
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 9 **Firma del Expositor (es):** Yesenia polo n

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007
		Versión: 3
		Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socialización			

Fecha: 05/02/2026 **Lugar:** Reforestación

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 7:14am **Hora Final:** 7:55am

Temas: Procedimiento en caso de ataque de abejas africanas **Obra:** C6544 - Cauce Mundo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Carlos Gamez	1083 572 789	consorcio	Ayudante	Carlos Gamez
2. Carlos Alvarez M	1029913769	consorcio	Ayudante	Carlos Alvarez
3. Jesus David Manotas	1079914724	Consorcio	Ayudante	Jesus David Manotas
4. Jesseca Bullero	1079934634	consorio	Ayudante	Jesseca Bullero
5. Brayan Daniel	1004114831	Consorcio	Ayudante	Brayan Daniel
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 5 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 3 Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socialización			

Fecha: 05/02/2026 **Lugar:** Box culvert #4

Expositor: Yesmith Polo Navarro **Hora Inicio:** 09:40am **Hora Final:** 09:55am

Temas: Procedimiento en caso de ataque de abejas africanas **Obra:** C6514 - Cauca Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Edilfo Cortell	1079916794	RF	oficial	Edilfo
2.	Ronaldo Martinez P	5078217	RF	A. de obra	Martinez
3.	Leonel Tercera	1079913169	RF	AYUDANTE	Leonel
4.	Miguel Leiva	1.193165789	RF	Ayudante	Miguel Leiva
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 4 **Firma del Expositor (es):** Yesmith Polo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 3 Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		**Charla Seguridad**		**Charla Técnica**	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socialización			

Fecha: 05/02/2026 **Lugar:** Barcaza #3

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 10:10am **Hora Final:** 10:35am

Temas: Procedimiento en caso de ataque de abejas africanas **Obra:** CGSM4 - Canal Navidad

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Pedro Baretl	5078310	RF	capataz	
2.	Manuel Pasian	5078804	RF	abrir	Manuel Pasian
3.	Jader Ivan Marcos	9077310	RF	ayudante	Jader Ivan M.
4.	Orlando Carrillo	85479875	RF	maestro	
5.	Kevin Alvarez	1004237226	RF	ayudante de obra	Kevin A
6.	German Borja	5078168	RF	OFICIAL	German
7.	Sebastián Avilo	1795330402	RF	Ado	Sebastián
8.	Luis Escorcia S	1081027296	RF	Ado	
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 8 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 3 Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socialización			

Fecha: 05/02/2026	**Lugar:** Barcaderet #2	
Expositor: Yesuth Polo Navarro	**Hora Inicio:** 01:00pm	**Hora Final:** 01:15pm
Temas: Procedimiento en caso de ataque de abejas africanas	**Obra:** CPS114 - Caño Hondo	

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Edoardo Tilbe	5.093.498	M H.	Ayudante	
2.	Edilberto Alvarez	85479598	M H	ayudante	
3.	Carlos Mercado Rodas	1091028345	M H	ayudante	
4.	NAYER FUN	1004129	M H	ayudante	
5.	JESUS OROZCO	1193540906	M H	ayudante	
6.		5078497	M H	oficial	
7.	Daniel Ricardo	8506100	M H	oficial	
8.	Davinson Fandiño	1079912738	M H	Ayudante	
9.	Reinaldo	7595150	M H	AYUDANTE	
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 9	**Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 06/02/2026 **Lugar:** Boxculvert # 1

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 7:10am **Hora Final:** 7:25am

Temas: Implicaciones de la contaminación en el suelo y agua **Obra:** CBS 44 - Cauca Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Roberto carlos B	5078708	MH	Ayudante	Roberto
2.	Oliver Ropain	1081028764	MH	Ayudante	
3.	Eduardo Perez	7331640	MH	Maestro	
4.	Heberto Jose	5078924	MH	Ayudante	Heberto
5.	Jose Jorge	1126120263	MH	Ayudante	Jose Jorge
6.	Jorge luis	1009121720	MH	Ayudante	Jorge luis
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 6 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-06-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 06/02/2026 **Lugar:** Box culvert #4

Expositor: yesuth polo navarro **Hora Inicio:** 10:20am **Hora Final:** 10:35am

Temas: Implicaciones de la contaminación en el suelo y agua **Obra:** CB544- cuño Hondo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Leonel Tenorio	1079913169	R F	A. De obra	leonel
2. Reynaldo Martinez	5078217	R F	A. De obra	
3. Edulfo Contillo	1079916791	R F	Oficial	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 3 **Firma del Expositor (es):** yesuth polo n

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 3 Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 06/02/2026 **Lugar:** Box culvert #1

Expositor: Yesuth polo navarro **Hora Inicio:** 7:10am **Hora Final:** 7:15am

Temas: Implicaciones de la contaminación en el suelo y agua **Obra:** CBS44 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Roberto Carlos B	5078708	MH	Ayudante	Roberto
2.	Oliver Popain	1081029364	MH	Ayudante	
3.	Escalder Perez	7331402	MH	Maestro	
4.	Heriberto Jose	5078921	MH	Ayudante	Heriberto
5.	Jose Jorge	1126120263	MH	Ayudante	Jose Jorge
6.	Jorge luis	1004127973	MH	Ayudante	Jorge luis
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 6 **Firma del Expositor (es):** Yesuth polo

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 3 Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 06/02/2026 **Lugar:** Boxculvert #4

Expositor: yesuth polo navarro **Hora Inicio:** 9:20am **Hora Final:** 10:35am

Temas: Implicaciones de la contaminación en el suelo y agua **Obra:** CBSM4 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Edulfo Castillo	1079916298	RF	Oficial	Edulfo C
2. Reynaldo Martinez	5078217	RF	A. De Obra	
3. Leonel Tercera	1079913169	RF	A. De obra	Leonel
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 3 **Firma del Expositor (es):** yesuth polo

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 13/02/2026 **Lugar:** Box culvert #2

Expositor: Yesuth polo navarro **Hora Inicio:** 8:00am **Hora Final:** 8:15am

Temas: Dia sin pitillo **Obra:** CGSM4 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Eduardo Cantillo	5.095494	M. H.	Ayudante	
2.	Heriberto Josa	5078921	M H	Ayudante	Heriberto
3.	oliver Robain	1081028364	MH	Ayudante	
4.	Daniel Ricardo	8506100	H H	oficial	
5.	Roberto carlos B	5078708	MH	Ayudante	Roberto
6.	Jesus Orozco	1143549966	MH	ayudante	Jesus Orozco
7.	Arturo Herrera	5078402	MH	Oficial	
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 7 **Firma del Expositor (es):** Yesuth polo n

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica		
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa		
Otro		¿Cuál?				

Fecha: 13/02/2026 **Lugar:** Boxculvert #3

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 8:50am **Hora Final:** 09:05am

Temas: Dia sin Pitello **Obra:** CGSM4 - Caño Honda

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Adolfo Bonett	5078710	RE	capataz	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 1 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 3 Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 13/02/2026 **Lugar:** Box culvert #2

Expositor: Yesmitt Polo Navarro **Hora Inicio:** 8:00am **Hora Final:** 8:15am

Temas: Día sin pitillo **Obra:** C6544 - Canto Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Eduardo Cantillo	5.095498	M H	Ayudante	
2	Heriberto Jose	5078925	M H	Ayudante	
3	Oliver Morair	1001021764	MH	Ayudante	
4	Daniel Ricardo	8506100	M H	oficial	
5	Roberto carlos B	5078708	MH	Ayudante	
6	Jesus Orozco	1195448906	MH	Ayudante	Jesus Orozco
7	Arturo Herrera	5078492	MH	Oficial	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Número Total de Participantes: 7 **Firma del Expositor (es):** Yesmitt Polo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007
		Versión: 3
		Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 13/02/2026 **Lugar:** Boxculvert #3

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 8:50am **Hora Final:** 09:05am

Temas: Dios Su Pueblo **Obra:** CGS 114 - Camino Nuevo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Adalto Bonell	5078310	RT	Capataz	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 1 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 27/02/2026	**Lugar:** Boxculvert #	
Expositor: yesmith Polo navarro	**Hora Inicio:** 7:20am	**Hora Final:** 7:40am
Temas: Protección de la biodiversidad	**Obra:** CGSM4 - Caño Hondo	

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Jose Jorge	1126 120 263	MH	Ayudante de obra	Jose Jorge
2.	Jesus Orozco	1193543906	MH	ayudante	Jesus Orozco
3.	Heriberto Jose	5078921	MH	Ayudante	Heriberto
4.	Oliver Lopain	1091021364	MH	oficio	Oliver
5.	Jorge luis	1004121720	MH	Ayudante de obra	Jorge luis
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5

Firma del Expositor (es): yesmith polo n

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 27/02/2026 **Lugar:** Box culvert #2

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 9:00am **Hora Final:** 09:15am

Temas: Protección a la biodiversidad **Obra:** CBS44- Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Eduardo Cantillo C	5.095.[illegible]	M H	Ayudante	
2.	Arturo Herrera	5078492	M H	Oficial	
3.	Roberto carlos Borja	5078708	M H	Ayudante	
4.	Elbyta Alvarez	25479599	M H	Ayudante	
5.	Fuentes Sherley	1079912124	M H	Ayudante	
6.	Reinaldo	7595150	M H	Ayudate	Reinaldo
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 6 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 21/02/2026 **Lugar:** Box Culvert #3

Expositor: Yesmith Polo Navarro **Hora Inicio:** 11:30am **Hora Final:** 11:45am

Temas: Protección de la biodiversidad **Obra:** CBS44 - Canto Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Jader Ivan draco	9877310	RF	ayudante	Jader Ivan O.
2.	Kevin Alvarez	1004213282	RF	ayudante	Kevin A
3.	Miguel Leiva	1-1931657897	RF	AYUDANTE	Miguel Leiva
4.	Eduardo	1099116294	RF	oficial	Eduardo e
5.	Sebastián Anillo	17955049	RF	Ayudante	Anillo
6.	Jesus N Palmer	1105099996	UNP	Topografo	Jesus N P
7.	Germán Borja	5078169	RF	Oficial	Germán
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 7 **Firma del Expositor (es):** Yesmith Polo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007
		Versión: 3
		Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 21/02/2026	**Lugar:** Boxculvert #1	
Expositor: yesuth polo navarro	**Hora Inicio:** 7:20am	**Hora Final:** 7:40am
Temas: Protección de la biodiversidad	**Obra:** CGS44 - Caño Hondo	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Jose Jorge	1126120263	MH	A De obra	Jose Jorge
2. Jesus Orozco	1143941906	MH	Ayudante	Jesus Orozco
3. Heriberto Jose	5878921	MH	Ayudante	Heriberto
4. Oliver Rapain	1091027564	MH	Oficial	
5. Jorgelwis	1004121720	MH	Ayudante	Jorgelwis
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 5

Firma del Expositor (es): yesuth polo n

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 3 Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 27/02/2026 **Lugar:** Box culvert #2

Expositor: Yesnelt Polo Navarro **Hora Inicio:** 09:00am **Hora Final:** 09:15am

Temas: Protección de la biodiversidad **Obra:** CG SM4 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Eduardo Castillo	5.095499	M H.	Aguatero	
2.	Arturo Herrera	5078491	MH	Oficial	
3.	Roberto carlos Borja	5078708	MH	Ayudante	
4.	Edilberto Alegria	85479599	MH	Ayudante	
5.	Jhonathan Schuffer	1079912124	MH	ayudante	
6.	Reinaldo	7595150	MH	ayute	Reinaldo
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 6 **Firma del Expositor (es):** Yesnelt Polo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 3 Fecha: 14/11/2018

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 27/02/2026 **Lugar:** Box culvert #3

Expositor: Yesuth Polo Novano **Hora Inicio:** 11:30am **Hora Final:** 11:45am

Temas: Protección de la biodiversidad **Obra:** CG544 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Jader Ivan Orozco	9877310	RF	ayudante	Jader Ivan Orozco
2.	Kevin Alvarez	1004213282	RF	ayudante de obra	Kevin A
3.	Miguel Leivol	1193165789	RF	AYUDANTE	Miguel Leivol
4.	Edilfo C	1079916974	RF.	oficial	Edilfo C
5.	Sebastián Avilla	17955049	RF	A d O	Sebastián
6.	Jesus D Palma	1100549993	U u D	Operador	Jesus D P.
7.	Germán Borja.	5072169	RF	oficial	Germán
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 7 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

FECHA:	12/02/2026
NOMBRE DEL OBSERVADOR:	Yesmith Polo Navarro
TIPO DE EMERGENCIA	Ataque de abejas africanas
PROYECTO:	CGSM4 - Caño Honda
EMBARCACION:	

PARTICIPANTES*

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Jesus Manotas	Consorcio	Jesus Manotas
Johandys Orozco	Consorcio	Johandys Orozco
Cesar santodomingo	consorcio	Cesar Stodomingo
Sinbaldo	Consorcio	Sinbaldo
Jose caballero	consorcio	Jose caballero

- En caso de que haya más participantes, regístrelos en el GH-R-007 Formato de asistencia a charlas o capacitaciones

Powered by CamScanner

	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
EVALUACION GENERAL				
¿Se tomaron las acciones iniciales pertinentes por quien detecto la emergencia?	✓			
¿Los participantes conocían sus roles y responsabilidades para la emergencia?	✓			
¿Se activaron los planes y procedimientos relacionados?	✓			
¿El ejercicio se realizó en forma ordenada y disciplinada?	✓			
¿Asistió todo el personal?		✓		
¿Fallo algún equipo o sistema?		✓		
EVALUACIÓN DE EVACUACIÓN				
¿Se dio la voz de alerta (se realizaron maniobras de resguardo)?	✓			
¿Se dio la voz de alarma?	✓			
¿La alerta y alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas?			✓	
¿Todos los empleados y visitantes acataron la señal de alerta y alarma?			✓	
¿Se tiene una adecuada señalización de las rutas de evacuación?			✓	
¿Las rutas de evacuación fueron suficientes para la evacuación de todos los participantes?			✓	
¿Se realizó la evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes?	✓			

Powered by CamScanner

	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
¿Se identificó (aron) al (los) Líder y/o Coordinador (es) de evacuación?			✓	
¿El (los) Líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó (aron) con claridad sus funciones?			✓	
¿El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verifico o vatido que el personal a su cargo evacuo su área?			✓	
¿Se contó con participación total de las áreas y partes interesadas para la realización del ejercicio?		✓		
EVALUACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO				
¿Hubo organización en el o los puntos de encuentro?	✓			
¿Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas las medidas de seguridad para los participantes que evacuaron?	✓			
¿Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y visitantes que evacuaron?	✓			
¿Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron novedades?	✓			
¿El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de reingreso?	✓			
¿Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de encuentro?	✓			
¿Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad?	✓			

Powered by CamScanner

CONTROL DE TIEMPOS

Señor observador: Registre cronológicamente todas las actividades que se realicen **durante el simulacro**, indicando la hora

ACTIVIDAD	HORA	OBSERVACIONES
Activación de la alerta		
Activación de la alarma de emergencia		
Salida de la primera persona		
Salida de la última persona		
Llegada de la primera persona al punto de encuentro		
Llegada de la última persona al punto de encuentro		
Retorno a las instalaciones		

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 12/02/2026 **Lugar:** Refuerzo de cim

Expositor: yesuth polo navarro **Hora Inicio:** 7:32am **Hora Final:** 7:47am

Temas: Evaso de ataque de abejas africanas **Obra:** CBSU4 - Cam Heredia

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Jesus Manotas	1079947424	Consorcio	Ayudante	Jesus Manota
2.	Johandys Orozco T	1009218504	Consorcio	Marino	Johandys O
3.	Cesar Santodomingo	1079936122	Consorcio	Ayudante	Cesar Stodomingo
4.	Balboa	1004117728	Consorcio	Marino	Balboa
5.	JOSE CABALLERO	1079934664	consorcio	AYUDANTE	Jose Caballero
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5 **Firma del Expositor (es):** yesuth polo n

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

FECHA:	12/02/2026
NOMBRE DEL OBSERVADOR:	Yesmith Polo Navarro
TIPO DE EMERGENCIA	Ataque de abejas africanas
PROYECTO:	CGSM - Caño Mocho
EMBARCACION:	

PARTICIPANTES*

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Luis Escorcia	RF	
Leonel Ternera	RF	Leonel
Miguel Leiva	RF	Miguel Leiva
Reinaldo Martinez P	RF	
Sebastián Castillo	RF	Castillo
Jader Ivan Orozco	RF	Jader Ivan Orozco O
Kevin Alvarez	RF	Kevin
Edwin Lopez	RF	Edwin Lopez C

- En caso de que haya más participantes, regístrelos en el GH-R-007 Formato de asistencia a charlas o capacitaciones

Powered by CamScanner

	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
EVALUACION GENERAL				
¿Se tomaron las acciones iniciales pertinentes por quien detecto la emergencia?	✓			
¿Los participantes conocían sus roles y responsabilidades para la emergencia?	✓			
¿Se activaron los planes y procedimientos relacionados?	✓			
¿El ejercicio se realizó en forma ordenada y disciplinada?	✓			
¿Asistió todo el personal?		✓		
¿Fallo algún equipo o sistema?		✓		
EVALUACIÓN DE EVACUACIÓN				
¿Se dio la voz de alerta (se realizaron maniobras de resguardo)?	✓			
¿Se dio la voz de alarma?	✓			
¿La alerta y alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas?			✓	
¿Todos los empleados y visitantes acataron la señal de alerta y alarma?			✓	
¿Se tiene una adecuada señalización de las rutas de evacuación?			✓	
¿Las rutas de evacuación fueron suficientes para la evacuación de todos los participantes?			✓	
¿Se realizó la evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes?	✓			

Powered by CamScanner

	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
¿Se identificó (aron) al (los) Líder y/o Coordinador (es) de evacuación?			✓	
¿El (los) Líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó (aron) con claridad sus funciones?			✓	
¿El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verifico o valido que el personal a su cargo evacuo su área?			✓	
¿Se contó con participación total de las áreas y partes interesadas para la realización del ejercicio?		✓		
EVALUACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO				
¿Hubo organización en el o los puntos de encuentro?	✓			
¿Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas las medidas de seguridad para los participantes que evacuaron?	✓			
¿Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y visitantes que evacuaron?	✓			
¿Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron novedades?	✓			
¿El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de reingreso?	✓			
¿Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de encuentro?	✓			
¿Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad?	✓			

Powered by CamScanner

CONTROL DE TIEMPOS

Señor observador: Registre cronológicamente todas las actividades que se realicen **durante el simulacro**, indicando la hora

ACTIVIDAD	HORA	OBSERVACIONES
Activación de la alerta		
Activación de la alarma de emergencia		
Salida de la primera persona		
Salida de la última persona		
Llegada de la primera persona al punto de encuentro		
Llegada de la última persona al punto de encuentro		
Retorno a las instalaciones		

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 12/01/2026 **Lugar:** Boxculvert #4

Expositor: yesuth polo navarro **Hora Inicio:** 09:35am **Hora Final:** 09:51am

Temas: En caso de ataque de abejas africanas **Obra:** CBS44- Coño Hermoso

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Luis Escorcia	1081027298	RF	ayudante de obra	
2.	Leonel Ternera	1079913159	RF	Ayudante	Leonel
3.	Miguel Leiva	1.193165789	RF		Miguel Leiva
4.	Reinaldo Martinez P	5078217	RF	A. de obra.	
5.	Sebastián Acuña	17955049	RF	A d O	
6.	Jadryan Charco	9874310	RF	ayudante	Jadryan C.
7.	Kevin Alvarez	1004213202	RF	ayudante de obra	Kevin A
8.	Eduardo	1079916290	RF	oficial	Eduardo C
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 8 **Firma del Expositor (es):** yesuth polo n

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO	
NOMBRE Y APELLIDO	Jose Jorge
CARGO:	Ayudante
FECHA:	21-02-2026
TEMA:	PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Marca con una X la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la biodiversidad?

A) Solo los animales que viven en un ecosistema
B) La variedad de animales, plantas y ecosistemas que existen en un lugar
C) Únicamente las plantas de un área protegida
D) La cantidad de agua en ríos y lagunas

2. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a proteger la biodiversidad en el lugar de trabajo?

A) Arrojar residuos en ríos o canales
B) Capturar animales silvestres para uso personal
C) Respetar las áreas de trabajo y no molestar la fauna
D) Mover sedimentos sin control

3. ¿Qué efecto puede tener el dragado si no se realiza con cuidado sobre la biodiversidad?

A) Mejorar la vida de los animales
B) Alterar hábitats y afectar a la fauna y flora acuática
C) Proteger los ecosistemas automáticamente
D) Aumentar la diversidad de especies

4. ¿Qué debe hacer un trabajador si encuentra fauna silvestre durante las labores?

A) Ignorarla y continuar trabajando
B) Capturarla para llevarla a casa
C) Informar al supervisor o al área ambiental y seguir las indicaciones
D) Moverla sin cuidado a otro lugar

5. ¿Por qué es importante proteger la biodiversidad en el trabajo diario?

A) Solo porque es un requisito legal
B) Porque mantiene el equilibrio natural y garantiza recursos para todos
C) Solo para evitar multas ambientales
D) Para que los animales no se acerquen a la maquinaria

EVALUADOO POR: _____ **CARGO:** _____ **CALIFICACION**_____

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO	
NOMBRE Y APELLIDO	Jesus otorco G
CARGO:	ayudante
FECHA:	21-02-2026
TEMA:	PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Marca con una X la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la biodiversidad?

A) Solo los animales que viven en un ecosistema
B) X La variedad de animales, plantas y ecosistemas que existen en un lugar
C) Únicamente las plantas de un área protegida
D) La cantidad de agua en ríos y lagunas

2. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a proteger la biodiversidad en el lugar de trabajo?

A) Arrojar residuos en ríos o canales
B) Capturar animales silvestres para uso personal
C) X Respetar las áreas de trabajo y no molestar la fauna
D) Mover sedimentos sin control

3. ¿Qué efecto puede tener el dragado si no se realiza con cuidado sobre la biodiversidad?

A) Mejorar la vida de los animales
B) X Alterar hábitats y afectar a la fauna y flora acuática
C) Proteger los ecosistemas automáticamente
D) Aumentar la diversidad de especies

4. ¿Qué debe hacer un trabajador si encuentra fauna silvestre durante las labores?

A) Ignorarla y continuar trabajando
B) Capturarla para llevarla a casa
C) X Informar al supervisor o al área ambiental y seguir las indicaciones
D) Moverla sin cuidado a otro lugar

5. ¿Por qué es importante proteger la biodiversidad en el trabajo diario?

A) Solo porque es un requisito legal
B) X Porque mantiene el equilibrio natural y garantiza recursos para todos
C) Solo para evitar multas ambientales
D) Para que los animales no se acerquen a la maquinaria

EVALUAD0O POR:_____ **CARGO:** _____ **CALIFICACION**_____

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO	
NOMBRE Y APELLIDO	Hb Eubeyto Pasion
CARGO:	Ayudante
FECHA:	02/2/26
TEMA:	PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Marca con una X la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la biodiversidad?

A) Solo los animales que viven en un ecosistema
B) X La variedad de animales, plantas y ecosistemas que existen en un lugar
C) Únicamente las plantas de un área protegida
D) La cantidad de agua en ríos y lagunas

2. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a proteger la biodiversidad en el lugar de trabajo?

A) Arrojar residuos en ríos o canales
B) Capturar animales silvestres para uso personal
C) X Respetar las áreas de trabajo y no molestar la fauna
D) Mover sedimentos sin control

3. ¿Qué efecto puede tener el dragado si no se realiza con cuidado sobre la biodiversidad?

A) Mejorar la vida de los animales
B) X Alterar hábitats y afectar a la fauna y flora acuática
C) Proteger los ecosistemas automáticamente
D) Aumentar la diversidad de especies

4. ¿Qué debe hacer un trabajador si encuentra fauna silvestre durante las labores?

A) Ignorarla y continuar trabajando
B) Capturarla para llevarla a casa
C) X Informar al supervisor o al área ambiental y seguir las indicaciones
D) Moverla sin cuidado a otro lugar

5. ¿Por qué es importante proteger la biodiversidad en el trabajo diario?

A) Solo porque es un requisito legal
B) X Porque mantiene el equilibrio natural y garantiza recursos para todos
C) Solo para evitar multas ambientales
D) Para que los animales no se acerquen a la maquinaria

EVALUAD0O POR:_____ **CARGO:** _____ **CALIFICACION**_____

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO	
NOMBRE Y APELLIDO	Jorge Luis Gomez
CARGO:	Ayudante
FECHA:	02-21-2026
TEMA:	PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Marca con una X la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la biodiversidad?

A) Solo los animales que viven en un ecosistema
B) La variedad de animales, plantas y ecosistemas que existen en un lugar
C) Únicamente las plantas de un área protegida
D) La cantidad de agua en ríos y lagunas

2. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a proteger la biodiversidad en el lugar de trabajo?

A) Arrojar residuos en ríos o canales
B) Capturar animales silvestres para uso personal
C) Respetar las áreas de trabajo y no molestar la fauna
D) Mover sedimentos sin control

3. ¿Qué efecto puede tener el dragado si no se realiza con cuidado sobre la biodiversidad?

A) Mejorar la vida de los animales
B) Alterar hábitats y afectar a la fauna y flora acuática
C) Proteger los ecosistemas automáticamente
D) Aumentar la diversidad de especies

4. ¿Qué debe hacer un trabajador si encuentra fauna silvestre durante las labores?

A) Ignorarla y continuar trabajando
B) Capturarla para llevarla a casa
C) Informar al supervisor o al área ambiental y seguir las indicaciones
D) Moverla sin cuidado a otro lugar

5. ¿Por qué es importante proteger la biodiversidad en el trabajo diario?

A) Solo porque es un requisito legal
B) Porque mantiene el equilibrio natural y garantiza recursos para todos
C) Solo para evitar multas ambientales
D) Para que los animales no se acerquen a la maquinaria

EVALUADOO POR:_____ **CARGO:** _____ **CALIFICACION**_____

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO	
NOMBRE Y APELLIDO	oliver Ropan
CARGO:	oficial
FECHA:	11/02/2026
TEMA:	PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Marca con una X la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la biodiversidad?

A) Solo los animales que viven en un ecosistema
B) La variedad de animales, plantas y ecosistemas que existen en un lugar
C) Únicamente las plantas de un área protegida
D) La cantidad de agua en ríos y lagunas

2. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a proteger la biodiversidad en el lugar de trabajo?

A) Arrojar residuos en ríos o canales
B) Capturar animales silvestres para uso personal
C) Respetar las áreas de trabajo y no molestar la fauna
D) Mover sedimentos sin control

3. ¿Qué efecto puede tener el dragado si no se realiza con cuidado sobre la biodiversidad?

A) Mejorar la vida de los animales
B) Alterar hábitats y afectar a la fauna y flora acuática
C) Proteger los ecosistemas automáticamente
D) Aumentar la diversidad de especies

4. ¿Qué debe hacer un trabajador si encuentra fauna silvestre durante las labores?

A) Ignorarla y continuar trabajando
B) Capturarla para llevarla a casa
C) Informar al supervisor o al área ambiental y seguir las indicaciones
D) Moverla sin cuidado a otro lugar

5. ¿Por qué es importante proteger la biodiversidad en el trabajo diario?

A) Solo porque es un requisito legal
B) Porque mantiene el equilibrio natural y garantiza recursos para todos
C) Solo para evitar multas ambientales
D) Para que los animales no se acerquen a la maquinaria

EVALUAD0O POR:_____ **CARGO:** _____ **CALIFICACION**_____

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO	
NOMBRE Y APELLIDO	Reinaldo ternera
CARGO:	Ayudante
FECHA:	21-02-2026
TEMA:	PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Marca con una X la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la biodiversidad?

A) Solo los animales que viven en un ecosistema
B) La variedad de animales, plantas y ecosistemas que existen en un lugar
C) Únicamente las plantas de un área protegida
D) La cantidad de agua en ríos y lagunas

2. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a proteger la biodiversidad en el lugar de trabajo?

A) Arrojar residuos en ríos o canales
B) Capturar animales silvestres para uso personal
C) Respetar las áreas de trabajo y no molestar la fauna
D) Mover sedimentos sin control

3. ¿Qué efecto puede tener el dragado si no se realiza con cuidado sobre la biodiversidad?

A) Mejorar la vida de los animales
B) Alterar hábitats y afectar a la fauna y flora acuática
C) Proteger los ecosistemas automáticamente
D) Aumentar la diversidad de especies

4. ¿Qué debe hacer un trabajador si encuentra fauna silvestre durante las labores?

A) Ignorarla y continuar trabajando
B) Capturarla para llevarla a casa
C) Informar al supervisor o al área ambiental y seguir las indicaciones
D) Moverla sin cuidado a otro lugar

5. ¿Por qué es importante proteger la biodiversidad en el trabajo diario?

A) Solo porque es un requisito legal
B) Porque mantiene el equilibrio natural y garantiza recursos para todos
C) Solo para evitar multas ambientales
D) Para que los animales no se acerquen a la maquinaria

EVALUADOO POR:_____ **CARGO:** _____ **CALIFICACION**_____

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO	
NOMBRE Y APELLIDO	Gherstuy Santodomingo Calvo
CARGO:	Aprendiz
FECHA:	21/02/2026
TEMA:	PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Marca con una X la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la biodiversidad?

A) Solo los animales que viven en un ecosistema
X B) La variedad de animales, plantas y ecosistemas que existen en un lugar
C) Únicamente las plantas de un área protegida
D) La cantidad de agua en ríos y lagunas

2. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a proteger la biodiversidad en el lugar de trabajo?

A) Arrojar residuos en ríos o canales
B) Capturar animales silvestres para uso personal
X C) Respetar las áreas de trabajo y no molestar la fauna
D) Mover sedimentos sin control

3. ¿Qué efecto puede tener el dragado si no se realiza con cuidado sobre la biodiversidad?

A) Mejorar la vida de los animales
X B) Alterar hábitats y afectar a la fauna y flora acuática
C) Proteger los ecosistemas automáticamente
D) Aumentar la diversidad de especies

4. ¿Qué debe hacer un trabajador si encuentra fauna silvestre durante las labores?

A) Ignorarla y continuar trabajando
B) Capturarla para llevarla a casa
X C) Informar al supervisor o al área ambiental y seguir las indicaciones
D) Moverla sin cuidado a otro lugar

5. ¿Por qué es importante proteger la biodiversidad en el trabajo diario?

A) Solo porque es un requisito legal
X B) Porque mantiene el equilibrio natural y garantiza recursos para todos
C) Solo para evitar multas ambientales
D) Para que los animales no se acerquen a la maquinaria

EVALUAD0O POR:_____ **CARGO:** _____ **CALIFICACION**_____

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO	
NOMBRE Y APELLIDO	Gilberto Alvarez Haza
CARGO:	Ayudante
FECHA:	21/01/2026
TEMA:	PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Marca con una X la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la biodiversidad?

A) Solo los animales que viven en un ecosistema
X B) La variedad de animales, plantas y ecosistemas que existen en un lugar
C) Únicamente las plantas de un área protegida
D) La cantidad de agua en ríos y lagunas

2. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a proteger la biodiversidad en el lugar de trabajo?

A) Arrojar residuos en ríos o canales
B) Capturar animales silvestres para uso personal
X C) Respetar las áreas de trabajo y no molestar la fauna
D) Mover sedimentos sin control

3. ¿Qué efecto puede tener el dragado si no se realiza con cuidado sobre la biodiversidad?

A) Mejorar la vida de los animales
X B) Alterar hábitats y afectar a la fauna y flora acuática
C) Proteger los ecosistemas automáticamente
D) Aumentar la diversidad de especies

4. ¿Qué debe hacer un trabajador si encuentra fauna silvestre durante las labores?

A) Ignorarla y continuar trabajando
B) Capturarla para llevarla a casa
X C) Informar al supervisor o al área ambiental y seguir las indicaciones
D) Moverla sin cuidado a otro lugar

5. ¿Por qué es importante proteger la biodiversidad en el trabajo diario?

A) Solo porque es un requisito legal
X B) Porque mantiene el equilibrio natural y garantiza recursos para todos
C) Solo para evitar multas ambientales
D) Para que los animales no se acerquen a la maquinaria

EVALUADOO POR:_____ CARGO: _____ CALIFICACION_____

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO	
NOMBRE Y APELLIDO	Barbuto Carlos Borja Martinez
CARGO:	Agricultor
FECHA:	21-02-2026
TEMA:	PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Marca con una X la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la biodiversidad?

A) Solo los animales que viven en un ecosistema
X B) La variedad de animales, plantas y ecosistemas que existen en un lugar
C) Únicamente las plantas de un área protegida
D) La cantidad de agua en ríos y lagunas

2. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a proteger la biodiversidad en el lugar de trabajo?

A) Arrojar residuos en ríos o canales
B) Capturar animales silvestres para uso personal
X C) Respetar las áreas de trabajo y no molestar la fauna
D) Mover sedimentos sin control

3. ¿Qué efecto puede tener el dragado si no se realiza con cuidado sobre la biodiversidad?

A) Mejorar la vida de los animales
X B) Alterar hábitats y afectar a la fauna y flora acuática
C) Proteger los ecosistemas automáticamente
D) Aumentar la diversidad de especies

4. ¿Qué debe hacer un trabajador si encuentra fauna silvestre durante las labores?

A) Ignorarla y continuar trabajando
B) Capturarla para llevarla a casa
X C) Informar al supervisor o al área ambiental y seguir las indicaciones
D) Moverla sin cuidado a otro lugar

5. ¿Por qué es importante proteger la biodiversidad en el trabajo diario?

A) Solo porque es un requisito legal
X B) Porque mantiene el equilibrio natural y garantiza recursos para todos
C) Solo para evitar multas ambientales
D) Para que los animales no se acerquen a la maquinaria

EVALUAD0O POR:_____ **CARGO:** _____ **CALIFICACION**_____

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO	
NOMBRE Y APELLIDO	Arturo Herrera
CARGO:	Oficial
FECHA:	02-21-26
TEMA:	PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Marca con una X la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la biodiversidad?

A) Solo los animales que viven en un ecosistema
X) La variedad de animales, plantas y ecosistemas que existen en un lugar
C) Únicamente las plantas de un área protegida
D) La cantidad de agua en ríos y lagunas

2. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a proteger la biodiversidad en el lugar de trabajo?

A) Arrojar residuos en ríos o canales
B) Capturar animales silvestres para uso personal
X) Respetar las áreas de trabajo y no molestar la fauna
D) Mover sedimentos sin control

3. ¿Qué efecto puede tener el dragado si no se realiza con cuidado sobre la biodiversidad?

A) Mejorar la vida de los animales
X) Alterar hábitats y afectar a la fauna y flora acuática
C) Proteger los ecosistemas automáticamente
D) Aumentar la diversidad de especies

4. ¿Qué debe hacer un trabajador si encuentra fauna silvestre durante las labores?

A) Ignorarla y continuar trabajando
B) Capturarla para llevarla a casa
X) Informar al supervisor o al área ambiental y seguir las indicaciones
D) Moverla sin cuidado a otro lugar

5. ¿Por qué es importante proteger la biodiversidad en el trabajo diario?

A) Solo porque es un requisito legal
X) Porque mantiene el equilibrio natural y garantiza recursos para todos
C) Solo para evitar multas ambientales
D) Para que los animales no se acerquen a la maquinaria

EVALUAD0O POR:_____ **CARGO:** _____ **CALIFICACION**_____

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO	
NOMBRE Y APELLIDO	Eduardo Contillo C.
CARGO:	Ayudante
FECHA:	27.02.-2026
TEMA:	PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Marca con una X la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la biodiversidad?

A) Solo los animales que viven en un ecosistema
X La variedad de animales, plantas y ecosistemas que existen en un lugar
C) Únicamente las plantas de un área protegida
D) La cantidad de agua en ríos y lagunas

2. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a proteger la biodiversidad en el lugar de trabajo?

A) Arrojar residuos en ríos o canales
B) Capturar animales silvestres para uso personal
X Respetar las áreas de trabajo y no molestar la fauna
D) Mover sedimentos sin control

3. ¿Qué efecto puede tener el dragado si no se realiza con cuidado sobre la biodiversidad?

A) Mejorar la vida de los animales
X Alterar hábitats y afectar a la fauna y flora acuática
C) Proteger los ecosistemas automáticamente
D) Aumentar la diversidad de especies

4. ¿Qué debe hacer un trabajador si encuentra fauna silvestre durante las labores?

A) Ignorarla y continuar trabajando
B) Capturarla para llevarla a casa
X Informar al supervisor o al área ambiental y seguir las indicaciones
D) Moverla sin cuidado a otro lugar

5. ¿Por qué es importante proteger la biodiversidad en el trabajo diario?

A) Solo porque es un requisito legal
X Porque mantiene el equilibrio natural y garantiza recursos para todos
C) Solo para evitar multas ambientales
D) Para que los animales no se acerquen a la maquinaria

EVALUAD0O POR:_____ **CARGO:** _____ **CALIFICACION**_____

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO	
NOMBRE Y APELLIDO	Eduardo A. Castillo Pacheco
CARGO:	Oficial
FECHA:	21-02-2026
TEMA:	PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Marca con una X la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la biodiversidad?

A) Solo los animales que viven en un ecosistema
B) La variedad de animales, plantas y ecosistemas que existen en un lugar
C) Únicamente las plantas de un área protegida
D) La cantidad de agua en ríos y lagunas

2. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a proteger la biodiversidad en el lugar de trabajo?

A) Arrojar residuos en ríos o canales
B) Capturar animales silvestres para uso personal
C) Respetar las áreas de trabajo y no molestar la fauna
D) Mover sedimentos sin control

3. ¿Qué efecto puede tener el dragado si no se realiza con cuidado sobre la biodiversidad?

A) Mejorar la vida de los animales
B) Alterar hábitats y afectar a la fauna y flora acuática
C) Proteger los ecosistemas automáticamente
D) Aumentar la diversidad de especies

4. ¿Qué debe hacer un trabajador si encuentra fauna silvestre durante las labores?

A) Ignorarla y continuar trabajando
B) Capturarla para llevarla a casa
C) Informar al supervisor o al área ambiental y seguir las indicaciones
D) Moverla sin cuidado a otro lugar

5. ¿Por qué es importante proteger la biodiversidad en el trabajo diario?

A) Solo porque es un requisito legal
B) Porque mantiene el equilibrio natural y garantiza recursos para todos
C) Solo para evitar multas ambientales
D) Para que los animales no se acerquen a la maquinaria

EVALUAD0O POR:_____ **CARGO:**_____ **CALIFICACION**_____

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO	
NOMBRE Y APELLIDO	Kevin Ramiro Alvarez Hoyos
CARGO:	Ayudante de obra
FECHA:	21/02/2026
TEMA:	PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Marca con una X la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la biodiversidad?

A) Solo los animales que viven en un ecosistema
B) La variedad de animales, plantas y ecosistemas que existen en un lugar
C) Únicamente las plantas de un área protegida
D) La cantidad de agua en ríos y lagunas

2. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a proteger la biodiversidad en el lugar de trabajo?

A) Arrojar residuos en ríos o canales
B) Capturar animales silvestres para uso personal
C) Respetar las áreas de trabajo y no molestar la fauna
D) Mover sedimentos sin control

3. ¿Qué efecto puede tener el dragado si no se realiza con cuidado sobre la biodiversidad?

A) Mejorar la vida de los animales
B) Alterar hábitats y afectar a la fauna y flora acuática
C) Proteger los ecosistemas automáticamente
D) Aumentar la diversidad de especies

4. ¿Qué debe hacer un trabajador si encuentra fauna silvestre durante las labores?

A) Ignorarla y continuar trabajando
B) Capturarla para llevarla a casa
C) Informar al supervisor o al área ambiental y seguir las indicaciones
D) Moverla sin cuidado a otro lugar

5. ¿Por qué es importante proteger la biodiversidad en el trabajo diario?

A) Solo porque es un requisito legal
B) Porque mantiene el equilibrio natural y garantiza recursos para todos
C) Solo para evitar multas ambientales
D) Para que los animales no se acerquen a la maquinaria

EVALUADOO POR:_____ **CARGO:** _____ **CALIFICACION**_____

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO	
NOMBRE Y APELLIDO	Germán Borja. A
CARGO:	Oficial
FECHA:	21-02-26
TEMA:	PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Marca con una X la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la biodiversidad?

A) Solo los animales que viven en un ecosistema
X B) La variedad de animales, plantas y ecosistemas que existen en un lugar
C) Únicamente las plantas de un área protegida
D) La cantidad de agua en ríos y lagunas

2. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a proteger la biodiversidad en el lugar de trabajo?

A) Arrojar residuos en ríos o canales
B) Capturar animales silvestres para uso personal
X C) Respetar las áreas de trabajo y no molestar la fauna
D) Mover sedimentos sin control

3. ¿Qué efecto puede tener el dragado si no se realiza con cuidado sobre la biodiversidad?

A) Mejorar la vida de los animales
X B) Alterar hábitats y afectar a la fauna y flora acuática
C) Proteger los ecosistemas automáticamente
D) Aumentar la diversidad de especies

4. ¿Qué debe hacer un trabajador si encuentra fauna silvestre durante las labores?

A) Ignorarla y continuar trabajando
B) Capturarla para llevarla a casa
X C) Informar al supervisor o al área ambiental y seguir las indicaciones
D) Moverla sin cuidado a otro lugar

5. ¿Por qué es importante proteger la biodiversidad en el trabajo diario?

A) Solo porque es un requisito legal
X B) Porque mantiene el equilibrio natural y garantiza recursos para todos
C) Solo para evitar multas ambientales
D) Para que los animales no se acerquen a la maquinaria

EVALUADOO POR:_____ **CARGO:** _____ **CALIFICACION**_____

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO	
NOMBRE Y APELLIDO	Miguel Leiva
CARGO:	Oficial de Obras
FECHA:	21/02/2026
TEMA:	PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Marca con una X la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la biodiversidad?

A) Solo los animales que viven en un ecosistema
X B) La variedad de animales, plantas y ecosistemas que existen en un lugar
C) Únicamente las plantas de un área protegida
D) La cantidad de agua en ríos y lagunas

2. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a proteger la biodiversidad en el lugar de trabajo?

A) Arrojar residuos en ríos o canales
B) Capturar animales silvestres para uso personal
X C) Respetar las áreas de trabajo y no molestar la fauna
D) Mover sedimentos sin control

3. ¿Qué efecto puede tener el dragado si no se realiza con cuidado sobre la biodiversidad?

A) Mejorar la vida de los animales
X B) Alterar hábitats y afectar a la fauna y flora acuática
C) Proteger los ecosistemas automáticamente
D) Aumentar la diversidad de especies

4. ¿Qué debe hacer un trabajador si encuentra fauna silvestre durante las labores?

A) Ignorarla y continuar trabajando
B) Capturarla para llevarla a casa
X C) Informar al supervisor o al área ambiental y seguir las indicaciones
D) Moverla sin cuidado a otro lugar

5. ¿Por qué es importante proteger la biodiversidad en el trabajo diario?

A) Solo porque es un requisito legal
X B) Porque mantiene el equilibrio natural y garantiza recursos para todos
C) Solo para evitar multas ambientales
D) Para que los animales no se acerquen a la maquinaria

EVALUAD0O POR: _____ **CARGO:** _____ **CALIFICACION** _____

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO	
NOMBRE Y APELLIDO	Jodar Ivan Orrco Orrco
CARGO:	ayudante
FECHA:	21 02 - 26
TEMA:	PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Marca con una X la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la biodiversidad?

A) Solo los animales que viven en un ecosistema
X La variedad de animales, plantas y ecosistemas que existen en un lugar
C) Únicamente las plantas de un área protegida
D) La cantidad de agua en ríos y lagunas

2. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a proteger la biodiversidad en el lugar de trabajo?

A) Arrojar residuos en ríos o canales
B) Capturar animales silvestres para uso personal
X Respetar las áreas de trabajo y no molestar la fauna
D) Mover sedimentos sin control

3. ¿Qué efecto puede tener el dragado si no se realiza con cuidado sobre la biodiversidad?

A) Mejorar la vida de los animales
X Alterar hábitats y afectar a la fauna y flora acuática
C) Proteger los ecosistemas automáticamente
D) Aumentar la diversidad de especies

4. ¿Qué debe hacer un trabajador si encuentra fauna silvestre durante las labores?

A) Ignorarla y continuar trabajando
B) Capturarla para llevarla a casa
X Informar al supervisor o al área ambiental y seguir las indicaciones
D) Moverla sin cuidado a otro lugar

5. ¿Por qué es importante proteger la biodiversidad en el trabajo diario?

A) Solo porque es un requisito legal
X Porque mantiene el equilibrio natural y garantiza recursos para todos
C) Solo para evitar multas ambientales
D) Para que los animales no se acerquen a la maquinaria

EVALUADOO POR:_____ **CARGO:** _____ **CALIFICACION**_____

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO	
NOMBRE Y APELLIDO	Sebastián Avilo Avilo
CARGO:	A d O
FECHA:	21 - 02 - 2026
TEMA:	PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Marca con una X la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la biodiversidad?

A) Solo los animales que viven en un ecosistema
X La variedad de animales, plantas y ecosistemas que existen en un lugar
C) Únicamente las plantas de un área protegida
D) La cantidad de agua en ríos y lagunas

2. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a proteger la biodiversidad en el lugar de trabajo?

A) Arrojar residuos en ríos o canales
B) Capturar animales silvestres para uso personal
X Respetar las áreas de trabajo y no molestar la fauna
D) Mover sedimentos sin control

3. ¿Qué efecto puede tener el dragado si no se realiza con cuidado sobre la biodiversidad?

A) Mejorar la vida de los animales
X Alterar hábitats y afectar a la fauna y flora acuática
C) Proteger los ecosistemas automáticamente
D) Aumentar la diversidad de especies

4. ¿Qué debe hacer un trabajador si encuentra fauna silvestre durante las labores?

A) Ignorarla y continuar trabajando
B) Capturarla para llevarla a casa
X Informar al supervisor o al área ambiental y seguir las indicaciones
D) Moverla sin cuidado a otro lugar

5. ¿Por qué es importante proteger la biodiversidad en el trabajo diario?

A) Solo porque es un requisito legal
X Porque mantiene el equilibrio natural y garantiza recursos para todos
C) Solo para evitar multas ambientales
D) Para que los animales no se acerquen a la maquinaria

EVALUAD0O POR:_____ **CARGO:** _____ **CALIFICACION**_____

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO	
NOMBRE Y APELLIDO	Jesus D Palmera G
CARGO:	1100547997
FECHA:	21-02-2026
TEMA:	PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Marca con una X la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la biodiversidad?

A) Solo los animales que viven en un ecosistema
X B) La variedad de animales, plantas y ecosistemas que existen en un lugar
C) Únicamente las plantas de un área protegida
D) La cantidad de agua en ríos y lagunas

2. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a proteger la biodiversidad en el lugar de trabajo?

A) Arrojar residuos en ríos o canales
B) Capturar animales silvestres para uso personal
X C) Respetar las áreas de trabajo y no molestar la fauna
D) Mover sedimentos sin control

3. ¿Qué efecto puede tener el dragado si no se realiza con cuidado sobre la biodiversidad?

A) Mejorar la vida de los animales
X B) Alterar hábitats y afectar a la fauna y flora acuática
C) Proteger los ecosistemas automáticamente
D) Aumentar la diversidad de especies

4. ¿Qué debe hacer un trabajador si encuentra fauna silvestre durante las labores?

A) Ignorarla y continuar trabajando
B) Capturarla para llevarla a casa
X C) Informar al supervisor o al área ambiental y seguir las indicaciones
D) Moverla sin cuidado a otro lugar

5. ¿Por qué es importante proteger la biodiversidad en el trabajo diario?

A) Solo porque es un requisito legal
X B) Porque mantiene el equilibrio natural y garantiza recursos para todos
C) Solo para evitar multas ambientales
D) Para que los animales no se acerquen a la maquinaria

EVALUADOO POR:_____ **CARGO:** _____ **CALIFICACION**_____

Powered by CamScanner

PANAMERICAN	INSPECCIÓN DE KIT CONTROL DERRAME	Codigo: GIM-R-012 Version: 4 Fecha: 1-10-2021

PROYECTO: C6544 - Caño Hondo

FECHA: 04/02/2026

UBICACIÓN	ELEMENTOS DEL KIT (marcar con X si esta dentro del kit o dejar en blanco si no esta)														OBSERVACIONES / COMENTARIOS
	PAÑOS ABSORVENTES	MAT. ABSOR.	BARRERAS	ALMOHADILLAS	JABON DESENGRASANTE	CINTA DE SEÑALIZACION	CEPILLO	PALA	BOLSA ROJA	MASILLA EPOXICA	GUANTES NITRILO	MASCARILLA	GAFAS	MALETIN	
punto Base	X	X	X		X	X		X	X		X	X		X	Sin Almohadillas Sin cepillo Sin masilla epoxica Sin gafas
Cat 345		X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	Sin paños ab Barreras Sin cepillo. Sin pa Sin cinta de señaliz Sin gafas a bolsa roja. Sin cepillo
Cat 325		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	

Yesmith Vanessa
NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA

Yesmith Palon
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN DE KIT CONTROL DERRAME	Codigo: GIM-R-012 Version: 1 Fecha: 15-01-2024

PROYECTO: C 6544 - Caño Hormiga

FECHA: 04/02/2026

UBICACIÓN	ELEMENTOS DEL KIT (marcar con X si esta dentro del kit o dejar en blanco si no esta)														OBSERVACIONES / COMENTARIOS
	PAÑOS ABSORVENTES	MAT. ABSOR.	BARRERAS	ALMOHADILLAS	JABON DESENGRASANTE	CINTA DE SEÑALIZACION	CEPILLO	PALA	BOLSA ROJA	BASILLA EPOXICA	GUANTES NITRILO	MASCARILLA	GAFAS	MALETIN	
Punto Base	X	X	X		X	X		X	X		X	X		X	Sin almohadillas, sin cepillo, sin manilla epoxica Bungalow
Cat 345		X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	Sin paños absorventes, sin cepillo, sin guantes de nitrilo
Cat 325		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	Sin paños absorventes, sin cepillo

Yesuth polo

NOMBRE QUIEN INSPECCIONA

Yesuth polo

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

Powered by CamScanner

CONTRATO DE CONCESIÓN No. 21833 PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (GRAVAS DE CANTERAS Y RECEBO) ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA –ANM- Y CANTERAS Y TRITURADOS PISVAR Y CIA LTDA. TRITUPISVAR LTDA.

Entre los suscritos, **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM**, agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, representada en este acto por su Gerente de Contratación y Titulación, la doctora **ANA MARÍA GONZÁLEZ BORRERO**, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.701.889, debidamente facultada para suscribir el presente acto por el Decreto - Ley 4134 del 03 de noviembre de 2011, expedido por el Ministerio de Minas y Energía, las Resoluciones No. 206 del 22 de marzo de 2013, 310 del 05 de mayo de 2016, 319 del 14 de junio de 2017 y 130 de 08 de marzo de 2022, proferidas por la Agencia Nacional de Minería, en adelante **LA CONCEDENTE,** de una parte y, de la otra, la sociedad **CANTERAS Y TRITURADOS PISVAR Y CIA LTDA. TRITUPISVAR LTDA,** Nit. 819.001.602-1, legalmente constituida por Escritura Pública No. 1973 de la Notaría 1ª de Santa Marta del 26 de agosto de 1997, registrado bajo el número 10272 del Libro IX el 6 de octubre de 1997, representada legalmente en éste acto por su Representante Legal **DORIS PIEDAD VARGAS PINZÓN** identificada con la cédula de ciudadanía No. 36,546,572, quien en adelante se llamará **EL CONCESIONARIO**, hemos acordado celebrar el presente contrato de concesión, con base en la facultad otorgada a **LA CONCEDENTE** en el artículo 317 del Código de Minas y las funciones previstas en el artículo 4°, numerales 1° y 2° del Decreto- Ley 4134 de 2011, previas las siguientes **CONSIDERACIONES: (i)** Mediante Resolución No 1170-0129 del 5 de diciembre de 2003, se otorgó a la sociedad comercial **CANTERAS Y TRITURADOS PISVAR Y CIA LTDA. "TRITUPISVAR LTDA."**, la Licencia No **21833**, para la exploración técnica de un yacimiento de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, en un área de 43 hectáreas y 7838,5 metros cuadrados, ubicada en el municipio de SANTA MARTA, departamento de MAGDALENA, con una duración de un año. Inscrita en el Registro Minero Nacional el 5 de julio de 2005. (Expediente Minero Cuaderno Principal 1, Folios 101-105) **(ii)** Mediante **Resolución No DSM-403** del **19 de octubre de 2009**, se otorgó a la sociedad comercial **CANTERAS Y TRITURADOS PISVAR Y CIA LTDA. "TRITUPISVAR LTDA."**, Licencia No **21833,** para la explotación económica de un yacimiento de **MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**, en un área de 43 hectáreas y 7838,5 metros cuadrados, ubicada en jurisdicción del municipio de **SANTA MARTA**, departamento de **MAGDALENA.** Inscrita en el Registro Minero Nacional el 10 de junio de 2010. (Expediente Minero Cuaderno Principal 2, Folios 61-65) **(iii)** La Resolución No. 236 del 14 de septiembre de 2010, proferida por el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente –DADMA, le concedió a **TRITUPISVAR LTDA** permiso de emisiones, atmosféricas, fuentes fijas para las emisiones, que, por efectos de la explotación de pétreos, se generan en las instalaciones de la planta trituradora de la Cantera **TRITUPISVAR**. (Expediente Minero Cuaderno Principal 2, Folios 104-118) **(iv)** En Auto PARV No. 0170 del 17 de abril de 2013, se aprobó la actualización del Programa de Trabajos e Inversiones PTI. (Expediente Minero Cuaderno Principal 3, Folios 73-76) **(v)** Por medio de la Resolución No. 0732 del 18 de noviembre de 2013, el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente –DADMA, le otorgó Licencia Ambiental a la Sociedad Canteras y Triturados PISVAR y CIA LTDA, para el desarrollo de la actividad de explotación de materiales de construcción en las Licencias de Explotación 19222 y **21833**. (Expediente Minero Cuaderno Principal 3, Folios 181-185) **(vi)** Mediante oficio radicado No 20169060019602 del 25 de octubre de 2016, la representante legal de la sociedad titular allegó solicitud de acogimiento al artículo 46 del decreto 2655 de 1988, en cuanto al Derecho de Preferencia para suscribir Contrato de Concesión dentro del Título No 21833. (Expediente Minero Cuaderno Principal 4, Folios 101-105) **(vii)** Mediante Resolución No 2304 del 18 de octubre de 2017, Ordenar al Grupo de Catastro y Registro Minero, corregir en el Registro Minero Nacional la vigencia del título minero No. **21833.** Inscrita en el Registro Minero Nacional el 8 de mayo de 2018. Folios 818-819. **(viii)** Mediante Auto No PARV-003 del 17 de enero de 2019, se aprobó la modificación al Programa de Trabajos y Obras -PTO de la Licencia de Explotación No. **21833**. **(ix)** Mediante Auto No PARV-558 del 2 de diciembre de 2021, entre otras disposiciones se informa al titular minero que se declara la viabilidad técnica y jurídica del Derecho de Preferencia, así: *"(..) Revisado el expediente contentivo de la Licencia de Explotación No. 21833, se estableció que el*

CONTRATO DE CONCESIÓN No. 21833 PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (GRAVAS DE CANTERAS Y RECEBO) ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA –ANM- Y CANTERAS Y TRITURADOS PISVAR Y CIA LTDA. TRITUPISVAR LTDA.

mismo cuenta con el trámite de derecho de preferencia para suscribir Contrato de Concesión, establecido en el artículo 46 del Decreto 2655 de 1988 solicitado con el radicado No. 20169060019602 del 25 de octubre de 2016, pendiente por resolver. (...) En consecuencia, debido a que la Licencia de Explotación No. 21833 fue otorgada conforme a lo dispuesto en el Decreto 2655 de 1998, procedemos a resolver la solicitud de suscripción de contrato de concesión, presentada mediante radicado No. 20169060019602 del 25 de octubre de 2016, con base en esta norma. Una vez analizada la solicitud impetrada por el titular de la Licencia de Explotación No. 21833 se determinó que la misma se ajusta a la legislación minera, toda vez, que fue solicitada dentro de los términos legales, con una anticipación superior a los dos meses antes del vencimiento del término de la licencia y con el debido sustento técnico, lo anterior de conformidad con el Articulo 46 del Decreto 2655 de 1988, (...) Así las cosas, juridicamente es viable el derecho de preferencia solicitado por el titular de la Licencia de Explotación No. 21833 con radicado No. 20169060019602 del 25 de octubre de 2016, en virtud del cual de conformidad con los conceptos del Ministerio de Minas y Energía Nos. 2010005151 y 2010005288 de 20101, se otorgará contrato de concesión que se regirá por las disposiciones de la Ley 685 de 2001. En cuanto a los minerales a explotar, los minerales aprobados para la explotación de conformidad con Resolución DSM No. 403 del 19 de octubre de 2009, en concordancia con la Resolución Nº 181108 de 2003 del Ministerio de Minas y Energía. Por lo tanto, teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestos, este Punto de Atención Regional encuentra juridica y técnicamente viable la solicitud de derecho de preferencia dispuesto en el articulo 46 del Decreto 2655 de 1988, en consecuencia, se procederá a remitir a la Vicepresidencia de Contratación y Titulación para la elaboración de la correspondiente minuta de contrato, en aplicación de lo dispuesto en las Resolución 319 de 2017 derogada por la Resolución No. 223 de 2021 modificada por la Resolución No. 363 de 2021de la Agencia Nacional de Mineria. La presente viabilidad se basa en el estudio técnico contemplado en el Concepto Técnico PARV No. 314 de 10 de noviembre de 2021 y en el estudio juridico contemplado en el presente acto de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera. *Con relación al derecho de preferencia allegados mediante radicado No. 20169060019602 del 25 de octubre de 2016 se tiene que de la Evaluación Técnica realizada mediante Concepto Técnico PARV No. 314 de 10 de noviembre de 2021, se determinó que la titular, "Manifestó que no presenta superposición con áreas de mineria restringida, al revisar el visor geográfico de AnnA mineria, se evidencia que presenta superposición total con un área de mineria restringida de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 de la ley 685 de 2001, esto es, porque se encuentra superpuesto con el perimetro urbano de Santa Marta. Además se manifestó "El polígono del Área minera según el POT del Distrito, se encuentra en las clasificaciones de los usos industriales del articulo 150 como actividad extractiva y dentro de un corredor múltiple tipo 2 CM2 del artículo 155, en la que se permiten actividades de producción de piedra tallada, productos triturados y granitos, igualmente es especifico el artículo 230 del instrumento técnico de planeación distrital, que determina que queda como única opción viable de materiales de construcción la cantera sobre la troncal del caribe, que corresponde a las licencias 19222 y 21833", sin embargo, no se presentó prueba de lo mencionado por el titular minero, por lo cual, se recomienda requerir al titular para que allegue el certificado, autorización o concepto emitido por la autoridad competente, respecto a la posibilidad de desarrollo de la actividad minera en el área del título 19222 el cual se superpone con un área de mineria restringida de acuerdo al artículo 35 de la ley 685 de 2001." En cumplimiento de lo anterior, se tiene que mediante radicado No. 20211001523522 de 28 de octubre de 2021 la sociedad CANTERAS TRITUPISVAR LTDA titular de la Licencia de Explotación No. 21833 allego escrito de Asunto: "presento respuesta Auto PARV No. 466 del 27 de Septiembre del 2.021, con documento adjunto de fecha 25 de octubre de 2021 bajo el No. 2735 con radicado No. 211021021 de referencia "CERTIFICACIÓN RESOLUCIÓN 0732 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2013 proferido por el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental –DADSA, dando asi viabilidad al derecho de preferencia solicitado de fecha 10/08/2016, relacionado con el desarrollo de la actividad minera en el área del título 21833 el cual se superpone con un área de mineria restringida de acuerdo al artículo 35 de la ley 685*

de 2001, de esta manera se encuentra subsanado el requisito establecido (...). **(x)** El Grupo de Evaluación de Modificaciones a Títulos Mineros de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación con Evaluación Técnica al Derecho de Preferencia de fecha 25 de marzo de 2022, concluyó: *"(...) 3,* ***CONCLUSIONES*** De la revisión del expediente del área de la licencia de explotación No 21833, sobre las condiciones relevantes para la evaluación de la solicitud de derecho de preferencia para suscribir contrato de concesión, se tiene: 3.1. *El área de la licencia de explotación No 21833, en el Sistema Integral de Gestión Minera SIGM 'AnnA Mineria', transformada al sistema de referencia MAGNA SIRGAS presenta la siguiente alinderación en coordenadas geográficas y valor de área: (...) 3.2 Mediante auto No PARV-558 del 2 de diciembre de 2021, se Declara la viabilidad técnica y jurídica del Derecho de Preferencia (...), con fundamento en la solicitud radicada con el radicado No 20169060019602 del 25 de octubre de 2016. 3.3. De acuerdo las caracteristicas del Programa de Trabajos y Obras aprobado dentro del trámite de derecho de preferencia, el mineral a explotar corresponde a grava y recebo. 3.4. Consultado el Visor Geográfico del Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM, 'AnnA Mineria', para la revisión de la existencia de superposición del área de la licencia de explotación No 21833, no presenta superposición a las zonas excluibles de la mineria, a zonas de mineria restringida establecidas en los articulos 34 y 35 de la Ley 685 de 2001, ni a las zonas delimitadas como páramo en el marco de lo establecido en el articulo 173 de la Ley 1753 de 2015. De otra parte, presenta las siguientes superposiciones que son de carácter informativo: Superposición con OTRAS ÁREAS PROTEJIDAS - reserva natural biosfera, con capa RESTITUCIÓN DE TIERRAS Zona Microfocalizada y Zona Macrofocalizada. 3.5. Se remite a la parte juridica para lo de su competencia, respecto de la solicitud de acogimiento al uso de derecho de preferencia, para la suscripción de contrato de concesión correspondiente a la licencia de explotación No 21833, presentada por la sociedad titular en comunicación radicada con número 20169060019602 del 25 de octubre de 2016. (...)"* **(xi)** Que, verificado en el sistema de información de la Procuraduria General de la Nación SIRI, la Contraloria General de la República y la Policia Nacional, se estableció 13 de abril de 2022, la sociedad **CANTERAS Y TRITURADOS PISVAR Y CIA LTDA. TRITUPISVAR LTDA.,** con Nit. 819.001.602-1 y su representante legal **DORIS PIEDAD VARGAS PINZON** identificado con la cédula de ciudadania No. 36.546.572, no registran sanciones ni inhabilidades vigentes, no se encuentran reportados como responsables fiscales, ni tienen asuntos pendientes con las autoridades judiciales, conforme a los certificados **Nos. 194352008 y 194351991** (Procuraduria), **8190016021220413191535 y 36546572220413191448** (Contraloria) y Consulta en Linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales del 13 de abril de 2022 (Policia Nacional). Asi mismo se verificó que **DORIS PIEDAD VARGAS PINZON** identificado con la cédula de ciudadania No. 36.546.572, en calidad representante legal de la sociedad titular no tiene medidas correctivas pendientes por cumplir de acuerdo con el Registro Interno de Validación No. **31699223**. **(xii)** De la misma manera, es de mencionar que una vez revisado el Registro Minero Nacional el dia 27 de abril de 2022 se constató que el titulo **No 21833**, no presenta medidas cautelares, asi mismo, consultado el número de identificación tributaria correspondiente a la **CANTERAS Y TRITURADOS PISVAR Y CIA LTDA. TRITUPISVAR LTDA.,** a través de la página web oficial del Registro de Garantias Mobiliarias de CONFECÁMARAS, no se encontró garantia mobiliaria que recaiga sobre los derechos que le corresponden a la titular dentro del Contrato **No 21833**, documentos que obran anexos al expediente. **(xiii)** Que asi mismo, revisado el Certificado de Existencia y Representación Legal de la titular **CANTERAS Y TRITURADOS PISVAR Y CIA LTDA. TRITUPISVAR LTDA., con Nit. 819.001.602-1** obtenido del Registro Único Empresarial y Social de la Cámara de Comercio – RUES el dia 13 de abril de 2022, se estableció que en su objeto social se encuentran contempladas las siguientes actividades: *"(...) OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A. LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DE YACIMIENTOS MINEROS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, COMUNMENTE CONOCIDOS Y/O DENOMINADOS CANTERAS..(...)"*, que la sociedad no se haya disuelta y que su duración es indefinida, cumpliéndose con los requisitos

establecidos en los articulos 17[1] de la Ley 685 de 2001 y 6[2] de la Ley 80 de 1993. Por otra parte, pudo evidenciarse en el Certificado de Existencia y Representación de la Cámara de Comercio de 13 de abril de 2022 que la *"(...) Administración: la representación legal de la sociedad estará a cargo del gerente general, quien tendrá todas las facultades administrativas y dispositivas inherentes al cabal desarrollo del objeto social. quien asumirá la representación de la compañia ante las autoridades judiciales, administrativas y policivas, así como ante cualquier entidad o funcionario públicos (...) 4. ejecutar los actos y celebrar los contratos tendientes al cumplimiento del objeto social, debiendo obtener autorización previa de la junta directiva cuando el monto de la operación sea superior a treinta (30) salarios minimos legales mensuales vigentes. atribuciones de la junta directiva: este órgano social ejercerá las siguientes funciones: (...) f. autorizar al representante legal de la sociedad para suscribir contratos o comprometer a la compañía con obligaciones cuya cuantía exceda de treinta (30) salarios minimos legales mensuales vigentes. (...)"* En virtud de lo anterior, mediante la Reunión Extraordinaria de Socios de la sociedad **CANTERAS TRITUPISVAR LTDA**, de 24 de marzo de 2022, se autoriza a la señora **DORIS PIEDAD VARGAS** para suscribir la minuta. Por una parte, de acuerdo a lo contemplado por el artículo 46 del Decreto 2655 de 1988, que reza: *Artículo 46. PLAZO DE LA LICENCIA DE EXPLOTACIÓN. Durante la licencia de explotación, los trabajos, obras de desarrollo y montaje se deberán realizar dentro del primer año, pero se podrá iniciar la explotación en cualquier tiempo, dando aviso al Ministerio. La licencia tendrá una duración total de diez (10) años que se contarán desde su inscripción en el Registro como título de explotación. Dos (2) meses antes del vencimiento, su beneficiario, podrá solicitar su prórroga por una sola vez y por un término igual al original, o hacer uso del derecho de preferencia para suscribir contrato de concesión.* Por último, es procedente aclarar que el contrato producto del derecho de preferencia de la Licencia de Explotación No. 21833 se regirá por lo establecido en la Ley 685 de 2001, de acuerdo con lo señalado en el Concepto 2010005151 del 04 de febrero de 2010, de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía, el cual dispone: *"(..)Así las cosas, en el caso analizado se tiene que el artículo 46 del Decreto 2655 de 1988 otorga un derecho de preferencia que consiste en la posibilidad del beneficiario de la Licencia de Explotación de solicitar par una vez la prórroga y continuar el trámite bajo las disposiciones establecidas en el Decreto 2655 de 1988, para las Licencias o hacer uso del derecho de preferencia para suscribir contrato de concesión, caso en el cual se regirá la suscripción del mismo por las normas establecidas en la Ley 685 de 2001, al tratarse de una situación jurídica que no se ha consolidado y por lo tanto admite la aplicación de la ley vigente al momento de su constitución"*. Por lo tanto, de acuerdo a lo contemplado por el artículo 46 del Decreto 2655 de 1988, con fundamento en la solicitud radicada con el No. en la solicitud radicada con el No. 20169060019602 del 25 de octubre de 2016, es procedente continuar con el trámite contractual regido por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA**. - **Objeto**. El presente contrato tiene por objeto la realización por parte de **EL CONCESIONARIO** de un proyecto de explotación económica y sostenible, de un yacimiento de **MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (GRAVAS DE CANTERAS Y RECEBO)** en el área total descrita en la cláusula segunda de este contrato, así como los que se hallaren asociados o en liga íntima o resultaren como subproductos de la explotación. **EL CONCESIONARIO** tendrá la libre disponibilidad de los minerales objeto del contrato de concesión que llegue a extraer en cumplimiento del Programa de Trabajos y Obras, aprobado por **LA CONCEDENTE**. Los minerales In Situ son del Estado Colombiano y una vez extraídos, serán de propiedad de **EL CONCESIONARIO**. **PARÁGRAFO**. - **Adición de Minerales**. Cuando por los trabajos de exploración o explotación se encontraren minerales distintos de los que son objeto del presente contrato y que no se encontraren en las circunstancias señaladas en el

[1] **Artículo 17. Capacidad legal.** La capacidad legal para formular propuesta de concesión minera y para celebrar el correspondiente contrato, se regula por las disposiciones generales sobre contratación estatal. Dicha capacidad, si se refiere a personas jurídicas, públicas o privadas, requiere que en su objeto se hallen incluidas, expresa y específicamente, la exploración y explotación mineras.

[2] **ARTÍCULO 6o. DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR**. Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y uniones temporales.
Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.

artículo 61 del Código de Minas, **EL CONCESIONARIO** podrá solicitar que su concesión se extienda a dichos minerales en los términos del artículo 62 del Código de Minas. **CLÁUSULA SEGUNDA**. - **Área del contrato**. El área objeto del presente contrato corresponde a la alinderación que se define por las coordenadas que se mencionan a continuación:

MUNICIPIO – DEPARTAMENTO	***SANTA MARTA-MAGDALENA***
ÁREA TOTAL	***43,8606 HECTÁREAS***
SISTEMA DE REFERENCIA GEOGRÁFICA	***MAGNA - SIRGAS***
COORDENADAS	***GEOGRÁFICAS***

ZONA DE ALINDERACIÓN

VERTICES		
ID	*LATITUD*	*LONGITUD*
1	11,20745	-74,19767
2	11,20746	-74,20363
3	11,21460	-74,20362
4	11,21459	-74,19767
5	11,21005	-74,19767
6	11,21113	-74,20040
7	11,20914	-74,20095
8	11,20810	-74,19767
1	11,20745	-74,19767

El área total antes descrita está ubicada en jurisdicción del municipio de **SANTA MARTA,** departamento de **MAGDALENA** y comprende una extensión superficiaria total de **43,8606 HECTÁREA(S) DISTRIBUIDO EN 1 ZONA**, la cual se representa gráficamente en el plano topográfico que corresponde al Anexo No.1 de este contrato y hace parte integral del mismo. El área se entrega como cuerpo cierto, en consecuencia, **EL CONCESIONARIO** no tendrá derecho a reclamo alguno en el evento de que la extensión comprendida dentro de los linderos antes indicados, sea mayor o menor que la enunciada o calculada en este contrato. **LA CONCEDENTE** no se compromete con **EL CONCESIONARIO** a ninguna obligación de saneamiento por evicción o vicios redhibitorios sobre el área contratada. El área objeto del presente contrato, quedará vinculada a los trabajos y obras de explotación, más las obras estrictamente necesarias para el beneficio, transporte interno, servicios de apoyo y obras de carácter ambiental, para lo cual se deberán tener en cuenta los valores, ubicación y cálculo de las reservas existentes al igual que la producción esperada en el Programa de Trabajos y Obras. **EL CONCESIONARIO** estará obligado a devolver, en lotes continuos o discontinuos las partes del área que no sean ocupadas por los trabajos y obras mencionados. El área retenida deberá estar constituida por una extensión continua, que será inscrita en el Registro Minero Nacional. En todo caso no se permitirá retener áreas que no sean económicamente explotables. **CLÁUSULA TERCERA**. - **Valor del Contrato.** El presente contrato al momento de perfeccionarse será de valor indeterminado pero determinable según la actividad que esté desarrollando **EL CONCESIONARIO**, de conformidad con las contraprestaciones de este contrato. Para efectos fiscales su valor se definirá con cada pago o abono en cuenta determinado sobre las contraprestaciones a favor del Estado, de acuerdo con la cláusula séptima. **CLÁUSULA CUARTA. - Duración del Contrato y Etapas.** El presente contrato tendrá una duración máxima de **TREINTA (30) AÑOS**, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Minero Nacional según lo señalado en el Artículo 70 del Código de Minas y para cada etapa así: **a) Plazo para la Explotación.** Corresponde a **TREINTA (30) AÑOS.** Como mínimo dos (2) años antes de vencerse el período de explotación, encontrándose a paz y salvo con todas las obligaciones derivadas del contrato y pagado las sanciones que se le hubieren impuesto hasta la fecha de la solicitud, **EL CONCESIONARIO** podrá solicitar la prórroga del mismo hasta por treinta (30) años, la cual no será automática y **LA CONCEDENTE** podrá exigir nuevas condiciones y pactar contraprestaciones adicionales a las regalías de conformidad con el Decreto 1975 de 2016 o aquellas normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. La

prórroga solicitada se perfeccionará mediante un acta suscrita por las partes, la cual surtirá efectos a partir de la inscripción en el Registro Minero Nacional y para todos los efectos se sujetará a lo establecido en el artículo 53 de la Ley 1753 de 2015, o aquellas normas que la modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. **PARÁGRAFO. - EL CONCESIONARIO** deberá presentar un nuevo Programa de Trabajos y Obras para la vigencia de la prórroga, según lo establece el Decreto 1073 de 2015, o aquellas normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. **CLÁUSULA QUINTA**. - Autorizaciones Ambientales. La gestión ambiental está incluida como una obligación del presente contrato a cargo del **CONCESIONARIO**. Para la etapa de explotación se debe contar con el acto administrativo ejecutoriado y en firme, en que la autoridad ambiental competente haya otorgado la Licencia Ambiental. **PARÁGRAFO**. - Adicionalmente, en caso de que se establezca la presencia de grupos étnicos en el área del presente contrato de concesión minera, **EL CONCESIONARIO** deberá realizar la consulta previa conforme a lo establecido en la ley. **CLÁUSULA SEXTA**. - Autorización de la autoridad competente. En caso de encontrarse el área otorgada en zona de minería restringida, deberá contarse con la correspondiente autorización de la autoridad competente. **CLÁUSULA SÉPTIMA**. - Obligaciones a cargo del CONCESIONARIO. Además del cumplimiento del objeto contractual en los términos establecidos por la normativa vigente, son obligaciones del **CONCESIONARIO** en desarrollo del presente contrato: **7.1.** Planear, diseñar, operar y dar cierre a sus operaciones de tal manera que promueva el desarrollo económico y social, en cumplimiento de los Términos de Referencia para Exploración y Programa de Trabajos y Obras PTO, así como con las condiciones fijadas por el Gobierno Nacional conforme al artículo 24 de la Ley 1753 de 2015 o aquellas normas que la modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. **7.2.** Presentar el acto administrativo, ejecutoriado y en firme, en que la autoridad competente haya otorgado la Licencia Ambiental, para ejecutar las labores y trabajos de la etapa de Explotación. **7.3.** Presentar dentro de los treinta (30) días siguientes a la inscripción del presente contrato en el Registro minero Nacional, el Programa de Trabajos y Obras, a desarrollar en el área total del contrato durante la etapa de Explotación, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Minas y a los Términos de Referencia. **7.4.** Dar cumplimiento a las características, dimensiones y calidades señaladas en el Programa de Trabajos y Obras aprobado para las construcciones, instalaciones y montajes mineros. Sin embargo, **EL CONCESIONARIO** podrá, durante su ejecución, hacer los cambios y adiciones que sean necesarios. **LA CONCEDENTE** y la autoridad ambiental deberán ser informados previamente de tales cambios y adiciones junto con una justificación de los mismos y podrán ser ejecutados una vez aprobados los ajustes por las autoridades minera y ambiental. El mencionado Programa de Trabajos y Obras, debidamente aprobado, será el Anexo No. 3 del presente contrato. **7.5.** Devolver las zonas retenidas, en caso de que no opte por su explotación, de acuerdo con el procedimiento establecido para el efecto en el Código de Minas. Si **EL CONCESIONARIO** decide explotar estas zonas retenidas, deberá incorporarlas al Programa de Trabajos y Obras y solicitar la modificación de la licencia ambiental, si a ello hubiere lugar. **7.6.** Llevar los registros e inventarios actualizados en la fase de explotación, de la producción en boca o borde de mina y en sitios de acopio, para establecer en todo tiempo los volúmenes de los minerales en bruto y de los entregados a las plantas de beneficio y, si fuere el caso, a las de transformación. Estos registros e inventarios se suministrarán trimestralmente a la Autoridad Minera. Para el efecto, **EL CONCESIONARIO** deberá diligenciar y suministrar el Formato Básico Minero adoptado por **LA CONCEDENTE**. **7.7.** Poner en práctica las reglas, métodos y procedimientos técnicos propios de la explotación minera, que eviten daños a los materiales explotados o removidos o que deterioren o esterilicen las reservas In Situ susceptibles de eventual aprovechamiento. **7.8.** Pagar las regalías establecidas en la Ley vigente al momento del perfeccionamiento del presente contrato para el mineral o minerales objeto del mismo. En todo caso, el monto de las regalías y el sistema para liquidarlas y reajustarlas, serán los vigentes a la fecha del perfeccionamiento del contrato de concesión y se aplicarán durante toda su vigencia. **7.9**. Pagar los impuestos o gravámenes del orden nacional, departamental o municipal que su actividad cause, cuando sean aplicables. **7.10.** Presentar toda la información requerida por **LA CONCEDENTE** y la correspondiente a la

información técnica y económica generada en desarrollo de los trabajos mineros conforme a las condiciones y la periodicidad que se haya dispuesto por **LA CONCEDENTE** para el efecto, durante la vigencia del contrato, la cual gozará de reserva en los términos dispuestos en el artículo 88 de la Ley 685 de 2001 o la norma que la modifique, reemplace o sustituya. **7.11.** Adoptar y mantener las medidas que correspondan en la ejecución de los trabajos a realizar durante todas las etapas del proyecto y disponer del personal y de los medios materiales necesarios para preservar la vida e integridad de las personas vinculadas a él y de terceros de conformidad con las normas vigentes sobre seguridad e higiene minera y salud ocupacional. **7.12** Presentar a **LA CONCEDENTE** un Plan de Gestión Social, que cumpla con lo señalado en la Resolución No. 318 del 20 de junio de 2018, modificada por la Resolución 263 del 25 de mayo de 2021, expedidas por la Agencia Nacional de Minería, o aquellas normas que la modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan; la formulación de este plan será presentada por el titular minero dentro de los treinta (30) días siguientes al perfeccionamiento del presente contrato. Así mismo, el Plan de Gestión Social a ejecutar debe contener los proyectos, programas, y actividades que serán ejecutados por **EL CONCESIONARIO** de acuerdo con la escala de producción y capacidad técnica y económica de **EL CONCESIONARIO**. La verificación del cumplimiento de esta obligación por parte de la autoridad minera hará parte del proceso de fiscalización de conformidad con el inciso 2o del artículo 22 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 y la Resolución No. 318 del 20 de junio de 2018, modificada por la Resolución 263 del 25 de mayo de 2021, expedidas por la Agencia Nacional de Minería, o aquellas normas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. **PARÁGRAFO:** El Plan de Gestión Social que se desarrolle en virtud del contrato de concesión, consolidará proyectos, programas y actividades para prevenir, mitigar, y atender los riesgos sociales generados por el desarrollo del proyecto minero; así como incrementar las oportunidades y beneficios generados por el mismo, considerando el respeto a los Derechos Humanos y en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional. **7.13. EL CONCESIONARIO** deberá informar y socializar a la comunidad del área de influencia directa del título minero, el proyecto a desarrollar. Para estos efectos, antes de iniciar la ejecución de su contrato de concesión informará al ente territorial el inicio del proyecto y una vez termine cada etapa, a saber, exploración, construcción y montaje, explotación y cierre, socializará con la comunidad del área de influencia, los resultados de la misma y las actividades a desarrollar en el área. **PARÁGRAFO:** Este espacio puede ser concurrente con el espacio de construcción del Plan de Gestión Social, pero el concesionario deberá llevar trazabilidad de cada de uno de ellos por separado para dar cumplimiento a esta obligación. **7.14.** Dar cumplimiento a los requisitos mínimos laborales y ambientales de acuerdo con los soportes presentados y aprobados dentro del trámite del presente contrato de concesión. **7.15.** Adoptar las medidas de protección del ambiente sano, las cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, frente a las posibles afectaciones que pueda derivarse de la actividad minera de conformidad con la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 o aquellas normas que la modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. **7.16.** En caso de existir obligaciones pendientes de cumplir por parte del titular de la licencia de exploración **No. 21833**, estas se entenderán incorporadas como obligaciones del presente contrato de concesión y en consecuencia **LA CONCEDENTE** podrá exigir su cumplimiento. **CLÁUSULA OCTAVA. -** Indemnidad. **EL CONCESIONARIO** se obliga a mantener indemne en todo momento a **LA CONCEDENTE** frente a cualquier demanda o controversia judicial, de cualquier naturaleza, que tenga como causa la ejecución del presente contrato, en tal virtud, se obliga a responder por las condenas, perjuicios, gastos de defensa judicial y extrajudicial, peritajes y demás erogaciones económicas en que deba incurrir **LA CONCEDENTE** con ocasión de la reclamación judicial derivada de la ejecución del contrato. **CLÁUSULA NOVENA. -** Autonomía Empresarial. En la ejecución de los estudios, trabajos y obras de exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio y transformación, **EL CONCESIONARIO** tendrá plena autonomía técnica, industrial, económica y comercial. Por lo tanto, podrán escoger la forma y orden de aplicación de los sistemas y procesos y determinar libremente la localización, movimientos y oportunidad del uso y dedicación del personal, equipos, instalaciones y obras, siempre y cuando se garantice el

aprovechamiento racional de los recursos mineros y la conservación del medio ambiente, sin perjuicio de la función de inspección y fiscalización a cargo de **LA CONCEDENTE**. **CLÁUSULA DÉCIMA**. - Trabajadores del CONCESIONARIO. El personal que **EL CONCESIONARIO** ocupe en la ejecución del presente contrato, será de su libre elección y remoción, sin apartarse cuando sea el caso de lo dispuesto en los artículos 128, 251, 253 y 254 del Código de Minas, estando a su cargo los salarios, prestaciones e indemnizaciones que legalmente le correspondan, entendiéndose que ninguna de tales obligaciones le corresponde a la autoridad minera. En consecuencia, **EL CONCESIONARIO** responderá por toda clase de procesos, demandas, reclamos, gastos, en que incurrieren a causa de sus relaciones laborales, así como en los que deba incurrir **LA CONCEDENTE** por dicha causa. **CLÁUSULA UNDÉCIMA**. - Responsabilidad del CONCESIONARIO. **EL CONCESIONARIO** será responsable ante **LA CONCEDENTE** por todos los trabajos que desarrolle en el área contratada. Además, responderá por cualquier daño que cause a terceros o a **LA CONCEDENTE** durante el desarrollo de los mismos, así como por las demandas, procesos, gastos judiciales y extrajudiciales, peritajes, condenas judiciales y conciliaciones que deba asumir **LA CONCEDENTE** como resultado de la ejecución del proyecto minero por parte de **EL CONCESIONARIO**. Frente a terceros dicha responsabilidad se establecerá en la forma y grado en que prevén las disposiciones civiles y comerciales ordinarias; en cuanto a dependientes o subcontratistas se dará cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Minas. **EL CONCESIONARIO** serán considerados como contratista independiente para efectos de todos los contratos civiles, comerciales y laborales que celebre por causa de sus estudios, trabajos y obras de exploración y explotación según lo establecido en el artículo 57 del Código de Minas. En ningún caso **LA CONCEDENTE** responderá por las obligaciones de cualquier naturaleza que adquiera **EL CONCESIONARIO** con terceros en desarrollo del presente contrato. **CLÁUSULA DUODÉCIMA** - Diferencias. Las diferencias de orden legal o económico quedan sometidas al conocimiento y decisión de la rama jurisdiccional del poder público colombiano, en los términos de competencia previstos para el efecto en el Código de Minas o en las disposiciones que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA**. - Cesión y Gravámenes. **13.1. Cesión.** La cesión de derechos emanados de este contrato se realizará de acuerdo con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 1955 de 2019 y con el cumplimiento del requisito dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015. La cesión de que trata esta cláusula no podrá estar sometida por las partes a término o condición alguna en cuanto hace relación al Estado. **a)** Si la cesión fuere total, el cesionario quedará subrogado en todas las obligaciones emanadas del contrato, aún en las contraídas antes de la cesión y que se hallaren pendientes de cumplirse. **b)** La cesión parcial de derechos del presente contrato, podrá hacerse por cuotas o porcentajes de dicho derecho. En este caso, cedente y cesionario serán solidariamente responsables por las obligaciones contraídas. **c) Cesión de áreas:** Podrá haber cesión de áreas del contrato de concesión mediante la división material de la zona solicitada o amparada por el mismo. Esta clase de cesión dará nacimiento a un nuevo contrato con el cesionario, que se perfeccionará con la inscripción del documento de cesión en el Registro Minero Nacional. **PARÁGRAFO. -** De conformidad con el artículo 22 de la Ley 1753 del 09 de junio de 2015 y la Resolución No. 352 del 04 de julio de 2018 de la Agencia Nacional de Minería, o aquellas normas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan, para los trámites de cesión de derechos y de áreas **LA CONCEDENTE** requerirá a los interesados acreditar la capacidad económica para la exploración, explotación, desarrollo y ejecución del proyecto minero. **13.2. Gravámenes**: - El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal podrá ser gravado o dado en garantía de obligaciones, en las condiciones y modalidades establecidas en el Capítulo XXIII del Código de Minas y la Ley 1676 de 2013 o aquellas normas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA**. - Póliza Minero – Ambiental. Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato de concesión minera, **EL CONCESIONARIO** deberá constituir una póliza de garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales, el pago de las multas y la caducidad. El valor asegurado se calculará con base en los siguientes criterios: a) Para la etapa de Explotación, equivaldrá a un diez por ciento (10%) del resultado de multiplicar el volumen de

producción anual estimada del mineral objeto de la concesión, con base en lo establecido en el Programa de Trabajos y Obras aprobado para dicha etapa, por el precio en boca de mina del referido mineral fijado anualmente por el Gobierno. La póliza de que trata esta cláusula deberá ser aprobada por **LA CONCEDENTE** y deberá mantenerse vigente durante la vida de la concesión, de sus prórrogas y por tres (3) años más. En el evento en que la póliza se haga efectiva, subsistirá la obligación de reponer dicha garantía. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA**. - Inspección. La autoridad Minera, inspeccionará en cualquier tiempo, en la forma que lo estime conveniente, las labores que realice **EL CONCESIONARIO**, en procura de alcanzar el debido cumplimiento del presente contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA**. - Seguimiento y Control. **LA CONCEDENTE** directamente o por medio de los auditores que designe, ejercerá el seguimiento y control de la forma y condiciones en que se ejecuta el contrato de concesión, tanto por los aspectos técnicos, económicos, jurídicos, así como de seguridad e higiene minera, como los operativos, sociales y ambientales, sin perjuicio de que sobre estos últimos la autoridad ambiental o sus auditores autorizados, ejerzan igual vigilancia en cualquier tiempo, manera y oportunidad. **PARÁGRAFO**: La Autoridad Minera podrá cobrar los servicios de seguimiento y control a los títulos mineros a través de funcionarios o contratistas. La tarifa por los servicios de seguimiento y control se fijará conforme a los parámetros adoptados para el efecto por la Autoridad Minera. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA**. - Multas. En caso de infracción de cualquiera de las obligaciones por parte de **EL CONCESIONARIO**, previo requerimiento y de conformidad con la Resolución No. 91544 del 24 de diciembre de 2014 del Ministerio de Minas y Energía o aquella norma que la modifique, adicione, complemente o sustituya, **LA CONCEDENTE** podrá imponer administrativamente multas sucesivas de hasta mil (1000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cada vez y para cada caso de infracción de las obligaciones derivadas del presente contrato, siempre que no fueren causal de caducidad o que **LA CONCEDENTE**, por razones de interés público expresamente invocadas, se abstuviere de declararla. Cada multa deberá ser pagada por **EL CONCESIONARIO** dentro del término de hasta treinta (30) días hábiles, según lo establezca **LA CONCEDENTE**, contados a partir de la fecha en que quede ejecutoriada la providencia que la imponga. Si **EL CONCESIONARIO** no cancelare oportunamente las multas de que trata esta cláusula, **LA CONCEDENTE** las hará efectivas con cargo a la póliza de cumplimiento o por intermedio de su facultad de cobro coactivo, sin perjuicio de que se declare la caducidad. En el caso de contravenciones a las disposiciones ambientales, la autoridad ambiental aplicará las sanciones previstas en las normas ambientales vigentes. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA**. - Terminación. El Contrato de concesión debidamente perfeccionado podrá darse por terminado en los siguientes casos: **18.1.** Por renuncia del concesionario, siempre que se encuentre a Paz y Salvo en el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de concesión. **18.2.** Por mutuo acuerdo. **18.3.** Por vencimiento del término de duración. **18.4.** Por muerte del concesionario y **18.5.** Por caducidad. **PARÁGRAFO. -** En caso de Terminación por muerte de **EL CONCESIONARIO,** esta causal se hará efectiva si dentro de los dos (2) años siguientes al fallecimiento de **EL CONCESIONARIO**, los asignatarios no piden subrogarse en los derechos emanados de la concesión, en los términos y condiciones establecidas en el artículo 111 del Código de Minas. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA**. - Caducidad. **LA CONCEDENTE** podrá mediante acto administrativo debidamente motivado declarar la caducidad administrativa del presente contrato por las causales señaladas en el artículo 112 del Código de Minas, así como lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley 1450 de 2011 o aquellas normas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. En este caso **EL CONCESIONARIO** queda obligado a cumplir o garantizar todas las obligaciones de orden ambiental que le sean exigibles y las de conservación y manejo adecuado de los frentes de trabajo y de las servidumbres que se hubieren establecido. **CLÁUSULA VIGÉSIMA**. - Procedimiento para la caducidad. La caducidad del contrato, en los casos en que hubiere lugar, será declarada por **LA CONCEDENTE** de conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 288 del Código de Minas o aquellas normas que la modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA**. - Reversión y Obligaciones en caso de Terminación. **a)** Reversión. En todos los casos de terminación del contrato, ocurrida en cualquier

tiempo, operará la reversión gratuita de bienes en favor del Estado, circunscrita esta medida a los inmuebles e instalaciones fijas y permanentes, construidas y destinadas por **EL CONCESIONARIO** en forma exclusiva al transporte y al embarque de los minerales provenientes del área contratada y de aquellas que se encuentren incorporadas a los yacimientos y accesos y que no puedan retirarse sin detrimento del mismo y de los frentes de trabajo. Esta reversión operará sólo en los casos en que las características y dimensiones de los mencionados bienes, a juicio de **LA CONCEDENTE**, los hagan aptos como infraestructura destinada a un servicio público de transporte o embarque o darse al uso de la comunidad. **b)** Obligaciones en caso de terminación. **EL CONCESIONARIO**, en todos los casos de terminación del contrato, quedan obligados a cumplir o a garantizar las obligaciones de orden ambiental exigibles al tiempo de hacerse efectiva dicha terminación. De igual manera darán cumplimiento o garantizarán sus obligaciones de orden laboral reconocidas o causadas al momento de su retiro como concesionarios. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA**. - Liquidación. Dentro los doce (12) meses siguientes a la expedición del acto administrativo que declare la terminación del presente contrato las partes suscribirán un Acta en la cual deberá constar detalladamente la liquidación definitiva del mismo y el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo de **EL CONCESIONARIO**, en especial de las siguientes: **22.1.** El recibo por parte de **LA CONCEDENTE** del área objeto del contrato y de la(s) mina(s), indicando las condiciones técnicas, físicas y ambientales en que se encuentra(n). Estas últimas de acuerdo con lo que establezca la autoridad ambiental competente. **22.2.** Las pruebas por parte de **EL CONCESIONARIO** del cumplimiento de todas sus obligaciones laborales, o la constancia de su no entrega; **22.3.** El cumplimiento de todas las obligaciones consignadas en la Cláusula Séptima, dejando constancia de las condiciones del mismo y del detalle de las obligaciones incumplidas, sobre las cuales **LA CONCEDENTE** tomará las acciones que procedan. **22.4.** La relación de pagos de regalías y canon superficiario a su cargo, dejando constancia de las condiciones de cumplimiento y del detalle de las obligaciones incumplidas, sobre las cuales **LA CONCEDENTE** tomará las acciones que procedan. Si **EL CONCESIONARIO** no compareciere a la diligencia en la cual se levante el Acta de Liquidación, **LA CONCEDENTE** liquidará el contrato de concesión en forma unilateral mediante acto administrativo debidamente motivado dentro de los dos (2) meses siguientes a la convocatoria o a la falta de acuerdo y se harán efectivas las garantías correspondientes si procediere. **PARÁGRAFO**. En el evento en que **EL CONTRATISTA** minero presente salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, la liquidación unilateral solo procederá en los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.** Intereses Moratorios Cuando **EL CONCESIONARIO** no pague oportunamente alguna de las obligaciones pecuniarias previstas en el presente contrato o la ley, **LA CONCEDENTE** aplicará a dicha obligación la máxima tasa de interés moratorio legalmente permitida y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, o la entidad que haga sus veces, al hacer efectivo su recaudo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA**. - Ley aplicable. Para todos los efectos, el presente contrato, una vez suscrito e inscrito en el Registro Minero Nacional, se sujetará exclusivamente a las leyes y jueces de la República de Colombia. Su ejecución e interpretación, terminación y liquidación quedan sujetos a la Constitución, leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, reglamentos o a cualquier otra disposición emanada de las autoridades competentes colombianas, que en alguna forma tengan relación con el objeto contractual. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA**. - Domicilio Contractual. Para todos los efectos derivados de este contrato el domicilio contractual será el lugar de su celebración. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA**. - Perfeccionamiento. Las obligaciones que por este contrato adquiere **EL CONCESIONARIO**, producen efectos desde su perfeccionamiento. El presente contrato se considera perfeccionado una vez se encuentre inscrito en el Registro Minero Nacional, según lo establecido por el artículo 50 del Código de Minas. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA**. - Anexos. Son anexos de este contrato y hacen o harán parte integrante del mismo los siguientes:

Anexo No.1. Plano Topográfico

Anexo No.2. Términos de Referencia para los trabajos de exploración y el Programa de Trabajos y Obras PTO y las Guías Minero Ambientales.

CONTRATO DE CONCESIÓN No. 21833 PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (GRAVAS DE CANTERAS Y RECEBO) ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA –ANM- Y CANTERAS Y TRITURADOS PISVAR Y CIA LTDA. TRITUPISVAR LTDA.

Anexo No.3. Programa de Trabajos y Obras PTO aprobado.

Anexo No.4. Anexos Administrativos:

- Fotocopia de la(s) cédula(s) de ciudadanía de **EL CONCESIONARIO / o su Representante Legal / Certificado de Existencia y Representación Legal**
- Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el SIRI de **EL CONCESIONARIO**
- La licencia ambiental o demás autorizaciones ambientales
- La póliza minero-ambiental
- Todos los documentos que suscriban las partes en desarrollo de este contrato

Para constancia se firma este contrato por los que en él intervienen, en dos (2) ejemplares del mismo tenor y contenido, en la ciudad de Bogotá D.C. a los 29 ABR 2022

LA CONCEDENTE

ANA MARÍA GONZÁLEZ BORRERO
La Gerente de Contratación y Titulación

EL CONCESIONARIO

CANTERAS Y TRITURADOS PISVAR Y CIA LTDA. TRITUPISVAR LTDA., Nit. 819.001.602-1
DORIS PIEDAD VARGAS PINZÓN PINZÓN,
C.C. No. 36,546,572,

Elaboró: Olga Carballo – Abogada Grupo de Evaluación de Modificaciones a Títulos Mineros
Cindy Carolina Quintero - Ingeniera de Minas -Grupo de Evaluación de Modificaciones a Títulos Mineros
Revisó: Emnyth Marilen Torres Pacheco – Ingeniera GEMTM
Revisó: Carlos Vides / Asesor VCT

ANEXO 4

Informe SST.

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)



MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES.

Áreas de intervención: Caño Hondo

PERIODO: febrero de 2026

CONTENIDO

1 LOCALIZACIÓN DEL SECTOR A INTERVENIR....5
1.1. LOCALIZACION GENERAL....5
1.2. LOCALIZACION GENERAL DEL SECTOR A INTERVENIR....6
2. PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL PROYECTO 7
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS....11
3.1 INDUCCIONES O REINDUCCIONES.....11
3.2 CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....12
3.3 INSPECCIONES DE SEGURIDAD.....25
3.4 ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP).....26
3.5 SEÑALIZACION.....32
4. MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS....35
5. PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS....36
6. ORDEN Y ASEO....42
7. INCIDENTES Y/O ACCIDENTES LABORALES....44
8. EXAMENES MEDICOS....45
9. HIDRATACION....46

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Personal asignado al proyecto....7
Tabla 2. Inducciones....11
Tabla 3. Charlas y capacitaciones SST....12
Tabla 4. Cronograma de inspecciones....25
Tabla 5. Capacitaciones relacionadas con el plan de emergencia....37

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización general del proyecto....5
Ilustración 2. Caño Hondo, localización general. Tomado de google earth....6

LISTA DE GRAFICAS

Grafica 1. Cumplimiento programa inspecciones....26

LISTA DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. Charlas y capacitaciones SST 14
Fotografía 2. Charlas y capacitaciones SST 15
Fotografía 3. Charlas y capacitaciones SST 16
Fotografía 4. Charlas y capacitaciones SST 17
Fotografía 5. Charlas y capacitaciones SST 18
Fotografia 6. Charlas y capacitaciones SST 19
Fotografia 7. Charlas y capacitaciones SST 20
Fotografia 8. Charlas y capacitaciones SST 21
Fotografia 9. Charlas y capacitaciones SST 22
Fotografia 10. Charlas y capacitaciones SST 23
Fotografia 11. Charlas y capacitaciones SST 24
Fotografia 12. Entrega de EPP 27
Fotografia 13. Entrega de EPP 28
Fotografia 14. Entrega de EPP 29
Fotografia 15. Entrega de EPP 30
Fotografia 16. Entrega de EPP 31
Fotografia 17. Señalización áreas de trabajo 32
Fotografía 18. Señalización áreas de trabajo 33
Fotografia 19. Señalización áreas de trabajo 34
Fotografia 20. Equipos de emergencias - Kit control derrame 38
Fotografia 21. Equipo de emergencia extintor 39
Fotografia 22. Equipo de emergencia botiquín 40
Fotografia 23. Equipo de emergencia camilla 41
Fotografia 24. Orden y aseo 42
Fotografia 25. Punto ecológico 43
Fotografia 26. Punto de hidratación 46


1 LOCALIZACIÓN DEL SECTOR A INTERVENIR

1.1. LOCALIZACION GENERAL.

La Ciénaga Grande de Santa Marta se localiza al Norte del país en el extremo Noroccidental del Departamento del Magdalena, su área de influencia está comprendida entre el nacimiento del caño Schiller en la Ciénaga de Cerro de San Antonio al Sur, el río Magdalena por el Oeste, el Mar Caribe al Norte y al Este por la desembocadura de los ríos Fundación, Aracataca, Sevilla y Frío que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

La ciénaga Grande de Santa Marta es la laguna costera más grande del país con una extensión lagunar de 430 km2, cuenta con una sola conexión con el mar Caribe a través del puente de la barra y está conectada al complejo lagunar del pajaral por intermedio de caños que permiten a su vez intercomunicación con el rio Magdalena.

Ilustración 1. Localización general del proyecto

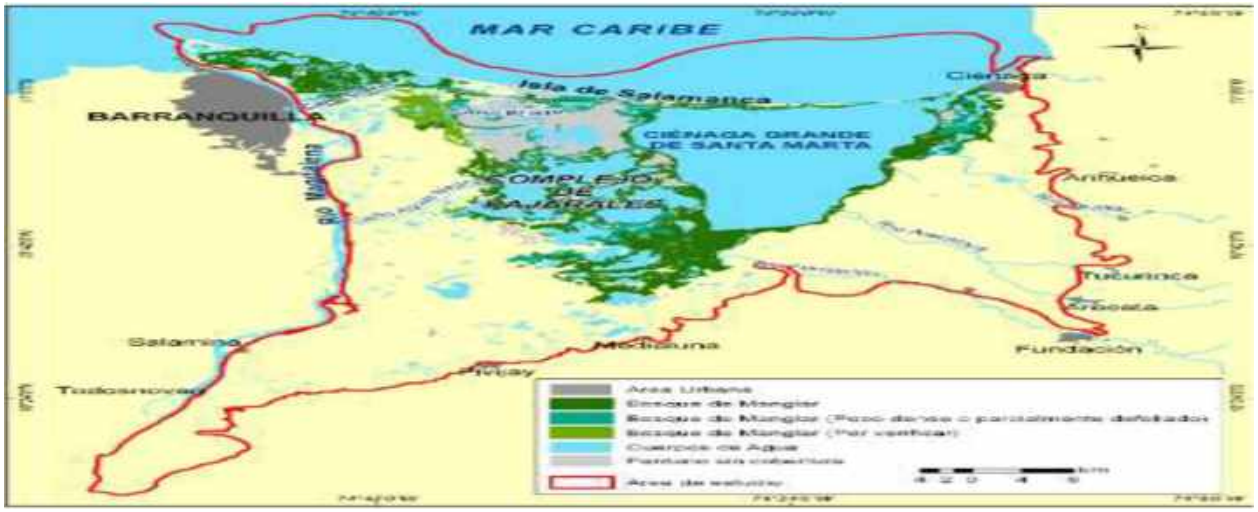


1.2. LOCALIZACION GENERAL DEL SECTOR A INTERVENIR

Específicamente el área de la Ciénaga Grande que se pretende intervenir con este proyecto se encuentra ubicada en el sector este, donde se ubica Caño Hondo del complejo lagunar, el cual se encuentran en la jurisdicción del municipio de Salamina, por tanto, los beneficiarios directos son los pobladores de los municipios de Salamina y Remolino. Ver figura No.2.

El municipio de Salamina es un municipio ubicado al norte del departamento del Magdalena, Colombia a escasos 50 kilómetros de la desembocadura del río Magdalena. Funciona como punto de conexión de la Vía de la Cordialidad del Magdalena con el Corregimiento Puerto Giraldo en el Departamento del Atlántico. El desarrollo social y económico de la cabecera ha estado marcado, históricamente desde principios de siglo, por las actividades agropecuarias, fluvial y comercial, lo cual le representó un auge significativo durante los primeros cincuenta años del anterior siglo. Sin lugar a duda, a ello contribuyó el efecto de sus fuertes vínculos con el comercio de Barranquilla y su importante y estratégica localización sobre el río Magdalena y el Departamento del Atlántico con relación a las poblaciones del interior del departamento del Magdalena, sobre las cuales debía configurarse un importante mercado regional.

Ilustración 2. Caño Hondo, localización general. Tomado de google earth

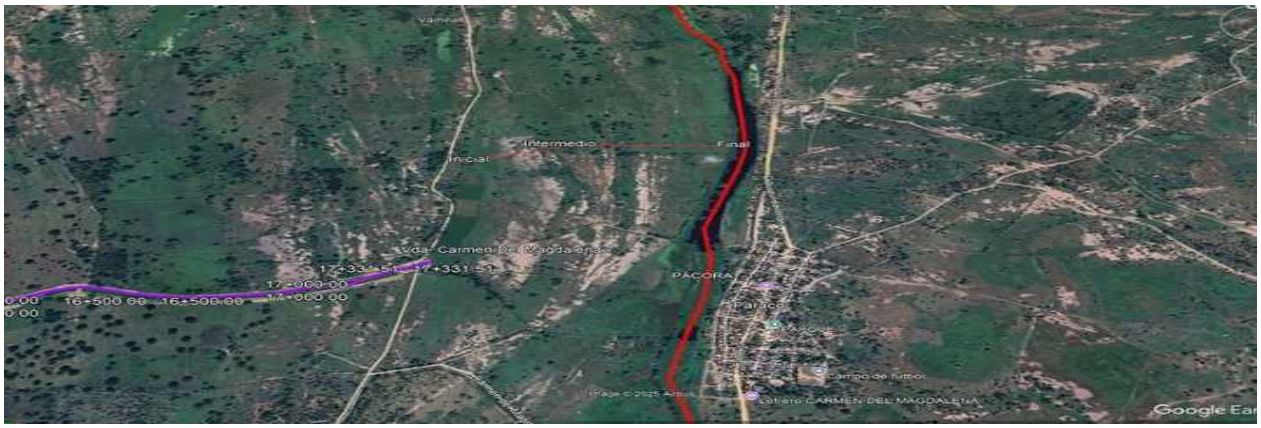

2. PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL PROYECTO

Como compromiso establecido en nuestra Política Integrada de Gestión y cumplimiento de la legislación colombiana en materia de Seguridad y Salud en el trabajo CONSORCIO CGSM 4, en su ANEXO 4.1 entrega los aportes a seguridad social del personal participante del proyecto, el cual se relaciona a continuación.

Tabla 1. Personal asignado al proyecto

CEDULA	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CARGO	EMPRESA
1129578658	ACEVEDO	COLON	YURANI ANDREA	INGENIERA AMBIENTAL SENIOR	PANAMERICAN
85479599	ALVAREZ	MAZA	EDILBERTO ENRIQUE	AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HERNANDEZ
1004213282	ALVAREZ	MANGA	KEVIN ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	RUBEN FRANCO
1079913769	ALVAREZ	MONTENEGRO	CARLOS ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO CGSM 4
17955049	ANILLO	ARDILA	SEBASTIAN	AYUDANTE DE OBRA	RUBEN FRANCO
1010080507	BARRERA	MARTINEZ	CARLOS	MARINO	CONSORCIO CGSM 4
5078310	BONET	ACUÑA	ADOLFO RAFAEL	CAPATAZ	RUBEN FRANCO
5078708	BORJA	MARTINEZ	ROBERTO CARLOS	AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HERNANDEZ
5078169	BORJAS	MARTINEZ	GERMAN EUTIMIO	OFICIAL	RUBEN FRANCO
1079911492	BUELVAS	COLON	EDUARDO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HERNANDEZ
1079934636	CABALLERO	CHARRIS	JOSE LEONARDO	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO CGSM 4
1081027709	CAMACHO	CANTILLO	JOSE GREGORIO	MARINO	CONSORCIO CGSM 4
5095498	CANTILLO	CARRILLO	EDUARDO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HERNANDEZ
1079916394	CANTILLO	PACHECHO	EDULFO ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	RUBEN FRANCO

CEDULA	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CARGO	EMPRESA
85479893	CANTILLO	BOLAÑO	ORLANDO RAFAEL	MAESTRO DE OBRA	RUBEN FRANCO
5062296	CERVANTES	OROZCO	YECID ALFONSO	AYUDANTE DE OBRA	RUBEN FRANCO
3761940	DE LOS RIOS	GUETTE	ARISTIDES MANUEL	AYUDANTE DE OBRA	RUBEN FRANCO
1081027248	ESCORCIA	SIERRA	LUIS EDUARDO	AYUDANTE DE OBRA	RUBEN FRANCO
1079912738	FANDIÑO	GUTIERREZ	DAVINSON JOSE	AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HERNANDEZ
1108767049	FUENTES	ACOSTA	LINA MARIA	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	VIAS Y DRAGADOS
1083572789	GAMEZ	SANTODOMINGO	CARLOS SEGUNDO	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO CGSM 4
1004121831	GAMEZ	RAMIREZ	BRYAN DAVID	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO CGSM 4
1126120263	GARCIA	OROZCO	JOSE JORGE	AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HERNANDEZ
1004121723	GOMEZ	ESCORCIA	SINIBALDO JOSE	MARINO	CONSORCIO CGSM 4
1004121720	GOMEZ	FABIAN	JORGE LUIS	AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HERNANDEZ
1004122911	GOMEZ	DE LA CRUZ	NASER IVAN	AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HERNANDEZ
1010150262	GONZALEZ	VERGARA	ADRIANA CRISTINA	PROFESIONAL EN SST	PANAMERICAN
5078492	HERRERA	CABARCAS	ARTURO RAFAEL	OFICIAL	MANUEL HERNANDEZ
1084738073	IBAÑEZ	OSPINO	ALFONSO ENRIQUE	OPERADOR DE EXCAVADORA	VIAS Y DRAGADOS
5078921	LARA	PASION	HERIBERTO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HERNANDEZ
1193165789	LEIVA	GAMEZ	MIGUEL ALFONSO	AYUDANTE DE OBRA	RUBEN FRANCO
84456544	LOPEZ	CLAVIJO	CHRISTIAN DARO	ESPECIALISTA HIDRAULICO	INDEPENDIENTE
7598807	MAESTRE	CHARRIS	DANIEL ALBERTO	MARINO	CONSORCIO CGSM 4

Realizó:	Revisó:	Aprobó:
Adriana G.V. Adriana González Vergara Profesional SST	Adriana G.V. Adriana González Vergara Profesional SST	Angel M Vizcaino E. Angel Vizcaino Escobar Director de Proyecto

CEDULA	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CARGO	EMPRESA
1079933354	MANCILLA	MONTENEGRO	ARMANDO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	RUBEN FRANCO
1079914724	MANOTAS	GUTIERREZ	JESUS DAVID	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO CGSM 4
1085224296	MARTINEZ	JIMENEZ	MARIA AUXILIADORA	BIOLOGA	CONSORCIO CGSM 4
5078217	MARTINEZ	PABON	REYNALDO	AYUDANTE DE OBRA	RUBEN FRANCO
1081028345	MERCADO	RUDAS	CARLOS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HERNANDEZ
1004212861	MORRÓN	VIZCAINO	JESUS DAVID	VIGIA HSE	VIAS Y DRAGADOS
9877310	OROZCO	OROZCO	JADER IVAN	AYUDANTE DE OBRA	RUBEN FRANCO
1004298507	OROZCO	FERREIRA	JOHENDRYS	MARINO	CONSORCIO CGSM 4
1193547906	OROZCO	GUETE	JESUS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HERNANDEZ
1100549999	PALENCIA	GUZMAN	JESUS DANIEL	TOPOGRAFO	VIAS Y DRAGADOS
5094631	PASION	GUTIERREZ	JOSE MANUEL	AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HERNANDEZ
5078804	PASION	MANGA	MANUEL GREGORIO	AYUDANTE DE OBRA	RUBEN FRANCO
73316407	PEREZ	SIERRA	ESNEIDER RAFAEL	MAESTRO DE OBRA	MANUEL HERNANDEZ
1082046517	POLO	NAVARRO	YESMITH VANESSA	VIGIA HSE	CONSORCIO CGSM 4
9464493661	PRADA	DAZA	EUGENIO	GERENTE DEL PROYECTO	INDEPENDIENTE
8506100	RICARDO	CRUZATE	DANIEL JOSE	AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HERNANDEZ
1081028364	ROPAIN	ROCA	OLIVER RAFAEL	AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HERNANDEZ
1118813194	ROYS	CORZO	EDILBERTO GREGORIO	INGENIERO RESIDENTE	PANAMERICAN
1031127390	SANTISTEBAN	MURIEL	IVONNE STIBALIZ	INGENIERO TOPOGRAFICO	PANAMERICAN

Realizó:	Revisó:	Aprobó:
Adriana González Vergara Profesional SST	Adriana González Vergara Profesional SST	Angel Vizcaino Escobar Director de Proyecto

CEDULA	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CARGO	EMPRESA
1079936122	SANTODOMINGO	DE LA CRUZ	CESAR ALFREDO	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO CGSM 4
1079912129	SANTODOMINGO	CALVO	JONATHAN ENRIQUE	AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HERNANDEZ
1079913169	TERNERA	CASTRO	LEONEL DAVID	AYUDANTE DE OBRA	RUBEN FRANCO
7595150	TERNERA	ORDOÑEZ	REINALDO JAIME	AYUDANTE DE OBRA	MANUEL HERNANDEZ
9153002	VALENCIA	PEREZ	FELIX	OPERADOR DE EXCAVADORA	VIAS Y DRAGADOS
73475172	VIZCAINO	ESCOBAR	ANGEL MARIA	DIRECTOR DE PROYECTOS	PANAMERICAN
1081028028	WILCHES	GONZALEZ	PEDRO MIGUEL	MARINO	CONSORCIO CGSM 4

Ver ANEXO 4.1. Seguridad Social

Ver ANEXO 4.2. Consolidado de personal

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

3.1 INDUCCIONES O REINDUCCIONES.

Durante el periodo reportado se programaron las inducciones relacionadas a continuación.

Tabla 2. Inducciones

CEDULA	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE	FECHA DE LA INDUCCION
1004122911	GOMEZ	DE LA CRUZ	NASER IVAN	03/02/2026
1079912738	FANDIÑO	GUTIERREZ	DAVINSON JOSE	03/02/2026
85479599	ALVAREZ	MAZA	EDILBERTO ENRIQUE	03/02/2026
7595150	TERNERA	ORDOÑEZ	REINALDO JAIME	03/02/2026
1004121720	GOMEZ	FABIAN	JORGE LUIS	03/02/2026
1126120263	GARCIA	OROZCO	JOSE JORGE	03/02/2026

Ver ANEXO 4.3. Inducciones

3.2 CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Durante este período se programaron las charlas de SST, dirigidas al personal operativo del proyecto, relacionadas a continuación:

Tabla 3. Charlas y capacitaciones SST

PROCESO O PROGRAMA	TIPO DE ACTIVIDA	(NOMBRE DE LA CAPACITACION)	FECHA	ASISTENTES
Conservación osteomuscular	Capacitación	Prevención de lesiones osteomusculares	3-feb-26	6
Estilo de vida saludable	DIA	DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER	4-feb-26	14
Plan de emergencias	Socialización	Procedimiento en caso de ataque de abejas africanas	5-feb-26	26
Riesgo cardiovascular	Charla	Charla: Riesgo cardiovascular - factores de riesgo	7-feb-26	19
SGI	Socialización	Política de seguridad operacional y protección del medio ambiente	9-feb-26	19
Conservación visual	Charla	Importancia del uso de las gafas de seguridad - de que me protege	10-feb-26	25
PESV	Charla	El alcohol y la conducción	11-feb-26	27
Plan de emergencias	Ejercicio practico	En caso de ataque de abejas africanas	12-feb-26	13
Prevención consumo alcohol y spa	Charla	Charla: Consumo de alcohol - efectos	14-feb-26	14
Riesgo publico	Capacitación	Riesgo publico	17-feb-26	5

PROCESO O PROGRAMA	TIPO DE ACTIVIDA	(NOMBRE DE LA CAPACITACION)	FECHA	ASISTENTES
PESV	Charla	Estándar de seguridad vial para ciclistas	18-feb-26	30
Plan de emergencias	Socialización	Procedimiento en caso de atentado terrorista	19-feb-26	28
Cultura de seguridad	Charla	La seguridad es realmente nuestra prioridad – Procedimiento de reporte de incidentes y accidentes	20-feb-26	31
SGSST	Charla	¿Qué es el COCOLA? ¿Como se eligen sus miembros? ¿Quiénes lo conforman?	23-feb-26	23
Riesgo mecánico	Capacitación	¿Cómo prevenir lesiones en las manos?	24-feb-26	29
PESV	Charla	Estándar de seguridad vial para peatones	25-feb-26	21
Plan de emergencias	Ejercicio practico	En caso de atentado terrorista	26-feb-26	27
Cultura de seguridad	Charla	Buen uso de la dotación	27-feb-26	28
Prevención consumo alcohol y spa	Socialización	Política de control de alcohol, drogas y tabaco	28-feb-26	22

Ver ANEXO 4.4. Asistencia a charlas o capacitaciones

Fotografía 1. Charlas y capacitaciones SST



Fuente: Autores, 2026

Fotografía 2. Charlas y capacitaciones SST



Fuente: Autores, 2026

Fotografía 3. Charlas y capacitaciones SST



Fuente: Autores, 2026

Fotografía 4. Charlas y capacitaciones SST



Fuente: Autores, 2026

Fotografía 5. Charlas y capacitaciones SST



Fuente: Autores, 2026

Fotografia 6. Charlas y capacitaciones SST



Fuente: Autores, 2026

Fotografia 7. Charlas y capacitaciones SST



Fuente: Autores, 2026

Fotografia 8. Charlas y capacitaciones SST



Fuente: Autores, 2026

Fotografia 9. Charlas y capacitaciones SST



Fuente: Autores, 2026

Fotografia 10. Charlas y capacitaciones SST



Fuente: Autores, 2026

Fotografia 11. Charlas y capacitaciones SST



Fuente: Autores, 2026


3.3 INSPECCIONES DE SEGURIDAD.

Se realizaron las inspecciones a los elementos de seguridad relacionados a continuación:

Tabla 4. Cronograma de inspecciones

TIPO DE INSPECCION	PROGRAMADA	EJECUTADA
GIM-R-011 Inspección de extintores	1	1
GIM-R-012 Inspección de Kit control derrame	1	1
GIM-R-018 Inspección de elementos de protección personal	1	1
GIM-R-021 Inspección de señalización	2	2
GIM-R-022 Inspección de botiquines	1	1
GIM-R-023 Inspección orden y aseo	1	1
GIM-R-064 Inspección de camilla	1	1

Grafica 1. Cumplimiento programa inspecciones

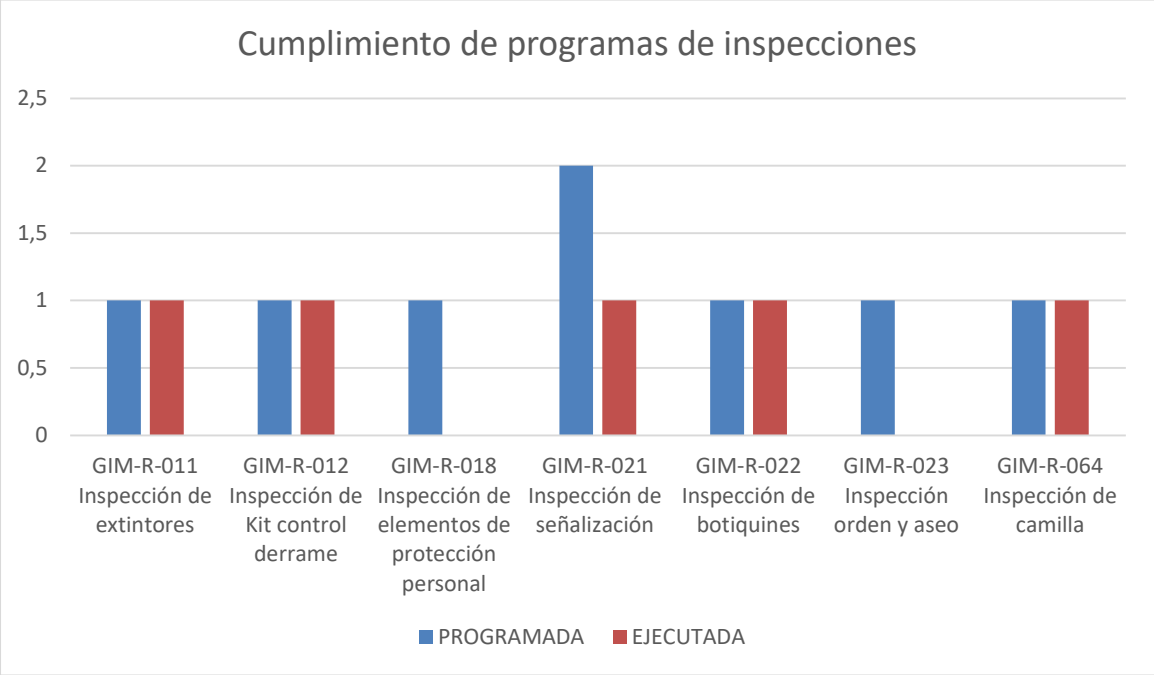

Ver ANEXO 4.5. Programa general de inspecciones 2026

Ver ANEXO 4.6. Registros de inspecciones

3.4 ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).

Como compromiso con nuestras Políticas HSEQ en la prevención de accidentes se entrega al personal del proyecto los elementos de protección personal necesarios para el desarrollo seguro de la operación. Se anexan soportes de entrega de los EPP. Ver ANEXO 4.7. Entrega de EPP

Fotografía 12. Entrega de EPP



Fuente: Autores, 2026

Fotografía 13. Entrega de EPP



Fuente: Autores, 2026

Fotografia 14. Entrega de EPP



Fuente: Autores, 2026

Fotografia 15. Entrega de EPP



Fuente: Autores, 2026

Fotografia 16. Entrega de EPP



Fuente: Autores, 2026

3.5 SEÑALIZACION.

En CONSORCIO CGSM 4 se utiliza la señalización como medida correctiva o preventiva en el ambiente laboral, antes que ocurran accidentes o incidentes.

Fotografia 17. Señalización áreas de trabajo



Fuente: Autores, 2026

Fotografía 18. Señalización áreas de trabajo



Fuente: Autores, 2026

Fotografia 19. Señalización áreas de trabajo



Fuente: Autores, 2026

4. MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Con el fin de garantizar un manejo adecuado de sustancias químicas y prevenir derrames y/o fugas se siguen los siguientes lineamientos:

- Todas las sustancias químicas que manipule el personal deben tener las etiquetas, acorde con las disposiciones del Sistema Globalmente Armonizado -SGA.
- Almacenar la sustancia asegurando la conservación y cumpliendo los criterios de compatibilidad de productos.
- Revisar se manera periódica el estado de envases y empaques de manera que se identifiquen puntos por donde pueda haber derrames o fugas.
- Disponer de las fichas de seguridad y seguir las recomendaciones que allí aparecen.
- Se realiza transporte y suministro de combustible para la maquinaria asignada al proyecto por parte de compañías que cuentan con todos sus documentos legales para al fin.
- Para al transporte y suministro de combustible se utilizan los camiones tipo tanque marca CHEVROLET WGV 681, CHEVROLET SZL 039 y HYUNDAI SMG 733. El servicio es prestado por Torcoroma comercializador industrial S.A.S

  Ver ANEXO 4.8. Documentos carrotanque de combustible

5. PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

El proyecto cuenta con un plan de preparación y respuesta ante emergencias cuyo objeto es, proporcionar a los empleados los elementos adecuados que les permitan responder con eficacia en la prevención y atención de una emergencia, para así disminuir las lesiones que se puedan presentar tanto humanas como económicas.

Dentro de este plan, se cuenta con procedimientos de actuación en caso de:

- Evacuación
- Sismo
- Inundaciones
- Tormenta tropical o eléctrica
- Mordedura de serpiente
- Ataque de abejas africanas
- Incendio
- Explosión
- Derrame de sustancias químicas
- Hundimiento
- Colisión de embarcaciones
- Hombre al agua
- Atentado terrorista
- Robo o asalto
- Accidente de transito

Tabla 5. Capacitaciones relacionadas con el plan de emergencia

TIPO DE ACTIVIDAD	TEMA (NOMBRE DE LA CAPACITACION)	SUBTEMA	FECHA	ASISTENTES CGSM 4
Socialización	Procedimiento en caso de ataque de abejas africanas	Abejas y su función en la naturaleza Objetos y elementos que las atraen Que hacer en caso de presencia de abejas en el lugar de trabajo Que hacer en caso de ataque de abejas	5-feb-26	26
Ejercicio practico	En caso de ataque de abejas africanas		12-feb-26	13
Socialización	Procedimiento en caso de atentado terrorista	Señales de alerta frente un atentado Actuación posterior al evento Aseguramiento de instalaciones Comunicación a Gerencia	19-feb-26	28
Ejercicio practico	En caso de atentado terrorista		26-feb-26	27

Ver ANEXO 4.4. Asistencia a charlas o capacitaciones

Ver ANEXO 4.9. Medevac

Ver ANEXO 4.10. Directorio de emergencias

Ver ANEXO 4.11. Guía para la evaluación prácticas de emergencia

Fotografia 20. Equipos de emergencias - Kit control derrame



Fuente: Autores, 2026

Fotografia 21. Equipo de emergencia extintor



Fuente: Autores, 2026

Fotografia 22. Equipo de emergencia botiquín



Fuente: Autores, 2026

Fotografía 23. Equipo de emergencia camilla



Fuente: Autores, 2026

6. ORDEN Y ASEO

El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran importancia para la salud y la seguridad, es por esto, que de manera periódica se realizan jornadas de orden y aseo en los frentes de obra.

Fotografía 24. Orden y aseo



Fuente: Autores, 2026

Fotografia 25. Punto ecológico



Fuente: Autores, 2026

7. INCIDENTES Y/O ACCIDENTES LABORALES

Durante el periodo reportado se presentaron los accidentes laborales relacionados a continuación.

NOMBRE DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO: Davinson José Fandiño Gutiérrez

FECHA DEL ACCIDENTE: 06 de febrero de 2026

DIAS DE INCAPACIDAD: 4 días de incapacidad

Ver ANEXO 4.12 Incidentes o accidentes

8. EXAMENES MEDICOS

En el proyecto se realiza exámenes de ingreso a su personal, con el fin de determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo y de manera periódica con el de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la exposición al medio ambiente de trabajo. Así mismo, para detectar enfermedades de origen común, con el fin de establecer un manejo preventivo.

Durante el periodo reportado no se programaron exámenes médicos.

9. HIDRATACION

En el proyecto se cuenta con punto de hidratación ubicado en el punto base, con el propósito de proteger la salud y el bienestar de todos nuestros colaboradores, teniendo en cuenta que una buena hidratación es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo ya que previene la fatiga, el agotamiento físico, y reduce el riesgo de deshidratación especialmente en labores que demandan esfuerzo físico y que se desarrollan en ambientes calurosos como es nuestro caso.

Fotografía 26. Punto de hidratación



Fuente: Autores, 2026

ANEXO 4.1.

SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901782967	1	CONSORCIO CGSM4	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO CGSM4	CALLE 54 #76 - 11	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3016552449	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	135094599	9501379812	E	2026/03/16	2026/03/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,829,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO CGSM4 (14 Afiliados)																								$32,332,179	$5,173,700			$32,332,179	$1,293,700			$23,848,015	$954,800			$32,332,179		$1,406,900		$0	$0		$8,829,100
Centro de Trabajo: INGENIERIA CIVIL RIESGO IV (14 Afiliados)																								$32,332,179	$5,173,700			$32,332,179	$1,293,700			$23,848,015	$954,800			$32,332,179		$1,406,900		$0	$0		$8,829,100
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (14 Afiliados)																								$32,332,179	$5,173,700			$32,332,179	$1,293,700			$23,848,015	$954,800			$32,332,179		$1,406,900		$0	$0		$8,829,100
1	CC	1079913769	ALVAREZ MONTENEGRO CARLOS ANDRES									X										230201	30	$1,939,923	$310,400	EPS041	30	$1,939,923	$77,600	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,939,923	4.350%	$84,400	30	$0	$0	Si	$542,500
2	CC	1010080507	BARRERA MARTINEZ CARLOS ALFREDO									X										230301	30	$2,984,099	$477,500	EPS041	30	$2,984,099	$119,400	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$2,984,099	4.350%	$129,900	30	$0	$0	Si	$796,900
3	CC	1079934636	CABALLERO CHARRIS JOSE LEONARDO									X										230301	30	$1,939,923	$310,400	ESSC24	30	$1,939,923	$77,600	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,939,923	4.350%	$84,400	30	$0	$0	Si	$542,500
4	CC	1081027709	CAMACHO CANTILLO JOSE GREGORIO									X										230301	30	$3,068,858	$491,100	ESSC24	30	$3,068,858	$122,800	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$3,068,858	4.350%	$133,500	30	$0	$0	Si	$817,500
5	CC	1004121831	GAMEZ RAMIREZ BRAYAN DAVID									X										230301	30	$1,939,923	$310,400	EPS002	30	$1,939,923	$77,600	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,939,923	4.350%	$84,400	30	$0	$0	Si	$542,500
6	CC	1083572789	GAMEZ SANTODOMINGO CARLOS SEGUNDO									X										230301	30	$1,910,078	$305,700	ESSC24	30	$1,910,078	$76,500	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,910,078	4.350%	$83,100	30	$0	$0	Si	$535,400
7	CC	1004121723	GOMEZ ESCORCIA SINIBALDO JOSE									X										230301	30	$2,107,054	$337,200	ESSC24	30	$2,107,054	$84,300	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$2,107,054	4.350%	$91,700	30	$0	$0	Si	$583,300
8	CC	7598807	MAESTRE CHARRIS DANIEL ALBERTO									X										230201	30	$4,066,874	$650,700	ESSC24	30	$4,066,874	$162,700	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$4,066,874	4.350%	$177,000	30	$0	$0	Si	$1,060,500
9	CC	1079914724	MANOTAS GUTIERREZ JESUS DAVID									X										230201	30	$1,939,923	$310,400	ESSC24	30	$1,939,923	$77,600	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,939,923	4.350%	$84,400	30	$0	$0	Si	$542,500
10	CC	1004298507	OROZCO FERREIRA JOHENDRYS		X							X									X	230301	22	$1,813,247	$290,200	ESSC07	22	$1,813,247	$72,600	CCF07	22	$1,666,186	$66,700	14-7	22	$1,813,247	4.350%	$78,900	22	$0	$0	Si	$508,400
11	CC	1082045696	PADILLA FERREIRA JONATAN ALBERTO		X							X									X	230201	13	$878,105	$140,500	ESSC24	13	$878,105	$35,200	CCF07	13	$1,170,969	$46,900	14-7	13	$878,105	4.350%	$38,200	13	$0	$0	Si	$260,800
12	CC	1082046517	POLO NAVARRO YESMITH VANESSA									X										230301	30	$1,989,664	$318,400	EPS005	30	$1,989,664	$79,600	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,989,664	4.350%	$86,600	30	$0	$0	Si	$554,700
13	CC	1079936122	SANTODOMINGO DE LA CRUZ CESAR ALFREDO									X										230301	30	$1,939,923	$310,400	EPS041	30	$1,939,923	$77,600	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,939,923	4.350%	$84,400	30	$0	$0	Si	$542,500
14	CC	1081028028	WILCHES GONZALEZ PEDRO JOSE									X										230301	30	$3,814,585	$610,400	EPS037	30	$3,814,585	$152,600	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$3,814,585	4.350%	$166,000	30	$0	$0	Si	$999,100
Total			**Afiliados(14)**																					$32,332,179	$5,173,700			$32,332,179	$1,293,700			$23,848,015	$954,800			$32,332,179		$1,406,900		$0	$0		$8,829,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$5,173,700	$0	$0	$5,173,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,761,700	$0	$0	$3,761,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,412,000	$0	$0	$1,412,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,406,900	$0	$0	$1,406,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	14	$1,406,900	$0	$0	$1,406,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$954,800	$0	$0	$954,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	14	$954,800	$0	$0	$954,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	$1,293,700	$0	$0	$1,293,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$636,700	$0	$0	$636,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$72,600	$0	$0	$72,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$152,600	$0	$0	$152,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$274,600	$0	$0	$274,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$77,600	$0	$0	$77,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$79,600	$0	$0	$79,600
TOTAL				**14**	**$8,829,100**	**$0**	**$0**	**$8,829,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806003450	9	PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 76 No 54-11	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3859150	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	135079394	9501211931	E	2026/03/12	2026/03/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$70,940,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BARRANQUILLA (75 Afiliados)																						**$245,939,847**	**$39,671,900**			**$267,641,889**	**$10,708,300**			**$265,971,416**	**$10,641,500**			**$267,641,889**		**$9,918,400**		**$0**	**$0**		**$70,940,100**
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (63 Afiliados)																						**$211,649,374**	**$34,184,500**			**$224,536,643**	**$8,983,300**			**$225,208,498**	**$9,010,200**			**$224,536,643**		**$9,747,900**		**$0**	**$0**		**$61,925,900**
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (12 Afiliados)																						**$40,710,216**	**$6,514,300**			**$40,710,216**	**$1,629,100**			**$40,710,216**	**$1,629,100**			**$40,710,216**		**$1,757,600**		**$0**	**$0**		**$11,530,100**
1	CC	63472480	ARTEAGA LOPEZ LUZ STELLA																	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS002	30	$2,100,000	$84,000	CCF38	30	$2,100,000	$84,000	14-7	30	$2,100,000	4.350%	$91,400	30	$0	$0	Si	$595,400
2	CC	91432427	BADILLO DE LA CRUZ HECTOR JULIO									X								25-14	17	$4,156,927	$665,200	EPS005	17	$4,156,927	$166,300	CCF38	17	$4,156,927	$166,300	14-7	17	$4,156,927	4.350%	$180,900	17	$0	$0	Si	$1,178,700
3	CC	1096233735	GARCIA SIERRA MAIRA JULIANA																	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS002	30	$2,100,000	$84,000	CCF38	30	$2,100,000	$84,000	14-7	30	$2,100,000	4.350%	$91,400	30	$0	$0	Si	$595,400
4	CC	13567645	GOMEZ BELEÑO GUILLERMO									X								25-14	30	$3,921,027	$627,400	EPS037	30	$3,921,027	$156,900	CCF38	30	$3,921,027	$156,900	14-7	30	$3,921,027	4.350%	$170,600	30	$0	$0	Si	$1,111,800
5	CC	1050920160	GUERRERO PEINADO ARCADIO JESUS										X							230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF38	3	$175,091	$7,100	14-7	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$42,300
6	CC	1050920160	GUERRERO PEINADO ARCADIO JESUS									X								230301	27	$3,288,477	$526,200	EPS037	27	$3,288,477	$131,600	CCF38	27	$3,288,477	$131,600	14-7	27	$3,288,477	4.350%	$143,100	27	$0	$0	Si	$932,500
7	CC	1096185809	LEON DITTA LILIANA																	230301	30	$4,405,260	$704,900	EPS005	30	$4,405,260	$176,300	CCF38	30	$4,405,260	$176,300	14-7	30	$4,405,260	4.350%	$191,700	30	$0	$0	Si	$1,249,200
8	CC	91432989	MANTILLA JORGE ENRIQUE									X								25-14	30	$3,783,819	$605,500	EPS037	30	$3,783,819	$151,400	CCF38	30	$3,783,819	$151,400	14-7	30	$3,783,819	4.350%	$164,600	30	$0	$0	Si	$1,072,900
9	CC	91444860	MONCADA MONTOYA HUMBERTO										X							25-14	2	$142,555	$22,900	EPS037	2	$142,555	$5,800	CCF38	2	$142,555	$5,800	14-7	2	$142,555	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$34,500
10	CC	91444860	MONCADA MONTOYA HUMBERTO									X								25-14	28	$4,562,178	$730,000	EPS037	28	$4,562,178	$182,500	CCF38	28	$4,562,178	$182,500	14-7	28	$4,562,178	4.350%	$198,500	28	$0	$0	Si	$1,293,500
11	CC	71985790	PALACIOS MORENO LUIS OVIDIO									X								231001	30	$2,686,845	$429,900	EPS037	30	$2,686,845	$107,500	CCF38	30	$2,686,845	$107,500	14-7	30	$2,686,845	4.350%	$116,900	30	$0	$0	Si	$761,800
12	CC	1096238842	PEREZ QUIROZ BRENDA VICTORIA																	230301	30	$2,850,000	$456,000	EPS017	30	$2,850,000	$114,000	CCF38	30	$2,850,000	$114,000	14-7	30	$2,850,000	4.350%	$124,000	30	$0	$0	Si	$808,000
13	CC	3804458	SEQUEDA RODELO EDUARDO JOSE									X								25-14	30	$3,887,864	$622,100	ESSC24	30	$3,887,864	$155,600	CCF38	30	$3,887,864	$155,600	14-7	30	$3,887,864	4.350%	$169,200	30	$0	$0	Si	$1,102,500
14	CC	91434416	VITOLA MARMOL JAVIER ALFONSO									X								25-14	30	$2,650,173	$424,100	EPS037	30	$2,650,173	$106,100	CCF38	30	$2,650,173	$106,100	14-7	30	$2,650,173	4.350%	$115,300	30	$0	$0	Si	$751,600
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (48 Afiliados)																						**$168,435,358**	**$27,269,500**			**$177,886,263**	**$7,116,500**			**$177,886,265**	**$7,116,500**			**$177,886,263**		**$7,731,800**		**$0**	**$0**		**$49,234,300**
15	CC	1129578658	ACEVEDO COLON YURANI ANDREA																	230301	21	$2,450,000	$392,000	EPS005	21	$2,450,000	$98,000	CCF07	21	$2,450,000	$98,000	14-7	21	$2,450,000	4.350%	$106,600	21	$0	$0	Si	$694,600
16	CC	9126669	ACOSTA ESTRADA VICTOR MANUEL																		0	$0	$0	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$216,400
17	CC	73578230	BADILLO CAÑAS ALEX									X								25-14	30	$2,551,950	$408,400	EPS048	30	$2,551,950	$102,100	CCF07	30	$2,551,950	$102,100	14-7	30	$2,551,950	4.350%	$111,100	30	$0	$0	Si	$723,700
18	CC	73268545	BECERRA HERAZO ADRIANO SEGUNDO									X								25-14	19	$2,749,619	$440,000	EPS037	19	$2,749,619	$110,000	CCF07	19	$2,749,619	$110,000	14-7	19	$2,749,619	4.350%	$119,700	19	$0	$0	Si	$779,700
19	CC	1128049263	BENITEZ MADRID JORGE ANDRES																	230301	30	$4,500,000	$720,000	EPS010	30	$4,500,000	$180,000	CCF07	30	$4,500,000	$180,000	14-7	30	$4,500,000	4.350%	$195,800	30	$0	$0	Si	$1,275,800
20	CC	72193392	BUELVAS GARCIA LUIS CARLOS									X								25-14	30	$3,929,781	$628,800	EPS002	30	$3,929,781	$157,200	CCF07	30	$3,929,781	$157,200	14-7	30	$3,929,781	4.350%	$171,000	30	$0	$0	Si	$1,114,200
21	CC	9100837	CABALLERO SALCEDO JAVIER ENRIQUE																	230201	30	$3,660,000	$585,600	EPS002	30	$3,660,000	$146,400	CCF07	30	$3,660,000	$146,400	14-7	30	$3,660,000	4.350%	$159,300	30	$0	$0	Si	$1,037,700
22	CC	1045726109	CAMPOS SAMPER MARIA CLAUDIA																	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF07	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	4.350%	$130,500	30	$0	$0	Si	$850,500

| | | |

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				70	$39,671,900	$0	$0	$39,671,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,105,200	$0	$0	$1,105,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	34	$21,849,800	$0	$0	$21,849,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$11,796,800	$0	$0	$11,796,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$3,960,100	$0	$0	$3,960,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$960,000	$0	$0	$960,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				75	$9,918,400	$0	$0	$9,918,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	75	$9,918,400	$0	$0	$9,918,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				75	$10,641,500	$0	$0	$10,641,500
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	12	$1,683,200	$0	$0	$1,683,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	60	$8,693,700	$0	$0	$8,693,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$264,600	$0	$0	$264,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				75	$10,708,300	$0	$0	$10,708,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$725,100	$0	$0	$725,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$225,700	$0	$0	$225,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	$387,300	$0	$0	$387,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	24	$3,122,500	$0	$0	$3,122,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$114,000	$0	$0	$114,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$91,400	$0	$0	$91,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$1,488,200	$0	$0	$1,488,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$327,200	$0	$0	$327,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$1,921,000	$0	$0	$1,921,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$2,305,900	$0	$0	$2,305,900
TOTAL				**75**	**$70,940,100**	**$0**	**$0**	**$70,940,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901006746	1	VIAS Y DRAGADOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CALLE 76 NO. 54-11 OFICINA 712	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3692364	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	135041760	9501275398	E	2026/03/11	2026/03/12	BANCO DAVIVIENDA	1	$148,349,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BARRANQUILLA (104 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4N (104 Afiliados)																														
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (104 Afiliados)																														
1	CC	1080014987	ACOSTA MARTINEZ BREINER ESMITH	X								X									230301	27	EPS037	27	CCF07	27	14-7	27	4.350%	27	Si
2	CC	72205126	ACOSTA PAGUANA JORGE LUIS									X									25-14	30	EPS048	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
3	CC	8534368	ACOSTA LONDOÑO JORGE ELIECER									X									25-14	30	ESSC07	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
4	CC	1002130464	ACOSTA ROMAN NELDA ROSA																		230301	9	ESSC24	9	CCF07	9	14-7	9	4.350%	9	Si
5	CC	1002130464	ACOSTA ROMAN NELDA ROSA													X					230301	21	ESSC24	21	CCF07	21	14-7	21	0.000%	21	Si
6	CC	1045745427	AFANADOR ORTIZ ALEXANDER									X									230301	30	ESSC07	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
7	CC	8506555	AFANADOR SUAREZ JHON JAIRO									X									230301	30	EPS010	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
8	PT	5523165	AGAMEZ ARMANDO JOSE									X									230301	29	ESSC07	29	CCF07	29	14-7	29	4.350%	29	Si
9	PT	5523165	AGAMEZ ARMANDO JOSE											X							230301	1	ESSC07	1	CCF07	1	14-7	1	0.000%	1	Si
10	CC	1051356818	ALVAREZ ESCAMILLA VICTOR ALFONSO									X									230301	24	EPS048	24	CCF07	24	14-7	24	4.350%	24	Si
11	CC	1051356818	ALVAREZ ESCAMILLA VICTOR ALFONSO											X							230301	6	EPS048	6	CCF07	6	14-7	6	0.000%	6	Si
12	CC	9098877	AYALA LIDUEÑA JHON JAIRO									X									230301	24	EPS002	24	CCF07	24	14-7	24	4.350%	24	Si
13	CC	9098877	AYALA LIDUEÑA JHON JAIRO													X					230301	6	EPS002	6	CCF07	6	14-7	6	0.000%	6	Si
14	CC	1081028843	BARRIOS TORRES JORGE EDUARDO																		230301	30	ESSC24	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
15	CC	1001869044	CABALLERO CASTELLANO CESAR CAMILO																		25-14	30	EPS010	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
16	CC	1080012753	CANDAMA CANTILLO EDIW RAFAEL									X									230301	29	EPS002	29	CCF07	29	14-7	29	4.350%	29	Si
17	CC	1080012753	CANDAMA CANTILLO EDIW RAFAEL													L					230301	1	EPS002	1	CCF07	1	14-7	1	0.000%	1	Si
18	CC	9307051	CARO PAREDES ALFREDO MANUEL									X										0	EPS037	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
19	CC	9079381	CARRANZA VERGARA TOMAS DE AQUINO									X										0	EPS010	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
20	CC	3911630	CARVAJAL MACHUCA REMBERTO													L						0	ESSC07	9	CCF07	9	14-7	9	0.000%	9	Si
21	CC	3911630	CARVAJAL MACHUCA REMBERTO									X										0	ESSC07	21	CCF07	21	14-7	21	4.350%	21	Si
22	CC	8660408	CASTRO DE LA HOZ CARLOS									X										0	EPS002	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si
23	CC	8568984	CASTRO THOMA JESUS ANTONIO									X									230301	30	EPS037	30	CCF07	30	14-7	30	4.350%	30	Si

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				171	$81,654,800	$52,600	$0	$81,707,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$4,168,700	$2,700	$0	$4,171,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	34	$19,868,800	$12,800	$0	$19,881,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	107	$48,847,200	$31,400	$0	$48,878,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$8,770,100	$5,700	$0	$8,775,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				181	$22,548,000	$14,500	$0	$22,562,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	181	$22,548,000	$14,500	$0	$22,562,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				181	$21,675,600	$14,100	$0	$21,689,700
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	71	$8,605,500	$5,600	$0	$8,611,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	104	$12,760,500	$8,300	$0	$12,768,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	6	$309,600	$200	$0	$309,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				181	$22,152,700	$15,100	$0	$22,167,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	6	$679,200	$500	$0	$679,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$140,600	$100	$0	$140,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	14	$1,685,200	$1,100	$0	$1,686,300
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	$164,700	$200	$0	$164,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	7	$829,100	$600	$0	$829,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	$1,894,700	$1,300	$0	$1,896,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$659,900	$500	$0	$660,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$162,900	$200	$0	$163,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	21	$2,396,800	$1,600	$0	$2,398,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	58	$7,392,700	$4,800	$0	$7,397,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	15	$1,939,800	$1,300	$0	$1,941,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	$2,961,000	$2,000	$0	$2,963,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$1,246,100	$900	$0	$1,247,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$133,000	$100	$0	$133,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$133,000	$100	$0	$133,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$88,600	$100	$0	$88,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$88,600	$100	$0	$88,700
TOTAL				**181**	**$148,252,700**	**$96,500**	**$0**	**$148,349,200**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S identificado(a) con NI 806003450 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANGEL MARIA VIZCAINO ESCOBAR identificado(a) con CC 73475172

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9501233825	135072644	Y	2026-03-12	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$3,080,000	12.5%	$385,000
9501233825	135072644	Y	2026-03-12	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$3,080,000	0.522%	$16,100

Este certificado se expide el día 2026-03-16 a las 11:06.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901782967	1	CONSORCIO CGSM4	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO CGSM4	CALLE 54 #76 - 11	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3016552449	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	135101344	9501205966	Y	2026/03/16	2026/03/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$575,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO CGSM4 (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$76,200		$0	$0		$575,300
Centro de Trabajo: INGENIERIA CIVIL RIESGO IV (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$76,200		$0	$0		$575,300
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$76,200		$0	$0		$575,300
1	CC	1085224496	MARTINEZ JIMENEZ MARIA AUXILIADORA																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-7	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$575,300
Total		**Afiliados(1)**																				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$76,200		$0	$0		$575,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,200	$0	$0	$76,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$76,200	$0	$0	$76,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$575,300**	**$0**	**$0**	**$575,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8673793	0	FRANCO MEDINA RUBEN DARIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 26 # 3a - 263	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3055338	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	159191851	9501849237	E	2026/03/20	2026/03/24	BANCOLOMBIA	4	$5,886,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (14 Afiliados)						$21,361,041	$3,246,000			$23,111,946	$752,300			$19,320,355	$631,900			$23,111,946	$1,241,000		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$1,050,543	$168,100			$1,050,543	$42,100			$780,000	$31,200			$1,050,543	$5,500		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$1,050,543	$168,100			$1,050,543	$42,100			$780,000	$31,200			$1,050,543	$5,500		$0	$0
1	CC	5078169	BORJA MARTINEZ GERMAN EUTIMIO	25-14	18	$1,050,543	$168,100	ESSC24	18	$1,050,543	$42,100	CCF06	18	$780,000	$31,200	14-11	18	$1,050,543	$5,500	18	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (13 Afiliados)						$20,310,498	$3,077,900			$22,061,403	$710,200			$18,540,355	$600,700			$22,061,403	$1,235,500		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (13 Afiliados)						$20,310,498	$3,077,900			$22,061,403	$710,200			$18,540,355	$600,700			$22,061,403	$1,235,500		$0	$0
2	CC	1004213282	ALVAREZ MANGA KEVIN ANDRES	230201	20	$1,167,270	$186,800	EPS041	20	$1,167,270	$46,700	CCF06	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0
3	CC	1004213282	ALVAREZ MANGA KEVIN ANDRES	230201	10	$583,635	$70,100	EPS041	10	$583,635	$0	CCF06	10	$583,635	$0	14-11	10	$583,635	$0	10	$0	$0
4	CC	17955049	ANILLO ARDILA SEBASTIAN	25-14	18	$1,050,543	$168,100	ESSC07	18	$1,050,543	$42,100	CCF06	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	$73,200	18	$0	$0
5	CC	5078310	BONETT ACUÑA ADOLFO RAFAEL	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS037	20	$1,167,270	$46,700	CCF06	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0
6	CC	5078310	BONETT ACUÑA ADOLFO RAFAEL	230301	10	$583,635	$70,100	EPS037	10	$583,635	$0	CCF06	10	$474,500	$0	14-11	10	$583,635	$0	10	$0	$0
7	CC	1079916394	CANTILLO PACHECO EDULFO ANTONIO	231001	20	$1,167,270	$186,800	EPS017	20	$1,167,270	$46,700	CCF06	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0
8	CC	1079916394	CANTILLO PACHECO EDULFO ANTONIO	231001	10	$583,635	$70,100	EPS017	10	$583,635	$0	CCF06	10	$474,500	$0	14-11	10	$583,635	$0	10	$0	$0
9	CC	85479893	CARRILLO BOLAÑO ORLANDO RAFAEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
10	CC	3761940	DE LOS RIOS GUETTE ARISTIDES MANUEL		0	$0	$0	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
11	CC	1081027248	ESCORCIA SIERRA LUIS EDUARDO	231001	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
12	CC	1193165789	LEIVA GAMEZ MIGUEL ALFONSO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
13	CC	1079933354	MANCILLA MONTENEGRO ARMANDO JOSE	230301	16	$933,816	$149,500	ESSC24	16	$933,816	$37,400	CCF06	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0
14	CC	1079933354	MANCILLA MONTENEGRO ARMANDO JOSE	230301	14	$817,089	$98,100	ESSC24	14	$817,089	$0	CCF06	14	$664,300	$0	14-11	14	$817,089	$0	14	$0	$0
15	CC	5078217	MARTINEZ PABON REYNALDO	230201	20	$1,167,270	$186,800	EPS041	20	$1,167,270	$46,700	CCF06	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0
16	CC	5078217	MARTINEZ PABON REYNALDO	230201	10	$583,635	$70,100	EPS041	10	$583,635	$0	CCF06	10	$433,334	$0	14-11	10	$583,635	$0	10	$0	$0
17	CC	9877310	OROZCO OROZCO JADER IVAN	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS037	20	$1,167,270	$46,700	CCF06	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0
18	CC	9877310	OROZCO OROZCO JADER IVAN	230301	10	$583,635	$70,100	EPS037	10	$583,635	$0	CCF06	10	$474,500	$0	14-11	10	$583,635	$0	10	$0	$0
19	CC	5078804	PASION MANGA MANUEL GREGORIO	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS041	20	$1,167,270	$46,700	CCF06	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0
20	CC	5078804	PASION MANGA MANUEL GREGORIO	230301	10	$583,635	$70,100	EPS041	10	$583,635	$0	CCF06	10	$433,334	$0	14-11	10	$583,635	$0	10	$0	$0
21	CC	1079913169	TERNERA CASTRO LEONEL DAVID	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(14)**			$21,361,041	$3,246,000			$23,111,946	$752,300			$19,320,355	$631,900			$23,111,946	$1,241,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$3,246,000	$8,500	$0	$3,254,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$537,100	$1,400	$0	$538,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$336,200	$900	$0	$337,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,858,900	$4,800	$0	$1,863,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$513,800	$1,400	$0	$515,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,241,000	$3,200	$0	$1,244,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$1,241,000	$3,200	$0	$1,244,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$631,900	$1,700	$0	$633,600
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	14	$631,900	$1,700	$0	$633,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	$752,300	$2,300	$0	$754,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$200	$0	$70,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$289,800	$800	$0	$290,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,700	$200	$0	$46,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$42,100	$200	$0	$42,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$163,500	$500	$0	$164,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$140,100	$400	$0	$140,500
TOTAL				**14**	**$5,871,200**	**$15,700**	**$0**	**$5,886,900**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-24, 04:31:34 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83881099

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8900655367

PAGADO 24/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MANUEL ENRIQUE HERNANDEZ VALBUENA		
Documento	NI8712984	**Dirección**	CL 70 #32 - 26 P2
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4211542
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal	HERNANDEZ VALBUENA MANUEL ENRIQUE	**Identificación**	CC 8712984
Total Afiliados	21	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1004121720	JORGE LUIS GOMEZ FABIAN	01	00	X																0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 175.091	$ 28.100	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 175.091	$ 7.100	6,960	$ 175.091	$ 12.200	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 5.000	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.600
CC 1004122911	NASER IVAN GOMEZ DE LA CRUZ	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 116.727	$ 18.700	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 116.727	$ 4.700	6,960	$ 116.727	$ 8.200	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 5.000	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.800
CC 1079911492	EDUARDO JOSE BUELVAS COLON	01	00											X						0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 875.453	$ 105.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 875.453	$ 0	0,000	$ 875.453	$ 0	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.600
CC 1079911492	EDUARDO JOSE BUELVAS COLON	01	00																	0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 875.453	$ 140.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 875.453	$ 35.100	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 5.000	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.400
CC 1079912129	JONATHAN ENRIQUE SANTODOMINGO CALVO	01	00											X						0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.453	$ 105.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 875.453	$ 0	0,000	$ 875.453	$ 0	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 711.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.100
CC 1079912129	JONATHAN ENRIQUE SANTODOMINGO CALVO	01	00																	0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.453	$ 140.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 875.453	$ 35.100	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 5.000	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.400
CC 1079912738	DAVINSON JOSE FANDIÑO GUTIERREZ	01	00	X																0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 175.091	$ 28.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 175.091	$ 7.100	6,960	$ 175.091	$ 12.200	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 5.000	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.600
CC 1081028345	CARLOS ALBERTO MERCADO RUDAS	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 5.000	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.100
CC 1081028364	OLIVER RAFAEL ROPAIN ROCA	01	00	X																0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 466.908	$ 74.800	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 466.908	$ 18.700	6,960	$ 466.908	$ 32.500	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 5.000	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.200
CC 1082986543	EMILIO JOSE SANTODOMINGO QUIROZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 5.000	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.100
CC 1083572063	MAURICIO JOSE OROZCO TORRES	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 5.000	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.100
CC 1126120263	JOSE JORGE GARCIA OROZCO	01	00	X																0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 175.091	$ 28.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 175.091	$ 7.100	6,960	$ 175.091	$ 12.200	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 5.000	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.600
CC 1193547906	JESUS ALBERTO OROZCO GUETTE	01	00											X						0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.453	$ 105.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 875.453	$ 0	0,000	$ 875.453	$ 0	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 711.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.100
CC 1193547906	JESUS ALBERTO OROZCO GUETTE	01	00																	0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.453	$ 140.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 875.453	$ 35.100	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 5.000	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.400
CC 5062316	CARLOS ALBERTO SANTODOMINGO TERNERA	01	00		X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 5.000	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.100
CC 5078492	ARTURO RAFAEL HERRERA CABARCAS	01	00											X						0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.453	$ 105.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 875.453	$ 0	0,000	$ 875.453	$ 0	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 711.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.100
CC 5078492	ARTURO RAFAEL HERRERA CABARCAS	01	00																	0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.453	$ 140.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 875.453	$ 35.100	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 5.000	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.400
CC 5078708	ROBERTO CARLOS BORJA MARTINEZ	01	00											X						0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 875.453	$ 105.100	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 875.453	$ 0	0,000	$ 875.453	$ 0	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 711.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.100
CC 5078708	ROBERTO CARLOS BORJA MARTINEZ	01	00																	0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 875.453	$ 140.100	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 875.453	$ 35.100	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 5.000	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 24/02/2026 | **Empresa NI8712984 MANUEL ENRIQUE HERNANDEZ VALBUENA** | **Planilla Nro: 83881099** | **Periodo Cotización: enero de 2026** | **Periodo Servicio: febrero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 5078921	HERIBERTO JOSE LARA PASION	01	00											X						0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 875.453	$ 140.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 875.453	$ 0	0,000	$ 875.453	$ 0	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 711.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.100
CC 5078921	HERIBERTO JOSE LARA PASION	01	00																	0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 875.453	$ 140.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 875.453	$ 35.100	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 5.000	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.400
CC 5094631	JOSE MANUEL PASION GUTIERREZ	01	04											X						0	0	15	15	15	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 875.453	$ 0	0,000	$ 875.453	$ 0	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 711.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 5094631	JOSE MANUEL PASION GUTIERREZ	01	04																	0	0	15	15	15	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 875.453	$ 35.100	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 5.000	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.300
CC 5095498	EDUARDO JOSE CANTILLO CARRILLO	01	00											X						0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.453	$ 105.100	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 875.453	$ 0	0,000	$ 875.453	$ 0	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 711.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.100
CC 5095498	EDUARDO JOSE CANTILLO CARRILLO	01	00																	0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.453	$ 140.100	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 875.453	$ 35.100	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 5.000	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.400
CC 73316407	ESNEIDER RAFAEL PEREZ SIERRA	01	00											X						0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 875.453	$ 105.100	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 875.453	$ 0	0,000	$ 875.453	$ 0	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 711.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.100
CC 73316407	ESNEIDER RAFAEL PEREZ SIERRA	01	00																	0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 875.453	$ 140.100	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 875.453	$ 35.100	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 5.000	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.400
CC 7595150	REINALDO JAIME TERNERA ORDOÑEZ	01	00	X																0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 175.091	$ 28.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 175.091	$ 7.100	6,960	$ 175.091	$ 12.200	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 5.000	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.600
CC 8506100	DANIEL JOSE RICARDO CRUZATE	01	00											X						0	9	9	9	9	(231001) COLFONDOS	$ 525.272	$ 63.100	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 525.272	$ 0	0,000	$ 525.272	$ 0	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 427.050	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.100
CC 8506100	DANIEL JOSE RICARDO CRUZATE	01	00	X																0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 875.453	$ 140.100	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 875.453	$ 35.100	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 5.000	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.400
CC 85479599	EDILBERTO ENRIQUE ALVAREZ MAZA	01	00	X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 233.454	$ 9.400	6,960	$ 233.454	$ 16.300	(CCF05) CAJACOPI ATLANTICO	$ 5.000	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 17.158.882	$ 18.909.788	$ 18.909.788	$ 6.937.800	$ 2.480.700	$ 421.800	$ 732.200	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.667.400	$ 12.400	$ 3.679.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO 4.2.

CONSOLIDADO DE PERSONAL

CEDULA	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	CARGO	FUNCIONES	EMPRESA	ARL	EPS	AFP	TIPO DE SANGRE	ALERGICO (SI/NO)	¿A QUE ES ALERGICO?
1129578658	ACEVEDO	COLON	YURANI ANDREA	INGENIERA AMBIENTAL SENIOR	Liderar, programar y ejecutar actividades para dar cumplimiento a los programas ambientales establecidos SGI .	PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	SANITAS	PORVENIR	B+	SI	AINES
85479599	ALVAREZ	MAZA	EDILBERTO ENRIQUE	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	MUTUAL SER			NO	
1004213282	ALVAREZ	MANGA	KEVIN ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA			A+	NO	
1079913769	ALVAREZ	MONTENEGRO	CARLOS ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	PROTECCION	O+	NO	
17955049	ANILLO	ARDILA	SEBASTIAN	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA			A+	NO	
1010080507	BARRERA	MARTINEZ	CARLOS	MARINO	Apoyo en actividades del proyecto	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	PORVENIR	B+	NO	
5078310	BONET	ACUÑA	ADOLFO RAFAEL	CAPATAZ	Ejecutar las actividades asignadas, como apoyo a los procesos	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA			O+	NO	
5078708	BORJA	MARTINEZ	ROBERTO CARLOS	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	CAJACOPI	COLFONDOS	O+	NO	
5078169	BORJAS	MARTINEZ	GERMAN EUTIMIO	OFICIAL	Ejecutar las actividades asignadas, como apoyo a los procesos	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA	COOSALUD		O+	NO	
1079911492	BUELVAS	COLON	EDUARDO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA					
1079934636	CABALLERO	CHARRIS	JOSE LEONARDO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD	PORVENIR	O+	NO	
1081027709	CAMACHO	CANTILLO	JOSE GREGORIO	MARINO	Apoyo en actividades del proyecto	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	CAJA COPI	PORVENIR	O+	NO	
5095498	CANTILLO	CARRILLO	EDUARDO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA			O+	NO	
1079916394	CANTILLO	PACHECHO	EDULFO ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA			O+	NO	
85479893	CANTILLO	BOLAÑO	ORLANDO RAFAEL	MAESTRO DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA			O+	NO	
5062296	CERVANTES	OROZCO	YECID ALFONSO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA	NUEVA EPS		O+	NO	
3761940	DE LOS RIOS	GUETTE	ARISTIDES MANUEL	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA					
1081027248	ESCORCIA	SIERRA	LUIS EDUARDO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA	CAJACOPI		O+	NO	
1079912738	FANDIÑO	GUTIERREZ	DAVINSON JOSE	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	COOSALUD			NO	
1108767049	FUENTES	ACOSTA	LINA MARIA	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	Planificar, desarollar y evaluar actividades sociales del proyecto	VIAS Y DRAGADOS	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	PORVENIR	A+	SI	AINES
1083572789	GAMEZ	SANTODOMINGO	CARLOS SEGUNDO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD	PORVENIR	O+	NO	
1004121831	GAMEZ	RAMIREZ	BRYAN DAVID	AYUDANTE DE OBRA		CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	SALUD TOTAL	PORVENIR	O+	NO	
1126120263	GARCIA	OROZCO	JOSE JORGE	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	NUEVA EPS			NO	
1004121723	GOMEZ	ESCORCIA	SINIBALDO JOSE	MARINO	Apoyo en actividades del proyecto	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	PORVENIR	O+	NO	
1004121720	GOMEZ	FABIAN	JORGE LUIS	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	CAJACOPI			NO	
1004122911	GOMEZ	DE LA CRUZ	NASER IVAN	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	COOSALUD			NO	
1010150262	GONZALEZ	VERGARA	ADRIANA CRISTINA	PROFESIONAL EN SST	Realizar actividades encaminadas , al desarrollo y mantenimiento del SGI	PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	SURA	PORVENIR	B+	SI	AINES Y ALISCOS
5078492	HERRERA	CABARCAS	ARTURO RAFAEL	OFICIAL	Ejecutar las actividades asignadas, como apoyo a los procesos	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	NUEVA EPS		O+	NO	
1084738073	IBAÑEZ	OSPINO	ALFONSO ENRIQUE	OPERADOR DE EXCAVADORA	Operar y ejecutar maniobras de remoción mecánica	VIAS Y DRAGADOS	SEGUROS BOLIVAR	SALUD TOTAL		O+	NO	
5078921	LARA	PASION	HERIBERTO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA				NO	
1193165789	LEIVA	GAMEZ	MIGUEL ALFONSO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA			O+	NO	
84456544	LOPEZ	CLAVIJO	CHRISTIAN DARO	ESPECIALISTA HIDRAULICO	Revision de aspectos hidraulicos del proyecto	INDEPENDIENTE	COLMENA	SANITAS	COLPENSIONES		NO	
7598807	MAESTRE	CHARRIS	DANIEL ALBERTO	MARINO	Apoyo en actividades del proyecto	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD	PORVENIR	O+	NO	
1079933354	MANCILLA	MONTENEGRO	ARMANDO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA					
1079914724	MANOTAS	GUTIERREZ	JESUS DAVID	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD	PROTECCION	O+	NO	
1085224296	MARTINEZ	JIMENEZ	MARIA AUXILIADORA	BIOLOGA	Trabajar en la conservacion de especies y habitats, diseñando estrategias para proteger la	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD		B+	NO	
5078217	MARTINEZ	PABON	REYNALDO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA	NUEVA EPS		O+	NO	
1081028345	MERCADO	RUDAS	CARLOS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	O+	NO	
1004212861	MORRÓN	VIZCAINO	JESUS DAVID	VIGIA HSE	Realizar todas las actividades asignadas que surjan de la implementación y documentación del SGI relacionados con la SST en todos los procesos.	VIAS Y DRAGADOS	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD	PORVENIR	NO		
9877310	OROZCO	OROZCO	JADER IVAN	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA	NUEVA EPS				
1004298507	OROZCO	FERREIRA	JOHENDRYS	MARINO	Apoyo en actividades del proyecto	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	MUTUAL SER	PORVENIR	O+	NO	
1193547906	OROZCO	GUETE	JESUS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA			O+	NO	
1100549999	PALENCIA	GUZMAN	JESUS DANIEL	TOPOGRAFO	Realizar actividades topobatrimetricas en el proyecto asignado	VIAS Y DRAGADOS	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	PORVENIR	A+	NO	
5094631	PASION	GUTIERREZ	JOSE MANUEL	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	MUTUAL SER			NO	
5078804	PASION	MANGA	MANUEL GREGORIO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA	NUEVA EPS		O+	NO	
73316407	PEREZ	SIERRA	ESNEIDER RAFAEL	MAESTRO DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	MUTUAL SER	COLPENSIONES	B+	NO	
1082046517	POLO	NAVARRO	YESMITH VANESSA	VIGIA HSE	Realizar todas las actividades asignadas que surjan de la implementación y documentación del SGI relacionados con la SST en	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	SANITAS	PORVENIR	B+	NO	
9464493661	PRADA	DAZA	EUGENIO	GERENTE DEL PROYECTO	Llevar parte administrativa y financiera del proyecto	INDEPENDIENTE	SURA	SURA	SIN AFP		NO	
8506100	RICARDO	CRUZATE	DANIEL JOSE	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	MUTUAL SER	COLFONDOS		NO	
1081028364	ROPAIN	ROCA	OLIVER RAFAEL	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	CAJACOPI	PORVENIR	O+	NO	
1118813194	ROYS	CORZO	EDILBERTO GREGORIO	INGENIERO RESIDENTE	Programar , coordinar y llevar el control de la ejecucion delproyecto.	PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	SURA	PORVENIR	O+	NO	
1031127390	SANTISTEBAN	MURIEL	IVONNE STIBALIZ	INGENIERO TOPOGRAFICO	Coordinar todas las actividades topo-batrimetricas en el proyecto	PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	SANITAS	PORVENIR	O+	NO	
1079936122	SANTODOMINGO	DE LA CRUZ	CESAR ALFREDO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	PORVENIR	O+	NO	
1079912129	SANTODOMINGO	CALVO	JONATHAN ENRIQUE	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA			O+	NO	
1079913169	TERNERA	CASTRO	LEONEL DAVID	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA	COOSALUD			NO	
7595150	TERNERA	ORDOÑEZ	REINALDO JAIME	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	COOSALUD			NO	
9153002	VALENCIA	PEREZ	FELIX	OPERADOR DE EXCAVADORA	Operar y ejecutar maniobras de remoción mecánica	VIAS Y DRAGADOS	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS		A+	NO	
73475172	VIZCAINO	ESCOBAR	ANGEL MARIA	DIRECTOR DE PROYECTOS	Planear , dirigir y asegurar la ejecucion del proyecto.	PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	SURA	COLPENSIONES	A+	NO	
1081028028	WILCHES	GONZALEZ	PEDRO MIGUEL	MARINO	Apoyo en actividades del proyecto	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	PORVENIR	A+	NO	

ANEXO 4.3.

INDUCCIONES O REINDUCCIONES

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica			
Re inducción		Inducción	X	Reunión Informativa			
Otro		¿Cuál?					

Fecha: 03/02/2026 **Lugar:** Box culvert #1

Expositor: yesuth polo Navarro **Hora Inicio:** 7:20am **Hora Final:** 8:50am

Temas: Inducción HSEQ **Obra:** CG544 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Naker Gomez	1004122911	MH	Ayudante de O	Naker Gomez
2.	Davinson Fandiño	1079912738	MH	Ayudante de obra	Davinson Fandiño
3.	Edilberto Alvarez	85479599	MH	Ayudante de obra	Edilberto Alvarez
4.	Reinaldo	7595150	MH	AYudatede	Reinaldo
5.	Jorge luis	1004121770	MH	Ayudatede	Jorge luis
6.	Jose Jorge	1126120263	MH	AYudatede	Jose Jorge
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 6 **Firma del Expositor (es):** yesuth polo N

Powered by CamScanner

BeP	**REGISTRO DE INDUCCIÓN**	**Código: GH-R-025** **Versión: 2** **Fecha: 19-06-2025**

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jorge luis Gomez **IDENTIFICACION:** 1004 121720

CARGO: ayudante de obra

TEMA	CARGO RESPONSABLE	FECHA	DURACIÓN	NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN
Video corporativo					
Presentación de inducción (misión, visión, valores corporativos, organigrama, nómina y seguridad social, beneficios, políticas, buenas prácticas y conductas laborales					
Reglamento Interno de Trabajo					
Manual de Convivencia Laboral					
HSEQ: Mapa de procesos, certificaciones, políticas, objetivos integrales, responsabilidades SGI, riesgos y peligros, programas, epp, accidente de trabajo, COPASST, COCOLA	Vigia HSE	03/02/2026	30 Min	Yesuth Vanessa	Yesuth Polo N
Procedimientos en caso de emergencia	Vigia HSE	03/02/26	20 Min	Yesuth Vanessa	Yesuth Polo N
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Vigia HSE	03/02/26	20 Min	Yesuth Vanessa	Yesuth Polo N
Programas ambientales – responsabilidad ambiental					
Gestión Social					
Calidad: Certificaciones, documentos del SGI					
Inducción al puesto de trabajo	Vigia HSE	03/02/26	20 Min	Yesuth Vanessa	Yesuth Polo N
Otros temas específicos para el cargo (cuando aplique)					

FIRMA DEL TRABAJADOR: Jorge luis Gomez **FECHA:** 2026-02-03

Powered by CamScanner

B&P	**COMPROMISO HSEQ** **(Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad)**	**Código: GH-R-020** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Mediante la presente certifico que he recibido por parte del CONSORCIO CGSM 4, inducción en lo referente a sistema integrado de gestión incluyendo políticas, objetivos, programas, procedimientos, matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos, aspectos e impactos ambientales y riesgos y oportunidades. Por lo tanto, manifiesto lo siguiente:

1. Me comprometo a cumplir cada una de las políticas y normas de la empresa de manera estricta.
2. Me comprometo a contribuir con la organización en la mejora continua del sistema integrado de gestión, desarrollando mis funciones y responsabilidades de manera óptima, salvaguardando los bienes de la compañía, la propiedad privada y la de sus clientes.
3. En mi sitio de trabajo, durante el horario laboral y de manera obligatoria utilizaré los elementos de protección personal (EPP) suministrados por la empresa.
4. Reportar inmediatamente todo accidente, incidente o enfermedad laboral.
5. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
6. Asistir y participar activamente en los programas de formación, capacitación y entrenamiento que la empresa determine.
7. Conocer y aplicar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
8. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
9. Procuraré el autocuidado integral de mi salud y la de mis compañeros; asimismo, informaré de manera oportuna a mi superior de riesgos potenciales que puedan generar un accidente de trabajo.
10. En horas y/o áreas de trabajo, no estaré bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, no consumiré tabaco u otras sustancias psicotrópicas y estaré dispuesto a practicarme las pruebas que la empresa así lo considere en relación a estas prohibiciones.
11. Desde mi sitio de trabajo contribuiré con el medio ambiente, utilizando los puntos ecológicos, evitando contaminar las fuentes hídricas, contribuyendo con el cuidado de la flora y la fauna.

Jorge Luis Gomez

FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jorge Luis Gomez

FECHA: 07/02/2026

Powered by CamScanner

B&P	**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y ALCOHOL**	**Código: GH-R-008** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Yo Jorge luis Gomez identificado con CC 1004 128 820 de Pivijay, obrando en la calidad abajo indicada, en desarrollo del artículo 15 de la Ley 23 de 1981, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizó al CONSORCIO CGSM 4 para efectuar las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol etílico, marihuana, cocaína, basuco, anfetaminas (éxtasis), benzodiacepinas (pastillas), opiáceos (heroína) y sustancias similares o derivadas.

Hago constar que he informado al profesional HSE y Vigía HSE sobre los medicamentos que he consumido hoy y en los días previos a la toma de éste examen y entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, de la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo.

El diagnóstico se realiza examinando mi muestra de orina para detectar la presencia de las sustancias psicoactivas mencionadas anteriormente. Existen varias pruebas de laboratorio diseñadas para este propósito las cuales se dividen básicamente en dos tipos: **Presuntivas:** que en caso de ser positivas indican una posible presencia de las sustancias psicoactivas y **Confirmatorias.** La prueba que se realizará inicialmente será de tipo presuntivo y en caso de salir positiva o indeterminada se realiza una prueba confirmatoria.

Asimismo, autorizo me sea realizada prueba de alcohol, la cual se practica haciendo uso de un alcoholímetro como medida presuntiva de presencia de dicha sustancia en mi organismo.

Comprendo que, para efectos de la obtención y confiablidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba, sin embargo, los resultados quedarán registrados en el laboratorio.

A pesar de lo anterior, la empresa no será responsable por posibles sanciones, daños o perjuicios causados a terceros, o a mi persona, derivados del uso de los resultados.

Confirmo haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen. Declaro que he dado ésta autorización voluntariamente.

CALIDAD EN LA QUE SE OTORGA ESTE CONSENTIMIENTO:

Como Trabajador: SI___ NO X

Fecha de Autorización: 03/02/2026

Firma del Trabajador: Jorge luis Gomez

Powered by CamScanner

	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN	Código: GH-R-006 Fecha: 01-07-2025 Versión: 2

Nombre y Apellidos: Jorge Luis G


Cedula: 1004121720

Cargo: Ayudante de obra

Fecha: 03/02/2026

1. ¿A qué se dedica el CONSORCIO CGSM 4?

a. Servicio de dragado hidráulico y mecánico, obras marítimas y fluviales, transporte fluvial, planeación y control de proyectos de ingeniería civil en el área de movimientos de tierra.



b. Nuestra pasión es mejorar su vida generando desarrollo social y soluciones financieras.



c. Desarrollar, producir y comercializar productos de evolución constante que brinden calidad y rentabilidad; creando un alto valor notado para accionistas, proveedores y clientes.



d. Ninguna de las anteriores.

2. Teniendo en cuenta la inducción recibida, mencione el propósito del cargo para el cual fue contratado. Realizar tareas de apoyo a operaciones de la obra, mantener el orden, de trabajo limpio y organizado.


3. ¿Qué formatos tiene que diligenciar usted desde el desempeño de su labor?

Formato de asistencia de charla y capacitación acta de entrega de epp

4. De acuerdo con la inducción, mencione los peligros a los cuales usted está expuesto mientras realiza su trabajo.

peligro biologico, fisico, Biomecanico, fenomenos naturales psicologico

5. Elija 2 responsabilidades que usted tiene desde su cargo en cuanto a la Seguridad y Salud en el trabajo.



Uso de epp



Analizar los riesgos



Asistir a capacitaciones y charlas



Autorizar permisos de trabajo



Trabajar en equipo

Powered by CamScanner

6. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo identifique que falta grave es causa justa para dar por terminado el contrato laboral existente.

a. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido.





b. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador.

c. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos o drogas enervantes.



(d) Todas las anteriores.

7. ¿Qué políticas posee la empresa?

a. Calidad - No Alcohol, No drogas y No fumadores – HSE
(b) HSEQ (Calidad – Seguridad, Salud en el trabajo – Medio Ambiente), Política Seguridad acuática, Política de No alcohol no drogas, Política de Seguridad Vial.
c. Orden y Aseo – HSE – Uso de EPP
d. HSE
e. Ninguna

8. ¿De qué trata la política de alcohol y no drogas?

a. Que se puede consumir alcohol o drogas siempre y cuando no sea en el lugar de trabajo.
(b) No se le permitirá a ninguna persona, sin importar su rango o posición, trabajar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.
c. Se puede consumir alcohol en el lugar de trabajo siempre y cuando no altere el orden y rendimiento en la ejecución de mi labor.
d. Todas las anteriores.

9. ¿La Política de Seguridad Acuática está dirigida a que personas?

a. Los trabajadores
b. Contratistas
c. Los trabajadores y contratistas
(d) Todos los trabajadores, contratistas y visitantes.

10. ¿Qué practicas están prohibidas dentro de nuestra política de seguridad vial?

a. El uso de celulares durante la conducción.



b. Consumir o estar bajo los efectos del alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas cuando se conduce o de pasajero en vehículos al servicio de la empresa.



c. Transportar personal ajeno a la organización sin previa autorización.



d. No Colocarse el cinturón de seguridad.



(e) Todas las anteriores

Powered by CamScanner

11. Escoja los equipos de protección personal (epp) o elementos de dotación que deba usar en su lugar de trabajo.



Uniforme completo



Botas



Casco



Gafas



Chaleco salvavidas



Guantes



Protección auditiva



Delantal, polainas, mangas, guantes y careta de soldador

12. ¿Cuáles programas están definidos actualmente como prevención de riesgos prioritarios en la empresa?

a. Riesgo cardiovascular, Salud Publica, Mecánico, Acuático, Conservación Auditiva, Conservación Osteomuscular

b. Caída al mismo nivel, caída desde alturas y Resbalones



c. Ninguna de las anteriores

13. Unir con una línea la figura que representa con el acto o condición insegura que representa.



Acto Inseguro



Condición Insegura

14. ¿Cuál es la función principal del COPASST?

a. Registrar los accidentes de trabajo.





b. Evaluar el desempeño de los empleados.

c. Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.





d. Registrar las actividades realizadas en el día.

e. Ninguna de las anteriores

15. En caso de accidente o incidente de trabajo usted debe:

a. No hacer nada.



b. Informar al Jefe inmediato y/o Vigia HSE para proceder a recibir atención médica.

c. Ir de manera independiente al médico.

d. Llamar a la oficina de Barranquilla a informar.

e. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

16. Escoja y relacione con el dibujo, las Brigadas de Emergencia con las que cuenta la empresa

a. Brigada de primeros auxilios.



b. Brigada de Evacuación.



c. Brigada contra incendios.



d. Todas las anteriores

17. ¿Cómo se reconocen las salidas de emergencia, rutas de evacuación

a. A través de señales de humo.
b. A través de cintas
c. A través de la señalización ubicadas en los equipos e instalaciones
d. A través de balizas.
e. No hay forma de reconocerlas.

18. Señala con una x los equipos de control de emergencias con que cuenta la empresa en sus instalaciones y/o proyectos (pueden ser uno o varios)

a. Agua
b. Alarma de incendio
c. Extintores
d. Kit control derrame
e. Ninguno ✗


19. ¿Cuál es el objetivo principal del PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental?

a. Contaminar las fuentes hídricas
b. Establecer e implementar medidas dirigidas al control ambiental del proyecto.
c. Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.
d. Ninguna de las anteriores

20. ¿Cuál es la función principal de los Puntos Ecológicos?

a. Separar los residuos en la fuente
b. Para cuidar el medio ambiente
c. Para guardar los aceites reciclables
d. a y b son ciertas

21. Teniendo en cuenta el código de colores para la separación de los residuos sólidos, une con una línea los desechos según la caneca donde deban depositarse

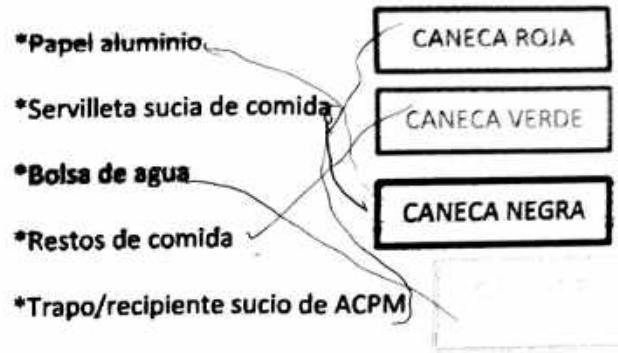

22. Son prohibiciones dentro de áreas de proyecto

a. Arrojar residuos sólidos al suelo o agua
b. Quemas a cielo abierto
c. Contaminar las áreas naturales
d. Cazar y comercializar especies de fauna
e. Todas las anteriores

23. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de Gestión Social?

a. Ejecutar actividades técnicas del dragado en el área del proyecto.
b. Diseñar y ejecutar estrategias de fortalecimiento social dirigidas a las partes interesadas en el área de influencia del proyecto.
c. Realizar auditorías ambientales y sociales en las comunidades.
d. Contratar personal técnico y operativo para los proyectos.

24. ¿Qué actividad NO hace parte del Componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social?

a. Funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad (PAC)
b. Recolección de hojas de vida en las comunidades
c. Atención de P.Q.R.S.F. (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones)
d. Instalación de medios de comunicación como vallas informativas y buzones de sugerencias

EVALUADO POR: Yesenia Polo
CARGO: Aux HSE
CALIFICACIÓN: 100

Powered by CamScanner

BaP	**REGISTRO DE INDUCCIÓN**	**Código: GH-R-025** **Versión: 2** **Fecha: 19-06-2025**

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jose Jorge Garcia **IDENTIFICACION:** 1126720263

CARGO: Ayudante de obra

TEMA	CARGO RESPONSABLE	FECHA	DURACIÓN	NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN
Video corporativo					
Presentación de inducción (misión, visión, valores corporativos, organigrama, nómina y seguridad social, beneficios, políticas, buenas prácticas y conductas laborales					
Reglamento Interno de Trabajo					
Manual de Convivencia Laboral					
HSEQ: Mapa de procesos, certificaciones, políticas, objetivos integrales, responsabilidades SGI, riesgos y peligros, programas, epp, accidente de trabajo, COPASST, COCOLA	Vigia HSE	03/02/26	30 Min	yesuth vanessa	yesuth polo v
Procedimientos en caso de emergencia	Vigia HSE	03/02/26	20 Min	yesuth vanessa	yesuth polo v
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Vigia HSE	03/02/26	20 Min	yesuth vanessa	yesuth polo v
Programas ambientales – responsabilidad ambiental					
Gestión Social					
Calidad: Certificaciones, documentos del SGI					
Inducción al puesto de trabajo	Vigia HSE	03/02/26	20 Min	yesuth vanessa	yesuth polo v
Otros temas específicos para el cargo (cuando aplique)					

FIRMA DEL TRABAJADOR: Jose Jorge Garcia **FECHA:** 03/02/26

Powered by CamScanner

B&P	**COMPROMISO HSEQ** **(Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad)**	**Código: GH-R-020** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Mediante la presente certifico que he recibido por parte del CONSORCIO CGSM 4, inducción en lo referente a sistema integrado de gestión incluyendo políticas, objetivos, programas, procedimientos, matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos, aspectos e impactos ambientales y riesgos y oportunidades. Por lo tanto, manifiesto lo siguiente:

1. Me comprometo a cumplir cada una de las políticas y normas de la empresa de manera estricta.
2. Me comprometo a contribuir con la organización en la mejora continua del sistema integrado de gestión, desarrollando mis funciones y responsabilidades de manera óptima, salvaguardando los bienes de la compañía, la propiedad privada y la de sus clientes.
3. En mi sitio de trabajo, durante el horario laboral y de manera obligatoria utilizaré los elementos de protección personal (EPP) suministrados por la empresa.
4. Reportar inmediatamente todo accidente, incidente o enfermedad laboral.
5. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
6. Asistir y participar activamente en los programas de formación, capacitación y entrenamiento que la empresa determine.
7. Conocer y aplicar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
8. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
9. Procuraré el autocuidado integral de mi salud y la de mis compañeros; asimismo, informaré de manera oportuna a mi superior de riesgos potenciales que puedan generar un accidente de trabajo.
10. En horas y/o áreas de trabajo, no estaré bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, no consumiré tabaco u otras sustancias psicotrópicas y estaré dispuesto a practicarme las pruebas que la empresa así lo considere en relación a estas prohibiciones.
11. Desde mi sitio de trabajo contribuiré con el medio ambiente, utilizando los puntos ecológicos, evitando contaminar las fuentes hídricas, contribuyendo con el cuidado de la flora y la fauna.

Jose Jorge Garcia
FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jose Jorge Garcia

FECHA: 03/03/26

Powered by CamScanner

B&P	**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y ALCOHOL**	**Código: GH-R-008** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Yo José Jorge García identificado con CC 1126720263 de Bucaramanga, obrando en la calidad abajo indicada, en desarrollo del artículo 15 de la Ley 23 de 1981, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizó al CONSORCIO CGSM 4 para efectuar las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol etílico, marihuana, cocaína, basuco, anfetaminas (éxtasis), benzodiacepinas (pastillas), opiáceos (heroína) y sustancias similares o derivadas.

Hago constar que he informado al profesional HSE y Vigía HSE sobre los medicamentos que he consumido hoy y en los días previos a la toma de éste examen y entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, de la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo.

El diagnóstico se realiza examinando mi muestra de orina para detectar la presencia de las sustancias psicoactivas mencionadas anteriormente. Existen varias pruebas de laboratorio diseñadas para este propósito las cuales se dividen básicamente en dos tipos: **Presuntivas:** que en caso de ser positivas indican una posible presencia de las sustancias psicoactivas y **Confirmatorias.** La prueba que se realizará inicialmente será de tipo presuntivo y en caso de salir positiva o indeterminada se realiza una prueba confirmatoria.

Asimismo, autorizo me sea realizada prueba de alcohol, la cual se practica haciendo uso de un alcoholímetro como medida presuntiva de presencia de dicha sustancia en mi organismo.

Comprendo que, para efectos de la obtención y confiablidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba, sin embargo, los resultados quedarán registrados en el laboratorio.

A pesar de lo anterior, la empresa no será responsable por posibles sanciones, daños o perjuicios causados a terceros, o a mi persona, derivados del uso de los resultados.

Confirmo haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen. Declaro que he dado ésta autorización voluntariamente.

CALIDAD EN LA QUE SE OTORGA ESTE CONSENTIMIENTO:

Como Trabajador: SI___ NO X

Fecha de Autorización: 03/02/26

Firma del Trabajador: José Jorge García

Powered by CamScanner

	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN	Código: GH-R-006 Fecha: 01-07-2025 Versión: 2

Nombre y Apellidos: Jose Jorge Garcia


Cedula: 1126120763

Cargo: Ayudante de obra

Fecha: 03/02/26

1. ¿A qué se dedica el CONSORCIO CGSM 4?

a. Servicio de dragado hidráulico y mecánico, obras marítimas y fluviales, transporte fluvial, planeación y control de proyectos de ingeniería civil en el área de movimientos de tierra.



b. Nuestra pasión es mejorar su vida generando desarrollo social y soluciones financieras.



c. Desarrollar, producir y comercializar productos de evolución constante que brinden calidad y rentabilidad; creando un alto valor notado para accionistas, proveedores y clientes.



d. Ninguna de las anteriores.

2. Teniendo en cuenta la inducción recibida, mencione el propósito del cargo para el cual fue contratado. Realizar tareas de ayuda de operacion de la obra, realizar orden y limpieza del area de trabajo

3. ¿Qué formatos tiene que diligenciar usted desde el desempeño de su labor?
formato de asistencia de charla y capacitaciones acta de entrega de EPP

4. De acuerdo con la inducción, mencione los peligros a los cuales usted está expuesto mientras realiza su trabajo.

Biologico, Psicosocial, Fisico, Fenomenos naturales, biomecanico

5. Elija 2 responsabilidades que usted tiene desde su cargo en cuanto a la Seguridad y Salud en el trabajo.



Uso de epp



Analizar los riesgos



Asistir a capacitaciones y charlas



Autorizar permisos de trabajo



Trabajar en equipo

Powered by CamScanner

6. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo identifique que falta grave es causa justa para dar por terminado el contrato laboral existente.

a. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido.





b. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador.

c. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos o drogas enervantes.



d. Todas las anteriores.

7. ¿Qué políticas posee la empresa?

a. Calidad - No Alcohol, No drogas y No fumadores – HSE
b. HSEQ (Calidad – Seguridad, Salud en el trabajo – Medio Ambiente), Política Seguridad acuática, Política de No alcohol no drogas, Política de Seguridad Vial.
c. Orden y Aseo – HSE – Uso de EPP
d. HSE
e. Ninguna

8. ¿De qué trata la política de alcohol y no drogas?

a. Que se puede consumir alcohol o drogas siempre y cuando no sea en el lugar de trabajo.
b. No se le permitirá a ninguna persona, sin importar su rango o posición, trabajar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.
c. Se puede consumir alcohol en el lugar de trabajo siempre y cuando no altere el orden y rendimiento en la ejecución de mi labor.
d. Todas las anteriores.

9. ¿La Política de Seguridad Acuática está dirigida a que personas?

a. Los trabajadores
b. Contratistas
c. Los trabajadores y contratistas
d. Todos los trabajadores, contratistas y visitantes.

10. ¿Qué practicas están prohibidas dentro de nuestra política de seguridad vial?

a. El uso de celulares durante la conducción.



b. Consumir o estar bajo los efectos del alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas cuando se conduce o de pasajero en vehículos al servicio de la empresa.



c. Transportar personal ajeno a la organización sin previa autorización.



d. No Colocarse el cinturón de seguridad.



e. Todas las anteriores

Powered by CamScanner

11. Escoja los equipos de protección personal (epp) o elementos de dotación que deba usar en su lugar de trabajo.



Uniforme completo



Botas



Casco



Gafas



Chaleco salvavidas



Guantes



Protección auditiva



Delantal, polainas, mangas, guantes y careta de soldador

12. ¿Cuáles programas están definidos actualmente como prevención de riesgos prioritarios en la empresa?

a. Riesgo cardiovascular, Salud Publica, Mecánico, Acustico, Conservación Auditiva, Conservación Osteomuscular

b. Caida al mismo nivel, caida desde alturas y Resbalones



c. Ninguna de las anteriores

13. Unir con una línea la figura que representa con el acto o condición insegura que representa.



Acto Inseguro



Condición Insegura

14. ¿Cuál es la función principal del COPASST?

a. Registrar los accidentes de trabajo.





b. Evaluar el desempeño de los empleados.

c. Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.





d. Registrar las actividades realizadas en el día.

e. Ninguna de las anteriores

15. En caso de accidente o incidente de trabajo usted debe:

a. No hacer nada.



b. Informar al Jefe Inmediato y/o Vigia HSE para proceder a recibir atención médica.

c. Ir de manera independiente al médico.

d. Llamar a la oficina de Barranquilla a informar.

e. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

16. Escoja y relacione con el dibujo, las Brigadas de Emergencia con las que cuenta la empresa

a. Brigada de primeros auxilios. 

b. Brigada de Evacuación. 

c. Brigada contra incendios. 

(d.) Todas las anteriores

17. ¿Cómo se reconocen las salidas de emergencia, rutas de evacuación

a. A través de señales de humo.
b. A través de cintas
(c.) A través de la señalización ubicadas en los equipos e instalaciones
d. A través de balizas.
e. No hay forma de reconocerlas.

18. Señala con una x los equipos de control de emergencias con que cuenta la empresa en sus instalaciones y/o proyectos (pueden ser uno o varios)

a. Agua
b. Alarma de incendio
c. Extintores
d. Kit control derrame
e. Ninguno X


19. ¿Cuál es el objetivo principal del PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental?

a. Contaminar las fuentes hídricas
(b.) Establecer e implementar medidas dirigidas al control ambiental del proyecto.
c. Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.
d. Ninguna de las anteriores

20. ¿Cuál es la función principal de los Puntos Ecológicos?

a. Separar los residuos en la fuente
b. Para cuidar el medio ambiente
c. Para guardar los aceites reciclables
(d.) a y b son ciertas

21. Teniendo en cuenta el código de colores para la separación de los residuos sólidos, une con una línea los desechos según la caneca donde deban depositarse



22. Son prohibiciones dentro de áreas de proyecto

a. Arrojar residuos sólidos al suelo o agua
b. Quemas a cielo abierto
c. Contaminar las áreas naturales
d. Cazar y comercializar especies de fauna
(e.) Todas las anteriores

23. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de Gestión Social?

a. Ejecutar actividades técnicas del dragado en el área del proyecto.
(b.) Diseñar y ejecutar estrategias de fortalecimiento social dirigidas a las partes interesadas en el área de influencia del proyecto.
c. Realizar auditorías ambientales y sociales en las comunidades.
d. Contratar personal técnico y operativo para los proyectos.

24. ¿Qué actividad NO hace parte del Componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social?

a. Funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad (PAC)
(b.) Recolección de hojas de vida en las comunidades
c. Atención de P.Q.R.S.F. (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones)
d. Instalación de medios de comunicación como vallas informativas y buzones de sugerencias

EVALUADO POR: Yesenia Palou
CARGO: Vigía HSE
CALIFICACIÓN: 100

Powered by CamScanner

BaP	**REGISTRO DE INDUCCIÓN**	**Código: GH-R-025** **Versión: 2** **Fecha: 19-06-2025**

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Edilberto Alvarez **IDENTIFICACION:** 85479599

CARGO: ayudante de obra

TEMA	CARGO RESPONSABLE	FECHA	DURACIÓN	NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN
Video corporativo					
Presentación de inducción (misión, visión, valores corporativos, organigrama, nómina y seguridad social, beneficios, políticas, buenas prácticas y conductas laborales					
Reglamento Interno de Trabajo					
Manual de Convivencia Laboral					
HSEQ: Mapa de procesos, certificaciones, políticas, objetivos integrales, responsabilidades SGI, riesgos y peligros, programas, epp, accidente de trabajo, COPASST, COCOLA	Vigia HSE	03/02/26	30 Min	Yesmith vanessa	Yesmith Polo V
Procedimientos en caso de emergencia	Vigia HSE	03/02/26	20 Min	Yesmith Vanessa	Yesmith Polo V
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Vigia HSE	03/02/26	20 Min	Yesmith Vanessa	Yesmith Polo V
Programas ambientales – responsabilidad ambiental					
Gestión Social					
Calidad: Certificaciones, documentos del SGI					
Inducción al puesto de trabajo	Vigia HSE	03/02/26	20 Min	Yesmith vanessa	Yesmith Polo V
Otros temas específicos para el cargo (cuando aplique)					

FIRMA DEL TRABAJADOR: Edilberto Alvarez **FECHA:** 03/02/2026

Powered by CamScanner

B&P	**COMPROMISO HSEQ** **(Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad)**	**Código: GH-R-020** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Mediante la presente certifico que he recibido por parte del CONSORCIO CGSM 4, inducción en lo referente a sistema integrado de gestión incluyendo políticas, objetivos, programas, procedimientos, matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos, aspectos e impactos ambientales y riesgos y oportunidades. Por lo tanto, manifiesto lo siguiente:

1. Me comprometo a cumplir cada una de las políticas y normas de la empresa de manera estricta.
2. Me comprometo a contribuir con la organización en la mejora continua del sistema integrado de gestión, desarrollando mis funciones y responsabilidades de manera óptima, salvaguardando los bienes de la compañía, la propiedad privada y la de sus clientes.
3. En mi sitio de trabajo, durante el horario laboral y de manera obligatoria utilizaré los elementos de protección personal (EPP) suministrados por la empresa.
4. Reportar inmediatamente todo accidente, incidente o enfermedad laboral.
5. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
6. Asistir y participar activamente en los programas de formación, capacitación y entrenamiento que la empresa determine.
7. Conocer y aplicar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
8. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
9. Procuraré el autocuidado integral de mi salud y la de mis compañeros; asimismo, informaré de manera oportuna a mi superior de riesgos potenciales que puedan generar un accidente de trabajo.
10. En horas y/o áreas de trabajo, no estaré bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, no consumiré tabaco u otras sustancias psicotrópicas y estaré dispuesto a practicarme las pruebas que la empresa así lo considere en relación a estas prohibiciones.
11. Desde mi sitio de trabajo contribuiré con el medio ambiente, utilizando los puntos ecológicos, evitando contaminar las fuentes hídricas, contribuyendo con el cuidado de la flora y la fauna.

Edilberto Alvarez

FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Edilberto Alvarez

FECHA: 03/02/2026

Powered by CamScanner

B&P	**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y ALCOHOL**	**Código: GH-R-008** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Yo Edilberto Alvarez Mazo identificado con CC 85479599 de Sabanina, obrando en la calidad abajo indicada, en desarrollo del artículo 15 de la Ley 23 de 1981, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizó al CONSORCIO CGSM 4 para efectuar las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol etílico, marihuana, cocaína, basuco, anfetaminas (éxtasis), benzodiacepinas (pastillas), opiáceos (heroína) y sustancias similares o derivadas.

Hago constar que he informado al profesional HSE y Vigía HSE sobre los medicamentos que he consumido hoy y en los días previos a la toma de éste examen y entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, de la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo.

El diagnóstico se realiza examinando mi muestra de orina para detectar la presencia de las sustancias psicoactivas mencionadas anteriormente. Existen varias pruebas de laboratorio diseñadas para este propósito las cuales se dividen básicamente en dos tipos: **Presuntivas:** que en caso de ser positivas indican una posible presencia de las sustancias psicoactivas y **Confirmatorias.** La prueba que se realizará inicialmente será de tipo presuntivo y en caso de salir positiva o indeterminada se realiza una prueba confirmatoria.

Asimismo, autorizo me sea realizada prueba de alcohol, la cual se practica haciendo uso de un alcoholímetro como medida presuntiva de presencia de dicha sustancia en mi organismo.

Comprendo que, para efectos de la obtención y confiablidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba, sin embargo, los resultados quedarán registrados en el laboratorio.

A pesar de lo anterior, la empresa no será responsable por posibles sanciones, daños o perjuicios causados a terceros, o a mi persona, derivados del uso de los resultados.

Confirmo haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen. Declaro que he dado ésta autorización voluntariamente.

CALIDAD EN LA QUE SE OTORGA ESTE CONSENTIMIENTO:

Como Trabajador: SI___ NO X

Fecha de Autorización: 03/02/2026

Firma del Trabajador: Edilberto Alvarez

Powered by CamScanner

	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN	Código: GH-R-006 Fecha: 01-07-2025 Versión: 2

Nombre y Apellidos: Edilberto Alvarez


Cedula: 85479599

Cargo: ayudante de obra

Fecha: 03/02/2026

1. ¿A qué se dedica el CONSORCIO CGSM 4?

a. Servicio de dragado hidráulico y mecánico, obras marítimas y fluviales, transporte fluvial, planeación y control de proyectos de ingeniería civil en el área de movimientos de tierra.



b. Nuestra pasión es mejorar su vida generando desarrollo social y soluciones financieras.



c. Desarrollar, producir y comercializar productos de evolución constante que brinden calidad y rentabilidad; creando un alto valor notado para accionistas, proveedores y clientes.



d. Ninguna de las anteriores.

2. Teniendo en cuenta la inducción recibida, mencione el propósito del cargo para el cual fue contratado. Realizar labores de apoyo a la ejecución de la obra, mantener el área de ejecución limpia y ordenada

3. ¿Qué formatos tiene que diligenciar usted desde el desempeño de su labor?

formato de asistencia charla o capacitaciones acta de entrega de EPP

4. De acuerdo con la inducción, mencione los peligros a los cuales usted está expuesto mientras realiza su trabajo.

biologico, bio mecanico psico social fenomenos naturales

5. Elija 2 responsabilidades que usted tiene desde su cargo en cuanto a la Seguridad y Salud en el trabajo.



Uso de epp X



Analizar los riesgos



Asistir a capacitaciones y charlas X



Autorizar permisos de trabajo



Trabajar en equipo

Powered by CamScanner

6. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo identifique que falta grave es causa justa para dar por terminado el contrato laboral existente.

a. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido.





b. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador.

c. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos o drogas enervantes.



d. Todas las anteriores.

7. ¿Qué políticas posee la empresa?

a. Calidad - No Alcohol, No drogas y No fumadores – HSE
b. HSEQ (Calidad – Seguridad, Salud en el trabajo – Medio Ambiente), Política Seguridad acuática, Política de No alcohol no drogas, Política de Seguridad Vial.
c. Orden y Aseo – HSE – Uso de EPP
d. HSE
e. Ninguna

8. ¿De qué trata la política de alcohol y no drogas?

a. Que se puede consumir alcohol o drogas siempre y cuando no sea en el lugar de trabajo.
b. No se le permitirá a ninguna persona, sin importar su rango o posición, trabajar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.
c. Se puede consumir alcohol en el lugar de trabajo siempre y cuando no altere el orden y rendimiento en la ejecución de mi labor.
d. Todas las anteriores.

9. ¿La Política de Seguridad Acuática está dirigida a que personas?

a. Los trabajadores
b. Contratistas
c. Los trabajadores y contratistas
d. Todos los trabajadores, contratistas y visitantes.

10. ¿Qué practicas están prohibidas dentro de nuestra política de seguridad vial?

a. El uso de celulares durante la conducción.



b. Consumir o estar bajo los efectos del alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas cuando se conduce o de pasajero en vehículos al servicio de la empresa.



c. Transportar personal ajeno a la organización sin previa autorización.



d. No Colocarse el cinturón de seguridad.



e. Todas las anteriores

Powered by CamScanner

11. Escoja los equipos de protección personal (epp) o elementos de dotación que deba usar en su lugar de trabajo.



Uniforme completo X



Botas



Casco X



Gafas X



Chaleco salvavidas



Guantes X



Protección auditiva X



Delantal, polainas, mangas, guantes y careta de soldador

12. ¿Cuáles programas están definidos actualmente como prevención de riesgos prioritarios en la empresa?

a. Riesgo cardiovascular, Salud Publica, Mecánico, Acustico, Conservación Auditiva, Conservación Osteomuscular

b. Caida al mismo nivel, caida desde alturas y Resbalones



c. Ninguna de las anteriores

13. Unir con una línea la figura que representa con el acto o condición insegura que representa.



Acto Inseguro



Condición Insegura

14. ¿Cuál es la función principal del COPASST?

a. Registrar los accidentes de trabajo.





b. Evaluar el desempeño de los empleados.

c. Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.





d. Registrar las actividades realizadas en el día.

e. Ninguna de las anteriores

15. En caso de accidente o incidente de trabajo usted debe:

a. No hacer nada.



b. Informar al Jefe inmediato y/o Vigia HSE para proceder a recibir atención médica.

c. Ir de manera independiente al médico.

d. Llamar a la oficina de Barranquilla a informar.

e. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

16. Escoja y relacione con el dibujo, las Brigadas de Emergencia con las que cuenta la empresa

a. Brigada de primeros auxilios 

b. Brigada de Evacuación. 

c. Brigada contra incendios. 

d. Todas las anteriores

17. ¿Cómo se reconocen las salidas de emergencia, rutas de evacuación

a. A través de señales de humo.
b. A través de cintas
c. A través de la señalización ubicadas en los equipos e instalaciones
d. A través de balizas.
e. No hay forma de reconocerlas.

18. Señala con una x los equipos de control de emergencias con que cuenta la empresa en sus instalaciones y/o proyectos (pueden ser uno o varios)

a. Agua
b. Alarma de incendio
c. Extintores
d. Kit control derrame
e. Ninguno


19. ¿Cuál es el objetivo principal del PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental?

a. Contaminar las fuentes hídricas
b. Establecer e implementar medidas dirigidas al control ambiental del proyecto.
c. Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.
d. Ninguna de las anteriores

20. ¿Cuál es la función principal de los Puntos Ecológicos?

a. Separar los residuos en la fuente
b. Para cuidar el medio ambiente
c. Para guardar los aceites reciclables
d. a y b son ciertas

21. Teniendo en cuenta el código de colores para la separación de los residuos sólidos, une con una línea los desechos según la caneca donde deban depositarse



22. Son prohibiciones dentro de áreas de proyecto

a. Arrojar residuos sólidos al suelo o agua
b. Quemas a cielo abierto
c. Contaminar las áreas naturales
d. Cazar y comercializar especies de fauna
e. Todas las anteriores

23. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de Gestión Social?

a. Ejecutar actividades técnicas del dragado en el área del proyecto.
b. Diseñar y ejecutar estrategias de fortalecimiento social dirigidas a las partes interesadas en el área de influencia del proyecto.
c. Realizar auditorías ambientales y sociales en las comunidades.
d. Contratar personal técnico y operativo para los proyectos.

24. ¿Qué actividad NO hace parte del Componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social?

a. Funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad (PAC)
b. Recolección de hojas de vida en las comunidades
c. Atención de P.Q.R.S.F. (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones)
d. Instalación de medios de comunicación como vallas informativas y buzones de sugerencias

EVALUADO POR: Yesenia Polo
CARGO: Líder HSE
CALIFICACIÓN: 100

Powered by CamScanner

B&P	**REGISTRO DE INDUCCIÓN**	**Código: GH-R-025** **Versión: 2** **Fecha: 19-06-2025**

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Naser Domtz **IDENTIFICACION:** 1004122911

CARGO: Ayudante de obra

TEMA	CARGO RESPONSABLE	FECHA	DURACIÓN	NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN
Video corporativo					
Presentación de inducción (misión, visión, valores corporativos, organigrama, nómina y seguridad social, beneficios, políticas, buenas prácticas y conductas laborales					
Reglamento Interno de Trabajo					
Manual de Convivencia Laboral					
HSEQ: Mapa de procesos, certificaciones, políticas, objetivos integrales, responsabilidades SGI, riesgos y peligros, programas, epp, accidente de trabajo, COPASST, COCOLA	Vigia HSE	03/02/26	30 Min	Yesuth vanessa	yesuth polo v
Procedimientos en caso de emergencia	Vigia HSE	03/02/26	20 Min	Yesuth vanessa	yesuth polo v
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Vigia HSE	03/02/26	20 Min	Yesuth vanessa	yesuth polo v
Programas ambientales – responsabilidad ambiental					
Gestión Social					
Calidad: Certificaciones, documentos del SGI					
Inducción al puesto de trabajo	Vigia HSE	03/02/26	20 Min	Yesuth vanessa	yesuth polo v
Otros temas específicos para el cargo (cuando aplique)					

FIRMA DEL TRABAJADOR: Naser Domtz **FECHA:** 03/02/2026

Powered by CamScanner

B&P	**COMPROMISO HSEQ** **(Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad)**	**Código: GH-R-020** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Mediante la presente certifico que he recibido por parte del CONSORCIO CGSM 4, inducción en lo referente a sistema integrado de gestión incluyendo políticas, objetivos, programas, procedimientos, matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos, aspectos e impactos ambientales y riesgos y oportunidades. Por lo tanto, manifiesto lo siguiente:

1. Me comprometo a cumplir cada una de las políticas y normas de la empresa de manera estricta.
2. Me comprometo a contribuir con la organización en la mejora continua del sistema integrado de gestión, desarrollando mis funciones y responsabilidades de manera óptima, salvaguardando los bienes de la compañía, la propiedad privada y la de sus clientes.
3. En mi sitio de trabajo, durante el horario laboral y de manera obligatoria utilizaré los elementos de protección personal (EPP) suministrados por la empresa.
4. Reportar inmediatamente todo accidente, incidente o enfermedad laboral.
5. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
6. Asistir y participar activamente en los programas de formación, capacitación y entrenamiento que la empresa determine.
7. Conocer y aplicar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
8. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
9. Procuraré el autocuidado integral de mi salud y la de mis compañeros; asimismo, informaré de manera oportuna a mi superior de riesgos potenciales que puedan generar un accidente de trabajo.
10. En horas y/o áreas de trabajo, no estaré bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, no consumiré tabaco u otras sustancias psicotrópicas y estaré dispuesto a practicarme las pruebas que la empresa así lo considere en relación a estas prohibiciones.
11. Desde mi sitio de trabajo contribuiré con el medio ambiente, utilizando los puntos ecológicos, evitando contaminar las fuentes hídricas, contribuyendo con el cuidado de la flora y la fauna.

FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Yaseli Ibnez

FECHA: 31/01/26

Powered by CamScanner

B&P	**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y ALCOHOL**	**Código: GH-R-008** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Yo Yesica Gomez identificado con CC 1004172291 de Santander, obrando en la calidad abajo indicada, en desarrollo del artículo 15 de la Ley 23 de 1981, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizó al CONSORCIO CGSM 4 para efectuar las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol etílico, marihuana, cocaína, basuco, anfetaminas (éxtasis), benzodiacepinas (pastillas), opiáceos (heroína) y sustancias similares o derivadas.

Hago constar que he informado al profesional HSE y Vigía HSE sobre los medicamentos que he consumido hoy y en los días previos a la toma de éste examen y entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, de la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo.

El diagnóstico se realiza examinando mi muestra de orina para detectar la presencia de las sustancias psicoactivas mencionadas anteriormente. Existen varias pruebas de laboratorio diseñadas para este propósito las cuales se dividen básicamente en dos tipos: **Presuntivas:** que en caso de ser positivas indican una posible presencia de las sustancias psicoactivas y **Confirmatorias.** La prueba que se realizará inicialmente será de tipo presuntivo y en caso de salir positiva o indeterminada se realiza una prueba confirmatoria.

Asimismo, autorizo me sea realizada prueba de alcohol, la cual se practica haciendo uso de un alcoholímetro como medida presuntiva de presencia de dicha sustancia en mi organismo.

Comprendo que, para efectos de la obtención y confiablidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba, sin embargo, los resultados quedarán registrados en el laboratorio.

A pesar de lo anterior, la empresa no será responsable por posibles sanciones, daños o perjuicios causados a terceros, o a mi persona, derivados del uso de los resultados.

Confirmo haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen. Declaro que he dado ésta autorización voluntariamente.

CALIDAD EN LA QUE SE OTORGA ESTE CONSENTIMIENTO:

Como Trabajador: SI___ NO X

Fecha de Autorización: 05/11/26

Firma del Trabajador: Yesica Gomez

Powered by CamScanner

	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN	Código: GH-R-006 Fecha: 01-07-2025 Versión: 2

Nombre y Apellidos: Nazel Osma


Cedula: 1004122911

Cargo: Ayudante de obra

Fecha: 03/02/26

1. ¿A qué se dedica el CONSORCIO CGSM 4?

a. Servicio de dragado hidráulico y mecánico, obras marítimas y fluviales, transporte fluvial, planeación y control de proyectos de ingeniería civil en el área de movimientos de tierra.



b. Nuestra pasión es mejorar su vida generando desarrollo social y soluciones financieras.



c. Desarrollar, producir y comercializar productos de evolución constante que brinden calidad y rentabilidad; creando un alto valor notado para accionistas, proveedores y clientes.



d. Ninguna de las anteriores.


2. Teniendo en cuenta la inducción recibida, mencione el propósito del cargo para el cual fue contratado. Para realizar Actividades de apoyo a la ejecución de la obra

3. ¿Qué formatos tiene que diligenciar usted desde el desempeño de su labor?
Formato de Asistencia con las capacitaciones

4. De acuerdo con la inducción, mencione los peligros a los cuales usted está expuesto mientras realiza su trabajo.

Biologico, Químico, Ferrocarriles, Físico, Psicosocial

5. Elija 2 responsabilidades que usted tiene desde su cargo en cuanto a la Seguridad y Salud en el trabajo.



Uso de epp



Analizar los riesgos



Asistir a capacitaciones y charlas



Autorizar permisos de trabajo



Trabajar en equipo

Powered by CamScanner

6. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento interno de Trabajo identifique que falta grave es causa justa para dar por terminado el contrato laboral existente.

a. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido.





b. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador.

c. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos o drogas enervantes.



(d.) Todas las anteriores.

7. ¿Qué políticas posee la empresa?

a. Calidad - No Alcohol, No drogas y No fumadores – HSE
(b.) HSEQ (Calidad – Seguridad, Salud en el trabajo – Medio Ambiente), Política Seguridad acuática, Política de No alcohol no drogas, Política de Seguridad Vial.
c. Orden y Aseo – HSE – Uso de EPP
d. HSE
e. Ninguna

8. ¿De qué trata la política de alcohol y no drogas?

a. Que se puede consumir alcohol o drogas siempre y cuando no sea en el lugar de trabajo.
(b.) No se le permitirá a ninguna persona, sin importar su rango o posición, trabajar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.
c. Se puede consumir alcohol en el lugar de trabajo siempre y cuando no altere el orden y rendimiento en la ejecución de mi labor.
d. Todas las anteriores.

9. ¿La Política de Seguridad Acuática está dirigida a que personas?

a. Los trabajadores
b. Contratistas
c. Los trabajadores y contratistas
(d.) Todos los trabajadores, contratistas y visitantes.

10. ¿Qué practicas están prohibidas dentro de nuestra política de seguridad vial?

a. El uso de celulares durante la conducción.



b. Consumir o estar bajo los efectos del alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas cuando se conduce o de pasajero en vehículos al servicio de la empresa.



c. Transportar personal ajeno a la organización sin previa autorización.



d. No Colocarse el cinturón de seguridad.



(e.) Todas las anteriores

Powered by CamScanner

11. Escoja los equipos de protección personal (epp) o elementos de dotación que deba usar en su lugar de trabajo.



Uniforme completo



Botas



Casco



Gafas



Chaleco salvavidas



Guantes



Protección auditiva



Delantal, polainas, mangas, guantes y careta de soldador

12. ¿Cuáles programas están definidos actualmente como prevención de riesgos prioritarios en la empresa?

a. Riesgo cardiovascular, Salud Publica, Mecánico, Acustico, Conservación Auditiva, Conservación Osteomuscular

b. Caída al mismo nivel, caída desde alturas y Resbalones



c. Ninguna de las anteriores

13. Unir con una línea la figura que representa con el acto o condición insegura que representa.



Acto Inseguro



Condición Insegura

14. ¿Cuál es la función principal del COPASST?

a. Registrar los accidentes de trabajo.





b. Evaluar el desempeño de los empleados.

c. Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.





d. Registrar las actividades realizadas en el día.

e. Ninguna de las anteriores

15. En caso de accidente o incidente de trabajo usted debe:

a. No hacer nada.



b. Informar al Jefe inmediato y/o Vigia HSE para proceder a recibir atención médica.

c. ir de manera independiente al médico.

d. Llamar a la oficina de Barranquilla a informar.

e. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

16. Escoja y relacione con el dibujo, las Brigadas de Emergencia con las que cuenta la empresa

a. Brigada de primeros auxilios.



b. Brigada de Evacuación.



c. Brigada contra incendios.



(d.) Todas las anteriores

17. ¿Cómo se reconocen las salidas de emergencia, rutas de evacuación

a. A través de señales de humo.
b. A través de cintas
(c.) A través de la señalización ubicadas en los equipos e instalaciones
d. A través de balizas.
e. No hay forma de reconocerlas.

18. Señala con una x los equipos de control de emergencias con que cuenta la empresa en sus instalaciones y/o proyectos (pueden ser uno o varios)

a. Agua
b. Alarma de incendio
c. Extintores
d. Kit control derrame
e. Ninguno X


19. ¿Cuál es el objetivo principal del PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental?

a. Contaminar las fuentes hídricas
(b.) Establecer e implementar medidas dirigidas al control ambiental del proyecto.
c. Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.
d. Ninguna de las anteriores

20. ¿Cuál es la función principal de los Puntos Ecológicos?

a. Separar los residuos en la fuente
b. Para cuidar el medio ambiente
c. Para guardar los aceites reciclables
(d.) a y b son ciertas

21. Teniendo en cuenta el código de colores para la separación de los residuos sólidos, une con una línea los desechos según la caneca donde deban depositarse



22. Son prohibiciones dentro de áreas de proyecto

a. Arrojar residuos sólidos al suelo o agua
b. Quemas a cielo abierto
c. Contaminar las áreas naturales
d. Cazar y comercializar especies de fauna
(e.) Todas las anteriores

23. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de Gestión Social?

a. Ejecutar actividades técnicas del dragado en el área del proyecto.
(b.) Diseñar y ejecutar estrategias de fortalecimiento social dirigidas a las partes interesadas en el área de influencia del proyecto.
c. Realizar auditorías ambientales y sociales en las comunidades.
d. Contratar personal técnico y operativo para los proyectos.

24. ¿Qué actividad NO hace parte del Componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social?

a. Funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad (PAC)
(b.) Recolección de hojas de vida en las comunidades
c. Atención de P.Q.R.S.F. (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones)
d. Instalación de medios de comunicación como vallas informativas y buzones de sugerencias

EVALUADO POR: Yesuth Polo
CARGO: Vigia HSE
CALIFICACIÓN: 100

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE INDUCCIÓN	Código: GH-R-025 Versión: 2 Fecha: 19-06-2025

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Reinaldo ternera **IDENTIFICACION:** 7595150

CARGO: Ayudante de obra

TEMA	CARGO RESPONSABLE	FECHA	DURACIÓN	NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN
Video corporativo					
Presentación de inducción (misión, visión, valores corporativos, organigrama, nómina y seguridad social, beneficios, políticas, buenas prácticas y conductas laborales					
Reglamento Interno de Trabajo					
Manual de Convivencia Laboral					
HSEQ: Mapa de procesos, certificaciones, políticas, objetivos integrales, responsabilidades SGI, riesgos y peligros, programas, epp, accidente de trabajo, COPASST, COCOLA	Vigia HSE	03/02/26	30 Min	yesuth vanessa	yesuth polo v
Procedimientos en caso de emergencia	Vigia HSE	03/02/26	20 Min	yesuth vanessa	yesuth polo v
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Vigia HSE.	03/02/26	20 Min	yesuth vanessa	yesuth polo v
Programas ambientales – responsabilidad ambiental					
Gestión Social					
Calidad: Certificaciones, documentos del SGI					
Inducción al puesto de trabajo	Vigia HSE	03/02/26	20 Min	yesuth vanessa	yesuth polo v
Otros temas específicos para el cargo (cuando aplique)					

FIRMA DEL TRABAJADOR: Reinaldo ternera **FECHA:** 03/2/26

Powered by CamScanner

B&P	**COMPROMISO HSEQ** **(Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad)**	**Código: GH-R-020** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Mediante la presente certifico que he recibido por parte del CONSORCIO CGSM 4, inducción en lo referente a sistema integrado de gestión incluyendo políticas, objetivos, programas, procedimientos, matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos, aspectos e impactos ambientales y riesgos y oportunidades. Por lo tanto, manifiesto lo siguiente:

1. Me comprometo a cumplir cada una de las políticas y normas de la empresa de manera estricta.
2. Me comprometo a contribuir con la organización en la mejora continua del sistema integrado de gestión, desarrollando mis funciones y responsabilidades de manera óptima, salvaguardando los bienes de la compañía, la propiedad privada y la de sus clientes.
3. En mi sitio de trabajo, durante el horario laboral y de manera obligatoria utilizaré los elementos de protección personal (EPP) suministrados por la empresa.
4. Reportar inmediatamente todo accidente, incidente o enfermedad laboral.
5. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
6. Asistir y participar activamente en los programas de formación, capacitación y entrenamiento que la empresa determine.
7. Conocer y aplicar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
8. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
9. Procuraré el autocuidado integral de mi salud y la de mis compañeros; asimismo, informaré de manera oportuna a mi superior de riesgos potenciales que puedan generar un accidente de trabajo.
10. En horas y/o áreas de trabajo, no estaré bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, no consumiré tabaco u otras sustancias psicotrópicas y estaré dispuesto a practicarme las pruebas que la empresa así lo considere en relación a estas prohibiciones.
11. Desde mi sitio de trabajo contribuiré con el medio ambiente, utilizando los puntos ecológicos, evitando contaminar las fuentes hídricas, contribuyendo con el cuidado de la flora y la fauna.

Reinaldo Herrera

FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: reinaldo herrera

FECHA: 02/7/26

Powered by CamScanner

B&P	**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y ALCOHOL**	**Código: GH-R-008** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Yo Reinaldo Ternera identificado con CC 7595150 de Pivijay, obrando en la calidad abajo indicada, en desarrollo del artículo 15 de la Ley 23 de 1981, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizó al CONSORCIO CGSM 4 para efectuar las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol etílico, marihuana, cocaína, basuco, anfetaminas (éxtasis), benzodiacepinas (pastillas), opiáceos (heroína) y sustancias similares o derivadas.

Hago constar que he informado al profesional HSE y Vigía HSE sobre los medicamentos que he consumido hoy y en los días previos a la toma de éste examen y entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, de la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo.

El diagnóstico se realiza examinando mi muestra de orina para detectar la presencia de las sustancias psicoactivas mencionadas anteriormente. Existen varias pruebas de laboratorio diseñadas para este propósito las cuales se dividen básicamente en dos tipos: **Presuntivas:** que en caso de ser positivas indican una posible presencia de las sustancias psicoactivas y **Confirmatorias.** La prueba que se realizará inicialmente será de tipo presuntivo y en caso de salir positiva o indeterminada se realiza una prueba confirmatoria.

Asimismo, autorizo me sea realizada prueba de alcohol, la cual se practica haciendo uso de un alcoholímetro como medida presuntiva de presencia de dicha sustancia en mi organismo.

Comprendo que, para efectos de la obtención y confiablidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba, sin embargo, los resultados quedarán registrados en el laboratorio.

A pesar de lo anterior, la empresa no será responsable por posibles sanciones, daños o perjuicios causados a terceros, o a mi persona, derivados del uso de los resultados.

Confirmo haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen. Declaro que he dado ésta autorización voluntariamente.

CALIDAD EN LA QUE SE OTORGA ESTE CONSENTIMIENTO:

Como Trabajador: SI___ NO X

Fecha de Autorización: 03/2/26

Firma del Trabajador: Reinaldo Ternera

Powered by CamScanner

	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN	Código: GH-R-006 Fecha: 01-07-2025 Versión: 2

Nombre y Apellidos: Reinaldo


Cedula: 7595150

Cargo: Residente de obra

Fecha: 03/02/26

1. ¿A qué se dedica el CONSORCIO CGSM 4?

a. Servicio de dragado hidráulico y mecánico, obras marítimas y fluviales, transporte fluvial, planeación y control de proyectos de ingeniería civil en el área de movimientos de tierra.



b. Nuestra pasión es mejorar su vida generando desarrollo social y soluciones financieras.



c. Desarrollar, producir y comercializar productos de evolución constante que brinden calidad y rentabilidad; creando un alto valor notado para accionistas, proveedores y clientes.



d. Ninguna de las anteriores.


2. Teniendo en cuenta la inducción recibida, mencione el propósito del cargo para el cual fue contratado. Realizar tareas de apoyo en la ejecución de la obra, mantener el área de trabajo limpia y ordenada

3. ¿Qué formatos tiene que diligenciar usted desde el desempeño de su labor?
Formato de asistencia a charla o capacitaciones, entrega de EPP

4. De acuerdo con la inducción, mencione los peligros a los cuales usted está expuesto mientras realiza su trabajo.

Biologico, Fisico, Psicosocial, Biomecanico, Fenomenos naturales

5. Elija 2 responsabilidades que usted tiene desde su cargo en cuanto a la Seguridad y Salud en el trabajo.



Uso de epp



Analizar los riesgos



Asistir a capacitaciones y charlas



Autorizar permisos de trabajo



Trabajar en equipo

Powered by CamScanner

6. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo identifique que falta grave es causa justa para dar por terminado el contrato laboral existente.

a. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido.





b. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador.

c. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos o drogas enervantes.



(d.) Todas las anteriores.

7. ¿Qué políticas posee la empresa?

a. Calidad - No Alcohol, No drogas y No fumadores – HSE
(b.) HSEQ (Calidad – Seguridad, Salud en el trabajo – Medio Ambiente), Política Seguridad acuática, Política de No alcohol no drogas, Política de Seguridad Vial.
c. Orden y Aseo – HSE – Uso de EPP
d. HSE
e. Ninguna

8. ¿De qué trata la política de alcohol y no drogas?

a. Que se puede consumir alcohol o drogas siempre y cuando no sea en el lugar de trabajo.
(b.) No se le permitirá a ninguna persona, sin importar su rango o posición, trabajar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.
c. Se puede consumir alcohol en el lugar de trabajo siempre y cuando no altere el orden y rendimiento en la ejecución de mi labor.
d. Todas las anteriores.

9. ¿La Política de Seguridad Acuática está dirigida a que personas?

a. Los trabajadores
b. Contratistas
c. Los trabajadores y contratistas
(d.) Todos los trabajadores, contratistas y visitantes.

10. ¿Qué practicas están prohibidas dentro de nuestra política de seguridad vial?

a. El uso de celulares durante la conducción.



b. Consumir o estar bajo los efectos del alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas cuando se conduce o de pasajero en vehículos al servicio de la empresa.



c. Transportar personal ajeno a la organización sin previa autorización.



d. No Colocarse el cinturón de seguridad.



(e.) Todas las anteriores

Powered by CamScanner

11. Escoja los equipos de protección personal (epp) o elementos de dotación que deba usar en su lugar de trabajo.



Uniforme completo



Botas



Casco



Gafas



Chaleco salvavidas



Guantes



Protección auditiva



Delantal, polainas, mangas, guantes y careta de soldador

12. ¿Cuáles programas están definidos actualmente como prevención de riesgos prioritarios en la empresa?

a. Riesgo cardiovascular, Salud Publica, Mecánico, Acuático, Conservación Auditiva, Conservación Osteomuscular

b. Caída al mismo nivel, caída desde alturas y Resbalones



c. Ninguna de las anteriores

13. Unir con una línea la figura que representa con el acto o condición insegura que representa.



Acto Inseguro



Condición Insegura

14. ¿Cuál es la función principal del COPASST?

a. Registrar los accidentes de trabajo.





b. Evaluar el desempeño de los empleados.



c. Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.



d. Registrar las actividades realizadas en el día.

e. Ninguna de las anteriores

15. En caso de accidente o incidente de trabajo usted debe:

a. No hacer nada.



b. Informar al Jefe inmediato y/o Vigía HSE para proceder a recibir atención médica.

c. Ir de manera independiente al médico.

d. Llamar a la oficina de Barranquilla a informar.

e. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

16. Escoja y relacione con el dibujo, las Brigadas de Emergencia con las que cuenta la empresa

a. Brigada de primeros auxilios.



b. Brigada de Evacuación.



c. Brigada contra incendios.



(d.) Todas las anteriores

17. ¿Cómo se reconocen las salidas de emergencia, rutas de evacuación

a. A través de señales de humo.
b. A través de cintas
(c.) A través de la señalización ubicadas en los equipos e instalaciones
d. A través de balizas.
e. No hay forma de reconocerlas.

18. Señala con una x los equipos de control de emergencias con que cuenta la empresa en sus instalaciones y/o proyectos (pueden ser uno o varios)

a. Agua
b. Alarma de incendio
c. Extintores
d. Kit control derrame
e. Ninguno X


19. ¿Cuál es el objetivo principal del PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental?

a. Contaminar las fuentes hídricas
(b.) Establecer e implementar medidas dirigidas al control ambiental del proyecto.
c. Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.
d. Ninguna de las anteriores

20. ¿Cuál es la función principal de los Puntos Ecológicos?

a. Separar los residuos en la fuente
b. Para cuidar el medio ambiente
c. Para guardar los aceites reciclables
(d.) a y b son ciertas

21. Teniendo en cuenta el código de colores para la separación de los residuos sólidos, une con una línea los desechos según la caneca donde deban depositarse



22. Son prohibiciones dentro de áreas de proyecto

a. Arrojar residuos sólidos al suelo o agua
b. Quemas a cielo abierto
c. Contaminar las áreas naturales
d. Cazar y comercializar especies de fauna
(e.) Todas las anteriores

23. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de Gestión Social?

a. Ejecutar actividades técnicas del dragado en el área del proyecto.
(b.) Diseñar y ejecutar estrategias de fortalecimiento social dirigidas a las partes interesadas en el área de influencia del proyecto.
c. Realizar auditorías ambientales y sociales en las comunidades.
d. Contratar personal técnico y operativo para los proyectos.

24. ¿Qué actividad NO hace parte del Componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social?

a. Funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad (PAC)
(b.) Recolección de hojas de vida en las comunidades
c. Atención de P.Q.R.S.F. (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones)
d. Instalación de medios de comunicación como vallas informativas y buzones de sugerencias

EVALUADO POR: Yesuth Polo M
CARGO: Vigía HSE
CALIFICACIÓN: 100

Powered by CamScanner

B&P	**REGISTRO DE INDUCCIÓN**	**Código: GH-R-025** **Versión: 2** **Fecha: 19-06-2025**

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Davinson Fandiño **IDENTIFICACION:** 1070912738

CARGO: Ayudante de obra

TEMA	CARGO RESPONSABLE	FECHA	DURACIÓN	NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INDUCCIÓN
Video corporativo					
Presentación de inducción (misión, visión, valores corporativos, organigrama, nómina y seguridad social, beneficios, políticas, buenas prácticas y conductas laborales					
Reglamento Interno de Trabajo					
Manual de Convivencia Laboral					
HSEQ: Mapa de procesos, certificaciones, políticas, objetivos integrales, responsabilidades SGI, riesgos y peligros, programas, epp, accidente de trabajo, COPASST, COCOLA	Virgia HSE	03/02/26	30 Min	Yesmith Vanessa	Yesmith Polo V
Procedimientos en caso de emergencia	Virgia HSE	03/02/26	20 Min	Yesmith Vanessa	Yesmith Polo V
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	Virgia HSE	03/02/26	20 Min	Yesmith Vanessa	Yesmith Polo V
Programas ambientales – responsabilidad ambiental					
Gestión Social					
Calidad: Certificaciones, documentos del SGI					
Inducción al puesto de trabajo	Virgia HSE	03/02/26	20 Min	Yesmith Vanessa	Yesmith Polo V
Otros temas específicos para el cargo (cuando aplique)					

FIRMA DEL TRABAJADOR: Davinson Fandiño **FECHA:** 3 Febrero 26

Powered by CamScanner

B&P	**COMPROMISO HSEQ** **(Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad)**	**Código: GH-R-020** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Mediante la presente certifico que he recibido por parte del CONSORCIO CGSM 4, inducción en lo referente a sistema integrado de gestión incluyendo políticas, objetivos, programas, procedimientos, matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos, aspectos e impactos ambientales y riesgos y oportunidades. Por lo tanto, manifiesto lo siguiente:

1. Me comprometo a cumplir cada una de las políticas y normas de la empresa de manera estricta.
2. Me comprometo a contribuir con la organización en la mejora continua del sistema integrado de gestión, desarrollando mis funciones y responsabilidades de manera óptima, salvaguardando los bienes de la compañía, la propiedad privada y la de sus clientes.
3. En mi sitio de trabajo, durante el horario laboral y de manera obligatoria utilizaré los elementos de protección personal (EPP) suministrados por la empresa.
4. Reportar inmediatamente todo accidente, incidente o enfermedad laboral.
5. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
6. Asistir y participar activamente en los programas de formación, capacitación y entrenamiento que la empresa determine.
7. Conocer y aplicar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
8. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
9. Procuraré el autocuidado integral de mi salud y la de mis compañeros; asimismo, informaré de manera oportuna a mi superior de riesgos potenciales que puedan generar un accidente de trabajo.
10. En horas y/o áreas de trabajo, no estaré bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, no consumiré tabaco u otras sustancias psicotrópicas y estaré dispuesto a practicarme las pruebas que la empresa así lo considere en relación a estas prohibiciones.
11. Desde mi sitio de trabajo contribuiré con el medio ambiente, utilizando los puntos ecológicos, evitando contaminar las fuentes hídricas, contribuyendo con el cuidado de la flora y la fauna.

Davinson Fandiño
FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Davinson Fandiño Gutierrez

FECHA: 3 de Febrero

Powered by CamScanner

B&P	**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y ALCOHOL**	**Código: GH-R-008** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

Yo Davinson José Fandiño identificado con CC 1029912738 de pivijay, obrando en la calidad abajo indicada, en desarrollo del artículo 15 de la Ley 23 de 1981, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizó al CONSORCIO CGSM 4 para efectuar las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol etílico, marihuana, cocaína, basuco, anfetaminas (éxtasis), benzodiacepinas (pastillas), opiáceos (heroína) y sustancias similares o derivadas.

Hago constar que he informado al profesional HSE y Vigía HSE sobre los medicamentos que he consumido hoy y en los días previos a la toma de éste examen y entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, de la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo.

El diagnóstico se realiza examinando mi muestra de orina para detectar la presencia de las sustancias psicoactivas mencionadas anteriormente. Existen varias pruebas de laboratorio diseñadas para este propósito las cuales se dividen básicamente en dos tipos: **Presuntivas:** que en caso de ser positivas indican una posible presencia de las sustancias psicoactivas y **Confirmatorias.** La prueba que se realizará inicialmente será de tipo presuntivo y en caso de salir positiva o indeterminada se realiza una prueba confirmatoria.

Asimismo, autorizo me sea realizada prueba de alcohol, la cual se practica haciendo uso de un alcoholímetro como medida presuntiva de presencia de dicha sustancia en mi organismo.

Comprendo que, para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba, sin embargo, los resultados quedarán registrados en el laboratorio.

A pesar de lo anterior, la empresa no será responsable por posibles sanciones, daños o perjuicios causados a terceros, o a mi persona, derivados del uso de los resultados.

Confirmo haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen. Declaro que he dado ésta autorización voluntariamente.

CALIDAD EN LA QUE SE OTORGA ESTE CONSENTIMIENTO:

Como Trabajador: SI___ NO X

Fecha de Autorización: 3 de febrero - 2026

Firma del Trabajador: Davinson Fandiño

Powered by CamScanner

	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN – REINDUCCIÓN	Código: GH-R-006 Fecha: 01-07-2025 Versión: 2

Nombre y Apellidos: Dayinson Tandio


Cedula: 1079 912 738

Cargo: Ayudante de obra

Fecha: 3 de febrero 2026

1. ¿A qué se dedica el CONSORCIO CGSM 4?

a. Servicio de dragado hidráulico y mecánico, obras marítimas y fluviales, transporte fluvial, planeación y control de proyectos de ingeniería civil en el área de movimientos de tierra.



b. Nuestra pasión es mejorar su vida generando desarrollo social y soluciones financieras.



c. Desarrollar, producir y comercializar productos de evolución constante que brinden calidad y rentabilidad; creando un alto valor notado para accionistas, proveedores y clientes.



d. Ninguna de las anteriores.

2. Teniendo en cuenta la inducción recibida, mencione el propósito del cargo para el cual fue contratado. Realizar tareas de apoyo en la operación de la obra, mantener el área de trabajo limpia y organizada


3. ¿Qué formatos tiene que diligenciar usted desde el desempeño de su labor?

Formato de asistencia a charlas o capacitaciones
acta de entrega EPP

4. De acuerdo con la inducción, mencione los peligros a los cuales usted está expuesto mientras realiza su trabajo.

Biológico Biomecánico
Físico psicosocial
Fenomenos naturales

5. Elija 2 responsabilidades que usted tiene desde su cargo en cuanto a la Seguridad y Salud en el trabajo.



Uso de epp X



Analizar los riesgos



Asistir a capacitaciones y charlas X



Autorizar permisos de trabajo



Trabajar en equipo

Powered by CamScanner

6. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo identifique que falta grave es causa justa para dar por terminado el contrato laboral existente.

a. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido.





b. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador.

c. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos o drogas enervantes.



(d.) Todas las anteriores.

7. ¿Qué políticas posee la empresa?

a. Calidad - No Alcohol, No drogas y No fumadores – HSE
(b.) HSEQ (Calidad – Seguridad, Salud en el trabajo – Medio Ambiente), Política Seguridad acuática, Política de No alcohol no drogas, Política de Seguridad Vial.
c. Orden y Aseo – HSE – Uso de EPP
d. HSE
e. Ninguna

8. ¿De qué trata la política de alcohol y no drogas?

a. Que se puede consumir alcohol o drogas siempre y cuando no sea en el lugar de trabajo.
(b.) No se le permitirá a ninguna persona, sin importar su rango o posición, trabajar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.
c. Se puede consumir alcohol en el lugar de trabajo siempre y cuando no altere el orden y rendimiento en la ejecución de mi labor.
d. Todas las anteriores.

9. ¿La Política de Seguridad Acuática está dirigida a que personas?

a. Los trabajadores
b. Contratistas
c. Los trabajadores y contratistas
(d.) Todos los trabajadores, contratistas y visitantes.

10. ¿Qué practicas están prohibidas dentro de nuestra política de seguridad vial?

a. El uso de celulares durante la conducción.



b. Consumir o estar bajo los efectos del alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas cuando se conduce o de pasajero en vehículos al servicio de la empresa.



c. Transportar personal ajeno a la organización sin previa autorización.



d. No Colocarse el cinturón de seguridad.



(e.) Todas las anteriores

Powered by CamScanner

11. Escoja los equipos de protección personal (epp) o elementos de dotación que deba usar en su lugar de trabajo.



Uniforme completo X



Botas X



Casco X



Gafas X



Chaleco salvavidas



Guantes X



Protección auditiva X



Delantal, polainas, mangas, guantes y careta de soldador

12. ¿Cuáles programas están definidos actualmente como prevención de riesgos prioritarios en la empresa?

a. Riesgo cardiovascular, Salud Publica, Mecánico, Acustico, Conservación Auditiva, Conservación Osteomuscular

b. Caída al mismo nivel, caída desde alturas y Resbalones



c. Ninguna de las anteriores

13. Unir con una línea la figura que representa con el acto o condición insegura que representa.



Acto Inseguro



Condición Insegura

14. ¿Cuál es la función principal del COPASST?

a. Registrar los accidentes de trabajo.





b. Evaluar el desempeño de los empleados.



c. Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.



d. Registrar las actividades realizadas en el día.

e. Ninguna de las anteriores

15. En caso de accidente o incidente de trabajo usted debe:

a. No hacer nada.



b. Informar al Jefe inmediato y/o Vigía HSE para proceder a recibir atención médica.

c. Ir de manera independiente al médico.

d. Llamar a la oficina de Barranquilla a informar.

e. Ninguna de las anteriores

Powered by CamScanner

16. Escoja y relacione con el dibujo, las Brigadas de Emergencia con las que cuenta la empresa

a. Brigada de primeros auxilios

b. Brigada de Evacuación.



c. Brigada contra incendios.



(d) Todas las anteriores

17. ¿Cómo se reconocen las salidas de emergencia, rutas de evacuación

a. A través de señales de humo.
b. A través de cintas
(c) A través de la señalización ubicadas en los equipos e instalaciones
d. A través de balizas.
e. No hay forma de reconocerlas.

18. Señale con una x los equipos de control de emergencias con que cuenta la empresa en sus instalaciones y/o proyectos (pueden ser uno o varios)

a. Agua
b. Alarma de incendio
c. Extintores
d. Kit control derrame
e. Ninguno x


19. ¿Cuál es el objetivo principal del PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental?

a. Contaminar las fuentes hídricas
(b) Establecer e implementar medidas dirigidas al control ambiental del proyecto.
c. Promocionar la seguridad, salud en el trabajo en todos los niveles de la organización.
d. Ninguna de las anteriores

20. ¿Cuál es la función principal de los Puntos Ecológicos?

a. Separar los residuos en la fuente
b. Para cuidar el medio ambiente
c. Para guardar los aceites reciclables
(d) a y b son ciertas

21. Teniendo en cuenta el código de colores para la separación de los residuos sólidos, une con una línea los desechos según la caneca donde deban depositarse



22. Son prohibiciones dentro de áreas de proyecto

a. Arrojar residuos sólidos al suelo o agua
b. Quemas a cielo abierto
c. Contaminar las áreas naturales
d. Cazar y comercializar especies de fauna
(e) Todas las anteriores

23. ¿Cuál es el objetivo principal del proceso de Gestión Social?

a. Ejecutar actividades técnicas del dragado en el área del proyecto.
(b) Diseñar y ejecutar estrategias de fortalecimiento social dirigidas a las partes interesadas an el área de influencia del proyecto.
c. Realizar auditorías ambientales y sociales en las comunidades.
d. Contratar personal técnico y operativo para los proyectos.

24. ¿Qué actividad NO hace parte del Componente de Comunicación, Divulgación y Acompañamiento Social?

a. Funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad (PAC)
(b) Recolección de hojas de vida en las comunidades
c. Atención de P.Q.R.S.F. (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones)
d. Instalación de medios de comunicación como vallas informativas y buzones de sugerencias

EVALUADO POR: Yesenia Palma
CARGO: Vigia HSE
CALIFICACIÓN: 100

Powered by CamScanner

ANEXO 4.4.

ASISTENCIA A CHARLAS O CAPACITACIONES

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 03/02/2026 **Lugar:** Boxculvert #1

Expositor: Yesenth Polo Navarro **Hora Inicio:** 08:55am **Hora Final:** 09:10am

Temas: Prevención de lesiones osteomusculares **Obra:** CBS44 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Jorge Luis	1004121728	MH	Ayudante	Jorge Luis
2.	Jose Jorge	1126120263	MH	Ayud de obra	Jose Jorge
3.	Davinson Jaramillo	1079821738	MH	Ayudante de obra	Davinson Jaramillo
4.	Alberto Alvarez	85479594	MH	Ayudante de obra	Alberto Alvarez
5.	Reinaldo	759515	MH	Ayudante de obra	Reinaldo
6.	NASER Gomez	1007122917	MH	Ayudante de obr	NASER Gomez
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 6 **Firma del Expositor (es):** Yesenth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 04/02/2026	**Lugar:** Box culvert # 2	
Expositor: Yesuth polo navarro	**Hora Inicio:** 2:40pm	**Hora Final:** 2:55pm
Temas: Día mundial contra el cáncer	**Obra:** CBS44 - Caño Hondo	

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Carlos Mercado Rubio	1082628345	M H	Ayudante	Carlos Mercado
2.	Jesus Orozco	1193547966	MH	ayudante	Jesus Orozco
3.	Edilberto Alvarez	85479599	MH	ayudante	Edilberto Alvarez
4.	Yaser Gomez	1004122911	MH	ayudante	Yaser Gomez
5.	Davinson Fandiño	1079912738	MH	Ayudante	Davinson Fandiño
6.	Reinaldo	7595150	MH	Ayudante	Reinaldo
7.	Arbey Herrera	507849	MH	oficial	
8.	Daniel Rosado	8506100	MH	oficial	
9.	Eduardo Castillo	5095499	M.H.	Ayudante	
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 9	**Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 04/02/2026 **Lugar:** Boxculvert # 1

Expositor: Yesmith Polo Navarro **Hora Inicio:** 03:50pm **Hora Final:** 04:05 pm

Temas: Dia mundial contra el Cáncer **Obra:** C6544 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Jorge luis	1004121720	MH	Ayudante de obra	Jorge luis
2.	Heriberto Jose	5078921	MH	Ayudante	Heriberto
3.	Jose Jorge	1126120263	MH	Ayudante de obra	Jose Jorge
4.	Roberto carlos B	5078708	MH	Ayudante	Roberto
5.	Oliver Rapain	1082028364	MH	Ayudante	
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5 **Firma del Expositor (es):** Yesmith Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socialización			

Fecha: 05/02/2026	**Lugar:** Reforestación
Expositor: Yesmith Polo Navarro	**Hora Inicio:** 7:40am **Hora Final:** 7:55am
Temas: Procedimiento en caso de bloque de abejas africanas	**Obra:** CBS44 - Cerro Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Carlos Gomez	1083 572 789	Consorcio	Ayudante	Carlos Gomez
2.	Carlos Alvarez	1079913769	Consorcio	Ayudante	Carlos Alvarez
3.	Jesus David MANOTAS	1079914724	Consorcio	Ayudante	Jesus D MANOTAS
4.	Jose CuBallERO	1079974636	consorcio	Ayudante	JoseCuBallERO
5.	Brayan David	1004121831	Consorcio	Ayudante	Brayan
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5	**Firma del Expositor (es):** Yesmith Polo Navarro

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Seguridad vial			

Fecha: 1/08/2024 **Lugar:** Box culvert #4

Expositor: Yesuth Polo Cuevas **Hora Inicio:** 7:40am **Hora Final:** 8:55am

Temas: Prevención en caso de atropellamiento de trabajadores **Obra:** CBSM4 - Centro Hermida

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Edwin Carbello	1079916894	R.F.	Oficial	Edwin C
2.	Reinaldo Martinez P	5078217	R.F	Ay. de obra	
3.	Leonel Ternera	1079913169	RF	AYUDANTE	Leonel
4.	Miguel Leiva	1.199316578	RF	Ayudante	Miguel Leiva
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 4 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socializa ción			

Fecha: 05/02/2026 **Lugar:** Boxculvert #3

Expositor: yesuth polo navarro **Hora Inicio:** 10:20am **Hora Final:** 10:35am

Temas: Procedimiento en caso de ataque de abejas africanas **Obra:** CGSM4- Cauce Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Adolfo Bonett	5078316	RF	cafetaz	
2.	manuel Pasion	5078804	RF	obrero	manuel Pasion
3.	Jadrivan Orozco	9877310	Rf	ayudante	Jadrivan Orozco
4.	Orlando Carrillo	85479893	Rf	maestro	
5.	Germans Borja.	5078169	RF	oficial	Germ
6.	Kevin Alvarez	1004723782	Rf	ayudante de obra.	Kevin A
7.	Sebastián Anillo	17955049	R.F	Aido	
8.	Luis escorcia S	1081027248	Rf	A d o	
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 8 **Firma del Expositor (es):** yesuth Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socialización			

Fecha: 05/02/2026 **Lugar:** Box cubículo # 2

Expositor: Yesenia polo navarro **Hora Inicio:** 01:00 pm **Hora Final:** 01:15 Pm

Temas: Procedimiento en caso de atraque de abejas africanas **Obra:** CPSMU - Caño Hondo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Eduardo Castillo	1.09.3498	M H.	Ayudante	
2. Gilberto Alvarez	85479599	M H	ayudante	Gilberto Alvarez
3. Carlos Mercado Rodas	1028883345	M H	ayudante	Carlos Mercado
4. Yaser Gamez	1004129111	M H	ayudante	Yaser Gamez
5. Jesus Orozco	1195[illegible]106	M H	ayudante	Jesus Orozco
6. Alfredo Herrera	5078498	M H	Oficial	
7. Daniel Ricardo	8506100	M H	oficial	
8. Davinson Tordino	1079912738	M H	Ayudante	Davinson Tordino
9. Reinaldo	7595150	M H	Ayudante	Reinaldo
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 9 **Firma del Expositor (es):** Yesenia polo n

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica			
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa			
Otro		¿Cuál?					

Fecha: 07/02/2026	**Lugar:** Box culvert # 1
Expositor: Yesuth Polo Navarro	**Hora Inicio:** 7:30am **Hora Final:** 7:45am
Temas: Riesgo cardiovascular- Factores de riesgo	**Obra:** CBS44 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Heriberto Jose	5278921	MH	Ayudante	
2.	Rabuto carlos B	5078708	MH	Ayudante	
3.	Jose Jorge	1126120263	MH	Ayudante de obra	
4.	Jorge luis	1004121720	MH	Ayudante de obra	
5.	Oliver Lorain	1080028764	MH	Ayudante	
6.	Emanuel Rol.	73316457	MH	Maestro	
7.	Daniel Ricardo	8506100	MH	oficial	
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 7	**Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 07/02/2026 **Lugar:** Box culvert #2

Expositor: Yesmith Polo Navarro **Hora Inicio:** 8:50am **Hora Final:** 9:10am

Temas: Riesgo cardiovascular- Factores de riesgo **Obra:** CGS44 - Cano Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Carlos Mercado Rutas	1081078345	MH	Ayudante	CarlosAMercado
2.	Jesus Orozco	1193521906	MH	ayudante	Jesus Orozco
3.	Julio Hernandez	5078492	MH	Oficial	
4.	Eduardo Castillo	5.093499	M-H	Ayudante	
5.	Gilberto Alvarez	85479599	MH	Ayudante	
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5 **Firma del Expositor (es):** Yesmith Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 07/02/2026 **Lugar:** Boxculvert #3

Expositor: yesuth polo navarro **Hora Inicio:** 09:50am **Hora Final:** 10:05am

Temas: Riesgo cardiovascular - Factores de riesgo **Obra:** CGSM4 - Cañon Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Adalberto Gonzalez	5078804	RF	capataz	
2.	manuel Pasion.	5078811	RF	obrero	manuel Pasion
3.	Kevin Alvarez	1004213282	al	ayudante de obra	Kevin A
4.	Germán Borja.	5079169	RF	oficial	
5.	Sebastián Ardila	1795504?	RF	Ado	
6.	Jader Ivan Orrego	9871710	RF	ayudante	Jader Ivan O.
7.	eduardo c	1079161194	RF	oficial	
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 7 **Firma del Expositor (es):** yesuth polo n

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socializacion			

Fecha: 09/02/2026	**Lugar:** Box culvert #1
Expositor: Yesmith Polo Navarro	**Hora Inicio:** 7:12 am **Hora Final:** 7:35 am
Temas: Politica de Seguridad operacional y protección del medio ambiente	**Obra:** CGSM4 - Cañon Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Roberto carlos B	5078708	MH	Ayudante	Roberto
2.	Jorge luis	1004121720	MH	Ayudante de obra	Jorge luis
3.	Jose Jorge	1126120263	MH	Ayudante	Jose Jorge
4.	oliver Lorain	1091028364	MH	Ayudante	
5.	Heriberto Josa	5078921	MH	Ayudante	Heriberto
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes:	**Firma del Expositor (es):** Yesmith Polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socialización			

Fecha: 09/02/2026	**Lugar:** Boxculvert #2
Expositor: Yesuth polo navarro	**Hora Inicio:** **Hora Final:**
Temas: Politica de Seguridad operacional y Proteccion del medio ambiente	**Obra:** C & S 44 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Edilberto Alvarez	85479599	M H	Ayudante	Edilberto Alvarez
2.	Jesus Orozco	1193547906	M H	ayudante	Jesus Orozco
3.	Eduardo Cantillo	5.095.498	M H	Ayudante	Eduardo
4.	Yaser Gomez	1004122911	M H	Ayudante	Yaser Gomez
5.	Arturo Herrera	50789902	M H	Oficio	Arturo
6.	Carlos Mercado R	1081028345	M H	AYUDANTE	Carlos Mercado
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 6	**Firma del Expositor (es):** Yesuth polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socialización			

Fecha: 09/02/2026	**Lugar:** Box culvert #3
Expositor: yesmith polo navarro	**Hora Inicio:** **Hora Final:**
Temas: Politica de Seguridad operacional y Protección al medio ambiente	**Obra:** C6544 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Jesus D Palencia G	1005144146	U u D	topografo	Jesus D Palencia
2.	Jader Ivan Orozco S	9871310	R f	oyudante	Jader Ivan O.
3.	Manuel Pasion.	5078804	RF	Obrero	manuel pasion
4.	Adalto Borrett	5078804	RF	capataz	
5.	Orlando Carrillo	85479893	RF	Maestro	
6.	Germen Borja	5078 169	RF	oficial	Germ
7.	Kevin Alvarez	1004213782	RF	ayudante de obra	Kevin A.
8.	Sebastian Arrillo	1795569	RF	AUXILIO	Arrillo
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes:	**Firma del Expositor (es):** yesmith polo n

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 10/02/2026 **Lugar:** Reforestación

Expositor: yesuth polo navarro **Hora Inicio:** 08:00am **Hora Final:** 08:23am

Temas: Importancia del uso de las gafas de seguridad - de que me protege **Obra:** CPSMU - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Sinibaldo	1004171723	Consorcio	Marino	Sinibaldo
2.	Carlos Alvarez M	1079913749	consorcio	Marino	
3.	Cesar sanlodomingo	1079936122	Consorcio	Ayudante	Cesar Sdomingo
4.		1004121831	Consorcio	Ayudante	
5.	Carlos Gamez	1083572789	consorcio	Ayudante	carlos Gamez
6.	JoseCuBallero	1079934636	consorcio	Ayudante	JoseCuBallero
7.	JesusDavidMANOTAS	1079914724	Consorcio	Ayudante	JesusDMANOTAS
8.	Johendys Ochoa	1004798507	Consorcio	Marino	Johendys O
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 8 **Firma del Expositor (es):** yesuth polo n

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 10/02/2026 **Lugar:** Boxculvert #4

Expositor: Yesuith Polo Navarro **Hora Inicio:** 09:16am **Hora Final:** 09:31am

Temas: Importancia del uso de las gafas de Seguridad - de que me protege **Obra:** C6SU4 - Continuo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Leonel Tornera	1079913169	RF	Ayudante	Leonel
2.	Eduardo	1079[illegible]	RF	oficial	Eduardo
3.	Luis Escorcia S	1081027248	Rf	Asudante obra	[illegible]
4.	Miguel Leiva	1.193165789	RF	Ayudante	Miguel Leiva
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 4 **Firma del Expositor (es):** Yesuith Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica		
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa		
Otro		¿Cuál?				

Fecha: 10/02/2026	**Lugar:** Boxculvert #1
Expositor: yesuth polo navarro	**Hora Inicio:** 09:5am **Hora Final:** 10:05am
Temas: Importancia del uso de las gafas de seguridad- de que me protege	**Obra:** C6SU4- Coño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Heberto Jose	5078921	MH	Ayudante	
2.	Roberto Carlos Barja	50788708	MH	Ayudante	
3.	Jesus D Polanco	1100849999	UAD	Progta	
4.	Oliver Lopair	10810285364	MH	Ayudante	
5.	Cristian Gl Ortega	8880886	Panamericana	Ing Residente	
6.	Ezequiel Perez	73816407	M H-	Maestro	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 6

Firma del Expositor (es): yesuth polo n

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica			
Re Inducción		Inducción		Reunión Informativa			
Otro		¿Cuál?					

Fecha: 10/02/2026		**Lugar:** Boxculvert #3	
Expositor: Yesuth Polo Navarro		**Hora Inicio:** 1:10pm	**Hora Final:** 1:15 Pm
Temas: Importancia del uso de los gafas de seguridad - de que me protege		**Obra:** CG 544 - Caño Hondo	

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Sebastián Anillo	1795 5049	R.F	Ado	Anillo
2.	Reinaldo Martinez P	5-078217	RF	A. - O	
3.	Kevin Alvarez	1004213282	RF	ayudante de obra	Kevin A
4.	Jader Ivan Arco	9877210	RF	ayudante	Jader Ivan Arco
5.	Genaro Borja	5078164	R.F	oficial	
6.	Manuel Pasion	5078804	RF	obrero	Manuel Pasion
7.	Walter Bonett	5078310	RF	cofa loz	
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 7	**Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 11/02/2026 **Lugar:** Boxculvert #1

Expositor: yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 7:20am **Hora Final:** 7:35am

Temas: El alcohol y la conducción **Obra:** CG544 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Heriberto Jose	5079211	MH	Ayudante	Heriberto
2.	Roberto carlos Barja	5078708	MH	Ayudante	Roberto
3.	Oliver Lopain	1091028364	MH	Ayudante	
4.	Jorge luis	1004121720	MH	Ayudante de obra	Jorge luis
5.	Jose Jorge	1126120263	MH	Ayudante de obra	Jose Jorge
6.	Reina Cotes Herrera	7595150	MH	Ayudante de obra	Reinaldo
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 6 **Firma del Expositor (es):** yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 11/02/2026 **Lugar:** Boxculvert #2

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 8:00am **Hora Final:** 8:15am

Temas: El alcohol y la conducción **Obra:** C G 544 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Eduardo Orrillos	5.095.494	M.H.	Aguatero	
2.	Jesus Orozco	1193	MH	Ayudante	Jesus Orozco
3.	Edilberto Alvarez	85479599	MH	Ayudante	Edilberto Alvarez
4.	Davinson Tordoya	1079917738	MH	Ayudante	Davinson Tordoya
5.	Arturo Herrera	5078492	MH	Oficial	
6.	Yaser Judin	1004122911	MH	Ayudante	Yaser Judin
7.	Carlos Mercado R	1081028345	MH	Ayudante	Carlos Mercado
8.	Daniel Ricardo	8506100	MH	Oficial.	
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 8 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 11/02/2026 **Lugar:** Boxculvert #3

Expositor: yesuth polo navarro **Hora Inicio:** 10:15am **Hora Final:** 10:30am

Temas: El alcohol y la conducción **Obra:** CBSM4 - Coño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	[illegible]	5018310	RF	Capataz	
2.	[illegible]	5078824	RF	operador	
3.	Jadv Ivan Orozco	4871510	RF	ayudante	
4.	Sebastián Avilla	17955049	RF	Ado	
5.	Reinaldo Martinez	5078217	RF	Ado	
6.	Germán Borja.	5078169	RF	oficial	
7.	Kevin Alvarez	1004213282	RF	ayudante de obra	
8.	Miguel Leiva	1193165789	RF	Ayudante de obra	
9.	Jesus N Polanco	1001344444	UNP	tecnico	
10.	Cristian Gil Ortega	8860886	Panamerican	Ing Residente	
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 10 **Firma del Expositor (es):** yesuth polo n

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica			
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa			
Otro		¿Cuál?					

Fecha: 11/02/2026 **Lugar:** Box culvert #4

Expositor: yesmith polo navarro **Hora Inicio:** 11:45am **Hora Final:** 12:00 Pm

Temas: El alcohol y la conducción **Obra:** CBS44 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Leonel Tenera	1079913169	RF	A. de obra	Leonel
2. Luis Escorcia	1091027748	RF	A. De obra	
3. Edulfo Cantillo	1[illegible]1639[illegible]	RF	A. De obra	Edulfo
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 3 **Firma del Expositor (es):** yesmith polo n

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 14/02/2026	**Lugar:** Box culvert #3	
Expositor: Yesuth Polo Navarro	**Hora Inicio:** 7:40am	**Hora Final:** 7:55am
Temas: Consumo de alcohol- Efectos	**Obra:** C & SM4- Cano Hondo	

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Manuel Pasion	5078504	RF	obrero	Manuel Pasion
2.	Adolfo Bonett	5078310	RF	cabo laz	
3.	G. Germán Borja	5078169	RF	oficial	Germán
4.	Saulvivon Orozco	9877310	RF	ayudante	Saulvivon O.
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 4

Firma del Expositor (es): Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 14/02/2026 **Lugar:** Box culvert #4

Expositor: yesmith Polo Navarro **Hora Inicio:** 09:00am **Hora Final:** 09:15am

Temas: Consumo de Alcohol - Efectos **Obra:** C&S M4 - Cauca Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Luis Escorcia S	1081027248	RF	Ayudante de obra	
2.	Leonel Ternera	1079913169	RF	Ayudante	Leonel
3.	Reinaldo Martinez	5078217	RF	A. de obra	
4.	Sebastián Arrillo	1795504?	RF	Ayudante de obra	
5.	Kevin Alvarez	1004213282	RF	ayudante de obra.	Kevin A
6.	Eduardo E	1079911794	RF	oficial	Eduardo E
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 6 **Firma del Expositor (es):** yesmith Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 14/02/2026 **Lugar:** Reforestación

Expositor: yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 10:05am **Hora Final:** 10:10am

Temas: Consumo de alcohol- Efectos **Obra:** CGSM4- Cerro Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Sinbaldo	1004121773	Consorcio	Marino	Sinbaldo
2.	Brayan Daniel	1004112831	Consorcio	Ayudante	Brayan
3.	Johandrys Orozco F	1004298507	Consorcio	Marino	Johandrys O
4.	JoscaBallero	1079994163	consocio	Ayudante	JoscaBallero
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 4 **Firma del Expositor (es):** yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 27/02/2026	**Lugar:** Boxculvert #2
Expositor: Yesmith Polo Navarro	**Hora Inicio:** 7:40 am **Hora Final:** 7:55 am
Temas: Riesgo Público	**Obra:** CGS44 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Daniel Ricardo	8506100	MH	Oficial	
2.	Jhonatan Sfodanya	1079[illegible]	MH	Ayudante	
3.	Eduardo Castillo	5.09543[illegible]	M.H.	Ayud. 1 Tu	
4.	Laura Herrera	5078492	MH	Oficial	
5.	Oliver Rapsin	1086028364	MH	Oficial	
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5	**Firma del Expositor (es):** Yesmith Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 18/02/2026 **Lugar:** Box culvert # 3

Expositor: Yesenia Polo Navarro **Hora Inicio:** [illegible] **Hora Final:** 10:00 am

Temas: Estándar de Seguridad Vial para Ciclistas **Obra:** C6 SM4 - Cañaveralejo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Jader Ivan Orozco	9877310	RF	ayudante	Jader Ivan O.
2	Geovanna Borja	5078167	RF	Oficial	Geovanna
3	Kevin Alzate	1004213211	RF	ayudante de obra	Kevin A
4	Ronaldo Martinez	5078217	RF	A obrero	Ronaldo
5	Miguel Leiva	1.193165789	RF	Ayudante	Miguel Leiva
6	Adolfo Borrett	5078310	RF	cabeza 2	[illegible]
7	Manuel Pasion	5078304	RF	obrero	Manuel Pasion
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Número Total de Participantes: 7 **Firma del Expositor (es):** Yesenia Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica			
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa			
Otro		¿Cuál?					

Fecha: 18/02/2026 **Lugar:** Boxculvert #2

Expositor: yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 10:50am **Hora Final:** 11:05am

Temas: Estandar de Seguridad vial para a dultos **Obra:** CGSM4- camino Mondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Eduardo Contillo C.	5.095498	M. H.	Aprendiz	
2	Jesus Orozco	1193547906	M.H.	ayudante	Jesus O.
3	Jose Jorge	1126120263	MH	Ayudante	Jose Jorge
4	Daniel Ricardo	85606100	MH	oficial	
5	Jhonbanes Sanchez	1079912121	MH	ayudante	
6	Davinson Fontiro	1079912738	MH	Ayudante	Davinson Fontiro
7	Reinaldo	7595150	MH	Ayudante	Reinaldo
8	Jorgelvis	1009121720	MH	Ayudante	Jorgelvis
9	Edilberto Alvarez	85479599	MH	Ayudante	Edilberto Alvarez
10	Jesus [illegible]	[illegible]	MH	topografo	Jes. [illegible]
11	Alfonso Moreno	5078492	MH	Oficial	
12					
13					
14					

Número Total de Participantes: 11 **Firma del Expositor (es):** yesuth Polon

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica			
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa			
Otro		¿Cuál?					

Fecha: 18/02/2026 **Lugar:** Box culvert #1

Expositor: yesmith polo navarro **Hora Inicio:** 1:30pm **Hora Final:** 1:45pm

Temas: Estándar de Seguridad vial para ciclistas **Obra:** CBS44- caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	oliver Lopair	1081021344	MH	Asolvato	
2.	Roberto carlos Borgo	5078708	MH	Ayudante	Roberto
3.	Heriberto Sosa	5073944	MH	Ayudante	Heriberto
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 3 **Firma del Expositor (es):** yesmith polo n

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	○	Charla Seguridad	✕	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 18-02-2026 **Lugar:** Fincas pozo lobo y Box #4

Expositor: Jesus Herrera **Hora Inicio:** 7:20AM **Hora Final:** 7:35AM

Temas: Estandares de seguridad vial para ciclistas **Obra:** CGSM4

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Jose caballero	1079934634	consorcio	AYUDANTE	Jose caballero
2. Cesar Santodomingo	1079936122	Consorcio	Ayudante	Cesar Stodomingo
3. Brayan Daniel	1004121831	Consorcio	Ayudante	Brayan
4. Sinbaldo	1004121723	Consorcio	Marino	sinbaldo
5. Jesus David Mantas	1079914724	Consorcio	Ayudante	Jesus David Mantas
6. Edwin castillo	079916394	RF	oficial	Edwin C
7. Luis Esconcia S	1081077248	Rf	Ayudante de obra	
8. Leonel Ternera	1079913169	Rf	Ayudante de obra	Leonel
9. Sebastian Acuña	17955049	RF	A d o	Sebastian
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 9

Firma del Expositor (es): Jesus Herrera

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socializa cuso			

Fecha: 19/02/2026 **Lugar:** Box culvert #3

Expositor: yesuth polo navarro **Hora Inicio:** 8:00am **Hora Final:** 8:15am

Temas: Procedimiento en caso de atentado terrorista **Obra:** C6544 - Canio Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Reinaldo Martinez	5-078217	RF	A. de obra	
2.	Germán Borja	5078169	RF	oficial	
3.	Soda Ivon Orozco	9877310	RF	ayudante	
4.	Kevin Abrego	1004713382	RF	ayudante de obra	
5.	manuel Pinzon	5078104	RF	obrero	
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5 **Firma del Expositor (es):** yesuth polo n

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socialización			

Fecha: 19/02/2026 **Lugar:** Box culvert #2

Expositor: yesmith polo navarro **Hora Inicio:** 8:55am **Hora Final:** 09:10am

Temas: Procedimiento en caso de atentado terrorista **Obra:** CBSMH - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Davinson Fandiño	1079912736	MH	A. De obra	Davinson Fandiño
2.	Oliver Ropain	1681028364	MH	A. De Obra	
3.	Heriberto Lara	5078921	MH	A. De obra	
4.	Eduardo Cantillo	5.095430	MH	A. De obra	
5.	Jesús orozco	1193547906	MH	A. De obra	Jesus Orozco
6.	Edilberto Alvarez	85479599	MH	A. De obra	Edilberto Alvarez
7.	Reinaldo Ternera	7595150	MH	A. De obra	Reinaldo
8.	Roberto Borja	5078708	MH	A. De obra	Roberto
9.	Jonathan Santodomingo	1074912124	MH	A. De obra	
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 9

Firma del Expositor (es): yesmith polo n

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socialización			

Fecha: 19/02/2026	**Lugar:** Box culvert #1
Expositor: Yesuth Polo Navarro	**Hora Inicio:** 2:20 Pm **Hora Final:** 2:35 Pm
Temas: Procedimiento en caso de atentado terrorista	**Obra:** CGS 44 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Jorge Luis	1004121720	MH	A De obra	Jorge Luis
2. Jose Jorge	1126120263	MH	A De obra	Jose Jorge
3. Arturo Herrera	50 E8492	MH	Oficial	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 3

Firma del Expositor (es): Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socialización			

Fecha: 19-02-2026 **Lugar:** Finca pajo lobo y Box #4

Expositor: Jesus Herron **Hora Inicio:** 6:18AM **Hora Final:** 6:49PM

Temas: Procedimiento en caso de atentado terrorista **Obra:** CGSM3

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Brayan David	1004121871	Consorcio	Ayudante	Brayan
2. Sinibaldo	1004121773	consorcio	Moreno	Sinibaldo
3. Jesus David MANOTAS	1079914724	Consorcio	Ayudante	Jesus MANOTAS
4. Jose caballero	1079934636	consorcio	AYUDANTE	Jose caballero
5. Cesar santodomingo	1079936122	Consorcio	Ayudante	Cesar Stodomingo
6. Carlos Gamez	1082 577789	consorcio	Ayudante	carlos Gamez
7. Miguel Leiva	1193165789	RF	obrero	Miguel
8. Edwin castillo	1079916294	RF	oficial	edwin c
9. leonel ternera	1079913169	RF	AYUDANTE	leonel
10. Sebastian ardila	1195550 49	RF	Ayudante	Sebastian
11. Luis escorcia S	1081027798	RF	obrero	Luis
12. /	/	/	/	/
13. /	/	/	/	/
14. /	/	/	/	/

Número Total de Participantes: 11

Firma del Expositor (es): Jesus Herron

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 20/02/2026 **Lugar:** Box culvert #1

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 8:00am **Hora Final:** 8:15am

Temas: La seguridad es realmente nuestra Prioridad-Procedimiento de reporte de incidentes y accidentes **Obra:** C 65144 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Jose Jorge	1126 120263	MH	Ayudante obra	Jose Jorge
2.	Jesus Orozco	1193514906	MH	ayudante	Jesus Orozco
3	Dawson Tandiño	1079912738	MH	Ayudante	Dawson Tandiño
4.	Jorge luis	1004121720	MH	Ayudante de obra	Jorge luis
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 4 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 20/02/2026 **Lugar:** Boxculvert #2

Expositor: Yesuth Polo Novano **Hora Inicio:** 09:00am **Hora Final:** 09:15am

Temas: La seguridad es realmente nuestra prioridad Procedimiento de reporte de incidentes y accidentes **Obra:** CGSM4 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Roberto Carlos Barja	5078708	MH	Ayudante	Roberto
2.	Arturo Hoyos	50f8497	M-H	Oficial	
3.	Eduardo Cantillo	5.095498	M. H.	Ayudante	
4.	Oliver Lopain	1081028364	MH	Ayudante	
5.	Edilberto Alvarez	85479599	MH	Ayudante	Edilberto Alvarez
6.	Reinaldo	7595150	MH	Ayudate	Reinaldo
7.	Heriberto Jose	50B924	MH	Ayudante	
8.	Jhunteeo Santiago	1074912179	MH	Ayudante	
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 8 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 20/02/2026 **Lugar:** Boxculvert #

Expositor: Yesmith Polo Navarro **Hora Inicio:** 10:15am **Hora Final:** 10:30am

Temas: La seguridad es realmente nuestra prioridad Procedimiento de reporte de incidentes y accidentes **Obra:** CBSM4- Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Manuel Pasion	5076804	RF	Obrero	Manuel Pasion
2.	Adolfo Perett	5078310	RF	capataz	
3.	Jader Ivan Orejuela O	9877310	RF	ayudante	Jader Ivan O.
4.	Reinaldo Martinez	5078217	RF	Ayudante	
5.	Germas Borja	5078169	RF	oficial	Germas
6.	Kevin Alvarez	1004213287	RF	ayudante de obra	Kevin A
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 6 **Firma del Expositor (es):** Yesmith Polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 20-02-2026	**Lugar:** Box # 4 y Finca pozo 1	
Expositor: Jesus Moreno	**Hora Inicio:** 6:59 AM	**Hora Final:** 7:14 AM
Temas: La seguridad es realmente nuestra prioridad - Procedimiento de reporte de incidente y accidentes	**Obra:** CGSM 3	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Edulfo castillo	1079216394	RF.	oficial	Edulfo
2. Sebastián Avilla	17955049	RF	A d O	Sebastián
3. Leonel Ternera	1079913169	Rf	AYUDANTE	Leonel
4. Luis Escorcia Sierra	1081027298	Rf	obrero	
5. Miguel Leiva	1.193165789	R F	obrero	Miguel Leiva
6. Jesus David Manotas	1079914724	consorcio	Ayudante	Jesus David Manotas
7. Sinibaldo	1004121923	Consorcio	Marino	Sinibaldo
8. Carlos Alvarez M	1079913769	consorcio	Ayudante	
9. Carlos Gamez	1083 572 789	consorcio	AYUDANTE	Carlos Gamez
10. Jose caballero	1079934636	consorcio	AYUDANTE	Jose caballero
11. Brayan Gomez	1004121831	Consorcio	Ayudante	Brayan Gomez
12. Johendys Orozco	1004798507	Consorcio	Marino	Johendys O
13. Cesar santodomingo	1079956122	consorcio	Ayudante	Cesar Stodomingo
14. /	/	/	/	/

Número Total de Participantes: 13	**Firma del Expositor (es):** Jesus Moreno

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 23/02/2026	**Lugar:** Box culvert #1
Expositor: Yesmith Polo Navarro	**Hora Inicio:** 7:40am **Hora Final:** 7:55am
Temas: ¿Que es el cocola? ¿como se eligen sus miembros? ¿Quienes lo conforman?	**Obra:** CGSM4- Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Heriberto Jose	5078921	M H	Ayudante	Heriberto
2.	Oliver Lopez	1081028354	MH	Ayudante	
3.	Roberto carlos Barrios	5078708	MH	Ayudante	Roberto
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 3	**Firma del Expositor (es):** Yesmith Polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 23/02/2026 **Lugar:** Boxculvert #2

Expositor: yesuth polo navarro **Hora Inicio:** 9:30am **Hora Final:** 09:45am

Temas: ¿Que es el cocola? ¿Cómo se dieron sus inicios? ¿Quienes lo conforman? **Obra:** CP544 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Jorgelvis	1004121720	MH		Jorgelvis
2.	Eduardo Carrillo	3.095499	MH.	Ayudante	
3.	Edilberto Alvarez	85479599	MH	Ayudante	
4.	Aldo Hurtado	80788491	MH	Oficial	
5.	Reinaldo	75795150	MH	Ayudante	Reinaldo
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5 **Firma del Expositor (es):** yesuth polo n

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 23/02/2026 **Lugar:** Borinquen #3

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 10:50am **Hora Final:** 11:05am

Temas: ¿Que es el cocalo? ¿como se eligen sus miembros? ¿Quienes lo conforman? **Obra:** CGS44 - Coño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Luis Escorcia S	1081627248	RF	obrero	
2.	Sebastian Pallo	1795504?	RF	Aydo	
3.	Kevin Alvarez	1004217281	RF	ayudante	Kevin A
4.	Leonel Ternera	1079913169	RF	ayudante	Leonel
5.	Reinaldo Martinez P	5078217	RF	Ayudante	
6.	Eduardo C	1079916604	RF	oficial	Eduardo C
7.	Miguel Leiva	1193165789	RF	Ayudante de obra	Miguel Leiva
8.	manuel pasion	5078804	RF	Ayudante	manuel pasión
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 8 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica			
Re Inducción		Inducción		Reunión Informativa			
Otro		¿Cuál?					
Fecha: 23-02-2026				Lugar: Finca paso bobo			
Expositor: Jesus Marron				Hora Inicio: 9:11AM		Hora Final: 9:36AM	
Temas: ¿que es el COCOLAP? ¿Como se eligen sus miembros? ¿Quienes lo conforman?				Obra: CGSM4			

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Jesus David Manotas	1077914724	Consorcio	Ayudante	Jesus D MANOTAS
2.	Brayan David	1004121831	Consorcio	Ayudante	Brayan Garcia
3.	Carlos Garcia	1083 572 787	Consorcio	Ayudante	Carlos Garcia
4.	Cesar santodomingo	1079936122	Consorcio	Ayudante	Cesar stodomingo
5.	Carlos Alvarez	1079913769	consorcio	Ayudante	Carlos Alvarez
6.	Jose Cubillo	1079934636	consorcio	AYUDANTE	Jose Cubillo
7.	Sinibaldo	1004121723	Consorcio	Marino	Sinibaldo
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 7	**Firma del Expositor (es): -** Jesús Marrón

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 24/02/2026 **Lugar:** Box culvert #3

Expositor: Yesmith Polo Navarro **Hora Inicio:** 8:30am **Hora Final:** 8:45am

Temas: ¿Como prevenir lesiones en las manos? **Obra:** CGSM4-Caño Llanto

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Leonel Ternera	1079913169	RF	A. De obra	Leonel
2.	Germán Borja	5078169	RF	Oficial	Germán
3.	Kevin Alvarez	1004213782	RF	A. De obra	Kevin A
4.	manuel Pasión	5078804	RF	A. De obra	manuel Pasión
5.	Edulfo Castillo	1079916724	RF	Oficial	Edulfo C
6.	Jader Orozco	9877310	RF	A. De obra	Sadajuan Orozco
7.	Luis Escorcia	1081077248	RF	A. De obra	
8.	Reynaldo Martinez	5078217	RF	A. De obra	
9.	Miguel Leiva	1.193165784	RF	A. De obra	Miguel Leiva
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 9 **Firma del Expositor (es):** Yesmith Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 24/02/2026 **Lugar:** Boxculvert #2

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 10:50am **Hora Final:** 11:05am

Temas: ¿Cómo prevenir lesiones en las manos? **Obra:** CG544 - Cano Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Davinson Tordoya	1079912739	MH	Ayudante	Davinson Tordoya
2.	Eduardo Cartillo	5.093.498	M. H.	Ayudante	Eduardo
3.	Arturo Herrera	5078492	MH	Oficial	Arturo
4.	Edilberto Alvarez	85479599	MH	Ayudante	Edilberto
5.	Reinaldo Cabrera	7595150	MH	Ayudante	Reinaldo
6.	Jhonatan Santos	1079912129	MH	Aguatero	Jhonatan
7.	Daniel Ricardo	8506100	MH	Oficial	Daniel R.
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 7 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 24/02/2026 **Lugar:** Box culvert #1

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 1:20 pm **Hora Final:** 1:45 pm

Temas: ¿Cómo prevenir lesiones en las manos? **Obra:** CBSM4 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Heriberto Lara	5078921	MH	Ayudante	Heriberto
2.	Jesus orozco	1193547906	MH	ayudante	Jesus O
3.	Oliver Ropain	1081033334	MH	Ayudante	Oliver
4.	Jorge Gomez	1004411210	MH	Ayudante	Jorge Luis
5.	Jose Jorge	1126120263	MH	ayudante	Jose Jorge
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 24-02-2026	**Lugar:** Box #5 y Frente la esperanza	
Expositor: Jesus Hurtado	**Hora Inicio:** 7:30 am	**Hora Final:** 7:33 am
Temas: Como prevenir lesiones en humedos	**Obra:** CGSHY	

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Pedro wilches gonzalez	1081028028	consorcio	Marino	Pedro wilches
2.	Carlos alfredo barrera	1010050377	Consorcio	Marino	Carlos Barrera
3.	Jesus david manotas	1079914724	Consorcio	Ayudante	Jesus manotas
4.	Cesar santodomingo	1079936122	consorcio	Ayudante	Cesar stodomingo
5.	Carlos Gamez	1083 572 789	consorcio	Ayudante	carlos Gamez
6.	Josecaballero	1079934636	consorcio	Ayudante	Josecaballero
7.	Brayan amid	1004121831	Consorcio	Ayudante	Brayan Amid
8.	Sinibaldo	1004121723	Consorcio	Marino	Sinibaldo
9.	/	/	/	/	/
10.	/	/	/	/	/
11.	/	/	/	/	/
12.	/	/	/	/	/
13.	/	/	/	/	/
14.	/	/	/	/	/

Número Total de Participantes: 8	**Firma del Expositor (es):** Jesús Hurtado

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 15/02/2026 **Lugar:** Box culvert #7

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 7:15am **Hora Final:** 7:30am

Temas: Estándar de Seguridad vial para peatones **Obra:** CBS44 - Canto Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Roberto Carlos B	5078708	MH	Ayudante	Roberto
2.	Jose Jorge	1126120263	MH	Ayudant	Jose Jorge
3.	Heriberto Jose	5078921	MH	Ayudante	Heriberto
4.	Arturo Herrera	5078962	MH	Oficial	Arturo
5.	Jorselis	1004171720	MH	Ayudante	Jorselis
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 25/02/2026 Lugar: Boxculvert #2

Expositor: Yesnith polo navarro Hora Inicio: 09:20am Hora Final: 09:35am

Temas: Estándar de seguridad vial para peatones Obra: C6S44 - Coiín Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Reinaldo	7595156	MH	Ayudante	Reinaldo
2.	Edaida Cortillo	5.095.188	M.H.	Aguda TC	
3.	Davinson Faadino	1079912338	MH	Ayudante	Davinson Faadino
4.	Edilberto Alvarez	85479599	MH	Ayudante	
5.	Jose Orozco	1193547908	MH	Ayudante	Jose Orozco
6.	Jhon Juan Sanchez	1079912979	MH	Ayudante	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 6 Firma del Expositor (es): Yesnith polo n

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 25/02/2026 **Lugar:** Box culvert #3

Expositor: yesmith polo novoa **Hora Inicio:** 10:15am **Hora Final:** 10:35am

Temas: Estándar de Seguridad Vial para peatones **Obra:** CGSM4 - Cauca Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Reinoldo Martinez P	5078217	Rf	A. de obra	
2.	Jose Escorcia S	1091027248	Rf	Ayudante de obra	
3.	Miguel Leivoc	1193165789	Rf	Ayudante de obra	Miguel Leivoc
4.	Eduyo e	1079916594	Rf.	Oficial	eduyo e
5.	Kevin Alvarez	1004213287	Rf	ayudante de obra	Kevin A
6.	Jader Ivan Orozco	9874740	Rf	ayudante	Jader Ivan Orozco
7.	Germán Borja	5078169	Rf	oficial	
8.	Leonel ternera	1079913169	Rf	ayudante	Leonel
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 8 **Firma del Expositor (es):** yesmith polo n

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica		
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa		
Otro		¿Cuál?				

Fecha: 25-02-2026	**Lugar:** Box #5	
Expositor: Jesus Herrera	**Hora Inicio:** 7:03 PM	**Hora Final:** 7:28 AM
Temas: Estandares de seguridad vial para peatones	**Obra:** CGSH4	

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Carlos alfredo Correa	1010080507	Consorcio	Marino	
2.	Pedro Wilches	1081078078	Consorcio	Marino	Pedro wilches
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 2	**Firma del Expositor (es):** Jesus Herrera

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 27/02/2026	**Lugar:** Box culvert #1
Expositor: Yesuth Polo Navarro	**Hora Inicio:** 7:20am **Hora Final:** 7:35am
Temas: Buen uso de la dotación	**Obra:** CBSM4 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Heriberto Jose	5078921	MH	Ayudante	Heriberto
2.	Olwin Orain	1061021764	MH	Ayudante	
3.	Eduardo Castillo	5.095.484	M.H.	Agrotec	
4.	Jesus Orozco	1193547906	MH	Ayudante	Jesus Orozco
5.	Daniel Ricardo	8506100	MH	oficial	
6.	Jose Jorge	1126120263	MH	Agrotec	Jose Jorge
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 6

Firma del Expositor (es): Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 27/02/2026 **Lugar:** Boxculvert #3

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 09:50am **Hora Final:** 10:050m

Temas: Buen uso de la dotación **Obra:** CGSM4 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Yesuth Alvarez	1007213279	RF	ayudante de obra	Yesuth A
2.	Miguel Leivo	1.193165789	RF	Ayudante	Miguel Leivo
3.	Leonel ternera	1079913169	Rf	ayudante	Leonel
4.	Reinaldo Martinez	5078217	Rf	A. de obra	
5.	Germán Borja	5078769	RF	oficial	Germ
6.	Manuel Pasión	5078804	RF	A. De obra	Manuel Pasion
7.	Luis Escorcia S	1081027278	Rf	A de obra	
8.	Jader Ivan Orozco O.	9877310	Rf	ayudante	Jader Ivan O.
9.	Orlando Carrillo	85477893	RF	Maestro de obra	
10.	Eduardo Cantillo	1079976394	RF	Oficial	Eduardo Cantillo
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 10 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 27/02/2026 **Lugar:** Box culvert #2

Expositor: Yesmitt Polo Navarro **Hora Inicio:** 11:00am **Hora Final:** 11:15am

Temas: Buen uso de la dotacion **Obra:** C 6514- Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Gustavo Santana	1079912121	MH	Gestor	
2.	Edilberto Alvarez	85479599	MH	Ayudante	
3.	Reinaldo Serpa	7593150	MH	AYUDANTE	
4.	Arturo Herrera	50 7892	MH	Oficial	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 4 **Firma del Expositor (es):** Yesmitt Polo N

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad	X	Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 27-02-2026	**Lugar:** Box #5 y Area comedor	
Expositor: Jesus Moreno	**Hora Inicio:** 6:41am	**Hora Final:** 6:56am
Temas: Bienvenida de la actividad	**Obra:** CGSM4	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Carlos Alfredo Barrera	1010080507	Consorcio	Marino	
2. Pedro wilches	1081028008	consorcio	Marino	Pedro wilches
3. Carlos Alvarez M	1079913769	consorcio	Ayudante	
4. carlos Garcez	1083 572 784	consorcio	Ayudante	carlos Garcez
5. Josecaballero	1079934639	consorcio	Ayudante	Josecaballero
6. Jesus David MANOTAS	1079914724	Consorcio	Ayudante	Jesus D MANOTAS
7. Sinibaldo	1004121723	Consorcio	Marino	Sinibaldo
8. Brayan David	1004121831	consorcio	Ayudante	Brayan Cruz
9. /	/	/	/	/
10. /	/	/	/	/
11. /	/	/	/	/
12. /	/	/	/	/
13. /	/	/	/	/
14. /	/	/	/	/

Número Total de Participantes: 9	**Firma del Expositor (es):** Jesus Moreno

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socialización			

Fecha: 28/02/2026	**Lugar:** Boxculvert #2	
Expositor: Yesuth Polo Navarro	**Hora Inicio:** 7:40am	**Hora Final:** 7:55 am
Temas: Política de control de alcohol, drogas y tabaco	**Obra:** C 6544- Costa Hondo	

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Davinson Fandiño	1079912738	MH	Ayudante	Davinson Fandiño
2.	Arturo Herrera	5078492	MH	Oficial	
3.	Eduardo Curtido	5.095499	M.H	Ayudante	
4.	Roberto Carlos Barga	5078208	MH	Ayudante	Roberto
	Herbert Jose	5078971	MH	Ayudante	Herbert
6.	Oliver Pertuz	1051028354	MH	Ayudante	
7.	Jhersson Santander	1079912179	MH	ayudante	
8.	Jesus Orozco	1193542906	MH	ayudante	Jesus Orozco
9.	Edilberto Alvarez	85479599	MH	ayudante	
10.	Reinaldo Ternera	7595150	MH	ayudante	Reinaldo
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 10	**Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socialización			

Fecha: 28/02/2026 | Lugar: Box culvert #3

Expositor: Yesuth Polo Navarro | Hora Inicio: 08:30am | Hora Final: 09:45am

Temas: Política de control de alcohol, drogas y tabaco | Obra: CBS114 - Canto Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1	Jader Ivan Orozco A	9877310	RF	ayudante	Jader Ivan Orozco
2	Miguel Leiva	1.193165789	RF	A de obra	Miguel Leiva
3	Luis Escorcia S	1081027248	Rf	A de obra	
4	Leonel ternera	1079913169	Rf	Ayudante	Leonel
5	Alvaro Carrillo	85479893	Rf	maestro	
6	Eduardo Cantillo	1079916241	Rf.	oficial	
7	Germán Borja	5078169	RF	oficial	Germán
8	Kevin Alvarez	1004213287	Rf	ayudante	Kevin A
9	Reinaldo Martinez P	5078219	Rf	Ayudante	
10	Manuel Pasión	5078214	Rf	Ayudante de chofer	Manuel Pasión
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 10 | Firma del Expositor (es): Yesuth Polo

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento		Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro	X	¿Cuál? Socialización			

Fecha: 28-02-2026	**Lugar:** Box #5
Expositor: Jesus Herron	**Hora Inicio:** 6:47pm **Hora Final:** 7:15pm
Temas: Politica de control de alcohol y tabaco	**Obra:** CGSH4

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Pedro wilches G	1081078078	Consorcio	Maestro	Pedro wilches
2. Carlos Alfredo Barrera	1010280097	Consorcio	Maestro	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 2	**Firma del Expositor (es):** Jesus Herron

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDO	FELIX VALENCIA PERET
CARGO:	OPERADOR
FECHA:	24.02.2026
TEMA:	Prevención de lesiones en las manos

Marca con O la respuesta correcta o incorrecta

1: ¿Cuál de las siguientes es una causa frecuente de lesiones en las manos?

A) Cortes con herramientas o vidrio
B) Golpes o atrapamientos con maquinaria
C) Movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
✓ D) Todas las anteriores

2: ¿Qué medida es más efectiva para proteger las manos al manipular productos químicos?

✓ A) Usar guantes adecuados para químicos
B) Usar guantes de tela comunes
C) Evitar el contacto con los productos sin protección
D) Todas las anteriores

3: ¿Cuál de estas prácticas ayuda a prevenir lesiones musculares y tendinitis?

✓ A) Mantener buena postura, hacer pausas y estiramientos
B) Trabajar sin pausas para terminar antes
C) Ajustar la velocidad de trabajo según la prisa del día
D) Todas las anteriores

4: Antes de usar herramientas o maquinaria, ¿qué debemos hacer?

✓ A) Revisarlas, asegurarse de que estén en buen estado y usar protección adecuada
B) Usarlas inmediatamente siguiendo la experiencia personal
C) Confiar en que la herramienta está segura sin inspección
D) Todas las anteriores

EVALUADO POR Jesus Moreno **CARGO:** Vigia HSEQ

CALIFICACION 4/4

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDO	Pedro Wilches Gonzalez
CARGO:	Marino
FECHA:	24 / 2 / 2026
TEMA:	Prevención de lesiones en las manos

Marca con O la respuesta correcta o incorrecta

1: ¿Cuál de las siguientes es una causa frecuente de lesiones en las manos?

A) Cortes con herramientas o vidrio
B) Golpes o atrapamientos con maquinaria
C) Movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
✓ X) Todas las anteriores

2: ¿Qué medida es más efectiva para proteger las manos al manipular productos químicos?

✓ X) Usar guantes adecuados para químicos
B) Usar guantes de tela comunes
C) Evitar el contacto con los productos sin protección
D) Todas las anteriores

3: ¿Cuál de estas prácticas ayuda a prevenir lesiones musculares y tendinitis?

✓ X) Mantener buena postura, hacer pausas y estiramientos
B) Trabajar sin pausas para terminar antes
C) Ajustar la velocidad de trabajo según la prisa del día
D) Todas las anteriores

4: Antes de usar herramientas o maquinaria, ¿qué debemos hacer?

✓ X) Revisarlas, asegurarse de que estén en buen estado y usar protección adecuada
B) Usarlas inmediatamente siguiendo la experiencia personal
C) Confiar en que la herramienta está segura sin inspección
D) Todas las anteriores

EVALUADO POR Jesus Moreno **CARGO:** Vigia HSEQ

CALIFICACION 4/4

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDO	Carlos alfredo Barrera Martinez
CARGO:	Marino
FECHA:	24-02-2026
TEMA:	Prevención de lesiones en las manos

Marca con O la respuesta correcta o incorrecta

1: ¿Cuál de las siguientes es una causa frecuente de lesiones en las manos?

A) Cortes con herramientas o vidrio
B) Golpes o atrapamientos con maquinaria
C) Movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
D) Todas las anteriores

2: ¿Qué medida es más efectiva para proteger las manos al manipular productos químicos?

A) Usar guantes adecuados para químicos
B) Usar guantes de tela comunes
C) Evitar el contacto con los productos sin protección
D) Todas las anteriores

3: ¿Cuál de estas prácticas ayuda a prevenir lesiones musculares y tendinitis?

A) Mantener buena postura, hacer pausas y estiramientos
B) Trabajar sin pausas para terminar antes
C) Ajustar la velocidad de trabajo según la prisa del día
D) Todas las anteriores

4: Antes de usar herramientas o maquinaria, ¿qué debemos hacer?

A) Revisarlas, asegurarse de que estén en buen estado y usar protección adecuada
B) Usarlas inmediatamente siguiendo la experiencia personal
C) Confiar en que la herramienta está segura sin inspección
D) Todas las anteriores

EVALUADO POR Jesús Ramón **CARGO:** Vigia HSEQ

CALIFICACION 4/4

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO	
NOMBRE Y APELLIDO	Jesus D Palencia
CARGO:	topografo
FECHA:	24 - feb - 2026.
TEMA:	Prevención de lesiones en las manos

Marca con O la respuesta correcta o incorrecta

1: ¿Cuál de las siguientes es una causa frecuente de lesiones en las manos?

A) Cortes con herramientas o vidrio
B) Golpes o atrapamientos con maquinaria
C) Movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
✓ D) Todas las anteriores

2: ¿Qué medida es más efectiva para proteger las manos al manipular productos químicos?

✓ A) Usar guantes adecuados para químicos
B) Usar guantes de tela comunes
C) Evitar el contacto con los productos sin protección
D) Todas las anteriores

3: ¿Cuál de estas prácticas ayuda a prevenir lesiones musculares y tendinitis?

✓ A) Mantener buena postura, hacer pausas y estiramientos
B) Trabajar sin pausas para terminar antes
C) Ajustar la velocidad de trabajo según la prisa del día
D) Todas las anteriores

4: Antes de usar herramientas o maquinaria, ¿qué debemos hacer?

✓ A) Revisarlas, asegurarse de que estén en buen estado y usar protección adecuada
B) Usarlas inmediatamente siguiendo la experiencia personal
C) Confiar en que la herramienta está segura sin inspección
D) Todas las anteriores

EVALUADO POR Jesús Momón CARGO: Vigia HSEQ

CALIFICACION 4/4

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDO	Jesus David MANOTAS G.
CARGO:	Ayudante
FECHA:	24 02 2026
TEMA:	Prevención de lesiones en las manos

Marca con O la respuesta correcta o incorrecta

1: ¿Cuál de las siguientes es una causa frecuente de lesiones en las manos?

A) Cortes con herramientas o vidrio
B) Golpes o atrapamientos con maquinaria
C) Movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
D) Todas las anteriores

2: ¿Qué medida es más efectiva para proteger las manos al manipular productos químicos?

A) Usar guantes adecuados para químicos
B) Usar guantes de tela comunes
C) Evitar el contacto con los productos sin protección
D) Todas las anteriores

3: ¿Cuál de estas prácticas ayuda a prevenir lesiones musculares y tendinitis?

A) Mantener buena postura, hacer pausas y estiramientos
B) Trabajar sin pausas para terminar antes
C) Ajustar la velocidad de trabajo según la prisa del día
D) Todas las anteriores

4: Antes de usar herramientas o maquinaria, ¿qué debemos hacer?

A) Revisarlas, asegurarse de que estén en buen estado y usar protección adecuada
B) Usarlas inmediatamente siguiendo la experiencia personal
C) Confiar en que la herramienta está segura sin inspección
D) Todas las anteriores

EVALUADO POR Jesús Morron **CARGO:** Virgin HSEQ

CALIFICACION 4/4

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDO	Cesar A. Santodomingo
CARGO:	Ayudante
FECHA:	24-02-2026
TEMA:	Prevención de lesiones en las manos

Marca con O la respuesta correcta o incorrecta

1: ¿Cuál de las siguientes es una causa frecuente de lesiones en las manos?

A) Cortes con herramientas o vidrio
B) Golpes o atrapamientos con maquinaria
C) Movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
✓ X) Todas las anteriores

2: ¿Qué medida es más efectiva para proteger las manos al manipular productos químicos?

✓ X) Usar guantes adecuados para químicos
B) Usar guantes de tela comunes
C) Evitar el contacto con los productos sin protección
D) Todas las anteriores

3: ¿Cuál de estas prácticas ayuda a prevenir lesiones musculares y tendinitis?

✓ X) Mantener buena postura, hacer pausas y estiramientos
B) Trabajar sin pausas para terminar antes
C) Ajustar la velocidad de trabajo según la prisa del día
D) Todas las anteriores

4: Antes de usar herramientas o maquinaria, ¿qué debemos hacer?

✓ X) Revisarlas, asegurarse de que estén en buen estado y usar protección adecuada
B) Usarlas inmediatamente siguiendo la experiencia personal
C) Confiar en que la herramienta está segura sin inspección
D) Todas las anteriores

EVALUADO POR Jesús Moreno **CARGO:** Vegia HSEQ

CALIFICACION 4/4

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDO	Carlos Gamez Santodomingo
CARGO:	Ayudante
FECHA:	24 oct 2026
TEMA:	Prevención de lesiones en las manos

Marca con O la respuesta correcta o incorrecta

1: ¿Cuál de las siguientes es una causa frecuente de lesiones en las manos?

A) Cortes con herramientas o vidrio
B) Golpes o atrapamientos con maquinaria
C) Movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
D) Todas las anteriores

2: ¿Qué medida es más efectiva para proteger las manos al manipular productos químicos?

A) Usar guantes adecuados para químicos
B) Usar guantes de tela comunes
C) Evitar el contacto con los productos sin protección
D) Todas las anteriores

3: ¿Cuál de estas prácticas ayuda a prevenir lesiones musculares y tendinitis?

A) Mantener buena postura, hacer pausas y estiramientos
B) Trabajar sin pausas para terminar antes
C) Ajustar la velocidad de trabajo según la prisa del día
D) Todas las anteriores

4: Antes de usar herramientas o maquinaria, ¿qué debemos hacer?

A) Revisarlas, asegurarse de que estén en buen estado y usar protección adecuada
B) Usarlas inmediatamente siguiendo la experiencia personal
C) Confiar en que la herramienta está segura sin inspección
D) Todas las anteriores

EVALUADO POR Jesus Morron **CARGO:** Vigia HSEQ

CALIFICACION 4 & 4

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDO	Jesus Caballero
CARGO:	Ayudante
FECHA:	2426
TEMA:	Prevención de lesiones en las manos

Marca con O la respuesta correcta o incorrecta

1: ¿Cuál de las siguientes es una causa frecuente de lesiones en las manos?

A) Cortes con herramientas o vidrio
B) Golpes o atrapamientos con maquinaria
C) Movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
✓ D) Todas las anteriores

2: ¿Qué medida es más efectiva para proteger las manos al manipular productos químicos?

✓ A) Usar guantes adecuados para químicos
B) Usar guantes de tela comunes
C) Evitar el contacto con los productos sin protección
D) Todas las anteriores

3: ¿Cuál de estas prácticas ayuda a prevenir lesiones musculares y tendinitis?

✓ A) Mantener buena postura, hacer pausas y estiramientos
B) Trabajar sin pausas para terminar antes
C) Ajustar la velocidad de trabajo según la prisa del día
D) Todas las anteriores

4: Antes de usar herramientas o maquinaria, ¿qué debemos hacer?

✓ A) Revisarlas, asegurarse de que estén en buen estado y usar protección adecuada
B) Usarlas inmediatamente siguiendo la experiencia personal
C) Confiar en que la herramienta está segura sin inspección
D) Todas las anteriores

EVALUADO POR Jesús Marron **CARGO:** Vigia HSEQ

CALIFICACION 4/4

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDO	Brayan David Lara Ramirez
CARGO:	Ayudante de obra
FECHA:	24-02-26
TEMA:	Prevención de lesiones en las manos

Marca con O la respuesta correcta o incorrecta

1: ¿Cuál de las siguientes es una causa frecuente de lesiones en las manos?

A) Cortes con herramientas o vidrio
B) Golpes o atrapamientos con maquinaria
C) Movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
D) Todas las anteriores

2: ¿Qué medida es más efectiva para proteger las manos al manipular productos químicos?

A) Usar guantes adecuados para químicos
B) Usar guantes de tela comunes
C) Evitar el contacto con los productos sin protección
D) Todas las anteriores

3: ¿Cuál de estas prácticas ayuda a prevenir lesiones musculares y tendinitis?

A) Mantener buena postura, hacer pausas y estiramientos
B) Trabajar sin pausas para terminar antes
C) Ajustar la velocidad de trabajo según la prisa del día
D) Todas las anteriores

4: Antes de usar herramientas o maquinaria, ¿qué debemos hacer?

A) Revisarlas, asegurarse de que estén en buen estado y usar protección adecuada
B) Usarlas inmediatamente siguiendo la experiencia personal
C) Confiar en que la herramienta está segura sin inspección
D) Todas las anteriores

EVALUADO POR Jesús Ramón **CARGO:** Vigia HSEQ

CALIFICACION 4/4

Powered by CamScanner

EVALUACION DE ENTENDIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDO	Stvibaldo
CARGO:	Marino
FECHA:	24-02-2020
TEMA:	Prevención de lesiones en las manos

Marca con O la respuesta correcta o incorrecta

1: ¿Cuál de las siguientes es una causa frecuente de lesiones en las manos?

A) Cortes con herramientas o vidrio
B) Golpes o atrapamientos con maquinaria
C) Movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
D) Todas las anteriores

2: ¿Qué medida es más efectiva para proteger las manos al manipular productos químicos?

A) Usar guantes adecuados para químicos
B) Usar guantes de tela comunes
C) Evitar el contacto con los productos sin protección
D) Todas las anteriores

3: ¿Cuál de estas prácticas ayuda a prevenir lesiones musculares y tendinitis?

A) Mantener buena postura, hacer pausas y estiramientos
B) Trabajar sin pausas para terminar antes
C) Ajustar la velocidad de trabajo según la prisa del día
D) Todas las anteriores

4: Antes de usar herramientas o maquinaria, ¿qué debemos hacer?

A) Revisarlas, asegurarse de que estén en buen estado y usar protección adecuada
B) Usarlas inmediatamente siguiendo la experiencia personal
C) Confiar en que la herramienta está segura sin inspección
D) Todas las anteriores

EVALUADO POR Jesus Human **CARGO:** Vigia HSEQ

CALIFICACION 4/4

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

FECHA:	12/02/2026
NOMBRE DEL OBSERVADOR:	Yesmith Polo Navarro
TIPO DE EMERGENCIA	Ataque de abejas africanas
PROYECTO:	CGSM4 - Caño Honda
EMBARCACION:	

PARTICIPANTES*

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Jesus Manotas	Consorcio	Jesus Manotas
Johandys Orozco	Consorcio	Johandys Orozco
Cesar santodomingo	consorcio	Cesar Stodomingo
Sinbaldo	Consorcio	Sinbaldo
Jose caballero	consorcio	Jose caballero

- En caso de que haya más participantes, regístrelos en el GH-R-007 Formato de asistencia a charlas o capacitaciones

Powered by CamScanner

	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
EVALUACION GENERAL				
¿Se tomaron las acciones iniciales pertinentes por quien detecto la emergencia?	✓			
¿Los participantes conocían sus roles y responsabilidades para la emergencia?	✓			
¿Se activaron los planes y procedimientos relacionados?	✓			
¿El ejercicio se realizó en forma ordenada y disciplinada?	✓			
¿Asistió todo el personal?		✓		
¿Fallo algún equipo o sistema?		✓		
EVALUACIÓN DE EVACUACIÓN				
¿Se dio la voz de alerta (se realizaron maniobras de resguardo)?	✓			
¿Se dio la voz de alarma?	✓			
¿La alerta y alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas?			✓	
¿Todos los empleados y visitantes acataron la señal de alerta y alarma?			✓	
¿Se tiene una adecuada señalización de las rutas de evacuación?			✓	
¿Las rutas de evacuación fueron suficientes para la evacuación de todos los participantes?			✓	
¿Se realizó la evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes?	✓			

Powered by CamScanner

	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
¿Se identificó (aron) al (los) Líder y/o Coordinador (es) de evacuación?			✓	
¿El (los) Líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó (aron) con claridad sus funciones?			✓	
¿El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verifico o vatido que el personal a su cargo evacuo su área?			✓	
¿Se contó con participación total de las áreas y partes interesadas para la realización del ejercicio?		✓		
EVALUACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO				
¿Hubo organización en el o los puntos de encuentro?	✓			
¿Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas las medidas de seguridad para los participantes que evacuaron?	✓			
¿Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y visitantes que evacuaron?	✓			
¿Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron novedades?	✓			
¿El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de reingreso?	✓			
¿Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de encuentro?	✓			
¿Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad?	✓			

Powered by CamScanner

CONTROL DE TIEMPOS

Señor observador: Registre cronológicamente todas las actividades que se realicen **durante el simulacro**, indicando la hora

ACTIVIDAD	HORA	OBSERVACIONES
Activación de la alerta		
Activación de la alarma de emergencia		
Salida de la primera persona		
Salida de la última persona		
Llegada de la primera persona al punto de encuentro		
Llegada de la última persona al punto de encuentro		
Retorno a las instalaciones		

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 12/02/2026 **Lugar:** Refuerzo de cim

Expositor: yesuth polo navarro **Hora Inicio:** 7:32am **Hora Final:** 7:47am

Temas: Evaso de ataque de abejas africanas **Obra:** CBSU4 - Cam Heredia

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Jesus Manotas	1079947424	Consorcio	Ayudante	Jesus Manota
2.	Johandys Orozco T	1009218504	Consorcio	Marino	Johandys O
3.	Cesar Santodomingo	1079936122	Consorcio	Ayudante	Cesar Stodomingo
4.	Balboa	1004117728	Consorcio	Marino	Balboa
5.	JOSE CABALLERO	1079934664	consorcio	AYUDANTE	Jose Caballero
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5 **Firma del Expositor (es):** yesuth polo n

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

FECHA:	12/02/2026
NOMBRE DEL OBSERVADOR:	Yesmith Polo Navarro
TIPO DE EMERGENCIA	Ataque de abejas africanas
PROYECTO:	CGSM - Caño Mocho
EMBARCACION:	

PARTICIPANTES*

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Luis Escorcia	RF	
Leonel Ternera	RF	Leonel
Miguel Leiva	RF	Miguel Leiva
Reinaldo Martinez P	RF	
Sebastián Castillo	RF	Castillo
Jader Ivan Orozco	RF	Jader Ivan Orozco O
Kevin Alvarez	RF	Kevin
Edwin Lopez	RF	Edwin Lopez C

- En caso de que haya más participantes, regístrelos en el GH-R-007 Formato de asistencia a charlas o capacitaciones

Powered by CamScanner

	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
EVALUACION GENERAL				
¿Se tomaron las acciones iniciales pertinentes por quien detecto la emergencia?	✓			
¿Los participantes conocían sus roles y responsabilidades para la emergencia?	✓			
¿Se activaron los planes y procedimientos relacionados?	✓			
¿El ejercicio se realizó en forma ordenada y disciplinada?	✓			
¿Asistió todo el personal?		✓		
¿Fallo algún equipo o sistema?		✓		
EVALUACIÓN DE EVACUACIÓN				
¿Se dio la voz de alerta (se realizaron maniobras de resguardo)?	✓			
¿Se dio la voz de alarma?	✓			
¿La alerta y alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas?			✓	
¿Todos los empleados y visitantes acataron la señal de alerta y alarma?			✓	
¿Se tiene una adecuada señalización de las rutas de evacuación?			✓	
¿Las rutas de evacuación fueron suficientes para la evacuación de todos los participantes?			✓	
¿Se realizó la evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes?	✓			

Powered by CamScanner

	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
¿Se identificó (aron) al (los) Líder y/o Coordinador (es) de evacuación?			✓	
¿El (los) Líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó (aron) con claridad sus funciones?			✓	
¿El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verifico o valido que el personal a su cargo evacuo su área?			✓	
¿Se contó con participación total de las áreas y partes interesadas para la realización del ejercicio?		✓		
EVALUACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO				
¿Hubo organización en el o los puntos de encuentro?	✓			
¿Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas las medidas de seguridad para los participantes que evacuaron?	✓			
¿Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y visitantes que evacuaron?	✓			
¿Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron novedades?	✓			
¿El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de reingreso?	✓			
¿Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de encuentro?	✓			
¿Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad?	✓			

Powered by CamScanner

CONTROL DE TIEMPOS

Señor observador: Registre cronológicamente todas las actividades que se realicen **durante el simulacro**, indicando la hora

ACTIVIDAD	HORA	OBSERVACIONES
Activación de la alerta		
Activación de la alarma de emergencia		
Salida de la primera persona		
Salida de la última persona		
Llegada de la primera persona al punto de encuentro		
Llegada de la última persona al punto de encuentro		
Retorno a las instalaciones		

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 12/01/2026 **Lugar:** Boxculvert #4

Expositor: yesuth polo navarro **Hora Inicio:** 09:35am **Hora Final:** 09:51am

Temas: En caso de ataque de abejas africanas **Obra:** CBS44- Coño Hermoso

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Luis Escorcia	1081027298	RF	ayudante de obra	
2.	Leonel Ternera	1079913159	RF	Ayudante	Leonel
3.	Miguel Leiva	1.193165789	RF		Miguel Leiva
4.	Reinaldo Martinez P	5078217	RF	A. de obra.	
5.	Sebastián Acuña	17955049	RF	A d O	
6.	Jadryan Charco	9874310	RF	ayudante	Jadryan C.
7.	Kevin Alvarez	1004213202	RF	ayudante de obra	Kevin A
8.	Eduardo	1079916290	RF	oficial	Eduardo C
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 8 **Firma del Expositor (es):** yesuth polo n

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

FECHA:	26/02/2026
NOMBRE DEL OBSERVADOR:	yesuth polo navarro
TIPO DE EMERGENCIA	En caso de atentado terrorista
PROYECTO:	CB544- Caño Honda
EMBARCACION:	N/A

PARTICIPANTES*

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Arturo Herrera	MH	
Roberto carlos B	MH	
Eduardo Castillo	MH	
Jorge luis	MH	
Jose Jorge	MH	

- En caso de que haya más participantes, regístrelos en el GH-R-007 Formato de asistencia a charlas o capacitaciones

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
EVALUACION GENERAL				
¿Se tomaron las acciones iniciales pertinentes por quien detecto la emergencia?	✓			
¿Los participantes conocían sus roles y responsabilidades para la emergencia?	✓			
¿Se activaron los planes y procedimientos relacionados?	✓			
¿El ejercicio se realizó en forma ordenada y disciplinada?	✓			
¿Asistió todo el personal?		✓		
¿Fallo algún equipo o sistema?		✓		
EVALUACIÓN DE EVACUACIÓN				
¿Se dio la voz de alerta (se realizaron maniobras de resguardo)?	✓			
¿Se dio la voz de alarma?	✓			
¿La alerta y alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas?			✓	
¿Todos los empleados y visitantes acataron la señal de alerta y alarma?	✓			
¿Se tiene una adecuada señalización de las rutas de evacuación?		✓		Señalizacion deficiente
¿Las rutas de evacuación fueron suficientes para la evacuación de todos los participantes?	✓			
¿Se realizó la evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes?	✓			

Powered by CamScanner

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
¿Se identificó (aron) al (los) Líder y/o Coordinador (es) de evacuación?	✓			
¿El (los) Líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó (aron) con claridad sus funciones?	✓			
¿El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verifico o valido que el personal a su cargo evacuo su área?	✓			
¿Se contó con participación total de las áreas y partes interesadas para la realización del ejercicio?		✓		
EVALUACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO				
¿Hubo organización en el o los puntos de encuentro?	✓			
¿Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas las medidas de seguridad para los participantes que evacuaron?	✓			
¿Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y visitantes que evacuaron?	✓			
¿Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron novedades?	✓			
¿El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de reingreso?	✓			
¿Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de encuentro?	✓			
¿Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad?	✓			

Powered by CamScanner

CONTROL DE TIEMPOS

Señor observador: Registre cronológicamente todas las actividades que se realicen **durante el simulacro**, indicando la hora

ACTIVIDAD	HORA	OBSERVACIONES
Activación de la alerta	7:35:50 am	
Activación de la alarma de emergencia		
Salida de la primera persona	7:36:04 am	
Salida de la última persona	7136:16 am	
Llegada de la primera persona al punto de encuentro	7:36 1 21 am	
Llegada de la última persona al punto de encuentro	7136:25 am	
Retorno a las instalaciones	7:50 a.m	

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 26/02/2026 **Lugar:** Box culvert # 1

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 7:35am **Hora Final:** 7:50am

Temas: En caso de atentado terrorista **Obra:** C 6544 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	[illegible]	5078496	MH	Oficial	
2.	Roberto Cortes B	5078708	MH	Ayudante	
3.	Edwar d Castillo	5.095498	MH	Ayudante	
4.	Jorgelvis	1004121720	MH	Ayudante de obra	Jorgelvis
5.	Jose Jorge	1126 120263	MH	Ayudante	Jose Jorge
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

FECHA:	26/02/2026
NOMBRE DEL OBSERVADOR:	yesuth Polo navarro
TIPO DE EMERGENCIA	En caso de atentado demuestra
PROYECTO:	CGSM4- Coco Hondo
EMBARCACION:	N/A

PARTICIPANTES*

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Jhonatan Santiago	MH	
Jesus Orozco	MH	Jesus Orozco
Reinaldo Contreras	MH	Reinaldo
Edilberto Alvarez	MH	
Dairosa Fandiño	MH	Dairosa Fandiño

- En caso de que haya más participantes, regístrelos en el GH-R-007 Formato de asistencia a charlas o capacitaciones

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
EVALUACION GENERAL				
¿Se tomaron las acciones iniciales pertinentes por quien detecto la emergencia?	✓			
¿Los participantes conocían sus roles y responsabilidades para la emergencia?	✓			
¿Se activaron los planes y procedimientos relacionados?	✓			
¿El ejercicio se realizó en forma ordenada y disciplinada?	✓			
¿Asistió todo el personal?		✓		
¿Fallo algún equipo o sistema?		✓		
EVALUACIÓN DE EVACUACIÓN				
¿Se dio la voz de alerta (se realizaron maniobras de resguardo)?	✓			
¿Se dio la voz de alarma?	✓			
¿La alerta y alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas?			✓	
¿Todos los empleados y visitantes acataron la señal de alerta y alarma?	✓			
¿Se tiene una adecuada señalización de las rutas de evacuación?		✓		Señalización deficiente
¿Las rutas de evacuación fueron suficientes para la evacuación de todos los participantes?	✓			
¿Se realizó la evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes?	✓			

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
¿Se identificó (aron) al (los) Líder y/o Coordinador (es) de evacuación?	✓			
¿El (los) Líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó (aron) con claridad sus funciones?	✓			
¿El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verifico o valido que el personal a su cargo evacuo su área?	✓			
¿Se contó con participación total de las áreas y partes interesadas para la realización del ejercicio?		✓		
EVALUACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO				
¿Hubo organización en el o los puntos de encuentro?	✓			
¿Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas las medidas de seguridad para los participantes que evacuaron?	✓			
¿Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y visitantes que evacuaron?	✓			
¿Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron novedades?	✓			
¿El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de reingreso?	✓			
¿Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de encuentro?	✓			
¿Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad?	✓			

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

CONTROL DE TIEMPOS

Señor observador: Registre cronológicamente todas las actividades que se realicen **durante el simulacro**, indicando la hora

ACTIVIDAD	HORA	OBSERVACIONES
Activación de la alerta	8:50:54 seg am	
Activación de la alarma de emergencia		
Salida de la primera persona	8:51:05 seg am	
Salida de la última persona	8:51:11 seg am	
Llegada de la primera persona al punto de encuentro	8:51:20 seg am	
Llegada de la última persona al punto de encuentro	8:51:28 seg am	
Retorno a las instalaciones	09:05 am	

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 26/02/2026 **Lugar:** Boxculvert #2

Expositor: Yesuth polo navarro **Hora Inicio:** 8:50am **Hora Final:** 9:05am

Temas: En caso de atentado terrorista **Obra:** CG SU4 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Jonathan Gutierrez	1079912751	MH	Aprendiz	
2.	Jesus Orozco	1193547906	MH	ayudante	Jesus Orozco
3.	Reinaldo Ternera	7595950	MH	Ayudante	Reinaldo
4.	Edilberto Alvarez	85479599	MH	Ayudante	
5.	Davinson Fontiño	1079912778	MH	Ayudante	Davinson Fontiño
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5 **Firma del Expositor (es):** Yesuth polo n

Powered by CamScanner

	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

FECHA:	26/02/2026
NOMBRE DEL OBSERVADOR:	Yesmith Polo Navarro
TIPO DE EMERGENCIA	En caso de atentado terrorista
PROYECTO:	CGS44- Canto Hondo
EMBARCACION:	N/A

PARTICIPANTES*

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Luis Escorcia	Rf	
Miguel Leivoc	RF	Miguel Leivoc
Jader Ivan Orozco	RP	Jader Ivan Orozco
Leonel Ternera	Rf	Leonel
Reinaldo Hortiz	Rf	
Eduyo castillo	RF.	
Jerman Borja	RF	
Kevin Alvarez	Rf	Kevin A

- En caso de que haya más participantes, regístrelos en el GH-R-007 Formato de asistencia a charlas o capacitaciones

Powered by CamScanner

PANAMERICAN	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
EVALUACION GENERAL				
¿Se tomaron las acciones iniciales pertinentes por quien detecto la emergencia?	✓			
¿Los participantes conocían sus roles y responsabilidades para la emergencia?	✓			
¿Se activaron los planes y procedimientos relacionados?	✓			
¿El ejercicio se realizó en forma ordenada y disciplinada?	✓			
¿Asistió todo el personal?		✓		
¿Fallo algún equipo o sistema?		✓		
EVALUACIÓN DE EVACUACIÓN				
¿Se dio la voz de alerta (se realizaron maniobras de resguardo)?	✓			
¿Se dio la voz de alarma?	✓			
¿La alerta y alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas?			✓	
¿Todos los empleados y visitantes acataron la señal de alerta y alarma?	✓			
¿Se tiene una adecuada señalización de las rutas de evacuación?		✓		Señalizacion deficiente
¿Las rutas de evacuación fueron suficientes para la evacuación de todos los participantes?	✓			
¿Se realizó la evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes?	✓			

Powered by CamScanner

	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
¿Se identificó (aron) al (los) Líder y/o Coordinador (es) de evacuación?	✓			
¿El (los) Líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó (aron) con claridad sus funciones?	✓			
¿El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verifico o valido que el personal a su cargo evacuo su área?	✓			
¿Se contó con participación total de las áreas y partes interesadas para la realización del ejercicio?		✓		
EVALUACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO				
¿Hubo organización en el o los puntos de encuentro?	✓			
¿Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas las medidas de seguridad para los participantes que evacuaron?	✓			
¿Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y visitantes que evacuaron?	✓			
¿Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron novedades?	✓			
¿El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de reingreso?	✓			
¿Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de encuentro?	✓			
¿Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad?	✓			

Powered by CamScanner

CONTROL DE TIEMPOS

Señor observador: Registre cronológicamente todas las actividades que se realicen **durante el simulacro**, indicando la hora

ACTIVIDAD	HORA	OBSERVACIONES
Activación de la alerta	11:13:16 segam	
Activación de la alarma de emergencia		
Salida de la primera persona	11:13:25 segam	
Salida de la última persona	11:13:34 segam	
Llegada de la primera persona al punto de encuentro	11:13:43 segam	
Llegada de la última persona al punto de encuentro	11:13:58 segam	
Retorno a las instalaciones	11:18:12 segam	

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 26/02/2026 **Lugar:** Boxculvert #3

Expositor: yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 11:13am **Hora Final:**

Temas: En caso de atentado terrorista **Obra:** CG SM4 - caño Hondo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Luis Escorcia S	1081077248	RF	Ayudante de obra	
2. Miguel Leiva	1193165789	RF		Miguel Leiva
3. Jader Ivan Blanco	9877310	RF	ayudante	Jader Ivan Blanco
4. Leonel Ternera	1079913769	RF	ayudante	Leonel
5. Reinaldo Martinez P	5078217	RF	Ayudante	
6. Edilfo E	1079916324	RF	oficial	Edilfo E
7. Kevin Alvarez	1004213781	RF	ayudante	Kevin A
8. Cesar Borja	5078169	RF	OFICIAL	
9. Manuel Posada		RF		
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 9 **Firma del Expositor (es):** yesuth Polo N

Powered by CamScanner

ANEXO 4.5.

PROGRAMA GENERAL DE INSPECCIONES

	PROGRAMA DE INSPECCIONES	Codigo	GH-PROG-008
		Version	1
		Fecha	2/02/2018

OBJETIVO GENERAL:	Determinar el estado de los elementos de seguridad y de los equipos que hacen parte de la empresa		
ALCANCE	OFICINAS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE LA EMPRESA		
INDICADORES	**CUMPLIMIENTO - META: 90%**	**COBERTURA - META: <=80%**	**EFICACIA: META: control 90% de acciones**
RESPONSABLE	Coordinador HSEQ- Profesional HSE - Ingeniero Ambiental- Vigia HSE		

ACTIVIDADES	**5 - 11 enero 2026**		**12 - 18 enero 2026**		**19 - 25 enero 2026**		**26 enero - 1 feb 2026**		**2 - 8 febrero 2026**		**9 - 15 febrero 2026**		**16 - 22 febrero 2026**		**23 febrero - 1 marzo 2026**		**2 - 8 marzo 2026**		**9 - 15 marzo 2026**		**16 - 22 marzo 2026**		**23 - 29 marzo 2026**	
	P	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**
GIM-R-011 Inspecciòn de extintores	1	1							1								1							
GIM-R-012 Inspecciòn de Kit control derrame	1	1							1								1							
GIM-R-018 Inspecciòn de elementos de proteccion personal			1	1							1								1					
GIM-R-019 Inspeccion de orden y aseo draga y equipo de apoyo			1	1							1								1					
GIM-R-021 Inspecciòn de señalizaciòn			1	1			1	1			1				1				1				1	
GIM-R.022 Inspecciòn de botiquin	1	1							1								1							
GIM-R-023 Inspección orden y aseo					1	1							1								1			
GIM-R-033 Inspeccion orden y aseo oficinas			1	1							1								1					
GIM-R-064 Inspeccion camilla	1	1							1								1							
GIM-R-073 Inspeccion orden y aseo campamentos			1	1							1								1					
GIM-R-074 Inspeccion para manejo de puntales					1	1							1								1			
Revision carpetas documentos draga, procedimientos de emergencia, entre otros							1	1							1								1	

	5 - 11 enero 2026	**12 - 18 enero 2026**	**19 - 25 enero 2026**	**26 enero - 1 feb 2026**	**2 - 8 febrero 2026**	**9 - 15 febrero 2026**	**16 - 22 febrero 2026**	**23 febrero - 1 marzo 2026**	**2 - 8 marzo 2026**	**9 - 15 marzo 2026**	**16 - 22 marzo 2026**	**23 - 29 marzo 2026**
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	4	5	2	1	4	5	2	1	4	5	2	1
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	4	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES MENSUALES	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

	PROGRAMA DE INSPECCIONES	Codigo	GH-PROG-008
		Version	1
		Fecha	2/02/2018

OBJETIVO GENERAL:	Determinar el estado de los elementos de seguridad y de los equipos que hacen parte de la empresa		
ALCANCE	OFICINAS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE LA EMPRESA		
INDICADORES	**CUMPLIMIENTO - META: 90%**	**COBERTURA - META: <=80%**	**EFICACIA: META: control 90% de acciones**
RESPONSABLE	Coordinador HSEQ- Profesional HSE - Ingeniero Ambiental- Vigia HSE		

ACTIVIDADES	**30 marzo - 5 de abril 2026**		**6 - 12 de abril 2026**		**13 - 19 de abril 2026**		**20 - 26 de abril 2026**		**27 abril - 3 de mayo 2026**		**4 - 10 mayo 2026**		**11 - 17 mayo 2026**		**18 - 24 mayo 2026**		**25- 31 mayo 2026**		**1 - 7 junio 2026**		**8 - 14 junio 2026**		**15 - 21 junio 2026**		**22 - 28 junio 2026**	
	P	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**
GIM-R-011 Inspecciòn de extintores			1								1								1							
GIM-R-012 Inspecciòn de Kit control derrame			1								1								1							
GIM-R-018 Inspecciòn de elementos de proteccion personal					1								1								1					
GIM-R-019 Inspeccion de orden y aseo draga y equipo de apoyo					1								1								1					
GIM-R-021 Inspecciòn de señalizaciòn					1				1				1				1				1				1	
GIM-R.022 Inspecciòn de botiquin			1								1								1							
GIM-R-023 Inspección orden y aseo							1								1								1			
GIM-R-033 Inspeccion orden y aseo oficinas					1								1								1					
GIM-R-064 Inspeccion camilla			1								1								1							
GIM-R-073 Inspeccion orden y aseo campamentos					1								1								1					
GIM-R-074 Inspeccion para manejo de puntales							1								1								1			
Revision carpetas documentos draga, procedimientos de emergencia, entre otros									1								1								1	

	30 marzo - 5 de abril 2026	**6 - 12 de abril 2026**	**13 - 19 de abril 2026**	**20 - 26 de abril 2026**	**27 abril - 3 de mayo 2026**	**4 - 10 mayo 2026**	**11 - 17 mayo 2026**	**18 - 24 mayo 2026**	**25- 31 mayo 2026**	**1 - 7 junio 2026**	**8 - 14 junio 2026**	**15 - 21 junio 2026**	**22 - 28 junio 2026**
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	**4**	**5**	**2**	**1**	**2**	**4**	**5**	**2**	**1**	**4**	**5**	**2**	**1**
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES MENSUALES	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**

	PROGRAMA DE INSPECCIONES	Codigo	GH-PROG-008
		Version	1
		Fecha	2/02/2018

OBJETIVO GENERAL:	Determinar el estado de los elementos de seguridad y de los equipos que hacen parte de la empresa
ALCANCE	OFICINAS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE LA EMPRESA
INDICADORES	**CUMPLIMIENTO - META: 90%** / **COBERTURA - META: <=80%** / **EFICACIA: META: control 90% de acciones**
RESPONSABLE	Coordinador HSEQ- Profesional HSE - Ingeniero Ambiental- Vigia HSE

ACTIVIDADES	29 junio a 5 julio 2026		6 - 12 julio 2026		13 - 19 julio 2026		20 - 26 julio 2026		27 julio - 2 agosto 2026		3 - 9 agosto 2026		10 - 16 agosto 2026		17 - 23 agosto 2026		24 - 30 agosto 2026		31 agosto - 6 septiembre 2026		7 - 13 septiembre 2026		14 - 20 septiembre 2026		21 - 27 septiembre 2026	
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
GIM-R-011 Inspecciòn de extintores			1								1								1							
GIM-R-012 Inspecciòn de Kit control derrame			1								1								1							
GIM-R-018 Inspecciòn de elementos de proteccion personal					1								1								1					
GIM-R-019 Inspeccion de orden y aseo draga y equipo de apoyo					1								1								1					
GIM-R-021 Inspecciòn de señalizaciòn					1				1				1				1				1				1	
GIM-R.022 Inspecciòn de botiquin			1								1								1							
GIM-R-023 Inspección orden y aseo							1								1								1			
GIM-R-033 Inspeccion orden y aseo oficinas					1								1								1					
GIM-R-064 Inspeccion camilla			1								1								1							
GIM-R-073 Inspeccion orden y aseo campamentos					1								1								1					
GIM-R-074 Inspeccion para manejo de puntales							1								1								1			
Revision carpetas documentos draga, procedimientos de emergencia, entre otros									1								1								1	

	29 junio a 5 julio 2026	6 - 12 julio 2026	13 - 19 julio 2026	20 - 26 julio 2026	27 julio - 2 agosto 2026	3 - 9 agosto 2026	10 - 16 agosto 2026	17 - 23 agosto 2026	24 - 30 agosto 2026	31 agosto - 6 septiembre 2026	7 - 13 septiembre 2026	14 - 20 septiembre 2026	21 - 27 septiembre 2026
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	0	4	5	2	4	5	2	1	1	4	5	2	1
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES MENSUALES		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

PANAMERICAN DRILLING & EXCAVATIONS	**PROGRAMA DE INSPECCIONES**	**Codigo**	GH-PROG-008
		Version	1
		Fecha	2/02/2018

OBJETIVO GENERAL:	Determinar el estado de los elementos de seguridad y de los equipos que hacen parte de la empresa
ALCANCE	OFICINAS, EQUIPOS Y PROYECTOS DE LA EMPRESA
INDICADORES	**CUMPLIMIENTO - META: 90%** — **COBERTURA - META: <=80%** — **EFICACIA: META: control 90% de acciones**
RESPONSABLE	Coordinador HSEQ- Profesional HSE - Ingeniero Ambiental- Vigia HSE

ACTIVIDADES	**28 septiembre - 4 octubre 2026**		**5 - 11 octubre 2026**		**12 - 18 octubre 2026**		**19 - 25 octubre 2026**		**26 octubre - 1 noviembre 2026**		**2 - 8 noviembre 2026**		**9 - 15 noviembre 2026**		**16 - 22 noviembre 2026**		**23 - 29 noviembre 2026**		**30 noviembre - 6 diciembre 2026**		**7 - 13 diciembre 2026**		**14 - 20 diciembre 2026**		**21 - 27 diciembre 2026**		**28 - 31 diciembre 2026**	
	P	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**	**P**	**E**
GIM-R-011 Inspecciòn de extintores			1								1								1									
GIM-R-012 Inspecciòn de Kit control derrame			1								1								1									
GIM-R-018 Inspecciòn de elementos de proteccion personal					1								1								1							
GIM-R-019 Inspeccion de orden y aseo draga y equipo de apoyo					1								1								1							
GIM-R-021 Inspecciòn de señalizaciòn					1				1				1				1				1				1			
GIM-R.022 Inspecciòn de botiquin			1								1								1									
GIM-R-023 Inspección orden y aseo							1								1								1					
GIM-R-033 Inspeccion orden y aseo oficinas					1								1								1							
GIM-R-064 Inspeccion camilla			1								1								1									
GIM-R-073 Inspeccion orden y aseo campamentos					1								1								1							
GIM-R-074 Inspeccion para manejo de puntales							1								1								1					
Revision carpetas documentos draga, procedimientos de emergencia, entre otros									1								1								1			

	5 - 11 octubre 2026	**12 - 18 octubre 2026**	**19 - 25 octubre 2026**	**26 octubre - 1 noviembre 2026**	**2 - 8 noviembre 2026**	**9 - 15 noviembre 2026**	**16 - 22 noviembre 2026**	**23 - 29 noviembre 2026**	**30 noviembre - 6 diciembre 2026**	**7 - 13 diciembre 2026**	**14 - 20 diciembre 2026**	**21 - 27 diciembre 2026**	**28 - 31 diciembre 2026**
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES	4	5	2	1	4	5	2	1	1	4	5	2	1	0
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES MENSUALES	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

ANEXO 4.6.

INSPECCIONES

	INSPECCION DE BOTIQUINES	CODIGO: GIM-R-022
B&P		VERSIÓN: 1
		FECHA: 15-08-2024

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Yesenia Perla Navarro | CARGO: Vigia HSE

PROYECTO: CPS44- Cabo Hondo | UBICACIÓN DEL BOTIQUIN: Punto Base

FECHA DE INSPECCION: 04/02/2026

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA PUNTO BASE Y DRAGA	CANTIDAD REQUERIDA REMOLCADOR, LANCHA, EXCAVADORA, VEHICULOS, OFICINA	CANTIDAD DISPONIBLE	FECHA DE VENCIMIENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES
Gasa esteril	Paquete	20	10	14		B		8 Vencen el 04/11/29 5 Vencen el 25/01/29 1 Vence el 19/09/28
Esparadrapo microporo	Rollo x 4"	1	0	0				No hay disponibilidad
Esparadrapo microporo	Rollo x 2 "	0	1	0	31/08/29	B		Disponible uno de 1" X 3 yd
Bajalenguas	Paquete x 20	1	1	1	07/11/27	B		
Guantes esteril	Par	4	4	0				
Venda elastica 2" X 5 yardas	Unidad	1	0	1	28/10/28	B		
Venda elastica 3" X 5 yardas	Unidad	1	1	1	28/05/28	B		
Venda elastica 5" x 5 yardas	Unidad	1	0	1	07/06/29	B		
Isodine espuma o jabon quirurgico	Unidad x 120 ml	1	0	1	07/05/27	B		
Isodine espuma o jabon quirurgico	Unidad x 60 ml	0	1	0	/	/	/	NO Aplica
Solucion salina	Bolsa x 500 cc	1	1	2	07/06/26	B		
Termometro digital	Unidad	1	0	1		B		
Alcohol antiseptico	Frasco 120 ml	1	1	1	07/02/28	B		
Apositos o compresas no esteriles	Unidad	5	2	3	20/10/29	B		Faltan 2 und
Tijera punta roma	Unidad	1	1	0				No hay disponibilidad
Curas	Unidad	10	10	4		B		Faltan 6 und
Kit de inmovilizadores para adulto *	Unidad	1	0	1		B		

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE BOTIQUINES	CODIGO: GIM-R-022
B&P		VERSIÓN: 1
		FECHA: 15-08-2024

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Yesenia Polo Navarro | CARGO: Vigia HSE

PROYECTO: CPS114 - Caño Herido | UBICACIÓN DEL BOTIQUIN: Cat 345

FECHA DE INSPECCION: 04/02/2026

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA PUNTO BASE Y DRAGA	CANTIDAD REQUERIDA REMOLCADOR, LANCHA, EXCAVADORA, VEHICULOS, OFICINA	CANTIDAD DISPONIBLE	FECHA DE VENCIMIENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES
Gasa esteril	Paquete	20	10	10	04/11/29	B		
Esparadrapo microporo	Rollo x 4"	1	0	0	/	/	/	NO Aplica
Esparadrapo microporo	Rollo x 2"	0	1	0	31/08/29	B		Disponible uno de 1" x 3 yd
Bajalenguas	Paquete x 20	1	1	1	07/08/29	B		
Guantes esteril	Par	4	4	4	17/02/30	B		
Venda elastica 2" X 5 yardas	Unidad	1	0	0	/	/	/	NO Aplica
Venda elastica 3" X 5 yardas	Unidad	1	1	0				No hay disponibilidad
Venda elastica 5" x 5 yardas	Unidad	1	0	0	/	/	/	NO Aplica
Isodine espuma o jabon quirurgico	Unidad x 120 ml	1	0	0	/	/	/	NO Aplica
Isodine espuma o jabon quirurgico	Unidad x 60 ml	0	1	1	07/04/27	B		
Solucion salina	Bolsa x 500 cc	1	1	1	07/05/27	B		
Termometro digital	Unidad	1	0	0	/	/	/	NO Aplica
Alcohol antiseptico	Frasco 120 ml	1	1	1	07/03/28	B		
Apositos o compresas no esteriles	Unidad	5	2	0				No hay disponibilidad Son 2 cuad
Tijera punta roma	Unidad	1	1	0				No hay disponibilidad
Curas	Unidad	10	10	10				
Kit de inmovilizadores para adulto *	Unidad	1	0	0	/	/	/	NO Aplica

Powered by CamScanner

INSPECCION DE BOTIQUINES

CODIGO: GIM-R-022
VERSIÓN: 1
FECHA: 15-08-2024

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Yesenia Polo Navarro — CARGO: Vigia HSE

PROYECTO: CGSM4- Cerro Hondo — UBICACIÓN DEL BOTIQUIN: Cat 325

FECHA DE INSPECCION: 04/02/2026

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA PUNTO BASE Y DRAGA	CANTIDAD REQUERIDA REMOLCADOR, LANCHA, EXCAVADORA, VEHICULOS, OFICINA	CANTIDAD DISPONIBLE	FECHA DE VENCIMIENTO	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	COMENTARIOS/OBSERVACIONES
Gasa esteril	Paquete	20	10	8	4/11/29	B		Faltan 2 und
Esparadrapo microporo	Rollo x 4"	1	0	0	/	/	/	NO Aplica
Esparadrapo microporo	Rollo x 2 "	0	1	0	01/06/27	B		Disponible una de 1 1/2" X 10 yd
Bajalenguas	Paquete x 20	1	1	19 und	17/04/29	B		Falta 1 und
Guantes esteril	Par	4	4	3	25/03/30	B		Falta 1 par
Venda elastica 2" X 5 yardas	Unidad	1	0	0	/	/	/	NO Aplica
Venda elastica 3" X 5 yardas	Unidad	1	1	1	28/10/29	B		
Venda elastica 5" x 5 yardas	Unidad	1	0	0	/	/	/	NO Aplica
Isodine espuma o jabon quirurgico	Unidad x 120 ml	1	0	0	/	/	/	NO Aplica
Isodine espuma o jabon quirurgico	Unidad x 60 ml	0	1	0				no hay disponibilidad
Solucion salina	Bolsa x 500 cc	1	1	1	07/05/27	B		
Termometro digital	Unidad	1	0	0	/	/	/	NO Aplica
Alcohol antiseptico	Frasco 120 ml	1	1	1	07/03/28	B		
Apositos o compresas no esterles	Unidad	5	2	0				no hay disponible Son 2 und
Tijera punta roma	Unidad	1	1	0				no hay disponible
Curas	Unidad	10	10	10		B		
Kit de inmovilizadores para adulto *	Unidad	1	0	0	/	/	/	NO Aplica

Powered by CamScanner

PANAMERICAN

INSPECCION DE CAMILLAS

CODIGO: QSS-R-054
VERSIÓN: 1
FECHA: 05/02/2021

NOMBRE DE QUIEN INSPECIONA: Yesenia Pinto Manrique CARGO: Vigia HSE

PROYECTO: C6244 - Cerro Hondo

FECHA DE INSPECCIÓN	UBICACIÓN DE LA CAMILLA	Instalación (sitio de ubicación)	Señalización	Estado del soporte	Sujetadores de agarre	Soporte para el cuello	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
04/02/2026	Punto Base	B	B	M	B	B	No cuenta con el soporte inferior cuello (Soporte Tipo L)
05/02/2026	Reforestación P.P. Base	B	M	M	B	M	No tiene fijación cuña no cuenta con soporte inferior No tiene soporte para el cuello

B	Buen estado
M	Mal estado
NA	No aplica

Powered by CamScanner

BP	INSPECCION EPP Y DOTACION	CODIGO: GIM-R-018 VERSION: 2 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD: Salamina Mag. Salema

PROYECTO: @ PSUH - Cerro Hondo

		FECHA			09/02/2026			09/02/2026			09/02/2026		
		NOMBRE DEL TRABAJADOR			Heriberto Lara			Roberto Rojas			Reinaldo Herrera		
TIPO DE PROTECCION	EPP	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA
DOTACION	CAMISA	✓			✓			✓			✓		
	PANTALON	✓			✓			✓			✓		
	CALZADO		X		✓			✓			✓		
CABEZA	CASCO	✓			✓			✓			✓		
	ALERON PARA CASCO												
VISUAL	GAFAS CLARAS								X				
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS												
	GAFAS OSCURAS		X		✓								
	MONOGAFAS												
CORPORAL	IMPERMEABLE												
	CHALECO SALVAVIDAS			✓			✓			✓			✓
	PITO PARA CHALECO			✓			✓			✓			✓
	LUZ PARA CHALECO			✓			✓			✓			✓
DE MANOS	CARNAZA												
	INDUSTRIAL												
	TIPO INGENIERO	✓			✓			✓			✓		
	POLIURETANO												
	HYCROM												
AUDITIVA	INSERCION												
	COPA												
FACIAL	ESCAFANDRA												
	CARETA DE ESMERILA												
PIES	BOTA PANTANERA												
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR			✓			✓			✓			✓
	GAFAS DE OXICORTE			✓			✓			✓			✓
	PROTECCION RESPIRATORIA			✓			✓			✓			✓
	FILTROS			✓			✓			✓			✓
	MANGAS DE CARNAZA			✓			✓			✓			✓
	GUANTES SOLDADOR			✓			✓			✓			✓
	DELANTAL DE CUERO			✓			✓			✓			✓
	POLAINAS			✓			✓			✓			✓

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	Yesmith Vanessa
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Yesmith Polo V

Powered by CamScanner

BnP	INSPECCION EPP Y DOTACION	CODIGO: GIM-R-018 VERSION: 2 FECHA: 1/08/2025

CIUDAD:	Solamina Mag
PROYECTO:	C6544- Cerro Hondo

FECHA		09/02/2026			09/02/2026			09/02/2026			09/02/2026		
NOMBRE DEL TRABAJADOR		Duvan Sanchez			Jose Jorge			Jorge Gomez			Esmuder Lora		
TIPO DE PROTECCION	EPP	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA
DOTACION	CAMISA	✓			✓			✓			✓		
	PANTALON	✓			✓			✓			✓		
	CALZADO	✓			✓			✓			✓		
CABEZA	CASCO	✓			✓			✓			✓		
	ALERON PARA CASCO												
VISUAL	GAFAS CLARAS	✓									✓		
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS												
	GAFAS OSCURAS					X		✓					
	MONOGAFAS												
CORPORAL	IMPERMEABLE												
	CHALECO SALVAVIDAS			✓			✓			✓			✓
	PITO PARA CHALECO			✓			✓			✓			✓
	LUZ PARA CHALECO			✓			✓			✓			✓
DE MANOS	CARNAZA												
	INDUSTRIAL												
	TIPO INGENIERO	✓			✓			✓					
	POLIURETANO										✓		
	HYCROM												
AUDITIVA	INSERCION												
	COPA												
FACIAL	ESCAFANDRA												
	CARETA DE ESMERILA			✓			✓			✓			✓
PIES	BOTA PANTANERA												
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR			✓			✓			✓			✓
	GAFAS DE OXICORTE			✓			✓			✓			✓
	PROTECCION RESPIRATORIA			✓			✓			✓			✓
	FILTROS			✓			✓			✓			✓
	MANGAS DE CARNAZA			✓			✓			✓			✓
	GUANTES SOLDADOR			✓			✓			✓			✓
	DELANTAL DE CUERO			✓			✓			✓			✓
	POLAINAS			✓			✓			✓			✓

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	Yesuth Vanes Su
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Yesuth Polo V

Powered by CamScanner

BHP	INSPECCION EPP Y DOTACION	CODIGO: GIM-R-018 VERSION: 2 FECHA: 1/08/2025

CIUDAD:	Salamina Magdalena
PROYECTO:	CGS44 - Cerro Horado

FECHA		09/02/2026			09/02/2026			09/02/2026			09/02/2026		
NOMBRE DEL TRABAJADOR		Eduardo Castillo			Alexander Herrera			Jesus Orozco			Carlos Hurtado		
TIPO DE PROTECCION	EPP	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA
DOTACION	CAMISA	✓			✓				X		✓		
	PANTALON	✓				X		✓			✓		
	CALZADO	✓				X		✓				X	
CABEZA	CASCO	✓			✓			✓			✓		
	ALERON PARA CASCO												
VISUAL	GAFAS CLARAS										✓		
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS												
	GAFAS OSCURAS	✓			✓				X				
	MONOGAFAS												
CORPORAL	IMPERMEABLE												
	CHALECO SALVAVIDAS			✓			✓			✓			✓
	PITO PARA CHALECO			✓			✓			✓			✓
	LUZ PARA CHALECO			✓			✓			✓			✓
DE MANOS	CARNAZA												
	INDUSTRIAL												
	TIPO INGENIERO		X		✓			✓			✓		
	POLIURETANO												
	HYCROM												
AUDITIVA	INSERCION												
	COPA												
FACIAL	ESCAFANDRA												
	CARETA DE ESMERILA			✓			✓			✓			✓
PIES	BOTA PANTANERA												
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR			✓			✓			✓			✓
	GAFAS DE OXICORTE			✓			✓			✓			✓
	PROTECCION RESPIRATORIA			✓			✓			✓			✓
	FILTROS			✓			✓			✓			✓
	MANGAS DE CARNAZA			✓			✓			✓			✓
	GUANTES SOLDADOR			✓			✓			✓			✓
	DELANTAL DE CUERO			✓			✓			✓			✓
	POLAINAS			✓			✓			✓			✓

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	Yesmith Vanessa
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Yesmith Polo V

Powered by CamScanner

BIP	INSPECCION EPP Y DOTACION	CODIGO: GIM-R-018 VERSION: 2 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD:	Salamina Mag
PROYECTO:	CGSM4- Caño Hondo

FECHA		09/02/2026			09/02/2026			09/02/2026						
NOMBRE DEL TRABAJADOR		Wasel Gomez			Edilbato Alvarez			Daniel Ricardo						
TIPO DE PROTECCION	EPP	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	
DOTACION	CAMISA	✓			✓			✓						
	PANTALON	✓			✓			✓						
	CALZADO	✓			✓			✓						
CABEZA	CASCO	✓			✓			✓						
	ALERON PARA CASCO													
VISUAL	GAFAS CLARAS				✓			✓						
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS													
	GAFAS OSCURAS	✓												
	MONOGAFAS													
CORPORAL	IMPERMEABLE													
	CHALECO SALVAVIDAS			✓			✓			✓				
	PITO PARA CHALECO			✓			✓			✓				
	LUZ PARA CHALECO			✓			✓			✓				
DE MANOS	CARNAZA													
	INDUSTRIAL													
	TIPO INGENIERO	✓				X		✓						
	POLIURETANO													
	HYCROM													
AUDITIVA	INSERCION													
	COPA													
FACIAL	ESCAFANDRA													
	CARETA DE ESMERILA													
PIES	BOTA PANTANERA													
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR			✓			✓			✓				
	GAFAS DE OXICORTE			✓			✓			✓				
	PROTECCION RESPIRATORIA			✓			✓			✓				
	FILTROS			✓			✓			✓				
	MANGAS DE CARNAZA			✓			✓			✓				
	GUANTES SOLDADOR			✓			✓			✓				
	DELANTAL DE CUERO			✓			✓			✓				
	POLAINAS			✓			✓			✓				

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	Yesmith Vanessa
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Yesmith Polo N

Powered by CamScanner

BnP	INSPECCION EPP Y DOTACION	CODIGO: GIM-R-018 VERSION: 2 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD:	Soledad - Mog
PROYECTO:	CQSUU - Cuña Humedo

		FECHA	09/02/2026			09/02/2026			09/02/2026			09/02/2026		
		NOMBRE DEL TRABAJADOR	Arbol - Bonilla			Jader Ospino			Manuel Pereira			Kevin Alvarez		
TIPO DE PROTECCION	EPP		BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA
DOTACION	CAMISA		✓			✓			✓			✓		
	PANTALON		✓			✓			✓			✓		
	CALZADO		✓			✓			✓			✓		
CABEZA	CASCO		✓			✓			✓			✓		
	ALERON PARA CASCO													
VISUAL	GAFAS CLARAS		✓			✓			✓					
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS													
	GAFAS OSCURAS											✓		
	MONOGAFAS													
CORPORAL	IMPERMEABLE													
	CHALECO SALVAVIDAS				✓			✓			✓			✓
	PITO PARA CHALECO				✓			✓			✓			✓
	LUZ PARA CHALECO				✓			✓			✓			✓
DE MANOS	CARNAZA		✓											
	INDUSTRIAL													
	TIPO INGENIERO								✓			✓		
	POLIURETANO					✓			✓			✓		
	HYCROM													
AUDITIVA	INSERCION													
	COPA													
FACIAL	ESCAFANDRA		✓			✓			✓			✓		
	CARETA DE ESMERILA				✓			✓			✓			✓
PIES	BOTA PANTANERA													
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR				✓			✓			✓			✓
	GAFAS DE OXICORTE				✓			✓			✓			✓
	PROTECCION RESPIRATORIA				✓			✓			✓			✓
	FILTROS				✓			✓			✓			✓
	MANGAS DE CARNAZA				✓			✓			✓			✓
	GUANTES SOLDADOR				✓			✓			✓			✓
	DELANTAL DE CUERO				✓			✓			✓			✓
	POLAINAS				✓			✓			✓			✓

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	Yesuth Vanegas
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Yesuth Pedro N

Powered by CamScanner

BnP	INSPECCION EPP Y DOTACION	CODIGO: GIM-R-018 VERSION: 2 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD: Salamina Magdalena

PROYECTO: CBS44 - Caño Hondo

		FECHA			09/02/2026			09/02/2026			10/02/2026			10/02/2026		
		NOMBRE DEL TRABAJADOR			Sebastian Avella			German Borja			Miguel Leiva			Luis Escorcia		
TIPO DE PROTECCION	EPP		BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA
DOTACION	CAMISA		✓			✓			✓			✓		
	PANTALON		✓			✓			✓			✓		
	CALZADO		✓			✓			✓			✓		
CABEZA	CASCO		✓			✓			✓			✓		
	ALERON PARA CASCO													
VISUAL	GAFAS CLARAS		✓			✓			✓					
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS													
	GAFAS OSCURAS											✓		
	MONOGAFAS													
CORPORAL	IMPERMEABLE													
	CHALECO SALVAVIDAS				✓			✓			✓			✓
	PITO PARA CHALECO				✓			✓			✓			✓
	LUZ PARA CHALECO				✓			✓			✓			✓
DE MANOS	CARNAZA													
	INDUSTRIAL													
	TIPO INGENIERO		✓			✓			✓			✓		
	POLIURETANO		✓			✓								
	HYCROM													
AUDITIVA	INSERCION													
	COPA													
FACIAL	ESCAFANDRA		✓			✓			✓			✓		
	CARETA DE ESMERILA				✓			✓			✓			✓
PIES	BOTA PANTANERA													
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR				✓			✓			✓			✓
	GAFAS DE OXICORTE				✓			✓			✓			✓
	PROTECCION RESPIRATORIA				✓			✓			✓			✓
	FILTROS				✓			✓			✓			✓
	MANGAS DE CARNAZA				✓			✓			✓			✓
	GUANTES SOLDADOR				✓			✓			✓			✓
	DELANTAL DE CUERO				✓			✓			✓			✓
	POLAINAS				✓			✓			✓			✓

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	Yesuth Vanegas
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

B&P	INSPECCION EPP Y DOTACION	CODIGO: GIM-R-018 VERSION: 2 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD: Solombra Magdalena

PROYECTO: CG544 - Canto Hondo

		10/02/2026			10/02/2026			09/02/2026			09/02/2026		
FECHA													
NOMBRE DEL TRABAJADOR		Estalfo Castillo			Leonel Pereira			Orlando Carrillo			Reinaldo Martinez		
TIPO DE PROTECCION	EPP	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA
DOTACION	CAMISA	✓			✓			✓			✓		
	PANTALON	✓			✓			✓			✓		
	CALZADO	✓			✓			✓			✓		
CABEZA	CASCO	✓			✓			✓			✓		
	ALERON PARA CASCO												
VISUAL	GAFAS CLARAS										✓		
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS												
	GAFAS OSCURAS	✓			✓								
	MONOGAFAS												
CORPORAL	IMPERMEABLE												
	CHALECO SALVAVIDAS			✓			✓			✓			✓
	PITO PARA CHALECO			✓			✓			✓			✓
	LUZ PARA CHALECO			✓			✓			✓			✓
DE MANOS	CARNAZA												
	INDUSTRIAL												
	TIPO INGENIERO	✓			✓						✓		
	POLIURETANO	✓			✓			✓		·			
	HYCROM												
AUDITIVA	INSERCION												
	COPA												
FACIAL	ESCAFANDRA	✓											
	CARETA DE ESMERILA			✓			✓			✓			✓
PIES	BOTA PANTANERA												
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR			✓			✓			✓			✓
	GAFAS DE OXICORTE			✓			✓			✓			✓
	PROTECCION RESPIRATORIA			/			✓			✓			✓
	FILTROS			✓			✓			✓			✓
	MANGAS DE CARNAZA			✓			✓			✓			✓
	GUANTES SOLDADOR			✓			✓			✓			✓
	DELANTAL DE CUERO			✓			✓			✓			✓
	POLAINAS			/			✓			✓			✓

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	Yesmith Vanessa
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Yesmith polo N

Powered by CamScanner

	INSPECCION EPP Y DOTACION	CODIGO: GIM-R-018 VERSION: 5 FECHA: 1/09/2025

CIUDAD:	Salamina Magdalena
PROYECTO:	C.C. Sitio Cano Alondo
FECHA	09/02/2026
NOMBRE DEL TRABAJADOR	Jesus Polanco

TIPO DE PROTECCION	EPP	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA
DOTACION	CAMISA	✓											
	PANTALON	✓											
	CALZADO	✓											
CABEZA	CASCO												
	ALERON PARA CASCO												
VISUAL	GAFAS CLARAS												
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS												
	GAFAS OSCURAS	✓											
	MONOGAFAS												
CORPORAL	IMPERMEABLE	✓											
	CHALECO SALVAVIDAS			✓									
	PITO PARA CHALECO			✓									
	LUZ PARA CHALECO			✓									
DE MANOS	CARNAZA												
	INDUSTRIAL												
	TIPO INGENIERO												
	POLIURETANO												
	HYCROM												
AUDITIVA	INSERCION												
	COPA												
FACIAL	ESCAFANDRA												
	CARETA DE ESMERILA												
PIES	BOTA PANTANERA	✓											
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR			✓									
	GAFAS DE OXICORTE			✓									
	PROTECCION RESPIRATORIA			✓									
	FILTROS			✓									
	MANGAS DE CARNAZA			✓									
	GUANTES SOLDADOR			✓									
	DELANTAL DE CUERO			✓									
	POLAINAS			✓									

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	Yesmith Valles Sa
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Yesmith Polo V

Powered by CamScanner

PANAMERICAN ENGINEERING & CONSTRUCTION

INSPECION EPP Y DOTACION

CODIGO: GIM-R-018
VERSION: 7
FECHA: 1/06/2025

CIUDAD: Salamina Magdalena
PROYECTO: CGSM- Caño Hondo

FECHA		09/02/2026												
NOMBRE DEL TRABAJADOR		Cristian Gil												
TIPO DE PROTECCION	EPP	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA
DOTACION	CAMISA	✓											
	PANTALON	✓											
	CALZADO	✓											
CABEZA	CASCO	✓											
	ALERON PARA CASCO												
VISUAL	GAFAS CLARAS												
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS												
	GAFAS OSCURAS	✓											
	MONOGAFAS												
CORPORAL	IMPERMEABLE	✓											
	CHALECO SALVAVIDAS			✓									
	PITO PARA CHALECO			✓									
	LUZ PARA CHALECO			✓									
DE MANOS	CARNAZA												
	INDUSTRIAL												
	TIPO INGENIERO												
	POLIURETANO	✓											
	HYCROM			✓									
AUDITIVA	INSERCION												
	COPA			✓									
FACIAL	ESCAFANDRA	✓											
	CARETA DE ESMERILA												
PIES	BOTA PANTANERA	✓											
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR			✓									
	GAFAS DE OXICORTE			✓									
	PROTECCION RESPIRATORIA			✓									
	FILTROS			✓									
	MANGAS DE CARNAZA			✓									
	GUANTES SOLDADOR			✓									
	DELANTAL DE CUERO			✓									
	POLAINAS			✓									

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	Yesuth Vanesso
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

BeP	INSPECCION EPP Y DOTACION	CODIGO: QIM-R-018 VERSION: 2 FECHA: 1/09/2025

CIUDAD: Sabanas Magdalena

PROYECTO: CESMU - Casa Hospital

		FECHA			10/02/2026			10/02/2026			10/02/2026		
		NOMBRE DEL TRABAJADOR			Sambulo Gomez			Carlos Alvarez			Cesar Santabarrago		
TIPO DE PROTECCION	EPP	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA
DOTACION	CAMISA				✓			✓			✓		
	PANTALON				✓			✓			✓		
	CALZADO		X		✓			✓			✓		
CABEZA	CASCO		X				✓						
	ALERON PARA CASCO	✓											
VISUAL	GAFAS CLARAS					X			X		✓		
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS												
	GAFAS OSCURAS	✓									✓		
	MONOGAFAS												
CORPORAL	IMPERMEABLE	✓											
	CHALECO SALVAVIDAS			✓			✓			✓			✓
	PITO PARA CHALECO			✓			✓			✓			✓
	LUZ PARA CHALECO			✓			✓			✓			✓
DE MANOS	CARNAZA												
	INDUSTRIAL												
	TIPO INGENIERO				✓			✓			✓		
	POLIURETANO	✓											
	HYCROM												
AUDITIVA	INSERCION												
	COPA												
FACIAL	ESCAFANDRA	✓				X			X			X	
	CARETA DE ESMERILA												
PIES	BOTA PANTANERA	✓			✓			✓			✓		
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR			✓			✓			✓			✓
	GAFAS DE OXICORTE			✓			✓			✓			✓
	PROTECCION RESPIRATORIA			✓			✓			✓			✓
	FILTROS			✓			✓			✓			✓
	MANGAS DE CARNAZA			✓			✓			✓			✓
	GUANTES SOLDADOR			✓			✓			✓			✓
	DELANTAL DE CUERO			✓			✓			✓			✓
	POLAINAS			✓			✓			✓			✓

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	yesuth vanessa
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	yesuth polo r

Powered by CamScanner

BIP	INSPECCION EPP Y DOTACION	CODIGO: GIM-R-018 VERSION: 2 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD: Salamina Mag

PROYECTO: CGSM4- Cerro Hondo

		FECHA			10/02/2026			10/02/2026			10/02/2026		
		NOMBRE DEL TRABAJADOR			Carlos Gomez			Jose Caballero			Jesus Montes		
TIPO DE PROTECCION	EPP	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA
DOTACION	CAMISA	✓			✓			✓				X	
	PANTALON	✓			✓			✓				X	
	CALZADO	✓			✓			✓				X	
CABEZA	CASCO										✓		
	ALERON PARA CASCO										✓		
VISUAL	GAFAS CLARAS		X			X			X			X	
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS												
	GAFAS OSCURAS												
	MONOGAFAS												
CORPORAL	IMPERMEABLE										✓		
	CHALECO SALVAVIDAS			✓			✓			✓			✓
	PITO PARA CHALECO			✓			✓			✓			✓
	LUZ PARA CHALECO			✓			✓			✓			✓
DE MANOS	CARNAZA												
	INDUSTRIAL												
	TIPO INGENIERO	✓			✓							X	
	POLIURETANO												
	HYCROM												
AUDITIVA	INSERCION										✓		
	COPA												
FACIAL	ESCAFANDRA		X			X			X			X	
	CARETA DE ESMERILA												
PIES	BOTA PANTANERA	✓			✓			✓			✓		
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR			✓			✓			✓			✓
	GAFAS DE OXICORTE			✓			✓			✓			✓
	PROTECCION RESPIRATORIA			✓			✓			✓			✓
	FILTROS			✓			✓			✓			✓
	MANGAS DE CARNAZA			✓			✓			✓			✓
	GUANTES SOLDADOR			✓			✓			✓			✓
	DELANTAL DE CUERO			✓			✓			✓			✓
	POLAINAS			✓			✓			✓			✓

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	Yesuth Polo N
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

BMP	INSPECCION EPP Y DOTACION	CODIGO: GIM-R-018 VERSION: 2 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD: Salamina Mag

PROYECTO: CBS44 - Cañe Hondo

		FECHA			09/02/2026			09/02/2026			09/02/2026		
		NOMBRE DEL TRABAJADOR			Carlos Ramos			Jose Carrillo			Yesuth polo		
TIPO DE PROTECCION	EPP	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA
DOTACION	CAMISA		X			X			X		✓		
	PANTALON		X			X			X		✓		
	CALZADO	✓				X			X		✓		
CABEZA	CASCO	✓			✓			✓			✓		
	ALERON PARA CASCO				✓								
VISUAL	GAFAS CLARAS												
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS												
	GAFAS OSCURAS	✓									✓		
	MONOGAFAS												
CORPORAL	IMPERMEABLE	✓			✓			✓			✓		
	CHALECO SALVAVIDAS												✓
	PITO PARA CHALECO												✓
	LUZ PARA CHALECO												✓
DE MANOS	CARNAZA												
	INDUSTRIAL												
	TIPO INGENIERO	✓			✓								✓
	POLIURETANO										✓		
	HYCROM												
AUDITIVA	INSERCION	✓						✓			✓		
	COPA												
FACIAL	ESCAFANDRA	✓									✓		
	CARETA DE ESMERILA												
PIES	BOTA PANTANERA	✓			✓			✓			✓		
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR			✓			✓			✓			✓
	GAFAS DE OXICORTE			✓			✓			✓			✓
	PROTECCION RESPIRATORIA			✓			✓			✓			✓
	FILTROS			✓			✓			✓			✓
	MANGAS DE CARNAZA			✓			✓			✓			✓
	GUANTES SOLDADOR			✓			✓			✓			✓
	DELANTAL DE CUERO			✓			✓			✓			✓
	POLAINAS			✓			✓			✓			✓

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	Yesuth Vanessa
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Yesuth polo V

Powered by CamScanner

BnP	INSPECCION EPP Y DOTACION	CODIGO: GIM-R-018 VERSION: 2 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD:	Salamina Mag
PROYECTO:	CPS44- Cañas Hermida
FECHA	09/02/2026
NOMBRE DEL TRABAJADOR	Daniel Murcia

TIPO DE PROTECCION	EPP	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA	BUENO	MALO	NO APLICA
DOTACION	CAMISA	✓											
	PANTALON	✓											
	CALZADO		X										
CABEZA	CASCO	✓											
	ALERON PARA CASCO	✓											
VISUAL	GAFAS CLARAS		X										
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS												
	GAFAS OSCURAS												
	MONOGAFAS												
CORPORAL	IMPERMEABLE	✓											
	CHALECO SALVAVIDAS												
	PITO PARA CHALECO												
	LUZ PARA CHALECO												
DE MANOS	CARNAZA												
	INDUSTRIAL												
	TIPO INGENIERO	✓											
	POLIURETANO	✓											
	HYCROM												
AUDITIVA	INSERCION												
	COPA												
FACIAL	ESCAFANDRA	✓											
	CARETA DE ESMERILA												
PIES	BOTA PANTANERA	✓											
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR			✓									
	GAFAS DE OXICORTE			✓									
	PROTECCION RESPIRATORIA			✓									
	FILTROS			✓									
	MANGAS DE CARNAZA			✓									
	GUANTES SOLDADOR			✓									
	DELANTAL DE CUERO			✓									
	POLAINAS			✓									

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA	Yesmith Vanessa
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Yesmith Palo N

Powered by CamScanner

B&P	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: GIM-R-011 Versión: 1 Fecha: 16-08-2024

PROYECTO	CPS144- Caño Hondo
FECHA DE LA INSPECCIÓN	04/02/2026

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN: **B:** BUENO **R:** REGULAR **M:** MALO

Tipo Extintor	Ubicación	Capacidad	Estado										Fecha de última recarga (dd/mm/aaaa)	Observaciones
			Manometro	Pasador de seguridad	Manguera	Boquilla	Manija	Pintura	Señalización	Cilindro	Peso	Visibilidad		
Multiproposito Solo ABC	Punto Base	20LB	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	07/08/25	
"	Cal 345	20LB	B	B	N/A	B	B	B	R	B	R	R	07/08/25	Señaliza con Barniza
"	Cal 315	20LB	B	B	N/A	B	B	B	B	B	R	R	07/09/25	

INSPECCIONADO POR: Yesuth Vanessa **FIRMA:** Yesuth Palo V

Powered by CamScanner

B&P	**INSPECCION A SEÑALIZACION DE OBRA**	**Código: GIM-R-021** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

PROYECTO: CBS44- Coiba Hondo

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 09/01/2026 **EQUIPO/LUGAR** Barcaluent #1

ITEMS	BU	REG	DEF	NA
1. Existe señalización clara y visible en el área de trabajo			✓	
2. Se encuentran demarcadas y señalizadas las áreas de acopio o de peligro			✓	
3. Estado de la señalización preventiva		✓		
4. Estado de la señalización reglamentaria			✓	
5. Estado de la señalización prohibitiva			✓	
6. Estado de la señalización informativa			✓	
7. El extintor cuenta con señalización			✓	
8. La tubería de la draga se encuentra señalizada				✓
9. Estado de las vallas informativas del proyecto.				✓
10. Existe señalización suficiente en el área de trabajo			✓	
11. Los recipientes de los residuos se encuentran señalizados			✓	
12. Estado de las rutas de evacuación.			✓	
13. Los recipientes para almacenar sustancias químicas están señalizados.				✓
14. Estado de la señalización luminosa a bordo.				✓

BU=Bueno - REG=Regular – DEF=Deficiente -NA= No Aplica

Observaciones: Se requiere instalar señalización preventiva como peligro excavación profunda y señalización reglamentaria como uso obligatorio de los EPP. Señalización prohibitiva como prohibido arrojar basura e informativa como punto de encuentro, punto de hidratación, rutas de evacuación.

Nota: La excavación solo está señalizada con cinta de peligro

Nombre de quien Inspecciona: Yesuth Polo Navarro

Cargo: Vigia HSE

Powered by CamScanner

B&P	**INSPECCION A SEÑALIZACION DE OBRA**	**Código: GIM-R-021** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

PROYECTO: CB544- Caño Hondo

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 09/02/2026 **EQUIPO/LUGAR** Buzo cubierta #2

ITEMS	BU	REG	DEF	NA
1. Existe señalización clara y visible en el área de trabajo			✓	
2. Se encuentran demarcadas y señalizadas las áreas de acopio o de peligro			✓	
3. Estado de la señalización preventiva		✓		
4. Estado de la señalización reglamentaria			✓	
5. Estado de la señalización prohibitiva			✓	
6. Estado de la señalización informativa			✓	
7. El extintor cuenta con señalización			✓	
8. La tubería de la draga se encuentra señalizada				✓
9. Estado de las vallas informativas del proyecto.				✓
10. Existe señalización suficiente en el área de trabajo			✓	
11. Los recipientes de los residuos se encuentran señalizados			✓	
12. Estado de las rutas de evacuación.			✓	
13. Los recipientes para almacenar sustancias químicas están señalizados.				✓
14. Estado de la señalización luminosa a bordo.				✓

BU=Bueno - REG=Regular – DEF=Deficiente -NA= No Aplica

Observaciones: Se requiere instalar señalización preventiva como peligro excavación profunda señalización reglamentaria como uso obligatorio de los E.P.P. Señalización prohibitiva como prohibido arrojar basura e informativa como punto de encuentro, punto de hidratación, rutas de evacuación

Nota:

Nombre de quien Inspecciona: Yesenia Polo Navarro

Cargo: Vigia HSE

Powered by CamScanner

B&P	**INSPECCION A SEÑALIZACION DE OBRA**	**Código: GIM-R-021** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

PROYECTO: CBSUM- Coco Hondo

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 09/02/2026 **EQUIPO/LUGAR** Boxculvert #3

ITEMS	BU	REG	DEF	NA
1. Existe señalización clara y visible en el área de trabajo			✓	
2. Se encuentran demarcadas y señalizadas las áreas de acopio o de peligro			✓	
3. Estado de la señalización preventiva		✓		
4. Estado de la señalización reglamentaria			✓	
5. Estado de la señalización prohibitiva			✓	
6. Estado de la señalización informativa			✓	
7. El extintor cuenta con señalización			✓	
8. La tubería de la draga se encuentra señalizada				✓
9. Estado de las vallas informativas del proyecto.				✓
10. Existe señalización suficiente en el área de trabajo			✓	
11. Los recipientes de los residuos se encuentran señalizados			✓	
12. Estado de las rutas de evacuación.			✓	
13. Los recipientes para almacenar sustancias químicas están señalizados.				✓
14. Estado de la señalización luminosa a bordo.				✓

BU=Bueno - REG=Regular – DEF=Deficiente -NA= No Aplica

Observaciones: Se requiere instalar Señalización Preventiva como peligro excavacion profunda Señaliza con reglamentario como uso obligatorio de los EPP Señaliza como prohibitivo como prohibido arrojar basura, e informativo como punto de encuentro, punto de hidratacion y rutas de evacuacion

Nota: La excavacion solo esta señalizado con cinta de peligro

Nombre de quien Inspecciona: Yesmith Polo Navarro

Cargo: Vigia HSE

Powered by CamScanner

B&P	**INSPECCION A SEÑALIZACION DE OBRA**	**Código: GIM-R-021** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

PROYECTO: CBSM4 - Caño Hondo

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 09/02/2026 **EQUIPO/LUGAR** Box culvert #4

ITEMS	BU	REG	DEF	NA
1. Existe señalización clara y visible en el área de trabajo			✓	
2. Se encuentran demarcadas y señalizadas las áreas de acopio o de peligro			✓	
3. Estado de la señalización preventiva		✓		
4. Estado de la señalización reglamentaria			✓	
5. Estado de la señalización prohibitiva			✓	
6. Estado de la señalización informativa			✓	
7. El extintor cuenta con señalización			✓	
8. La tubería de la draga se encuentra señalizada				✓
9. Estado de las vallas informativas del proyecto.				✓
10. Existe señalización suficiente en el área de trabajo			✓	
11. Los recipientes de los residuos se encuentran señalizados			✓	
12. Estado de las rutas de evacuación.			✓	
13. Los recipientes para almacenar sustancias químicas están señalizados.				✓
14. Estado de la señalización luminosa a bordo.				✓

BU=Bueno - REG=Regular – DEF=Deficiente -NA= No Aplica

Observaciones: Se requiere instalar Señalización Preventiva como peligro excavación profunda Señalización Reglamentaria como uso obligatorio de los EPP, Señalización prohibitiva como prohibido arrojar basura, e informativa como punto de encuentro, punto de hidratación, rutas de evacuación.

Nota: La excavación solo está Señalizada con cinta de peligro

Nombre de quien Inspecciona: Yesuth Pablo Navarro

Cargo: Vigia HSE

Powered by CamScanner

B&P	**INSPECCION A SEÑALIZACION DE OBRA**	**Código: GIM-R-021** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

PROYECTO: C6S44- Caño Hondo

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 23/02/2026 **EQUIPO/LUGAR** Boxculvert #4

ITEMS	BU	REG	DEF	NA
1. Existe señalización clara y visible en el área de trabajo			✓	
2. Se encuentran demarcadas y señalizadas las áreas de acopio o de peligro			✓	
3. Estado de la señalización preventiva		✓		
4. Estado de la señalización reglamentaria			✓	
5. Estado de la señalización prohibitiva			✓	
6. Estado de la señalización informativa			✓	
7. El extintor cuenta con señalización			✓	
8. La tubería de la draga se encuentra señalizada				✓
9. Estado de las vallas informativas del proyecto.				✓
10. Existe señalización suficiente en el área de trabajo			✓	
11. Los recipientes de los residuos se encuentran señalizados			✓	
12. Estado de las rutas de evacuación.			✓	
13. Los recipientes para almacenar sustancias químicas están señalizados.				✓
14. Estado de la señalización luminosa a bordo.				✓

BU=Bueno - REG=Regular – DEF=Deficiente -NA= No Aplica

Observaciones: Se requiere instalar señalización con preventiva como peligro excavación profunda señalización con reglamentaria como uso obligatorio de los EPP, señalización prohibitiva como prohibido arrojar basura, e informativa como punto de encuentro, punto de hidratación, mapas de evacuación.

Nota: La excavación solo está señalizada con cinta de peligro

Nombre de quien Inspecciona: Yesmith Polo Navarro

Cargo: Vigia HSE

Powered by CamScanner

B&P	**INSPECCION A SEÑALIZACION DE OBRA**	**Código: GIM-R-021** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

PROYECTO: C 6544- caño Hondo

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 23/02/2026 **EQUIPO/LUGAR** Box culvert #2

ITEMS	BU	REG	DEF	NA
1. Existe señalización clara y visible en el área de trabajo			✓	
2. Se encuentran demarcadas y señalizadas las áreas de acopio o de peligro			✓	
3. Estado de la señalización preventiva		✓		
4. Estado de la señalización reglamentaria			✓	
5. Estado de la señalización prohibitiva			✓	
6. Estado de la señalización informativa			✓	
7. El extintor cuenta con señalización			✓	
8. La tubería de la draga se encuentra señalizada				✓
9. Estado de las vallas informativas del proyecto.				✓
10. Existe señalización suficiente en el área de trabajo			✓	
11. Los recipientes de los residuos se encuentran señalizados			✓	
12. Estado de las rutas de evacuación.			✓	
13. Los recipientes para almacenar sustancias químicas están señalizados.				✓
14. Estado de la señalización luminosa a bordo.				✓

BU=Bueno - REG=Regular – DEF=Deficiente -NA= No Aplica

Observaciones: Se requiere instalar señalizacion preventiva como peligro excavacion profunda señalizacion reglamentaria como uso obligatorio de los EPP, señalizacion prohibitiva como prohibido arrojar basura e informativa como punto de encuentro, punto de hidratacion, rutas de evacuacion.

Notar la excavacion solo está señalizada con cinta de peligro

Nombre de quien Inspecciona: yesnith polo navarro

Cargo: Vigia HSE

Powered by CamScanner

B&P	**INSPECCION A SEÑALIZACION DE OBRA**	**Código: GIM-R-021** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

PROYECTO: C Gas 44 - Caño Hondo

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 23/02/2026 **EQUIPO/LUGAR** Boxculvert #3

ITEMS	BU	REG	DEF	NA
1. Existe señalización clara y visible en el área de trabajo			✓	
2. Se encuentran demarcadas y señalizadas las áreas de acopio o de peligro			✓	
3. Estado de la señalización preventiva		✓		
4. Estado de la señalización reglamentaria			✓	
5. Estado de la señalización prohibitiva			✓	
6. Estado de la señalización informativa			✓	
7. El extintor cuenta con señalización			✓	
8. La tubería de la draga se encuentra señalizada				✓
9. Estado de las vallas informativas del proyecto.				✓
10. Existe señalización suficiente en el área de trabajo			✓	
11. Los recipientes de los residuos se encuentran señalizados			✓	
12. Estado de las rutas de evacuación.			✓	
13. Los recipientes para almacenar sustancias químicas están señalizados.				✓
14. Estado de la señalización luminosa a bordo.				✓

BU=Bueno - REG=Regular – DEF=Deficiente -NA= No Aplica

Observaciones: Se requiere instalar señalización preventiva como peligro excavación profunda. Señalización reglamentaria como uso obligatorio de los EPP. Señalización prohibitiva como prohibido arrojar basura e informativa como punto de encuentro, punto de hidratación, rutas de evacuación.

Nota: La excavación solo está señalizada con cinta de peligro

Nombre de quien Inspecciona: Yesmith Vanessa

Cargo: Vigia HSE

Powered by CamScanner

B&P	**INSPECCION A SEÑALIZACION DE OBRA**	**Código: GIM-R-021** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

PROYECTO: CGSM4

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 25-02-2026 **EQUIPO/LUGAR** Box #5

ITEMS	BU	REG	DEF	NA
1. Existe señalización clara y visible en el área de trabajo			✓	
2. Se encuentran demarcadas y señalizadas las áreas de acopio o de peligro			✓	
3. Estado de la señalización preventiva	✓			
4. Estado de la señalización reglamentaria			✓	
5. Estado de la señalización prohibitiva			✓	
6. Estado de la señalización informativa	✓			
7. El extintor cuenta con señalización			✓	
8. La tubería de la draga se encuentra señalizada			✓	
9. Estado de las vallas informativas del proyecto.			✓	
10. Existe señalización suficiente en el área de trabajo			✓	
11. Los recipientes de los residuos se encuentran señalizados			✓	
12. Estado de las rutas de evacuación.			✓	
13. Los recipientes para almacenar sustancias químicas están señalizados.			✓	
14. Estado de la señalización luminosa a bordo.			✓	

BU=Bueno - REG=Regular – DEF=Deficiente -NA= No Aplica

Observaciones:

El punto no cuenta con las señalizaciones requeridas

Nombre de quien Inspecciona: Jesus Herrera

Cargo: Vigia HSEQ

Powered by CamScanner

B&P	**INSPECCION A SEÑALIZACION DE OBRA**	**Código: GIM-R-021** **Versión: 1** **Fecha: 15-08-2024**

PROYECTO: CGSM4

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 25-02-2026 **EQUIPO/LUGAR** Reforestacion

ITEMS	BU	REG	DEF	NA
1. Existe señalización clara y visible en el área de trabajo				✓
2. Se encuentran demarcadas y señalizadas las áreas de acopio o de peligro				✓
3. Estado de la señalización preventiva				✓
4. Estado de la señalización reglamentaria				✓
5. Estado de la señalización prohibitiva				✓
6. Estado de la señalización informativa				✓
7. El extintor cuenta con señalización				✓
8. La tubería de la draga se encuentra señalizada				✓
9. Estado de las vallas informativas del proyecto.				✓
10. Existe señalización suficiente en el área de trabajo				✓
11. Los recipientes de los residuos se encuentran señalizados				✓
12. Estado de las rutas de evacuación.				✓
13. Los recipientes para almacenar sustancias químicas están señalizados.				✓
14. Estado de la señalización luminosa a bordo.				✓
BU=Bueno - REG=Regular – DEF=Deficiente -NA= No Aplica				

Observaciones:

El punto no cuenta con las señalizaciones requeridas

Nombre de quien Inspecciona:

Cargo:

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN DE KIT CONTROL DERRAME	Codigo: GIM-R-012 Version: 1 Fecha: 15-01-2024

PROYECTO: C 6544 - Caño Hormiga

FECHA: 04/02/2026

UBICACIÓN	ELEMENTOS DEL KIT (marcar con X si esta dentro del kit o dejar en blanco si no esta)														OBSERVACIONES / COMENTARIOS
	PAÑOS ABSORVENTES	MAT. ABSOR.	BARRERAS	ALMOHADILLAS	JABON DESENGRASANTE	CINTA DE SEÑALIZACION	CEPILLO	PALA	BOLSA ROJA	BASILLA EPOXICA	GUANTES NITRILO	MASCARILLA	GAFAS	MALETIN	
Punto Base	X	X	X		X	X		X	X		X	X		X	Sin almohadillas, sin cepillo, sin manilla epoxica Bungalow
Cat 345		X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	Sin paños absorventes, sin cepillo, sin guantes de nitrilo
Cat 325		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	Sin paños absorventes, sin cepillo

Yesuth polo

NOMBRE QUIEN INSPECCIONA

Yesuth polo

FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	CÓDIGO: GIM-R-023 VERSIÓN: 1 FECHA: 15-08-2024

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

FECHA: 18/02/2026	INSPECCIONADO POR: Yesmith Polo Navarro
CIUDAD: Santa Magdalena	PROYECTO: CGSM4 - Cairo Hondo (Box culvert #1)

AREA DE TRABAJO Y PUNTO DE MANDO UNIFICADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿La carpa se encuentra limpia, despejada de herramientas o residuos químicos y sólidos?	✓			
¿Las áreas se encuentran libres de obstáculos que permitan el fácil acceso hacia otros lugares de trabajo, entradas y salidas?	✓			
¿Los suelos se encuentran limpios, sin presencia de materiales, herramientas, aceites u otros?	✓			
¿Existen canecas o depósitos de basura en el puesto de trabajo o centro de acopio para los trabajos?	✓			Se almacenan temporalmente los residuos en bolsas de basura
¿Al terminar la jornada laboral se deja la estación de trabajo limpia y libres de obstáculos?	✓			
¿Se cuenta con lavamanos?		✓		
¿Se cuenta con botiquín de primeros auxilios?		✓		Se debe contar de botiquín para la atención inmediata de lesiones y emergencias comunes
¿Se cuenta con camilla?		✓		Se debe contar con camilla para garantizar la seguridad y el bienestar del personal
¿Se cuenta con extintor?		✓		Se debe contar de extintor, ya que se cuenta con planta eléctrica y equipos electrónicos que pueden generar un conato de incendio
¿Se cuenta con kit control derrame?		✓		Es importante contar con kit de control de derrame para la atención oportuna de alguna derrame que se pueda presentar
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS				
¿Se encuentran almacenado los residuos de la manera adecuada según matriz de compatibilidad?			✓	
¿El almacenamiento de materiales peligrosos cumple con las normas de seguridad , acompañada con rótulos y fichas de seguridad correspondiente?			✓	
¿Al finalizar las tareas el área de trabajo permanece limpia, sin desechos, herramientas y otros?	✓			
MAQUINARIA Y EQUIPO				
¿Se encuentra limpio y ordenadas de buena manera?	✓			
¿Se observan derrames de aceite, grasa u otro líquido?		✓		
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO				
¿Se encuentran almacenada las sustancias químicas de la manera adecuada según especificaciones?			✓	
¿Se colocan las herramientas en su lugar al finalizar las tareas?	✓			
¿Las herramientas y equipos de trabajo se encuentran limpios?	✓			
¿Las herramientas y equipos de trabajo se encuentran en buenas condiciones?	✓			
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				
¿Los equipos de protección personal se encuentran limpios , ordenados y en buen estado?	✓			
¿Los equipos de protección personal se encuentran en buen estado?	✓			
¿Se utilizan los equipo de protección personal de la forma adecuada?	✓			

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	CÓDIGO: GIM-R-023 VERSIÓN: 1 FECHA: 15-08-2024

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

FECHA: 17/02/2026	INSPECCIONADO POR: Yesmith Polo Navarro
CIUDAD: Zalamua Magdalena	PROYECTO: CBS44 - Caño Mondo (Box culvert #2)

AREA DE TRABAJO Y PUNTO DE MANDO UNIFICADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿La carpa se encuentra limpia, despejada de herramientas o residuos químicos y sólidos?	✓			
¿Las áreas se encuentran libres de obstáculos que permitan el fácil acceso hacia otros lugares de trabajo, entradas y salidas?	✓			
¿Los suelos se encuentran limpios, sin presencia de materiales, herramientas, aceites u otros?	✓			
¿Existen canecas o depósitos de basura en el puesto de trabajo o centro de acopio para los trabajos?	✓			Se almacenan temporalmente los residuos en bolsas de basura
¿Al terminar la jornada laboral se deja la estación de trabajo limpia y libres de obstáculos?	✓			
¿Se cuenta con lavamanos?		✓		
¿Se cuenta con botiquín de primeros auxilios?		✓		Se debe contar de botiquín para la atención inmediata de lesiones y enfermedades
¿Se cuenta con camilla?		✓		Se debe contar con camilla para garantizar la seguridad y el bienestar del personal
¿Se cuenta con extintor?		✓		Se debe contar de extintor. Ya que no cuenta con planta eléctrica y grupos electrógenos que pueden generar un conato de incendio
¿Se cuenta con kit control derrame?		✓		Es importante contar con Kit de control de derrame para la atención oportuna de algún derrame que se pueda presentar
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS				
¿Se encuentran almacenado los residuos de la manera adecuada según matriz de compatibilidad?			✓	
¿El almacenamiento de materiales peligrosos cumple con las normas de seguridad, acompañada con rótulos y fichas de seguridad correspondiente?			✓	
¿Al finalizar las tareas el área de trabajo permanece limpia, sin desechos, herramientas y otros?	✓			
MAQUINARIA Y EQUIPO				
¿Se encuentra limpio y ordenadas de buena manera?	✓			
¿Se observan derrames de aceite, grasa u otro liquido?		✓		
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO				
¿Se encuentran almacenada las sustancias químicas de la manera adecuada según especificaciones?			✓	
¿Se colocan las herramientas en su lugar al finalizar las tareas?	✓			
¿Las herramientas y equipos de trabajo se encuentran limpios?	✓			
¿Las herramientas y equipos de trabajo se encuentran en buenas condiciones?	✓			
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				
¿Los equipos de protección personal se encuentran limpios, ordenados y en buen estado?	✓			
¿Los equipos de protección personal se enouentran en buen estado?	✓			
¿Se utilizan los equipo de protección personal de la forma adecuada?	✓			

Powered by CamScanner

BaP	INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO	CÓDIGO: GIM-R-023 VERSIÓN: 1 FECHA: 15-08-2024

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

FECHA: 18/02/2026	INSPECCIONADO POR: Yesuth Polo Navarro
CIUDAD: Salamina Magdalena	PROYECTO: CBS44 - Cerro Hondo CBX culvert #3)

AREA DE TRABAJO Y PUNTO DE MANDO UNIFICADO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿La carpa se encuentra limpia, despejada de herramientas o residuos químicos y sólidos?	✓			
¿Las areas se encuentran libres de obstáculos que permitan el fácil acceso hacia otros lugares de trabajo, entradas y salidas?	✓			
¿Los suelos se encuentran limpios, sin presencia de materiales, herramientas, aceites u otros?	✓			
¿Existen canecas o depósitos de basura en el puesto de trabajo o centro de acopio para los trabajos?	✓			Se almacenan temporalmente los residuos en bolsas de basura
¿Al terminar la jornada laboral se deja la estación de trabajo limpia y libres de obstáculos?	✓			
¿Se cuenta con lavamanos?		✓		
¿Se cuenta con botiquin de primeros auxilios?		✓		Se debe dotar de botiquin para la atencion inmediata de lesiones y emergencias comunes
¿Se cuenta con camilla?		✓		Se debe dotar con camilla para garantizar la seguridad y el bienestar del Personal
¿Se cuenta con extintor?		✓		Se debe dotar de extintor. Ya que se cuenta con planta electrica y equipos electricos que pueden generar un conato de incendio
¿Se cuenta con kit control derrame?		✓		Es importante contar con kit de control de derrame para la atencion oportuna de algun derrame que se pueda presentar.
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS				
¿Se encuentran almacenado los residuos de la manera adecuada según matriz de compatibilidad?			✓	
¿El almacenamiento de materiales peligrosos cumple con las normas de seguridad , acompañada con rótulos y fichas de seguridad correspondiente?			✓	
¿Al finalizar las tareas el área de trabajo permanece limpia, sin desechos, herramientas y otros?	✓			
MAQUINARIA Y EQUIPO				
¿Se encuentra limpio y ordenadas de buena manera?	✓			
¿Se observan derrames de aceite, grasa u otro liquido?		✓		
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO				
¿Se encuentran almacenada las sustancias quimicas de la manera adecuada según especificaciones?			✓	
¿Se colocan las herramientas en su lugar al finalizar las tareas?	✓			
¿Las herramientas y equipos de trabajo se encuentran limpios?	✓			
¿Las herramientas y equipos de trabajo se encuentran en buenas condiciones?	✓			
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				
¿Los equipos de protección personal se encuentran limpios , ordenados y en buen estado?	✓			
¿Los equipos de protección personal se encuentran en buen estado?	✓			
¿Se utilizan los equipo de proteccion personal de la forma adecuada?	✓			

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	Codigo	GI-R-024
		Fecha	1/02/2023
		Version	1

RPM 3.800 PROYECTO CGSM4 - Canto Hondo OPERADOR Daniel Rivera

SEMANA DESDE 02 HASTA 08 MES 02 AÑO 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del mango fijo y auxiliar			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)			✓		✓		✓		✓		✓				
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora			✓		✓		✓		✓		✓				Las RPM del disco son superior a las RPM de la pulidora
	Estado general de la guia y la guarda			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓		✓		✓				

Yasmith Polo N

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

FIRMA DE QUIEN SUPERVISA

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	Codigo	GI-R-024
		Fecha	1/02/2023
		Version	1

RPM 11.000 PROYECTO C6544 - Caño Hondo OPERADOR manuel pusiña

SEMANA DESDE 02 HASTA 08 MES 02 AÑO 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓				✓		✓						
	Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓				✓		✓						El interruptor es adaptado
	Estado del accesorio portadiscos			✓				✓		✓						
	Estado del mango fijo y auxiliar			✓				✓		✓						
	Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓				✓		✓						
	Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)			✓				✓		✓						
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora			✓				✓		✓						Las RPM del disco es superior a las RPM de la pulidora
	Estado general de la guía y la guarda			✓				✓		✓						
	Estado de la plaqueta de identificación			✓				✓		✓						

Yesuth Polo N
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

FIRMA DE QUIEN SUPERVISA

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	Codigo	GI-R-024
		Fecha	1/02/2023
		Version	1

RPM 3.800 PROYECTO CBSM4- Caño Hornillos OPERADOR Daniel Rivera

SEMANA DESDE 09 HASTA 15 MES 02 AÑO 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del mango fijo y auxiliar	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓		✓				Las RPM del disco son superior a las RPM de la pulidora
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

FIRMA DE QUIEN SUPERVISA

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING

INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA

Codigo	GI-R-024
Fecha	1/02/2023
Version	1

RPM 11.000 PROYECTO CGSM4- Caño Honda OPERADOR manuel pasion

SEMANA DESDE 09 HASTA 15 MES 02 AÑO 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓				El interruptor es adaptado
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del mango fijo y auxiliar	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓		✓				Los RPM del disco son superior a los RPM de la pulidora
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

Yezmith Polo
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

FIRMA DE QUIEN SUPERVISA

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	Codigo	GI-R-024
		Fecha	1/02/2023
		Version	1

RPM 11.000 PROYECTO C6544-Caño Hondo OPERADOR manuel pasión

SEMANA DESDE 09 HASTA 15 MES 02 AÑO 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓				Interruptor es adaptado
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del mango fijo y auxiliar	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓		✓				Las RPM del disco es superior a las RPM de la pulidora
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

Yezuith Polo V

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN

FIRMA DE QUIEN SUPERVISA

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	Codigo	GI-R-024
		Fecha	1/02/2023
		Version	1

RPM 11.000 PROYECTO C.6544- Caño Hondo OPERADOR manuel Pozón

SEMANA DESDE 16 HASTA 22 MES 02 AÑO 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓		✓		✓		✓		✓				El interruptor es adaptado
	Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del mango fijo y auxiliar			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)			✓		✓		✓		✓		✓				
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora			✓		✓		✓		✓		✓				Las RPM del disco son superior a las RPM de la pulidora
	Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓		✓		✓				

Yasuth Polo
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

FIRMA DE QUIEN SUPERVISA

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	Codigo	GI-R-024
		Fecha	1/02/2023
		Version	1

RPM 11.000 PROYECTO C.6544- Caño Hondo OPERADOR manuel Pozón

SEMANA DESDE 16 HASTA 22 MES 02 AÑO 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓		✓		✓		✓		✓				El interruptor es adaptado
	Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del mango fijo y auxiliar			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)			✓		✓		✓		✓		✓				
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora			✓		✓		✓		✓		✓				Las RPM del disco son superior a las RPM de la pulidora
	Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓		✓		✓				

Yasuth Polo
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

FIRMA DE QUIEN SUPERVISA

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	Codigo	GI-R-024
		Fecha	1/02/2023
		Version	1

RPM 11.000 PROYECTO CGS44 - Cerro Hondo OPERADOR Orlando Carrillo

SEMANA DESDE 23 HASTA 01 MES 03 AÑO 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓				El interruptor es adoptado
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del mango fijo y auxiliar	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	✓		✓		✓		✓		✓		✓				Los RPM del disco son superiores a los RPM de la pulidora
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

Yesuth Polo V
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

FIRMA DE QUIEN SUPERVISA

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING

INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA DE METAL

Codigo	GI-R-034
Fecha	6/02/2026
Version	1

RPM 3.800 PROYECTO CBSMH- Cano Hondo OPERADOR Jonathan Santalaranga

SEMANA DESDE 16 HASTA 22 MES 02 AÑO 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del brazo de corte y resorte de retorno			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado de la prensa de fijación			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado de la base y puntos de apoyo			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)			✓		✓		✓		✓		✓				
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la tronzadora			✓		✓		✓		✓		✓				Las RPM del disco son superior a las RPM de la tronzadora
	Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓		✓		✓				

Yesmith Polo V
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION

FIRMA DE QUIEN SUPERVISA

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA DE METAL	Codigo	GI-R-034
		Fecha	6/02/2026
		Version	1

RPM 3.800 PROYECTO C 6544 - Caño Hondo OPERADOR Gustavo Estupiñan

SEMANA DESDE 23 HASTA 01 MES 03 AÑO 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del brazo de corte y resorte de retorno	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado de la prensa de fijación	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado de la base y puntos de apoyo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la ~~tronzadora~~	✓		✓		✓		✓		✓		✓				Las RPM del disco son superiores a las de la pulidora
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION Yesmith Delgado

FIRMA DE QUIEN SUPERVISA

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO:	GI-R-021
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/02/2021

PROYECTO C6544 - Caño Honda PERÍODO: DEL 02 AL 08 DE 2026

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palustra	Colima			✓		✓		✓		✓		✓			
Pala	Colima			✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	Dewalt			✓		✓		✓		✓		✓			
Mona	Milenio			✓		✓		✓		✓		✓			
Machete	Gavilan			✓		✓		✓		✓		✓			
Pala	Colima			✓		✓		✓		✓		✓			
Pico	Dafer			✓		✓		✓		✓		✓			
Bichinque	Artesanal			✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: INS H menores Box # 1

Inspeccionado por:

FIRMA: Yesuth Pola N.

NOMBRE: Yesuth Varela

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO:	GI-R-021
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/02/2021

PROYECTO CG544- Caño Hondo PERÍODO: DEL 02 AL 08 DE 2026

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
pala	colima			✓		✓		✓		✓		✓			
Buchinque	Artesanal			✓		✓		✓		✓		✓			
palin	Hemaguz			✓		✓		✓		✓		✓			
Palin	colima			✓		✓		✓		✓		✓			
pico	Dafer			✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: IHS Hmenores Box # 2

Inspeccionado por:

FIRMA: Yesuth Polo V

NOMBRE: Yesuth Venegas

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO:	GI-R-021
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/02/2021

PROYECTO CGSHH- Coiba Hondo PERÍODO: DEL 02 AL 08 DE 2026

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Bichmogue	Interamal			✓				✓		✓		✓			
Pica	Hemogro			✓				✓		✓		✓			
Pala	Hemogro			✓				✓		✓		✓			
Tenaza	Dubotools			✓				✓		✓		✓			
Sugeta	Cuscen			✓				✓		✓		✓			
Punza	Thaukimg			✓				✓		✓		✓			
Palustraja	Hemogro			✓				✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: Ins H menores Box #3

Inspeccionado por:

FIRMA: Yesuth polo v

NOMBRE: Yesuth Vanessa

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO:	GI-R-021
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/02/2021

PROYECTO CG544- Caño Hondo PERÍODO: DEL 02 AL 08 DE 2026

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pica	Colima			✓				✓		✓		✓			
Rechazque	Artisanal			✓				✓		✓		✓			
Tenaza	Dubai tools			✓				✓		✓		✓			
palustroga	Hunoguo			✓				✓		✓		✓			
martillo	Hunoguo			✓				✓		✓		✓			
Pica	Hunoguo			✓				✓		✓		✓			
Serrucho	colima			✓				✓		✓		✓			
pala	Agrotek			✓				✓		✓		✓			
Punza	thaukins			✓				✓		✓		✓			
segueta	Cuscus			✓				✓		✓		✓			
pala	Hunoguo			✓				✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: Las Herramientas Box #4

Inspeccionado por:

FIRMA: Yesuth Pola N

NOMBRE: Yesuth Valverde

Powered by CamScanner

PANAMERICAN MINING & ENGINEERING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO:	GI-R-021
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/02/2021

PROYECTO CGS44- Cañon Honduo PERÍODO: DEL 02 AL 08 DE 2026

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicate dobla	Hemogro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machete	colima	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
palin	Colima	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palodraga	Colima	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Lima	Bellota.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machete	Hemogro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: Ins H Menores Reforestación

Inspeccionado por:

FIRMA: Yesuth Pola N

NOMBRE: Yesuth Vanessa

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO:	GI-R-021
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/02/2021

PROYECTO CGSM4- Cañó Honda PERÍODO: DEL 09 AL 15 DE 2026

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palin	Colin	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pachinaje	Artesanal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pala	Colin	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pico	Dafer	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machete	Gavilan	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	Dewalt	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mona	Milwis	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palustraga	colin	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por:

FIRMA: Yesuth Palau

NOMBRE: Yesuth Vanessa

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO:	GI-R-021
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/02/2021

PROYECTO C6544-Caños Hondo PERÍODO: DEL 09 AL 15 DE 2026

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
pala	Colima	✓		✓		✓		✓		✓					
pico	Dafer	✓		✓		✓		✓		✓					
Barra 9 lbs	Asterowal	✓		✓		✓		✓		✓					
palin	Colima	✓		✓		✓		✓		✓					
palin	Hermoyo	✓		✓		✓		✓		✓					
Alicate corta frio	JS tools	✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES: Ins H Menores Box culvert #2

Inspeccionado por:

FIRMA: Yesuth palos

NOMBRE: yesuth vanessa

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO:	GI-R-021
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/02/2021

PROYECTO: Cgsmu - Cerro Hondo PERÍODO: DEL 09 AL 15 DE 2026

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Brichaque	Artesanal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pico	Hemaco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palustraga	Hemaco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Punzo	Thorking	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Segueta	Crescen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tenaza	Dubaitools	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Punzon	Thorking	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillo	Hemaco	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: Ins H Menores Box culvert #3

Inspeccionado por:

FIRMA: Yesuth Pabon

NOMBRE: Yesuth Vanessa

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DRILLING & ENGINEERING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO:	GHR-021
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/02/2021

PROYECTO: CBSU4 - Caño Hondo PERÍODO: DEL 09 AL 15 DE 2026

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pico	Colima	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Bichiroque	Artesanal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pala	Ayontek	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Segueta	Corsen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Punza	Thonking	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pala	Hermogo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Serrucho	Colima	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pica	Hermogo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillo	Hermogo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tenaza	Dubai tool	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palustraga	Hermogo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: Inst Menores Boxculvert #4

Inspeccionado por:

FIRMA: Yesuth Palomo

NOMBRE: Yesuth Vanessa

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO:	GI-R-021
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/02/2021

PROYECTO CGSM4-Cañaveral PERÍODO: DEL 09 AL 15 DE 2026

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Machete	Hermagua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicate Diablo	Gávilan	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palín	Colima	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paladanga	Colima	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Lima	Bellota	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machete	Hermagua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machete	Collins	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: Ins H Menores Reforestación

Inspeccionado por:

FIRMA: Yesuth Pabon

NOMBRE: Yesuth Vanegas

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO:	GI-R-021
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/02/2021

PROYECTO CGSM4 PERÍODO: DEL 18 AL 21 DE 2026

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palastrago	Colina					✓		✓		✓		✓			
Palin	Colina					✓		✓		✓		✓			
Pala	Colina					✓		✓		✓		✓			
Pico	Henagro					✓		✓		✓		✓			
Segueta	Crescen					✓		✓		✓		✓			
Martillo	Henagro					✓		✓		✓		✓			
Tenaza	Dubaitool					✓		✓		✓		✓			
Machete	Colina					✓		✓		✓		✓			
Lima	Bellota					✓		✓		✓		✓			
Alicate Doble	Gabilan					✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

Reporte trabajo

Inspeccionado por:

FIRMA: Jesús Marón

NOMBRE: Jesus David Marón

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES

CÓDIGO:	GI-R-021
VERSIÓN:	1
FECHA:	1/02/2021

PROYECTO CGSM3 PERÍODO: DEL 18 AL 21 DE 2026

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Martillo	Henagro					✓		✓		✓		✓			
Segueta	crescen					✓		✓		✓		✓			
Pautre	Colina					✓		✓		✓		✓			
Bichiveque	Artesanal					✓		✓		✓		✓			
Pala Draga	Henagro					✓		✓		✓		✓			
Pala	Henagro					✓		✓		✓		✓			
Pinza	ShonKeng					✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

Box #4

Inspeccionado por:

FIRMA: Jesus Herron

NOMBRE: Jesus David Herron

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO:	GI-R-021
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/02/2021

PROYECTO C6514 - Cerro Hondo PERÍODO: DEL 16 AL 22 DE 2026

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicate Diablo	Bates choice					✓		✓		✓		✓			
Pala	Hernagua					✓		✓		✓		✓			
Pico	Pafer					✓		✓		✓		✓			
Palin	Colima					✓		✓		✓		✓			
Mona	Milenio					✓		✓		✓		✓			
Palustranga	Colima					✓		✓		✓		✓			
Cizalla	Dewalt					✓		✓		✓		✓			
Bichoque	Artesanal					✓		✓		✓		✓			
Pala	Colima					✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: Las Herramientas Box culvert #1

Inspeccionado por:

FIRMA: Yesuth Polan

NOMBRE: Yesuth Vanessa

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO:	GI-R-021
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/02/2021

PROYECTO C6514 - Cerro Hondo PERÍODO: DEL 16 AL 22 DE 2026

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicate Diablo	Bates choice					✓		✓		✓		✓			
Pala	Hernagua					✓		✓		✓		✓			
Pico	Pafer					✓		✓		✓		✓			
Palin	Colima					✓		✓		✓		✓			
Mona	Milenio					✓		✓		✓		✓			
Palustranga	Colima					✓		✓		✓		✓			
Cizalla	Dewalt					✓		✓		✓		✓			
Bichoque	Artesanal					✓		✓		✓		✓			
Pala	Colima					✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: Las Herramientas Box culvert #1

Inspeccionado por:

FIRMA: Yesuth Polan

NOMBRE: Yesuth Vanessa

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO:	GI-R-021
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/02/2021

PROYECTO C6514- Caño Hondo PERÍODO: DEL 16 AL 22 DE 2026

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Alicate corta frio	Ingtools			✓		✓		✓		✓		✓			
Brocha grue	Interoual			✓		✓		✓		✓		✓			
palin	Colima			✓		✓		✓		✓		✓			
palin	Henogro			✓		✓		✓		✓		✓			
pala	Colima			✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: Ins H Menores Box culvert #2

Inspeccionado por:

FIRMA: Yesuth palo N

NOMBRE: Yesuth vanessa

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DRILLING & ENGINEERING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO:	GI-R-021
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/02/2021

PROYECTO CGSU4-Caño Hondo PERÍODO: DEL 16 AL 22 DE 2026

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Martillo	Hmogno			✓		✓		✓		✓		✓			
Palastrogue	Hmogno			✓		✓		✓		✓		✓			
Pinza	Hauskmy			✓		✓		✓		✓		✓			
Pinza	Dubai tools			✓		✓		✓		✓		✓			
Buchinague	Artesanal			✓		✓		✓		✓		✓			
Segueta	crescent			✓		✓		✓		✓		✓			
Pico	Hmogno			✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: Las Herramientas menores Box # 3

Inspeccionado por:

FIRMA: Yesuth Polo N

NOMBRE: Yesuth Vanessa

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO:	GI-R-021
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/02/2021

PROYECTO: CGSAU - Caño Hondo PERÍODO: DEL 23 AL 01 DE 2026

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
pala	Henrique	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
palin	Colima	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicate Diablo	Bates choice	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Buchnoque	Artesanal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Masa	Milenio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
pico	Pafer	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
palustraga	Colima	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: INSHHemons Boxculvert #1

Inspeccionado por:

FIRMA: yesuth palon

NOMBRE: yesuth vinesso

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO:	GI-R-021
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/02/2021

PROYECTO Cosua- Caño Hondo PERÍODO: DEL 23 AL 01 DE 2026

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Brchuoque	Artesanal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
pico	Dafer	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
pala	Colima	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
palin	Colmi	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicate corta frio	JS tools	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	Dewalt	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
palin	Henogro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillo	Henogro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: Ins H Menores Boxculvert #2

Inspeccionado por:

FIRMA: Yesuth Polo N

NOMBRE: Yesuth Valmeyer

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO:	GI-R-021
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/02/2021

PROYECTO CG544- Cañón Hondo PERÍODO: DEL 23 AL 01 DE 2026

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	S	M	B	M	B	M
Martillo	Hemogua	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Segueta	Crescen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Rachuegue	Artesanal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tenaza	Dubai tools	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pinza	Thonkung	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Paladraga	Hemogra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES: Las HM menores Box culvert #3

Inspeccionado por:

FIRMA: Yesuth Polon

NOMBRE: Yesuth Vanegas

Powered by CamScanner

PANAMERICAN	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MENORES	CÓDIGO:	GER-021
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/02/2021

PROYECTO CGSM4 PERÍODO: DEL 23 AL 28 DE 2026

HERRAMIENTA	MARCA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palaalnaga	Colina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin	Colina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pala	Colina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pico	Herragro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Segueta	Crescen	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillo	Herragro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tenaza	Dubaitrol	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machete	Colina	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Lima	Bolleta	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicate Diablo	Gavilan	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Martillo	Herragro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

Reforestacion

Inspeccionado por:

FIRMA: Jesús Morrón

NOMBRE: Jesus David Morron

Powered by CamScanner

ANEXO 4.7.

ENTREGA DE EPP

	FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCCIÓN PERSONAL	CODIGO: GH-R-009 VERSION: 7 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD:	Solarmuro Huila				
PROYECTO:	CG544 - Caño Hondo				
TIPO DE PROTECCION	EPP	INDIQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, LA CANTIDAD ENTREGADA Y OBSERVACIONES			
OTROS	REPELENTE				
CABEZA	CASCO				
	ALERON PARA CASCO				
VISUAL	GAFAS CLARAS				
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS				
	GAFAS OSCURAS	1			
	MONOGAFAS				
CORPORAL	IMPERMEABLE				
	CHALECO SALVAVIDAS				
	PITO PARA CHALECO				
	LUZ PARA CHALECO				
DE MANOS	CARNAZA				
	INDUSTRIAL				
	TIPO INGENIERO				
	POLIURETANO				
	HYCROM				
AUDITIVA	INSERCION				
	COPA				
FACIAL	ESCAFANDRA				
	CARETA DE ESMERILA				
PIES	BOTA PANTANERA				
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR				
	GAFAS DE OXICORTE				
	PROTEC. RESPIRAT.				
	FILTROS				
	MANGAS DE CARNAZA				
	GUANTES SOLDADOR				
	DELANTAL DE CUERO				
	POLAINAS				

	1. El trabajador manifiesta que la dotación y EPP que aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de Terminación del contrato trabajo, me comprometo a hacer la devolución de la dotacion si la empresa asi me lo solicita. 2. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del buen uso de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar conciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo.
FECHA	04/02/2026
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Jesus D Polo
IDENTIFICACION	1003944...
FIRMA DE QUIEN RECIBE	Jesus D Polo
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	yesuth polo
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	yesuth polo

Powered by CamScanner

BAP	FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCCIÓN PERSONAL	CODIGO GH-R-009 VERSION 3 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD:	Salamina Magdalena
PROYECTO:	CGS 44 - Caño Hondo

TIPO DE PROTECCION	EPP	INDIQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, LA CANTIDAD ENTREGADA Y OBSERVACIONES			
OTROS	REPELENTE				
CABEZA	CASCO				
	ALERON PARA CASCO				
VISUAL	GAFAS CLARAS				
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS				
	GAFAS OSCURAS	1	1	1	1
	MONOGAFAS				
CORPORAL	IMPERMEABLE				
	CHALECO SALVAVIDAS				
	PITO PARA CHALECO				
	LUZ PARA CHALECO				
DE MANOS	CARNAZA				
	INDUSTRIAL				
	TIPO INGENIERO				
	POLIURETANO				
	HYCROM				
AUDITIVA	INSERCION				
	COPA				
FACIAL	ESCAFANDRA				
	CARETA DE ESMERILA				
PIES	BOTA PANTANERA				
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR				
	GAFAS DE OXICORTE				
	PROTEC. RESPIRAT.				
	FILTROS				
	MANGAS DE CARNAZA				
	GUANTES SOLDADOR				
	DELANTAL DE CUERO				
	POLAINAS				

1. El trabajador manifiesta que la dotación y EPP que aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de Terminación del contrato trabajo, me comprometo a hacer la devolución de la dotacion si la empresa asi me lo solicita. 2. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de proteccion personal y por ende será responsable del buen uso de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar conciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo.

FECHA	04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Jonatan Murillo	Sin baldo	Yesuth polo	Carlos alfredo
IDENTIFICACION	1082046646	1004111723	1082046517	1010
FIRMA DE QUIEN RECIBE		Sin baldo	Yesuth polo	
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	Yesuth polo	Yesuth polo	Yesuth polo	Yesuth polo
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	Yesuth polo	Yesuth polo	Yesuth polo	Yesuth polo

Powered by CamScanner

B&P	FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCCIÓN PERSONAL	CODIGO: GH-R-009 VERSION: 3 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD: Sabanas Magdalena

PROYECTO: CGSM4 - Caño Hondo

TIPO DE PROTECCION	EPP	INDIQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, LA CANTIDAD ENTREGADA Y OBSERVACIONES			
OTROS	REPELENTE				
CABEZA	CASCO				
	ALERON PARA CASCO				
VISUAL	GAFAS CLARAS				
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS				
	GAFAS OSCURAS		1	1	1
	MONOGAFAS				
CORPORAL	IMPERMEABLE				
	CHALECO SALVAVIDAS				
	PITO PARA CHALECO				
	LUZ PARA CHALECO				
DE MANOS	CARNAZA				
	INDUSTRIAL				
	TIPO INGENIERO			1 Par	1 Par
	POLIURETANO	1 Par	1 Par	1 Par	1 Par
	HYCROM				
AUDITIVA	INSERCION				
	COPA				
FACIAL	ESCAFANDRA				
	CARETA DE ESMERILA				
PIES	BOTA PANTANERA				
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR				
	GAFAS DE OXICORTE				
	PROTEC. RESPIRAT.				
	FILTROS				
	MANGAS DE CARNAZA				
	GUANTES SOLDADOR				
	DELANTAL DE CUERO				
	POLAINAS				

1. El trabajador manifiesta que la dotación y EPP que aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de Terminación del contrato trabajo, me comprometo a hacer la devolución de la dotacion si la empresa asi me lo solicita. 2. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del buen uso de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar conciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo.

FECHA	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Sinibaldo	Jose Cubillo	Jesus Manotas	Johendrys Orozco
IDENTIFICACION	1004121723	1079939636	1079914724	1004298501
FIRMA DE QUIEN RECIBE	Sinibaldo	Jose Cubillo	Jesus Manotas	Johendrys O.
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	Yesuth Vargas	Yesuth Vargas	Yesuth Vargas	Yesuth Vargas
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	Yesuth Polo	Yesuth Polo	Yesuth Polo	Yesuth Polo

Powered by CamScanner

		FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCCIÓN PERSONAL	CODIGO: GH-R-009 VERSION: 3 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD: Salamina Mag

PROYECTO: CGSM4 - Caño Mendo

TIPO DE PROTECCION	EPP	INDIQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, LA CANTIDAD ENTREGADA Y OBSERVACIONES			
OTROS	REPELENTE				
CABEZA	CASCO				
	ALERON PARA CASCO				
VISUAL	GAFAS CLARAS				
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS				
	GAFAS OSCURAS	1	1	1	1
	MONOGAFAS				
CORPORAL	IMPERMEABLE				
	CHALECO SALVAVIDAS				
	PITO PARA CHALECO				
	LUZ PARA CHALECO				
DE MANOS	CARNAZA				
	INDUSTRIAL				
	TIPO INGENIERO				
	POLIURETANO	1 Par	1 Par	1 Par	1 Par
	HYCROM				
AUDITIVA	INSERCION				
	COPA				
FACIAL	ESCAFANDRA	1	1	1	1
	CARETA DE ESMERILA				
PIES	BOTA PANTANERA				
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR				
	GAFAS DE OXICORTE				
	PROTEC. RESPIRAT.				
	FILTROS				
	MANGAS DE CARNAZA				
	GUANTES SOLDADOR				
	DELANTAL DE CUERO				
	POLAINAS				

1. El trabajador manifiesta que la dotación y EPP que aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de Terminación del contrato trabajo, me comprometo a hacer la devolución de la dotacion si la empresa asi me lo solicita. 2. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del buen uso de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar conciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo.

FECHA	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Carlos Alvarez	Cesar Santodomingo	Brayan Gamez	Carlos Gamez
IDENTIFICACION	1079913769	1079936122	1004112831	1083 572 789
FIRMA DE QUIEN RECIBE	Carlos Alvarez	Cesar Stodomingo	Brayan Gamez	Carlos Gamez
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	Yesuth Polo	Yesuth Polo	Yesuth Vanegas	Yesuth Vanegas
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	Yesuth Polo	Yesuth Polo	Yesuth Polo	Yesuth Polo

Powered by CamScanner

B&P	FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCCIÓN PERSONAL	CODIGO: GH-R-009 VERSION: 3 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD: Sabanas Magdalena

PROYECTO: CG544-Cerro Manolo

TIPO DE PROTECCION	EPP	INDIQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, LA CANTIDAD ENTREGADA Y OBSERVACIONES			
OTROS	REPELENTE				
CABEZA	CASCO				
	ALERON PARA CASCO				
VISUAL	GAFAS CLARAS				
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS				
	GAFAS OSCURAS				
	MONOGAFAS				
CORPORAL	IMPERMEABLE				
	CHALECO SALVAVIDAS				
	PITO PARA CHALECO				
	LUZ PARA CHALECO				
DE MANOS	CARNAZA				
	INDUSTRIAL				
	TIPO INGENIERO				
	POLIURETANO				
	HYCROM				
AUDITIVA	INSERCION				
	COPA				
FACIAL	ESCAFANDRA	1	1	1	1
	CARETA DE ESMERILA				
PIES	BOTA PANTANERA				
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR				
	GAFAS DE OXICORTE				
	PROTEC. RESPIRAT.				
	FILTROS				
	MANGAS DE CARNAZA				
	GUANTES SOLDADOR				
	DELANTAL DE CUERO				
	POLAINAS				

1. El trabajador manifiesta que la dotación y EPP que aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de Terminación del contrato trabajo, me comprometo a hacer la devolución de la dotacion si la empresa asi me lo solicita. 2. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del buen uso de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar conciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo.

FECHA	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Jesus Manota	Sinibaldo	Johandys Arrieta	Jose Carrillo
IDENTIFICACION	1079914724	1004121723	1004298504	1079934636
FIRMA DE QUIEN RECIBE	Jesus Manota	Sinibaldo	Johandys Arrieta	Jose Carrillo
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	Yesuth Vanegas	Yesuth Vanegas	Yesuth Vanegas	Yesuth Vanegas
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	Yesuth Polo	Yesuth Polo	Yesuth Polo	Yesuth Polo

Powered by CamScanner

B&P	FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCCIÓN PERSONAL	CODIGO: GH-R-009 VERSION: 3 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD:	Salamina - Magdalena
PROYECTO:	CGSH4. - Box#4

TIPO DE PROTECCION	EPP	INDIQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, LA CANTIDAD ENTREGADA Y OBSERVACIONES			
OTROS	REPELENTE				
CABEZA	CASCO				
	ALERON PARA CASCO				
VISUAL	GAFAS CLARAS				
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS				
	GAFAS OSCURAS				
	MONOGAFAS				
CORPORAL	IMPERMEABLE				
	CHALECO SALVAVIDAS				
	PITO PARA CHALECO				
	LUZ PARA CHALECO				
DE MANOS	CARNAZA	1	1		
	INDUSTRIAL				
	TIPO INGENIERO				
	POLIURETANO				
	HYCROM				
AUDITIVA	INSERCION				
	COPA				
FACIAL	ESCAFANDRA				
	CARETA DE ESMERILA				
PIES	BOTA PANTANERA				
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR				
	GAFAS DE OXICORTE				
	PROTEC. RESPIRAT.				
	FILTROS				
	MANGAS DE CARNAZA				
	GUANTES SOLDADOR				
	DELANTAL DE CUERO				
	POLAINAS				

1. El trabajador manifiesta que la dotación y EPP que aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de Terminación del contrato trabajo, me comprometo a hacer la devolución de la dotacion si la empresa asi me lo solicita. **2.** El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del buen uso de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar conciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo

FECHA	20-02-2026	20-02-2026		
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	leonel ternero	Miguel Leiva		
IDENTIFICACION	1079973169	1193165789		
FIRMA DE QUIEN RECIBE	leonel	Miguel		
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	Jesus Marun	Jesus Marun		
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	Jesus Marun	Jesus Marun		

Powered by CamScanner

B&P	FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCCIÓN PERSONAL	CODIGO: GH-R-009 VERSION: 3 FECHA: 1/06/2025

CIUDAD: Salamina Magdalena

PROYECTO: CBS 114

TIPO DE PROTECCION	EPP	INDIQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE, LA CANTIDAD ENTREGADA Y OBSERVACIONES			
OTROS	REPELENTE				
CABEZA	CASCO				
	ALERON PARA CASCO				
VISUAL	GAFAS CLARAS				
	GAFAS INDOORS-OUTDOORS				
	GAFAS OSCURAS				
	MONOGAFAS				
CORPORAL	IMPERMEABLE				
	CHALECO SALVAVIDAS				
	PITO PARA CHALECO				
	LUZ PARA CHALECO				
DE MANOS	CARNAZA				
	INDUSTRIAL				
	TIPO INGENIERO	1	1		
	POLIURETANO				
	HYCROM				
AUDITIVA	INSERCION				
	COPA				
FACIAL	ESCAFANDRA				
	CARETA DE ESMERILA				
PIES	BOTA PANTANERA				
SOLDADOR	CARETA SOLDADOR				
	GAFAS DE OXICORTE				
	PROTEC. RESPIRAT.				
	FILTROS				
	MANGAS DE CARNAZA				
	GUANTES SOLDADOR				
	DELANTAL DE CUERO				
	POLAINAS				

1. El trabajador manifiesta que la dotación y EPP que aquí se entrega es y será de la empresa en todo momento, en caso de Terminación del contrato trabajo, me comprometo a hacer la devolución de la dotacion si la empresa asi me lo solicita. **2.** El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del buen uso de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar conciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo.

FECHA	24-02-2026	24-02-2026			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Pedro Wilches	Carlos Borrero			
IDENTIFICACION	1081 328 029	10100			
FIRMA DE QUIEN RECIBE	Pedro Wilches				
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	Jesus Morron	Jesus Morron			
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	Jesus Morron	Jesus Morron			

Powered by CamScanner

ANEXO 4.8.

DOCUMENTOS CARROTANQUE DE COMBUSTIBLE

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGURO

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO | MES | DÍA)	VIGENCIA DESDE (AÑO | MES | DÍA) LAS 00 HORAS DEL	HASTA (AÑO | MES | DÍA) LAS 23:59 HORAS DEL
2025-02-13	2025-02-16	2026-02-15

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1508006089328000	WGV681	CARGA O MIXTO	PUBLICO	5193	2016

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	CISTERNA O TANQUE
	LÍNEA VEHÍCULO: NPR	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
4HK1337408	9GDNPR756GB004850	9GDNPR756GB004850	3.41

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
E D S LA TORCOROMA ALVAREZ TRILLOS	3164745602	NI	9003160034	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	12042	0	MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 580700	$ 301900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 884700

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Las obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento. usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345 para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Habeas Data

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otras ramas de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos, para [illegible]

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 179523734

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA PRADERA

NIT: 901396508

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-041

Fecha de expedición: 2025/02/13

Fecha de vencimiento: 2026/02/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WGV681

CLASE: CAMION

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2016

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5193

NRO. MOTOR: 4HK1-337408

NRO. CHASIS: 9GDNPR756GB004850

VIN: 9GDNPR756GB004850

LÍNEA: NPR

COLOR: BLANCO GALAXIA

NOMBRE PROPIETARIO: E.D.S LA TORCOROMA ALVAREZ TRILLOS S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO

Concesión RUNT S.A. BAC ...

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO | MES | DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)
2025-02-22	2025-02-25	2026-02-24

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1508006102627000	SZL039	CARGA O MI□TO	PUBLICO	5193	2013

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
3	CHEVROLET	NPR	CISTERNA O TANQUE

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
4HK1967365	9GDNPR755DB001918	9GDNPR755DB001918	4.10

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
EDS LA TORCOROMA ALVAREZ TRILLOS	3164745602	NI	9003160034	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	12042	0	MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 580700	$ 301900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 884700

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77 UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

[1] **Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.**

[2] **Para las demás tarifas no citadas en (1).**

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 180802267

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA PRADERA

NIT: 901396508

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-041

Fecha de expedición: 2025/04/15

Fecha de vencimiento: 2026/04/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SZL039

CLASE: CAMION

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 2013

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 5193

NRO. MOTOR: 4HK1-967365

NRO. CHASIS: 9GDNPR755DB001918

VIN: 9GDNPR755DB001918

LÍNEA: NPR

COLOR: BLANCO GALAXIA

NOMBRE PROPIETARIO: E.D.S LA TORCOROMA ALVAREZ TRILLOS S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO | MES | DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)
2025-04-10	2025-04-12	2026-04-11

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1508006184199000	SMG733	CARGA O MI□TO	PUBLICO	3907	2009

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
2	HYUNDAI	HD 65	CISTERNA O TANQUE

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
DADB8369939	KMFGA17BP9C096198	KMFGA17BP9C096198	4.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TORCOROMA COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL SA	3164745602	NI	9003160034	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	12042	0	MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 580700	$ 301900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 884700

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

VIGILADO
LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 180844016

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA PRADERA

NIT: 901396508

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-041

Fecha de expedición: 2025/04/19

Fecha de vencimiento: 2026/04/19

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SMG733

CLASE: CAMION

MARCA: HYUNDAI

MODELO: 2009

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3907

NRO. MOTOR: DADB8369939

NRO. CHASIS: KMFGA17BP9C096198

VIN: KMFGA17BP9C096198

LÍNEA: HD 65

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: TORCOROMA COMERCIALIZADOR INDUTRIAL S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO

ANEXO 4.9.

MEDEVAC

MEDEVAC

CÓDIGO	GIM-R-062
VERSIÓN	1
FECHA	15/03/2024

PROYECTO: **CGSM4-CAÑO HONDO**

FECHA DE ACTUALIZACION: **4/03/2026**

CEDULA	APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	ACTIVIDAD/UBICACION	EMPRESA	ARL	EPS	TIPO DE SANGRE	ALERGIAS		¿A QUE ES ALERGICO?
									SI	NO	
1129578658	ACEVEDO COLON	YURANI ANDREA	INGENIERO AMBIENTALES SENIOR	Programar y ejecutar actividades para dar cumplimiento a los programas ambientales	PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	SANITAS	B+	X		AINES
85479599	ALVAREZ MAZA	EDILBERTO ENRIQUE	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ	SURA	MUTUAL SER			X	
1004213282	ALVAREZ MANGA	KEVIN AN DRES	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO	SURA		A+		X	
1079913769	ALVAREZ MONTENEGRO	CARLOS ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	O+		X	
17955049	ANILLO ARDILA	SEBASTIAN	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA		A+		X	
1010080507	BARRERA MARTINEZ	CARLOS	MARINO	Realizar tareas de apoyo a la operación	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	B+		X	
5078310	BONET ACUÑA	ADOLFO RAFAEL	CAPATAZ	Ejecutar las actividades asignadas, como apoyo a los procesos	RUBEN FRANCO	SURA	CAJACOPI	O+		X	
5078708	BORJA MARTINEZ	ROBERTO CARLOS	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ	SURA	COOSALUD	O+		X	
5078169	BORJA MARTINEZ	GERMAN EUTIMIO	OFICIAL		RUBEN FRANCO	SURA		O+		X	
1079911492	BUELVAS COLON	EDUARDO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ	SURA				X	
1079934636	CABALLERO CHARRIS	JOSE LEONARDO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD	O+		X	
1081027709	CAMACHO CANTILLO	JOSE GREGORIO	MARINO	Realizar tareas de apoyo a la operación	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	CAJA COPI	O+		X	
5095498	CANTILLO CARRILLO	EDUARDO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ	SURA		O+		X	
1079916394	CANTILLO PACHECO	EDULFO ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO	SURA		O+		X	
85479893	CANTILLO BOLAÑO	ORLANDO RAFAEL	MAESTRO DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO	SURA		O+		X	
5062296	CERVANTES OROZCO	YECID ALFONSO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA	NUEVA EPS	O+		X	
3761940	DE LOS RIOS GUETTE	ARISTIDES MANUEL	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA				X	
1081027248	ESCORCIA SIERRA	LUIS EDUARDO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA	CAJACOPI	O+		X	
1079912738	FANDIÑO GUTIERREZ	DAVINSON JOSE	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	COOSALUD			X	
1108767049	FUENTES ACOSTA	LINA MARIA	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	Planificar, desarollar y evaluar actividades sociales del proyecto	VIAS Y DRAGADOS	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	A+	X		AINES
1083572789	GAMEZ SANTODOMINGO	CARLOS SEGUNDO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD	O+		X	
10044121831	GAMEZ RODRIGUEZ	BRAYAN DAVID	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	SALUD TOTAL	O+		X	
8860886	GIL ORTEGA	CRISTIAN DAVID	INGENIERO RESIDENTE	Programar , coordinar y llevar el control de la ejecucion delproyecto.	PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS			X	
1126120263	GARCIA OROZCO	JOSE JORGE	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	NUEVA EPS	O+		X	
1004121723	GOMEZ ESCORCIA	SINIBALDO JOSE	MARINO	Realizar tareas de apoyo a la operación	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD			X	
1004121720	GOMEZ FABIAN	JORGE LUIS	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	CAJACOPI			X	
1004122911	GOMEZ DE LA CRUZ	NASER IVAN	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	COOSALUD	B+		X	
1010150262	GONZALEZ VERGARA	ADRIANA CRISTINA	PROFESIONAL EN SST		PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	SURA	O+	X		AINES Y ALISCOS
5078492	HERRERA CABARCAS	ARTURO RAFAEL	OFICIAL	Ejecutar las actividades asignadas, como apoyo a los procesos	MANUEL HERNANDEZ	SURA		O+		X	
1084738073	IBAÑEZ OSPINO	ALFONSO ENRIQUE	OPERADOR DE EXCAVADORA	Operar y ejecutar maniobras de remoción mecánica	VIAS Y DRAGADOS	SEGUROS BOLIVAR	SALUD TOTAL			X	
5078921	LARA PASION	HERIBERTO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ	SURA		O+		X	
1193165789	LEIVA GAMEZ	MIGUEL ALFONSO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA				X	
84456544	LOPEZ CLAVIJO	CHRISTIAN DARO	ESPECIALISTA HIDRAULICO	Revision de aspectos hidraulicos del proyecto	INDEPENDIENTE	COLMENA	SANITAS	O+		X	
7598807	MAESTRE CHARRIS	DANIEL ALBERTO	MARINO	Realizar tareas de apoyo a la operación	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD	O+	X		AINES
1079933354	MANCILLA MONTENEGRO	ARMANDO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA				X	
1079914724	MANOTAS GUTIERREZ	JESUS DAVID	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD	B+		X	
1085224296	MARTINEZ JIMENEZ	MARIA AUXILIADORA	BIOLOGA	Trabajar en la conservación de especies y hábitats, diseñando estrategias para proteger la biodiversidad.	PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD	O+		X	
5078217	MARTINEZ PABON	REYNALDO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA	NUEVA EPS	O+		X	
1081028345	MERCADO RUDAS	CARLOS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	NUEVA EPS	O+		X	
1004212861	MORRÓN VIZCAINO	JESUS DAVID	VIGIA HSE	Realizar todas las actividades asignadas que surjan de la implementación y documentación del SGI relacionados con la SST en todos los procesos.	VIAS Y DRAGADOS	SEGUROS BOLIVAR	COOSALUD			X	
9877310	OROZCO OROZCO	JADER IVAN	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA	NUEVA EPS	O+		X	
1004298507	OROZCO FERREIRA	JOHENDRYS	MARINO	Realizar tareas de apoyo a la operación	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	MUTUAL SER	O+		X	
1193547906	OROZCO GUETE	JESUS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ	SURA				X	
1100549999	PALENCIA GUZMAN	JESUS DANIEL	TOPOGRAFO	Realizar actividades topobatrimetricas en el proyecto asignado	VIAS Y DRAGADOS	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS			X	
5094631	PASION GUTIERREZ	JOSE MANUEL	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	MUTUAL SER	O+		X	
5078804	PASION MANGA	MANUEL GREGORIO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA	NUEVA EPS	B+		X	
73316407	PEREZ SIERRA	ESNEIDER RAFAEL	MAESTRO DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	MUTUAL SER	B+		X	
1082046517	POLO NAVARRO	YESMITH VANESSA	VIGIA HSE	Realizar todas las actividades que surjan de la implementacion y documentacion del SGI relacionados con la SST en todos los procesos	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	SANITAS			X	
9464493661	PRADA DAZA	EUGENIO	GERENTE DEL PROYECTO	Llevar parte administrativa y financiera del proyecto	INDEPENDIENTE	SURA	SURA			X	
8506100	RICARDO CRUZATE	DANIEL JOSE	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	MUTUAL SER	O+		X	
1081028364	ROPAIN ROCA	OLIVER RAFAEL	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	CAJACOPI	O+		X	
1118813194	ROYS CORZO	EDILBERTO GREGORIO	INGENIERO RESIDENTE	Programar , coordinar y llevar el control de la ejecucion delproyecto.	PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	SURA	O+		X	
1031127390	SANTISTEBAN MURIEL	IVONNE STIBALIZ	INGENIERO TOPOGRAFICO	Coordinar todas las actividades topo-batrimetricas en el proyecto	PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	SANITAS			X	
1079936122	SANTODOMINGO DE LA CRUZ	CESAR ALFREDO	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	O+		X	
1079912129	SANTODOMINGO CALVO	JONATHAN ENRIQUE	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA				X	
1079913169	TERNERA CASTRO	LEONEL DAVID	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	RUBEN FRANCO MEDINA	SURA	COOSALUD			X	
7595150	TERNERA ORDOÑEZ	REINALDO JAIME	AYUDANTE DE OBRA	Realizar tareas de apoyo a la operación de la obra a la cual es asignado	MANUEL HERNANDEZ VALBUENA	SURA	COOSALUD	A+		X	
9153002	VALENCIA PEREZ	FELIX	OPERADOR DE EXCAVADORA	Operar y ejecutar maniobras de remoción mecánica	VIAS Y DRAGADOS	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	A+		X	
73475172	VIZCAINO ESCOBAR	ANGEL MARIA	DIRECTOR DE OBRA		PANAMERICAN	SEGUROS BOLIVAR	SURA	A+		X	
1081028028	WILCHEZ GONZALEZ	PEDRO MIGUEL	MARINO	Realizar tareas de apoyo a la operación	CONSORCIO CGSM 4	SEGUROS BOLIVAR	NUEVA EPS	A+		X	

ANEXO 4.10.

DIRECTORIO DE EMERGENCIA

	DIRECTORIO DE EMERGENCIAS	CÓDIGO	GIM-R-060
		VERSIÓN	1
		FECHA	15/03/2024

PROYECTO/AREA:	CGSM 4 - MANTENIMIENTO CUERPOS DE AGUA QUE ALIMENTA LA CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA (CAÑO HONDO)
FECHA DE ACTUALIZACION:	4/03/2026

ENTIDAD	DIRECCION	TELEFONO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
CONTROL TRAFICO MARTIMO		3104770348 CANAL VHF 16 Y 69		
POLICIA NACIONAL : Linea de atencion de emergencias		123		
BOMBEROS		3016142992	Salamina	Magdalena
BOMBEROS	Calle 6 Carrera 6 Esquina	Líneas de atención: Teléfono: CITEL (57)6015557926 Ext.: 213 Número Directo.: CITEL (57)6015557932 Celular: CITEL +57 322 347 2150 - +57 3228662944	Sitio Nuevo	Magdalena
OFICINA GESTION DEL RIESGO Jaime Enrique Camacho Avendaño	cdgrd.magdalena@gestiondelriesgo.gov.co	3202406959/ 3013867413	Santa Marta	Magdalena
CRUZ ROJA		132		
DEFENSA CIVIL		144		
DIRECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE		167		
AIR-E		115		
GASES DEL CARIBE		164		
ARL SEGUROS BOLIVAR		# 322 Linea Nacional 018000123322 Línea de atencion: 601 312 2122		
E.S.E Hospital Local de Salamina (NIVEL 1)	Calle 5 # 7 - 13	3145068603	Salamina	Magdalena
E.S.E. HOSPITAL SANTANDER HERRERA	Calle 14 N° 12 - 46	Teléfono Conmutador: 4157997 Teléfono móvil: 3006305003	Pivijay	Magdalena
Fundacion Clinica Santa Helena	Carrera 16 Calle 12-31	3127815760	Pivijay	Magdalena
HOSPITAL DE SITIO NUEVO	Carrera 8 # 2-20	3232317064 - esesitionuevo@gmail.com	Sitio Nuevo	Magdalena
Fundacion Hospital Universidad Del Norte	CALLE 30 VIA AL AEROPUERTO AL LADO DEL PARQUE MUVDI, SOLEDAD, ATLANTICO	(605) 3715562 - 3715555	Soledad	Atlantico
VIGIA HSE	YESMITH POLO - JESUS MORRON		Salamina	Magdalena

ANEXO 4.11.

GUIA PARA LA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIAS

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

FECHA:	12/02/2026
NOMBRE DEL OBSERVADOR:	Yesmith Polo Navarro
TIPO DE EMERGENCIA	Ataque de abejas africanas
PROYECTO:	CGSM4 - Caño Honda
EMBARCACION:	

PARTICIPANTES*

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Jesus Manotas	Consorcio	Jesus Manotas
Johandys Orozco	Consorcio	Johandys Orozco
Cesar santodomingo	consorcio	Cesar Stodomingo
Sinbaldo	Consorcio	Sinbaldo
Jose caballero	consorcio	Jose caballero

- En caso de que haya más participantes, regístrelos en el GH-R-007 Formato de asistencia a charlas o capacitaciones

Powered by CamScanner

	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
EVALUACION GENERAL				
¿Se tomaron las acciones iniciales pertinentes por quien detecto la emergencia?	✓			
¿Los participantes conocían sus roles y responsabilidades para la emergencia?	✓			
¿Se activaron los planes y procedimientos relacionados?	✓			
¿El ejercicio se realizó en forma ordenada y disciplinada?	✓			
¿Asistió todo el personal?		✓		
¿Fallo algún equipo o sistema?		✓		
EVALUACIÓN DE EVACUACIÓN				
¿Se dio la voz de alerta (se realizaron maniobras de resguardo)?	✓			
¿Se dio la voz de alarma?	✓			
¿La alerta y alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas?			✓	
¿Todos los empleados y visitantes acataron la señal de alerta y alarma?			✓	
¿Se tiene una adecuada señalización de las rutas de evacuación?			✓	
¿Las rutas de evacuación fueron suficientes para la evacuación de todos los participantes?			✓	
¿Se realizó la evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes?	✓			

Powered by CamScanner

	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
¿Se identificó (aron) al (los) Líder y/o Coordinador (es) de evacuación?			✓	
¿El (los) Líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó (aron) con claridad sus funciones?			✓	
¿El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verifico o vatido que el personal a su cargo evacuo su área?			✓	
¿Se contó con participación total de las áreas y partes interesadas para la realización del ejercicio?		✓		
EVALUACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO				
¿Hubo organización en el o los puntos de encuentro?	✓			
¿Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas las medidas de seguridad para los participantes que evacuaron?	✓			
¿Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y visitantes que evacuaron?	✓			
¿Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron novedades?	✓			
¿El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de reingreso?	✓			
¿Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de encuentro?	✓			
¿Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad?	✓			

Powered by CamScanner

CONTROL DE TIEMPOS

Señor observador: Registre cronológicamente todas las actividades que se realicen **durante el simulacro**, indicando la hora

ACTIVIDAD	HORA	OBSERVACIONES
Activación de la alerta		
Activación de la alarma de emergencia		
Salida de la primera persona		
Salida de la última persona		
Llegada de la primera persona al punto de encuentro		
Llegada de la última persona al punto de encuentro		
Retorno a las instalaciones		

Powered by CamScanner

	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
B&P		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 12/02/2026 **Lugar:** Refuerzo de cim

Expositor: yesuth polo navarro **Hora Inicio:** 7:32am **Hora Final:** 7:47am

Temas: Evaso de ataque de abejas africanas **Obra:** CBSU4 - Cam Heredia

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Jesus Manotas	1079947424	Consorcio	Ayudante	Jesus Manota
2.	Johandys Orozco T	1009218504	Consorcio	Marino	Johandys O
3.	Cesar Santodomingo	1079936122	Consorcio	Ayudante	Cesar Stodomingo
4.	Balboa	1004117728	Consorcio	Marino	Balboa
5.	JOSE CABALLERO	1079934664	consorcio	AYUDANTE	Jose Caballero
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5 **Firma del Expositor (es):** yesuth polo n

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

FECHA:	12/02/2026
NOMBRE DEL OBSERVADOR:	Yesmith Polo Navarro
TIPO DE EMERGENCIA	Ataque de abejas africanas
PROYECTO:	CGSM - Caño Mocho
EMBARCACION:	

PARTICIPANTES*

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Luis Escorcia	RF	
Leonel Ternera	RF	Leonel
Miguel Leiva	RF	Miguel Leiva
Reinaldo Martinez P	RF	
Sebastián Castillo	RF	Castillo
Jader Ivan Orozco	RF	Jader Ivan Orozco O
Kevin Alvarez	RF	Kevin
Edwin Lopez	RF	Edwin Lopez C

- En caso de que haya más participantes, regístrelos en el GH-R-007 Formato de asistencia a charlas o capacitaciones

Powered by CamScanner

	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
EVALUACION GENERAL				
¿Se tomaron las acciones iniciales pertinentes por quien detecto la emergencia?	✓			
¿Los participantes conocían sus roles y responsabilidades para la emergencia?	✓			
¿Se activaron los planes y procedimientos relacionados?	✓			
¿El ejercicio se realizó en forma ordenada y disciplinada?	✓			
¿Asistió todo el personal?		✓		
¿Fallo algún equipo o sistema?		✓		
EVALUACIÓN DE EVACUACIÓN				
¿Se dio la voz de alerta (se realizaron maniobras de resguardo)?	✓			
¿Se dio la voz de alarma?	✓			
¿La alerta y alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas?			✓	
¿Todos los empleados y visitantes acataron la señal de alerta y alarma?			✓	
¿Se tiene una adecuada señalización de las rutas de evacuación?			✓	
¿Las rutas de evacuación fueron suficientes para la evacuación de todos los participantes?			✓	
¿Se realizó la evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes?	✓			

Powered by CamScanner

	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
¿Se identificó (aron) al (los) Líder y/o Coordinador (es) de evacuación?			✓	
¿El (los) Líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó (aron) con claridad sus funciones?			✓	
¿El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verifico o valido que el personal a su cargo evacuo su área?			✓	
¿Se contó con participación total de las áreas y partes interesadas para la realización del ejercicio?		✓		
EVALUACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO				
¿Hubo organización en el o los puntos de encuentro?	✓			
¿Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas las medidas de seguridad para los participantes que evacuaron?	✓			
¿Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y visitantes que evacuaron?	✓			
¿Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron novedades?	✓			
¿El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de reingreso?	✓			
¿Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de encuentro?	✓			
¿Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad?	✓			

Powered by CamScanner

CONTROL DE TIEMPOS

Señor observador: Registre cronológicamente todas las actividades que se realicen **durante el simulacro**, indicando la hora

ACTIVIDAD	HORA	OBSERVACIONES
Activación de la alerta		
Activación de la alarma de emergencia		
Salida de la primera persona		
Salida de la última persona		
Llegada de la primera persona al punto de encuentro		
Llegada de la última persona al punto de encuentro		
Retorno a las instalaciones		

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 12/01/2026 **Lugar:** Boxculvert #4

Expositor: yesuth polo navarro **Hora Inicio:** 09:35am **Hora Final:** 09:51am

Temas: En caso de ataque de abejas africanas **Obra:** CBS44- Coño Hermoso

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Luis Escorcia	1081027298	RF	ayudante de obra	
2.	Leonel Ternera	1079913159	RF	Ayudante	Leonel
3.	Miguel Leiva	1.193165789	RF		Miguel Leiva
4.	Reinaldo Martinez P	5078217	RF	A. de obra.	
5.	Sebastián Acuña	17955049	RF	A d O	
6.	Jadryan Charco	9874310	RF	ayudante	Jadryan C.
7.	Kevin Alvarez	1004213202	RF	ayudante de obra	Kevin A
8.	Eduardo	1079916290	RF	oficial	Eduardo C
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 8 **Firma del Expositor (es):** yesuth polo n

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

FECHA:	26/02/2026
NOMBRE DEL OBSERVADOR:	yesuth polo navarro
TIPO DE EMERGENCIA	En caso de atentado terrorista
PROYECTO:	CB544- Caño Honda
EMBARCACION:	N/A

PARTICIPANTES*

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Arturo Herrera	MH	
Roberto carlos B	MH	
Eduardo Castillo	MH	
Jorge luis	MH	
Jose Jorge	MH	

- En caso de que haya más participantes, regístrelos en el GH-R-007 Formato de asistencia a charlas o capacitaciones

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
EVALUACION GENERAL				
¿Se tomaron las acciones iniciales pertinentes por quien detecto la emergencia?	✓			
¿Los participantes conocían sus roles y responsabilidades para la emergencia?	✓			
¿Se activaron los planes y procedimientos relacionados?	✓			
¿El ejercicio se realizó en forma ordenada y disciplinada?	✓			
¿Asistió todo el personal?		✓		
¿Fallo algún equipo o sistema?		✓		
EVALUACIÓN DE EVACUACIÓN				
¿Se dio la voz de alerta (se realizaron maniobras de resguardo)?	✓			
¿Se dio la voz de alarma?	✓			
¿La alerta y alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas?			✓	
¿Todos los empleados y visitantes acataron la señal de alerta y alarma?	✓			
¿Se tiene una adecuada señalización de las rutas de evacuación?		✓		Señalizacion deficiente
¿Las rutas de evacuación fueron suficientes para la evacuación de todos los participantes?	✓			
¿Se realizó la evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes?	✓			

Powered by CamScanner

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
¿Se identificó (aron) al (los) Líder y/o Coordinador (es) de evacuación?	✓			
¿El (los) Líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó (aron) con claridad sus funciones?	✓			
¿El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verifico o valido que el personal a su cargo evacuo su área?	✓			
¿Se contó con participación total de las áreas y partes interesadas para la realización del ejercicio?		✓		
EVALUACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO				
¿Hubo organización en el o los puntos de encuentro?	✓			
¿Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas las medidas de seguridad para los participantes que evacuaron?	✓			
¿Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y visitantes que evacuaron?	✓			
¿Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron novedades?	✓			
¿El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de reingreso?	✓			
¿Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de encuentro?	✓			
¿Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad?	✓			

Powered by CamScanner

CONTROL DE TIEMPOS

Señor observador: Registre cronológicamente todas las actividades que se realicen **durante el simulacro**, indicando la hora

ACTIVIDAD	HORA	OBSERVACIONES
Activación de la alerta	7:35:50 am	
Activación de la alarma de emergencia		
Salida de la primera persona	7:36:04 am	
Salida de la última persona	7136:16 am	
Llegada de la primera persona al punto de encuentro	7:36 1 21 am	
Llegada de la última persona al punto de encuentro	7136:25 am	
Retorno a las instalaciones	7:50 a.m	

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 26/02/2026 **Lugar:** Box culvert # 1

Expositor: Yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 7:35am **Hora Final:** 7:50am

Temas: En caso de atentado terrorista **Obra:** C 6544 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	[illegible]	5078496	MH	Oficial	
2.	Roberto Cortes B	5078708	MH	Ayudante	
3.	Edwar d Castillo	5.095498	MH	Ayudante	
4.	Jorgelvis	1004121720	MH	Ayudante de obra	Jorgelvis
5.	Jose Jorge	1126 120263	MH	Ayudante	Jose Jorge
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5 **Firma del Expositor (es):** Yesuth Polo N

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

FECHA:	26/02/2026
NOMBRE DEL OBSERVADOR:	yesuth Polo navarro
TIPO DE EMERGENCIA	En caso de atentado demuestra
PROYECTO:	CGSM4- Coco Hondo
EMBARCACION:	N/A

PARTICIPANTES*

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Jhonatan Santiago	MH	
Jesus Orozco	MH	Jesus Orozco
Reinaldo Contreras	MH	Reinaldo
Edilberto Alvarez	MH	
Dairosa Fandiño	MH	Dairosa Fandiño

- En caso de que haya más participantes, regístrelos en el GH-R-007 Formato de asistencia a charlas o capacitaciones

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
EVALUACION GENERAL				
¿Se tomaron las acciones iniciales pertinentes por quien detecto la emergencia?	✓			
¿Los participantes conocían sus roles y responsabilidades para la emergencia?	✓			
¿Se activaron los planes y procedimientos relacionados?	✓			
¿El ejercicio se realizó en forma ordenada y disciplinada?	✓			
¿Asistió todo el personal?		✓		
¿Fallo algún equipo o sistema?		✓		
EVALUACIÓN DE EVACUACIÓN				
¿Se dio la voz de alerta (se realizaron maniobras de resguardo)?	✓			
¿Se dio la voz de alarma?	✓			
¿La alerta y alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas?			✓	
¿Todos los empleados y visitantes acataron la señal de alerta y alarma?	✓			
¿Se tiene una adecuada señalización de las rutas de evacuación?		✓		Señalización deficiente
¿Las rutas de evacuación fueron suficientes para la evacuación de todos los participantes?	✓			
¿Se realizó la evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes?	✓			

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
¿Se identificó (aron) al (los) Líder y/o Coordinador (es) de evacuación?	✓			
¿El (los) Líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó (aron) con claridad sus funciones?	✓			
¿El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verifico o valido que el personal a su cargo evacuo su área?	✓			
¿Se contó con participación total de las áreas y partes interesadas para la realización del ejercicio?		✓		
EVALUACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO				
¿Hubo organización en el o los puntos de encuentro?	✓			
¿Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas las medidas de seguridad para los participantes que evacuaron?	✓			
¿Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y visitantes que evacuaron?	✓			
¿Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron novedades?	✓			
¿El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de reingreso?	✓			
¿Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de encuentro?	✓			
¿Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad?	✓			

Powered by CamScanner

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

CONTROL DE TIEMPOS

Señor observador: Registre cronológicamente todas las actividades que se realicen **durante el simulacro**, indicando la hora

ACTIVIDAD	HORA	OBSERVACIONES
Activación de la alerta	8:50:54 seg am	
Activación de la alarma de emergencia		
Salida de la primera persona	8:51:05 seg am	
Salida de la última persona	8:51:11 seg am	
Llegada de la primera persona al punto de encuentro	8:51:20 seg am	
Llegada de la última persona al punto de encuentro	8:51:28 seg am	
Retorno a las instalaciones	09:05 am	

Powered by CamScanner

B&P	**Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones**	Código: GH-R-007 Versión: 1 Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 26/02/2026 **Lugar:** Boxculvert #2

Expositor: Yesuth polo navarro **Hora Inicio:** 8:50am **Hora Final:** 9:05am

Temas: En caso de atentado terrorista **Obra:** CG SU4 - Caño Hondo

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1.	Jonathan Gutierrez	1079912751	MH	Aprendiz	
2.	Jesus Orozco	1193547906	MH	ayudante	Jesus Orozco
3.	Reinaldo Ternera	7595950	MH	Ayudante	Reinaldo
4.	Edilberto Alvarez	85479599	MH	Ayudante	
5.	Davinson Fontiño	1079912778	MH	Ayudante	Davinson Fontiño
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					

Número Total de Participantes: 5 **Firma del Expositor (es):** Yesuth polo n

Powered by CamScanner

	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

FECHA:	26/02/2026
NOMBRE DEL OBSERVADOR:	Yesmith Polo Navarro
TIPO DE EMERGENCIA	En caso de atentado terrorista
PROYECTO:	CGS44- Canto Hondo
EMBARCACION:	N/A

PARTICIPANTES*

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Luis Escorcia	Rf	
Miguel Leivoc	RF	Miguel Leivoc
Jader Ivan Orozco	RP	Jader Ivan Orozco
Leonel Ternera	Rf	Leonel
Reinaldo Hortiz	Rf	
Eduyo castillo	RF.	
Jerman Borja	RF	
Kevin Alvarez	Rf	Kevin A

- En caso de que haya más participantes, regístrelos en el GH-R-007 Formato de asistencia a charlas o capacitaciones

Powered by CamScanner

PANAMERICAN	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
EVALUACION GENERAL				
¿Se tomaron las acciones iniciales pertinentes por quien detecto la emergencia?	✓			
¿Los participantes conocían sus roles y responsabilidades para la emergencia?	✓			
¿Se activaron los planes y procedimientos relacionados?	✓			
¿El ejercicio se realizó en forma ordenada y disciplinada?	✓			
¿Asistió todo el personal?		✓		
¿Fallo algún equipo o sistema?		✓		
EVALUACIÓN DE EVACUACIÓN				
¿Se dio la voz de alerta (se realizaron maniobras de resguardo)?	✓			
¿Se dio la voz de alarma?	✓			
¿La alerta y alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas?			✓	
¿Todos los empleados y visitantes acataron la señal de alerta y alarma?	✓			
¿Se tiene una adecuada señalización de las rutas de evacuación?		✓		Señalizacion deficiente
¿Las rutas de evacuación fueron suficientes para la evacuación de todos los participantes?	✓			
¿Se realizó la evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes?	✓			

Powered by CamScanner

	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
¿Se identificó (aron) al (los) Líder y/o Coordinador (es) de evacuación?	✓			
¿El (los) Líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó (aron) con claridad sus funciones?	✓			
¿El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verifico o valido que el personal a su cargo evacuo su área?	✓			
¿Se contó con participación total de las áreas y partes interesadas para la realización del ejercicio?		✓		
EVALUACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO				
¿Hubo organización en el o los puntos de encuentro?	✓			
¿Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas las medidas de seguridad para los participantes que evacuaron?	✓			
¿Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y visitantes que evacuaron?	✓			
¿Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron novedades?	✓			
¿El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de reingreso?	✓			
¿Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de encuentro?	✓			
¿Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad?	✓			

Powered by CamScanner

CONTROL DE TIEMPOS

Señor observador: Registre cronológicamente todas las actividades que se realicen **durante el simulacro**, indicando la hora

ACTIVIDAD	HORA	OBSERVACIONES
Activación de la alerta	11:13:16 segam	
Activación de la alarma de emergencia		
Salida de la primera persona	11:13:25 segam	
Salida de la última persona	11:13:34 segam	
Llegada de la primera persona al punto de encuentro	11:13:43 segam	
Llegada de la última persona al punto de encuentro	11:13:58 segam	
Retorno a las instalaciones	11:18:12 segam	

Powered by CamScanner

B&P	Formato de Asistencia a Charlas o Capacitaciones	Código: GH-R-007
		Versión: 1
		Fecha: 01-08-2024

Capacitación/Entrenamiento	X	Charla Seguridad		Charla Técnica	
Re inducción		Inducción		Reunión Informativa	
Otro		¿Cuál?			

Fecha: 26/02/2026 **Lugar:** Boxculvert #3

Expositor: yesuth Polo Navarro **Hora Inicio:** 11:13am **Hora Final:**

Temas: En caso de atentado terrorista **Obra:** CG SM4 - caño Hondo

PARTICIPANTES

NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
1. Luis Escorcia S	1081077248	RF	Ayudante de obra	
2. Miguel Leiva	1193165789	RF		Miguel Leiva
3. Jader Ivan Blanco	9877310	RF	ayudante	Jader Ivan Blanco
4. Leonel Ternera	1079913769	RF	ayudante	Leonel
5. Reinaldo Martinez P	5078217	RF	Ayudante	
6. Edilfo E	1079916324	RF	oficial	Edilfo E
7. Kevin Alvarez	1004213781	RF	ayudante	Kevin A
8. Cesar Borja	5078169	RF	OFICIAL	
9. Manuel Posada		RF		
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Número Total de Participantes: 9 **Firma del Expositor (es):** yesuth Polo N

Powered by CamScanner

	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

FECHA:	26 - 02 - 2026
NOMBRE DEL OBSERVADOR:	Jesús Moreno
TIPO DE EMERGENCIA	En caso de atentado terrorista
PROYECTO:	CCSM4
EMBARCACION:	Box #5

PARTICIPANTES*

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Felix Valencia	V y D	
Pedro Wiches Gonzale	Consorcio	Pedro Wiches
Carlos Alfredo Borrero	Consorcio	
Jesus David Manotas	Consorcio	Jesus David Manotas
Joseca Bullero	consorcio	Joseca Bullero
Carlos Gamez	consorcio	Carlos Gamez
Sinibaldo	Consorcio	Sinibaldo
Brayan David	Consorcio	Brayan Gra
Carlos Alvarez	Consorcio	Carlos Alvarez
/	/	/
/	/	/
/	/	/

- En caso de que haya más participantes, regístrelos en el GH-R-007 Formato de asistencia a charlas o capacitaciones

Powered by CamScanner

	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
EVALUACION GENERAL				
¿Se tomaron las acciones iniciales pertinentes por quien detecto la emergencia?	✓			
¿Los participantes conocian sus roles y responsabilidades para la emergencia?	✓			
¿Se activaron los planes y procedimientos relacionados?	✓			
¿El ejercicio se realizó en forma ordenada y disciplinada?	✓			
¿Asistió todo el personal?	✓			
¿Fallo algún equipo o sistema?	✓			
EVALUACIÓN DE EVACUACIÓN				
¿Se dio la voz de alerta (se realizaron maniobras de resguardo)?	✓			
¿Se dio la voz de alarma?	✓			
¿La alerta y alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas?	✓			
¿Todos los empleados y visitantes acataron la señal de alerta y alarma?	✓			
¿Se tiene una adecuada señalización de las rutas de evacuación?		X		No tiene
¿Las rutas de evacuación fueron suficientes para la evacuación de todos los participantes?	✓	X		no fueron
¿Se realizó la evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes?	✓			

Powered by CamScanner

	GUIA PARA EVALUACION DE PRACTICAS DE EMERGENCIA Y/O SIMULACROS	CODIGO:	GIM-R-072
		VERSION:	2
		FECHA:	11-03-2024

	SI	NO	NO APLICA	COMENTARIOS
¿Se identificó (aron) al (los) Líder y/o Coordinador (es) de evacuación?	✓			
¿El (los) Líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó (aron) con claridad sus funciones?	✓			
¿El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verifico o valido que el personal a su cargo evacuo su área?	✓			
¿Se contó con participación total de las áreas y partes interesadas para la realización del ejercicio?	✓			
EVALUACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO				
¿Hubo organización en el o los puntos de encuentro?	✓			
¿Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas las medidas de seguridad para los participantes que evacuaron?	✓			
¿Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y visitantes que evacuaron?	✓			
¿Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron novedades?	✓			
¿El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de reingreso?	✓			
¿Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de encuentro?	✓			
¿Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad?	✓			

Powered by CamScanner

CONTROL DE TIEMPOS

Señor observador: Registre cronológicamente todas las actividades que se realicen **durante el simulacro**, indicando la hora

ACTIVIDAD	HORA	OBSERVACIONES
Activación de la alerta	7:08 AM	
Activación de la alarma de emergencia	7:08 AM	
Salida de la primera persona	9:09 AM	
Salida de la última persona	7:10 AM	
Llegada de la primera persona al punto de encuentro	7:11 AM	
Llegada de la última persona al punto de encuentro	7:12 AM	
Retorno a las instalaciones	7:15 AM	

Powered by CamScanner

ANEXO 4.12.

INCIDENTES O ACCIDENTES LABORALES

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | sura

EPS a la que está afiliado	Código EPS	ARL a la que está afiliado	Código ARL
EPS COOSALUD	C24	ARL SURA	40

AFP a la que está afiliado: COLPENSIONES — Código AFP: 031

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral: (•) Empleador ( ) Contratante ( ) Cooperativa de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

Nombre o razón social

MANUEL ENRIQUE HERNANDEZ VALBUENA

Tipo de identificación: ( ) NI (•) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA — Número: 8712984

Dirección	Teléfono	Fax
AV DEL FERROCARRIL	3218787623	

Correo electrónico	Departamento	Municipio	Zona
MANUEL.HERNANDEZ.VALBUENA@GMAIL.COM	MAGDALENA	SANTA MARTA	( ) U (•) R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? (•) Si ( ) No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo — Código de la actividad económica del centro de trabajo: 5411201

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES

Dirección	Teléfono	Fax
CL 70 # 32 - 26 PISO 2	3218787623	

Departamento	Municipio	Zona
ATLANTICO	BARRANQUILLA	(•) U ( ) R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación: (•) Planta ( ) Misión ( ) Cooperado ( ) Estudiante o aprendíz ( ) Independiente — Código:

Primer apellido	Segundo apellido	Nombres
FANDIÑO	GUTIERREZ	DAVINSON JOSE

Tipo de identificación	Número	Fecha de nacimiento	Sexo
( ) NI (•) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA	1079912738	15011985	(•) M ( ) F

Dirección	Teléfono	Fax
CL 15 # 3 - 21	3026533503	

Departamento	Municipio	Zona	Cargo
MAGDALENA	PIVIJAY	(•) U ( ) R	OBRERO CONSTRUCCION

Ocupación habitual	Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente
OBREROS DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO: CARRETERAS, PRESAS Y OBRAS SIMILARES	0:9

Fecha de ingreso a la empresa	Salario u honorarios (mensual)	Jornada de trabajo habitual
28012026	1750905	(•) Diurna ( ) Nocturna ( ) Mixto ( ) Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente	Estaba dentro de la empresa?	Día de la semana en el que ocurrio el accidente
06022026 09:00:00	S	Viernes

Jornada en que sucede	¿Estaba realizando su labor habitual?	¿Cuál?
(•) Normal ( ) Extra	(•) Si ( ) No	

¿Causó la muerte al trabajador?	Departamento del accidente	Municipio del accidente	Zona donde ocurrio el accidente
( ) Si (•) No	MAGDALENA	SALAMINA	( ) U (•) R

Total tiempo laborado previo al accidente	Tipo de accidente
2:0	( ) Violencia ( ) Tránsito ( ) Deportivo ( ) Recreativo o cultural (•) Propios del trabajo

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

Lugar donde ocurrió el accidente (●) Dentro de la empresa ( ) Fuera de la empresa

Indique cuál sitio

- ( ) Almacenes o depósitos
- (●) Áreas de producción
- ( ) Áreas recreativas o deportivas
- ( ) Corredores o pasillos
- ( ) Escaleras
- ( ) Parqueaderos o áreas de circulación vehícular
- ( ) Oficinas
- ( ) Otras áreas comunes
- ( ) Otro

Parte del cuerpo aparentemente afectado

- (●) Cabeza
- ( ) Ojo
- ( ) Cuello
- ( ) Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pélvis)
- ( ) Tórax
- ( ) Abdomen
- ( ) Miembros superiores
- ( ) Manos
- ( ) Miembros inferiores
- ( ) Pies
- ( ) Ubicaciones múltiples
- ( ) Lesiones generales u otras

Tipo de Lesión

- ( ) Fractura
- ( ) Luxación
- ( ) Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
- ( ) Conmoción o trauma interno
- ( ) Amputación o ennucleación
- (●) Herida
- ( ) Trauma superficial
- ( ) Golpe contusión o aplastamiento
- ( ) Quemadura
- ( ) Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
- ( ) Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
- ( ) Asfixia
- ( ) Efecto de la electricidad
- ( ) Efecto nocivo de la radiación
- ( ) Lesiones múltiples
- ( ) Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)

- ( ) Máquinas y/o equipos
- ( ) Medios de transporte
- ( ) Aparatos
- ( ) Herramientas, implementos o utensilios
- (●) Materiales o sustancias
- ( ) Radiaciones
- ( ) Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- ( ) Otros agentes no clasificados
- ( ) Animales (vivos o productos animales)
- ( ) Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o forma del accidente

- ( ) Caída de personas
- ( ) Caída de objetos
- ( ) Pisadas, choques o golpes
- ( ) Atrapamientos
- ( ) Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
- ( ) Exposición o contacto con temperatura extrema
- ( ) Exposición o contacto con la electricidad
- ( ) Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o salpicaduras
- (●) Golpes por o contra objetos
- ( ) Otro

Descripción del accidente

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA SOLTANDO SOLTANDO UNA DE LAS VARILLAS DE LA ETRUCTURA DE REFUERZO DE UNO DE LOS MUROS DEL BOXCULVER #2, CUANDO CORTO EL ALAMBRE CON LA PINZA,LA VARILLA DE LA PRESION REEBOTO Y LE GOLPEO LA MEJILLA DERECHA, CAUSANDOLE UNA HERIDA ABIERTA SEMIPROFUNDA EN EL POMULO, PRESENTO SANGRADO, INMEDIATAMENTE SE ENVIA AL PUESTO DE SALUD DEL CARMEN DEL MAGDALENA PARA VALORACION, EL TRABAJADOR TENIA TODOS SUS EPP

Personas que presenciaron el accidente — Hubo personas que presenciaron el accidente? (●) Si ( ) No

		Documento de identidad	No.
Apellidos y nombres	YESMITH POLO NAVARRO		
Cargo	VIGIA HSE	(●) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA	1082046517
Apellidos y nombres		Documento de identidad	No.
Cargo		CC TI CE NU PA	

Persona responsable del informe (Representante o delegado)

		Documento de identidad	No.
Apellidos y nombres	HERNANDEZ BALVUENAS MANUEL	(●) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA	8712984
Cargo	GERENTE		

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente

Fecha de recibido en ARL SURA

ARL | sura
06-02-2026 10:50:22
06-02-2026 10:50:21
RECIBIDO

Fecha Impresión 06-02-2026 10:51:37

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

ANEXO 5

Informe Gestión Social.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG.

CONTRATO DE OBRA No. LP-005-2023.

CONTRATISTA:

CONTRATO No. LP-005-2023.

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".

INFORME SOCIAL

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

Contenido

INTRODUCCIÓN 5

LOCALIZACIÓN GENERAL DE SECTOR A INTERVENIR 6

LOCALIZACIÓN GENERAL 6

LOCALIZACIÓN GENERAL DEL SECTOR A INTERVENIR 7

1. COMPONENTE LECTURA TERRITORIAL 8

1.1. IDENTIFICACIÓN AREA DE INFLUENCIA 8

1.2. DIRECTORIO DE ACTORES 9

1.3. IDENTIFICACIÓN CONTROLES DE RIESGOS 9

2. COMPONENTE COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 10

2.1. INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PAC 10

2.2. DIVULGACIÓN COMUNITARIA 10

2.2.1. PIEZAS DE DIVULGACIÓN 10

2.2.2. VALLA INFORMATIVA 10

2.2.3. REUNIONES DE PARTICIPACIÓN 11

2.3. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, FELICITACIONES (P.Q.R.S.F) 14

2.4. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 14

2.4.1. ACTAS DE VECINDAD 14

3. COMPONENTE CAPACIDAD DE MANO DE OBRA EN LA ZONA 14

4. COMPONENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 16

TABLAS

Tabla 1 Cuadro de responsabilidades 4

Tabla 2 Identificación de impactos sociales 10

Tabla 3 Relación actas de vecindad..... 14

Tabla 4 Información personal contratado..... 15

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización General Ciénaga Grande de Santa Marta 6

Ilustración 2 Caño Hondo, Localización general Tomado de Google Earth 2018 7

Ilustración 3 Valla informativa 11

Ilustración 4 Elaboración acta de vecindad, predio la india 2..... 11

Ilustración 5 Elaboración acta de vecindad, predio Paso Lobo..... 12

Ilustración 6 Elaboración acta de vecindad, predio Bella Sara 12

Ilustración 7 Reunión oficina Secretaría de Planeación. 13

Ilustración 8 Visita a Box Culvert #1. 13

CUADRO DE RESPONSABILIDADES.




RESPONSABLE POR:	NÚMERO DE REVISIÓN		
	0	1	2
Elaboración	Lina Fuentes		
			
	Profesional Social Contratista		
Revisión	Ángel Vizcaino		
			
	Director de Obra.		
Aprobación			
			
	Profesional Social Interventoría		

Tabla 1 Cuadro de responsabilidades

INTRODUCCIÓN

Con el presente informe se dan a conocer las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026, actividades contempladas en el marco del proyecto **"MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES". CONTRATO NO. LP-005-2023.** El componente social, continua en el desarrollo de estrategias que contribuyen a reducir y mitigar los impactos sociales negativos que pudieran ocasionar las actividades realizadas.

A continuación, se detallan cada una de las actividades con sus respectivos productos.

LOCALIZACIÓN GENERAL DE SECTOR A INTERVENIR

LOCALIZACIÓN GENERAL

La Ciénaga Grande de Santa Marta se localiza al Norte del país en el extremo Noroccidental del Departamento del Magdalena, su área de influencia está comprendida entre el nacimiento del caño Schiller en la Ciénaga de Cerro de San Antonio al Sur, el río Magdalena por el Oeste, el Mar Caribe al Norte y al Este por la desembocadura de los ríos Fundación, Aracataca, Sevilla y Frío que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

La ciénaga Grande de Santa Marta es la laguna costera más grande del país con una extensión lagunar de 430 km2, cuenta con una sola conexión con el mar Caribe a través del puente de la barra y está conectada al complejo lagunar del pajaral por intermedio de caños que permiten a su vez intercomunicación con el rio Magdalena

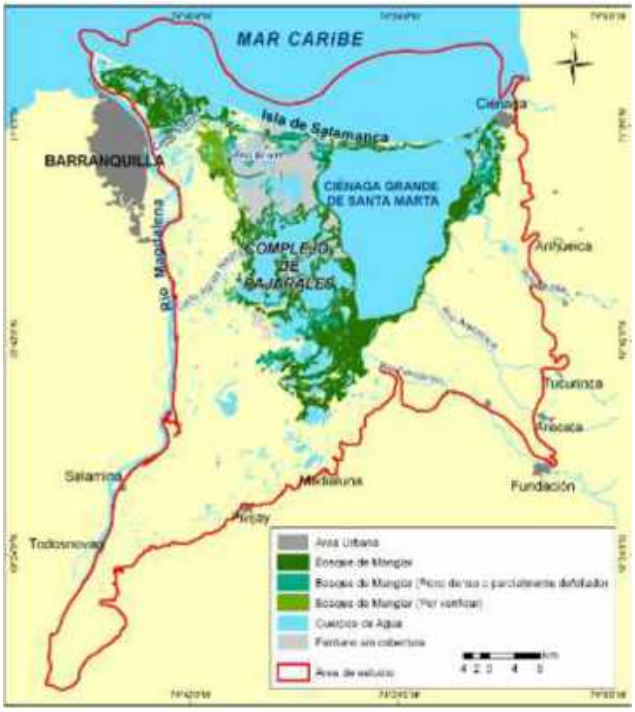


Ilustración 1 Localización General Ciénaga Grande de Santa Marta

LOCALIZACIÓN GENERAL DEL SECTOR A INTERVENIR

Específicamente el área de la Ciénaga Grande que se pretende intervenir con este proyecto se encuentra ubicada en el sector este donde se ubica Caño Hondo del complejo lagunar, el cual se encuentran en la jurisdicción del municipio de Salamina, por tanto, los beneficiarios directos son los pobladores de los municipios de Salamina y Remolino. Ver figura No.2.

El municipio de Salamina es un municipio ubicado al norte del departamento del Magdalena, Colombia a escasos 50 kilómetros de la desembocadura del río Magdalena. Funciona como punto de conexión de la Vía de la Cordialidad del Magdalena con el Corregimiento Puerto Giraldo en el Departamento del Atlántico. El desarrollo social y económico de la cabecera ha estado marcado, históricamente desde principios de siglo, por las actividades agropecuarias, fluvial y comercial, lo cual le representó un auge significativo durante los primeros cincuenta años del anterior siglo. Sin lugar a dudas, a ello contribuyó el efecto de sus fuertes vínculos con el comercio de Barranquilla y su importante y estratégica localización sobre el río Magdalena y el Departamento del Atlántico con relación a las poblaciones del interior del departamento del Magdalena, sobre las cuales debía configurarse un importante mercado regional.

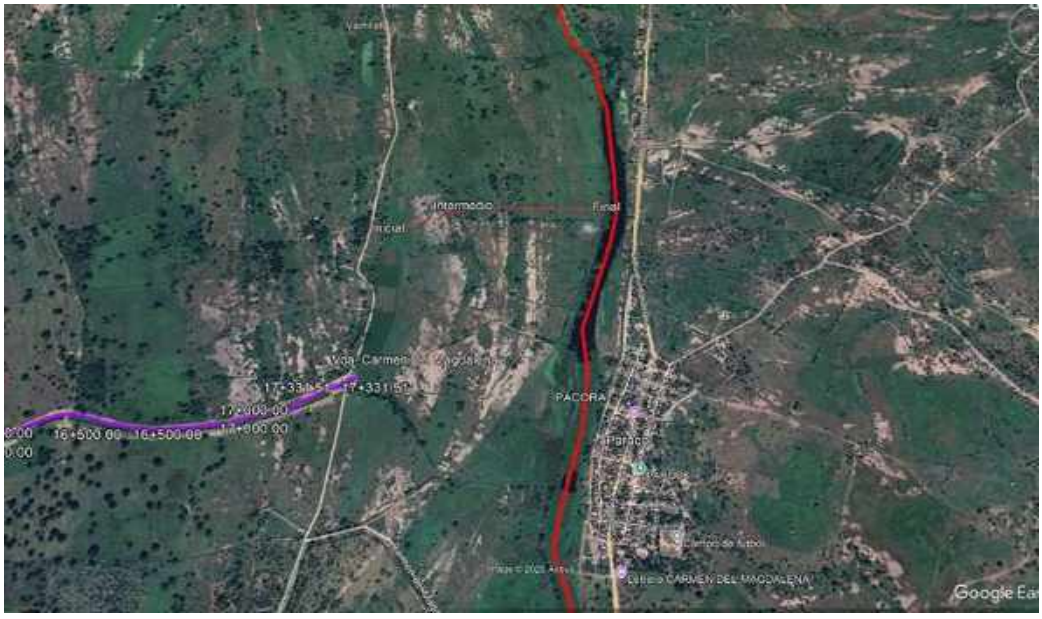


Ilustración 2 Caño Hondo, Localización general Tomado de Google Earth 2018

1. COMPONENTE LECTURA TERRITORIAL

1.1. IDENTIFICACIÓN AREA DE INFLUENCIA

Salamina, Magdalena

Salamina es un municipio ubicado al norte del departamento del Magdalena, Colombia a escasos 50 kilómetros a la desembocadura del rio Magdalena Funciona como punto de conexión de la Vía de la Cordialidad del Magdalena con el Corregimiento Puerto Giraldo en el Departamento del Atlántico. Con una población estimada en 12.500 habitantes, está constituida como uno de los municipios mas antiguos del departamento.

Como tal, cuenta con una significativa infraestructura urbana representada en un importante puerto fluvial, acueducto, alcantarillado, telefonía entre otros. Presenta como Límites generales los siguientes: por el norte limita con el municipio de Remolino, al Este limita con el municipio de Pivijay y de El Piñón, al Oeste limita con el río Magdalena y al Sur limita con el municipio de El Piñón.

División política

El municipio de Salamina tiene como cabecera municipal a SALAMINA y cuenta con un corregimiento y cinco veredas: Corregimiento Guáimaro y veredas El Salado, Julepe, Vainillal, Aserradero, La Loma.

Economía

El desarrollo social y económico de la cabecera ha estado marcado, históricamente desde principios de siglo, por las actividades agropecuarias, fluvial y comercial, lo cual le representó un auge significativo durante los primeros cincuenta años del anterior siglo. Sin lugar a duda, a ello contribuyó el efecto de sus fuertes vínculos con el comercio de Barranquilla y su importante y estratégica localización sobre el río Magdalena y el Departamento del Atlántico con relación a las poblaciones del interior del departamento del Magdalena, sobre las cuales debía configurarse un importante mercado regional.

1.2. DIRECTORIO DE ACTORES

El directorio de actores constituye una herramienta práctica y de gestión, en la cual se recopila información relevante como datos personales, información de contacto y ubicación de cada uno de los actores o partes interesadas vinculadas al proyecto. Este instrumento es verificado y actualizado periódicamente durante la ejecución del contrato "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES". CONTRATO NO. LP-005-2023. Ver **Anexo No. 5.1** (Directorio de actores)

1.3. IDENTIFICACIÓN CONTROLES DE RIESGOS

La identificación de los riesgos socioeconómicos, culturales y ambientales que pueden derivarse de la ejecución de las actividades de dragado permite determinar los impactos potenciales, tanto positivos como negativos, así como su incidencia en las comunidades del área de influencia. En este sentido, resulta fundamental reconocer y evaluar aquellas situaciones que puedan afectar el desarrollo, sostenibilidad y la adecuada ejecución del proyecto durante su ejecución.

RIESGO	EVENTO	NIVEL DE IMPACTO
1	Conflictos con comunidades y entidades ubicadas en el área conflictivas – No dejan realizar actividades	Muy Alto – Negativo
2	Presencia y/o aumento de reasentamientos.	Muy Alto – Negativo
3	Atención de PQRSF por impactos generados de las actividades de dragado por parte de la comunidad y/o partes interesadas.	Muy Alto – Negativo
4	Contratación de Mano de Obra Local	Muy Alto - Positivo
5	Cambios en el tránsito de embarcaciones menores de pescadores que se encuentren en la zona de intervención.	Muy Alto – Negativo
6	Ubicación de equipos en áreas donde afecten cultivos de pan coger.	Muy Alto - Negativo

Tabla 2 Identificación de impactos sociales

2. COMPONENTE COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

2.1. INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PAC

El Punto de Atención a la Comunidad constituye un espacio dispuesto para brindar información y atención personalizada a la población del área de influencia, donde la profesional social atiende de manera presencial y telefónica a todas las personas que requieran orientación o información relacionada con el proyecto.

No obstante, durante el período reportado, la atención a la comunidad se realizó a través de un punto rodante, en el cual se encuentra el equipo interdisciplinario, con el fin de facilitar el acceso a la información y fortalecer el acompañamiento social.

2.2. DIVULGACIÓN COMUNITARIA

2.2.1. PIEZAS DE DIVULGACIÓN

Se describen las piezas de divulgación e información empleadas durante el período reportado, tales como cartas de invitación y perifoneo para convocar a reuniones de socialización o para difundir información de interés dirigida a la comunidad en general y a las entidades de los diferentes municipios del área de influencia. Sin embargo, durante el período en mención no se elaboraron ni difundieron piezas de divulgación.

2.2.2. VALLA INFORMATIVA

La valla informativa es donde se contempla la información general de la obra. Se encuentra instalada en el predio del sr. Luis Pabón, donde actualmente se realizan actividades de dragado mecánico.



Ilustración 3 Valla informativa

2.2.3. REUNIONES DE PARTICIPACIÓN

- El 4 de febrero se elaboraron actas de vecindad y permiso uso de predio con los señores Rafael de la Cruz y José Javier Orozco. En estos documentos se deja constancia del estado inicial del área y se autoriza la ejecución de las actividades de rehabilitación ecológica en sus predios.



Ilustración 4 Elaboración acta de vecindad, predio la india 2.

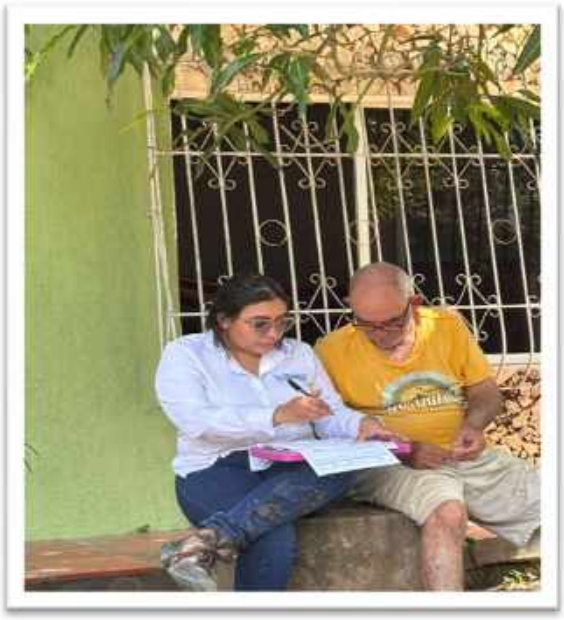


Ilustración 5 Elaboración acta de vecindad, predio Paso Lobo.

- El 19 de febrero se elaboró acta de vecindad y permiso uso de predio con el señor Luis Ramó Orozco. En estos documentos se deja constancia del estado inicial del área y se autoriza la ejecución de las actividades de rehabilitación ecológica en el predio Bella Sara.



Ilustración 6 Elaboración acta de vecindad, predio Bella Sara

- El 25 de febrero se asistió a la reunión convocada por la Secretaría de Planeación del municipio de Salamina, en la cual estuvieron presentes, por parte de la Secretaría de Planeación, Fabio Montenegro; por parte de la CORPAMAG, la ingeniera Katty Amaya; por parte de la Interventoría, los ingenieros Fernando Morron, María Escorcia y Melissa Chi; y por parte del contratista, los ingenieros Ivonne Santisteban, Yurani Acevedo y Edilberto Roys, así como la profesional social Lina Fuentes, con el fin de conocer el estado de las obras ejecutadas en su jurisdicción; así mismo, se realizó una visita al Box Culvert N.º 1. Ver acta de reunión en **Anexo No.5.4.**



Ilustración 7 Reunión oficina Secretaría de Planeación.



Ilustración 8 Visita a Box Culvert #1.

2.3. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, FELICITACIONES (P.Q.R.S.F)

Durante la ejecución del proyecto: **"MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"** Sin embargo, durante este periodo no se recibieron manifestaciones por parte de la comunidad. Ver **Anexo No.5.2** (Consolidado P.Q.R.S.F.)

2.4. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

2.4.1. ACTAS DE VECINDAD

Para la adecuada ejecución del proyecto, se hace indispensable la realización de actas de vecindad en los predios y/o viviendas ubicadas dentro del área de influencia de este, con el fin de dejar constancia del estado actual de las infraestructuras y prevenir posibles reclamaciones derivadas del desarrollo de las actividades. Durante este periodo se realizaron cuatro (4) actas de vecindad Ver **Anexo No. 5.3** (Actas de vecindad)

Relacionadas de la siguiente manera:

NO.	NOMBRE	UBICACIÓN
1	Rafael de la Cruz	Reforestación
2	José Javier Orozco	Reforestación
3	Carlos Mena	Reforestación
4	Luis Ramón Orozco	Reforestación

Tabla 3 Relación actas de vecindad.

3. COMPONENTE CAPACIDAD DE MANO DE OBRA EN LA ZONA

Para el período en referencia se contempló la vinculación de mano de obra calificada y no calificada. En la actualidad, el proyecto cuenta con un total de treinta y cinco (35) personas, asignadas a los siguientes cargos:

NO.	NOMBRE	CARGO	RESIDENCIA
1	Jesús Daniel Palencia Guzmán	Topógrafo	La Loma
2	Pedro Wilches	Marino	La Loma
3	Carlos Barrera Martínez	Marino	La Loma
4	Sinibaldo Gómez Escorcia	Marino	Salamina
5	Daniel Maestre Charris	Marino	Salamina
6	Johendrys Orozco Ferreira	Marino	Salamina
7	Jonathan Padilla Ferreira	Marino	Salamina
8	Yesmith Polo	Vigía HSE	Salamina
9	Adolfo Bonet Acuña	Marino	Remolino
10	Roberto Borja Martínez	Marino	Salamina
11	Cristian David Gil Ortega	Ingeniero	Salamina
12	Carlos Álvarez Montenegro	Marino	Carmen del Magdalena
13	José Caballero	Marino	Carmen del Magdalena
14	José Camacho	Marino	Carmen del Magdalena
15	Eduardo Cantillo Carrillo	Marino	Carmen del Magdalena
16	Carlos Gámez Santodomingo	Marino	Carmen del Magdalena
17	Brayan David Gómez Ramírez	Marino	Carmen del Magdalena
18	José Guete Ojeda	Marino	Carmen del Magdalena
19	Heriberto Lara	Marino	Carmen del Magdalena
20	Jesús Manotas Gutiérrez	Marino	Carmen del Magdalena
21	Jesús Alberto Orozco Guete	Marino	Carmen del Magdalena
22	Cesar Santodomingo	Marino	Carmen del Magdalena
23	Kevin Álvarez Manga	Marino	Carmen del Magdalena
24	Sebastián Anillo	Marino	Salamina
25	Edulfo Cantillo	Ayudante de obra	Salamina
26	Orlando Cantillo	Ayudante de obra	Salamina
27	Arturo Herrera	Ayudante de obra	Salamina
28	Miguel Leiva Gámez	Ayudante de obra	Salamina
29	Carlos Mercado	Ayudante de obra	Salamina
30	Mauricio Orozco	Ayudante de obra	Salamina
31	José Manuel Pasion Gutiérrez	Ayudante de obra	Salamina
32	Esneider Pérez	Ayudante de obra	Salamina
33	Carlos Santodomingo Ternera	Ayudante de obra	Salamina
34	Emilio Santodomingo	Ayudante de obra	Salamina
35	Jhonatan Santodomingo	Ayudante de obra	Salamina

Tabla 4 Información personal contratado

De igual manera, se contempló la contratación de bienes y servicios, promoviendo la dinamización de la economía local mediante la adquisición de insumos en

ferreterías, estaciones de servicio, alquiler de viviendas y locales, así como la compra de alimentos.

4. COMPONENTE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Durante el período en referencia, cada una de las actividades ejecutadas contaron con el acompañamiento de la Interventoría.

DIRECTORIO DE ACTORES CGSM4 VIGENCIA 2025

NO.	ENTIDAD	CARGO	NOMBRE	CONTACTO	CORREO
1	ALCALDÍA SALAMINA	ALCALDE	EDWIN PABÓN	NO INFORMA	contactenos@salamina-magdalena.gov.co
2		SECRETARIO DE PLANEACIÓN	FABIO ANDRES MONTENEGRO BUSTAMANTE	NO INFORMA	secretariadeplaneacion@salamina-magdalena.gov.co
3	ALCALDIA DE PIVIJAY	ALCALDE	JORGE IVAN SALAH ROPAIN	NO INFORMA	alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co
4		SECRETARIA DE PLANEACIÓN	LAURA CARPIO	3225150313	
5	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS GANADEROS CARMEN DEL MAGDALENA - ASOPEGACAMAG	GERENTE	ARNULFO ACUÑA	3145593544	NO INFORMA
6	MUJERES CAMPESINAS . CARMEN DEL MAGDALENA	GERENTE	ZOILA OROZCO	3213453818	NO INFORMA
7	INSPECCIÓN DE POLICIA CARMEN DEL MAGDALENA	INSPECTORA	CRISTINA OROZCO	3128934556	NO INFORMA
8	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AGROPECUARIA OTILIA MENA	RECTOR	BENJAMIN DE LA CRUZ FONTALVO	3205435289	NO INFORMA
9		COORDINADOR	JAIDER MOYA	3135296712	NO INFORMA
10	ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL CARMEN DEL MAGDALENA	PRESIDENTE	BIODILSA OROZCO	3113582414	NO INFORMA
11	LIDERES DE LA COMUNIDAS CARMEN DEL MAGDALENA	LIDER	ROSA SIERRA	3215962022	NO INFORMA
12		LIDER	ENA OROZCO	3135296712	NO INFORMA
13	CORPAMAG	SUPERVISORA DEL CONTRATO	KATY AMAYA BRIEVA	____	katty.amaya@corpamag.gov.co
14		SUBDIRECTORA TÉCNICA	ANGELICA RODRÍGUEZ	____	subdtecnica@corpamag.gov.co
15	INTERVENTORÍA INTERVENTORES E INGENIERÍA SAS	DIRECTOR	FRANCISCO FERNÁNDEZ	____	interventoriacienagagrandeiei@gmail.com
16		COORDINADORA	ANY ZAMBRANO	____	
17		INGENIERO CIVIL	FERNANDO MORRON	3023733631	_____
18		INGENIERA AMBIENTAL	MARIA CECILIA ESCORCIA	3014555226	_____
19	CONSORCIO CGSM4	DIRECTOR DE OBRA	ING. ÁNGEL VIZCAINO	3218484421	directorobra@panamerican.com.co
20		INGENIERO RESIDENTE	ING. EDILBERTO ROYS	3015744289	ingproyectos@panamerican.com.co
21		PROFESIONAL SST	ADRIANA GONZALEZ	3004664534	hse@panamerican.com.co
22		INGENIERO AMBIENTAL	YURANI ACEVEDO	3016712587	yurani.acevedo@panamerican.com.co
23		FRANCISCO BALLESTAS	VETERINARIO	3104220728	fmballestas@gmail.com
24		PROFESIONAL SOCIAL	LINA FUENTES	3003436183	lina.fuentes@panamerican.com.co

PETICIÓN - QUEJA - RECLAMO - SUGERENCIA - FELICITACIONES										
"MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"			,			MUNICIPIO: SALAMINA				
CONTRATO No. LP-005			CONTRATISTA: CONSORCIO CGSM4			INTERVENTORÍA: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S.				
FECHA DE RECIBO (DD-MM-AA)	NOMBRE PETICIONARIO	TELEFONO	TIPO DE PQRS	MOTIVO	MEDIO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN TOMADA/SOLUCIÓN	EL PETICIONARIO MANIFIESTA SATISFACCIÓN	FECHA DE SOLUCIÓN (DD-MM-AA)	OBSERVACIONES
Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2025 no se atendieron PQRSF.										
Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025 no se atendieron PQRSF.										
Para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2025 no se atendieron PQRSF.										
Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025 no se atendieron PQRSF.										
24/11/2025	Eugenio Garcia	3007049908	Reclamo	Pago arreglo de cerca por afectaciones causadas.	Personal	El señor Eugenio informa que durante la ejecución de las actividades de drgado desarrolladas por el CONSORCIO PHDV 2020 se presentarion afectaciones en la cerca de su predio, dichos daños fueron asumidos por el. Por lo tanto en el marco de la solicitud del permiso de uso de predio para la construcción del Box Culvert #1 en Caño Hondo vigencia 2025 el señor manifiesta que requiere la compensación por un valor de $1,000,000 (Un millón de pesos) correspondientes a los gastos asumidos por la repacación mencionada.	Se realiza acta de conciliación con la explicación de los hechos y contenido sobre pago. El 11 de diciembre se realiza consignación a la sra Milagro Pabola Gonzalez quien fue autorizada por el sr Eugenio Garcia para recibir el dinero.	SI	11/12/2025	N/A
Para el periodo comprenndido entre el 1 al 31 de diciembre de 2025 no se atendieron PQRSF.										
Para el periodo comprenndido entre el 1 al 31 de enero de 2026 no se atendieron PQRSF.										
Para el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2026 no se atendieron PQRSF.										

	FORMATO PERMISO USO PREDIO	Codigo	GS-R-003
		Version	1
		Fecha	15/08/2024

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"

No.	FECHA SOLICITUD DE PERMISO	ACTA DE VECINDAD		ACTIVIDAD ECONOMICA DEL PREDIO	UBICACIÓN DEL PREDIO
		SI	NO		
15	4 febrero 2026	X		Ganadería	Carmen del Magdalena

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROPIETARIO / ADMINISTRADOR DEL PREDIO	Rafael De la Cruz.			
MOTIVO DEL PERMISO	Rehabilitación Ecologica	AREA REQUERIDA DEL PREDIO (Ha,m2)	N/A	
CONDICIONES ECONOMICAS POR USO DEL PREDIO (precio y forma de pago)	NO APLICA	TIEMPO OCUPACION DEL PREDIO	N/A	
		REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE USARLO	SI: X	NO:
NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESIONAL QUE TRAMITA EL PERMISO	Lina María Fuentes Acosta			
CONDICIONES DE ENTREGA DEL PREDIO				

FIRMA DEL PROPIETARIO/ADMINISTRADOR DEL PREDIO	FIRMA PROFESIONAL AMBIENTAL
Edilberto Rays	Lina M. Fuentes A.
FIRMA INGENIERO RESIDENTE	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL

OBSERVACIONES:
El Propietario está de acuerdo con la rehabilitación ecologica dentro de su predio y con el mantenimiento por 18 meses despues de la siembra.

Scanned with CamScanner

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	GS-R-002
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	15/08/2024

CONTRATO No. LP- 005			PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"
FECHA			
04	02	2026	
DD	MM	AA	
ACTA No.:	15		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: La India

Tenencia ___ Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario Rafael De la Cruz.

Dirección Camino del Magdalena.

Teléfono 3106327059 No. de pisos 0.

Long. del frente (mts)

Abscisados Inicial

Cédula catastral Final

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía		X	
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO				ESPACIO GEOGRÁFICO
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐	1. Urbano
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	X Rural
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐	
4. Valor normal	☒	Cuál?		¿Cuál?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Finca	☒	El garaje se usa como
4. Institucional	☐	8. Otro ☐ Cuál?		comercio SI ☐ NO ☒

Scanned with CamScanner

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	GS-R-002
BeP		VERSIÓN:	1
		FECHA:	15/08/2024

CONTRATO No. LP- 005			PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"
FECHA			
04	02	2026	
DD	MM	AA	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA	No Aplica	GRIETAS Y FISURAS	No Aplica
MUROS	No Aplica	HUMEDADES	No Aplica
CUBIERTA	No Aplica	HUNDIMIENTO PISO	No Aplica
PISOS	No Aplica	DESPLAZAMIENTOS	No Aplica
FACHADA	No Aplica	OTRO ¿Cuál?	N/A

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se Observa predio destinado a la ganadería. Se elabora acta de Vecindad y Permiso uso de predio, con el fin de llevar a cabo actividades de rehabilitación ecológica y mantenimiento por un periodo de diez (10) meses. El Propietario manifiesta su conformidad y autorización para la ejecución de los trabajos, indicando y mostrando el área destinada para el desarrollo de dichas actividades.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO





FIRMAS

Firma Propietario
Nombre
C.C. ó NIT.

Firma Director de Obra
Nombre
C.C. ó NIT. 77.475172

Firma profesional Social
Nombre Lina Fuentes

Vo. Bo. Representante de la interventoria

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoria
Copia: para el contratista

Scanned with CamScanner

	FORMATO PERMISO USO PREDIO	Codigo	GS-R-003
		Version	1
		Fecha	15/08/2024

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"

No.	FECHA SOLICITUD DE PERMISO	ACTA DE VECINDAD		ACTIVIDAD ECONOMICA DEL PREDIO	UBICACIÓN DEL PREDIO
		SI	NO		
16	4 febrero 2026	X		Cuncadena.	Carmen Del Magdalena.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROPIETARIO / ADMINISTRADOR DEL PREDIO	Jose Javier Ospino				
MOTIVO DEL PERMISO	Rehabilitación Ecologica.	AREA REQUERIDA DEL PREDIO (Ha,m2)	N/A		
CONDICIONES ECONOMICAS POR USO DEL PREDIO (precio y forma de pago)	NO APLICA	TIEMPO OCUPACION DEL PREDIO	N/A		
		REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE USARLO	SI	NO	
NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESIONAL QUE TRAMITA EL PERMISO	Luna María Fonts Acosta.		X		
CONDICIONES DE ENTREGA DEL PREDIO					

FIRMA DEL PROPIETARIO/ADMINISTRADOR DEL PREDIO	FIRMA PROFESIONAL AMBIENTAL
Edilberto Rojas	Luna M. Fonts A.
FIRMA INGENIERO RESIDENTE	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL


OBSERVACIONES:
Se realiza permiso uso de predio para ejecutar actividades de rehabilitación ecologica mas 18 meses de mantenimiento.

Scanned with CamScanner

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	GS-R-002
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	15/08/2024

CONTRATO No. LP- 005			PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"
FECHA			
04	02	2026	
DD	MM	AA	
ACTA No.:	16		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

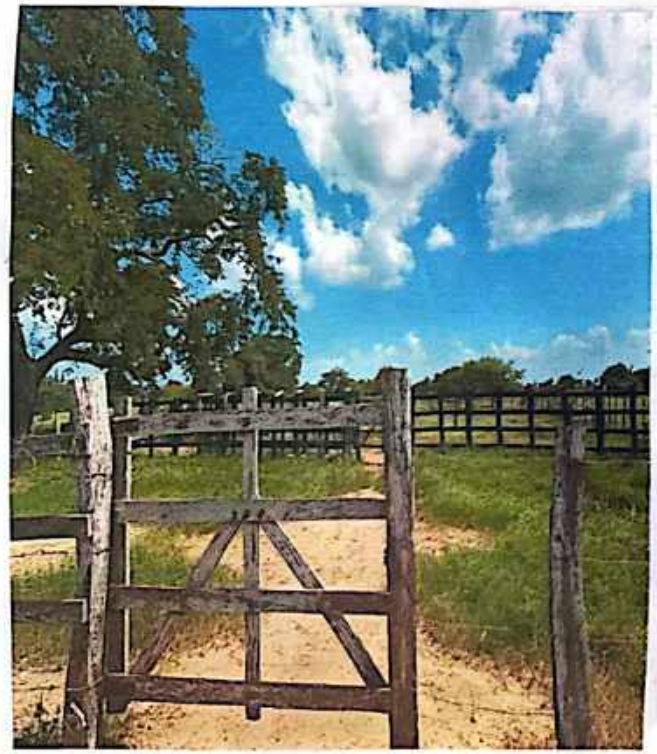

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: Paso Lodo

Tenencia ___ Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario José Jesus Ortiz Gomez.

Dirección Camino del magdalena.

Teléfono 3114014104. No. de pisos 0.

Long. del frente (mts)

Abscisados Inicial

Cédula catastral Final

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía		X	
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO				ESPACIO GEOGRÁFICO
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐	1. Urbano
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	2. Rural X
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐	
4. Valor normal	X	Cuál?		¿Cuál?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Finca	X	El garaje se usa como
4. Institucional	☐	8. Otro ☐ Cuál?		comercio SI ☐ NO ☒

Scanned with CamScanner

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	GS-R-002
B&P		VERSIÓN:	1
		FECHA:	15/08/2024

CONTRATO No. LP- 005		
FECHA		
04	02	2026
DD	MM	AA

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA	N/A	GRIETAS Y FISURAS	N/A
MUROS	N/A	HUMEDADES	N/A
CUBIERTA	N/A	HUNDIMIENTO PISO	N/A
PISOS	N/A	DESPLAZAMIENTOS	N/A
FACHADA	N/A	OTRO ¿Cuál?	N/A.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Predio debido a la ganadería; se realizó acta de Vecindad y permiso uso de predio para la rehabilitación Ecológica más 18 mes, de mantenimiento de los individuos, todo socializado con el propietario. ques avanza la ejecución de los trabajos. marcando y mostrando el área distancia para el desarrollo de los contratistas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO





FIRMAS

Firma Propietario
Nombre
C.C. ó NIT. 1091139[illegible]

Firma Director de Obra
Nombre
C.C. ó NIT. 73 495 172.

Firma profesional Social
Nombre Linci Fuentes
Vo. Bo. Representante de la interventoria

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoria
Copia: para el contratista

Scanned with CamScanner

	FORMATO PERMISO USO PREDIO	Codigo	GS-R-003
		Version	1
		Fecha	15/08/2024

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"

No.	FECHA SOLICITUD DE PERMISO	ACTA DE VECINDAD		ACTIVIDAD ECONOMICA DEL PREDIO	UBICACIÓN DEL PREDIO
		SI	NO		
17	4 febrero 2026	X		Ganadería.	Camino del magdalena.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROPIETARIO / ADMINISTRADOR DEL PREDIO	Carlos Meza.			
MOTIVO DEL PERMISO	Rehabilitación Ecologica.	AREA REQUERIDA DEL PREDIO (Ha,m2)	N/A	
CONDICIONES ECONOMICAS POR USO DEL PREDIO (precio y forma de pago)	NO APLICA	TIEMPO OCUPACION DEL PREDIO	N/A	
		REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE USARLO	SI	NO
NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESIONAL QUE TRAMITA EL PERMISO	Linci María Fuentes Acosta.		X	
CONDICIONES DE ENTREGA DEL PREDIO				

Carlos Meza A	Jeraldin Acosta Cepeda
FIRMA DEL PROPIETARIO/ADMINISTRADOR DEL PREDIO	FIRMA PROFESIONAL AMBIENTAL
Edilberto Roys	Linci Fuentes A.
FIRMA INGENIERO RESIDENTE	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL

OBSERVACIONES:

Permiso uso de predio para la rehabilitación ecologica mas 18 meses de mantenimiento de los individuos.

Scanned with CamScanner

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	GS-R-002
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	15/08/2024

CONTRATO No. LP- 005	PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"

FECHA: 04 (DD) 02 (MM) 2026 (AA)

ACTA No.: 17

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: Monterey.

Tenencia ___ Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Carlos Mena Alvarez

Dirección: Carmen del Magdalena

Teléfono: ___ No. de pisos: 0

Long. del frente (mts): ___

Abscisados Inicial: ___

Cédula catastral Final: ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía		X	
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO				ESPACIO GEOGRÁFICO
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐	1. Urbano
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	2. Rural X
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐	
4. Valor normal	☐	Cuál? ___		¿Cuál? Rural

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Reçreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos ___
3. Industrial	☐	7. Finca	☒	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4. Institucional	☐	8. Otro ☐ Cuál? ___		

Scanned with CamScanner

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	GS-R-002
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	15/08/2024

CONTRATO No. LP- 005			PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"
FECHA			
DD	MM	AA	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA	NO	GRIETAS Y FISURAS	NO
MUROS	NO	HUMEDADES	NO
CUBIERTA	NO	HUNDIMIENTO PISO	NO
PISOS	NO	DESPLAZAMIENTOS	NO
FACHADA	NO	OTRO ¿Cuál?	NO.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se realiza Acta de Vecindad y Permiso uso de predio para las actividades de rehabilitación ecologica (siembra más mantenimiento por los 48 meses).

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO





FIRMAS

Firma Propietario
Nombre
C.C. ó NIT.

Firma Director de Obra
Nombre
C.C. ó NIT. 73475172

Firma profesional Social

Nombre Lina María Fonts Acosta.

Vo. Bo. Representante de la interventoria

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoria
Copia: para el contratista

Scanned with CamScanner

	FORMATO PERMISO USO PREDIO	Codigo	GS-R-003
		Version	1
		Fecha	15/08/2024

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES" VIGENCIA 2025.

No.	FECHA SOLICITUD DE PERMISO	ACTA DE VECINDAD		ACTIVIDAD ECONOMICA DEL PREDIO	UBICACIÓN DEL PREDIO
		SI	NO		
18	19 febrero 2026	X		Ganadería.	Carmen del magdalena.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROPIETARIO / ADMINISTRADOR DEL PREDIO	Luis Ramón Orozco Gutierrez.			
MOTIVO DEL PERMISO	Rehabilitación Ecologica.	**AREA REQUERIDA DEL PREDIO (Ha,m2)**	NO APLICA	
CONDICIONES ECONOMICAS POR USO DEL PREDIO (precio y forma de pago)	NO APLICA	**TIEMPO OCUPACION DEL PREDIO**	NO APLICA	
		REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE USARLO	**SI**: x	**NO**:
NOMBRE Y APELLIDO DEL PROFESIONAL QUE TRAMITA EL PERMISO	Lina María Fuentes Acosta.			
CONDICIONES DE ENTREGA DEL PREDIO	NO APLICA			

FIRMA DEL PROPIETARIO/ADMINISTRADOR DEL PREDIO	**FIRMA PROFESIONAL AMBIENTAL**
Edilberto Reyes	Lina M. Fuentes A.
FIRMA INGENIERO RESIDENTE	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**

OBSERVACIONES:


Se realiza Permiso uso de predio con el fin de realizar rehabilitación ecologica dentro de la propiedad más un periodo de 18 meses para el mantenimiento de los individuos.

Scanned with CamScanner

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	GS-R-002
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	15/08/2024

CONTRATO No. LP- 005			PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"
FECHA			
19	02	2026	
DD	MM	AA	
ACTA No.:	18		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

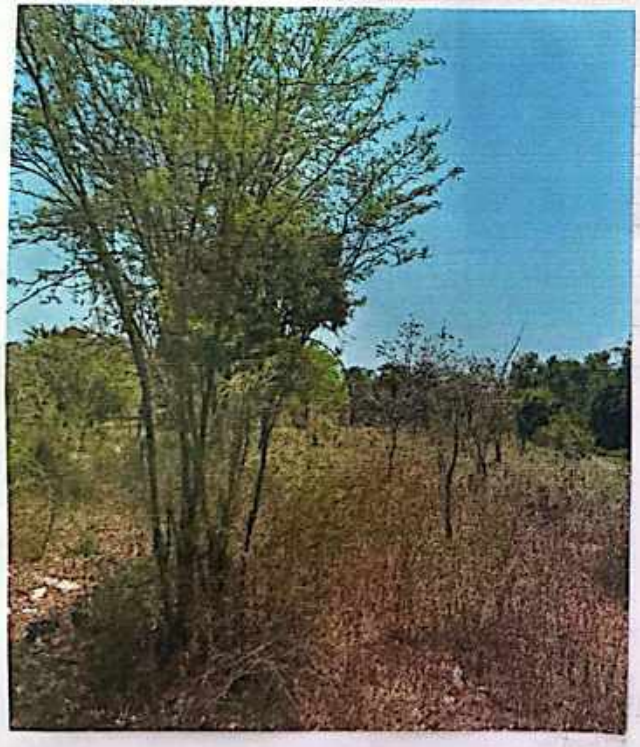

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del predio: Bella Sara

Tenencia ___ Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?___

Nombre del Propietario Luis Ramón Ortiz Gutierrez

Dirección Carmen del magdalena

Teléfono 3226465310 No. de pisos 0

Long. del frente (mts)

Abscisados Inicial

Cédula catastral Final

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía		X	
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cuál?

TIPO DE PREDIO				ESPACIO GEOGRÁFICO
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐	1. Urbano
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	2. Rural X
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐	
4. Valor normal	X	Cuál?___		¿Cuál?___

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos ___
3. Industrial	☐	7. Finca	X	El garaje se usa como
4. Institucional	☐	8. Otro ☐ Cuál?___		comercio SI ☐ NO ☒

Scanned with CamScanner

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	GS-R-002
B&P		VERSIÓN:	1
		FECHA:	15/08/2024

CONTRATO No. LP- 005			PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"
FECHA			
19	07	2026	
DD	MM	AA	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA	N/A	GRIETAS Y FISURAS	N/A
MUROS	N/A	HUMEDADES	N/A
CUBIERTA	N/A	HUNDIMIENTO PISO	N/A
PISOS	N/A	DESPLAZAMIENTOS	N/A.
FACHADA	N/A.	OTRO ¿Cuál?	N/A.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (DESCRIPCION ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Predio destinado a la ganadería, se realizó acta de vecindad y permiso uso de predio para la rehabilitación ecológica que contempla siembra, mas 18 meses de mantenimiento de los individuos. Todo lo anterior fue socializado al propietario quien autorizó la ejecución de los trabajos indicando y mostrando el área destinada para el desarrollo de las actividades.

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO





FIRMAS

Firma Propietario
Nombre
C.C. ó NIT.

Firma Director de Obra
Nombre
C.C. ó NIT. 73 475 172

Firma profesional Social
Nombre Una Fuente

Vo. Bo. Representante de la Interventoria

Original 1: para el propietario
Original 2: para la interventoria
Copia: para el contratista

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNIÓN No. 20

FECHA: 25 de febrero de 2026.

LUGAR: Alcaldía Municipal de Salamina – Magdalena.

HORA: 10:00 AM.

PARTICIPANTES:

- Supervisión técnica CORPAMAG.
- Consorcio CGSM4.
- Interventores e ingeniería S.A.S.
- Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipio Salamina.

OBJETIVO:

Solicitud de seguimiento y revisión del estado del contrato de obra No. LP 005 de 2023 suscrito con el Consorcio CGSM4, en el marco de las actividades programadas para la vigencia 2025, solicitado mediante oficio SAL-OFI-016-2026 por parte de la Secretaria de Planeación e Infraestructura de la Alcaldía de Salamina – Magdalena.

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Desarrollo de la reunión.
3. Compromisos.

1. Presentación de los asistentes.

Se inicia la reunión con la presentación de los asistentes por parte de la entidad contratante, la Ingeniera Katty Amaya, supervisora del contrato.

Posteriormente, se realiza la presentación por parte del personal del consorcio CGSM4, contratista de obra y la Coordinación de Interventores e Ingeniería S.A.S.

Finalmente, la presentación por parte del Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio, Fabio Montenegro Bustamante.

2. Desarrollo de la reunión.

Se inicia el comité manifestando por parte del Secretario de Infraestructura – Fabio Montenegro la importancia de conocer el avance de ejecución de las actividades del contratista Consorcio CGSM4 dentro del Municipio y el seguimiento realizado por parte de la interventoría.

Por lo que, la coordinación de la interventoría comenta que el avance físico de la obra a la fecha corresponde a un 75% aproximadamente.

Se menciona las actividades de la vigencia 2025 que tienen incidencia directa dentro de la jurisdicción del Municipio de Salamina, las cuales son la remoción mecánica de sedimentos mediante el uso de la excavadora en aproximadamente 1.2 km de intervención en el Caño Hondo, que a la fecha se encuentra culminado en su 100%; y la construcción de cinco (05) boxcoulverts, el cual lleva un avance general del 60%, considerando la intervención adelantada en cuatro (04) box y el inicio de actividades de excavación en uno de ellos.

Luego, el Secretario de Infraestructura pregunta por la mano de obra no calificada del sector del municipio que participan en las actividades del proyecto. A esto, el contratista de obra manifiesta que, para las actividades culminadas de la remoción mecánica se tuvo en cuenta el personal de banco de hojas de vida suministrado por la Alcaldía de Salamina. Asimismo, para las actividades de los box se ha tenido en cuenta un porcentaje considerable de mano de obra no calificada del Municipio.

Consecuentemente, se realizó el recorrido a uno de los puntos de los box con el fin de verificar el avance a la fecha de este, y en cual se evidenció el 80% de ejecución de este. Se explicó el proceso constructivo, sus especificaciones y la fecha tentativa de culminación de este. Se verificó también el personal encargado de dicha construcción.

Por último, la supervisora de CORPAMAG – Ing. Katty Amaya extiende invitación al Secretario de Infraestructura a las próximas socializaciones que se realizarán en el Municipio de Salamina para el inicio de un nuevo proyecto, y que la documentación requerida y solicitada por parte de la Alcaldía, será remitida por parte de la Entidad.

3. COMPROMISOS

POR PARTE DE LA ENTIDAD.

- Remitir acta de comité con registro fotográfico y listado de asistencia.

Para constancia de lo anterior, se firma la presenta acta por los que en ella intervinieron a los veinticinco (25) días del mes de febrero 2026.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





REGISTRO DE ASISTENCIA EVENTOS USUARIOS EXTERNOS

Nombre del Evento: Mesa con sec. planeación Salamina para inf. sobre proyecto LP005.
Objetivo: Atender solicitud de la alcaldia con radicado # R2026000092
Fecha: 25 feb. 2025
Horas de Duración:
Responsables: Subdirección Tecnica.
Municipio/Lugar: Alcaldia de Salamina.

	Nombres y Apellidos	Telefono - Celular	Correo Electrónico	Edad	Genero			COMUNIDAD A LA QUE PERTENECE				Victima del Conflicto	Discapacidad	Municipio y/o lugar donde vive	Entidad o Sector que representa	Firma
					M	F	Otro	Negras, Afrocolumbianas,	Pueblos Indigenas	Pueblo Rrom o Gitano	Ninguno					
1	Katty Amaya Brieva	4380200.	katty.amaya@corpamag.gov.co											Sta. Marta	Corpamag	
2	Melissa Chi Quintero	3016068369	melissacq98@gmail.com											Sta Mta	Interv. e Ing.	
3	Sibalia Santisteban	1031127390	Hidrotopografia@panamerican.											B/Quilla	CGSM4	
4	Lina María Fuentes Acosta	3003436693	lina.fuentes@panamerican.com.											Barranquilla	Consorcio CGSM4	
5	Maria Escorcia Jiménez	3014555226	mariaescorciajimenez@gmail.com											Carmen del Magd.	Interv. e Ing	
6	Fernando Morron Urzola	3023995598	fmorronurzola1405@gmail.com		X									Remolino	Interv. e Ing	
7	Edilberto Roys Corzo	3015744789	ingproyectos@panamerican.com.co	37	X									B/quilla	Consorcio CGSM4	
8	Yurani Acevedo Cotes	1129578658-3016012587	Yurani.acevedo@panamerican.com.co			X								B/quilla	Consorcio CGSM4	
9	FABIO MONTENEGRO BUSTAMANTE	3012549385	ingcivilfabio14@gmail.com	29	X									SALAMINA	ALCALDIA SALAMINA	
10																
11																
12																
13																
14																
15																

Los datos personales aquí reportados serán recolectados, almacenados, procesados, usados, compilados, transmitidos, circulados, transferidos, actualizados, suprimidos y dispuestos conforme lo establece la Ley 1581 de 2012 y la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG. Cualquier inquietud con relación al uso de sus datos, comuníquese al 605 - 4380200 o 605 - 4380300 o escribir a contactenos@corpamag.gov.co

ANEXO 6

Planillas de seguridad social.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901782967	1	CONSORCIO CGSM4	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO CGSM4	CALLE 54 #76 - 11	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3016552449	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	135094599	9501379812	E	2026/03/16	2026/03/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,829,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO CGSM4 (14 Afiliados)																								$32,332,179	$5,173,700			$32,332,179	$1,293,700			$23,848,015	$954,800			$32,332,179		$1,406,900		$0	$0		$8,829,100
Centro de Trabajo: INGENIERIA CIVIL RIESGO IV (14 Afiliados)																								$32,332,179	$5,173,700			$32,332,179	$1,293,700			$23,848,015	$954,800			$32,332,179		$1,406,900		$0	$0		$8,829,100
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (14 Afiliados)																								$32,332,179	$5,173,700			$32,332,179	$1,293,700			$23,848,015	$954,800			$32,332,179		$1,406,900		$0	$0		$8,829,100
1	CC	1079913769	ALVAREZ MONTENEGRO CARLOS ANDRES									X										230201	30	$1,939,923	$310,400	EPS041	30	$1,939,923	$77,600	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,939,923	4.350%	$84,400	30	$0	$0	Si	$542,500
2	CC	1010080507	BARRERA MARTINEZ CARLOS ALFREDO									X										230301	30	$2,984,099	$477,500	EPS041	30	$2,984,099	$119,400	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$2,984,099	4.350%	$129,900	30	$0	$0	Si	$796,900
3	CC	1079934636	CABALLERO CHARRIS JOSE LEONARDO									X										230301	30	$1,939,923	$310,400	ESSC24	30	$1,939,923	$77,600	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,939,923	4.350%	$84,400	30	$0	$0	Si	$542,500
4	CC	1081027709	CAMACHO CANTILLO JOSE GREGORIO									X										230301	30	$3,068,858	$491,100	ESSC24	30	$3,068,858	$122,800	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$3,068,858	4.350%	$133,500	30	$0	$0	Si	$817,500
5	CC	1004121831	GAMEZ RAMIREZ BRAYAN DAVID									X										230301	30	$1,939,923	$310,400	EPS002	30	$1,939,923	$77,600	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,939,923	4.350%	$84,400	30	$0	$0	Si	$542,500
6	CC	1083572789	GAMEZ SANTODOMINGO CARLOS SEGUNDO									X										230301	30	$1,910,078	$305,700	ESSC24	30	$1,910,078	$76,500	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,910,078	4.350%	$83,100	30	$0	$0	Si	$535,400
7	CC	1004121723	GOMEZ ESCORCIA SINIBALDO JOSE									X										230301	30	$2,107,054	$337,200	ESSC24	30	$2,107,054	$84,300	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$2,107,054	4.350%	$91,700	30	$0	$0	Si	$583,300
8	CC	7598807	MAESTRE CHARRIS DANIEL ALBERTO									X										230201	30	$4,066,874	$650,700	ESSC24	30	$4,066,874	$162,700	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$4,066,874	4.350%	$177,000	30	$0	$0	Si	$1,060,500
9	CC	1079914724	MANOTAS GUTIERREZ JESUS DAVID									X										230201	30	$1,939,923	$310,400	ESSC24	30	$1,939,923	$77,600	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,939,923	4.350%	$84,400	30	$0	$0	Si	$542,500
10	CC	1004298507	OROZCO FERREIRA JOHENDRYS		X							X									X	230301	22	$1,813,247	$290,200	ESSC07	22	$1,813,247	$72,600	CCF07	22	$1,666,186	$66,700	14-7	22	$1,813,247	4.350%	$78,900	22	$0	$0	Si	$508,400
11	CC	1082045696	PADILLA FERREIRA JONATAN ALBERTO		X							X									X	230201	13	$878,105	$140,500	ESSC24	13	$878,105	$35,200	CCF07	13	$1,170,969	$46,900	14-7	13	$878,105	4.350%	$38,200	13	$0	$0	Si	$260,800
12	CC	1082046517	POLO NAVARRO YESMITH VANESSA									X										230301	30	$1,989,664	$318,400	EPS005	30	$1,989,664	$79,600	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,989,664	4.350%	$86,600	30	$0	$0	Si	$554,700
13	CC	1079936122	SANTODOMINGO DE LA CRUZ CESAR ALFREDO									X										230301	30	$1,939,923	$310,400	EPS041	30	$1,939,923	$77,600	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,939,923	4.350%	$84,400	30	$0	$0	Si	$542,500
14	CC	1081028028	WILCHES GONZALEZ PEDRO JOSE									X										230301	30	$3,814,585	$610,400	EPS037	30	$3,814,585	$152,600	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$3,814,585	4.350%	$166,000	30	$0	$0	Si	$999,100
Total			**Afiliados(14)**																					$32,332,179	$5,173,700			$32,332,179	$1,293,700			$23,848,015	$954,800			$32,332,179		$1,406,900		$0	$0		$8,829,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$5,173,700	$0	$0	$5,173,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,761,700	$0	$0	$3,761,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,412,000	$0	$0	$1,412,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,406,900	$0	$0	$1,406,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	14	$1,406,900	$0	$0	$1,406,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$954,800	$0	$0	$954,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	14	$954,800	$0	$0	$954,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	$1,293,700	$0	$0	$1,293,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$636,700	$0	$0	$636,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$72,600	$0	$0	$72,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$152,600	$0	$0	$152,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$274,600	$0	$0	$274,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$77,600	$0	$0	$77,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$79,600	$0	$0	$79,600
TOTAL				**14**	**$8,829,100**	**$0**	**$0**	**$8,829,100**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S identificado(a) con NI 806003450 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ADRIANA CRISTINA GONZALEZ VERGARA identificado(a) con CC 1010150262

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9501211931	135079394	E	2026-03-12	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		$2,500,000	4%	$100,000
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$2,500,000	16%	$400,000
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30																		$2,500,000		$0
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30																		$2,500,000		$0
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30																		$0	0%	$0
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-02	30																		$0	0%	$0
9501211931	135079394	E	2026-03-12	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$2,500,000	4.35%	$108,800
9501211931	135079394	E	2026-03-12	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$2,500,000	4%	$100,000

Este certificado se expide el día 2026-03-16 a las 10:56.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S identificado(a) con NI 806003450 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANGEL MARIA VIZCAINO ESCOBAR identificado(a) con CC 73475172

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9501233825	135072644	Y	2026-03-12	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$3,080,000	12.5%	$385,000
9501233825	135072644	Y	2026-03-12	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$3,080,000	0.522%	$16,100

Este certificado se expide el día 2026-03-16 a las 11:06.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	84456544
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CHRISTIAN DARIO LOPEZ CLAVIJO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	MZ 18 CASA 8 CISNE	TELÉFONO:	4000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4645917932**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996009002	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608.000	$ 0	$ 608.000
SUBTOTALES:										**$ 608.000**	**$ 0**	**$ 608.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 475.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.000	$ 0	$ 0	$ 475.000
SUBTOTALES:													**$ 475.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 475.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 19.900	$ 19.900	$ 0	$ 0	$ 19.900
SUBTOTALES:									**$ 19.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 19.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 84456544	LOPEZ CLAVIJO CHRISTIAN DARIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.800.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.800.000	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 608.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 3.800.000	$ 475.000	$ 0	$ 475.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.800.000	84456544	$ 19.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.102.900

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S identificado(a) con NI 806003450 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDILBERTO GREGORIO ROYS CORZO identificado(a) con CC 1118813194

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9501211931	135079394	E	2026-03-12	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		$5,500,000	4%	$220,000
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$5,500,000	16%	$880,000
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30																		$5,500,000		$0
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30																		$5,500,000		$0
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30																		$0	0%	$0
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-02	30																		$0	0%	$0
9501211931	135079394	E	2026-03-12	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$5,500,000	4.35%	$239,300
9501211931	135079394	E	2026-03-12	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$5,500,000	4%	$220,000

Este certificado se expide el día 2026-03-16 a las 10:58.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S identificado(a) con NI 806003450 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para IVONNE STIBALIZ SANTISTEBAN MURIEL identificado(a) con CC 1031127390

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9501211931	135079394	E	2026-03-12	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		$6,000,000	4%	$240,000
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$6,000,000	16%	$960,000
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230901	SKANDIA	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30																		$6,000,000		$0
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230901	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30																		$6,000,000		$0
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30																		$0	0%	$0
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230901	SKANDIA	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-02	30																		$0	0%	$0
9501211931	135079394	E	2026-03-12	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$6,000,000	4.35%	$261,000
9501211931	135079394	E	2026-03-12	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$6,000,000	4%	$240,000

Este certificado se expide el día 2026-03-16 a las 11:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que VIAS Y DRAGADOS S.A.S identificado(a) con NI 901006746 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LINA MARIA FUENTES ACOSTA identificado(a) con CC 1108767049

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9501275398	135041760	E	2026-03-12	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		$2,100,000	4%	$84,000
9501275398	135041760	E	2026-03-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$2,100,000	16%	$336,000
9501275398	135041760	E	2026-03-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30																		$2,100,000		$0
9501275398	135041760	E	2026-03-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30																		$2,100,000		$0
9501275398	135041760	E	2026-03-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30																		$0	0%	$0
9501275398	135041760	E	2026-03-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-02	30																		$0	0%	$0
9501275398	135041760	E	2026-03-12	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$2,100,000	4.35%	$91,400
9501275398	135041760	E	2026-03-12	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$2,100,000	4%	$84,000

Este certificado se expide el día 2026-03-16 a las 11:23.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901782967	1	CONSORCIO CGSM4	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO CGSM4	CALLE 54 #76 - 11	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3016552449	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	135101344	9501205966	Y	2026/03/16	2026/03/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$575,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO CGSM4 (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$76,200		$0	$0		$575,300
Centro de Trabajo: INGENIERIA CIVIL RIESGO IV (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$76,200		$0	$0		$575,300
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$76,200		$0	$0		$575,300
1	CC	1085224496	MARTINEZ JIMENEZ MARIA AUXILIADORA																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-7	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	0	$0	$0	No	$575,300
Total		**Afiliados(1)**																				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$76,200		$0	$0		$575,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,200	$0	$0	$76,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$76,200	$0	$0	$76,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$575,300**	**$0**	**$0**	**$575,300**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S identificado(a) con NI 806003450 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YURANI ANDREA ACEVEDO COLON identificado(a) con CC 1129578658

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9501211931	135079394	E	2026-03-12	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	9													X					$1,050,000	4%	$42,000
9501211931	135079394	E	2026-03-12	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	21																		$2,450,000	4%	$98,000
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	9													X					$1,050,000	16%	$168,000
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	21																		$2,450,000	16%	$392,000
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	9													X					$1,050,000		$0
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	21																		$2,450,000		$0
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	9													X					$1,050,000		$0
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	21																		$2,450,000		$0
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	9													X					$0	0%	$0
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	21																		$0	0%	$0
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-02	9													X					$0	0%	$0
9501211931	135079394	E	2026-03-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-02	21																		$0	0%	$0
9501211931	135079394	E	2026-03-12	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	9													X					$1,050,000	0%	$0
9501211931	135079394	E	2026-03-12	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	21																		$2,450,000	4.35%	$106,600
9501211931	135079394	E	2026-03-12	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	9													X					$1,050,000	4%	$42,000
9501211931	135079394	E	2026-03-12	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	21																		$2,450,000	4%	$98,000

Este certificado se expide el día 2026-03-16 a las 10:46.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-17, 12:00:04 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080541295

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 17/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EUGENIO JOSE PRADA DAZA		
Documento	CC19145528	**Dirección**	CL 76 #54 - 11
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6692364
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 19145528	EUGENIO JOSE PRADA DAZA	59	02																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 225.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.400	$ 1.700	$ 236.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO 7

Acta y memoria de cantidades.

ENTIDAD EJECUTORA : CORPAMAG

ACTA DE OBRA No. 23

FECHA CONTRATO: 26 DE DICIEMBRE DE 2023.

PERIODO: DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

CONTRATO No.: LP-005-2023

HOJA: 1 de 2

OBJETO DEL CONTRATO: **"MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"**

CONTRATISTA: CONSORCIO CGSM4

INTERVENTOR: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S.

VALOR TOTAL CONTRATO	PLAZO INICIAL
$340.466.351.223,00	CIENTO CUARENTA Y SEIS (146) MESES

VALOR ACTA DE COBRO:	$ 1.150.802.017,36	**VALOR ACTAS ACUMULADAS:**	$ 5.682.610.958,26
PORCENTAJE DE COBRO:	15,19%	**PORCENTAJE ACUMULADO:**	**75,01%**

AÑO 2024							ACTA DE OBRA No. 23		ACUMULADO		SALDOS	
ÍTEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
III. REHABILITACIÓN ECOLÓGICA						**$ 58.531.860,00**		**$ 0,00**		**$ 58.531.860,00**		**$ 0,00**
		Mantenimiento al Material Vegetal Establecido	ha	20	$ 2.926.593,00	$ 58.531.860,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 58.531.860,00	0,00	$ 0,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 58.531.860,00**		**$ 0,00**		**$ 58.531.860,00**		**$ 0,00**
		Administración			23,00%	$ 13.462.328,00		$ 0,00		$ 13.462.328,00		$ 0,00
		Imprevistos			2,00%	$ 1.170.637,00		$ 0,00		$ 1.170.637,00		$ 0,00
		Utilidad			5,00%	$ 2.926.593,00		$ 0,00		$ 2.926.593,00		$ 0,00
		IVA (19%) sobre la Utilidad			19,00%	$ 556.052,00		$ 0,00		$ 556.052,00		$ 0,00
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 18.115.610,00**		**$ 0,00**		**$ 18.115.610,00**		**$ 0,00**
		VALOR PPTO OBRA DEL PERÍODO 2025				**$ 76.647.470,00**		**$ 0,00**		**$ 76.647.470,00**		**$ 0,00**

AÑO 2025							ACTA DE OBRA No. 23		ACUMULADO		SALDOS	
ÍTEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
I. PRELIMINARES						**$ 49.999.844,00**		**$ 24.999.922,00**		**$ 49.999.844,00**		**$ 0,00**
1.1	P - 1.1	Movilización y Desmovilización de Equipos	und	2,0	$ 24.999.922,0	$ 49.999.844,00	1,00	$ 24.999.922,00	2,00	$ 49.999.844,00	0,00	$ 0,00
II. MANTENIMIENTO HIDRÁULICO						**$ 4.804.622.102,32**		**$ 649.653.542,74**		**$ 3.597.171.496,26**		**$ 1.207.450.606,06**
2.2	P - 2.2	Remoción Mecánica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora Brazo Largo y Explanación Lateral del Material sobrante de la Remoción. Incluye: Seguimiento y Control Topobatimétrico.	m3	113.159,10	$ 19.639,00	$ 2.222.331.531,00	330,64	$ 6.493.404,58	113.159,10	$ 2.222.331.531,00	0,00	$ 0,00
OBRAS DURAS												
2.10	NP - 2.10	Localización, Trazado y Replanteo Topográfico	m2	937,00	$ 4.319,00	$ 4.046.903,00	187,40	$ 809.380,60	937,00	$ 4.046.903,00	0,00	$ 0,00
2.11	NP - 2.11	Excavación manual. Incluye: Cargue, Retiro y Explanación lateral del Material de Excavación	m3	522,65	$ 60.215,00	$ 31.471.370,00	159,15	$ 9.583.217,25	418,12	$ 25.177.096,00	104,53	$ 6.294.274,00
2.12	NP - 2.12	Concreto de F'c 3.000 PSI (21 Mpa) para solado de limpieza y nivelación de fondo de cimentación e = 0.05 m. Incluye transporte de materiales	m2	971,65	$ 66.533,00	$ 64.646.789,00	0,00	$ 0,00	777,32	$ 51.717.432,00	194,33	$ 12.929.357,00
2.13	NP - 2.13	Construcción de Box Culvert en Concreto Reforzado de 4.000 PSI (28 Mpa) Con Baja Permeabilidad (Incluye: Transporte de Materiales. No incluye Acero de Refuerzo	m3	770,67	$ 2.313.980,00	$ 1.783.314.966,60	218,45	$ 505.491.244,98	398,55	$ 922.239.042,98	372,12	$ 861.075.923,62
2.14	NP - 2.14	Suministro, Corte, Figuración y armado de Acero de Refuerzo Grado 60 con Fy 60.000 PSI (420 PSI). Incluye Transporte	kg	74.268,12	$ 8.956,00	$ 665.145.282,72	14.211,29	$ 127.276.295,33	41.498,38	$ 371.659.491,28	32.769,74	$ 293.485.791,44
2.15	NP - 2.15	Concreto de F'c 4.000 PSI (28 Mpa) para construcción de losas de aproximación. Incluye: Formaletería, desencofre y Transporte de Materiales	m3	20,00	$ 1.683.263,00	$ 33.665.260,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 33.665.260,00

ENTIDAD EJECUTORA : CORPAMAG

ACTA DE OBRA No. 23

FECHA CONTRATO: 26 DE DICIEMBRE DE 2023.

PERIODO: DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

CONTRATO No.: LP-005-2023

HOJA: 1 de 2

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"

CONTRATISTA: CONSORCIO CGSM4

INTERVENTOR: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S.

VALOR TOTAL CONTRATO $340.466.351.223,00

PLAZO INICIAL CIENTO CUARENTA Y SEIS (146) MESES

VALOR ACTA DE COBRO: $ 1.150.802.017,36

VALOR ACTAS ACUMULADAS: $ 5.682.610.958,26

ÍTEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
III. REHABILITACIÓN ECOLÓGICA						**$ 418.523.000,00**		**$ 135.295.092,77**		**$ 180.219.724,00**		**$ 238.303.276,00**
3.1	P - 3.1	Aislamiento al Área Objeto de la Restauración Ecológica	ha	20	$ 4.806.217,00	$ 96.124.340,00	12,00	$ 57.674.604,00	12,00	$ 57.674.604,00	8,00	$ 38.449.736,00
3.2	P - 3.2	Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica	ha	20	$ 9.917.137,00	$ 198.342.740,00	5,25	$ 52.064.969,25	9,78	$ 96.989.600,00	10,22	$ 101.353.140,00
3.3	P - 3.3	Mantenimiento al Material Vegetal Establecido	ha	40	$ 3.101.398,00	$ 124.055.920,00	8,24	$ 25.555.519,52	8,24	$ 25.555.520,00	31,76	$ 98.500.400,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 5.331.676.806,00**		**$ 809.948.557,51**		**$ 3.827.391.064,26**		**$ 1.445.753.882,06**
		Administración			23,00%	$ 1.226.285.665,00		$ 186.288.168,23		$ 880.299.945,00		$ 345.985.720,00
		Imprevistos			2,00%	$ 106.633.536,00		$ 16.198.971,15		$ 76.547.821,00		$ 30.085.715,00
		Utilidad			5,00%	$ 266.583.840,00		$ 40.497.427,88		$ 191.369.553,00		$ 75.214.287,00
		IVA (19%) sobre la Utilidad			19,00%	$ 50.650.930,00		$ 7.694.511,30		$ 36.360.215,00		$ 14.290.715,00
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 1.650.153.971,00**		**$ 250.679.078,56**		**$ 1.184.577.534,00**		**$ 465.576.437,00**
		VALOR PPTO OBRA DEL PERÍODO 2025				**$ 6.981.830.777,00**		**$ 1.060.627.636,07**		**$ 5.011.968.598,26**		**$ 1.911.330.319,06**
IV. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						**$ 499.155.370,00**		**$ 75.776.791,00**		**$ 499.155.370,00**		**$ 0,00**
4.1	P - 4.1	Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre	mes	6,00	$ 19.004.991,00	$ 114.029.946,00	1,00	$ 19.004.991,00	6,00	$ 114.029.946,00	0,00	$ 0,00
4.2	P - 4.2	Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto	und	1,00	$ 328.353.624,00	$ 328.353.624,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 328.353.624,00	0,00	$ 0,00
4.5	P - 4.5	Mantenimiento Preventivo Estación de Monitoreo	und	4,00	$ 14.192.950,00	$ 56.771.800,00	4,00	$ 56.771.800,00	4,00	$ 56.771.800,00	0,00	$ 0,00
		IVA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			19,00%	$ 94.839.520,00		$ 14.397.590,29		$ 94.839.520,00		$ 0,00
		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CON IVA				**$ 593.994.890,00**		**$ 90.174.381,29**		**$ 593.994.890,00**		**$ 0,00**
		VALOR PPTO OBRA DEL PERÍODO 2025				**$ 7.575.825.667,00**		**$ 1.150.802.017,36**		**$ 5.605.963.488,26**		**$ 1.911.330.319,06**
		VALOR TOTAL VIGENCIAS 2024 - 2025				**$ 7.575.825.667,00**		**$ 1.150.802.017,36**		**$ 5.682.610.958,26**		**$ 1.893.214.708,74**

VALOR PRESENTE ACTA: MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DIECISIETE PESOS CON 36/100 CENTAVOS.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo parcial de obra por los que en ella intervinieron a los 28 días del mes de febrero de 2026:

ING. CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CGSM4

ING. FRANCISCO ALFONSO FERNÁNDEZ SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".	**ACTA**	**23**	**PERIODO**	**FEBRERO DE 2026**
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4	**NIT**	901-782,967-1	**CONTRATO**	LP 005 DE 2023
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 008 DE 2023

CAPÍTULO	**PRELIMINARES**	**ITEM**	**Movilización y desmovilización de equipos**	**UNIDAD**	**Und**





CAT 345	Identificación de la máquina:	MC685986	Cantidad:	0,50
CAT 323	Identificación de la máquina:	MC039573	Cantidad:	0,50
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**2,00**
			FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**1,00**
			TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**1,00**

Firma: _____
Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".	**ACTA**	**23**	**PERIODO**	**FEBRERO DE 2026**
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4	**NIT O C.C.**	901-782,967-1	**CONTRATO**	LP 005 DE 2023
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT O C.C.**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 008 DE 2023

CAPÍTULO	**MANTENIMIENTO HIDRAULICO**	**ITEM**	**Remoción Mecanica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora sobre Orugas. Incluye: Seguimiento y Control Topografico**	**UNIDAD**	**m3**



LOCALIZACION		**LONGITUD**	**AREA**	**VOLUMEN**	**VOLUMEN TOTAL**
CAÑO EL SALADO					
ALETA BOX 5	5+700.000			330,64	330,64
	5+725.000				
	5+750.000				
	5+775.000				
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		**113.159,10**
			FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR		**112.828,46**
			TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA		**330,64**

Firma: _____
Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".	**ACTA**	**23**	**PERIODO**	**FEBRERO DE 2026**
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4	**NIT**	901-782,967-1	**CONTRATO**	LP 005 DE 2023
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 008 DE 2023

CAPÍTULO	**MANTENIMIENTO HIDRAULICO**	**ITEM**	**Localización, trazado y replanteo topográfico**	**UNIDAD**	**m2**



CAÑO HONDO	
BOX 5	187,40
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**937,00**
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**749,60**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**187,40**

Firma: _____
Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".	**ACTA**	**23**	**PERIODO**	**FEBRERO DE 2026**
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4	**NIT**	901-782,967-1	**CONTRATO**	LP 005 DE 2023
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 008 DE 2023

CAPÍTULO	**MANTENIMIENTO HIDRAULICO**	**ITEM**	**Excavación manual**	**UNIDAD**	**m3**



CAÑO HONDO					
Área	**Alto**	**Ancho**	**Largo**	**Unidad**	**TOTAL**
Box No. 2 - Zapatas Sección 1	0,40	4,75	3,60	4,00	27,36
Box No. 2 - Zapatas Sección 2	0,35	3,50	3,60	4,00	17,64
Box No. 2 - Zapatas Sección 3	0,25	2,30	3,50	4,00	8,05
Box No. 3 - Zapatas Sección 1	0,40	4,75	3,60	4,00	27,36
Box No. 3 - Zapatas Sección 2	0,35	3,50	3,60	4,00	17,64
Box No. 3 - Zapatas Sección 3	0,25	2,30	3,50	4,00	8,05
Box No. 4 - Zapatas Sección 1	0,40	4,75	3,60	4,00	27,36
Box No. 4 - Zapatas Sección 2	0,35	3,50	3,60	4,00	17,64
Box No. 4 - Zapatas Sección 3	0,25	2,30	3,50	4,00	8,05
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		**418,12**
			FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR		**258,97**
			TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA		**159,15**

Firma: _____
Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".	**ACTA**	**23**	**PERIODO**	**FEBRERO DE 2026**
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4	**NIT**	901-782,967-1	**CONTRATO**	LP 005 DE 2023
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 008 DE 2023

CAPÍTULO	**MANTENIMIENTO HIDRAULICO**	**ITEM**	**Concreto F'c 3.000 PSI (21 Mpa) para solado de limpieza y nivelación de fondo de cimentación e=0,05m.**	**UNIDAD**	**m3**





CAÑO HONDO

Área	Alto	Ancho	Largo	Unidad	TOTAL
BOX NO. 1					
Aletas Sección 1	11	0,35	1	2,00	7,70
Aletas Sección 2	7,22	0,3	1	2,00	4,33
Aletas Sección 3	3,05	0,2	1	2,00	1,22
BOX NO. 2					
Losa Inferior	0,4	4	19,8	1,00	31,68
Muros	3	0,4	4	5,00	24,00
Zapatas Sección 1	0,35	3,75	3,6	4,00	18,90
Zapatas Sección 2	0,3	2,5	3,6	4,00	10,80
Zapatas Sección 3	0,2	1,3	3,5	4,00	3,64
BOX NO. 3					
Muros	3	0,4	4	5,00	24,00
Zapatas Sección 1	0,35	3,75	3,6	3,00	14,18
Zapatas Sección 2	0,3	2,5	3,6	3,00	8,10
Zapatas Sección 3	0,2	1,3	3,5	3,00	2,73
Aletas Sección 1	11	0,35	1	2,00	7,70
Aletas Sección 2	7,22	0,3	1	2,00	4,33
Aletas Sección 3	3,05	0,2	1	2,00	1,22
BOX NO. 4					
Muros	3	0,4	4	5,00	24,00
Zapatas Sección 1	0,35	3,75	3,6	2,00	9,45
Zapatas Sección 2	0,3	2,5	3,6	2,00	5,40
Zapatas Sección 3	0,2	1,3	3,5	2,00	1,82
Aletas Sección 1	11	0,35	1	2,00	7,70
Aletas Sección 2	7,22	0,3	1	2,00	4,33
Aletas Sección 3	3,05	0,2	1	2,00	1,22
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		**398,55**
			FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR		**180,10**
			TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA		**218,45**

Firma: _____
Nombre: ANGEL MARIA VIZCAINO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".	**ACTA**	**23**	**PERIODO**	**FEBRERO DE 2026**
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4	**NIT**	901-782,967-1	**CONTRATO**	LP 005 DE 2023
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 008 DE 2023

CAPÍTULO	**MANTENIMIENTO HIDRAULICO**	**ITEM**	**Suministro, corte, figuración y armado de acero de refuerzo grado 60 con Fy 60.000 PSI**	**UNIDAD**	**kg**



CAÑO HONDO	
Boxcoulvert No. 2	
Losa Inferior	4.575,68
Aletas (3)	4.129,55
Boxcoulvert No. 3	
Aletas (4)	5.506,06
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**41.498,37**
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**27.287,08**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**14.211,29**

Firma: _____
Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".	**ACTA**	**23**	**PERIODO**	**FEBRERO DE 2026**
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4	**NIT**	901-782,967-1	**CONTRATO**	LP 005 DE 2023
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 008 DE 2023

CAPÍTULO	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**	**ITEM**	**Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre**	**UNIDAD**	**Mes**



CAÑO HONDO	
Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre	1,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**6,00**
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**5,00**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**1,00**

Firma: _____
Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre: YURANI ACEVEDO
INGENIERA AMBIENTAL DE OBRA

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre: IVÁNA LEYES MORA
ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".	**ACTA**	**23**	**PERIODO**	**FEBRERO DE 2026**
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4	**NIT**	901-782,967-1	**CONTRATO**	LP 005 DE 2023
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 008 DE 2023

CAPÍTULO	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**	**ITEM**	**Aislamiento al Área Objeto de la Restauración Ecológica**	**UNIDAD**	**ha**



CAÑO HONDO	
Aislamiento al área objeto de restauración ecológica	12,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**12,00**
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**0,00**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**12,00**

Firma: _____
Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre: YURANI ACEVEDO
INGENIERA AMBIENTAL DE OBRA

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre: IVANA LEYES MORA
ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".	**ACTA**	**23**	**PERIODO**	**FEBRERO DE 2026**
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4	**NIT**	901-782,967-1	**CONTRATO**	LP 005 DE 2023
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT**	901.433.145-6	**CONTRATO**	CM 008 DE 2023

CAPÍTULO	**REHABILITACIÓN ECOLÓGICA**	**ITEM**	**Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica**	**UNIDAD**	**Ha**



Establecimiento siembra		5,25
	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**9,78**
	FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**4,53**
	TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**5,25**

Firma: _____
Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre: YURANI ACEVEDO
INGENIERA AMBIENTAL DE OBRA

Firma: _____
Nombre: IVANA LEYES MORA
ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP-005-2023. OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".		**ACTA**	**23**	**PERIODO**	**FEBRERO DE 2026**	
CONTRATISTA	CONSORCIO CGSM4	**NIT**	901-782,967-1		**CONTRATO**	LP 005 DE 2023	
INTERVENTOR	INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S.	**NIT**	901.433.145-6		**CONTRATO**	CM 008 DE 2023	

CAPÍTULO	**REHABILITACIÓN ECOLÓGICA**	**ITEM**	**Mantenimiento al Material Vegetal Establecido**	**UNIDAD**	**Ha**



Mantenimiento siembra		8,24
	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**8,24**
	FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR	**0,00**
	TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**8,24**

Firma: _____
Nombre: ÁNGEL MARÍA VIZCAÍNO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA


Firma: _____
Nombre: YURANI ACEVEDO
INGENIERA AMBIENTAL DE OBRA

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma: _____
Nombre: IVANA LEYES MORA
ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA

ANEXO 8

Planos topográficos.

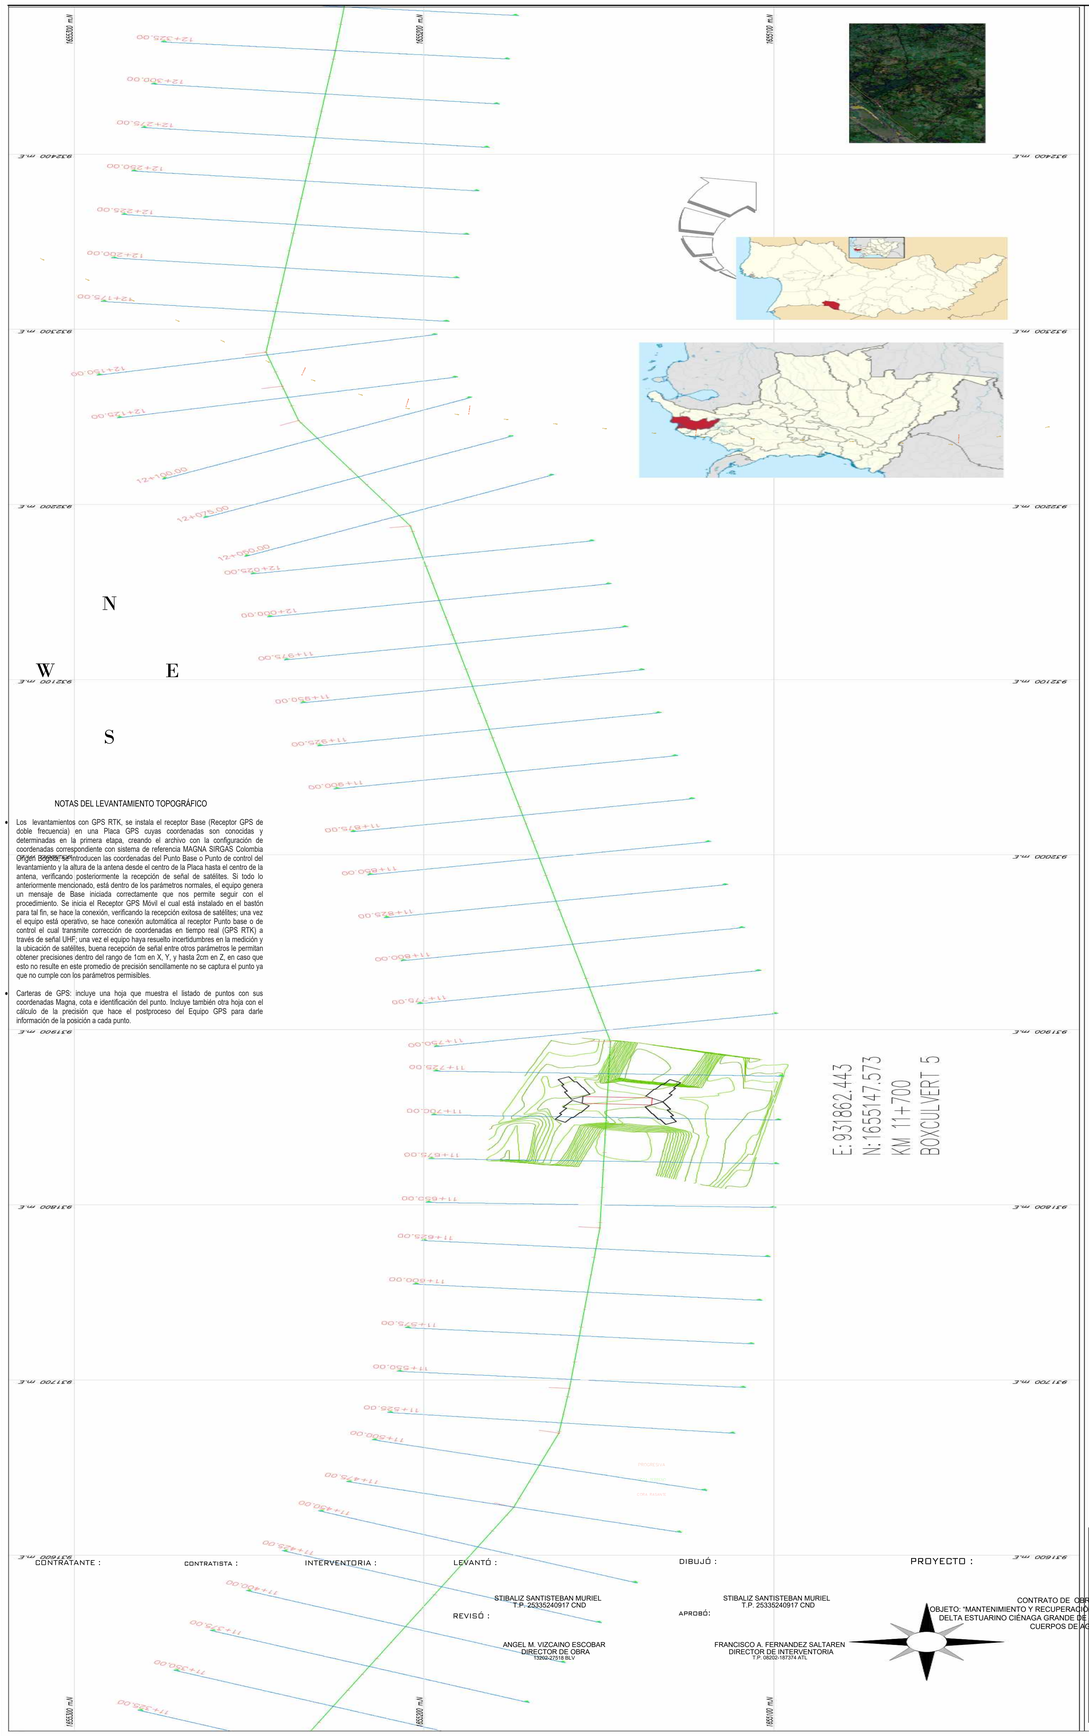

NOTAS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

- Los levantamientos con GPS RTK, se instala el receptor Base (Receptor GPS de doble frecuencia) en una Placa GPS cuyas coordenadas son conocidas y determinadas en la primera etapa, creando el archivo con la configuración de coordenadas correspondiente con sistema de referencia MAGNA SIRGAS Colombia Origen Oeste, se introducen las coordenadas del Punto Base o Punto de control del levantamiento y la altura de la antena desde el centro de la Placa hasta el centro de la antena, verificando posteriormente la recepción de señal de satélites. Si todo lo anteriormente mencionado, está dentro de los parámetros normales, el equipo genera un mensaje de Base iniciada correctamente que nos permite seguir con el procedimiento. Se inicia el Receptor GPS Móvil el cual está instalado en el bastón para tal fin, se hace la conexión, verificando la recepción exitosa de satélites; una vez el equipo está operativo, se hace conexión automática al receptor Punto base o de control el cual transmite corrección de coordenadas en tiempo real (GPS RTK) a través de señal UHF; una vez el equipo haya resuelto incertidumbres en la medición y la ubicación de satélites, buena recepción de señal entre otros parámetros le permitan obtener precisiones dentro del rango de 1cm en X, Y, y hasta 2cm en Z, en caso que esto no resulte en este promedio de precisión sencillamente no se captura el punto ya que no cumple con los parámetros permisibles.
- Carteras de GPS: incluye una hoja que muestra el listado de puntos con sus coordenadas Magna, cota e identificación del punto. Incluye también otra hoja con el cálculo de la precisión que hace el postproceso del Equipo GPS para darle información de la posición a cada punto.

PLANTA GENERAL
Esc. ---- 1: 1000

PERFIL LONGITUDINAL
Esc. ---- 1: 500

RESULTADO DE LA NIVELACION

Id	Altura Elipsoidal	Id	Ondulación	Ortometrica	Altura Nivelada
GP01	-0,857	GP01	-5,7	4,843	5,45
GP02	-2,148	GP02	-5,6	3,452	4,059
GP03	-2,858	GP03	-5,6	2,742	3,349
GP04	-3,913	GP04	-5,5	1,587	2,194
GP05	-2,782	GP05	-5,6	2,818	3,425
GP06	-4,423	GP06	-5,5	1,077	1,684
GP07	-4,094	GP07	-5,4	1,306	1,913
GP08	-3,811	GP08	-5,4	1,589	2,196
GP09	-3,629	GP09	-5,6	1,971	2,578
GP10	-3,704	GP10	-5,5	1,796	2,403
GP11	-4,574	GP11	-5,4	0,826	1,433

COORDENADAS

Id	Norte	Este	Origen
GP01	1654676,64	923993,293	Central
GP02	1653975,909	928323,377	Central
GP03	1655093,844	930759,717	Central
GP04	1656071,684	933426,815	Central
GP05	1663507,29	935004,845	Central
GP06	1659620,6	933103,938	Central
GP07	1662140,83	934304,127	Central
GP08	1645299,78	931295,934	Central
GP09	1660886,671	936933,942	Central
GP10	1666597,515	939526,659	Central
GP11	1667134,398	940783,302	Central
N°2TN2	1651627,666	921676,812	Central


CONTIENE :


CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LP 005 DE 2023.
OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESRATEGIAS"


CAÑO HONDO
BOXCULVERT 5
KM 11+675 - KM 11+750

MODIFICACIONES :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



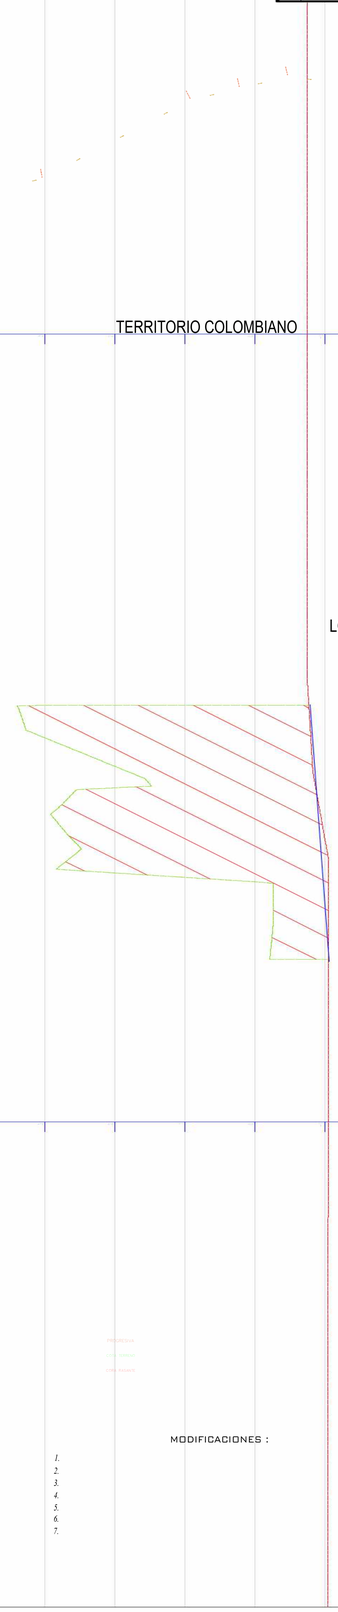



CONVENCIONES
TERRENO NATURAL
COTA DE DISEÑO
COTA EJECUCCIÓN
CANAL PROYECTADO
CANAL EXISTENTE
SECCIONES TRANSVERSALES
CURVAS DE NIVEL
PUENTE
ÁREA A INTERVENIR

CONTRATANTE :

CONTRATISTA :

INTERVENTORIA :

LEVANTÓ : STIBALIZ SANTISTEBAN MURIEL
T.P. 25335240917 CND

REVISÓ : ANGEL M. VIZCAINO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA
T3DNA-12715 RLV

DIBUJÓ : STIBALIZ SANTISTEBAN MURIEL
T.P. 25335240917 CND

APROBÓ : FRANCISCO A. FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
T.P. 08050-197374 ATL

PROYECTO :

TIPO : INDICADAS
ESCALA :
PLANO : 01 DE 02
CÓDIGO : HONDO-25
NOMBRE DE ARCHIVO : BOXCULVERT 5
FECHA : FEBRERO 2026
DISEÑO HIDRAULICO
PROYECTO : CAÑO HONDO

BOXCULVERT 5


SECCIÓN 11+675.00



SECCIÓN 11+700.00



SECCIÓN 11+725.00



CUADRO DE VOLUMEN TOTAL

PROGRESIVA	AREA DE CORTE(m2)	VOLUMEN DE CORTE(m3)	VOL. ACUMULABLE DE CORTE(m3)
11+675.00	20.72	259.05	23217.93
11+700.00	85.09	1322.74	24540.67
11+725.00	56.53	1770.31	26310.98
11+750.00	0.00	671.76	26982.74

CONVENCIONES
- TERRENO NATURAL
- COTA DE DISEÑO
- COTA EJECUCIÓN
- CANAL PROYECTADO
- CANAL EXISTENTE
- SECCIONES TRANSVERSALES
- CURVAS DE NIVEL
- PUENTE
- ÁREA A INTERVENIR

CONTRATANTE : CORPAMAG

CONTRATISTA : B&P

INTERVENTORIA : IEI INTERVENTORES E INGENIERIA

LEVANTÓ :
STIBALIZ SANTISTEBAN MURIEL
T.P. 25335240917 CND

REVISÓ :
ANGEL M. VIZCAINO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA
13050-27518 RLV

DIBUJÓ :
STIBALIZ SANTISTEBAN MURIEL
T.P. 25335240917 CND

APROBÓ:
FRANCISCO A. FERNANDEZ SALTAREN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
T.P. 08202-187314 ATL

PROYECTO :
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LP 005 DE 2023.
OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESRATEGIAS"

CONTIENE :
CAÑO HONDO

BOX 5 - KM 11+675 - 11+725

MODIFICACIONES :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ESCALA : 1:200

CÓDIGO : HONDO-25

NOMBRE DE ARCHIVO : POS DRAGADO

FECHA : FEBRERO 2026

TIPO : PLANO DISEÑO HIDRAULICO

PLANO : 02 DE 02

PROYECTO : CAÑO HONDO

ANEXO 9

Informe de salvamento de fauna.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG.

CONTRATO DE OBRA No. LP-005-2023.

CONTRATISTA:

Consorcio CGSM4
NIT. 901.782.967-1

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".

INFORME MES DE FEBRERO DE 2026.

CUADRO DE RESPONSABILIDADES



RESPONSABLE POR	NÚMERO DE REVISIÓN		
	0	1	2
Elaboración	Biólogo		
			
	Maria Auxiliadora Martínez Jiménez		
Revisión	Director de obra		
			
	Ing. Ángel M. Vizcaíno Escobar		

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN. 5
PROFESIONALES Y MATERIALES PARA EL AHUYENTAMIENTO Y RESCATE. 6
Grupo Técnico de Rescate y Manejo de Fauna Silvestre. 6
Herramientas e insumos veterinarios. 6
MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 8
ETAPA 1: Medidas preventivas. 8
ETAPA 2: Campamento. 9
ETAPA 3: Capacitación activa. 9
ETAPA 4: Rescate en caliente. 10
ETAPA 5 y 6. Atención medica inmediata y transporte hacia el CAVFS por parte de un profesional en fauna silvestre. 10
ETAPA 7. Liberación inmediata en zonas destinadas por la autoridad ambiental. 10
ETAPA 8. Monitoreo biológico. 10
Metodología general. 11
Anfibios y reptiles. 11
Aves. 12
Mamíferos. 12
Resultados. 12
Herpetos. 12
Aves. 13
Mamíferos. 18
REFERENCIAS. 20

Lista de ilustraciones.

Ilustración 1. Planificación de obras de rehabilitación hidráulica del proyecto VIGENCIA 2025 – Caño Hondo. Fuente Consorcio CGSM4. 5
Ilustración 2. Pinza herpetológica en campo. 9
Ilustración 3. Jornada de educación ambiental al personal presente en los frentes de obra activos, febrero 2026. 10
Ilustración 4. Ubicación espacial de los transectos monitoreados. Imagen tomada de Google, modificada. 11

Ilustración 5. Curva de completitud muestral Caño Hondo septiembre, octubre y noviembre. 14

Lista de tablas.

Tabla 1. Materiales del proyecto para ahuyentamiento, salvamento y monitoreo de fauna silvestre, Caño Hondo 2025. 7
Tabla 2. Insumos veterinarios para la atención primaria de fauna silvestre, Caño Hondo 2025. 7
Tabla 3. Especies de reptiles registradas en Caño Hondo. 13
Tabla 4. Resumen muestreo Caño Hondo septiembre, octubre y noviembre. 13
Tabla 5. Índices de Diversidad Alfa. 15
Tabla 6. Diversidad Beta – Jaccard. 15
Tabla 7. Especies de aves registradas en el Caño Hondo, etapa de ejecución recuperación hidrosedimentaria. 16

Lista de gráficos.

Gráfico 1. Número de familias de los órdenes identificados periodo septiembre, octubre y noviembre 2025. 14
Gráfico 2. clúster de similitud resultado del análisis del índice de Jaccard. 16

INTRODUCCIÓN.

El presente informe se enmarca en el proyecto MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES, desarrollado conforme a los lineamientos establecidos en el protocolo MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EN MARCO DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN HIDRO SEDIMENTOLÓGICA CGSM propuesto.

En el correspondiente periodo las actividades principales han estado orientadas a siembra y reforestación y a la construcción de Box Culvert, acciones intrínsicamente relacionadas con el entorno natural en las distintas zonas intervenidas. En este contexto y atendiendo la información suministrada por los operarios oriundos del territorio, sobre la presencia de serpientes en estos espacios; se ha dispuesto materiales específicos para la captura y manejo seguro de reptiles con el fin de garantizar tanto la seguridad de los operarios como la protección de los individuos hallados. De manera complementaria se ha continuado las charlas de educación ambiental dirigidas al personal vinculado al proyecto.

Finalmente, este documento presenta el análisis taxonómico derivado de la evaluación de los grupos vertebrados observados en el tramo intervenido en la vigencia en Caño Hondo, correspondientes a la fase operacional de la actividad de recuperación hidrosedimentaria. Este análisis constituye un insumo técnico fundamental para la gestión ambiental, al documentar especies presentes en el área de perturbación derivada de la ejecución del proyecto.

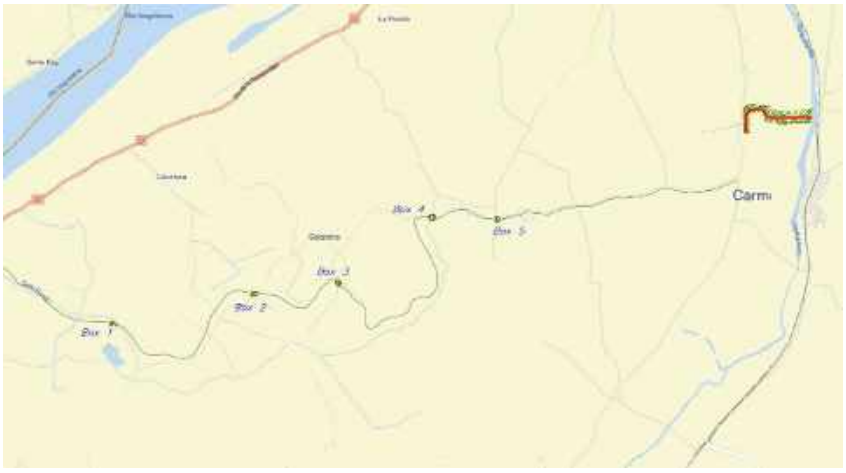


Ilustración 1. Planificación de obras de rehabilitación hidráulica del proyecto VIGENCIA 2025 – Caño Hondo. Fuente Consorcio CGSM4.

PROFESIONALES Y MATERIALES PARA EL AHUYENTAMIENTO Y RESCATE.

Grupo Técnico de Rescate y Manejo de Fauna Silvestre.

En el marco del proyecto de recuperación hidrosedimentaria, se ha conformado un equipo técnico interdisciplinario especializado en el manejo responsable de fauna silvestre, con el objetivo de garantizar la ejecución ética, segura y eficiente de las acciones de rescate, ahuyentamiento, valoración, atención, transporte y liberación de ejemplares que puedan verse afectados por las actividades del proyecto.

Un profesional en Biología, responsable de la identificación taxonómica de los ejemplares, evaluación ecológica del hábitat, registro de datos técnicos, elaboración de informes y coordinación de las acciones de rescate y liberación conforme a la Resolución 2064 de 2010 MAVDT.

Médico Veterinario, encargado de la valoración clínica, atención, estabilización y seguimiento sanitario de los ejemplares rescatados, quien define criterios de aptitud para el transporte y liberación, y supervisa el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y bienestar animal.

Dos auxiliares de campo, que apoyan en la captura segura, manipulación, traslado y liberación de los animales capturaos en caliente. Este personal es oriundo del área de influencia del proyecto; con experiencia previa en uso de equipos de contención y aplicación de protocolos de rescate en ambientes acuáticos y terrestres, tal como los establece el PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE DRAGADO EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA CGSM – Establecido por CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG.

Herramientas e insumos veterinarios.

Para la ejecución segura de las acciones de ahuyentamiento y rescate de fauna silvestre en el marco del proyecto, se dispone de un conjunto de materiales especializados que permiten minimizar el estrés animal y garantizar su integridad.

El equipamiento incluye dispositivos sonoros, como bocinas. Para el rescate en caliente, se cuenta con red nasa, pértiga, ganchos herpetológicos, guantes de protección, contenedores ventilados, además de un kit veterinario portátil para atención primaria.

Además, se cuenta con equipos para monitoreo de la fauna *in situ*, como cámaras para fototrampeo, binocular Simmons 8x42 mm y cámara fotográfica Canon EOS Rebel T7 con lente EF 75 – 300 mm f/4-5.6 III.

Tabla 1. Materiales del proyecto para ahuyentamiento, salvamento y monitoreo de fauna silvestre, Caño Hondo 2025.

Descripción	Cantidad
Cámaras trampa Protección contra chorros directos de alta presión IP66 de 32 MP	4
Baterías Alcalinas X 68 x caja de 48 baterías	2
Pinza para el Manejo de Serpientes (Long. Minima 1.20m)	1
Pértiga para el Manejo de Mamíferos y Herpetos (Long. Minima 1.20m)	1
Guacal plástico rígido Para Perro #300 (talla L) 81 cm de largo	1
Guacal Nacional, plástico rígido, viaje - pequeño #100 60X40	1
Cajas plásticas transparentes con broches grandes Wenbox 40x31x66 cm 61 Lt Transparente	1
Cajas plasticas transparentes Set x2 cajas organizadoras con broches 20 L	1
Nasa de control	2
Guantes reforzados, largos de carnaza	6
Guantes blandos X20 pares	1
Poli sombra X 100 m	2
Machete con vaina Juego de 6 Limas 6Pulg Con Mango	6
Bocinas y vuvuzelas (Ruido)	2
Sillas y mesa plástica para campamento	2

Tabla 2. Insumos veterinarios para la atención primaria de fauna silvestre, Caño Hondo 2025.

Insumos Veterinarios.	Cantidad.
Caja de guantes quirúrgicos	1
Botiquín primeros auxilios	1

Clorhexidina liquida	1
Productos antisépticos curación fauna *Dermosyn	1
Suero fisiológico	2
Analgésicos fauna* Meloxicam	1
Antidiarreicos fauna	5
Kit pequeña cirugía y sutura	1
Rollo de algodón	2
Jeringas 10 ml	5
Jeringas insulina	5
Sales de rehidratación oral X caja	5
Rollo de papel secante	2
Pañitos húmedos X 100	1
Platos alimentación animales	1
Atomizadores de agua	1

MEDIDAS DE MITIGACIÓN.

Las activades de manejo de fauna silvestre en el proyecto están direccionadas por el PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE SALVAMENTO DE FAUNA ACUÁTICA Y TERRESTRE CGSM4 para el Manejo de Fauna Silvestre en Marco de las Obras De Rehabilitación Hidrosedimentológica CGSM.

ETAPA 1: Medidas preventivas.

Se implementaron medidas preventivas para mitigar las posibles afectaciones a la fauna silvestre presente en la zona de desarrollo de las actividades correspondientes a este periodo, en concordancia con el Plan de Manejo de Fauna Silvestre en el marco de las Obras de Rehabilitación Hidrosedimentológica del CGSM, propuesto por el consorcio y ajustado a los lineamientos establecidos en la Resolución 2064 de 2010 del MAVDT.

En el frente de reforestación se mantiene disponibles materiales para la captura y reubicación de reptiles, garantizando la protección de estos vertebrados y la seguridad del personal operativo.

ETAPA 2: Campamento.

El proyecto cuenta los elementos e insumos veterinarios descritos en las tablas 1 y 2, los cuales respaldan las acciones de manejo y atención de fauna silvestres en las áreas de intervención del proyecto. Sin embargo, debido a que la cuadrilla de reforestación realiza cambios continuos de sus áreas de trabajo y considerando la seguridad en la zona, únicamente se mantiene en itinerancia las pinzas herpetológicas, herramienta fundamental para el manejo seguro de reptiles, en especial las serpientes. Esta decisión responde a la necesidad de garantizar respuesta inmediata ante la presencia de estos individuos y la optimización de la logística en campo, manteniendo insumos relevantes para contingencias bajo los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo de Fauna Silvestre en el marco de las obras de rehabilitación hidrosedimentológica del CGSM.



Ilustración 2. Pinza herpetológica en campo.

ETAPA 3: Capacitación activa.

En este periodo, el personal operativo vinculado a las labores de los frentes activos del proyecto participó en jornadas de capacitación orientadas a la protección del medio ambiente, con el propósito de seguir fortaleciendo sus conocimientos y practicas en torno al manejo responsables de los recursos naturales.





Ilustración 3. Jornada de educación ambiental al personal presente en los frentes de obra activos, febrero 2026.

ETAPA 4: Rescate en caliente.

Durante el periodo, no se realizaron capturas en caliente de fauna silvestre en el marco de las actividades operativas del proyecto.

ETAPA 5 y 6. Atención medica inmediata y transporte hacia el CAVFS por parte de un profesional en fauna silvestre.

En el periodo, no fue necesario realizar atención médica, ni efectuar el traslado de fauna silvestre hacia el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAVFS) por parte del Grupo Técnico de Rescate y Manejo de Fauna Silvestre.

ETAPA 7. Liberación inmediata en zonas destinadas por la autoridad ambiental.

En el periodo, no fue necesario realizar atención médica, ni efectuar el traslado de fauna silvestre hacia el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAVFS) por parte del Grupo Técnico de Rescate y Manejo de Fauna Silvestre.

ETAPA 8. Monitoreo biológico.

A continuación, se propone el análisis taxonómico de los registros de fauna silvestre obtenidos en la fase de ejecución del dragado del tramo del Caño Hondo programado para intervenir en la vigencia 2025.

Para estos monitoreos se tuvieron en cuenta los transectos definidos en el levantamiento de la línea basa de fauna silvestre, de acuerdo con lo anterior se enmarcaron tres tramos:

Transecto 1: área paralela a la carretera. Reservorio con platas acuáticas y pastizales. Coordenada. 10°31'44.3"N 74°40'00.8".

Transecto 2: área dentro de las fincas. Con árboles dispersos, pastizales y suelos descubiertos. Coordenada. 10.534, -74.667

Transecto 3: área con conexión a caño Martinica, Reservorio con platas acuáticas, pastizales y arboles dispersos. 10.532, -74.663.

Estos registros se realizaron en los meses de septiembre, octubre y noviembre entre las 7 am y las 11 am, logrando con ello un recorrido en el tramo 1 y dos en los tramos 2 y 3.

Para la identificación de algunas especies se utilizó guía de campo Aves del Caribe Colombiano de Milles McMuller 2021, Guía Ilustrada de la Avifauna Colombiana de Fernando Ayerbe Quiñones 2022 y Guía de Reptiles del Caribe Colombiano 2020.



Ilustración 4. Ubicación espacial de los transectos monitoreados. Imagen tomada de Google, modificada.

Metodología general.

Anfibios y reptiles.

Durante los recorridos se registraron todos anfibios y reptiles encontrados a lo largo de cada transecto delimitado.

Algunos individuos encontrados fueron fotografiados e identificados hasta especie utilizando literatura especializada con claves dicotómicas para su identificación hasta el nivel de especie.

Aves.

Se realizaron registros visuales y auditivos de las especies de aves presentes en los transectos, considerando la abundancia relativa de cada una. Para lograr, un consolidado del tramo que permita caracterizar la composición específica en la unidad del muestreo.

Mamíferos.

Se instaló un sistema de fototrampeo mediante cámara trampa ubicada en la ribera de Caño Hondo, específicamente en el área intervenida correspondiente al transecto 2. Esta acción tuvo como objetivo complementar el monitoreo de fauna silvestre mediante registros indirectos, permitiendo detectar especies de hábitos crípticos, nocturnos o de baja detectabilidad durante los recorridos diurnos.

Resultados.

Herpetos.

Se realizó el registro de los anfibios y reptiles a partir de observaciones ocasionales que no representan un muestreo exhaustivo debido a que las horas de muestreo apropiadas para estos grupos de vertebrados incluye un horario de búsqueda nocturno (Angulo et al. 2006).

Se registraron cuatro especies de reptiles en el área de estudio, pertenecientes a tres órdenes y tres familias. Siendo la familia Teiidae quien posee las mayores abundancias en los tres tramos evaluados. Las especies de la familia Teiidae, como *Ameiva praesignis*, muestran una alta tolerancia a la perturbación antrópica y se registran con frecuencia en áreas abiertas y modificadas (Fuentes, 2024).

Trachemys callirostris ha demostrado capacidad de adaptación y reproducción en ambientes intervenidos, lo que evidencia su resiliencia frente a la transformación del hábitat, a pesar de ello se encuentra catalogada como vulnerable debido a la presión antrópica sobre sus hábitats acuáticos y a la extracción ilegal de individuos para consumo y comercio (Leguízamo et al. 2014). *Caiman crocodilus fuscus* constituye una de las especies de mayor relevancia ecológica en los humedales del Caribe colombiano, desempeñando un papel clave en el equilibrio de las comunidades acuáticas. Sin embargo, desde el punto de vista de su vulnerabilidad, enfrenta presiones significativas derivadas de la transformación de ecosistemas, la fragmentación de hábitats y la cacería ilegal para consumo y comercio de pieles (Forero et al. 2016).

Tabla 3. Especies de reptiles registradas en Caño Hondo.

Orden	Familia	Especie	Trans1	Trans2	Trans3
Testudines	Emydidae	*Trachemys callirostris*	1		
Crocodylia	Alligatoridae	*Caiman crocodilus fuscus*	1		
Squamata	Teiidae	*Ameiva praesignis*	3	5	5
		Cnemidophorus sp	5	8	8

Aves.

En relación con avifauna tenemos registros en transecto 1 de 98 individuos, para el transecto 2: 249 y el transecto 3: 163. Para un total de 510 especímenes, repartidos en 78 especies presente en el área total estudiada.

Tabla 4. Resumen muestreo Caño Hondo septiembre, octubre y noviembre.

	Trans1	Trans2	Trans3
Número de individuos.	98	249	163
Especies observadas	32	50	42
Cobertura de muestreo	0.9192	0.9520	0.9148

De acuerdo con la cobertura de muestreo estimada mediante el software estadístico iNext, en cada tramo evaluado se logró registrar más del 90% de las especies potenciales presentes. Con base en estos resultados, se presenta la curva de acumulación de avifauna construida a partir de los registros obtenidos durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025 en los transectos establecidos para el estudio.

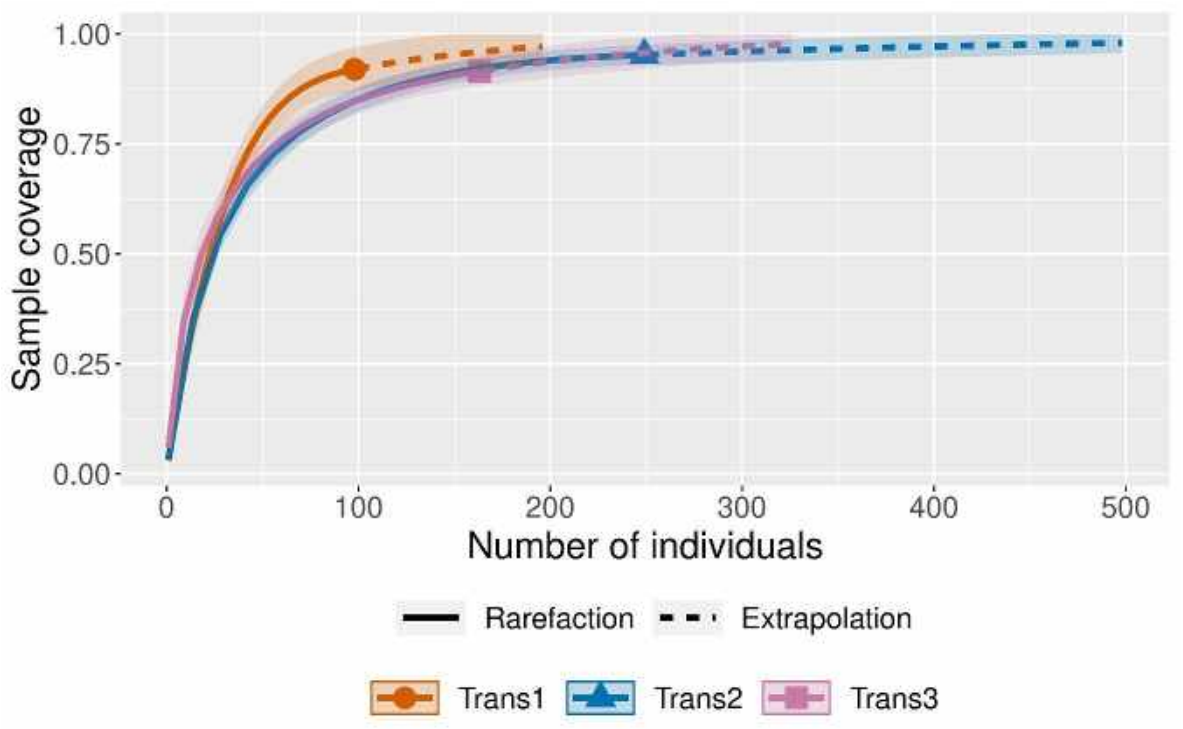


Ilustración 5. Curva de completitud muestral Caño Hondo septiembre, octubre y noviembre.

En relación con los órdenes registrados, se identificó un total de 17, dentro de los cuales se agrupan 30 familias. El orden *Passeriformes* resultó ser el mejor representado, con el 27% de las familias, seguido por *Charadriiformes* con el 16%, y finalmente *Anseriformes* y *Columbiformes*, cada uno con el 6%.

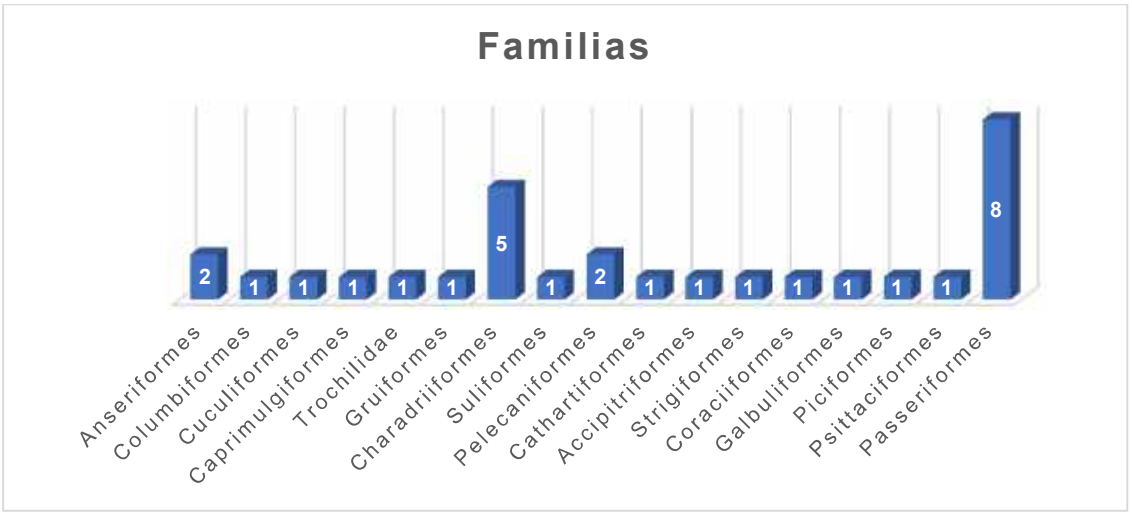


Gráfico 1. Número de familias de los órdenes identificados periodo septiembre, octubre y noviembre 2025.

La riqueza de especies en cada tramo estudiado fue estimada mediante los índices de Margalef, Shannon y Simpson, utilizando el software estadístico Past. De acuerdo con estos resultados, el análisis de la diversidad alfa revela transectos diversos, con mayor riqueza específica en el Trans2. No obstante, en las tres áreas se evidencia la presencia de especies dominantes, aunque sin perder la equidad en la distribución de los individuos.

Tabla 5. Índices de Diversidad Alfa.

Índice	Trans1	Trans2	Trans3
Margalef	6.761	8.881	8.049
Simpson_1D	0.9705	0.9657	0.9408
Shannon_H	3.484	3.644	3.355

A partir del clúster de similitud resultado del análisis del índice de Jaccard para diversidad Beta, observamos que los transectos 2 y 3 comparten una porción moderada de especies identificándolos cómo las zonas con mayor cercanía con una similitud de 0.327. Mientras que el Trans1 comparte menos especies con las otras áreas (0.28 – 0.25).

Tabla 6. Diversidad Beta – Jaccard.

Jaccard	Trans1 (A)	Trans2 (B)	Trans3 (C)
Trans1 (A)	1	0,28846154	0,25
Trans2 (B)	0,28846154	1	0,32727273
Trans3 (C)	0,25	0,32727273	1

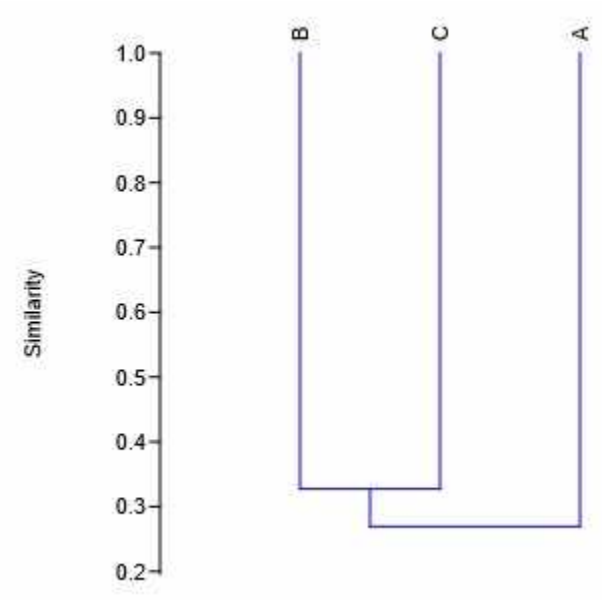


Gráfico 2. clúster de similitud resultado del análisis del índice de Jaccard.

Tabla 7. Especies de aves registradas en el Caño Hondo, etapa de ejecución recuperación hidrosedimentaria.

Orden	Familia	Especie	Trans1	Trans2	Trans3
Anseriformes	Anhimidae	*Chauna chavaria*	2		
	Anatidae	*Dendrocygna autumnalis*	4	5	7
Columbiformes	Columbidae	*Columbina talpacoti*	4	10	5
		Columbina squammata	6	13	4
		Leptotila verreauxi		2	3
		Zenaida auriculata			3
Cuculiformes	Cuculidae	*Crotophaga ani*	6	22	14
		Crotophaga major		4	0
		Crotophaga sulcirostris		18	1
		Tapera naevia		1	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	*Nyctidromus albicollis*			2
Trochilidae	Apodiformes	*Chrysuronia goudoti*		4	
Gruiformes	Aramidae	*Aramus guarauna*		2	6
Charadriiformes	Recurvirostridae	*Himantopus mexicanus*		4	
	Charadriidae	*Vanellus chilensis*	3	4	
	Jacanidae	*Jacana jacana*	5	6	1

	Laridae	*Phaetusa simplex*			15
	Scolopacidae	*Actitis macularius*	1	8	
		Anarhynchus collaris		7	
		Tringa solitaria	3	8	2
Suliformes	Phalacrocoracidae	*Nannopterum brasilianum*		1	
Pelecaniformes	Threskiornithidae	*Phimosus infuscatus*	4	3	5
		Mesembrinibis cayennensis			1
	Ardeidae	*Tigrisoma lineatum*	1		
		Butorides striata			1
		Egretta thula		1	
		Ardea ibis		1	
		Ardea alba		6	5
		Ardea cocoi			1
Cathartiformes	Cathartidae	*Cathartes burrovianus*	1	3	
		Coragyps atratus		4	
		Cathartes aura			7
Accipitriformes	Accipitridae	*Geranospiza caerulescens*	1		
		Rupornis magnirostris			1
		Rostrhamus sociabilis	4		
		Busarellus nigricollis		3	2
		Buteogallus meridionalis			2
Strigiformes	Strigidae	*Bubo virginianus*		1	
		Glaucidium brasilianum		1	
Coraciiformes	Alcedinidae	*Megaceryle torquata*		1	
		Chloroceryle americana	1	1	
Galbuliformes	Bucconidae	*Hypnelus ruficollis*		6	
Piciformes	Picidae	*Melanerpes rubricapillus*		2	1
Psittaciformes	Psittacidae	*Eupsittula pertinax*		16	
Passeriformes	Furnariidae	*Certhiaxis cinnamomeus*	5	6	1
		Furnarius longirostris	4		
		Synallaxis albescens	1		
	Tyrannidae	*Todirostrum cinereum*		4	3
		Empidonax traillii	2		
		Tyrannulus elatus			1
		Elaenia flavogaster			1

		Pyrocephalus rubinus	1	3	2
		Fluvicola pica	2	1	1
		Arundinicola leucocephala		2	
		Machetornis rixosa		2	
		Pitangus sulphuratus	3	16	6
		Megarynchus pitangua		1	
		Tyrannus melancholicus	4	9	2
		Tyrannus dominicensis		6	1
	Hirundinidae	*Progne tapera*	5		30
		Progne chalybea	4		
		Hirundo rustica		3	
		Pygochelidon cyanoleuca	3		
	Troglodytidae	*Troglodytes musculus*	4	4	3
		Campylorhynchus nuchalis		4	3
		Campylorhynchus griseus	2		4
	Vireonidae	*Cyclarhis gujanensis*		3	
	Icteridae	*Quiscalus mexicanus*	3		
		Quiscalus lugubris			5
		Chrysomus icterocephalus			2
		Icterus nigrogularis		9	2
	Parulidae	*Protonotaria citrea*		1	
		Setophaga petechia		3	3
	Thraupidae	*Sicalis flaveola*	3	1	
		Volatinia jacarina	5	3	2
		Thraupis palmarum	1		
		Thraupis episcopus			1
		Saltator olivascens			1

Mamíferos.

Del grupo mamífero, se registra *Myrmecophaga tridactyla* (oso hormiguero gigante) dentro del área de influencia directa del proyecto. Esta especie habita una amplia variedad de ecosistemas, incluyendo sabanas, pastizales, áreas pantanosas, bosques húmedos y bosques secos, siendo más frecuente en zonas abiertas con alta disponibilidad de hormigas y termitas, que constituyen la base de su dieta

especializada (mirmecofagia) (Cáceres-Martínez et al., 2024). A nivel mundial y nacional, *M. tridactyla* ha sido categorizado como Vulnerable (VU) y está incluido en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Entre las principales amenazas que enfrenta se encuentran la destrucción y fragmentación de su hábitat, ataques por parte de perros domésticos, atropellamientos en vías terrestres, quemas, y la cacería tanto deportiva como de subsistencia (Gaudin et al., 2018).

REFERENCIAS.

Consorcio CGSM4. (2024). Manejo de fauna silvestre en marco de las obras de rehabilitación hidro sedimentológica CGSM. Contrato de obra lp-005-2023. “Mantenimiento y recuperación de las condiciones ambientales del complejo delta estuarino ciénaga grande de santa marta mediante la intervención de los cuerpos de agua y otras estrategias adicionales”. 19 P.

CORPAMAG (2021). Protocolo para el manejo de fauna silvestre en el marco de los proyectos de dragado en la Ciénaga Grande de Santa Marta-CGSM. 14p.

Angulo A., et al. (2006). Técnicas para el inventario y monitoreo para los anfibios de la región tropical Andina. Conservación Internacional Serie Manuales de Campo. 299 p.

Fuentes, R. (2024). *Mating of the Amazon racerunner (Ameiva praesignis) (Squamata, Teiidae) in Panama*. Neotropical Biology and Conservation, 19(3), 405–409.

Leguízamo-Pardo, C., & Bonilla Gómez, M. A. (2014). Reproducción de *Trachemys callirostris callirostris* (Emydidae) en ambientes generados por la minería en La Guajira, Colombia. *Acta Biológica Colombiana, 19*(3), 363–380. Universidad Nacional de Colombia. Disponible en: Redalyc – Acta Biológica Colombiana (redalyc.org in Bing)

Forero-Medina, G., Castaño-Mora, O. V., & Rodríguez-Melo, M. (2006). *Ecología de Caiman crocodilus fuscus en San Andrés Isla, Colombia: Un estudio preliminar*. Caldasia, 28(1), 115–124. Universidad Nacional de Colombia.

Chao, A., Ma, K. H., y Hsieh, T.C. (2016) iNEXT (iNterpolación y EXTrapolación) Online: Software para la Interpolación y Extrapolación de la Diversidad de Especies. Programa y guía de usuario publicada en http://chao.stat.nthu.edu.tw/wordpress/software_download/inext-online/.

Cáceres-Martínez, C. H., Aya-Cuero, C. A., Zamora-Abrego, J. G., & Acevedo-Quintero, J. F. (2024). Nuevo registro de Myrmecophaga tridactyla (Pilosa: Myrmecophagidae) para La Guajira: ampliando el conocimiento sobre su distribución en Colombia. Mammalogy Notes, 10(2), 409–409. https://doi.org/10.47603/mano.v10n2.409.

Gaudin, T. J., Hicks, P., & Di Blanco, Y. (2018). Myrmecophaga tridactyla (Pilosa: Myrmecophagidae). Mammalian Species, 50(956), 1–13. https://doi.org/10.1093/mspecies/sey001

ANEXO 10

Informe de siembra.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG.

CONTRATISTA:


CONTRATO DE OBRA No. LP-005-2023.

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".

INFORME DE ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

FEBRERO 2026.

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE POR:	NÚMERO DE REVISIÓN		
	0	1	2
Elaboración	Ing. Yurani Acevedo C.		
			
	Residente Ambiental		
Revisión	Ing. Yurani Acevedo C.		
			
	Residente Ambiental		
Aprobación	Ing. Ángel Vizcaino Escobar		
			
	Director de Proyecto		

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DEPENDENCIA	No. COPIAS	FECHA DE ENVÍO	OBSERVACIONES
CORPAMAG	1		
Interventores e Ingeniería S.A.S	1		

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 4
2.1 Localización 4
2.2 Localización especifica 5
3. ACTIVIDADES EN CAMPO 6
3.1 Siembra 7
3.2 Riego 7
3.3 Tutorado 7
3.4 Descargue de material vegetal 8
3.5 Trinchera 9
3.6 Control fitosanitario 9
4. HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPOS 10

1. INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, suscribió con CONSORCIO CGSM4 el Contrato de Obra No. LP-005-2023 para realizar las obras de "*MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES*" Igualmente, celebró el Contrato de interventoría No. CM-008-2023 con INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S., para realizar la Interventoría al presente proyecto.

Dentro del alcance del contrato, se encuentra contemplado el "Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica", que contempla la siembra de individuos arbóreos en una extensión de 20 hectáreas. La actividad de siembra se realizará en la zona de intervención de la presente vigencia del contrato, específicamente en Caño Hondo, municipio de Pivijay, corregimiento de Carmen del Magdalena.

Esta estrategia implica la plantación de árboles y se utiliza principalmente cuando la sucesión natural de la vegetación se ve obstaculizada por ciertos factores, lo que requiere un apoyo o aceleración de este proceso. Entre los elementos que pueden dificultar el desarrollo de la sucesión vegetal se encuentran: la disponibilidad de agua, la distancia a fuentes de semillas, el uso histórico del suelo, la falta de fauna dispersora, entre otros. Por esta razón, la restauración activa mediante la plantación de árboles puede omitir algunas etapas del proceso sucesional, ayudando a recuperar gradualmente las funciones que el ecosistema tenía antes de las perturbaciones.

La restauración activa no se basa en plantar árboles de manera aleatoria, sino que es fundamental seleccionar adecuadamente las especies, la distancia de siembra, las condiciones del terreno y las prácticas silvícolas que se apliquen para asegurar el éxito del proceso. Las especies elegidas deben ser nativas y autóctonas de la región, ya que estas tienen una mejor adaptación. Además, la selección debe realizarse a partir del estudio de los ecosistemas de referencia cercanos, considerando las características particulares del lugar donde se realizará la siembra.

2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

2.1 Localización

La Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM), es el complejo lagunar más grande de Colombia con un área aproximada de 3.487 km2 de los cuales 73 corresponden al espejo de agua. Dentro de esta área se encuentran localizados la vía - Parque Isla de Salamanca y el Santuario de Flora y Fauna. La CGSM está ubicada en el extremo

noroccidental del Departamento del Magdalena, al norte del país y esta globalmente comprendido entre el nacimiento del caño Schiller en la Ciénaga de Cerro de San Antonio por el Sur, el río Magdalena por el Oeste, el Mar Caribe al Norte y al Este por la desembocadura de los ríos Fundación, Aracataca, Sevilla y Frío que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y desembocan en la Ciénaga Grande de Santa Marta. *(Estudios previos)*

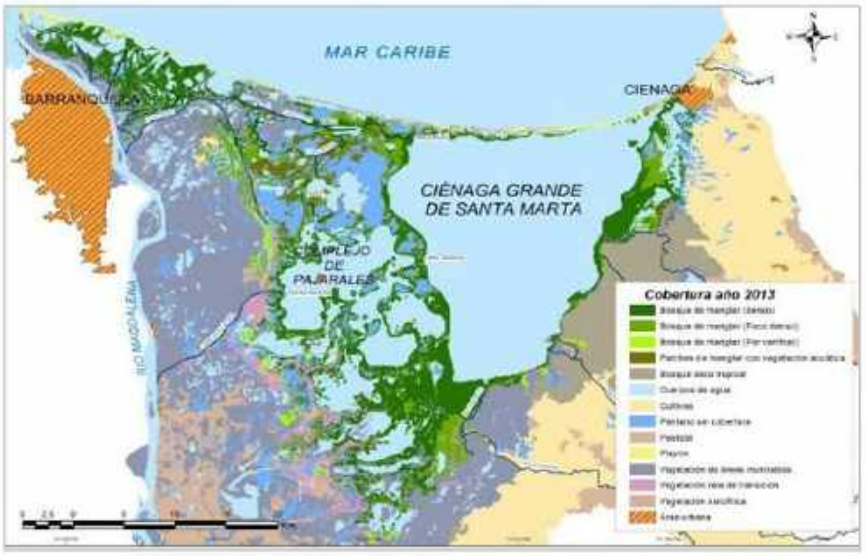


Ilustración 1. Complejo Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta.

2.2 Localización especifica

Específicamente el área de la Ciénaga Grande que se pretende intervenir durante la vigencia del año 2025 es el Caño Hondo, localizado en inmediaciones del Municipio de Salamina (Magdalena).

El municipio de Salamina se localiza en Colombia, en el Departamento del Magdalena, pertenece a la región geográfica de la ciénaga Grande del Magdalena, fue fundado en 1765, se encuentra ubicado al Centro del departamento del Magdalena, localizado a los 10° 29`25" de latitud norte y 74° 47`38" de longitud al oeste de Greenwich, comprende una extensión de 175 Km2 que equivale al 0.75% del área departamental y al 0.015% del total nacional, su altura sobre el nivel del mar es de 3m, dista 173.3 Km con la ciudad de Santa Marta (Capital del Departamento) y a 75.5 Km del distrito de Barranquilla. Su relieve está caracterizado por poseer un territorio bajo plano y cenagoso, bañado por algunos caños convirtiéndose en una inmensa llanura de inundaciones que contienen depósitos de terraza aluvial generándose una terraza ligeramente inclinada.

Las actividades del componente de rehabilitación ecológica se llevarán a cabo en distintos predios del corregimiento de Carmen del Magdalena listados a continuación:

- La India 1
- Nueva Esperanza
- Tosnovan
- Betania
- La India 2
- Paso Lobo
- La Esmeralda
- Monterrey
- La Tigra 1
- Bella Sara



Ilustración 2. Polígonos seleccionados para la restauración ecológica

3. ACTIVIDADES EN CAMPO

Durante el periodo del mes de enero de 2026, el consorcio CGSM4 realizó las siguientes labores:

3.1 Siembra

Durante este periodo se sembraron un estimado de 5,25 hectáreas, esta siembra corresponde a la especie de roble, ceiba blanca, bonga, guayacán, trébol y caracolí.





3.2 Riego

La labor de riego se realiza de forma semanal a cada lo sembrado, en la finca La India 1 por inundación y en la finca Nueva Esperanza por aspersión y Tosnovan de forma manual.

3.3 Tutorado

La labor de tutorado para enderezar y fortalecer el tallo se realiza en los especímenes que son livianos en el mismo, esta labor se hace en las especies ceiba blanca y bonga.




3.4 Descargue de material vegetal

Durante el mes se descargó un total de 11.550 árboles en la finca La Bodega, las especies descargadas fueron roble morado, ceiba blanca, bonga, trébol y guayacan, caracolí y campano, se realiza adicional el descargue de 160 bultos de 50 kilos cada uno de abono orgánico.







3.5 Trinchera

Para evitar la inundación excesiva de los lotes sembrados, se realiza la labor de trinchera.




3.6 Control fitosanitario

Se realiza control una vez a la semana en cada lote sembrado, así como en los especímenes sin sembrar, se observan arboles sanos, sin ataque de plagas o enfermedades. A la fecha de este informe se observan especímenes con buen vigor y crecimiento.





4. HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPOS

Para el mes de enero se utilizaron las siguientes herramientas, insumos y equipos:

- Herramientas menores (machetes, limas, paladragas, metro y cuerdas).
- Tanques para preparación de hidro retenedor y medidores de 500 gramos.
- Carretillas.
- Elementos de protección personal (Guantes, botas pantaneras).

ANEXO 11

Informe de mantenimiento de estaciones de monitoreo.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG.

CONTRATO DE OBRA No. LP-005-2023.

CONTRATISTA:

CONTRATO No. LP-005-2023.



OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".

INFORME TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y CALIDAD DE AGUA

ESTACIÓN CAÑO AGUAS NEGRAS

Febrero 2025.

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE POR:	NÚMERO DE REVISIÓN		
	0	1	2
Elaboración	Ing. Carlos J. Cárdenas Molina		
			
	Gerente General Envicteck		
Revisión	Ing. Edilberto G. Roys Corzo.		
			
	Residente de Obra		
Aprobación	Ing. Ángel M. Vizcaíno Escobar.		
			
	Director de Obra		

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DEPENDENCIA	No. COPIAS	FECHA DE ENVÍO	OBSERVACIONES
CORPAMAG	1		
Interventores e ingeniería S.A.S	1		

CUADRO DE MODIFICACIONES

ÍNDICE DE REVISIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

CONTENIDO

1. ESTADO INICIAL 4
2. ACTIVIDADES REALIZADAS 5
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 5
   3.1. Análisis y verificación de histórico de datos, descarga de programación y datos de la plataforma colectora de datos. 5
   3.2. Mantenimiento preventivo a sensores 5
   3.3. Verificación y mantenimiento al sistema de alimentación (panel solar, controlador de carga y batería). 9
4. ESTADO FINAL DE LA ESTACIÓN 10
5. RECOMENDACIONES 11
6. CONCLUSIONES GENERALES 12

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Estado inicial – Fachada 4
Ilustración 2. Estado inicial - Alrededores 4
Ilustración 3. Mantenimiento sensor de precipitación 5
Ilustración 4. Mantenimiento sensor de nivel de agua 6
Ilustración 5. Mantenimiento sonda manda de lodo 6
Ilustración 6. Limpieza general sonda HL7 7
Ilustración 7. Membrana sensor de oxígeno disuelto 7
Ilustración 8. Calibración pH. 8
Ilustración 9. Calibración conductividad. 8
Ilustración 10. Calibración turbidez 9
Ilustración 12. Verificación sistema de alimentación 9
Ilustración 13. Mantenimiento panel solar 10
Ilustración 14. Estado final de la estación 10
Ilustración 15. Visualización de datos en el datalogger 11
Ilustración 16. Registro de datos Aquatick 11

1. ESTADO INICIAL

La estación se encontró operativa, pero con la membrana del sensor de oxígeno disuelto totalmente deteriorada, el modem externo para la transmisión de datos vía GPRS está funcionando adecuadamente, por último, las estructuras (soportes, mástiles, brazo, miras limnimétricas y tubo Novafort), caseta y cerramiento se hallaron en buenas condiciones.



Ilustración 1. Estado inicial – Fachada



Ilustración 2. Estado inicial - Alrededores

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Análisis y verificación de histórico de datos, descarga de programación y datos de la plataforma colectora de datos.
- Mantenimiento preventivo a sensores y calibración o verificación sonda de calidad de agua.
- Verificación y mantenimiento al sistema de alimentación (Panel solar, controlador de carga y batería).

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

3.1. Análisis y verificación de histórico de datos, descarga de programación y datos de la plataforma colectora de datos.

Se examinó y verificó el histórico de datos para tener conocimiento de la operación y comportamiento de cada uno de los sensores, se realizó la descarga de la plantilla de programación dell datalogger al igual que la descarga de los datos almacenados en la memoria interna para el periodo comprendido entre el 11/04/2025 y el 02/12/2025.

3.2. Mantenimiento preventivo a sensores

- **Sensor de precipitación**

El sensor se encontró en buenas condiciones, pero con una pequeña obstrucción en el filtro, se realizó limpieza general (superficie colectora, elemento basculante, carcasa y filtro), se verificó y ajustó nivelación con el propósito de asegurar una óptima captación de precipitaciones, el sensor quedó totalmente funcional.



Ilustración 3. Mantenimiento sensor de precipitación

- **Sensor de nivel de agua**

Para tener acceso al sensor fue necesario girar el brazo que le sirve de soporte, dicha actividad se adelantó de manera controlada para minimizar la posibilidad de causar una avería tanto en el sensor como en la estructura, el sensor se halló en buen estado, se le realizó limpieza general (carcasa y cubiertas de antenas), se colocó un tornillo en acero inoxidable para bloquear el movimiento del brazo ya que este estaba sujetado con alambre y se parametrizó su lectura de nivel de acuerdo con lo indicado en la mira limnimétrica, el sensor quedó totalmente funcional.



Ilustración 4. Mantenimiento sensor de nivel de agua

- **Sonda manta de lodo**

La sonda se encontró en buenas condiciones, se inspeccionaron sus conexiones eléctricas y estado físico tanto del cable como de la carcasa, se le realizó limpieza general y el equipo quedó funcionando correctamente.



Ilustración 5. Mantenimiento sonda manda de lodo

- **Sonda de calidad de agua HL7**

Se efectuó limpieza general a la sonda evidenciándose que la membrana del sensor de oxígeno disuelto esta totalmente deteriorada (se sugiere su reemplazo), luego se conectó la sonda al PC con el propósito de verificar lecturas y realizar calibración por medio del software Hydrolab, se efectuó la calibración del sensor

de pH usando estándares para tres puntos (7 pH, 4 pH, 10 pH), del sensor de conductividad usando estándares para dos puntos (0 mS/cm y 1.413 mS/cm) y del sensor de turbidez empleando estándares para dos puntos (0 NTU y 20 NTU), la sonda quedó operativa.



Ilustración 6. Limpieza general sonda HL7



Ilustración 7. Membrana sensor de oxígeno disuelto

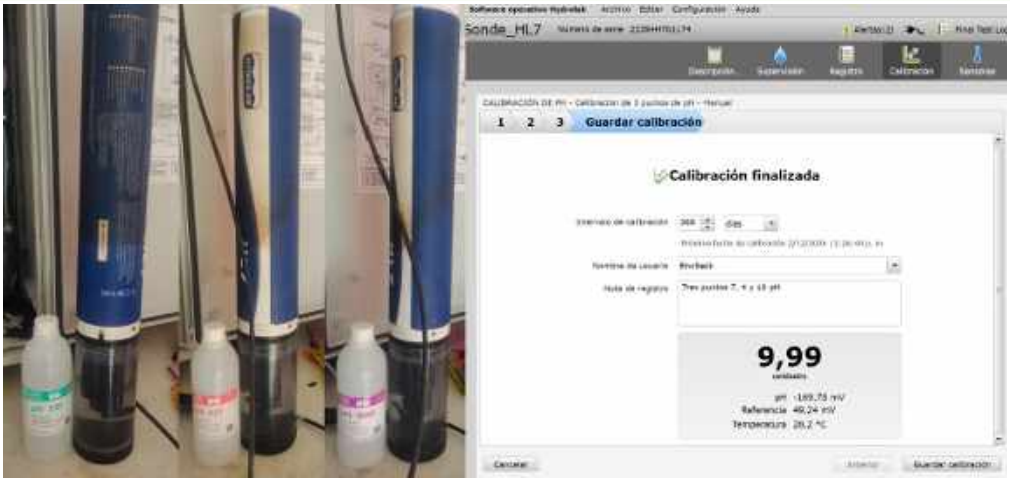


Ilustración 8. Calibración pH

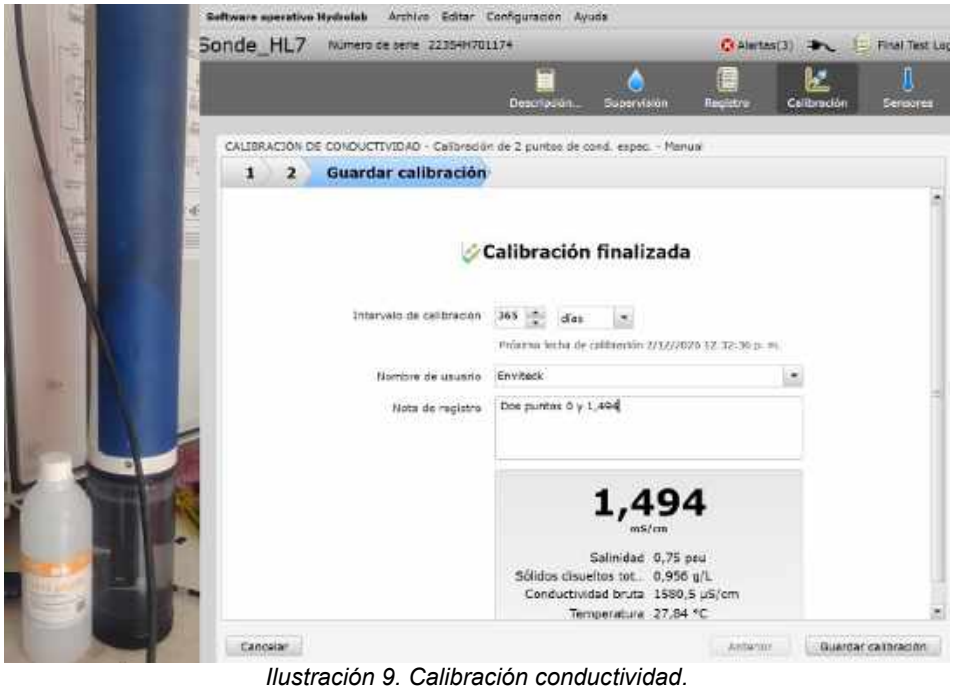


Ilustración 9. Calibración conductividad.

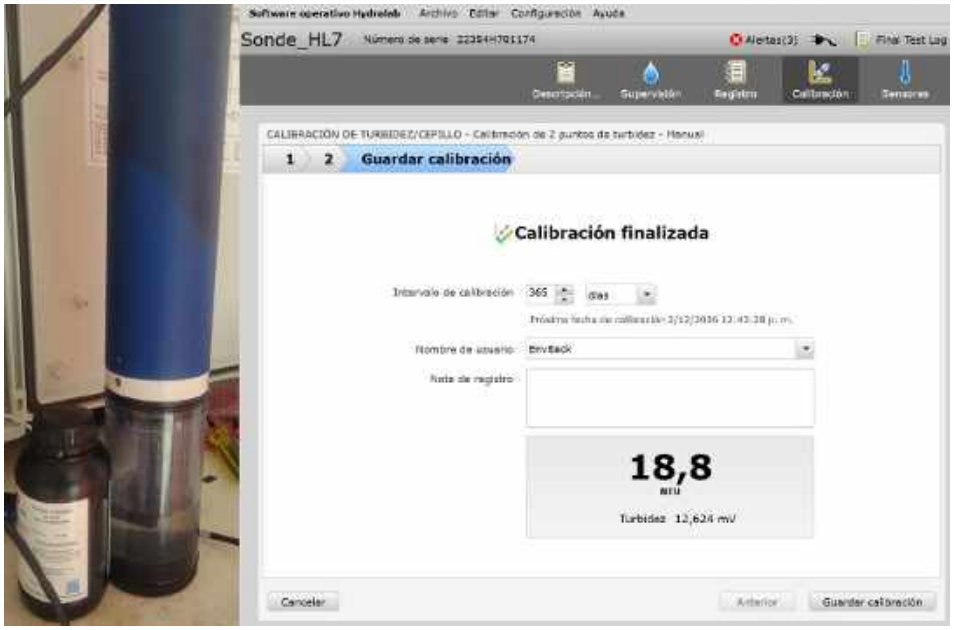


Ilustración 10. Calibración turbidez

3.3. Verificación y mantenimiento al sistema de alimentación (panel solar, controlador de carga y batería).

El sistema de alimentación se encontró operando normalmente (gestionando la energía para los procesos de carga/descarga de la batería y suministro), se verificaron las conexiones eléctricas y estado del fusible, empleando un multímetro se efectuaron lecturas de voltajes y se determinó que el sistema queda totalmente funcional, finalmente se realizó limpieza general tanto a la batería como al panel solar.

- Voltaje panel solar: 23.51 V
- Voltaje batería: 13.08 V
- Voltaje salida: 13.67 V



Ilustración 11. Verificación sistema de alimentación



Ilustración 12. Mantenimiento panel solar

4. ESTADO FINAL DE LA ESTACIÓN

La estación quedó totalmente operativa, registrando, almacenando, procesando y transmitiendo vía GPRS (modem interno 4G) datos de precipitación, nivel, conductividad, oxígeno disuelto (valor no verídico), pH, salinidad, sólidos disueltos totales, temperatura del agua, turbidez, porcentaje de lodos, sólidos suspendidos y voltaje de la batería, todo esto segúnla programación del datalogger, por último se reemplazó el desecante (sílica gel con indicador de pH) para disminuir presencia de humedad al interior del gabinete.



Ilustración 13. Estado final de la estación

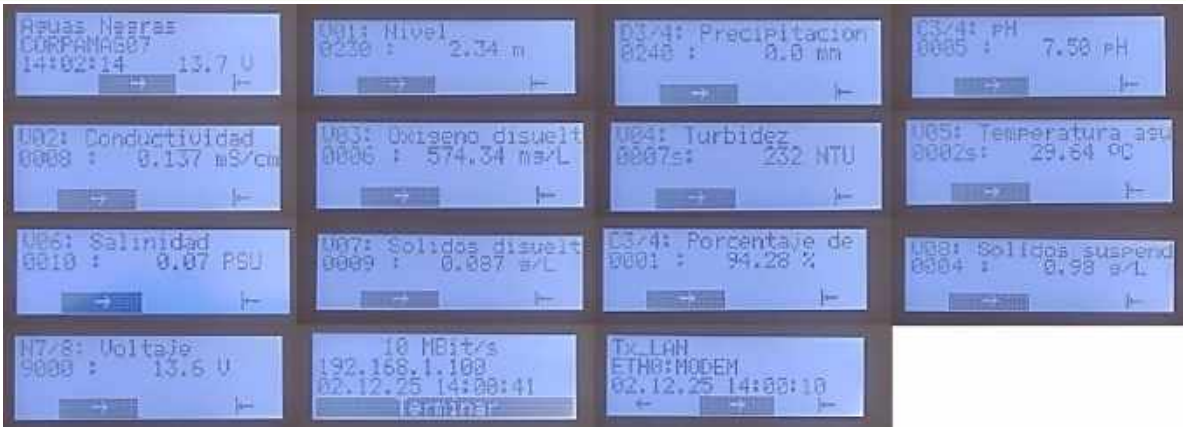


Ilustración 14. Visualización de datos en el datalogger



Ilustración 15. Registro de datos Aquatick

5. RECOMENDACIONES

- Se recomienda reemplazar la membrana del sensor de oxígeno disuelto de la sonda HL7.
- Se sugiere efectuar limpieza frecuente al panel solar para garantizar una óptima generación de energía.
- Se recomienda efectuar limpieza periódica a los sensores de la sonda de calidad de agua para no comprometer la calidad del dato.
- Se sugiere realizar limpieza frecuente al filtro del sensor de precipitación para evitar taponamientos y que el sensor arroje datos erróneos.

6. CONCLUSIONES GENERALES

- La estación quedó operativa, registrando, almacenando, procesando y transmitiendo datos vía GPRS por medio del modem externo.
- Se realizó mantenimiento preventivo a todos los sensores y la calibración de los sensores de pH, conductividad y turbidez de la sonda multiparamétrica HL7.
- Se efectuó mantenimiento general al sistema de alimentación.
- Se realizó la descarga de la plantilla de configuración y de los datos almacenados en el datalogger.
- Se reemplazó el desecante para disminuir la presencia de humedad al interior del gabinete.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG.

CONTRATO DE OBRA No. LP-005-2023.

CONTRATISTA:

CONTRATO No. LP-005-2023.


OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".

INFORME TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y CALIDAD DE AGUA

ESTACIÓN CAÑO EL BURRO

Febrero 2025.

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE POR:	NÚMERO DE REVISIÓN		
	0	1	2
Elaboración	Ing. Carlos J. Cárdenas Molina		
			
	Gerente General Envicteck		
Revisión	Ing. Edilberto G. Roys Corzo.		
			
	Residente de Obra		
Aprobación	Ing. Ángel M. Vizcaíno Escobar.		
			
	Director de Obra		

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DEPENDENCIA	No. COPIAS	FECHA DE ENVÍO	OBSERVACIONES
CORPAMAG	1		
Interventores e ingeniería S.A.S	1		

CUADRO DE MODIFICACIONES

ÍNDICE DE REVISIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

CONTENIDO

1. ESTADO INICIAL 4
2. ACTIVIDADES REALIZADAS 4
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 5
   3.1. Análisis y verificación de histórico de datos, descarga de programación y datos de la plataforma colectora de datos. 5
   3.2. Mantenimiento preventivo a sensores y calibración o verificación sonda de calidad de agua. 5
   3.3. Verificación y mantenimiento al sistema de alimentación (panel solar, controlador de carga y batería). 10
4. ESTADO FINAL DE LA ESTACIÓN 11
5. RECOMENDACIONES 13
6. CONCLUSIONES GENERALES 13

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Estado inicial – Fachada 4
Ilustración 2. Estado inicial - Alrededores 4
Ilustración 3. Mantenimiento sensor de velocidad y dirección del viento. 5
Ilustración 4. Mantenimiento sensor de temperatura y humedad relativa 6
Ilustración 5. Mantenimiento sensor de precipitación. 6
Ilustración 6. Mantenimiento sensor de presión. 7
Ilustración 7. Mantenimiento sensor de nivel y velocidad del agua 8
Ilustración 8. Mantenimiento sonda de lodo. 8
Ilustración 9. Limpieza general 9
Ilustración 10. Fallo en sensor de turbidez y estado de la membrana sensor de oxígeno disuelto. 9
Ilustración 11. Calibración pH 10
Ilustración 12. Calibración de conductividad 10
Ilustración 13. Verificación sistema de alimentación 11
Ilustración 14. Mantenimiento panel solar 11
Ilustración 15. Estado final de la estación 12
Ilustración 16. Visualización de datos en el datalogger 12
Ilustración 17. Registro de datos Aquatick 13

1. ESTADO INICIAL

La estación se encontró encendida pero con la sonda de manta de lodo fuera de servicio, con la batería deteriorada, con el sensor de turbidez inoperativo, con la membrana del sensor de oxígeno disuelto totalmente desgastada y con el pluviómetro obstruido, sin embargo los demás sensores se encontraron operativos, así como el modem externo para la transmisión de datos vía GPRS, finalmente las estructuras(soportes, mástiles, brazo, miras limnimétricas y tubo novafort), caseta y cerramiento se hallaron en buen estado.



Ilustración 1. Estado inicial – Fachada



Ilustración 2. Estado inicial - Alrededores

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Análisis y verificación de histórico de datos, descarga de programación y datos de la plataforma colectora de datos.

- Mantenimiento preventivo a sensores y calibración o verificación sonda de calidad de agua.
- Verificación y mantenimiento al sistema de alimentación (Panel solar, controlador de carga y batería).

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

3.1. Análisis y verificación de histórico de datos, descarga de programación y datos de la plataforma colectora de datos.

Se analizó y verificó el histórico de datos para conocer el funcionamiento y comportamiento de cada uno de los sensores, se efectuó la descarga de la plantilla de programación del datalogger al igual que la descarga de los datos almacenados en la memoria interna para el periodo comprendido entre el 17/03/2025 y el 30/11/2025.

3.2. Mantenimiento preventivo a sensores y calibración o verificación sonda de calidad de agua.

- **Sensor de velocidad y dirección del viento**

El sensor se encontró operativo, pero con acumulación de suciedad, se le realizó limpieza general teniendo especial cuidado para no afectar los transceptores ni la superficie reflectora, se revisaron sus conexiones eléctricas y orientación, el equipo queda totalmente funcional.



Ilustración 3. Mantenimiento sensor de velocidad y dirección del viento.

- **Sensor de temperatura y humedad relativa del aire.**

El sensor se halló funcional, se le efectuó limpieza general (cuerpo, filtro y radiation shield), se verificaron sus conexiones eléctricas, el equipo quedó en condiciones normales de funcionamiento.



Ilustración 4. Mantenimiento sensor de temperatura y humedad relativa

- **Sensor de precipitación**

El sensor se encontró en buenas condiciones, pero con una obstrucción en el filtro que impedía el correcto funcionamiento, por lo anterior se realizó limpieza general (superficie colectora, elemento basculante, carcasa y filtro), se verificó y ajustó nivelación con el fin de garantizar una óptima captación de precipitaciones, finalmente el sensor quedó totalmente operativo.



Ilustración 5. Mantenimiento sensor de precipitación.

- **Sensor de presión**

El sensor se encontró en buenas condiciones y sin rastros visibles de deterioro debido a que se encuentra alojado al interior del gabinete, se le realizó limpieza general y se revisó el estado de su toma de aire junto con su respectiva manguera y filtro, el equipo quedó totalmente funcional.



Ilustración 6. Mantenimiento sensor de presión.

- **Sensor de nivel y velocidad del agua**

Con el fin de adelantar el mantenimiento fue necesario girar el brazo que le sirve de soporte, lo cual se llevó a cabo de manera controlada para no afectar la estructura ni el sensor, luego se le realizó limpieza general (carcasa y cubiertas de antenas) y se ajustó su lectura de nivel de acuerdo con lo indicado por la mira limnimétrica, el sensor quedó en condiciones normales de funcionamiento.



Ilustración 7. Mantenimiento sensor de nivel y velocidad del agua

- **Sonda manta de lodo**

La sonda se encontró fuera de servicio por lo que se revisaron sus conexiones eléctricas (suministro de energía y datos) y estado físico tanto del cable como de la carcasa de igual manera se le realizó limpieza general y finalmente se comprobó desde el datalogger que la sonda no es encontrada, de acuerdo con lo anterior la sonda quedó inoperativa.



Ilustración 8. Mantenimiento sonda de lodo.

- **Sonda de calidad de agua HL7**

Se efectuó limpieza general a la sonda evidenciándose que la membrana del sensor de oxígeno disuelto está totalmente desgastada (se sugiere su reemplazo), luego se conectó la sonda al PC con el propósito de verificar lecturas y realizar calibración por medio del software Hydrolab, dicho software informa que hay una falla en el motor del sensor de turbidez por lo que se recomienda su reemplazo, de acuerdo con los expuesto anteriormente solo fue posible realizar la calibración del sensor de Ph (Previo a la calibración se reemplazó el electrolito junto con sus pastillas de KCL) usando estándares para dos puntos (7pH y 10Ph) y del sensor de conductividad usando estándares para dos puntos (0 mS/cm y 1.413 mS/cm).



Ilustración 9. Limpieza general



Ilustración 10. Fallo en sensor de turbidez y estado de la membrana sensor de oxígeno disuelto.



Ilustración 11. Calibración pH



Ilustración 12. Calibración de conductividad

3.3. Verificación y mantenimiento al sistema de alimentación (panel solar, controlador de carga y batería).

El sistema de alimentación se encontró operativo, pero se detectó cierto deterioro en la batería ya que no esta recibiendo la carga adecuada, se verificaron las conexiones eléctricas y estado del fusible, empleando un multímetro se tomaron lecturas de voltajes y se concluyó que el sistema está funcional, pero se recomienda el cambio de la batería antes de que esta sufra una avería total y la estación se apague, finalmente se realizó limpieza general tanto a la batería como al panel solar.

- Voltaje panel solar: 19.72 V
- Voltaje batería: 12.08 V
- Voltaje salida: 12.23 V



Ilustración 13. Verificación sistema de alimentación



Ilustración 14. Mantenimiento panel solar

4. ESTADO FINAL DE LA ESTACIÓN

La estación quedó registrando, almacenando, procesando y transmitiendo vía GPRS (modem externo) datos de velocidad y dirección del viento, temperatura y humedad relativa del aire, precipitación, presión barométrica, nivel y velocidad del agua, conductividad, oxigeno disuelto (valor no verídico), pH, salinidad, solidos disueltos totales, temperatura del agua, turbidez (valor no verídico), y voltaje de la batería, todo esto según la programación del datalogger, finalmente se realizó cambio del desecante para disminuir presencia de humedad al interior del gabinete.



Ilustración 15. Estado final de la estación



Ilustración 16. Visualización de datos en el datalogger

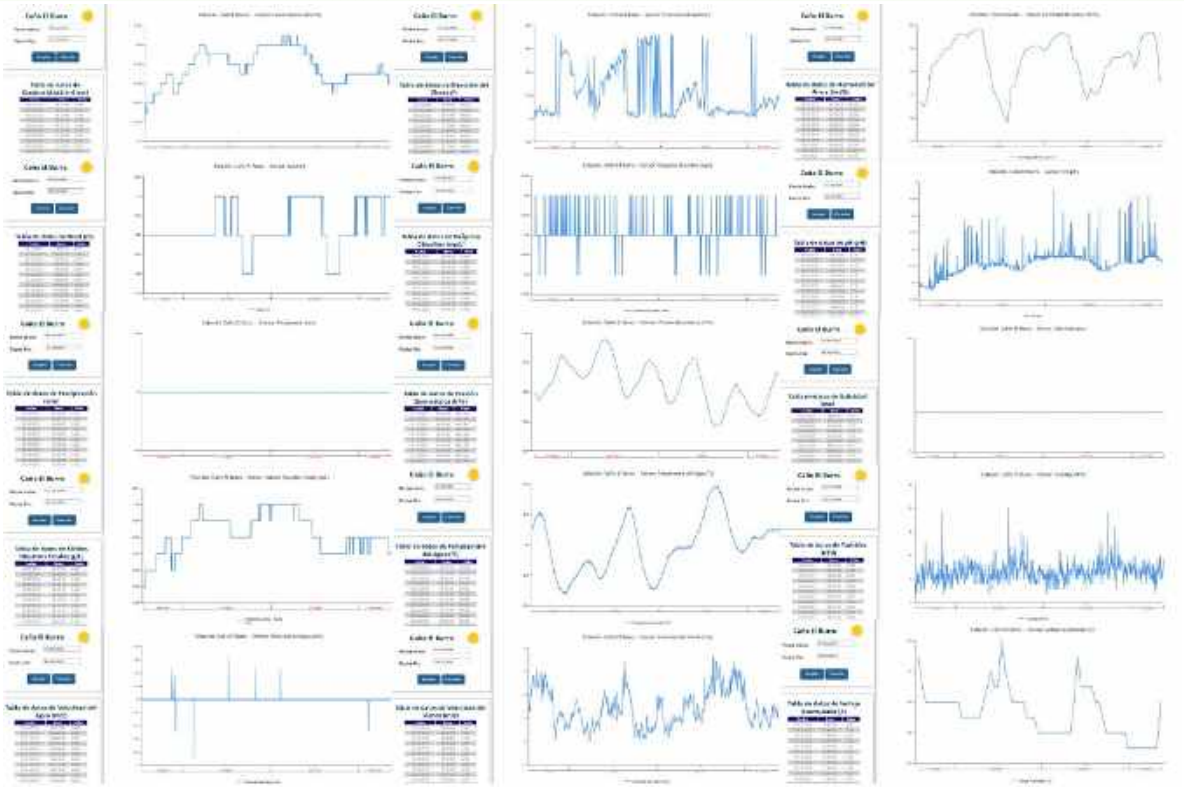


Ilustración 17. Registro de datos Aquatick

5. RECOMENDACIONES

- Se recomienda efectuar cambio de la sonda de manta de lodo.
- Se sugiere cambiar el sensor de turbidez de la sonda HL7.
- Se recomienda reemplazar la membrana del sensor de oxígeno disuelto de la sonda HL7.
- Se sugiere efectuar limpieza frecuente al panel solar para garantizar una buena generación de energía.
- Se recomienda efectuar limpieza periódica a los sensores de la sonda de calidad de agua para no comprometer la veracidad del dato.
- Se sugiere realizar limpieza frecuente al filtro del sensor de precipitación para evitar taponamientos y por lo tanto un mal funcionamiento.
- Se recomienda cambiar la batería antes que el controlador de carga apague la estación.
- Se sugiere hacer las gestiones necesarias para la obtención del código NESDIS con el propósito de poder efectuar transmisiones satelitales GOES.

6. CONCLUSIONES GENERALES

- La estación quedó operativa, registrando, almacenando, procesando y transmitiendo datos vía GPRS por medio del modem externo.

- Se realizó mantenimiento preventivo a todos los sensores y la calibración de los sensores de pH y conductividad de la sonda multiparamétrica HL7.
- La estación se encuentra encendida mientras la batería no se deteriore totalmente.
- Se efectuó mantenimiento general al sistema de alimentación
- Se realizó la descarga de la plantilla de configuración y de los datos almacenados en el datalogger.
- Se efectuó cambio de desecante para disminuir la presencia de humedad al interior del gabinete.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG.

CONTRATO DE OBRA No. LP-005-2023.

CONTRATISTA:

CONTRATO No. LP-005-2023.



OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".

INFORME TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y CALIDAD DE AGUA

ESTACIÓN CAÑO EL SALADO

Febrero 2025.

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE POR:	NÚMERO DE REVISIÓN		
	0	1	2
Elaboración	Ing. Carlos J. Cárdenas Molina		
			
	Gerente General Envicteck		
Revisión	Ing. Edilberto G. Roys Corzo.		
			
	Residente de Obra		
Aprobación	Ing. Ángel M. Vizcaíno Escobar.		
			
	Director de Obra		

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DEPENDENCIA	No. COPIAS	FECHA DE ENVÍO	OBSERVACIONES
CORPAMAG	1		
Interventores e ingeniería S.A.S	1		

CUADRO DE MODIFICACIONES

ÍNDICE DE REVISIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

CONTENIDO

1. ESTADO INICIAL 4
2. ACTIVIDADES REALIZADAS 5
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 5
3.1. Análisis y verificación de histórico de datos, descarga de programación y datos de la plataforma colectora de datos. 5
3.2. Mantenimiento preventivo a sensores 5
3.3. Verificación y mantenimiento al sistema de alimentación (panel solar, controlador de carga y batería). 8
4. ESTADO FINAL DE LA ESTACIÓN 9
5. RECOMENDACIONES 10
6. CONCLUSIONES GENERALES 11

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Estado inicial – Fachada 4
Ilustración 2. Estado inicial - Alrededores 4
Ilustración 3. Mantenimiento sensor de velocidad y dirección del viento 5
Ilustración 4. Mantenimiento sensor de temperatura y humedad relativa 6
Ilustración 5. Mantenimiento sensor de precipitación 6
Ilustración 6. Limpieza general sonda HL7 7
Ilustración 7. Mantenimiento sensor de nivel y velocidad del agua. 7
Ilustración 8. Mantenimiento sonda manda de lodo 8
Ilustración 9. Verificación sistema de alimentación 8
Ilustración 10. Mantenimiento panel solar 9
Ilustración 11. Estado final de la estación 9
Ilustración 12. Visualización de datos en el datalogger 10
Ilustración 13. Registro de datos Aquatick 10

1. ESTADO INICIAL

La estación se encontró encendida, pero con la sonda de manta de lodo emitiendo datos atípicos, con la batería deteriorada y con el tubo de Novafort inclinado, sin embargo, los demás sensores se encontraron operativos, así como el modem externo para la transmisión de datos vía GPRS, por último, las estructuras (soportes, mástiles, brazo, miras limnimétricas), caseta y cerramiento se hallaron en buen estado.



Ilustración 1. Estado inicial – Fachada



Ilustración 2. Estado inicial - Alrededores

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Análisis y verificación de histórico de datos, descarga de programación y datos de la plataforma colectora de datos.
- Mantenimiento preventivo a sensores.
- Verificación y mantenimiento al sistema de alimentación (Panel solar, controlador de carga y batería).

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

3.1. Análisis y verificación de histórico de datos, descarga de programación y datos de la plataforma colectora de datos.

Se examinó y verificó el histórico de datos para tener conocer el funcionamiento y comportamiento de cada uno de los sensores, se efectuó la descarga de la plantilla de programación de datalogger al igual que la descarga de los datos almacenados en la memoria interna para el periodo comprendido entre 20/08/2024 y el 03/12/2025.

3.2. Mantenimiento preventivo a sensores

- **Sensor de velocidad y dirección del viento**

El sensor se halló en buen estado, se le efectuó limpieza general con especial cuidado para no afectar los transceptores y superficie reflectora, se checaron sus conexiones eléctricas y cableado, el sensor quedó totalmente funcional.



Ilustración 3. Mantenimiento sensor de velocidad y dirección del viento

- **Sensor de temperatura y humedad relativa del aire**

El sensor se encontró operativo, se le efectuó limpieza general (cuerpo, filtro y radiation shield), se verificaron sus conexiones eléctricas y cableado, el equipo quedó en condiciones normales de funcionamiento.



Ilustración 4. Mantenimiento sensor de temperatura y humedad relativa

- **Sensor de precipitación**

La sonda se halló en buenas condiciones pero con obstrucciones en el filtro, se le efectuó limpieza general (superficie colectora, filtro, elemento basculante, carcasa y desagües), se verificó y ajustó nivelación con el fin de garantizar una óptima captación de precipitaciones, el sensor quedó totalmente operativo.



Ilustración 5. Mantenimiento sensor de precipitación

- **Sonda de presión**

El sensor se encontró operativo y sin grandes rasgos de deterioro ya que se encuentra alojado al interior del gabinete, se le efectuó limpieza general y se verificó su toma de aire (filtro manguera), el equipo quedó totalmente funcional.



Ilustración 6. Limpieza general sonda HL7

- **Sensor de nivel y velocidad del agua.**

Con el propósito de efectuar el mantenimiento se giró el brazo que le sirve de soporte, lo cual se realizó limpieza general (carcasa y cubierta de antenas) y se ajustó su lectura de nivel de acuerdo con lo indicado en la mira limnimétrica, el sensor quedó en óptimas condiciones de operatividad.



Ilustración 7. Mantenimiento sensor de nivel y velocidad del agua.

- **Sonda manta de lodo**

La sonda se encontró emitiendo datos atípicos por lo que se efectuó limpieza general con especial atención para no rayar los lentes, de igual manera, se revisaron sus conexiones eléctricas (suministro de energía y datos) y estado físico tanto del cable como de la carcasa, una vez introducida nuevamente en el agua siguió emitiendo datos erróneos (porcentaje de lodos bajo – paso bajo de luz IR –

aún cuando los lentes y el agua estaban limpios), días después la sonda ha presentado intermitencia en la emisión de datos así como datos fuera de rango (se recomienda su reemplazo), finalmente el tubo de Novafort fue enderezado.



Ilustración 8. Mantenimiento sonda manda de lodo

3.3. Verificación y mantenimiento al sistema de alimentación (panel solar, controlador de carga y batería).

El sistema de alimentación se encontró operativo, pero se descubrió deterioro en la batería ya que no está recibiendo la carga suficiente, se inspeccionaron las conexiones eléctricas y estado del fusible, empleando un multímetro se efectuaron lecturas de voltaje y se concluyó que el sistema estaba funcional, pero se recomienda el cambio de la batería antes que esta sufra una falla total y la estación se apague, finalmente se realizó limpieza general tanto a la batería como al panel solar.

- Voltaje panel solar: 18.45 V
- Voltaje batería: 12.14 V
- Voltaje salida: 12.23 V



Ilustración 9. Verificación sistema de alimentación



Ilustración 10. Mantenimiento panel solar

4. ESTADO FINAL DE LA ESTACIÓN

La estación quedó registrando, almacenando, procesando y transmitiendo vía GPRS (modem externo 4G) datos de velocidad y dirección del viento, temperatura y humedad relativa del aire, precipitación, presión barométrica, nivel y velocidad del agua, datos de la sonda de manta de lodo no verídicos (porcentaje de lodos, sólidos suspendidos, temperatura del agua y turbidez) y voltaje de la batería, todo esto según la programación del datalogger, por último, se realizó cambio del desecante (silica gel con indicador de pH) para disminuir presencia de humedad al interior del gabinete.



Ilustración 11. Estado final de la estación

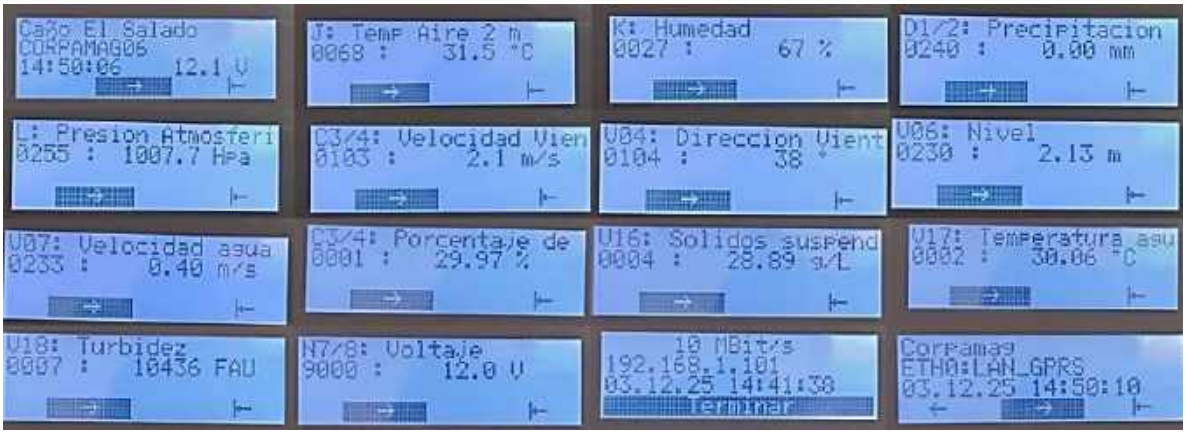


Ilustración 12. Visualización de datos en el datalogger



Ilustración 13. Registro de datos Aquatick

5. RECOMENDACIONES

- Se recomienda efectuar cambio de la sonda de manda de lodo.
- Se sugiere efectuar limpieza periódica al panel solar para garantizar una óptima generación de energía.
- Se recomienda realizar limpieza frecuente al filtro del sensor de precipitación para evitar obstrucciones y por lo tanto una operación no adecuada.

- Se recomienda cambiar la batería antes que el controlador de carga apague la estación.
- Se sugiere hacer as gestiones necesarias para la obtención del código NESDIS con el objeto de poder realizar transmisiones satelitales GOES.

6. CONCLUSIONES GENERALES

- La estación quedó operativa, registrando, almacenando, procesando y transmitiendo datos vía GPRS por medio del modem externo.
- Se realizó mantenimiento preventivo a todos los sensores.
- La estación se encuentra encendida mientras la batería no falle por completo.
- Se efectuó mantenimiento general al sistema de alimentación.
- Se realizó la descarga de la plantilla de configuración y de los datos almacenados en el datalogger.
- Se efectuó cambio de desecante para disminuir la presencia de humedad al interior del gabinete.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG.

CONTRATO DE OBRA No. LP-005-2023.

CONTRATISTA:

CONTRATO No. LP-005-2023.



OBJETO: "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES".

INFORME TÉCNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y CALIDAD DE AGUA

ESTACIÓN CAÑO LOS MICOS

Febrero 2025.

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE POR:	NÚMERO DE REVISIÓN		
	0	1	2
Elaboración	Ing. Carlos J. Cárdenas Molina		
			
	Gerente General Envicteck		
Revisión	Ing. Edilberto G. Roys Corzo.		
			
	Residente de Obra		
Aprobación	Ing. Ángel M. Vizcaíno Escobar.		
			
	Director de Obra		

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DEPENDENCIA	No. COPIAS	FECHA DE ENVÍO	OBSERVACIONES
CORPAMAG	1		
Interventores e ingeniería S.A.S	1		

CUADRO DE MODIFICACIONES

ÍNDICE DE REVISIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

CONTENIDO

1. ESTADO INICIAL 4
2. ACTIVIDADES REALIZADAS 5
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 5
   3.1. Análisis y verificación de histórico de datos, descarga de programación y datos de la plataforma colectora de datos. 5
   3.2. Mantenimiento preventivo a sensores 5
   3.3. Verificación y mantenimiento al sistema de alimentación (panel solar, controlador de carga y batería). 8
4. ESTADO FINAL DE LA ESTACIÓN 9
5. RECOMENDACIONES 10
6. CONCLUSIONES GENERALES 11

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Estado inicial – Fachada 4
Ilustración 2. Estado inicial - Alrededores 4
Ilustración 3. Mantenimiento sensor de velocidad y dirección del viento. 6
Ilustración 4. Mantenimiento sensor de temperatura y humedad relativa 6
Ilustración 5. Mantenimiento sensor de precipitación. 7
Ilustración 6. Mantenimiento sensor de evaporación. 7
Ilustración 7. Mantenimiento sensor de nivel y velocidad del agua 8
Ilustración 13. Verificación sistema de alimentación 8
Ilustración 14. Mantenimiento panel solar 9
Ilustración 15. Estado final de la estación 9
Ilustración 16. Visualización de datos en el datalogger 10
Ilustración 17. Registro de datos Aquatick 10

1. ESTADO INICIAL

La estación se encontró operativa, pero con el sensor de precipitación tapado, con el tanque de evaporación vacío y lleno de residuos, los demás sensores se hallaron funcionando, el modem interno 3G se encontró realizando las transmisiones y las estructuras (soportes, mástiles, brazo y miras limnimétricas), caseta y cerramiento se encontraron en buen estado.



Ilustración 1. Estado inicial – Fachada



Ilustración 2. Estado inicial - Alrededores

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Análisis y verificación de histórico de datos, descarga de programación y datos de la plataforma colectora de datos.
- Mantenimiento preventivo a sensores.
- Verificación y mantenimiento al sistema de alimentación (Panel solar, controlador de carga y batería).

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

3.1. Análisis y verificación de histórico de datos, descarga de programación y datos de la plataforma colectora de datos.

Se estudió y verificó el histórico de datos para estar al tanto del funcionamiento y comportamiento de cada uno de los sensores, se realizó la descarga de la plantilla de programación del datalogger al igual que la descarga de los datos almacenados en la memoria interna para el periodo comprendido entre el 17/08/204 y el 01/12/2025.

3.2. Mantenimiento preventivo a sensores

- **Sensor de velocidad y dirección del viento**

El sensor se encontró en buen estado, pero con acumulación de verdín, se le realizó limpieza general poniendo especial atención para no averiar la superficie reflectora ni los transceptores, se inspeccionaron sus conexiones eléctricas al igual que su orientación, el equipo quedó totalmente funcional.



Ilustración 3. Mantenimiento sensor de velocidad y dirección del viento.

- **Estación compacta (radiación solar global, temperatura y humedad relativa del aire, presión barométrica).**

La estación se encontró en buen estado, pero con acumulación de suciedad, se le realizó limpieza general con especial cuidado para no rayar el domo y así evitar difracciones que pueden llegar a afectar las lecturas de radiación, se verificaron sus conexiones eléctricas y la estación compacta quedó en condiciones normales de funcionamiento.



Ilustración 4. Mantenimiento estación compacta

- **Sensor de precipitación**

El sensor se encontró en condiciones aceptables, pero con una obstrucción en el filtro y embudo que impedían la circulación de agua, se le realizó limpieza general (superficie colectora, elemento basculante, carcasa, filtro y embudo), se verificó y

ajustó nivelación con el propósito de garantizar una óptima captación de precipitaciones, finalmente el sensor quedó totalmente funcional.



Ilustración 5. Mantenimiento sensor de precipitación.

- **Sensor de evaporación**

El sensor se encontró con una grieta en el costado de su carcasa, el tanque de evaporación estaba totalmente vacío y lleno de residuos, se selló la grieta con adhesivo epóxico y se lavó el tanque de evaporación, se niveló el sensor, se agregó agua al tanque de evaporación y se ajustó la lectura del sensor de acuerdo con el nivel de agua, el equipo quedó totalmente operativo.



Ilustración 6. Mantenimiento sensor de evaporación.

- **Sensor de nivel**

Para acceder al sensor fue necesario girar el brazo que le sirve de soporte, dicha maniobra se adelantó de manera controlada para minimizar la posibilidad de causar una avería tanto en el sensor como en la estructura, el sensor se halló en buen estado, se le realizó limpieza general (carcasa y cubiertas de antenas) y se

ajustó su lectura de nivel de acuerdo con lo indicado en la mira limnimétrica, el sensor quedó totalmente funcional.



Ilustración 7. Mantenimiento sensor de nivel y velocidad del agua

3.3. Verificación y mantenimiento al sistema de alimentación (panel solar, controlador de carga y batería).

El sistema de alimentación se encontró operativo (gestión de energía en carga, descarga y entrega), se verificaron las conexiones y estado del fusible, usando un multímetro se tomaron lecturas de voltajes y se determinó que el sistema está totalmente operativo, finalmente se realizó limpieza general tanto a la batería como al panel solar.

- Voltaje panel solar: 19.91 V
- Voltaje batería: 13.42 V
- Voltaje salida: 13.72 V



Ilustración 8. Verificación sistema de alimentación



Ilustración 9. Mantenimiento panel solar

4. ESTADO FINAL DE LA ESTACIÓN

La estación quedó totalmente operativa, registrando, almacenando, procesando y transmitiendo vía GPRS (modem interno 3G) datos de velocidad y dirección de viento, radiación solar global, temperatura y humedad relativa del aire, presión barométrica, evaporación, precipitación, nivel y voltaje de la batería, todo esto según la programación del datalogger, finalmente se realizó cambio del desecante para disminuir presencia de humedad al interior del gabinete.



Ilustración 10. Estado final de la estación



Ilustración 11. Visualización de datos en el datalogger



Ilustración 12. Registro de datos Aquatick

5. RECOMENDACIONES

- Se sugiere efectuar limpieza periódica al panel solar para garantizar una buena generación de energía.
- Se recomienda monitorear y actuar (agregar o sustraer agua) de acuerdo con el nivel del tanque de evaporación, esto para garantizar que el nivel siempre se mantenga en el rango de funcionamiento del sensor de evaporación (0mm – 100mm)
- Se sugiere realizar limpieza frecuente al filtro del sensor de precipitación para evitar obstrucciones que causen un taponamiento y por consiguiente un mal funcionamiento.

- Se recomienda hacer las gestiones necesarias para la obtención del código NESDIS con el propósito de poder efectuar transmisiones satelitales GOES.
- Se sugiere la instalación de un modem externo con tecnología 4G, ya que en el país se está adelantando el proceso de apagado de la red 3G.

6. CONCLUSIONES GENERALES

- La estación quedó totalmente funcional, registrando, almacenando, procesando y transmitiendo datos vía GPRS por medio del módem interno de la plataforma colectora de datos.
- Se realizó mantenimiento preventivo a todos los sensores.
- Se efectuó mantenimiento general al sistema de alimentación.
- Se realizó la descarga de la plantilla de configuración y de los datos almacenados en el datalogger.
- Se efectuó el reemplazo de desecante para disminuir la presencia de humedad al interior del gabinete.

ANEXO 12


Guías de movilización.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

GUÍA DE MOVILIZACIÓN O TRÁNSITO DE LA MAQUINARIA

ENTIDAD **PORTAL WEB**

NRO. de GUIA 613511


NRO. TARJETA DE REGISTRO DE LA MAQUINARIA: 131324	**TIPO DE DOCUMENTO DEL SOLICITANTE:** Cédula Ciudadanía	**NÚMERO DE DOCUMENTO DEL SOLICITANTE:** 92276057
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE: CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA		**NRO. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA:** MC685986
VIN:	**CHASIS:**	**MOTOR:** 7ZR03650
SERIE: *5WS00418*	**SUBPARTIDA ARANCELARIA:** 8429520000	**IDENTIFICACIÓN DEL GPS:** 869731053495647
EMPRESA DE HABILITACIÓN DEL GPS: SISTEMAS SATELITALES S.A.S	**FECHA EXPEDICIÓN:** 21/01/2026	**FECHA VENCIMIENTO:** 20/02/2026
ORIGEN: SALAMINA	**DESTINO:** BARRANQUILLA	
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: VIAS NACIONALES, CAÑOS Y RIOS		
COLOR: AMARILLO	**USO:** CONSTRUCCION	**FIRMA FUNCIONARIO EXPEDIDOR**

MINISTERIO DE TRANSPORTE

GUÍA DE MOVILIZACIÓN O TRÁNSITO DE LA MAQUINARIA

ENTIDAD PORTAL WEB

NRO. de GUIA 613523

NRO. TARJETA DE REGISTRO DE LA MAQUINARIA: 132784	**TIPO DE DOCUMENTO DEL SOLICITANTE:** Cédula Ciudadanía	**NÚMERO DE DOCUMENTO DEL SOLICITANTE:** 92276057
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE: CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA		**NRO. ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA:** MC693794
VIN: CAT00320TSYW30844	**CHASIS:** CAT00320TSYW30844	**MOTOR:** 2W238146
SERIE: CAT00320TSYW30844	**SUBPARTIDA ARANCELARIA:** 8429520000	**IDENTIFICACIÓN DEL GPS:** 0890018932
EMPRESA DE HABILITACIÓN DEL GPS: GECOLSA S.A	**FECHA EXPEDICIÓN:** 21/01/2026	**FECHA VENCIMIENTO:** 20/02/2026
ORIGEN: SALAMINA	**DESTINO:** BARRANQUILLA	
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: VIAS NACIONALES, CAÑOS Y RIOS		
COLOR: AMARILLO	**USO:** CONSTRUCCIONES	**FIRMA FUNCIONARIO EXPEDIDOR**

ANEXO 13

Ensayos de concreto.

TECNISUELOS S.A.S

ASESORIAS - INTERVENTORIAS - CONSULTORIAS
ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS
BARRANQUILLA - COLOMBIA

OBRA: Box coulvert Caño Hondo

SOLICITANTE: CONORCIO CGSM4

FECHA: 27 DE FEBRERO 2026

Los siguientes son los resultados obtenidos sobre los ensayos de resistencia a la compresión de cilindros de concreto moldeado según norma NTC 673.

REFERENCIA	FECHA DE VACIADO	FECHA DE ENSAYO	No DIAS	Carga (KN)	Carga KG	Diam. cilind. cm	Area cilind. cm2	Resist. Kg/cm2	Resist Mpa	Resist Psi
#1 Zapata box No. 1 3000 PSI	24-ene-26	21-feb-26	28	578,6	59005	15	182	324,3	31,8	4.612
#2 Zapata box No. 4 3000 PSI	24-ene-26	21-feb-26	28	532,5	54303	15	182	298,5	29,3	4.244
#1 Zapata y muro box No. 4 4000 PSI	26-ene-26	23-feb-26	28	542,7	55344	15	182	304,2	29,8	4.326
#2 Zapata y muro box No. 4 4000 PSI	26-ene-26	23-feb-26	28	518,2	52841	15	182	290,4	28,5	4.130
#1 Dentellon box No. 2 4000 PSI	28-ene-26	25-feb-26	28	545,0	55578	15	182	305,5	30,0	4.344
#2 Dentellon box No. 2 4000 PSI	28-ene-26	25-feb-26	28	533,5	54405	15	182	299,0	29,3	4.252
#1 Muro 1 No.1 4000 PSI	28-ene-26	25-feb-26	28	578,9	59036	15	182	324,5	31,8	4.614
#2 Muro 1 No.1 4000 PSI	28-ene-26	25-feb-26	28	560,2	57128	15	182	314,0	30,8	4.465

OBSERVACIONES:

Jefe de Laboratorio
