
Flujo de caja

Nombre	Costo	Comienzo	Fin
PLACA VEREDA LA SIERRITA (32,3 m X 20 m)	$ 386,047,707.00	19/03/26	19/05/26

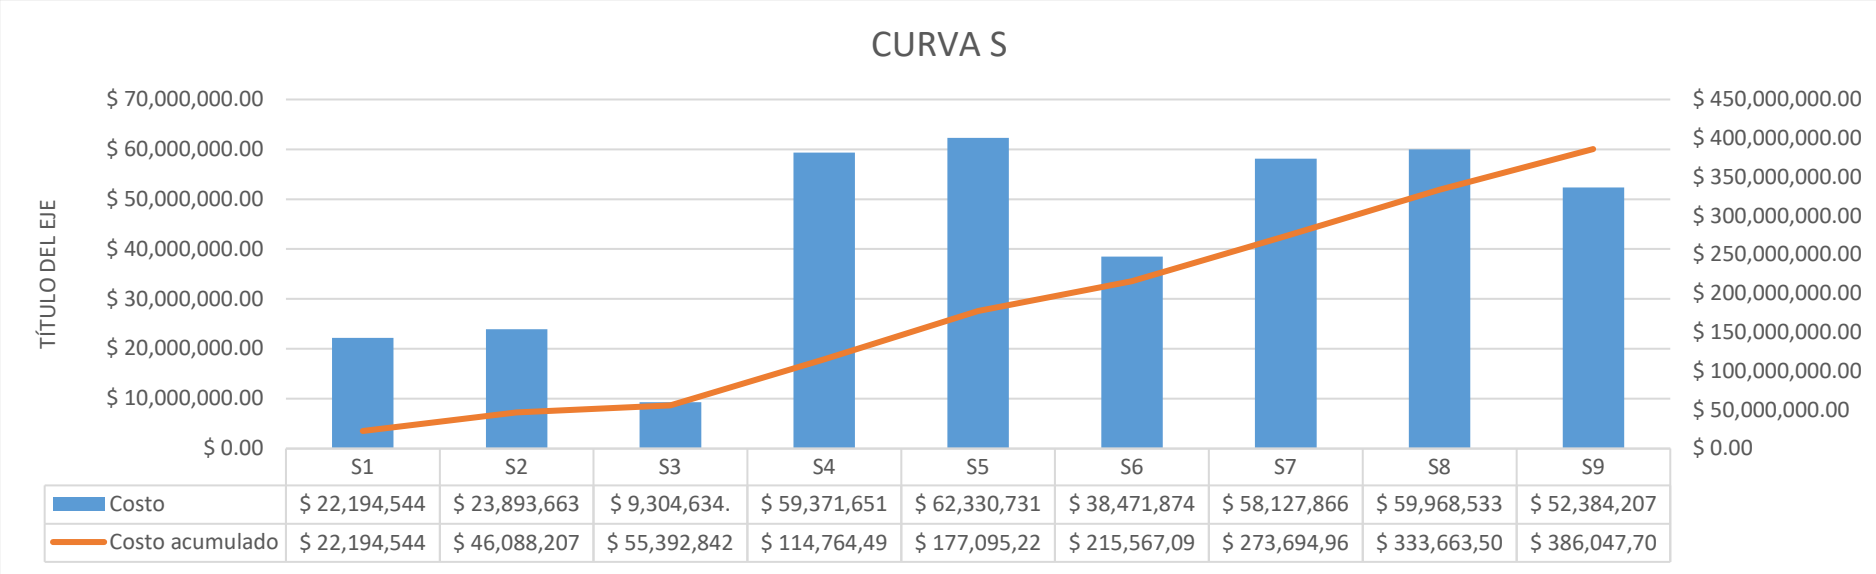

Nombre	Comienzo	Duración	Fin	Costo
Inicio	19/03/26	0 días	19/03/26	$ 0.00
DEMOLICION Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	19/03/26	12 días	7/04/26	$ 54,603,398.00
CONFORMACION DE TERRENO	7/04/26	5 días	13/04/26	$ 2,105,185.00
AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES	13/04/26	3 días	16/04/26	$ 40,899,799.00
CONCRETOS PARA ESTRUCTURAS	16/04/26	18 días	9/05/26	$ 129,385,266.00
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	2/05/26	9 días	13/05/26	$ 72,291,864.00
PINTURA PARA PISO	14/05/26	3 días	19/05/26	$ 52,384,207.00
OBRAS EXTRAS	9/04/26	30 días	19/05/26	$ 34,377,988.00
