| **DATOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023** | | |
|---|---|---|
| DEPENDENCIA | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | |
| ACTA No. | 12 | |
| FECHA DEL ACTA | 24 DE ABRIL DEL 2026 | |
| No. DE CONTRATO Y FECHA | 069 DEL 14 DE ABRIL DE 2023 | |
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO DE OBRA | |
| CONTRANTE | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0 | |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | |
| CONTRATISTA | NOMBRE | CONSORCIO LA FLORA 2023 |
| | NIT | 901.702.490-7 |
| REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE | GONZALO CÁRDENAS OREJARENA |
| | C.C | 1.095.824.353 FLORIDABLANCA |
| ORDENADOR DEL GASTO | NOMBRE | CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ |
| | CARGO | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA (E) |
| | C.C | 13.746.642 |
| INTERVENTOR | NOMBRE | CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA |
| | NIT | 901.706.924-1 |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 40,514,056,113.00 | |
| VALOR ADICIONADO | $ 20,168,495,053.00 | |
| PAGO ANTICIPADO (30%) | $ 12,091,429,892.12 | |
| CDP | NÚMERO: 2843 | |
| | FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2023 | |
| CDP RESERVA | NÚMERO: 0470 | |
| | FECHA: 26 DE ENERO DE 2024 | |
| CDP PASIVO EXIGIBLE | NÚMERO: 4278 | |
| | FECHA: 30 DE MAYO DE 2025 | |
| CDP ADICIONAL NO.01 | NÚMERO: 3950 | |
| | FECHA: 09 DE MAYO DE 2025 | |
| CDP ADICIONAL NO.01 – RESERVA | NÚMERO: 0868 | |
| | FECHA: 22 DE ENERO DE 2026 | |
| RP | NÚMERO: 4562 | |
| | FECHA: 18 DE ABRIL DE 2023 | |
| RP RESERVA | NÚMERO: 0260 | |
| | FECHA: 26 DE ENERO DE 2024 | |
| RP PASIVO EXIGIBLE | NÚMERO: 5819 | |
| | FECHA: 30 DE MAYO DE 2025 | |
| RP ADICIONAL NO.01 | NÚMERO: 5340 | |
| | FECHA: 09 DE MAYO DE 2025 | |
| RP ADICIONAL NO.01 - RESERVA | NÚMERO: 1779 | |
| | FECHA: 22 DE ENERO DE 2026 | |
| PLAZO DEL CONTRATO | Fecha de Inicio | 05 DE MAYO DE 2023 |
| | Fecha de Finalización: | 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| | Nueva fecha de terminación: | 27 DE AGOSTO DE 2026 |
| | Plazo total de ejecución: | TREINTA Y SEIS (36) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS |

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

| Tipo de modificación | No. | Tiempo | Fecha inicial | Fecha Final |
|---|---|---|---|---|
| Suspensión No.1 | 1 | Ocho (8) días | 04/12/2024 | |
| Reinicio No.1 | 1 | | | 11/12/2024 |
| Suspensión No.2 | 2 | Ochenta y dos (82) días | 23/12/2025 | |
| Ampliación No.01 a la suspensión No.02 | | | 14/01/2026 | 13/03/2026 |
| Reinicio No.2 | 2 | | | 13/03/2026 |
| Suspensión No.3 | 3 | Ocho (8) días | 20/03/2026 | |
| Reinicio No.3 | 3 | | | 27/03/2026 |
| Prórroga No.1 | 1 | Un (1) mes | 04/11/2024 | 04/12/2024 |
| Prórroga No.2 | 2 | Cinco (5) meses | 11/12/2024 | 10/05/2025 |
| Prórroga No.3 | 3 | Siete (7) meses | 11/05/2025 | 10/12/2025 |
| Prórroga No.4 | 4 | Veintiún (21) días | 11/12/2025 | 31/12/2025 |
| Prórroga No.5 | 5 | Cinco (5) meses | 27/03/2026 | 27/08/2026 |

| Tipo de modificación | No. | Fecha de la adición | Valor adicionado | Valor total del contrato |
|---|---|---|---|---|
| Adiciones | 01 | 09/05/2025 | $ 20,168,495,053.00 | $ 60,682,551,166.00 |

| Otras modificaciones | No. | Fecha de la modificación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Acta aclaratoria | 01 | 11/09/2023 | |
| Pactación de precios unitarios | 01 | 15/09/2023 | |
| Modificatoria de cantidades | 01 | 15/09/2023 | |
| Pactación de precios unitarios No.2 | 02 | 14/12/2023 | |
| Modificatoria de cantidades No.2 | 02 | 14/12/2023 | |
| Pactación de precios unitarios No.3 | 03 | 19/07/2024 | |
| Modificatoria de cantidades No.3 | 03 | 19/07/2024 | |
| Pactación de precios unitarios No.4 | 04 | 30/09/2024 | |
| Modificatoria de cantidades No.4 | 04 | 30/09/2024 | |
| Pactación de precios unitarios No.5 | 05 | 14/03/2025 | |
| Modificatoria de cantidades No.5 | 05 | 14/03/2025 | |
| Modificatoria de cantidades No.6 | 06 | 10/10/2025 | |
| Pactación de precios unitarios No.6 | 06 | 13/04/2026 | |
| Modificatoria de cantidades No.7 | 07 | 13/04/2026 | |

**GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| Aseguradora | Amparo | No. Póliza | Vigencia | | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | |
| SEGUROS DEL ESTADO | Cumplimiento de las obligaciones del contrato | 96-44-101180422-10. | 05/05/2023 | 28/12/2026 | $ 12,136,510,233.20 |
| SEGUROS DEL ESTADO | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 96-44-101180422-10. | 05/05/2023 | 28/12/2026 | $ 12,091,429,892.12 |
| SEGUROS DEL ESTADO | Estabilidad y calidad de la obra | 96-44-101180422-10. | 05/05/2023 | 28/08/2031 | $ 12,136,510,233.20 |
| SEGUROS DEL ESTADO | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 96-44-101180422-10. | 05/05/2023 | 28/08/2029 | $ 6,068,255,116.60 |
| SEGUROS DEL ESTADO | Responsabilidad civil extracontractual | 96-40-101063839-8. | 05/05/2023 | 28/08/2026 | $ 3,034,127,558.30 |

| | |
|---|---|
| FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS | **23 DE ABRIL DE 2026** |

**DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| PERIODO DE COBRO | DESDE: 01 DE OCTUBRE DE 2025 |
| | HASTA: 23 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| VALOR A COBRAR | **SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($ 7.258.984.862,72)** |
| ANTICIPO AMORTIZADO | **$0** |

**PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL – OCTUBRE 2025**

| PERSONAL NÓMINA – OCTUBRE 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO DE COTIZACIÓN** | **FECHA DE PAGO** | **Nro. PLANILLA INTEGRADA** | **INGRESO BASE DE COTIZACIÓN** |
| **OCTUBRE 2025** | 2025/11/20 | 9494977871 | $ 32.818.000 |

| ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES | CAJA DE COMPENSACION |
|---|---|---|---|
| NUEVA EPS<br>SALUD TOTAL<br>SANITAS<br>SURA | COLPENSIONES<br>PORVENIR<br>PROTECCCIÓN<br>COLFONDOS | SEGUROS BOLIVAR | COMFENALCO SANTANDER |
| **VR PAGADO** | **VR PAGADO** | **VR PAGADO** | **VR PAGADO** |
| **$ 1.312.800** | **$ 5.321.100** | **$ 2.284.400** | **$ 1.312.800** |

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL – OCTUBRE 2025

| **ESPECIALISTA GEOTECNICO – OCTUBRE 2025** | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO DE COTIZACIÓN** | **FECHA DE PAGO** | **Nro. PLANILLA INTEGRADA** | **INGRESO BASE DE COTIZACIÓN** |
| **OCTUBRE 2025** | 2025/10/23 | 34908884 | $ 4.800.000 |

| **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD** | **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES** | **ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES** | **CAJA DE COMPENSACION** |
|---|---|---|---|
| SALUD MIA EPS | PORVENIR | POSITIVA | SIN CCF |
| **VR PAGADO** **$ 600.000** | **VR PAGADO** **$ 768.000** | **VR PAGADO** **$ 334.100** | **VR PAGADO** **$ 0** |

| **INGENIERA FORESTAL – OCTUBRE 2025** | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO DECOTIZACIÓN** | **FECHA DE PAGO** | **Nro. PLANILLA INTEGRADA** | **INGRESO BASE DE COTIZACIÓN** |
| **OCTUBRE 2025** | 2025/11/05 | 35013413 | $ 1.423.500 |

| **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD** | **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES** | **ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES** | **CAJA DE COMPENSACION** |
|---|---|---|---|
| SALUD TOTAL | PORVENIR | ARL POSITIVA | SIN CCF |
| **VR PAGADO** **$ 178.000** | **VR PAGADO** **$ 227.800** | **VR PAGADO** **$ 7.500** | **VR PAGADO** **$0** |

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL – OCTUBRE 2025

| **ESPECIALISTA HIDRAULICO – OCTUBRE 2025** | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO DE COTIZACIÓN** | **FECHA DE PAGO** | **Nro. PLANILLA INTEGRADA** | **INGRESO BASE DE COTIZACIÓN** |
| **OCTUBRE 2025** | 2025/10/21 | 9493443358 | $ 4.000.000 |
| **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD** | **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES** | **ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES** | **CAJA DE COMPENSACION** |
| EPS SURA | PORVENIR | ARL POSITIVA | SIN CCF |
| **VR PAGADO** **$ 500.000** | **VR PAGADO** **$ 640.000** | **VR PAGADO** **$ 97.500** | **VR PAGADO** **$ 0** |

| **ESPECIALISTA ESTRUCTURAL – OCTUBRE 2025** | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO DE COTIZACIÓN** | **FECHA DE PAGO** | **Nro. PLANILLA INTEGRADA** | **INGRESO BASE DE COTIZACIÓN** |
| **OCTUBRE 2025** | 2025/11/18 | 9493900106 | $ 2.800.000 |
| **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD** | **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES** | **ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES** | **CAJA DE COMPENSACION** |
| EPS SURA | PORVENIR | ARL SURA | SIN CCF |
| **VR PAGADO** **$ 350.000** | **VR PAGADO** **$ 448.000** | **VR PAGADO** **$ 14.700** | **VR PAGADO** **$ 0** |

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL – NOVIEMBRE 2025

| **PERSONAL NÓMINA – NOVIEMBRE 2025** | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO DE COTIZACIÓN** | **FECHA DE PAGO** | **Nro. PLANILLA INTEGRADA** | **INGRESO BASE DE COTIZACIÓN** |
| **NOVIEMBRE 2025** | 2025/12/10 | 9496259243 | $ 32.818.000 |
| **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD** | **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES** | **ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES** | **CAJA DE COMPENSACION** |
| NUEVA EPS<br>SALUD TOTAL<br>SANITAS<br>SURA | COLPENSIONES<br>PORVENIR<br>PROTECCCIÓN<br>COLFONDOS | SEGUROS BOLIVAR | COMFENALCO SANTANDER |
| **VR PAGADO $ 1.312.800** | **VR PAGADO $ 5.321.100** | **VR PAGADO $ 2.284.400** | **VR PAGADO $ 1.312.800** |

| **ESPECIALISTA GEOTÉCNICO – NOVIEMBRE 2025** | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO DE COTIZACIÓN** | **FECHA DE PAGO** | **Nro. PLANILLA INTEGRADA** | **INGRESO BASE DE COTIZACIÓN** |
| **NOVIEMBRE 2025** | 2025/11/25 | 35134245 | $ 4.800.000 |
| **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD** | **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES** | **ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES** | **CAJA DE COMPENSACION** |
| EPS SALUD MIA | PORVENIR | ARL POSITIVA | SIN CCF |
| **VR PAGADO $ 600.000** | **VR PAGADO $ 768.000** | **VR PAGADO $ 334.100** | **VR PAGADO $ 0** |

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL – NOVIEMBRE 2025

| **INGENIERA FORESTAL – NOVIEMBRE 2025** | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO DE COTIZACIÓN** | **FECHA DE PAGO** | **Nro. PLANILLA INTEGRADA** | **INGRESO BASE DE COTIZACIÓN** |
| **NOVIEMBRE 2025** | 2025/11/27 | 35263677 | $ 1.423.500 |
| **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD** | **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES** | **ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES** | **CAJA DE COMPENSACION** |
| SALUD TOTAL | PORVENIR | ARL POSITIVA | SIN CCF |
| **VR PAGADO $ 178.000** | **VR PAGADO $ 227.800** | **VR PAGADO $ 7.500** | **VR PAGADO $ 0** |

| **ESPECIALISTA HIDRAULICO – NOVIEMBRE 2025** | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO DE COTIZACIÓN** | **FECHA DE PAGO** | **Nro. PLANILLA INTEGRADA** | **INGRESO BASE DE COTIZACIÓN** |
| **NOVIEMBRE 2025** | 2025/11/19 | 9494866709 | $ 5.000.000 |
| **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD** | **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES** | **ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES** | **CAJA DE COMPENSACION** |
| EPS SURA | PORVENIR | ARL POSITIVA | SIN CCF |
| **VR PAGADO $ 625.000** | **VR PAGADO $ 800.000** | **VR PAGADO $ 121.800** | **VR PAGADO $ 0** |

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL – NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025

| **ESPECIALISTA ESTRUCTURAL – NOVIEMBRE 2025** | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO DE COTIZACIÓN** | **FECHA DE PAGO** | **Nro. PLANILLA INTEGRADA** | **INGRESO BASE DE COTIZACIÓN** |
| **NOVIEMBRE 2025** | 2025/12/03 | 9495418401 | $ 2.800.000 |

| **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD** | **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES** | **ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES** | **CAJA DE COMPENSACION** |
|---|---|---|---|
| EPS SURA | PORVENIR | ARL SURA | SIN CCF |
| **VR PAGADO** **$ 350.000** | **VR PAGADO** **$ 448.000** | **VR PAGADO** **$ 14.700** | **VR PAGADO** **$ 0** |

| **PERSONAL NÓMINA – DICIEMBRE 2025** | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO DE COTIZACIÓN** | **FECHA DE PAGO** | **Nro. PLANILLA INTEGRADA** | **INGRESO BASE DE COTIZACIÓN** |
| **DICIEMBRE 2025** | 2026/01/19 | 9498124474 | $ 32.818.001 |
| **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD** | **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES** | **ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES** | **CAJA DE COMPENSACION** |
| NUEVA EPS<br>SALUD TOTAL<br>SANITAS<br>SURA | COLPENSIONES<br>PORVENIR<br>PROTECCCIÓN<br>COLFONDOS | SEGUROS BOLIVAR | COMFENALCO SANTANDER |
| **VR PAGADO** **$ 1.312.900** | **VR PAGADO** **$ 5.321.100** | **VR PAGADO** **$ 2.243.300** | **VR PAGADO** **$ 1.312.900** |

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL – DICIEMBRE 2025

| **ESPECIALISTA GEOTÉCNICO – DICIEMBRE 2025** | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO DE COTIZACIÓN** | **FECHA DE PAGO** | **Nro. PLANILLA INTEGRADA** | **INGRESO BASE DE COTIZACIÓN** |
| **DICIEMBRE 2025** | 2025/12/17 | 35747885 | $ 2.720.000 |

| **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD** | **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES** | **ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES** | **CAJA DE COMPENSACION** |
|---|---|---|---|
| EPS SALUD MIA | PORVENIR | ARL POSITIVA | SIN CCF |
| **VR PAGADO** **$ 340.000** | **VR PAGADO** **$ 435.200** | **VR PAGADO** **$ 189.400** | **VR PAGADO** **$ 0** |

| **INGENIERA FORESTAL – DICIEMBRE 2025** | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO DE COTIZACIÓN** | **FECHA DE PAGO** | **Nro. PLANILLA INTEGRADA** | **INGRESO BASE DE COTIZACIÓN** |
| **DICIEMBRE 2025** | 2026/01/13 | 35501081 | $ 1.423.500 |
| **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD** | **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES** | **ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES** | **CAJA DE COMPENSACION** |
| SALUD TOTAL | PORVENIR | ARL POSITIVA | SIN CCF |
| **VR PAGADO** **$ 178.000** | **VR PAGADO** **$ 227.800** | **VR PAGADO** **$ 7.500** | **VR PAGADO** **$ 0** |

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL – DICIEMBRE 2025

| **ESPECIALISTA HIDRAULICO – DICIEMBRE 2025** | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO DE COTIZACIÓN** | **FECHA DE PAGO** | **Nro. PLANILLA INTEGRADA** | **INGRESO BASE DE COTIZACIÓN** |
| **DICIEMBRE 2025** | 2025/12/05 | 9495974893 | $ 5.000.000 |

| **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD** | **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES** | **ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES** | **CAJA DE COMPENSACION** |
|---|---|---|---|
| EPS SURA | PORVENIR | ARL POSITIVA | SIN CCF |
| **VR PAGADO $ 625.000** | **VR PAGADO $ 800.000** | **VR PAGADO $ 121.800** | **VR PAGADO $ 0** |

| **ESPECIALISTA ESTRUCTURAL – DICIEMBRE 2025** | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO DE COTIZACIÓN** | **FECHA DE PAGO** | **Nro. PLANILLA INTEGRADA** | **INGRESO BASE DE COTIZACIÓN** |
| **DICIEMBRE 2025** | 2025/12/29 | 9496476178 | $ 2.800.000 |

| **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD** | **ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES** | **ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES** | **CAJA DE COMPENSACION** |
|---|---|---|---|
| EPS SURA | PORVENIR | ARL SURA | SIN CCF |
| **VR PAGADO $ 350.000** | **VR PAGADO $ 448.000** | **VR PAGADO $ 14.700** | **VR PAGADO $ 0** |

26272

| Alcaldía de Bucaramanga | ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO | Código: F-GJ-1140-238,37-082 |
|---|---|---|
| | | Versión: 3.0 |
| | | Fecha aprobación: Julio-12-2021 |
| | | Página 11 de 11 |

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron GONZALO CARDENAS OREJARENA quien actúa en nombre y representación legal del CONSORCIO LA FLORA 2023 en calidad de Contratista; y ALFONSO VEGA ALBINO quien actúa en nombre y representación legal del CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA en calidad de Interventor, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.
2. El Contratista CONSORCIO LA FLORA 2023 acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada.
3. El Contratista CONSORCIO LA FLORA 2023 ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de obra No. 069 de 2023 de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA.
4. El Interventor CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

| | |
|---|---|
| **Valor ejecutado en la presente acta:** | **$ 7.258.984.862,72** |
| **Valor IVA:** | **$ -** |
| **Menos amortización del anticipo:** | **$ 0** |
| **Valor bruto ejecutado a pagar:** | **$ 7.258.984.862,72** |

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

| ESTAMPILLA | No. | VALOR |
|---|---|---|
| PRO HOSPITAL | 2502600239900 | $ 5,800 |
| ORDENANZA 012/2005 | 2502600239900 | $ 580 |

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 24 de abril de 2026.

Contratista

R.L. Gonzalo Cárdenas Orejarena
Consorcio la Flora 2023
Contratista

Interventor

R.L. Alfonso Vega Albino
Consorcio Interventoría Canalización BGA
Interventor

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA: 30-04-26
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

***Proyectó***

Ing. Daniel Gómez Barragán – INGENIERO CIVIL CONTRATISTA – Consorcio la Flora 2023

***Revisó***

Ing. Julio Lozano – INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – Consorcio Interventoría Canalización BGA

Scanned with CamScanner

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038 |
|---|---|---|
| | | Versión: 3.0 |
| | | Fecha aprobación: Mayo-20-2019 |
| | | Página 1 de 1 |

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 1 | CAPÍTULO 1. PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Vallas y señales especiales | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02 | Vallas en lona | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.02.01 | Valla tipo 3 | und | 1,00 | $ 1.349.443,00 | $ 1.349.443,00 | 4,00 | $ 1.349.443,00 | $ 5.397.772,00 | | | | | | | 2,00 | $ 2.698.886,00 |
| 1,02 | Retiro de basuras y escombros | m3 | 12.478,99 | $ 49.600,00 | $ 618.957.904,00 | 3.155,46 | $ 49.600,00 | $ 156.510.816,00 | | | | | | | 2.930,93 | $ 145.374.128,00 |
| 1.03 | Encerramiento y campamento | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01 | Encerramiento | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03.01.02 | Encerramiento con tela de polipropileno verde | m | 7.130,08 | $ 24.992,00 | $ 178.194.959,36 | 4.361,0582652 | $ 24.992,00 | $ 108.991.568,16 | 648,90 | $ 16.217.308,80 | 710,50 | $ 17.756.816,00 | 68,50 | $ 1.711.952,00 | 3.820,03 | $ 95.470.189,76 |
| 1.03.02 | Campamento | und | 4,00 | $ 4.387.594,00 | $ 17.550.376,00 | 2,00 | $ 4.387.594,00 | $ 8.775.188,00 | | | | | 1,00 | $ 4.387.594,00 | 2,00 | $ 8.775.188,00 |
| 1,04 | Replanteo, control y medición permanente de la obra | mes | 18,00 | $ 7.649.114,00 | $ 137.684.052,00 | 36,87 | $ 7.649.114,00 | $ 282.022.833,18 | 2,00 | $ 15.298.228,00 | 3,00 | $ 22.947.342,00 | 2,60 | $ 19.887.696,40 | 31,60 | $ 241.712.002,40 |
| 1,05 | Desmonte y limpieza | m2 | 3.775,50 | $ 4.997,00 | $ 18.866.173,50 | 8.664,77 | $ 4.997,00 | $ 43.297.855,69 | | $ - | | $ - | | $ - | 8.664,14 | $ 43.294.707,58 |
| 1.07 | Rotura de pavimentos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.07.01 | Asfáltico | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.07.01.02 | Espesor entre 0.06m y 0.10m | m2 | 6.804,00 | $ 41.697,00 | $ 283.706.388,00 | 4.276,07 | $ 41.697,00 | $ 178.299.290,79 | 3.253,07 | $ 135.643.259,79 | | $ - | 135,58 | $ 5.653.279,26 | 3.388,65 | $ 141.296.539,05 |
| 1.07.01.03 | Espesor entre 0.10 m y 0.20 m | m2 | 883,08 | $ 50.003,00 | $ 44.156.649,24 | 6.262,04 | $ 50.003,00 | $ 313.120.786,12 | 1.579,50 | $ 78.979.738,50 | | $ - | 3.263,50 | $ 163.184.790,50 | 4.939,54 | $ 246.991.818,62 |
| | | | | SUBTOTAL | $ 1.300.465.945,10 | SUBTOTAL | | $ 1.096.416.109,94 | SUBTOTAL | $ 246.138.535,09 | SUBTOTAL | $ 40.704.158,00 | SUBTOTAL | $ 194.825.312,16 | SUBTOTAL | $ 925.613.459,41 |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038 |
|---|---|---|
| | | Versión: 3.0 |
| | | Fecha aprobación: Mayo-20-2019 |
| | | Página 1 de 1 |

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 2 | CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.01 | Excavación en zanja para alcantarillados | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.01.01 | Excavación con acarreo libre | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.01.01.1 | En tierra con entibados | | | | | | | | | | | | | | | - |
| A | De 0.00 a 2.50 m de profundidad | m3 | 1.063,98 | $ 38.816,00 | $ 41.299.447,68 | 2.546,05 | $ 38.816,00 | $ 98.827.476,80 | - | $ - | | $ - | | $ - | 2.546,05 | $ 98.827.476,80 |
| B | De 2.51 a 5.00 m de profundidad | m3 | 53.763,19 | $ 46.234,00 | $ 2.485.687.326,46 | 3,51 | $ 46.234,00 | $ 162.281,34 | - | $ - | | $ - | | $ - | 3,51 | $ 162.281,34 |
| C | A más de 5.00 m de profundidad | m3 | 9,84 | $ 71.095,00 | $ 699.574,80 | - | $ 71.095,00 | $ - | | | | | | | | |
| 2.01.01.01.2 | En tierra sin entibados | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | De 0.00 a 2.50 m de profundidad | m3 | 118,22 | $ 34.535,00 | $ 4.082.727,70 | 33.871,27 | $ 34.535,00 | $ 1.169.744.309,45 | 1.781,90 | $ 61.537.916,50 | | $ - | 5.551,91 | $ 191.735.211,85 | 29.931,95 | $ 1.033.699.893,25 |
| B | De 2.51 a 5.00 m de profundidad | m3 | 20,18 | $ 42.912,00 | $ 865.964,16 | 3.001,82 | $ 42.912,00 | $ 128.814.099,84 | | | | | 2202,66 | $ 94.520.545,92 | 2.202,66 | $ 94.520.545,92 |
| C | A más de 5.00 m de profundidad | m3 | 11,45 | $ 65.805,00 | $ 753.467,25 | - | $ 65.805,00 | $ - | | | | | | | | |
| 2.01.01.01.3 | En material granular con entibados | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | De 0.00 a 2.50 m de profundidad | m3 | 851,18 | $ 39.797,00 | $ 33.874.410,46 | - | $ 39.797,00 | $ - | | | | | | | | |
| B | De 2.51 a 5.00 m de profundidad | m3 | 145,35 | $ 51.952,00 | $ 7.551.223,20 | 2.901,14 | $ 51.952,00 | $ 150.720.025,28 | | $ - | | $ - | | $ - | 2.901,14 | $ 150.720.025,28 |
| C | A más de 5.00 m de profundidad | m3 | 11,29 | $ 76.379,00 | $ 862.318,91 | 1.183,98 | $ 76.379,00 | $ 90.431.208,42 | | | | | | | 1.183,98 | $ 90.431.208,42 |
| 2.01.01.01.4 | En material granular sin entibados | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | De 0.00 a 2.50 m de profundidad | m3 | 94,57 | $ 34.979,00 | $ 3.307.964,03 | 81,11 | $ 34.979,00 | $ 2.837.146,69 | | | | | | | | |
| B | De 2.51 a 5.00 m de profundidad | m3 | 16,15 | $ 44.605,00 | $ 720.370,75 | 17.490,88 | $ 44.605,00 | $ 780.180.702,40 | 1.025,00 | $ 45.720.125,00 | | $ - | 1.752,48 | $ 78.169.370,40 | 17.490,88 | $ 780.180.702,40 |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| C | A más de 5.00 m de profundidad | m3 | 10,03 | $ 69.317,00 | $ 695.249,51 | 13.858,16 | $ 69.317,00 | $ 960.606.076,72 | 912,34 | $ 63.240.671,78 | | $ - | 1.784,84 | $ 123.719.754,28 | 13.858,16 | $ 960.606.076,72 |
| 2.01.01.01.5 | En roca a cualquier profundidad | m3 | 553,80 | $ 130.151,00 | $ 72.077.623,80 | 17.307,98 | $ 130.151,00 | $ 2.252.650.904,98 | 804,02 | $ 104.644.007,02 | | $ - | 2.754,90 | $ 358.552.989,90 | 16.646,11 | $ 2.166.507.862,61 |
| 2.01.01.02 | Excavaciones sin acarreo libre | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.01.02.1 | En tierra con entibados | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | De 0.00 a 2.50 m de profundidad | m3 | 1.595,97 | $ 34.545,00 | $ 55.132.783,65 | - | $ 34.545,00 | $ - | | | | | | | | |
| B | De 2.51 a 5.00 m de profundidad | m3 | 272,53 | $ 41.049,00 | $ 11.187.083,97 | - | $ 41.049,00 | $ - | | | | | | | | |
| C | A más de 5.00 m de profundidad | m3 | 12,54 | $ 67.842,00 | $ 850.738,68 | - | $ 67.842,00 | $ - | | | | | | | | |
| 2.01.01.02.2 | En tierra sin entibados | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | De 0.00 a 2.50 m de profundidad | m3 | 177,33 | $ 34.134,00 | $ 6.052.982,22 | - | $ 34.134,00 | $ - | | | | | | $ - | - | $ - |
| B | De 2.51 a 5.00 m de profundidad | m3 | 30,28 | $ 38.133,00 | $ 1.154.667,24 | - | $ 38.133,00 | $ - | | | | | | | | |
| C | A más de 5.00 m de profundidad | m3 | 8,06 | $ 63.664,00 | $ 513.131,84 | - | $ 63.664,00 | $ - | | | | | | | | |
| 2.01.01.02.3 | En material granular con entibados | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | De 0.00 a 2.50 m de profundidad | m3 | 1.276,78 | $ 37.243,00 | $ 47.551.117,54 | - | $ 37.243,00 | $ - | | | | | | | | |
| B | De 2.51 a 5.00 m de profundidad | m3 | 271,18 | $ 47.784,00 | $ 12.958.255,10 | - | $ 47.784,00 | $ - | | | | | | | | |
| C | A más de 5.00 m de profundidad | m3 | 8,43 | $ 74.238,00 | $ 625.826,34 | - | $ 74.238,00 | $ - | | | | | | | | |
| 2.01.01.02.4 | En material granular sin entibados | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | De 0.00 a 2.50 m de profundidad | m3 | 141,86 | $ 32.838,00 | $ 4.658.398,68 | - | $ 32.838,00 | $ - | | | | | | | | |
| B | De 2.51 a 5.00 m de profundidad | m3 | 24,22 | $ 42.225,00 | $ 1.022.689,50 | - | $ 42.225,00 | $ - | | | | | | | | |
| C | A más de 5.00 m de profundidad | m3 | 8,05 | $ 66.064,00 | $ 531.683,07 | - | $ 66.064,00 | $ - | | | | | | | | |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 2.01.01.01.5b | En roca a cualquier profundidad | m3 | 830,70 | $ 128.131,00 | $ 106.438.421,70 | - | $ 128.131,00 | $ - | | | | | | | | |
| 2.02 | Terraplenes y rellenos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.02 | Suministro, conformación y compactación de rellenos comunes | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.02.01 | En zanja | m3 | 17.481,03 | $ 83.507,00 | $ 1.459.788.372,21 | 62.129,89 | $ 83.507,00 | $ 5.188.280.891,24 | 6.289,30 | $ 525.200.575,10 | 3.514,39 | $ 293.476.165,73 | | $ - | 52.197,76 | $ 4.358.878.344,32 |
| 2.02.06 | Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para cimentación de tubería | m3 | 600,75 | $ 146.181,00 | $ 87.818.235,75 | 1.607,75 | $ 146.181,00 | $ 235.022.502,75 | 156,30 | $ 22.848.090,30 | 153,84 | $ 22.488.485,04 | | | 1.370,63 | $ 200.360.064,03 |
| 2.03 | Acarreos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.03.04 | Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000 m. | m3-est | 289.972,90 | $ 3.196,00 | $ 926.753.388,40 | 1.049.626,84 | $ 3.196,00 | $ 3.354.607.380,64 | 57.973,94 | $ 185.284.712,24 | 2.078,50 | $ 6.642.886,00 | 146.194,76 | $ 467.238.452,96 | 986.100,42 | $ 3.151.576.942,32 |
| | | | | SUBTOTAL | $ 5.375.515.444,60 | SUBTOTAL | | $ 14.412.885.006,55 | SUBTOTAL | $ 1.008.476.097,94 | SUBTOTAL | $ 322.607.536,77 | SUBTOTAL | $ 1.313.936.325,31 | SUBTOTAL | $ 13.086.471.423,41 |
| 3 | CAPÍTULO 3. TUBERÍAS PREFABRICADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,04 | Tubería de PVC | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.04.01 | Tubería sanitaria | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.04.01.01 | Suministro e instalación de tubería de D= 2" | m | 54,00 | $ 27.988,00 | $ 1.511.352,00 | - | $ 27.988,00 | $ - | | | | | | | | |
| 3.04.01.05 | Suministro e instalación de accesorios D=2" | u | 47,00 | $ 25.848,00 | $ 1.214.856,00 | - | $ 25.848,00 | $ - | | | | | | | | |
| 3.04.02 | Tubería de P.V.C. para alcantarillado | | | | | | | | | | | | | | | |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 3.04.02.10 | Suministro e instalación de tubería de D= 24" | m | 1.957,04 | $ 806.540,00 | $ 1.578.431.041,60 | 1.230,73 | $ 806.540,00 | $ 992.632.974,20 | 181,33 | $ 146.249.898,20 | 216,95 | $ 174.978.853,00 | | $ - | 918,73 | $ 740.992.494,20 |
| | | | | SUBTOTAL | $ 1.581.157.249,60 | SUBTOTAL | | $ 992.632.974,20 | SUBTOTAL | $ 146.249.898,20 | SUBTOTAL | $ 174.978.853,00 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 740.992.494,20 |
| 4 | CAPÍTULO 4. ESTRUCTURAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,02 | Concreto | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.01 | Suministro y colocación de concreto de 4000 psi | m3 | 5.456,40 | $ 1.046.026,00 | $ 5.707.536.266,40 | 6.460,11 | $ 1.046.026,00 | $ 6.757.443.022,86 | 190,64 | $ 199.414.396,64 | 240,16 | $ 251.213.604,16 | | $ - | 6.231,82 | $ 6.518.645.747,32 |
| 4.02.05 | Suministro y colocación de concreto de 3000 psi | m3 | 3.091,57 | $ 968.931,00 | $ 2.995.518.011,67 | 203,92 | $ 968.931,00 | $ 197.584.409,52 | 12,03 | $ 11.656.239,93 | 16,66 | $ 16.142.390,46 | | $ - | 179,92 | $ 174.330.065,52 |
| 4.02.07 | Suministro y colocación de concreto de 2000 psi | m3 | 104,39 | $ 691.342,00 | $ 72.169.191,38 | - | $ 691.342,00 | $ - | | | | | | | | |
| 4.02.09 | Suministro y colocación de concreto pobre para solados | m3 | 514,30 | $ 459.877,00 | $ 236.514.741,10 | 79,00 | $ 459.877,00 | $ 36.330.283,00 | 1,54 | $ 708.210,58 | 2,34 | $ 1.076.112,18 | | $ - | 39,27 | $ 18.059.369,79 |
| 4,03 | Acero de refuerzo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.03.01 | Suministro y colocación de acero de refuerzo fy=2590 kg/cm2 | kg | 1.017,29 | $ 8.765,00 | $ 8.916.573,15 | 10.517,619978 | $ 8.765,00 | $ 92.186.939,11 | 848,74 | $ 7.439.206,10 | 495,77 | $ 4.345.424,05 | 95,93 | $ 840.826,45 | 9.532,42 | $ 83.551.661,30 |
| 4.03.02 | Suministro y colocación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | Kg | 986.295,89 | $ 9.015,00 | $ 8.891.457.448,35 | 760.273,93 | $ 9.015,00 | $ 6.853.869.478,95 | 29.862,20 | $ 269.207.733,00 | 37.206,09 | $ 335.412.901,35 | 7.270,88 | $ 65.546.983,20 | 706.258,83 | $ 6.366.923.352,45 |
| 4,05 | Estructuras en ladrillo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.05.01 | Mampostería de ladrillo para pozos de inspección | m2 | 485,90 | $ 246.732,00 | $ 119.887.078,80 | 233,21 | $ 246.732,00 | $ 57.540.369,72 | | $ - | - | $ - | | $ - | 151,86 | $ 37.468.721,52 |
| 4.06 | Sifones de caída-conexiones domiciliarias | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.06.01 | Sifones de caída | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.06.01.12 | Diametro 14"y hp= 1.01 - 2.00 m | u | 1,00 | $ 2.310.836,00 | $ 2.310.836,00 | - | $ 2.310.836,00 | $ - | | | | | | | | |
| 4.06.01.13 | Diametro 14"y hp= 2.01 - 3.00 m | u | 1,00 | $ 2.735.508,00 | $ 2.735.508,00 | - | $ 2.735.508,00 | $ - | | | | | | | | |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12

OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 4.08 | Juntas con cinta polivinilo | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.08.02 | Juntas con sello de P.V.C. ancho 15 cm | ml | 3.516,00 | $ 62.378,00 | $ 219.321.048,00 | 5.024,50 | $ 62.378,00 | $ 313.418.261,00 | 168,00 | $ 10.479.504,00 | 212,00 | $ 13.224.136,00 | 39,85 | $ 2.485.763,30 | 4.673,75 | $ 291.539.177,50 |
| 4.08.02.P | Junta de dilatación constructiva. Incluye sello P.V.C. ancho 10 cm y sellante de poliuretano | ml | 1.259,57 | $ 171.198,00 | $ 215.635.674,64 | 1.569,50 | $ 171.198,00 | $ 268.695.261,00 | 54,00 | $ 9.244.692,00 | 67,50 | $ 11.555.865,00 | | $ - | 1.545,00 | $ 264.500.910,00 |
| | | | | SUBTOTAL | $ 18.472.002.377,49 | SUBTOTAL | SUBTOTAL | $ 14.577.068.025,16 | SUBTOTAL | $ 508.149.982,25 | SUBTOTAL | $ 632.970.433,20 | SUBTOTAL | $ 68.873.572,95 | SUBTOTAL | $ 13.755.019.005,40 |
| 5 | CAPÍTULO 5. VARIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,01 | Demolición de estructuras existentes | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.01 | Demolición de pisos, sardineles, canaletas y escaleras | m3 | 447,58 | $ 198.974,00 | $ 89.056.782,92 | 609,31 | $ 198.974,00 | $ 121.236.847,94 | 123,92 | $ 24.656.858,08 | 148,61 | $ 29.569.526,14 | | $ - | 309,75 | $ 61.632.196,50 |
| 5.01.05 | Demolicion de estructuras en concreto simple | m3 | 180,00 | $ 163.647,00 | $ 29.456.460,00 | 39,81 | $ 163.647,00 | $ 6.514.787,07 | | | | | | | 29,81 | $ 4.878.317,07 |
| 5.01.06 | Demolición de estructuras en concreto reforzado | m3 | 5.047,41 | $ 240.594,00 | $ 1.214.376.561,54 | 622,83 | $ 240.594,00 | $ 149.849.161,02 | | $ - | | $ - | | $ - | 602,83 | $ 145.037.281,02 |
| 5,03 | Reparación de pavimentos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.03.01 | Reparacion de Pavimento especificacion EMPAS (e=7,5cm) | m2 | 888,63 | $ 132.004,00 | $ 117.302.125,27 | 3.802,00 | $ 132.004,00 | $ 501.879.208,00 | | | | | | | | |
| 1 | Reparación de pavimento asfáltico | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Base asfáltica e = 0.10m | m2 | 6.804,00 | $ 139.992,00 | $ 952.505.568,00 | - | $ 139.992,00 | $ - | | | | | | | | |
| b | Carpeta de rodadura e = 0.05m | m2 | 6.804,00 | $ 78.409,00 | $ 533.494.836,00 | 3.802,00 | $ 78.409,00 | $ 298.111.018,00 | | | | | | | | |
| c | Suministro e instalación de base granular | m3 | 1.020,60 | $ 183.779,00 | $ 187.564.847,40 | 1.880,80 | $ 183.779,00 | $ 345.651.543,20 | 365,25 | $ 67.125.279,75 | 238,64 | $ 43.857.020,56 | 753,73 | $ 138.519.745,67 | 1.357,62 | $ 249.502.045,98 |
| 5,05 | Reparación y limpieza de calles, limpieza general | | | | | | | | | | | | | | | |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 5.05.01 | Reparación de pisos andenes en concreto de 2500 psi e=0.10 m | m2 | 850,50 | $ 93.356,00 | $ 79.399.278,00 | 897,494667 | $ 93.356,00 | $ 83.786.512,13 | | | | | 519,73 | $ 48.519.913,88 | 519,73 | $ 48.519.913,88 |
| 5.05.02 | Reparación de sardineles, andenes, zonas verdes, limpieza general | ml | 378,00 | $ 134.672,00 | $ 50.906.016,00 | 30,00 | $ 134.672,00 | $ 4.040.160,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,13 | Accesorios de hierro fundido | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.13.02 | Aros y contra-aros para tapas de pozos | und | 47,00 | $ 625.330,00 | $ 29.390.510,00 | 62,00 | $ 625.330,00 | $ 38.770.460,00 | - | $ - | | $ - | | $ - | 34,00 | $ 21.261.220,00 |
| | | | | SUBTOTAL | $ 3.283.452.985,13 | SUBTOTAL | SUBTOTAL | $ 1.549.839.697,36 | SUBTOTAL | $ 91.782.137,83 | SUBTOTAL | $ 73.426.546,70 | SUBTOTAL | $ 187.039.659,55 | SUBTOTAL | $ 530.830.974,45 |
| | NUEVOS ITEMS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CAPÍTULO 6. VARIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.1. | Demolición de muros en mampostería, e <=0.15m. | m2 | | $ 26.300,00 | | 414,48 | $ 26.300,00 | $ 10.900.824,00 | | | | | | | 414,48 | $ 10.900.824,00 |
| 6.0.2. | Demolicion de tuberías existentes en concreto reforzado (Diametro 2mts, espesor 20cms) | ml | | $ 559.234,00 | | 823,61 | $ 559.234,00 | $ 460.590.714,74 | | $ - | | $ - | 25,60 | $ 14.316.390,40 | 823,61 | $ 460.590.714,74 |
| 6.0.3. | Demolicion de estructuras en concreto ciclopeo | m3 | | $ 213.036,00 | | 2.474,00 | $ 213.036,00 | $ 527.051.064,00 | | $ - | | $ - | | $ - | 2.474,00 | $ 527.051.064,00 |
| 6.0.4. | Desmonte de rejas metálicas (1.40m x 2.00m) | und | | $ 24.258,00 | | 18,00 | $ 24.258,00 | $ 436.644,00 | | | | | | | 18,00 | $ 436.644,00 |
| 6.0.5. | Muro en ladrillo a la vista (25x6.5x12cm) | m2 | | $ 123.682,00 | | 424,54 | $ 123.682,00 | $ 52.507.956,28 | | | | | | | | |
| 6.0.6. | Alfajía fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI, ancho 22 cm, Tipo VP.015, incluye acero de refuerzo. | ml | | $ 90.819,00 | | 160,00 | $ 90.819,00 | $ 14.531.040,00 | | | | | | | | |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 6.0.7. | Columneta de Confinamiento En Concreto De 3000 Psi De 0.12 X 0.20 Metros, (No Incluye Acero de Refuerzo). | ml | | $ 28.662,00 | | 320,00 | $ 28.662,00 | $ 9.171.840,00 | | | | | | | | |
| 6.0.8. | Suministro y colocacion de concreto ciclopeo 35% piedra rajón y 65% concreto de 2500 psi | m3 | | $ 537.196,15 | | 2.843,09 | $ 537.196,15 | $ 1.527.297.002,10 | 115,37 | $ 61.976.319,83 | 143,83 | $ 77.264.922,25 | | $ - | 2.811,09 | $ 1.510.106.725,30 |
| 6.0.9. | Viga de cimentación en concreto 3000 PSI mezclado en obra. Área Transversal de 625 a 1600 cm2 | m3 | | $ 958.861,00 | | 24,48 | $ 958.861,00 | $ 23.472.917,28 | | | | | | | | |
| 6.0.10. | Canaleta en Concreto 3000 PSI Mezclado en Sitio. Área Transversal de 625 a 1600 cm2 (No incluye acero de refuerzo) | m3 | | $ 1.020.917,00 | | 3,00 | $ 1.020.917,00 | $ 3.062.751,00 | | | | | | | | |
| 6.0.11. | Geocompuesto de subdrenaje (geodren planar H = 1:00 m -Tuberia perforada diametro 4") | ml | | $ 186.296,00 | | 2.020,00 | $ 186.296,00 | $ 376.317.920,00 | 82,60 | $ 15.388.049,60 | 96,80 | $ 18.033.452,80 | | $ - | 2.020,00 | $ 376.317.920,00 |
| 6.0.12. | Desmonte de juegos infantiles en madera, incluye arco para pasamanos, columpios y resbaladero. | und | | $ 206.051,00 | | 1,00 | $ 206.051,00 | $ 206.051,00 | | | | | | | 1,00 | $ 206.051,00 |
| 6.0.13. | Excavación manual en zanja en material común en seco, ancho máx: 60 cm, prof máx: 100 cm, incluye acarreo libre a máximo 50 metros. Para andenes y sardineles. | m3 | | $ 55.205,00 | | 135,60 | $ 55.205,00 | $ 7.485.798,00 | 36,20 | $ 1.998.421,00 | 13,36 | $ 737.538,80 | | $ - | 49,56 | $ 2.735.959,80 |
| 6.0.14. | Tubería sanitaria PVC Diámetro 3" para ventilación pozos de inspección, incluye accesorios de conexión. | ml | | $ 46.030,30 | | 142,40 | $ 46.030,30 | $ 6.554.714,72 | | | | $ - | | $ - | 61,00 | $ 2.807.848,30 |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 6.0.15. | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 200mm (8"), incluye accesorios de conexión | ml | | $ 99.404,41 | | 29,88 | $ 99.404,41 | $ 2.970.203,77 | | $ - | | $ - | | $ - | 29,88 | $ 2.970.203,77 |
| 6.0.16. | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 250mm (10"), incluye accesorios de conexión | ml | | $ 127.740,82 | | 11,17 | $ 127.740,82 | $ 1.426.864,96 | | $ - | | $ - | | $ - | 11,17 | $ 1.426.864,96 |
| 6.0.17. | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 315mm (12"), incluye accesorios de conexión. Para manijas. | ml | | $ 165.603,32 | | 157,49 | $ 165.603,32 | $ 26.080.866,87 | 56,04 | $ 9.280.410,05 | 22,42 | $ 3.712.826,43 | | $ - | 126,35 | $ 20.923.979,48 |
| 6.0.18. | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 355mm (14"), incluye accesorios de conexión. Para cámaras de caída en pozos de inspección. | ml | | $ 223.423,89 | | - | $ 223.423,89 | $ - | | | | | | | | |
| 6.0.19. | Red hidráulica PVC RDE 9 diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión. | ml | | $ 14.399,81 | | - | $ 14.399,81 | $ - | | | | | | | | |
| 6.0.20. | Red hidráulica PVC RDE 11 Diámetro 3/4", incluye accesorios de conexión. | ml | | $ 16.747,12 | | - | $ 16.747,12 | $ - | | | | | | | | |
| 6.0.21. | Red hidráulica PVC RDE 13,5 Diámetro 1", incluye accesorios de conexión. | ml | | $ 20.723,23 | | - | $ 20.723,23 | $ - | | | | | | | | |
| 6.0.22. | Anclaje para varilla de 1/2" con epóxico de fijación, embebida 15 cms. Para anclaje de estructuras de entrega en el box-culvert construido. | und | | $ 17.399,62 | | 128,00 | $ 17.399,62 | $ 2.227.151,36 | | | | | | | 128,00 | $ 2.227.151,36 |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 6.0.23. | Caja de inspección 0,40x0,40 H= 0,60 m en ladrillo temosa, incluye piso en concreto e=0.15mts y tapa en concreto e=0.10mts | und | | $ 343.039,08 | | - | $ 343.039,08 | $ - | | | | | | | | |
| 6.0.24. | Caja de inspección 0,60x0,60 H= 0,60 m en ladrillo temosa, incluye piso en concreto e=0.15mts y tapa en concreto e=0.10mts | und | | $ 452.677,10 | | - | $ 452.677,10 | $ - | | | | | | | | |
| 6.0.25. | Caja de inspección 0,80x0,80 H= 0,80 m en ladrillo temosa, incluye piso en concreto e=0.15mts y tapa en concreto e=0.10mts | und | | $ 735.687,54 | | - | $ 735.687,54 | $ - | | | | | | | | |
| 6.0.26. | Desmonte de máquinas de gimnasio y/o Juegos infantiles metálicos, incluye cargue y transporte local. | und | | $ 114.369,00 | | 13,00 | $ 114.369,00 | $ 1.486.797,00 | | | | | | | 13,00 | $ 1.486.797,00 |
| 6.0.27. | Desmonte de módulo de cerramiento en malla eslabonada y ángulo, incluye cargue y retiro | m2 | | $ 15.557,55 | | 396,33 | $ 15.557,55 | $ 6.165.923,79 | | | | | | | 396,33 | $ 6.165.923,79 |
| 6.0.28. | Suministro e instalación de cerramiento provisional en láminas metálicas Cold Rolled H=2.00 m, con apoyos separados entre ejes cada 2.00 m en perfil metálico tipo C 100 x 50 x 1,5mm, incluye cimentación en concreto 2000 PSI | ml | | $ 285.516,41 | | - | $ 285.516,41 | $ - | | | | | | | | |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 6.0.29. | Desmonte y reubicación de cerramiento provisional en láminas metálicas Cold Rolled H=2.00 m, con apoyos separados entre ejes cada 2.00 m en perfil metálico tipo C 100 x 50 x 1,5mm, incluye cimentación en concreto 2000 PSI | ml | | $ 158.525,91 | | - | $ 158.525,91 | $ - | | | | | | | | |
| 6.0.30. | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 400mm (16"), incluye accesorios de conexión. Para sumideros | ml | | $ 260.379,75 | | 119,13 | $ 260.379,75 | $ 31.019.039,62 | | $ - | | $ - | | $ - | 80,13 | $ 20.864.229,37 |
| 6.0.31. | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 450mm (18"), incluye accesorios de conexión. Para sumideros | ml | | $ 306.279,75 | | 102,00 | $ 306.279,75 | $ 31.240.534,50 | | $ - | | $ - | | $ - | 96,55 | $ 29.571.309,86 |
| 6.0.32. | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 850mm (33"), incluye accesorios de conexión. Para estructuras de separación | ml | | $ 930.653,20 | | 65,91 | $ 930.653,20 | $ 61.339.352,41 | | $ - | | $ - | | $ - | 50,41 | $ 46.914.227,81 |
| 6.0.33. | Tubería PVC de pared estructural alcantarillado hermético, diámetro 900mm (36"), incluye accesorios de conexión. Para estructuras de separación | ml | | $ 1.318.253,20 | | 27,78 | $ 1.318.253,20 | $ 36.621.073,90 | | $ - | | $ - | | $ - | 27,78 | $ 36.621.073,90 |
| 6.0.34. | Suministro y colocación de concreto de 4000 psi. Para estructuras de separación y sumideros | m3 | | $ 1.245.118,00 | | 644,73 | $ 1.245.118,00 | $ 802.764.928,14 | | $ - | 14,06 | $ 17.506.359,08 | 75,34 | $ 93.807.190,12 | 302,67 | $ 376.859.865,06 |
| 6.0.35. | Suministro e instalación de rejillas en hierro fundido para sumidero 54 x 90 x 7cm | und | | $ 1.235.959,06 | | 118,00 | $ 1.235.959,06 | $ 145.843.169,08 | 48,00 | $ 59.326.034,88 | | $ - | | $ - | 82,00 | $ 101.348.642,92 |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 6.0.36. | Traslado de cámaras de vigilancia, incluye hincado de poste nuevo y puesta en marcha del sistema | und | | $ 18.806.233,70 | | 2,00 | $ 18.806.233,70 | $ 37.612.467,40 | | | | | | | 2,00 | $ 37.612.467,40 |
| 6.0.37. | Control temporal del cauce utilizando tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 36 pulgadas. (Incluye Desmonte y Montaje para traslado) | ml | | $ 469.343,64 | | 252,25 | $ 469.343,64 | $ 118.391.933,19 | | $ - | | $ - | | $ - | 229,00 | $ 107.479.693,56 |
| 6.0.38. | Reubicación y adecuación de redes eléctricas con instalación de poste de concreto nuevo | und | | $ 30.310.427,17 | | 1,00 | $ 30.310.427,17 | $ 30.310.427,17 | | | | | | | 1,00 | $ 30.310.427,17 |
| 6.0.39. | Construcción y adecuación de variante eléctrica para traslado de redes de media y baja tensión, mitigación de riesgos y reinstalación de transformador, incluye instalación de postes de concreto nuevo | und | | $ 84.232.352,00 | | 1,00 | $ 84.232.352,00 | $ 84.232.352,00 | | | | | | | 1,00 | $ 84.232.352,00 |
| 6.0.40. | Suministro e instalación de tubería PEAD estructurada Ø1800 mm | ml | | $ 6.838.854,56 | | 484,83 | $ 6.838.854,56 | $ 3.315.681.856,32 | | $ - | | $ - | 297,89 | $ 2.037.226.384,88 | 297,89 | $ 2.037.226.384,88 |
| 6.0.41 | Suministro e instalación de sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0,20 x 0,50 x 0,80 m. Incluye sello de juntas. | ml | | $ 96.014,88 | | 2.290,00 | $ 96.014,88 | $ 219.874.075,20 | 603,32 | $ 57.927.697,40 | 222,72 | $ 21.384.434,07 | 474,90 | $ 45.597.466,51 | 1.300,94 | $ 124.909.597,99 |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 6.0.42 | Piso adoquín peatonal rectangular 20 x 20 x 6 cm en concreto color gris o amarillo sobre mortero 1:4 y malla gallinero. | m2 | | $ 187.685,97 | | 2.026,33 | $ 187.685,97 | $ 380.313.711,59 | | $ - | 557,37 | $ 104.610.529,10 | 475,15 | $ 89.178.988,65 | 1.032,52 | $ 193.789.517,74 |
| 6.0.43. | Concreto hidráulico de fraguado rápido MR 41 (fast track) | m3 | | $ 1.092.782,25 | | 1.620,79 | $ 1.092.782,25 | $ 1.771.170.542,98 | 365,25 | $ 399.138.716,81 | 171,74 | $ 187.674.423,62 | 633,43 | $ 692.201.060,62 | 1.170,42 | $ 1.279.014.201,05 |
| 6.0.44 | Bordillo recto en concreto 3000 PSI mezclado en sitio (10 cm x 30 cm) tipo BS.001 o similar, incluye solado y acero de refuerzo | ml | | $ 76.242,95 | | 2.140,07 | $ 76.242,95 | $ 163.165.250,01 | | $ - | 543,37 | $ 41.428.131,74 | 642,00 | $ 48.947.973,90 | 1.185,37 | $ 90.376.105,64 |
| 6.0.45. | Prado remolina, incluye tierra negra para abono | m2 | | $ 28.665,00 | | 6.807,50 | $ 28.665,00 | $ 195.136.987,50 | | $ - | | $ - | 2.139,82 | $ 61.337.940,30 | 2.139,82 | $ 61.337.940,30 |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 6.0.46. | Suministro e Instalación de grama sintética en fibra artificial de polietileno fibrilado 50mm, de tercera generación, incluye un riego con arena de sílice y grano de caucho. | m2 | | $ 125.277,10 | | - | $ 125.277,10 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 6.0.47. | Sobreacarreos para acarreos totales de 0.00 a 1000.00 m. (Por estación de 100 mts) | m3*est | | $ 12.099,03 | | - 0,00 | $ 12.099,03 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 6.0.48. | Suministro, conformación y compactación de relleno en triturado de 3/4" para cimentación de tubería | m3 | | $ 160.084,76 | | 3.238,92 | $ 160.084,76 | $ 518.501.730,86 | | $ - | | $ - | 2.354,37 | $ 376.898.756,40 | 2.354,37 | $ 376.898.756,40 |
| 6.0.49 | Conformación de calzada existente | m2 | | $ 1.206,75 | | 12.530,74 | $ 1.206,75 | $ 15.121.470,50 | 1.826,92 | $ 2.204.635,71 | 858,82 | $ 1.036.381,04 | 3.191,68 | $ 3.851.559,84 | 5.877,42 | $ 7.092.576,59 |
| 6.0.50. | Mantenimiento y montaje de módulos de cerramiento en malla eslabonada y ángulo y/o varilla | m2 | | $ 108.321,30 | | 330,00 | $ 108.321,30 | $ 35.746.029,00 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 6.0.51. | Conformación y compactación de rellenos comunes en zanja o terraplén con acarreo libre | m3 | | $ 45.247,98 | | 4.602,93 | $ 45.247,98 | $ 208.273.284,58 | | $ - | | $ - | 3.307,53 | $ 149.659.051,29 | 3.307,53 | $ 149.659.051,29 |
| 6.0.52. | Línea de demarcación con pintura en frío | ml | | $ 5.417,27 | | 4.920,00 | $ 5.417,27 | $ 26.652.968,40 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 6.0.53. | Base imprimante para demarcación de pintura en pavimentos de concreto, por metro lineal | ml | | $ 4.575,49 | | 3.390,00 | $ 4.575,49 | $ 15.510.911,10 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 6.0.54. | Cerramiento en malla eslabonada CAL 12 h=2mts y postes en concreto 17MPA, separados entre ejes cada 2.50 mts | ml | | $ 75.158,80 | | 640,00 | $ 75.158,80 | $ 48.101.632,00 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 6.0.55. | Acometida domiciliaria de 0.00 a 6.00 mts, incluye excavación, semicodo, silla yee, cama de arena, instalación de tubería 6" y relleno | und | | $ 1.600.103,57 | | 14,00 | $ 1.600.103,57 | $ 22.401.449,98 | | $ - | | $ - | 9,00 | $ 14.400.932,13 | 14,00 | $ 22.401.449,98 |
| 6.0.56. | Acometida domiciliaria de 6.01 a 10.00 mts, incluye excavación, semicodo, silla yee, cama de arena, instalación de tubería 6" y relleno | und | | $ 1.862.361,39 | | 9,00 | $ 1.862.361,39 | $ 16.761.252,51 | | $ - | | $ - | | $ - | 9,00 | $ 16.761.252,51 |
| 6.0.57. | Cerramiento en tubo galvanizado 3" CAL 1.9 mm, separacion entre ejes 20 cm, acabado en pintura anticorrosiva. | ml | | $ 835.964,25 | | 20,00 | $ 835.964,25 | $ 16.719.285,00 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 6.0.58. | Reubicación de tubería de la red de acueducto D=20" L=55 m en hierro dúctil C30, con tramo elevado en acero SCH40 soportado mediante estructura metálica tipo cercha de 24 m, incluyendo instalación de codos, uniones, excavación, construcción de caissons, anclajes y relleno | und | | $ 249.735.006,00 | | 1,00 | $ 249.735.006,00 | $ 249.735.006,00 | 1,00 | $ 249.735.006,00 | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 249.735.006,00 |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 6.0.59. | Suministro e instalación de máquina gimnasio al aire libre RUEDA DE TAI CHI - TIMONES DOBLE, tipo 2019-0102, Dimensiones 115x112x162 cm, Color Gris Antracita y gris plata | und | | $ 6.130.774,47 | | 1,00 | $ 6.130.774,47 | $ 6.130.774,47 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 6.0.60. | Suministro e instalación de máquina gimnasio al aire cintura, tipo MGJ.003, incluye cimentación en concreto | und | | $ 5.927.491,67 | | 1,00 | $ 5.927.491,67 | $ 5.927.491,67 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 6.0.61. | Suministro e instalación de máquina gimnasio al aire extensión de piernas y sentadilla doble, tipo MGJ.004 | und | | $ 5.889.137,90 | | 1,00 | $ 5.889.137,90 | $ 5.889.137,90 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 6.0.62. | Suministro e instalación de máquina de gimnasio al aire libre pectorales doble en wpc, incluye cimentación en concreto y anclaje | und | | $ 8.180.836,63 | | 1,00 | $ 8.180.836,63 | $ 8.180.836,63 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 6.0.63. | Suministro e instalación de máquina de gimnasio al aire libre piernas sentadilla doble wpc, tipo MGJ.007, incluye cimentación en concreto y anclaje | und | | $ 7.237.210,30 | | 1,00 | $ 7.237.210,30 | $ 7.237.210,30 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 6.0.64. | Suministro e instalación de máquina de gimnasio al aire libre banca doble abdominales doble wpc, tipo MGJ.008 | und | | $ 6.582.865,37 | | 1,00 | $ 6.582.865,37 | $ 6.582.865,37 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 6.0.65. | Suministro e instalación de máquina de gimnasio al aire libre elíptica doble en wpc, tipo MGJ.009. incluye cimentación en concreto y anclaje. | und | | $ 9.864.218,29 | | 1,00 | $ 9.864.218,29 | $ 9.864.218,29 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 6.0.66. | Suministro e instalación de máquina de gimnasio al aire libre swing balanceo y cintura doble wpc, tipo MGJ.010, incluye cimentación en concreto y anclaje | und | | $ 5.146.842,63 | | 1,00 | $ 5.146.842,63 | $ 5.146.842,63 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 6.0.67. | Suministro e instalación de máquina de gimnasio al aire libre bicicleta estática doble en wpc, tipo MGJ.011, incluye cimentación en concreto y anclaje. | und | | $ 9.657.918,29 | | 1,00 | $ 9.657.918,29 | $ 9.657.918,29 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 6.0.68. | Suministro e instalación de máquina de gimnasio al aire libre timón/volantes de brazos wpc, tipo MGJ.012, incluye cimentación en concreto y anclaje. | und | | $ 5.498.936,63 | | 1,00 | $ 5.498.936,63 | $ 5.498.936,63 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 6.0.69. | Suministro e instalación de máquina de gimnasio al aire libre barras paralelas wpc, tipo MGJ.013 | und | | $ 5.381.955,37 | | 1,00 | $ 5.381.955,37 | $ 5.381.955,37 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 6.0.70. | Suministro e instalación de juego infantil columpio 2 asientos tipo SF006 (3.8m x 2.18m x 2.31m), incluye cimentación en concreto y anclajes | und | | $ 24.402.538,15 | | 1,00 | $ 24.402.538,15 | $ 24.402.538,15 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 6.0.71. | Suministro e instalación de Juego infantil, Tipo ATI 909, incluye cimentacion en concreto y anclajes | und | | $ 50.105.140,68 | | 1,00 | $ 50.105.140,68 | $ 50.105.140,68 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 6.0.72. | Suministro e instalación de juego infantil, Tipo SP008, incluye cimentación en concreto y anclajes | und | | $ 42.499.387,68 | | 1,00 | $ 42.499.387,68 | $ 42.499.387,68 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 6.0.73. | Suministro e instalación de banca con espaldar prefabricada en concreto tipo Oland, dimensiones 0.45 m de alto, 0.57 m de ancho y 1.80 m de longitud, forma y colores de acuerdo a detalles arquitectónicos. | und | | $ 2.496.655,10 | | 10,00 | $ 2.496.655,10 | $ 24.966.551,00 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 6.0.74. | Suministro e instalación de banca sin espaldar prefabricada en concreto tipo Oland, dimensiones 0.45 m de alto, 0.45 m de ancho y 1.80 m de longitud, forma y colores de acuerdo a detalles arquitectónicos. | und | | $ 1.951.306,10 | | 10,00 | $ 1.951.306,10 | $ 19.513.061,00 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 6.0.75. | Construcción de zona endurecida en concreto f'c = 3.000 psi, espesor 12 cm , reforzada con malla electrosoldada de 4 mm hueco 15x15cm, con juntas de contracción y acabado final en pintura acrílica base solvente para tráfico peatonal | m2 | | $ 217.881,00 | | 1.416,27 | $ 217.881,00 | $ 308.578.323,87 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 6.0.76. | Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada metálica 2.1/4" x 2.1/4" calibre 2,70 mm con ángulos 1.1/2X1/8 pulg (acabado en pintura anticorrosiva y pintura esmalte) | m2 | | $ 243.151,00 | | 166,08 | $ 243.151,00 | $ 40.382.518,08 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 6.0.77. | Suministro e instalación de paral metalico estructural en tuberia de 2.1/2" para cerramiento contra impacto (acabado en pintura anticorrosiva y pintura esmalte) | ml | | $ 71.836,00 | | 150,00 | $ 71.836,00 | $ 10.775.400,00 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 6.0.78. | Suministro e instalación de defensa metálica vehicular galvanizada tipo ACS01-BL4R nivel de contención N2, con terminal abatible y captafaros reflectivos bidireccionales. | ml | | $ 303.901,00 | | 60,00 | $ 303.901,00 | $ 18.234.060,00 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12

OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| 6.0.79. | Tuberia sanitaria PVC Diámetro 4" para ventilación cámaras de inspección, incluye accesorios de conexión. | ml | | $ 60.667,00 | | 47,50 | $ 60.667,00 | $ 2.881.682,50 | | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| | | | | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | SUBTOTAL | $ 12.276.024.616,32 | SUBTOTAL | $ 856.975.291,28 | SUBTOTAL | $ 473.388.998,93 | SUBTOTAL | $ 3.627.423.695,04 | SUBTOTAL | $ 8.407.370.800,92 |
| TOTAL COSTO DIRECTO | | | | | $ 30.012.594.001,92 | | | $ 44.904.866.429,52 | | $ 2.857.771.942,59 | | $ 1.718.076.526,60 | | $ 5.392.098.565,01 | | $ 37.446.298.157,79 |
| Administración 29% | | | | | $ 8.703.652.260,56 | | | $ 13.022.411.264,56 | | $ 828.753.863,35 | | $ 498.242.192,71 | | $ 1.563.708.583,85 | | $ 10.859.426.465,76 |
| Imprevistos 0% | | | | | $ - | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| Utilidad 5% | | | | | $ 1.500.629.700,10 | | | $ 2.245.243.321,48 | | $ 142.888.597,13 | | $ 85.903.826,33 | | $ 269.604.928,25 | | $ 1.872.314.907,89 |
| Costos Indirectos (AU 34%) | | | | | $ 10.204.281.960,65 | | | $ 15.267.654.586,05 | | $ 971.642.460,48 | | $ 584.146.019,04 | | $ 1.833.313.512,10 | | $ 12.731.741.373,65 |
| Valor total obras | | | | | $ 40.216.875.962,57 | | | $ 60.172.521.015,57 | | $ 3.829.414.403,07 | | $ 2.302.222.545,64 | | $ 7.225.412.077,11 | | $ 50.178.039.531,44 |
| Valor PMA | | | | | $ 86.972.260,00 | | | $ 231.972.260,00 | | $ 6.664.600,00 | | $ 21.767.042,24 | | $ 11.875.446,20 | | $ 198.847.706,20 |
| Administración 29% | | | | | $ 25.221.955,40 | | | $ 67.271.955,40 | | $ 1.932.734,00 | | $ 6.312.442,25 | | $ 3.443.879,40 | | $ 57.665.834,80 |

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 40.514.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,00 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,42% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |
| Valor total PMA | | | | | $ 112.194.215,40 | | | $ 299.244.215,40 | | $ 8.597.334,00 | | $ 28.079.484,49 | | $ 15.319.325,60 | | $ 256.513.541,00 |
| Valor PMT | | | | | $ 75.267.900,00 | | | $ 95.267.900,00 | | | | | | $ 12.959.969,00 | ✓ | $ 88.227.869,00 |
| Administración 29% | | | | | $ 21.827.691,00 | | | $ 27.627.691,00 | | $ - | | $ - | | $ 3.758.391,01 | | $ 25.586.082,01 |
| Valor total PMT | | | | | $ 97.095.591,00 | | | $ 122.895.591,00 | | $ - | | $ - | | $ 16.718.360,01 | | $ 113.813.951,01 |
| Valor ensayos y laboratorio | | | | | $ 68.132.049,64 | | | $ 68.132.049,64 | | $ 844.900,00 | | $ 2.011.100,00 | | $ 1.190.000,00 | | $ 58.394.661,38 |
| Administración 29% | | | | | $ 19.758.294,39 | | | $ 19.758.294,39 | | $ 245.021,00 | | $ 583.219,00 | | $ 345.100,00 | | $ 16.934.451,80 |
| Valor total ensayos y laboratorio | | | | | $ 87.890.344,03 | | | $ 87.890.344,03 | | $ 1.089.921,00 | | $ 2.594.319,00 | | $ 1.535.100,00 | | $ 75.329.113,18 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | | | | | $ 40.514.056.113,00 | | | $ 60.682.551.166,00 | | $ 3.839.101.658,07 | | $ 2.332.896.349,13 | | $ 7.258.984.862,72 | | $ 50.623.696.136,63 |

| SALDO POR EJECUTAR: | $ 10.058.855.029,37 |
|---|---|

26296

| Alcaldía de Bucaramanga | ANEXO No. 01 DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | Código: F-GDI-5000-238,37-038<br>Versión: 3.0<br>Fecha aprobación: Mayo-20-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**ANEXO AL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12 DEL CONTRATO DE OBRA No. 069 DE 2023**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.12**

**OBJETO : CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

| VALOR INICIAL (Incl. AU) : | $ 48.534.056.113,00 | | | VALOR ADICIONAL: | $ 20.168.495.053,09 | PERIODO DE COBRO: | 01 DE OCTUBRE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE 2025 | | PORCENTAJE DE EJECUCION (%): | 83,62% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES No. 07 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2026) | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 10 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 11 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 12 | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL | CANT | VALOR PARCIAL |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR PRESENTE ACTA | $ | 7.258.984.892,72 |
| % AMORTIZACIÓN | | 0,00% |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO | $ | - |
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO) : | $ | 7.258.984.892,72 |

1. El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.

2. El recibo por parte de la interventoria y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a cua hace referencia el citado contrato de obra.

**Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron**

Firma:
**Nombre: Gonzalo Cárdenas Orejarena**
**Contratista - R.L. Consorcio la Flora 2023**

Firma:
**Nombre: Alonso Vega Albino**
**Interventor - R.L. Consorcio interventoria canalización BGA**

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA 30-01-26
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Proyectó aspectos técnicos: Ing. Daniel A. Gómez Barragán – Consorcio la Flora 2023

Revisó: Ing. Julio Lozano - Consorcio interventoria canalización bga



Scanned with CamScanner

26300

BBVA
GOBIERNOS BUCARAMANGA
08 ABR 2026
AUX No 1
RECIBIDO
POR LEGALIZACIÓN

**SECRETARIA DE HACIENDA**
**DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
**ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES**
NIT 890.201.235-6

**( Recibo de recaudo No: 2502600239900 )**

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No. Documento: 901702490
Nombre:
Consorcio la flora 2023

**TRÁMITE**
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

**ESTAMPILLA-TASA IMPUESTO CONTRIBUCIÓN**
PRO HOSPITAL $5.800

| | |
|---|---|
| TOTAL | $5.800 |
| Ordenanza 018/2005 | $580 |
| **Total a pagar** | **$6.380** |

Con destino a:
Alcaldía de Bucaramanga

Fecha expedición: 2026/04/08
Fecha límite de pago: 2026/04/14

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.

RE-OP-07L

**SOPORTE TRÁMITE**

Hora Impr:2026/04/08 15:00:26

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA 30-04-26
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

| | CUADRO CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE CONTRATISTA<br>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Código: F-GDI-5000-238,37-097<br>Versión: 0.0<br>Fecha aprobación: Septiembre-19-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**CONTRATISTA**: CONSORCIO LA FLORA 2023
**NIT**: 901.706.924 – 1
**CONTRATO DE OBRA N° 069 DEL 14 DE ABRIL DEL 2023**
**OBJETO**: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

| NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA | CARGO | TIPO DE VINCULACION (Nomina, CPS, Otro) | SALARIO ($) | % DEDICACION | FECHA DE INGRESO | DIAS LABORADOS | MES FACTURADO | IBC(SEGÚN CONTRATO) | NUMERO DE PLANILLA | IBC (PAGADO) | SALUD | PENSION | ARL | CCF | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APARICIO SANCHEZ JHON ANDREY | 1098780561 | TOPÓGRAFO | NOMINA | $ 2.365.000 | 100% | 19/07/2023 | 30 | OCTUBRE | $ 2.365.000 | 9494977871 | $ 2.365.000 | $ 94.600 | $ 378.400 | $ 164.700 | $ 94.600 | $ 732.300 |
| BUITRAGO RÍOS JAIRO JAVIER | 9735010 | DIRECTOR DE OBRA | NOMINA | $ 7.000.000 | 100% | 22/08/2024 | 30 | OCTUBRE | $ 7.000.000 | 9494977871 | $ 7.000.000 | $ 280.000 | $ 1.190.000 | $ 487.200 | $ 280.000 | $ 2.237.200 |
| FERREIRA MORGADO JHON JAIRO | 13741016 | INGENIERO RESIDENTE | NOMINA | $ 3.500.000 | 100% | 1/10/2025 | 30 | OCTUBRE | $ 3.500.000 | 9494977871 | $ 3.500.000 | $ 140.000 | $ 560.000 | $ 243.600 | $ 140.000 | $ 1.083.600 |
| GOMEZ BARRAGAN DANIEL ALBERTO | 1095826837 | INGENIERO CIVIL | NOMINA | $ 3.547.000 | 100% | 26/04/2023 | 30 | OCTUBRE | $ 3.547.000 | 9494977871 | $ 3.547.000 | $ 141.900 | $ 567.600 | $ 246.900 | $ 141.900 | $ 1.098.300 |
| MORENO SANGUINO ANGIE LICETH | 1100894648 | TRABAJADORA SOCIAL | NOMINA | $ 3.000.000 | 100% | 12/05/2025 | 30 | OCTUBRE | $ 3.000.000 | 9494977871 | $ 3.000.000 | $ 120.000 | $ 480.000 | $ 208.800 | $ 120.000 | $ 928.800 |
| NAVARRO MURCIA EDUARD JAIVIER | 1098602734 | TOPOGRAFO | NOMINA | $ 2.720.000 | 100% | 26/04/2023 | 30 | OCTUBRE | $ 2.720.000 | 9494977871 | $ 2.720.000 | $ 108.800 | $ 435.200 | $ 189.400 | $ 108.800 | $ 842.200 |
| PALOMINO GUEVARA KAREN EUGENIA | 26863946 | HSEQ | NOMINA | $ 3.547.000 | 100% | 9/05/2023 | 30 | OCTUBRE | $ 3.547.000 | 9494977871 | $ 3.547.000 | $ 141.900 | $ 567.600 | $ 246.900 | $ 141.900 | $ 1.098.300 |
| QUINTERO HERNÁNDEZ DIEGO ANDRÉS | 13742977 | INGENIERO RESIDENTE | NOMINA | $ 4.139.000 | 100% | 26/05/2023 | 30 | OCTUBRE | $ 4.139.000 | 9494977871 | $ 4.139.000 | $ 165.600 | $ 662.300 | $ 288.100 | $ 165.600 | $ 1.281.600 |
| FABIAN ANDRÉS TAVERA GÓMEZ | 1095937018 | INGENIERO AMBIENTAL | NOMINA | $ 3.000.000 | 100% | 4/04/2024 | 30 | OCTUBRE | $ 3.000.000 | 9494977871 | $ 3.000.000 | $ 120.000 | $ 480.000 | $ 208.800 | $ 120.000 | $ 928.800 |
| VALENCIA PINZON EDWIN FERNANDO | 91494944 | ESP.GEOTECNICO | CPS | $ 2.150.000 | 50% | 1/05/2023 | 30 | OCTUBRE | $ 1.423.500 | 34908884 | $ 4.800.000 | $ 600.000 | $ 768.000 | $ 334.100 | $ 0 | $ 1.702.100 |
| SILVA CAMACHO LAURA TATIANA | 1096956702 | INGENIERA FORESTAL | CPS | $ 1.423.500 | 25% | 1/05/2023 | 30 | OCTUBRE | $ 1.423.500 | 35013413 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 227.800 | $ 7.500 | $ 0 | $ 413.300 |
| BERMUDEZ FLOREZ WILIAM FERNANDO | 91530295 | ESP. HIDRAÚLICO | CPS | $ 2.150.000 | 50% | 1/05/2023 | 30 | OCTUBRE | $ 1.423.500 | 9493443358 | $ 4.000.000 | $ 500.000 | $ 640.000 | $ 97.500 | $ 0 | $ 1.237.500 |
| GAITAN PRADA CARLOS ALFONSO | 1098672661 | ESP. ESTRUCTURAL | CPS | $ 2.150.000 | 50% | 1/05/2023 | 30 | OCTUBRE | $ 1.423.500 | 9493900106 | $ 2.800.000 | $ 350.000 | $ 448.000 | $ 14.700 | $ 0 | $ 812.700 |
| | | | | | | | | | | | $ 45.841.500 | $ 2.940.800 | $ 7.404.900 | $ 2.738.200 | $ 1.312.800 | |

IBC: Ingreso base de cotizacion

GONZALO CARDENAS OREJARENA
CONSORCIO LA FLORA 2023
REP. LEGAL

ALFONSO VEGA ALBINO
CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACION BGA
REP. LEGAL

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901702490 | 7 | CONSORCIO LA FLORA 2023 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | AV 4 N 6 N 67 OF 602 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6381213 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-11 | 1942412493 | 9494977871 | E | 2025/11/25 | 2025/11/20 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $22,396,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: PRINCIPAL (29 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $65,755,429 | $10,592,000 | | | $65,755,429 | $2,631,300 | | | $64,144,857 | $2,566,800 | | | $65,755,429 | | $4,465,700 | | $0 | $0 | | $20,255,800 |



2025/11/20 10:18 AM

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Trabajo: Principal (29 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $65,755,429 | $10,592,000 | | | $65,755,429 | $2,631,300 | | | $64,144,857 | $2,566,800 | | | $65,755,429 | | $4,465,700 | | $0 | $0 | | $20,255,800 |
| Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (29 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $65,755,429 | $10,592,000 | | | $65,755,429 | $2,631,300 | | | $64,144,857 | $2,566,800 | | | $65,755,429 | | $4,465,700 | | $0 | $0 | | $20,255,800 |
| 1 | CC | 1095916963 | ALMEYDA IVAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,365,097 | $378,500 | EPS005 | 30 | $2,365,097 | $94,700 | CCF40 | 30 | $2,365,097 | $94,700 | 14-7 | 30 | $2,365,097 | 6.960% | $164,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $732,600 |
| 2 | CC | 1098780561 | APARICIO JHON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $2,365,000 | $378,400 | EPS010 | 30 | $2,365,000 | $94,600 | CCF40 | 30 | $2,365,000 | $94,600 | 14-7 | 30 | $2,365,000 | 6.960% | $164,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $732,300 |
| 3 | CC | 1090491206 | ARREGOCES NELSON | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 1 | $66,667 | $10,700 | EPS002 | 1 | $66,667 | $2,700 | CCF40 | 1 | $69,445 | $2,800 | 14-7 | 1 | $66,667 | 6.960% | $4,700 | 1 | $0 | $0 | SI | $20,900 |
| 4 | CC | 1005154334 | ARRIETA BRAYAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,365,000 | $378,400 | EPS037 | 30 | $2,365,000 | $94,600 | CCF40 | 30 | $2,365,000 | $94,600 | 14-7 | 30 | $2,365,000 | 6.960% | $164,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $732,300 |
| 5 | CC | 19789132 | ARRIETA HUGO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,557,504 | $249,300 | EPS010 | 30 | $1,557,504 | $62,400 | CCF40 | 30 | $1,557,504 | $62,400 | 14-7 | 30 | $1,557,504 | 6.960% | $108,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $482,600 |
| 6 | CC | 91298725 | BARAJAS ALVARO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,303,504 | $368,600 | EPS002 | 30 | $2,303,504 | $92,200 | CCF40 | 30 | $2,303,504 | $92,200 | 14-7 | 30 | $2,303,504 | 6.960% | $160,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $713,400 |
| 7 | CC | 1135254103 | BECERRA JESUS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 4 | $189,867 | $30,400 | ESSC24 | 4 | $189,867 | $7,600 | CCF40 | 4 | $189,867 | $7,600 | 14-7 | 4 | $189,867 | 6.960% | $13,300 | 4 | $0 | $0 | SI | $58,900 |
| 8 | CC | 9735010 | BUITRAGO JAIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $7,000,000 | $1,190,000 | EPS005 | 30 | $7,000,000 | $280,000 | CCF40 | 30 | $7,000,000 | $280,000 | 14-7 | 30 | $7,000,000 | 6.960% | $487,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $2,237,200 |
| 9 | CC | 5010380 | CARVAJAL JAVIER | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23020 1 | 2 | $159,663 | $25,600 | EPS037 | 2 | $159,663 | $6,400 | CCF40 | 2 | $159,663 | $6,400 | 14-7 | 2 | $159,663 | 6.960% | $11,200 | 2 | $0 | $0 | SI | $49,600 |
| 10 | CC | 5010380 | CARVAJAL JAVIER | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 23020 1 | 28 | $1,328,600 | $212,600 | EPS037 | 28 | $1,328,600 | $53,200 | CCF40 | 0 | $0 | $0 | 14-7 | 28 | $1,328,600 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $265,800 |
| 11 | CC | 13741016 | FERREIRA JHON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $3,500,000 | $560,000 | EPS037 | 30 | $3,500,000 | $140,000 | CCF40 | 30 | $3,500,000 | $140,000 | 14-7 | 30 | $3,500,000 | 6.960% | $243,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,083,600 |
| 12 | CC | 1095826837 | GOMEZ DANIEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $3,547,000 | $567,600 | EPS005 | 30 | $3,547,000 | $141,900 | CCF40 | 30 | $3,547,000 | $141,900 | 14-7 | 30 | $3,547,000 | 6.960% | $246,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,098,300 |
| 13 | CC | 7600898 | GUERRA JORGE | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,553,458 | $248,600 | EPS002 | 30 | $1,553,458 | $62,200 | CCF40 | 30 | $1,553,458 | $62,200 | 14-7 | 30 | $1,553,458 | 6.960% | $108,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $481,200 |
| 14 | CC | 1095834868 | LANDAZABAL IVAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,682,917 | $269,300 | EPS005 | 30 | $1,682,917 | $67,400 | CCF40 | 30 | $1,682,917 | $67,400 | 14-7 | 30 | $1,682,917 | 6.960% | $117,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $521,300 |
| 15 | CC | 1003334373 | MACHUCA LUIS | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,634,370 | $261,500 | EPS002 | 30 | $1,634,370 | $65,400 | CCF40 | 30 | $1,634,370 | $65,400 | 14-7 | 30 | $1,634,370 | 6.960% | $113,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $506,100 |
| 16 | CC | 19768481 | MARTINEZ LUIS | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,634,370 | $261,500 | EPS037 | 30 | $1,634,370 | $65,400 | CCF40 | 30 | $1,634,370 | $65,400 | 14-7 | 30 | $1,634,370 | 6.960% | $113,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $506,100 |
| 17 | CC | 63451296 | MONOGA OLGA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23020 1 | 27 | $1,394,876 | $223,200 | EPS037 | 27 | $1,394,876 | $55,800 | CCF40 | 27 | $1,394,876 | $55,800 | 14-7 | 27 | $1,394,876 | 6.960% | $97,100 | 27 | $0 | $0 | SI | $431,900 |
| 18 | CC | 63451296 | MONOGA OLGA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 23020 1 | 1 | $47,467 | $7,600 | EPS037 | 1 | $47,467 | $1,900 | CCF40 | 0 | $0 | $0 | 14-7 | 1 | $47,467 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $9,500 |
| 19 | CC | 63451296 | MONOGA OLGA | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 23020 1 | 2 | $94,933 | $15,200 | EPS037 | 2 | $94,933 | $3,800 | CCF40 | 0 | $0 | $0 | 14-7 | 2 | $94,933 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $19,000 |
| 20 | CC | 1100894648 | MORENO ANGIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | EPS005 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | CCF40 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-7 | 30 | $3,000,000 | 6.960% | $208,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $928,800 |
| 21 | CC | 1098602734 | NAVARRO EDUARD | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,720,000 | $435,200 | EPS002 | 30 | $2,720,000 | $108,800 | CCF40 | 30 | $2,720,000 | $108,800 | 14-7 | 30 | $2,720,000 | 6.960% | $189,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $842,200 |
| 22 | CC | 1098720858 | PABON JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 27 | $1,281,600 | $205,100 | EPS002 | 27 | $1,281,600 | $51,300 | CCF40 | 27 | $1,281,600 | $51,300 | 14-7 | 27 | $1,281,600 | 6.960% | $89,200 | 27 | $0 | $0 | SI | $396,900 |
| 23 | CC | 1098720858 | PABON JOSE | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 23030 1 | 3 | $142,350 | $22,800 | EPS002 | 3 | $142,350 | $5,700 | CCF40 | 0 | $0 | $0 | 14-7 | 3 | $142,350 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $28,500 |
| 24 | CC | 26863946 | PALOMINO KAREN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $3,547,000 | $567,600 | EPS005 | 30 | $3,547,000 | $141,900 | CCF40 | 30 | $3,547,000 | $141,900 | 14-7 | 30 | $3,547,000 | 6.960% | $246,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,098,300 |
| 25 | CC | 13742977 | QUINTERO DIEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $4,139,000 | $662,300 | EPS037 | 30 | $4,139,000 | $165,600 | CCF40 | 30 | $4,139,000 | $165,600 | 14-7 | 30 | $4,139,000 | 6.960% | $288,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,281,600 |
| 26 | CC | 91527086 | QUINTERO GERARDO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,294,068 | $367,100 | EPS005 | 30 | $2,294,068 | $91,800 | CCF40 | 30 | $2,294,068 | $91,800 | 14-7 | 30 | $2,294,068 | 6.960% | $159,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $710,400 |
| 27 | CC | 5629152 | ROJAS PEDRO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,513,003 | $242,100 | EPS002 | 30 | $1,513,003 | $60,600 | CCF40 | 30 | $1,513,003 | $60,600 | 14-7 | 30 | $1,513,003 | 6.960% | $105,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $468,700 |
| 28 | CC | 1082838396 | SILVA GUSTAVO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,357,735 | $377,300 | EPS002 | 30 | $2,357,735 | $94,400 | CCF40 | 30 | $2,357,735 | $94,400 | 14-7 | 30 | $2,357,735 | 6.960% | $164,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $730,200 |
| 29 | CC | 17594632 | TABORDA ORLANDO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,328,141 | $372,600 | EPS005 | 30 | $2,328,141 | $93,200 | CCF40 | 30 | $2,328,141 | $93,200 | 14-7 | 30 | $2,328,141 | 6.960% | $162,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $721,100 |
| 30 | CC | 1095937018 | TAVERA FABIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | EPS005 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | CCF40 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-7 | 30 | $3,000,000 | 6.960% | $208,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $928,800 |
| 31 | CC | 91240282 | TORRES JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,424,000 | $227,900 | EPS002 | 30 | $1,424,000 | $57,000 | CCF40 | 30 | $1,424,000 | $57,000 | 14-7 | 30 | $1,424,000 | 6.960% | $99,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $441,100 |
| 32 | CC | 3983570 | TORRES LUIS | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,527,231 | $244,400 | EPS037 | 30 | $1,527,231 | $61,100 | CCF40 | 30 | $1,527,231 | $61,100 | 14-7 | 30 | $1,527,231 | 6.960% | $106,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $472,900 |
| 33 | CC | 19710847 | VILORIA ATANAEL | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,691,008 | $270,600 | EPS037 | 30 | $1,691,008 | $67,700 | CCF40 | 30 | $1,691,008 | $67,700 | 14-7 | 30 | $1,691,008 | 6.960% | $117,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $523,700 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,727,500 | $1,396,400 | | | $8,727,500 | $349,100 | | | $8,727,500 | $349,100 | | | $8,727,500 | | $45,900 | | $0 | $0 | | $2,146,500 |

PLANILLA PAGADA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)** | | | | | | | $8,727,500 | $1,396,400 | | | $8,727,500 | $349,100 | | | $8,727,500 | $349,100 | | | $8,727,500 | | $45,900 | | $0 | $0 | | $2,140,500 |
| Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados) | | | | | | | $8,727,500 | $1,396,400 | | | $8,727,500 | $349,100 | | | $8,727,500 | $349,100 | | | $8,727,500 | | $45,900 | | $0 | $0 | | $2,140,500 |
| 34 | CC | 1098804045 | CORTES SARAI | | 231001 | 30 | $1,650,000 | $264,000 | EPS010 | 30 | $1,650,000 | $66,000 | CCF40 | 30 | $1,650,000 | $66,000 | 14-7 | 30 | $1,650,000 | 0.522% | $8,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $404,700 |
| 35 | CC | 1090526122 | MARTINEZ ASTRID | | 230201 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS005 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF40 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-7 | 30 | $2,000,000 | 0.522% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $490,500 |
| 36 | CC | 87470664 | ORDOÑEZ BERNARDO | X | 25-14 | 9 | $750,000 | $120,000 | EPS010 | 9 | $750,000 | $30,000 | CCF40 | 9 | $750,000 | $30,000 | 14-7 | 9 | $750,000 | 0.522% | $4,000 | 9 | $0 | $0 | SI | $184,000 |
| 37 | CC | 91509603 | URIBE FELIPE | | 230201 | 30 | $2,727,500 | $436,400 | EPS010 | 30 | $2,727,500 | $109,100 | CCF40 | 30 | $2,727,500 | $109,100 | 14-7 | 30 | $2,727,500 | 0.522% | $14,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $668,900 |
| 38 | CC | 1005320989 | VALERO ZAIDY | | 25-14 | 30 | $1,600,000 | $256,000 | EPS005 | 30 | $1,600,000 | $64,000 | CCF40 | 30 | $1,600,000 | $64,000 | 14-7 | 30 | $1,600,000 | 0.522% | $8,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $392,400 |
| **Total** | **Afiliados( 34)** | | | | | | $74,482,929 | $11,988,400 | | | $74,482,929 | $2,980,400 | | | $72,872,357 | $2,915,900 | | | $74,482,929 | | $4,511,600 | | $0 | $0 | | $22,396,300 |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901702490 | 7 | CONSORCIO LA FLORA 2023 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | AV 4 N 6 N 67 OF 602 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6381213 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-11 | 1942412493 | 9494977871 | E | 2025/11/25 | 2025/11/20 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $22,396,300 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 34 | $11,988,400 | $0 | $0 | $11,988,400 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $1,454,000 | $0 | $0 | $1,454,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 7 | $2,264,500 | $0 | $0 | $2,264,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 16 | $5,141,300 | $0 | $0 | $5,141,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 9 | $3,128,600 | $0 | $0 | $3,128,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 34 | $4,511,600 | $0 | $0 | $4,511,600 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 34 | $4,511,600 | $0 | $0 | $4,511,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 34 | $2,915,900 | $0 | $0 | $2,915,900 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 34 | $2,915,900 | $0 | $0 | $2,915,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 34 | $2,980,400 | $0 | $0 | $2,980,400 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $7,600 | $0 | $0 | $7,600 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 5 | $362,100 | $0 | $0 | $362,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 8 | $715,500 | $0 | $0 | $715,500 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 9 | $600,300 | $0 | $0 | $600,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 11 | $1,294,900 | $0 | $0 | $1,294,900 |
| TOTAL | | | | 34 | $22,396,300 | $0 | $0 | $22,396,300 |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
## PLANILLA NRO. 34908884
## REFERENCIA DE PAGO (PIN):
## Fecha Pago Planilla: 2025-10-23

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | EDWIN FERNANDO VALENCIA PINZON | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 91494944 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | Independiente |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 30 22 200 APTO 402 EDIFICIO CAAVER | DEPARTAMENTO | SANTANDER | MUNICIPIO | FLORIDABLANCA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 8299 | CORREO ELECTRÓNICO | VALENCIAEDWIN@HOTMAIL.COM | TELÉFONO | 6392386 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 04 | NOMBRE SUCURSAL | 2025 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | POSITIVA | Tipo de aportante | Independiente |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2025 | Mes: 10 | Año: 2025 | Mes: 10 | Sucursal |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | $0 | | 34908884 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-91494944 | 57 | No | No | No | 68 | 276 | 0 | Salario | VALENCIA PINZON EDWIN FERNANDO | $4.800.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 91494944 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 91494944 | PORVENIR | 30 | $4.800.000 | 0.1600000 | $768.000 | $0 | $0 | $768.000 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 91494944 | SALUD MIA EPS | 30 | $4.800.000 | 0.1250000 | $600.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $4.800.000 | 9149444 | 0.0696000 | $334.100 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-91494944 | SIN CCF | 0 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 10 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PORVENIR | 1 | $768.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $768.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| SALUD MIA EPS | 1 | $600.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $600.000 | 0 | $0 | $0 | $600.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $600.000 | $0 | $0 | $600.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| POSITIVA | 1 | $334.100 | 0 | $0 | $0 | $334.100 | 0 | $0 | $334.100 | 0 | $0 | $0 | $334.100 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| SIN CCF | 1 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 1 | $600.000 |
| PENSIONES | 1 | $768.000 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $334.100 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 0 | $0 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $1.702.100 |

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | LAURA TATIANA SILVA CAMACHO |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1096956702 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2025-11-26 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-11-05 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-11-05 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO POPULAR |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-10 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-10 |
| NÚMERO PLANILLA: | 35013413 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 35013413 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 | $ 178.000 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | $ 227.800 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.500 | $ 7.500 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 413.300 | $ 413.300 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 02/12/2025 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 91530295 | | BERMUDEZ FLOREZ WILLIAM FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 21B No 115 116 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6047279 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-10 | 1868861721 | 9493443358 | I | 2025/11/26 | 2025/10/21 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,237,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 91530295 | BERMUDEZ FLOREZ WILLIAM FERNANDO | 230301 | 30 | $4,000,000 | $640,000 | EPS010 | 30 | $4,000,000 | $500,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $4,000,000 | $97,500 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $4,000,000 | $640,000 | | | $4,000,000 | $500,000 | | | $0 | $0 | | | $4,000,000 | $97,500 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $640,000 | $0 | $0 | $640,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $640,000 | $0 | $0 | $640,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $97,500 | $0 | $0 | $97,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $97,500 | $0 | $0 | $97,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $500,000 | $0 | $0 | $500,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $500,000 | $0 | $0 | $500,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $1,237,500 | $0 | $0 | $1,237,500 |



2025/10/23 07:55 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1098672661 | | GAITAN PRADA CARLOS ALFONSO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 31 -63 apto 907 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6175167 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-10 | 1930606944 | 9493900106 | I | 2025/11/18 | 2025/11/18 | BANCOLOMBIA | 0 | $812,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $2,800,000 | $448,000 | | | $2,800,000 | $350,000 | | | $0 | $0 | | | $2,800,000 | $14,700 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $2,800,000 | $448,000 | | | $2,800,000 | $350,000 | | | $0 | $0 | | | $2,800,000 | $14,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) | | | | | $2,800,000 | $448,000 | | | $2,800,000 | $350,000 | | | $0 | $0 | | | $2,800,000 | $14,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1098672661 | GAITAN CARLOS | 230301 | 30 | $2,800,000 | $448,000 | EPS010 | 30 | $2,800,000 | $350,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $2,800,000 | $14,700 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $2,800,000 | $448,000 | | | $2,800,000 | $350,000 | | | $0 | $0 | | | $2,800,000 | $14,700 | | $0 | $0 |

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA



2025/11/15 06:13 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1098672661 | | GAITAN PRADA CARLOS ALFONSO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 31 -63 apto 907 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6175167 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-10 | 1930606944 | 9493900106 | I | 2025/11/18 | 2025/11/18 | BANCOLOMBIA | 0 | $812,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $448,000 | $0 | $0 | $448,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $448,000 | $0 | $0 | $448,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $14,700 | $0 | $0 | $14,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $14,700 | $0 | $0 | $14,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $350,000 | $0 | $0 | $350,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $350,000 | $0 | $0 | $350,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $812,700 | $0 | $0 | $812,700 |

| | CUADRO CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE CONTRATISTA<br>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Código: F-GDI-5000-238,37-097<br>Versión: 0.0<br>Fecha aprobación: Septiembre-19-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**CONTRATISTA**: CONSORCIO LA FLORA 2023
**NIT**: 901.706.924 – 1
**CONTRATO DE OBRA N° 069 DEL 14 DE ABRIL DEL 2023**
**OBJETO**: CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

| NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA | CARGO | TIPO DE VINCULACION (Nomina, CPS, Otro) | SALARIO ($) | % DEDICACION | FECHA DE INGRESO | DIAS LABORADOS | MES FACTURADO | IBC(SEGÚN CONTRATO) | NUMERO DE PLANILLA | IBC (PAGADO) | SALUD | PENSION | ARL | CCF | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APARICIO SANCHEZ JHON ANDREY | 1098780561 | TOPÓGRAFO | NOMINA | $ 2.365.000 | 100% | 19/07/2023 | 30 | NOVIEMBRE | $ 2.365.000 | 9496259243 | $ 2.365.000 | $ 94.600 | $ 378.400 | $ 164.700 | $ 94.600 | $ 732.300 |
| BUITRAGO RÍOS JAIRO JAVIER | 9735010 | DIRECTOR DE OBRA | NOMINA | $ 7.000.000 | 100% | 22/08/2024 | 30 | NOVIEMBRE | $ 7.000.000 | 9496259243 | $ 7.000.000 | $ 280.000 | $ 1.190.000 | $ 487.200 | $ 280.000 | $ 2.237.200 |
| FERREIRA MORGADO JHON JAIRO | 13741016 | INGENIERO RESIDENTE | NOMINA | $ 3.500.000 | 100% | 1/10/2025 | 30 | NOVIEMBRE | $ 3.500.000 | 9496259243 | $ 3.500.000 | $ 140.000 | $ 560.000 | $ 243.600 | $ 140.000 | $ 1.083.600 |
| GOMEZ BARRAGAN DANIEL ALBERTO | 1095826837 | INGENIERO CIVIL | NOMINA | $ 3.547.000 | 100% | 26/04/2023 | 30 | NOVIEMBRE | $ 3.547.000 | 9496259243 | $ 3.547.000 | $ 141.900 | $ 567.600 | $ 246.900 | $ 141.900 | $ 1.098.300 |
| MORENO SANGUINO ANGIE LICETH | 1100894648 | TRABAJADORA SOCIAL | NOMINA | $ 3.000.000 | 100% | 12/05/2025 | 30 | NOVIEMBRE | $ 3.000.000 | 9496259243 | $ 3.000.000 | $ 120.000 | $ 480.000 | $ 208.800 | $ 120.000 | $ 928.800 |
| NAVARRO MURCIA EDUARD JAIVIER | 1098602734 | TOPOGRAFO | NOMINA | $ 2.720.000 | 100% | 26/04/2023 | 30 | NOVIEMBRE | $ 2.720.000 | 9496259243 | $ 2.720.000 | $ 108.800 | $ 435.200 | $ 189.400 | $ 108.800 | $ 842.200 |
| PALOMINO GUEVARA KAREN EUGENIA | 26863946 | HSEQ | NOMINA | $ 3.547.000 | 100% | 9/05/2023 | 30 | NOVIEMBRE | $ 3.547.000 | 9496259243 | $ 3.547.000 | $ 141.900 | $ 567.600 | $ 246.900 | $ 141.900 | $ 1.098.300 |
| QUINTERO HERNÁNDEZ DIEGO ANDRÉS | 13742977 | INGENIERO RESIDENTE | NOMINA | $ 4.139.000 | 100% | 26/05/2023 | 30 | NOVIEMBRE | $ 4.139.000 | 9496259243 | $ 4.139.000 | $ 165.600 | $ 662.300 | $ 288.100 | $ 165.600 | $ 1.281.600 |
| FABIAN ANDRÉS TAVERA GÓMEZ | 1095937018 | INGENIERO AMBIENTAL | NOMINA | $ 3.000.000 | 100% | 4/04/2024 | 30 | NOVIEMBRE | $ 3.000.000 | 9496259243 | $ 3.000.000 | $ 120.000 | $ 480.000 | $ 208.800 | $ 120.000 | $ 928.800 |
| VALENCIA PINZON EDWIN FERNANDO | 91494944 | ESP.GEOTECNICO | CPS | $ 2.150.000 | 50% | 1/05/2023 | 30 | NOVIEMBRE | $ 1.423.500 | 35134245 | $ 4.800.000 | $ 600.000 | $ 768.000 | $ 334.100 | $ 0 | $ 1.702.100 |
| SILVA CAMACHO LAURA TATIANA | 1096956702 | INGENIERA FORESTAL | CPS | $ 1.423.500 | 25% | 1/05/2023 | 30 | NOVIEMBRE | $ 1.423.500 | 35263677 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 227.800 | $ 7.500 | $ 0 | $ 413.300 |
| BERMUDEZ FLOREZ WILIAM FERNANDO | 91530295 | ESP. HIDRAÚLICO | CPS | $ 2.150.000 | 50% | 1/05/2023 | 30 | NOVIEMBRE | $ 1.423.500 | 9494866709 | $ 5.000.000 | $ 625.000 | $ 800.000 | $ 121.800 | $ 0 | $ 1.546.800 |
| GAITAN PRADA CARLOS ALFONSO | 1098672661 | ESP. ESTRUCTURAL | CPS | $ 2.150.000 | 50% | 1/05/2023 | 30 | NOVIEMBRE | $ 1.423.500 | 9495418401 | $ 2.800.000 | $ 350.000 | $ 448.000 | $ 14.700 | $ 0 | $ 812.700 |
| | | | | | | | | | | | $ 46.841.500 | $ 3.065.800 | $ 7.564.900 | $ 2.762.500 | $ 1.312.800 | |

IBC: Ingreso base de cotizacion

GONZALO CARDENAS OREJARENA
CONSORCIO LA FLORA 2023
REP. LEGAL

ALFONSO VEGA ALBINO
CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACION BGA
REP. LEGAL

aportes en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901702490 | 7 | CONSORCIO LA FLORA 2023 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | AV 4 N 6 N 67 OF 602 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6381213 | Si |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: PRINCIPAL (30 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $68,277,461 | $10,995,500 | | | $68,277,461 | $2,732,000 | | | $68,303,194 | $2,731,000 | | | $68,277,461 | | $4,750,200 | | $0 | $0 | | $21,208,700 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Trabajo: Principal (30 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $68,277,461 | $10,995,500 | | | $68,277,461 | $2,732,000 | | | $68,301,194 | $2,731,000 | | | $68,277,461 | | $4,750,200 | | $0 | $0 | | $21,208,700 |
| Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (30 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $68,277,461 | $10,995,500 | | | $68,277,461 | $2,732,000 | | | $68,301,194 | $2,731,000 | | | $68,277,461 | | $4,750,200 | | $0 | $0 | | $21,208,700 |
| 1 | CC | 1095916963 | ALMEYDA IVAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,278,867 | $364,700 | EPS005 | 30 | $2,278,867 | $91,200 | CCF40 | 30 | $2,278,867 | $91,200 | 14-7 | 30 | $2,278,867 | 6.960% | $158,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $705,800 |
| 2 | CC | 1098780561 | APARICIO JHON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $2,365,000 | $378,400 | EPS010 | 30 | $2,365,000 | $94,600 | CCF40 | 30 | $2,365,000 | $94,600 | 14-7 | 30 | $2,365,000 | 6.960% | $164,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $732,300 |
| 3 | CC | 1005154334 | ARRIETA BRAYAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,365,000 | $378,400 | EPS037 | 30 | $2,365,000 | $94,600 | CCF40 | 30 | $2,365,000 | $94,600 | 14-7 | 30 | $2,365,000 | 6.960% | $164,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $732,300 |
| 4 | CC | 19789132 | ARRIETA HUGO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,581,778 | $253,100 | EPS010 | 30 | $1,581,778 | $63,300 | CCF40 | 30 | $1,581,778 | $63,300 | 14-7 | 30 | $1,581,778 | 6.960% | $110,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $489,800 |
| 5 | CC | 91298725 | BARAJAS ALVARO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,285,026 | $365,700 | EPS002 | 30 | $2,285,026 | $91,500 | CCF40 | 30 | $2,285,026 | $91,500 | 14-7 | 30 | $2,285,026 | 6.960% | $159,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $707,800 |
| 6 | CC | 1135254103 | BECERRA JESUS | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,496,821 | $239,500 | ESSC24 | 30 | $1,496,821 | $59,900 | CCF40 | 30 | $1,496,821 | $59,900 | 14-7 | 30 | $1,496,821 | 6.960% | $104,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $463,500 |
| 7 | CC | 9735010 | BUITRAGO JAIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $7,000,000 | $1,190,000 | EPS005 | 30 | $7,000,000 | $280,000 | CCF40 | 30 | $7,000,000 | $280,000 | 14-7 | 30 | $7,000,000 | 6.960% | $487,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $2,237,200 |
| 8 | CC | 5010380 | CARVAJAL JAVIER | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230201 | 1 | $47,450 | $7,600 | EPS037 | 1 | $47,450 | $1,900 | CCF40 | 1 | $47,450 | $0 | 14-7 | 1 | $47,450 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | Si | $9,500 |
| 9 | CC | 5010380 | CARVAJAL JAVIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 29 | $1,376,534 | $220,300 | EPS037 | 29 | $1,376,534 | $55,100 | CCF40 | 29 | $1,376,534 | $55,100 | 14-7 | 29 | $1,376,534 | 6.960% | $95,900 | 29 | $0 | $0 | Si | $426,400 |
| 10 | CC | 1007690411 | ESCAMILLA LUIS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 20 | $1,333,334 | $213,400 | EPS037 | 20 | $1,333,334 | $53,400 | CCF40 | 20 | $1,333,334 | $53,400 | 14-7 | 20 | $1,333,334 | 6.960% | $92,900 | 20 | $0 | $0 | Si | $413,100 |
| 11 | CC | 13741016 | FERREIRA JHON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,500,000 | $560,000 | EPS037 | 30 | $3,500,000 | $140,000 | CCF40 | 30 | $3,500,000 | $140,000 | 14-7 | 30 | $3,500,000 | 6.960% | $243,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,083,600 |
| 12 | CC | 1095826837 | GOMEZ DANIEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $3,547,000 | $567,600 | EPS005 | 30 | $3,547,000 | $141,900 | CCF40 | 30 | $3,547,000 | $141,900 | 14-7 | 30 | $3,547,000 | 6.960% | $246,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,098,300 |
| 13 | CC | 7600898 | GUERRA JORGE | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,521,094 | $243,400 | EPS002 | 30 | $1,521,094 | $60,900 | CCF40 | 30 | $1,521,094 | $60,900 | 14-7 | 30 | $1,521,094 | 6.960% | $105,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $471,100 |
| 14 | CC | 1095834868 | LANDAZABAL IVAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,589,869 | $254,400 | EPS005 | 30 | $1,589,869 | $63,600 | CCF40 | 30 | $1,589,869 | $63,600 | 14-7 | 30 | $1,589,869 | 6.960% | $110,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $492,300 |
| 15 | CC | 1003334373 | MACHUCA LUIS | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,602,006 | $256,400 | EPS002 | 30 | $1,602,006 | $64,100 | CCF40 | 30 | $1,602,006 | $64,100 | 14-7 | 30 | $1,602,006 | 6.960% | $111,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $496,100 |
| 16 | CC | 19768481 | MARTINEZ LUIS | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,634,370 | $261,500 | EPS037 | 30 | $1,634,370 | $65,400 | CCF40 | 30 | $1,634,370 | $65,400 | 14-7 | 30 | $1,634,370 | 6.960% | $113,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $506,100 |
| 17 | CC | 63451296 | MONOGA OLGA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,642,461 | $262,800 | EPS037 | 30 | $1,642,461 | $65,700 | CCF40 | 30 | $1,642,461 | $65,700 | 14-7 | 30 | $1,642,461 | 6.960% | $114,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $508,600 |
| 18 | CC | 1100894648 | MORENO ANGIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | EPS005 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | CCF40 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-7 | 30 | $3,000,000 | 6.960% | $208,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $928,800 |
| 19 | CC | 1098602734 | NAVARRO EDUARD | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,720,000 | $435,200 | EPS002 | 30 | $2,720,000 | $108,800 | CCF40 | 30 | $2,720,000 | $108,800 | 14-7 | 30 | $2,720,000 | 6.960% | $189,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $842,200 |
| 20 | CC | 1098720858 | PABON JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,424,000 | $227,900 | EPS002 | 30 | $1,424,000 | $57,000 | CCF40 | 30 | $1,424,000 | $57,000 | 14-7 | 30 | $1,424,000 | 6.960% | $99,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $441,100 |
| 21 | CC | 26863946 | PALOMINO KAREN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $3,547,000 | $567,600 | EPS005 | 30 | $3,547,000 | $141,900 | CCF40 | 30 | $3,547,000 | $141,900 | 14-7 | 30 | $3,547,000 | 6.960% | $246,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,098,300 |
| 22 | CC | 1095801916 | PINZON JHON | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | X | 230301 | 12 | $585,782 | $93,800 | EPS041 | 12 | $585,782 | $23,500 | CCF40 | 12 | $609,515 | $24,400 | 14-7 | 12 | $585,782 | 6.960% | $40,800 | 12 | $0 | $0 | Si | $182,500 |
| 23 | CC | 13742977 | QUINTERO DIEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $4,139,000 | $662,300 | EPS037 | 30 | $4,139,000 | $165,600 | CCF40 | 30 | $4,139,000 | $165,600 | 14-7 | 30 | $4,139,000 | 6.960% | $288,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,281,600 |
| 24 | CC | 91527086 | QUINTERO GERARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,987,000 | $318,000 | EPS005 | 30 | $1,987,000 | $79,500 | CCF40 | 30 | $1,987,000 | $79,500 | 14-7 | 30 | $1,987,000 | 6.960% | $138,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $615,300 |
| 25 | CC | 5629152 | ROJAS PEDRO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,537,277 | $246,000 | EPS002 | 30 | $1,537,277 | $61,500 | CCF40 | 30 | $1,537,277 | $61,500 | 14-7 | 30 | $1,537,277 | 6.960% | $107,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $476,000 |
| 26 | CC | 1082838396 | SILVA GUSTAVO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,315,415 | $370,500 | EPS002 | 30 | $2,315,415 | $92,700 | CCF40 | 30 | $2,315,415 | $92,700 | 14-7 | 30 | $2,315,415 | 6.960% | $161,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $717,100 |
| 27 | CC | 17594632 | TABORDA ORLANDO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,352,779 | $376,500 | EPS005 | 30 | $2,352,779 | $94,200 | CCF40 | 30 | $2,352,779 | $94,200 | 14-7 | 30 | $2,352,779 | 6.960% | $163,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $728,700 |
| 28 | CC | 1095937018 | TAVERA FABIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | EPS005 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | CCF40 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-7 | 30 | $3,000,000 | 6.960% | $208,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $928,800 |
| 29 | CC | 91240282 | TORRES JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,424,000 | $227,900 | EPS002 | 30 | $1,424,000 | $57,000 | CCF40 | 30 | $1,424,000 | $57,000 | 14-7 | 30 | $1,424,000 | 6.960% | $99,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $441,100 |
| 30 | CC | 3983570 | TORRES LUIS | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,504,912 | $240,800 | EPS037 | 30 | $1,504,912 | $60,200 | CCF40 | 30 | $1,504,912 | $60,200 | 14-7 | 30 | $1,504,912 | 6.960% | $104,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $466,000 |
| 31 | CC | 19710847 | VILORIA ATANAEL | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,573,686 | $251,800 | EPS037 | 30 | $1,573,686 | $63,000 | CCF40 | 30 | $1,573,686 | $63,000 | 14-7 | 30 | $1,573,686 | 6.960% | $109,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $487,400 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $10,477,500 | $1,676,400 | | | $10,477,500 | $419,100 | | | $10,477,500 | $419,100 | | | $10,477,500 | | $55,000 | | $0 | $0 | | $2,569,600 |

PLANILLA PAGADA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $10,477,500 | $1,676,400 | | | $10,477,500 | $419,100 | | | $10,477,500 | $419,100 | | | $10,477,500 | | $55,000 | | $0 | $0 | | $2,569,600 |
| Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $10,477,500 | $1,676,400 | | | $10,477,500 | $419,100 | | | $10,477,500 | $419,100 | | | $10,477,500 | | $55,000 | | $0 | $0 | | $2,569,600 |
| 32 | CC | 1098804045 | CORTES SARAI | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $1,650,000 | $264,000 | EPS010 | 30 | $1,650,000 | $66,000 | CCF40 | 30 | $1,650,000 | $66,000 | 14-7 | 30 | $1,650,000 | 0.522% | $8,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $404,700 |
| 33 | CC | 1090526122 | MARTINEZ ASTRID | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS005 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF40 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-7 | 30 | $2,000,000 | 0.522% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $490,500 |
| 34 | CC | 87470664 | ORDOÑEZ BERNARDO | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,500,000 | $400,000 | EPS010 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | CCF40 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | 14-7 | 30 | $2,500,000 | 0.522% | $13,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $613,100 |
| 35 | CC | 91509603 | URIBE FELIPE | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $2,727,500 | $436,400 | EPS010 | 30 | $2,727,500 | $109,100 | CCF40 | 30 | $2,727,500 | $109,100 | 14-7 | 30 | $2,727,500 | 0.522% | $14,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $668,900 |
| 36 | CC | 1005320989 | VALERO ZAIDY | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,600,000 | $256,000 | EPS005 | 30 | $1,600,000 | $64,000 | CCF40 | 30 | $1,600,000 | $64,000 | 14-7 | 30 | $1,600,000 | 0.522% | $8,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $392,400 |
| **Total** | | | **Afiliados( 35)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | $78,754,961 | $12,671,900 | | | $78,754,961 | $3,151,100 | | | $78,778,694 | $3,150,100 | | | $78,754,961 | | $4,805,200 | | $0 | $0 | | $23,778,300 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-12 | 1997219938 | 9496259243 | E | 2025/12/22 | 2025/12/10 | BANCO ITAU | 0 | $23,778,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 35 | $12,671,900 | $0 | $0 | $12,671,900 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $1,454,000 | $0 | $0 | $1,454,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 7 | $2,538,000 | $0 | $0 | $2,538,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 16 | $5,118,500 | $0 | $0 | $5,118,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 10 | $3,561,400 | $0 | $0 | $3,561,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 35 | $4,805,200 | $0 | $0 | $4,805,200 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 35 | $4,805,200 | $0 | $0 | $4,805,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 35 | $3,150,100 | $0 | $0 | $3,150,100 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 35 | $3,150,100 | $0 | $0 | $3,150,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 35 | $3,151,100 | $0 | $0 | $3,151,100 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $59,900 | $0 | $0 | $59,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 5 | $433,000 | $0 | $0 | $433,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 9 | $764,900 | $0 | $0 | $764,900 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $23,500 | $0 | $0 | $23,500 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 8 | $593,500 | $0 | $0 | $593,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 11 | $1,276,300 | $0 | $0 | $1,276,300 |
| TOTAL | | | | 35 | $23,778,300 | $0 | $0 | $23,778,300 |

ASOPAGOS s.a.

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
## PLANILLA NRO. 35134245
## REFERENCIA DE PAGO (PIN):
## Fecha Pago Planilla: 2025-11-25

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | EDWIN FERNANDO VALENCIA PINZON | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 91494944 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | Independiente |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 30 22 200 APTO 402 EDIFICIO CAAVER | DEPARTAMENTO | SANTANDER | MUNICIPIO | FLORIDABLANCA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 8299 | CORREO ELECTRÓNICO | VALENCIAEDWIN@HOTMAIL.COM | TELÉFONO | 6392386 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 04 | NOMBRE SUCURSAL | 2025 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | POSITIVA | Tipo de aportante | Independiente |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2025 | Mes: 11 | Año: 2025 | Mes: 11 | Sucursal |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | $0 | | 35134245 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Extno obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-91494944 | 57 | No | No | No | 68 | 276 | 0 | Salario | VALENCIA PINZON EDWIN FERNANDO | $4.800.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 91494944 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 91494944 | PORVENIR | 30 | $4.800.000 | 0.1600000 | $768.000 | $0 | $0 | $768.000 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 91494944 | SALUD MIA EPS | 30 | $4.800.000 | 0.1250000 | $600.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $4.800.000 | 91494944 | 0.0696000 | $334.100 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-91494944 | SIN CCF | 0 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PORVENIR | 1 | $768.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $768.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| SALUD MIA EPS | 1 | $600.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $600.000 | 0 | $0 | $0 | $600.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $600.000 | $0 | $0 | $600.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| POSITIVA | 1 | $334.100 | 0 | $0 | $0 | $334.100 | 0 | $0 | $334.100 | 0 | $0 | $0 | $334.100 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| SIN CCF | 1 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 1 | $600.000 |
| PENSIONES | 1 | $768.000 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $334.100 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 0 | $0 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $1.702.100 |

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | LAURA TATIANA SILVA CAMACHO |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1096956702 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2025-11-26 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-12-02 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-11-27 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO POPULAR |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-11 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-11 |
| NÚMERO PLANILLA: | 35263677 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 35263677 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 | $ 178.000 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | $ 227.800 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.500 | $ 7.500 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 413.300 | $ 413.300 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 05/01/2026 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 91530295 | | BERMUDEZ FLOREZ WILLIAM FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 21B No 115 116 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6047279 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-11 | 1939118540 | 9494866709 | I | 2025/12/23 | 2025/11/19 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,546,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 91530295 | BERMUDEZ FLOREZ WILLIAM FERNANDO | 230301 | 30 | $5,000,000 | $800,000 | EPS010 | 30 | $5,000,000 | $625,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $5,000,000 | $121,800 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $5,000,000 | $800,000 | | | $5,000,000 | $625,000 | | | $0 | $0 | | | $5,000,000 | $121,800 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $800,000 | $0 | $0 | $800,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $800,000 | $0 | $0 | $800,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $121,800 | $0 | $0 | $121,800 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $121,800 | $0 | $0 | $121,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $625,000 | $0 | $0 | $625,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $625,000 | $0 | $0 | $625,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $1,546,800 | $0 | $0 | $1,546,800 |



2025/11/20 07:55 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1098672661 | | GAITAN PRADA CARLOS ALFONSO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 31 -63 apto 907 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6175167 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-11 | 1978041673 | 9495418401 | I | 2025/12/15 | 2025/12/03 | BANCOLOMBIA | 0 | $812,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $2,800,000 | $448,000 | | | $2,800,000 | $350,000 | | | $0 | $0 | | | $2,800,000 | $14,700 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | **$2,800,000** | **$448,000** | | | **$2,800,000** | **$350,000** | | | **$0** | **$0** | | | **$2,800,000** | **$14,700** | | **$0** | **$0** |
| Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) | | | | | **$2,800,000** | **$448,000** | | | **$2,800,000** | **$350,000** | | | **$0** | **$0** | | | **$2,800,000** | **$14,700** | | **$0** | **$0** |
| 1 | CC 1098672661 | GAITAN CARLOS | 230301 | 30 | $2,800,000 | $448,000 | EPS010 | 30 | $2,800,000 | $350,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $2,800,000 | $14,700 | 0 | $0 | $0 |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | **$2,800,000** | **$448,000** | | | **$2,800,000** | **$350,000** | | | **$0** | **$0** | | | **$2,800,000** | **$14,700** | | **$0** | **$0** |



2025/12/03 09:17 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1098672661 | | GAITAN PRADA CARLOS ALFONSO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 31 -63 apto 907 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6175167 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-11 | 1978041673 | 9495418401 | I | 2025/12/15 | 2025/12/03 | BANCOLOMBIA | 0 | $812,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $448,000 | $0 | $0 | $448,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $448,000 | $0 | $0 | $448,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $14,700 | $0 | $0 | $14,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $14,700 | $0 | $0 | $14,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $350,000 | $0 | $0 | $350,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $350,000 | $0 | $0 | $350,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $812,700 | $0 | $0 | $812,700 |

| | CUADRO CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE CONTRATISTA<br>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Código: F-GDI-5000-238,37-097<br>Versión: 0.0<br>Fecha aprobación: Septiembre-19-2019<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

**CONTRATISTA:** CONSORCIO LA FLORA 2023
**NIT:** 901.706.924 – 1
**CONTRATO DE OBRA N° 069 DEL 14 DE ABRIL DEL 2023**
**OBJETO:** CONSTRUCCION CANALIZACION DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

| NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA | CARGO | TIPO DE VINCULACION (Nomina, CPS, Otro) | SALARIO ($) | % DEDICACION | FECHA DE INGRESO | DIAS LABORADOS | MES FACTURADO | IBC(SEGÚN CONTRATO) | NUMERO DE PLANILLA | IBC (PAGADO) | SALUD | PENSION | ARL | CCF | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APARICIO SANCHEZ JHON ANDREY | 1098780561 | TOPÓGRAFO | NOMINA | $ 2.365.000 | 100% | 19/07/2023 | 30 | DICIEMBRE | $ 2.365.000 | 9498124474 | $ 2.365.000 | $ 94.600 | $ 378.400 | $ 164.700 | $ 94.600 | $ 732.300 |
| BUITRAGO RÍOS JAIRO JAVIER | 9735010 | DIRECTOR DE OBRA | NOMINA | $ 7.000.000 | 100% | 22/08/2024 | 30 | DICIEMBRE | $ 7.000.000 | 9498124474 | $ 7.000.000 | $ 280.000 | $ 1.190.000 | $ 487.200 | $ 280.000 | $ 2.237.200 |
| FERREIRA MORGADO JHON JAIRO | 13741016 | INGENIERO RESIDENTE | NOMINA | $ 3.500.000 | 100% | 1/10/2025 | 30 | DICIEMBRE | $ 3.500.000 | 9498124474 | $ 3.500.000 | $ 140.000 | $ 560.000 | $ 243.600 | $ 140.000 | $ 1.083.600 |
| GOMEZ BARRAGAN DANIEL ALBERTO | 1095826837 | INGENIERO CIVIL | NOMINA | $ 3.547.000 | 100% | 26/04/2023 | 30 | DICIEMBRE | $ 3.547.000 | 9498124474 | $ 3.547.001 | $ 142.000 | $ 567.600 | $ 205.800 | $ 142.000 | $ 1.057.400 |
| MORENO SANGUINO ANGIE LICETH | 1100894648 | TRABAJADORA SOCIAL | NOMINA | $ 3.000.000 | 100% | 12/05/2025 | 30 | DICIEMBRE | $ 3.000.000 | 9498124474 | $ 3.000.000 | $ 120.000 | $ 480.000 | $ 208.800 | $ 120.000 | $ 928.800 |
| NAVARRO MURCIA EDUARD JAIVIER | 1098602734 | TOPOGRAFO | NOMINA | $ 2.720.000 | 100% | 26/04/2023 | 30 | DICIEMBRE | $ 2.720.000 | 9498124474 | $ 2.720.000 | $ 108.800 | $ 435.200 | $ 189.400 | $ 108.800 | $ 842.200 |
| PALOMINO GUEVARA KAREN EUGENIA | 26863946 | HSEQ | NOMINA | $ 3.547.000 | 100% | 9/05/2023 | 30 | DICIEMBRE | $ 3.547.000 | 9498124474 | $ 3.547.000 | $ 141.900 | $ 567.600 | $ 246.900 | $ 141.900 | $ 1.098.300 |
| QUINTERO HERNÁNDEZ DIEGO ANDRÉS | 13742977 | INGENIERO RESIDENTE | NOMINA | $ 4.139.000 | 100% | 26/05/2023 | 30 | DICIEMBRE | $ 4.139.000 | 9498124474 | $ 4.139.000 | $ 165.600 | $ 662.300 | $ 288.100 | $ 165.600 | $ 1.281.600 |
| FABIAN ANDRÉS TAVERA GÓMEZ | 1095937018 | INGENIERO AMBIENTAL | NOMINA | $ 3.000.000 | 100% | 4/04/2024 | 30 | DICIEMBRE | $ 3.000.000 | 9498124474 | $ 3.000.000 | $ 120.000 | $ 480.000 | $ 208.800 | $ 120.000 | $ 928.800 |
| VALENCIA PINZON EDWIN FERNANDO | 91494944 | ESP.GEOTECNICO | CPS | $ 2.150.000 | 50% | 1/05/2023 | 30 | DICIEMBRE | $ 1.423.500 | 35747885 | $ 2.720.000 | $ 340.000 | $ 435.200 | $ 189.400 | $ 0 | $ 964.600 |
| SILVA CAMACHO LAURA TATIANA | 1096956702 | INGENIERA FORESTAL | CPS | $ 1.423.500 | 25% | 1/05/2023 | 30 | DICIEMBRE | $ 1.423.500 | 35501081 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 227.800 | $ 7.500 | $ 0 | $ 413.300 |
| BERMUDEZ FLOREZ WILIAM FERNANDO | 91530295 | ESP. HIDRAÚLICO | CPS | $ 2.150.000 | 50% | 1/05/2023 | 30 | DICIEMBRE | $ 1.423.500 | 9495974893 | $ 5.000.000 | $ 625.000 | $ 800.000 | $ 121.800 | $ 0 | $ 1.546.800 |
| GAITAN PRADA CARLOS ALFONSO | 1098672661 | ESP. ESTRUCTURAL | CPS | $ 2.150.000 | 50% | 1/05/2023 | 30 | DICIEMBRE | $ 1.423.500 | 9496476178 | $ 2.800.000 | $ 350.000 | $ 448.000 | $ 14.700 | $ 0 | $ 812.700 |
| | | | | | | | | | | | $ 44.761.501 | $ 2.805.900 | $ 7.232.100 | $ 2.576.700 | $ 1.312.900 | |

IBC: Ingreso base de cotizacion

GONZALO CARDENAS OREJARENA
CONSORCIO LA FLORA 2023
REP. LEGAL

ALFONSO VEGA ALBINO
CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACION BGA
REP. LEGAL

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901702490 | 7 | CONSORCIO LA FLORA 2023 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | AV 4 N 6 N 67 OF 602 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6381213 | Si |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-12 | 2026-01 | 2094632277 | 9498124474 | E | 2026/01/23 | 2026/01/19 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $23,319,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: PRINCIPAL (29 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $66,994,615 | $10,790,300 | | | $66,994,615 | $2,680,900 | | | $67,121,193 | $2,685,900 | | | $66,994,615 | | $4,593,300 | | $0 | $0 | | $20,750,400 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Trabajo: Principal (29 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $66,994,615 | $10,790,300 | | | $66,994,615 | $2,680,900 | | | $67,121,193 | $2,685,900 | | | $66,994,615 | | $4,593,300 | | $0 | $0 | | $20,750,400 |
| Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (29 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $66,994,615 | $10,790,300 | | | $66,994,615 | $2,680,900 | | | $67,121,193 | $2,685,900 | | | $66,994,615 | | $4,593,300 | | $0 | $0 | | $20,750,400 |
| 1 | CC | 1095916963 | ALMEYDA IVAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,174,159 | $347,900 | EPS005 | 30 | $2,174,159 | $87,000 | CCF40 | 30 | $2,174,159 | $87,000 | 14-7 | 30 | $2,174,159 | 6.960% | $151,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $673,300 |
| 2 | CC | 1098780561 | APARICIO JHON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $2,365,000 | $378,400 | EPS010 | 30 | $2,365,000 | $94,600 | CCF40 | 30 | $2,365,000 | $94,600 | 14-7 | 30 | $2,365,000 | 6.960% | $164,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $732,300 |
| 3 | CC | 1005154334 | ARRIETA BRAYAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,365,000 | $378,400 | EPS037 | 30 | $2,365,000 | $94,600 | CCF40 | 30 | $2,365,000 | $94,600 | 14-7 | 30 | $2,365,000 | 6.960% | $164,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $732,300 |
| 4 | CC | 19789132 | ARRIETA HUGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,424,000 | $227,900 | EPS010 | 30 | $1,424,000 | $57,000 | CCF40 | 30 | $1,424,000 | $57,000 | 14-7 | 30 | $1,424,000 | 6.960% | $99,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $441,100 |
| 5 | CC | 91298725 | BARAJAS ALVARO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,235,752 | $357,800 | EPS002 | 30 | $2,235,752 | $89,500 | CCF40 | 30 | $2,235,752 | $89,500 | 14-7 | 30 | $2,235,752 | 6.960% | $155,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $692,500 |
| 6 | CC | 1135254103 | BECERRA JESUS | | X | | | | | | | X | | | | | | | | X | 230201 | 30 | $1,428,046 | $228,500 | ESSC24 | 30 | $1,428,046 | $57,200 | CCF40 | 30 | $1,554,624 | $62,200 | 14-7 | 30 | $1,428,046 | 6.960% | $99,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $447,300 |
| 7 | CC | 9735010 | BUITRAGO JAIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $7,000,000 | $1,190,000 | EPS005 | 30 | $7,000,000 | $280,000 | CCF40 | 30 | $7,000,000 | $280,000 | 14-7 | 30 | $7,000,000 | 6.960% | $487,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $2,237,200 |
| 8 | CC | 5010380 | CARVAJAL JAVIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,424,000 | $227,900 | EPS037 | 30 | $1,424,000 | $57,000 | CCF40 | 30 | $1,424,000 | $57,000 | 14-7 | 30 | $1,424,000 | 6.960% | $99,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $441,100 |
| 9 | CC | 1007690411 | ESCAMILLA LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS037 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF40 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-7 | 30 | $2,000,000 | 6.960% | $139,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $619,200 |
| 10 | CC | 13741016 | FERREIRA JHON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,500,000 | $560,000 | EPS037 | 30 | $3,500,000 | $140,000 | CCF40 | 30 | $3,500,000 | $140,000 | 14-7 | 30 | $3,500,000 | 6.960% | $243,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,083,600 |
| 11 | CC | 1095826837 | GOMEZ DANIEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 25 | $2,955,834 | $473,000 | EPS005 | 25 | $2,955,834 | $118,300 | CCF40 | 25 | $2,955,834 | $118,300 | 14-7 | 25 | $2,955,834 | 6.960% | $205,800 | 25 | $0 | $0 | Si | $915,400 |
| 12 | CC | 1095826837 | GOMEZ DANIEL | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 5 | $591,167 | $94,600 | EPS005 | 5 | $591,167 | $23,700 | CCF40 | 5 | $591,167 | $23,700 | 14-7 | 5 | $591,167 | 0.000% | $0 | 5 | $0 | $0 | Si | $142,000 |
| 13 | CC | 7600898 | GUERRA JORGE | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,529,185 | $244,700 | EPS002 | 30 | $1,529,185 | $61,200 | CCF40 | 30 | $1,529,185 | $61,200 | 14-7 | 30 | $1,529,185 | 6.960% | $106,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $473,600 |
| 14 | CC | 1095834868 | LANDAZABAL IVAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,444,228 | $231,100 | EPS005 | 30 | $1,444,228 | $57,800 | CCF40 | 30 | $1,444,228 | $57,800 | 14-7 | 30 | $1,444,228 | 6.960% | $100,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $447,300 |
| 15 | CC | 1003334373 | MACHUCA LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,424,000 | $227,900 | EPS002 | 30 | $1,424,000 | $57,000 | CCF40 | 30 | $1,424,000 | $57,000 | 14-7 | 30 | $1,424,000 | 6.960% | $99,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $441,100 |
| 16 | CC | 19768481 | MARTINEZ LUIS | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,448,274 | $231,800 | EPS037 | 30 | $1,448,274 | $58,000 | CCF40 | 30 | $1,448,274 | $58,000 | 14-7 | 30 | $1,448,274 | 6.960% | $100,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $448,600 |
| 17 | CC | 63451296 | MONOGA OLGA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,751,692 | $280,300 | EPS037 | 30 | $1,751,692 | $70,100 | CCF40 | 30 | $1,751,692 | $70,100 | 14-7 | 30 | $1,751,692 | 6.960% | $122,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $542,500 |
| 18 | CC | 1100894648 | MORENO ANGIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | EPS005 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | CCF40 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-7 | 30 | $3,000,000 | 6.960% | $208,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $928,800 |
| 19 | CC | 1098602734 | NAVARRO EDUARD | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,720,000 | $435,200 | EPS002 | 30 | $2,720,000 | $108,800 | CCF40 | 30 | $2,720,000 | $108,800 | 14-7 | 30 | $2,720,000 | 6.960% | $189,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $842,200 |
| 20 | CC | 1098720858 | PABON JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 21 | $996,800 | $159,500 | EPS002 | 21 | $996,800 | $39,900 | CCF40 | 21 | $996,800 | $39,900 | 14-7 | 21 | $996,800 | 6.960% | $69,400 | 21 | $0 | $0 | Si | $308,700 |
| 21 | CC | 1098720858 | PABON JOSE | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 9 | $427,200 | $68,400 | EPS002 | 9 | $427,200 | $17,100 | CCF40 | 9 | $427,200 | $17,100 | 14-7 | 9 | $427,200 | 0.000% | $0 | 9 | $0 | $0 | Si | $102,600 |
| 22 | CC | 26863946 | PALOMINO KAREN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $3,547,000 | $567,600 | EPS005 | 30 | $3,547,000 | $141,900 | CCF40 | 30 | $3,547,000 | $141,900 | 14-7 | 30 | $3,547,000 | 6.960% | $246,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,098,300 |
| 23 | CC | 13742977 | QUINTERO DIEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $4,139,000 | $662,300 | EPS037 | 30 | $4,139,000 | $165,600 | CCF40 | 30 | $4,139,000 | $165,600 | 14-7 | 30 | $4,139,000 | 6.960% | $288,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,281,600 |
| 24 | CC | 91527086 | QUINTERO GERARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,987,000 | $318,000 | EPS005 | 30 | $1,987,000 | $79,500 | CCF40 | 30 | $1,987,000 | $79,500 | 14-7 | 30 | $1,987,000 | 6.960% | $138,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $615,300 |
| 25 | CC | 5629152 | ROJAS PEDRO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,428,046 | $228,500 | EPS002 | 30 | $1,428,046 | $57,200 | CCF40 | 30 | $1,428,046 | $57,200 | 14-7 | 30 | $1,428,046 | 6.960% | $99,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $442,300 |
| 26 | CC | 1082838396 | SILVA GUSTAVO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,212,639 | $354,100 | EPS002 | 30 | $2,212,639 | $88,600 | CCF40 | 30 | $2,212,639 | $88,600 | 14-7 | 30 | $2,212,639 | 6.960% | $154,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $685,300 |
| 27 | CC | 17594632 | TABORDA ORLANDO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,180,319 | $348,900 | EPS005 | 30 | $2,180,319 | $87,300 | CCF40 | 30 | $2,180,319 | $87,300 | 14-7 | 30 | $2,180,319 | 6.960% | $151,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $675,300 |
| 28 | CC | 1095937018 | TAVERA FABIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | EPS005 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | CCF40 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-7 | 30 | $3,000,000 | 6.960% | $208,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $928,800 |
| 29 | CC | 91240282 | TORRES JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,424,000 | $227,900 | EPS002 | 30 | $1,424,000 | $57,000 | CCF40 | 30 | $1,424,000 | $57,000 | 14-7 | 30 | $1,424,000 | 6.960% | $99,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $441,100 |
| 30 | CC | 3983570 | TORRES LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,424,000 | $227,900 | EPS037 | 30 | $1,424,000 | $57,000 | CCF40 | 30 | $1,424,000 | $57,000 | 14-7 | 30 | $1,424,000 | 6.960% | $99,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $441,100 |
| 31 | CC | 19710847 | VILORIA ATANAEL | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,448,274 | $231,800 | EPS037 | 30 | $1,448,274 | $58,000 | CCF40 | 30 | $1,448,274 | $58,000 | 14-7 | 30 | $1,448,274 | 6.960% | $100,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $448,600 |
| **LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | ima | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $10,477,501 | $1,676,500 | | | $10,477,501 | $419,200 | | | $10,477,501 | $419,200 | | | $10,477,501 | | $54,300 | | $0 | $0 | | $2,569,200 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $10,477,501 | $1,676,500 | | | $10,477,501 | $419,200 | | | $10,477,501 | $419,200 | | | $10,477,501 | | $54,300 | | $0 | $0 | | $2,569,200 |
| Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $10,477,501 | $1,676,500 | | | $10,477,501 | $419,200 | | | $10,477,501 | $419,200 | | | $10,477,501 | | $54,300 | | $0 | $0 | | $2,569,200 |
| 32 | CC | 1098804045 | CORTES SARAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,650,000 | $264,000 | EPS010 | 30 | $1,650,000 | $66,000 | CCF40 | 30 | $1,650,000 | $66,000 | 14-7 | 30 | $1,650,000 | 0.522% | $8,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $404,700 |
| 33 | CC | 1090526122 | MARTINEZ ASTRID | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 28 | $1,866,667 | $298,700 | EPS005 | 28 | $1,866,667 | $74,700 | CCF40 | 28 | $1,866,667 | $74,700 | 14-7 | 28 | $1,866,667 | 0.522% | $9,800 | 28 | $0 | $0 | Si | $457,900 |
| 34 | CC | 1090526122 | MARTINEZ ASTRID | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230201 | 2 | $133,334 | $21,400 | EPS005 | 2 | $133,334 | $5,400 | CCF40 | 2 | $133,334 | $5,400 | 14-7 | 2 | $133,334 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | Si | $32,200 |
| 35 | CC | 87470664 | ORDOÑEZ BERNARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,500,000 | $400,000 | EPS010 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | CCF40 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | 14-7 | 30 | $2,500,000 | 0.522% | $13,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $613,100 |
| 36 | CC | 91509603 | URIBE FELIPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $2,727,500 | $436,400 | EPS010 | 30 | $2,727,500 | $109,100 | CCF40 | 30 | $2,727,500 | $109,100 | 14-7 | 30 | $2,727,500 | 0.522% | $14,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $668,900 |
| 37 | CC | 1005320989 | VALERO ZAIDY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,600,000 | $256,000 | EPS005 | 30 | $1,600,000 | $64,000 | CCF40 | 30 | $1,600,000 | $64,000 | 14-7 | 30 | $1,600,000 | 0.522% | $8,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $392,400 |
| **Total** | **Afiliados( 34)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $77,472,116 | $12,466,800 | | | $77,472,116 | $3,100,100 | | | $77,598,694 | $3,105,100 | | | $77,472,116 | | $4,647,600 | | $0 | $0 | | $23,319,600 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 34 | $12,466,800 | $0 | $0 | $12,466,800 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $1,454,000 | $0 | $0 | $1,454,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 7 | $2,517,200 | $0 | $0 | $2,517,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 15 | $4,846,200 | $0 | $0 | $4,846,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 10 | $3,649,400 | $0 | $0 | $3,649,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 34 | $4,647,600 | $0 | $0 | $4,647,600 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 34 | $4,647,600 | $0 | $0 | $4,647,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 34 | $3,105,100 | $0 | $0 | $3,105,100 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 34 | $3,105,100 | $0 | $0 | $3,105,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 34 | $3,100,100 | $0 | $0 | $3,100,100 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $57,200 | $0 | $0 | $57,200 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 5 | $426,700 | $0 | $0 | $426,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 9 | $780,300 | $0 | $0 | $780,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 8 | $576,300 | $0 | $0 | $576,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 11 | $1,259,600 | $0 | $0 | $1,259,600 |
| TOTAL | | | | 34 | $23,319,600 | $0 | $0 | $23,319,600 |

ASOPAGOS s.a.

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
## PLANILLA NRO. 35747885
## REFERENCIA DE PAGO (PIN):
## Fecha Pago Planilla: 2025-12-17

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | EDWIN FERNANDO VALENCIA PINZON | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cédula de Ciudadanía |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 91494944 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | Independiente |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CALLE 30 22 200 APTO 402 EDIFICIO CAAVER | DEPARTAMENTO | SANTANDER | MUNICIPIO | FLORIDABLANCA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 8299 | CORREO ELECTRÓNICO | VALENCIAEDWIN@HOTMAIL.COM | TELÉFONO | 6392386 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 04 | NOMBRE SUCURSAL | 2025 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | POSITIVA | Tipo de aportante | Independiente |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2025 | Mes: 12 | Año: 2025 | Mes: 12 | Sucursal |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | $0 | | 35747885 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-91494944 | 57 | No | No | No | 68 | 276 | 0 | Salario | VALENCIA PINZON EDWIN FERNANDO | $2.720.000 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 91494944 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 91494944 | PORVENIR | 30 | $2.720.000 | 0.1600000 | $435.200 | $0 | $0 | $435.200 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 91494944 | SALUD MIA EPS | 30 | $2.720.000 | 0.1250000 | $340.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $2.720.000 | 91494944 | 0.0696000 | $189.400 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-91494944 | SIN CCF | 0 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PORVENIR | 1 | $435.200 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $435.200 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| SALUD MIA EPS | 1 | $340.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $340.000 | 0 | $0 | $0 | $340.000 | $0 | 0 | $0 | $0 | $340.000 | $0 | $0 | $340.000 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| POSITIVA | 1 | $189.400 | 0 | $0 | $0 | $189.400 | 0 | $0 | $189.400 | 0 | $0 | $0 | $189.400 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| SIN CCF | 1 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 1 | $340.000 |
| PENSIONES | 1 | $435.200 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $189.400 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 0 | $0 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $964.600 |

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | LAURA TATIANA SILVA CAMACHO |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1096956702 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2026-01-14 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-01-13 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-01-13 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO POPULAR |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-12 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-12 |
| NÚMERO PLANILLA: | 35501081 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 35501081 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 900 | $ 178.000 | $ 178.900 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 1.200 | $ 227.800 | $ 229.000 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 100 | $ 7.500 | $ 7.600 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 2.200 | $ 413.300 | $ 415.500 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 03/02/2026 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 91530295 | | BERMUDEZ FLOREZ WILLIAM FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cra 21B No 115 116 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6047279 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-12 | 2025-12 | 1983161640 | 9495974893 | I | 2026/01/26 | 2025/12/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,546,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 91530295 | BERMUDEZ FLOREZ WILLIAM FERNANDO | 230301 | 30 | $5,000,000 | $800,000 | EPS010 | 30 | $5,000,000 | $625,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $5,000,000 | $121,800 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $5,000,000 | $800,000 | | | $5,000,000 | $625,000 | | | $0 | $0 | | | $5,000,000 | $121,800 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $800,000 | $0 | $0 | $800,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $800,000 | $0 | $0 | $800,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $121,800 | $0 | $0 | $121,800 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $121,800 | $0 | $0 | $121,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $625,000 | $0 | $0 | $625,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $625,000 | $0 | $0 | $625,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $1,546,800 | $0 | $0 | $1,546,800 |



2025/12/05 07:55 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1098672661 | | GAITAN PRADA CARLOS ALFONSO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 31 -63 apto 907 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6175167 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-12 | 2025-12 | 41262972 | 9496476178 | I | 2026/01/16 | 2025/12/29 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $812,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $2,800,000 | $448,000 | | | $2,800,000 | $350,000 | | | $0 | $0 | | | $2,800,000 | $14,700 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $2,800,000 | $448,000 | | | $2,800,000 | $350,000 | | | $0 | $0 | | | $2,800,000 | $14,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) | | | | | $2,800,000 | $448,000 | | | $2,800,000 | $350,000 | | | $0 | $0 | | | $2,800,000 | $14,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1098672661 | GAITAN CARLOS | 230301 | 30 | $2,800,000 | $448,000 | EPS010 | 30 | $2,800,000 | $350,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $2,800,000 | $14,700 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $2,800,000 | $448,000 | | | $2,800,000 | $350,000 | | | $0 | $0 | | | $2,800,000 | $14,700 | | $0 | $0 |



2025/12/29 09:33 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1098672661 | | GAITAN PRADA CARLOS ALFONSO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | carrera 23 # 31 -63 apto 907 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6175167 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-12 | 2025-12 | 41262972 | 9496476178 | I | 2026/01/16 | 2025/12/29 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $812,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $448,000 | $0 | $0 | $448,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $448,000 | $0 | $0 | $448,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $14,700 | $0 | $0 | $14,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $14,700 | $0 | $0 | $14,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $350,000 | $0 | $0 | $350,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $350,000 | $0 | $0 | $350,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $812,700 | $0 | $0 | $812,700 |

# CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

**ALFONSO VEGA ALBINO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.497.873, y **JULIO LOZANO GARCÍA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 73.083.496, en calidad de Representante Legal y Director de Interventoría, respectivamente, en el marco de la ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 085** del 26 de abril de 2023, nos permitimos certificar que hemos recibido a entera satisfacción las actividades reportadas por el contratista del **CONTRATO DE OBRA No. 069** del 14 de abril de 2023, con las siguientes características:

| | |
|---|---|
| PERIODO A COBRAR | 01 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2025 |
| VALOR AUTORIZADO A PAGAR | $ 7.258.984.862,72 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION A PAGAR | 11.96% |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | 069 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | CONSORCIO LA FLORA 2023 |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | NIT 901.702.490-7 |
| OBJETO | "CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTOR: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" |
| FECHA DEL CONTRATO | 14 DE ABRIL DEL 2023 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 40.514'056.113.00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 20,168,495,053.00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 60,682,551,166.00 |
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN | DIECIOCHO (18) MESES |
| PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN | DIECIOCHO (18) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS |
| PLAZO TOTAL DEL EJECUCIÓN | TREINTA Y SEIS (36) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS |
| INTERVENTOR | CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA |
| IDENTIFICACIÓN DEL INTERVENTOR | NIT 901.706.924-1 |
| FECHA DE INICIO | MAYO 05 DEL 2023 |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL | NOVIEMBRE 04 DEL 2024 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01 | DICIEMBRE 04 DEL 2024 |
| FECHA DE REINICIO No. 01 | DICIEMBRE 11 DEL 2024 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02 | DICIEMBRE 23 DEL 2025 |
| FECHA DE AMPLIACIÓN No.01 A LA SUSPENSIÓN No.02 | ENERO 14 DEL 2026 |
| FECHA DE REINICIO No. 02 | MARZO 13 DEL 2026 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03 | MARZO 20 DEL 2026 |
| FECHA DE REINICIO No. 03 | MARZO 27 DEL 2026 |
| FECHA DE TERMINACION | AGOSTO 27 DEL 2026 |
| ASEGURADORA | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| No. DE POLIZA | 96-44-101180422 - 10<br>96-40-101063839 - 8 |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP CONTRATO ORIGINAL | 2843 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2023 |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP RESERVA CONTRATO ORIGINAL | 0470 DEL 26 DE ENERO DEL 2024 |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP PASIVO EXIGIBLE | 4278 DEL 30 DE MAYO DEL 2025 |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP ADICIONAL NO.01 | 3950 DEL 09 DE MAYO DEL 2025 |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP ADICIONAL NO.01 RESERVA | 0868 DEL 22 DE ENERO DEL 2026 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – RP CONTRATO ORIGINAL | 4562 DEL 18 DE ABRIL DEL 2023 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – RP RESERVA CONTRATO ORIGINAL | 0260 DEL 26 DE ENERO DEL 2024 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – RP PASIVO EXIGIBLE | 5819 DEL 30 DE MAYO DEL 2025 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – RP ADICIONAL NO.01 | 5340 DEL 09 DE MAYO DEL 2025 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL – RP ADICIONAL NO.01 RESERVA | 1779 DEL 22 DE ENERO DEL 2026 |

Certificamos que los informes Técnico, HSEQ, Social, aportes a la seguridad social, cumplimiento de soportes parafiscales, entre otros, fueron presentados por el contratista del **CONTRATO DE OBRA No. 069** del 14 de abril de 2023. Dichos informes han sido revisados y se encuentran aprobados por esta interventoría, dado que cumplen con lo pactado en el contrato, el pliego de condiciones y los demás anexos estipulados en el proceso de contratación.

La presente certificación se expide exclusivamente para el trámite de pago del **Acta de Ejecución Parcial No. 12** ante la **Alcaldía de Bucaramanga**, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2026. Por lo tanto, este documento no es idóneo para acreditar experiencia.

Atentamente,

**Firma:** _____

**ALFONSO VEGA ALBINO**
REPRESENTANTE LEGAL
**CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA**

**Firma:** _____

**JULIO LOZANO GARCÍA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
**CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA**

| Secretaria de Infraestructura Fisica<br>Alcaldía de Bucaramanga | Alcaldía de Bucaramanga | Consorcio La Flora 2023 | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA |
|---|---|---|---|

| FECHA | DD | 23 | MM | 12 | AAAA | 2025 | ACTA No. | 12 | ELABORÓ | DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| ENT CONTRATANTE: | ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO LA FLORA 2023 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA |

CAPÍTULO 1. PRELIMINARES

| 1.03.01.02 | Encerramiento con tela de polipropileno verde | UNIDAD | m |
|---|---|---|---|

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO








| Fecha | Ubicación | DIMENSIONES | | | Elemento (und) | Longitud (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | | |
| ACTA #12 | | | | | | |
| PARQUE LA FLORA - CARRERA 36 | | | | | | |
| 11/11/2025 | DE K0+012 A K0+060 | 68,50 | | | 1,00 | 68,50 |
| SUBTOTAL - ACTA #12 | | | | | | 68,50 |

VISTA EN PLANTA - TRAZADO CERRAMIENTO EN LONA, CARRERA 36 DE LA ABSCISA K0+012 A LA K0+060

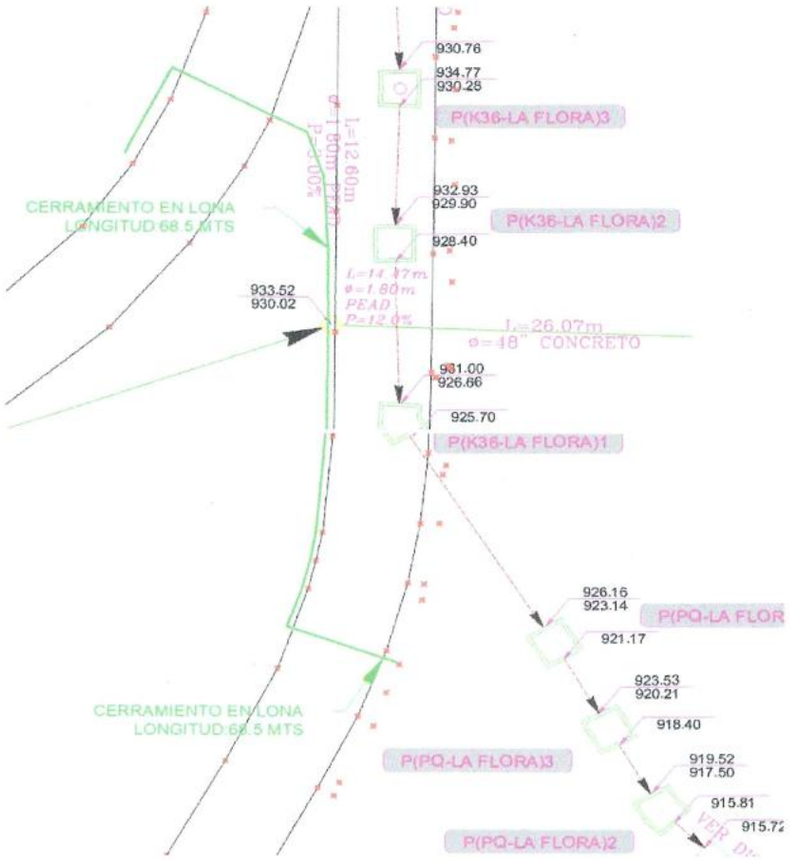


| OBSERVACIONES: | PRESENTE ACTA 12 | | ACUMULADO | | | TOTALES | 68,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | % EJECUTADO | | |
| | 68,50 | $ 1.711.952,00 | 3.820,03 | $ 95.470.189,76 | 87,59% | | |

**CONTRATISTA:** CONSORCIO LA FLORA 2023

**Firma:**

REPRESENTANTE LEGAL

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN EGA

**Firma:**

REPRESENTANTE LEGAL

| Secretaria de Infraestructura Fisica<br>Alcaldía de Bucaramanga | Alcaldía de Bucaramanga | Consorcio La Flora 2023 | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA |
|---|---|---|---|

| FECHA | DD | 23 | MM | 12 | AAAA | 2025 | ACTA No. | 12 | ELABORÓ | DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| ENTIDAD | ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO LA FLORA 2023 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA |

CAPÍTULO 1. PRELIMINARES

| 1.03.02 | Campamento | UNIDAD | und |
|---|---|---|---|

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMAGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO





| Localización | Ubicación | DIMENSIONES Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Cantidad (und) | Cantidad (und) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA #12 | | | | | | |
| PARQUE LA FLORA - CARRERA 36 | | | | | | |
| CAMPAMENTO PARA FRENTE DE OBRA | | | | | | |
| | K0+282 | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | SUBTOTAL - ACTA #12 | 1,00 |

| OBSERVACIONES: | PRESENTE ACTA 12 | | ACUMULADO | | | TOTALES | 1,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | % EJECUTADO | | |
| | 1,00 | $ 4.387.594,00 | 2,00 | $ 8.775.188,00 | 100,00% | | |

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: _____ REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma: _____ REPRESENTANTE LEGAL

| Secretaria de Infraestructura Fisica<br>Alcaldía de Bucaramanga | Alcaldía de Bucaramanga | Consorcio La Flora 2023 | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA |
|---|---|---|---|

| FECHA | DD | 23 | MM | 12 | AAAA | 2025 | ACTA No. | 12 | ELABORÓ | DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO LA FLORA 2023 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA |

**CAPÍTULO 1. PRELIMINARES**

| 1,04 | Replanteo, control y medición permanente de la obra | | UNIDAD | mes |
|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







| DESCRIPCIÓN - PERIODO | | | DIMENSIONES | | | Cantidad (mes) | Duración (mes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | | |
| ACTA #12 | | | | | | | |
| 5-oct-25 | - | 4-nov-25 | | | | 1,00 | 1,00 |
| 5-nov-25 | - | 4-dic-25 | | | | 1,00 | 1,00 |
| 5-dic-25 | - | 23-dic-25 | | | | 0,60 | 0,60 |
| | | | | | SUBTOTAL - ACTA #12 | | 2,60 |

| OBSERVACIONES: | PRESENTE ACTA 12 | | ACUMULADO | | | TOTALES | 2,60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | % EJECUTADO | | |
| | 2,60 | $ 19.887.696,40 | 31,60 | $ 241.712.002,40 | 85,71% | | |

**CONTRATISTA:** CONSORCIO LA FLORA 2023

**Firma:** _____

REPRESENTANTE LEGAL

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

**Firma:** _____

REPRESENTANTE LEGAL

| Secretaria de Infraestructura Fisica<br>Alcaldía de Bucaramanga | Alcaldía de Bucaramanga | Consorcio La Flora 2023 | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA |
|---|---|---|---|

| FECHA | DD | 23 | MM | 12 | AAAA | 2025 | ACTA No. | 12 | ELABORÓ | DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| ENTIDAD | ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO LA FLORA 2023 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA |

**CAPÍTULO 1. PRELIMINARES**

| 1.07.01.02 | Rotura de pavimentos | Asfáltico | Espesor entre 0.06m y 0.10m | UNIDAD | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN**

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ROTURA DE PAVIMENTO ENTRE LAS ABSCISAS K0+023 Y K0+042,45

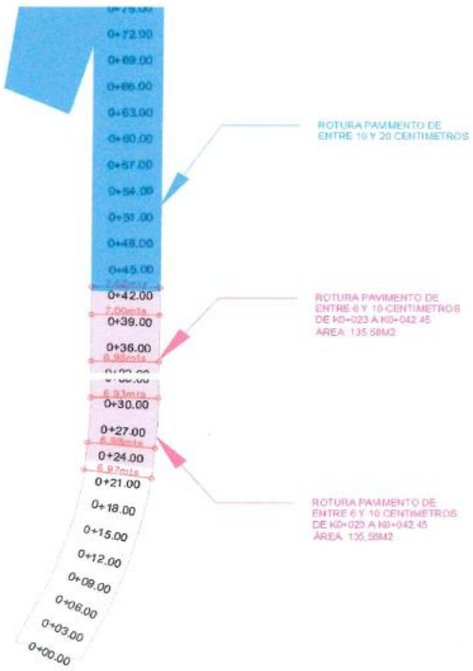


REGISTRO FOTOGRÁFICO



| ABSCISA | DIMENSIONES Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Ancho promedio (m) | Área (m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA #12** | | | | | |
| **PARQUE LA FLORA - CARRERA 36** | | | | | |
| **ROTURA DE PAVIMENTO ENTRE LAS ABSCISAS K0+023 Y K0+042,45** | | | | | |
| k0+023,00 | | 6,97 | | | |
| | 2,00 | | | 6,98 | 13,96 |
| k0+025,00 | | 6,98 | | | |
| | 5,00 | | | 6,96 | 34,80 |
| k0+030,00 | | 6,93 | | | |
| | 5,00 | | | 6,95 | 34,75 |
| k0+035,00 | | 6,96 | | | |
| | 5,00 | | | 6,98 | 34,90 |
| k0+040,00 | | 7,00 | | | |
| | 2,45 | | | 7,01 | 17,17 |
| k0+042,45 | | 7,02 | | | |
| | | | | **SUBTOTAL - ACTA #12** | 135,58 |

**OBSERVACIONES:**

| PRESENTE ACTA 12 | | ACUMULADO | | | TOTALES | 135,58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | % EJECUTADO | | |
| 135,58 | $ 5.653.279,26 | 3.388,65 | $ 141.296.539,05 | 79,25% | | |

**CONTRATISTA:** CONSORCIO LA FLORA 2023

**Firma:** _____
REPRESENTANTE LEGAL

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

**Firma:** _____
REPRESENTANTE LEGAL

| Secretaria de Infraestructura Fisica<br>Alcaldía de Bucaramanga | Alcaldía de Bucaramanga | Consorcio La Flora 2023 | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA |
|---|---|---|---|

| FECHA | DD | 23 | MM | 12 | AAAA | 2025 | ACTA No. | 12 | ELABORÓ | DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| ENT CONTRATANTE: | ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO LA FLORA 2023 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA |


**CAPÍTULO 1. PRELIMINARES**

| 1.07.01.03 | Rotura de pavimentos | Asfáltico | Espesor entre 0.10 m y 0.20 m | UNIDAD | m2 |
|---|---|---|---|---|---|

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN


REGISTRO FOTOGRÁFICO



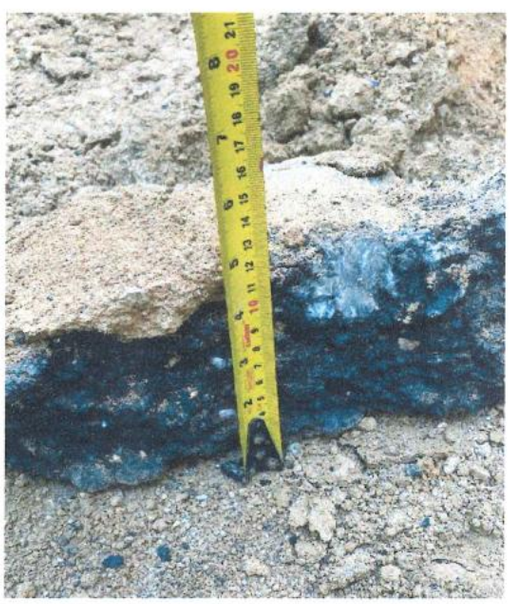

| ABSCISA | DIMENSIONES | | | Ancho promedio (m) | Área (m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | | |
| **ACTA #12** | | | | | |
| **PARQUE LA FLORA - CARRERA 36** | | | | | |
| **ROTURA PAVIMENTO ENTRE LAS ABSCISAS K0+042,45 Y K0+350** | | | | | |
| k0+042,45 | | 7,02 | | | |
| | 7,55 | | | 7,04 | 53,15 |
| k0+050,00 | | 7,06 | | | |
| | 10,00 | | | 7,07 | 70,70 |
| k0+060,00 | | 7,08 | | | |
| | 10,00 | | | 7,05 | 70,50 |
| k0+070,00 | | 7,01 | | | |
| | 10,00 | | | 7,27 | 72,70 |
| k0+080,00 | | 7,52 | | | |
| | 10,00 | | | 7,82 | 78,20 |
| k0+090,00 | | 8,12 | | | |
| | 10,00 | | | 8,08 | 80,80 |
| k0+100,00 | | 8,04 | | | |
| | 10,00 | | | 8,02 | 80,20 |
| k0+110,00 | | 8,00 | | | |
| | 10,00 | | | 7,50 | 75,00 |
| k0+120,00 | | 7,00 | | | |
| | 10,00 | | | 6,98 | 69,80 |
| k0+130,00 | | 6,96 | | | |
| | 10,00 | | | 6,96 | 69,60 |
| k0+140,00 | | 6,95 | | | |
| | 10,00 | | | 6,96 | 69,60 |
| k0+150,00 | | 6,97 | | | |
| | 10,00 | | | 6,96 | 69,60 |
| k0+160,00 | | 6,94 | | | |
| | 10,00 | | | 6,97 | 69,70 |
| k0+170,00 | | 6,99 | | | |
| | 10,00 | | | 6,95 | 69,50 |
| k0+180,00 | | 6,90 | | | |
| | 10,00 | | | 6,95 | 69,50 |
| k0+190,00 | | 7,00 | | | |
| | 10,00 | | | 6,97 | 69,70 |
| k0+200,00 | | 6,94 | | | |
| | 10,00 | | | 6,96 | 69,60 |
| k0+210,00 | | 6,98 | | | |
| | 10,00 | | | 6,99 | 69,90 |
| k0+220,00 | | 7,00 | | | |
| | 10,00 | | | 7,01 | 70,10 |
| k0+230,00 | | 7,02 | | | |
| | 10,00 | | | 6,99 | 69,90 |
| k0+240,00 | | 6,96 | | | |
| | 10,00 | | | 6,99 | 69,90 |
| k0+250,00 | | 7,01 | | | |
| | 10,00 | | | 7,02 | 70,20 |
| k0+260,00 | | 7,03 | | | |
| | 10,00 | | | 6,99 | 69,90 |
| k0+270,00 | | 6,94 | | | |
| | 10,00 | | | 6,96 | 69,60 |
| k0+280,00 | | 6,97 | | | |
| | 10,00 | | | 6,99 | 69,90 |
| k0+290,00 | | 7,01 | | | |
| | 10,00 | | | 7,01 | 70,10 |
| k0+300,00 | | 7,01 | | | |
| | 10,00 | | | 7,00 | 70,00 |
| k0+310,00 | | 6,98 | | | |
| | 10,00 | | | 6,99 | 69,90 |
| k0+320,00 | | 7,00 | | | |
| | 10,00 | | | 7,00 | 70,00 |
| k0+330,00 | | 7,00 | | | |
| | 10,00 | | | 6,99 | 69,90 |
| k0+340,00 | | 6,97 | | | |
| | 10,00 | | | 6,99 | 69,90 |
| k0+350,00 | | 7,00 | | | |
| **BARRIO SAN MARTIN** | | | | | |
| ROTURA DE PAVIMENTO ENTRE LAS ABSCISAS K0+031 Y K0+198 | | | | | |
| k0+031,00 | | 5,78 | | | |
| | 9,00 | | | 5,74 | 51,66 |

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ROTURA PAVIMENTO ENTRE LAS ABSCISAS K0+042,45 Y K0+350

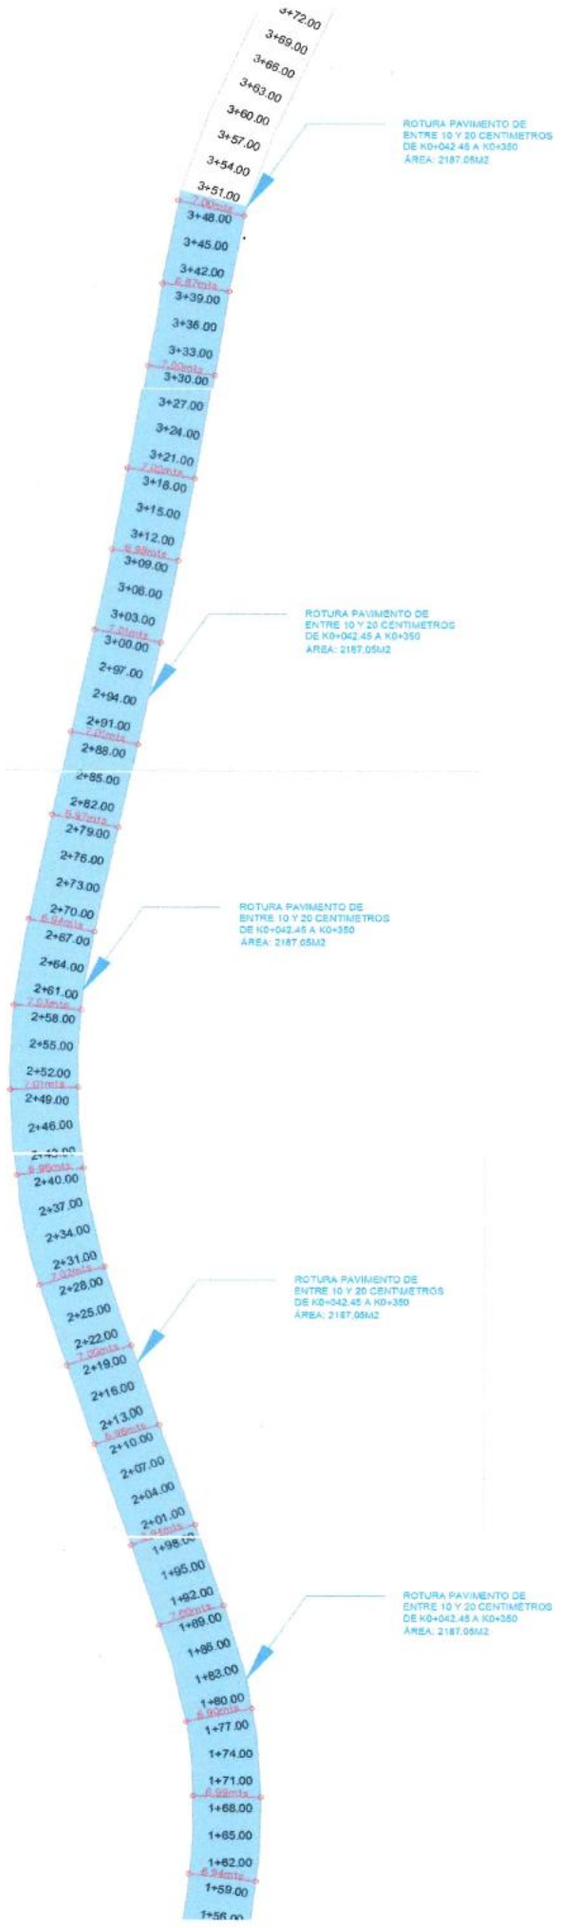



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| k0+040,00 | | 5,70 | | | |
| | 10,00 | | | 5,70 | 57,00 |
| k0+050,00 | | 5,70 | | | |
| | 10,00 | | | 5,70 | 57,00 |
| k0+060,00 | | 5,70 | | | |
| | 10,00 | | | 5,77 | 57,70 |
| k0+070,00 | | 5,84 | | | |
| | 10,00 | | | 5,78 | 57,80 |
| k0+080,00 | | 5,72 | | | |
| | 10,00 | | | 5,71 | 57,10 |
| k0+090,00 | | 5,70 | | | |
| | 10,00 | | | 5,70 | 57,00 |
| k0+100,00 | | 5,70 | | | |
| | 10,00 | | | 5,70 | 57,00 |
| k0+110,00 | | 5,70 | | | |
| | 10,00 | | | 5,70 | 57,00 |
| k0+120,00 | | 5,70 | | | |
| | 10,00 | | | 5,70 | 57,00 |
| k0+130,00 | | 5,70 | | | |
| | 10,00 | | | 5,70 | 57,00 |
| k0+140,00 | | 5,70 | | | |
| | 10,00 | | | 5,70 | 57,00 |
| k0+150,00 | | 5,70 | | | |
| | 10,00 | | | 5,85 | 58,50 |
| k0+160,00 | | 6,00 | | | |
| | 5,00 | | | 7,86 | 39,30 |
| k0+165,00 | | 9,72 | | | |
| | 5,00 | | | 9,93 | 49,65 |
| k0+170,00 | | 10,13 | | | |
| | 5,00 | | | 9,29 | 46,45 |
| k0+175,00 | | 8,45 | | | |
| | 5,00 | | | 9,99 | 49,95 |
| k0+180,00 | | 11,53 | | | |
| | 5,00 | | | 10,70 | 53,50 |
| k0+185,00 | | 9,87 | | | |
| | 5,00 | | | 8,67 | 43,35 |
| k0+190,00 | | 7,47 | | | |
| | 5,00 | | | 7,09 | 35,45 |
| k0+195,00 | | 6,70 | | | |
| | 3,00 | | | 6,68 | 20,04 |
| k0+198,00 | | 6,65 | | | |
| | | | | **SUBTOTAL - ACTA #12** | 3.263,50 |

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ROTURA PAVIMENTO ENTRE LAS ABSCISAS K0+042,45 Y K0+350







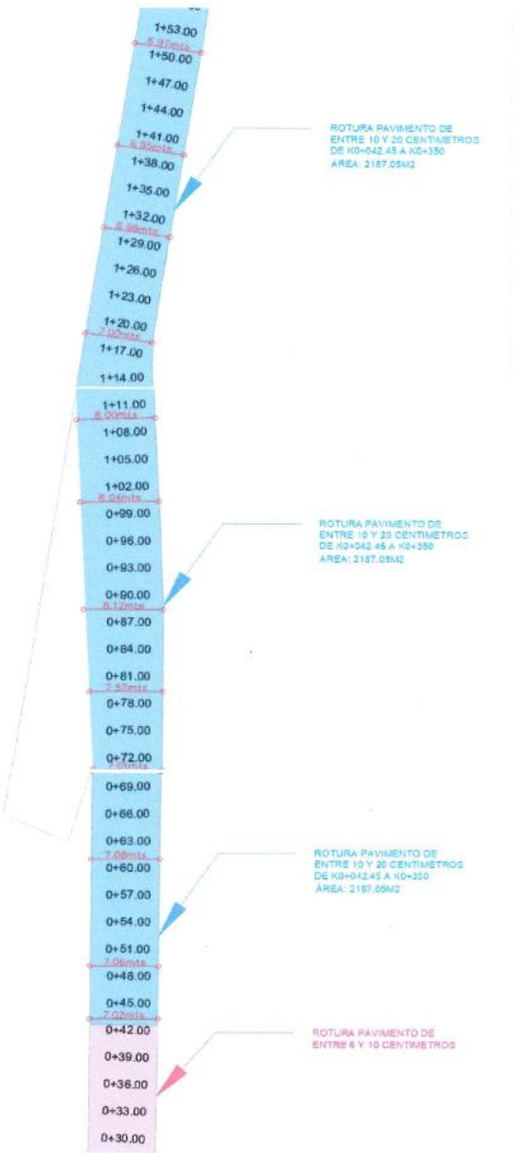

BARRIO SAN MARTIN - ROTURA DE PAVIMENTO ENTRE LAS ABSCISAS K0+031 Y K0+198









| OBSERVACIONES: | PRESENTE ACTA 12 | | ACUMULADO | | | TOTALES | 3.263,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | % EJECUTADO | | |
| | 3.263,50 | $ 163.184.790,50 | 4.939,54 | $ 246.991.818,62 | 78,88% | | |

**CONTRATISTA:** CONSORCIO LA FLORA 2023

**Firma:** _____
REPRESENTANTE LEGAL

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BQA

**Firma:** _____
REPRESENTANTE LEGAL

| Secretaria de Infraestructura Fisica<br>Alcaldía de Bucaramanga | Alcaldía de Bucaramanga | Consorcio La Flora 2023 | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA |
|---|---|---|---|

| FECHA | DD | 23 | MM | 12 | AAAA | 2025 | ACTA No. | 12 | ELABORÓ | DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO LA FLORA 2023 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA |

**CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRA**

| 2.01.01.01.2 | A | Excavación con acarreo libre | En tierra sin entibados | De 0.00 a 2.50 m de profundidad | UNIDAD | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**






| | Abscisado | DIMENSIONES Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Área (m2) | Volumen (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTA #12** | | | | | |
| | **BARRIO SAN MARTIN** | | | | | |
| | **RED ALCANTARILLADO MIXTO DENTRO DEL PARQUE EXTREMO** | | | | | |
| | DE POZO "PQ-EXTRE3" A POZO "PQ-EXTRE2" | | | | | |
| | 0,00 | | 2,50 | 2,50 | 6,25 | |
| | | 6,67 | | | | 36,12 |
| | 6,67 | | 1,83 | 2,50 | 4,58 | |
| | DE POZO "PQ-EXTRE2" A POZO "PQ-EXTRE1" | | | | | |
| | 0,00 | | 2,51 | 2,50 | 6,28 | |
| | | 7,12 | | | | 44,61 |
| | 7,12 | | 2,50 | 2,50 | 6,25 | |
| | DE POZO "PQ-EXTRE1" A POZO "IN-EST-SEP 1(PQ-EXTRE)" | | | | | |
| | 0,00 | | 2,24 | 2,50 | 5,60 | |
| | | 2,30 | | | | 13,65 |
| | 2,30 | | 2,51 | 2,50 | 6,27 | |
| | DE POZO "PQ-EXTRE4" A POZO "PQ-EXTRE2" | | | | | |
| | 0,00 | | 1,60 | 2,40 | 3,84 | |
| | | 7,66 | | | | 29,41 |
| | 7,66 | | 1,60 | 2,40 | 3,84 | |
| | TOTAL EXCAVACIÓN DE 0,00MTS A 2,50MTS DE PROFUNDIDAD, PARA RED ALCANTARILLADO MIXTO DENTRO DEL PARQUE EXTREMO | | | | | 123,79 |
| | **SUBTOTAL "A" - E.C.A.L. EN TIERRA DE 0,00MTS A 2,50MTS DE PROFUNDIDAD, PARA RED ALCANTARILLADO MIXTO DENTRO DEL PARQUE EXTREMO (100%)** | | | | | **123,79** |
| | **ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN 7, ABSCISA K4+645** | | | | | |
| | EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN No.07 UBICADA EN K4+645 | | | | | |
| | 0,00 | | 8,35 | 2,50 | 20,88 | |
| | | 6,50 | | | | 88,17 |
| | 6,50 | | 2,50 | 2,50 | 6,25 | |
| | TOTAL EXCAVACIÓN DE 0,00MTS A 2,50MTS DE PROFUNDIDAD, PARA ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN 7, ABSCISA K4+645 | | | | | 88,17 |
| | **SUBTOTAL "B" - E.C.A.L. EN TIERRA DE 0,00MTS A 2,50MTS DE PROFUNDIDAD, PARA ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN 7, ABSCISA K4+645 (100%)** | | | | | **88,17** |
| | **BOX-CULVERT DE K4+273,8 A K4+323.** | | | | | |
| MOD 92 | K4+323,00 | | 21,62 | 2,50 | 54,05 | |
| | | 13,00 | | | | 793,52 |
| MOD 93 | K4+310,00 | | 27,21 | 2,50 | 68,03 | |
| | | 10,00 | | | | 677,30 |
| MOD 94 | K4+300,00 | | 26,97 | 2,50 | 67,43 | |
| | | 10,00 | | | | 526,15 |
| MOD 95 | K4+290,00 | | 15,12 | 2,50 | 37,80 | |
| | | 10,00 | | | | 455,00 |
| MOD 96 | K4+280,00 | | 21,28 | 2,50 | 53,20 | |
| | | 6,20 | | | | 289,35 |
| MOD 97 | K4+273,80 | | 16,06 | 2,50 | 40,14 | |
| | TOTAL EXCAVACIÓN DE 0,00MTS A 2,50MTS DE PROFUNDIDAD, BOX-CULVERT DE K4+273,8 A K4+323 | | | | | 2.741,32 |
| | **SUBTOTAL "C" - E.C.A.L. EN TIERRA DE 0,00MTS A 2,50MTS DE PROFUNDIDAD, PARA BOX-CULVERT DE K4+273,8 A K4+323. (80%)** | | | | | **2193,06** |
| | **CARRERA 36** | | | | | |
| | **RED PEAD 1800MM DESDE P(K36-LA FLORA)1 (K0+030) A P(K36-LA FLORA)11 (K0+351)** | | | | | |
| | MANEJO DE AGUAS CARRERA 36 (DESCOLE) | | | | | |
| | K0+000,00 | | 1,33 | 0,78 | 1,04 | |
| | | 3,99 | | | | 5,77 |
| | K0+003,99 | | 1,34 | 1,38 | 1,85 | |
| | | 4,34 | | | | 10,96 |
| | K0+008,33 | | 1,34 | 2,38 | 3,20 | |
| | | 4,34 | | | | 14,02 |
| | K0+012,67 | | 1,37 | 2,38 | 3,26 | |
| | | 4,32 | | | | 14,13 |
| | K0+016,99 | | 1,38 | 2,38 | 3,28 | |
| | | 8,68 | | | | 31,25 |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**










| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | K0+025,67 | | 1,65 | 2,38 | 3,92 | |
| | | 4,33 | | | | 18,19 |
| | K0+030,00 | | 1,88 | 2,38 | 4,48 | |
| TRAMO P(K36-LA FLORA)1 & P(K36-LA FLORA)2 | | | | | | |
| | K0+000,00 | | 5,11 | 2,38 | 12,16 | |
| | | 4,00 | | | | 47,86 |
| | K0+004,00 | | 4,95 | 2,38 | 11,77 | |
| | | 3,50 | | | | 42,93 |
| | K0+007,50 | | 5,36 | 2,38 | 12,76 | |
| | | 6,97 | | | | 91,59 |
| | K0+014,47 | | 5,68 | 2,38 | 13,52 | |
| TRAMO P(K36-LA FLORA)2 & P(K36-LA FLORA)3 | | | | | | |
| | K0+000,00 | | 5,68 | 2,38 | 13,52 | |
| | | 3,00 | | | | 37,41 |
| | K0+003,00 | | 4,80 | 2,38 | 11,42 | |
| | | 2,00 | | | | 23,01 |
| | K0+005,00 | | 4,87 | 2,38 | 11,59 | |
| | | 6,30 | | | | 74,34 |
| | K0+011,30 | | 5,05 | 2,38 | 12,01 | |
| | | 1,30 | | | | 15,68 |
| | K0+012,60 | | 5,09 | 2,38 | 12,11 | |
| TRAMO P(K36-LA FLORA)3 & P(K36-LA FLORA)4 | | | | | | |
| | K0+000,00 | | 5,09 | 2,38 | 12,11 | |
| | | 1,25 | | | | 13,82 |
| | K0+001,25 | | 4,20 | 2,38 | 10,00 | |
| | | 6,50 | | | | 65,75 |
| | K0+007,75 | | 4,30 | 2,38 | 10,23 | |
| | | 5,14 | | | | 54,41 |
| | K0+012,89 | | 4,60 | 2,38 | 10,94 | |
| | | 6,30 | | | | 76,99 |
| | K0+019,19 | | 5,67 | 2,38 | 13,50 | |
| | | 5,13 | | | | 69,46 |
| | K0+024,32 | | 5,71 | 2,38 | 13,58 | |
| TRAMO P(K36-LA FLORA)4 & P(K36-LA FLORA)5 | | | | | | |
| | K0+000,00 | | 5,71 | 2,38 | 13,58 | |
| | | 1,25 | | | | 16,88 |
| | K0+001,25 | | 5,64 | 2,38 | 13,43 | |
| | | 6,32 | | | | 80,17 |
| | K0+007,57 | | 5,02 | 2,38 | 11,94 | |
| | | 6,40 | | | | 80,64 |
| | K0+013,97 | | 5,57 | 2,38 | 13,26 | |
| | | 6,28 | | | | 82,43 |
| | K0+020,25 | | 5,46 | 2,38 | 12,99 | |
| | | 6,26 | | | | 79,88 |
| | K0+026,51 | | 5,26 | 2,38 | 12,53 | |
| | | 6,30 | | | | 80,07 |
| | K0+032,81 | | 5,42 | 2,38 | 12,89 | |
| | | 1,25 | | | | 16,79 |
| | K0+034,06 | | 5,87 | 2,38 | 13,97 | |
| TRAMO P(K36-LA FLORA)5 & P(K36-LA FLORA)6 | | | | | | |
| | K0+000,00 | | 5,71 | 2,38 | 13,58 | |
| | | 1,25 | | | | 17,24 |
| | K0+001,25 | | 5,88 | 2,38 | 14,00 | |
| | | 6,47 | | | | 81,04 |
| | K0+007,72 | | 4,64 | 2,38 | 11,05 | |
| | | 6,32 | | | | 68,29 |
| | K0+014,04 | | 4,44 | 2,38 | 10,56 | |
| | | 6,32 | | | | 66,01 |
| | K0+020,36 | | 4,34 | 2,38 | 10,33 | |
| | | 6,31 | | | | 68,02 |
| | K0+026,67 | | 4,72 | 2,38 | 11,23 | |
| | | 6,34 | | | | 80,45 |
| | K0+033,01 | | 5,95 | 2,38 | 14,15 | |
| | | 6,32 | | | | 86,43 |
| | K0+039,33 | | 5,55 | 2,38 | 13,20 | |
| | | 6,30 | | | | 82,31 |
| | K0+045,63 | | 5,43 | 2,38 | 12,93 | |
| | | 4,14 | | | | 52,31 |
| | K0+049,77 | | 5,18 | 2,38 | 12,34 | |
| | | 4,13 | | | | 53,86 |
| | K0+053,90 | | 5,77 | 2,38 | 13,74 | |
| | | 1,00 | | | | 14,03 |
| | K0+054,90 | | 6,01 | 2,38 | 14,31 | |
| TRAMO P(K36-LA FLORA)6 & P(K36-LA FLORA)7 | | | | | | |
| | K0+000,00 | | 6,01 | 2,38 | 14,31 | |
| | | 1,45 | | | | 20,60 |
| | K0+001,45 | | 5,93 | 2,38 | 14,11 | |
| | | 6,32 | | | | 75,75 |
| | K0+007,77 | | 4,14 | 2,38 | 9,86 | |
| | | 6,45 | | | | 64,89 |
| | K0+014,22 | | 4,31 | 2,38 | 10,26 | |
| | | 6,33 | | | | 69,31 |
| | K0+020,55 | | 4,89 | 2,38 | 11,64 | |
| | | 6,18 | | | | 74,65 |
| | K0+026,73 | | 5,26 | 2,38 | 12,52 | |
| | | 6,31 | | | | 78,69 |
| | K0+033,04 | | 5,22 | 2,38 | 12,42 | |
| | | 0,98 | | | | 13,22 |
| | K0+034,02 | | 6,11 | 2,38 | 14,55 | |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAMO P(K36-LA FLORA)7 & P(K36-LA FLORA)8 | | | | | | |
| | K0+000,00 | | 6,11 | 2,38 | 14,55 | |
| | | 1,25 | | | | 18,01 |
| | K0+001,25 | | 6,00 | 2,38 | 14,27 | |
| | | 6,44 | | | | 84,40 |
| | K0+007,69 | | 5,02 | 2,38 | 11,94 | |
| | | 6,31 | | | | 79,13 |
| | K0+014,00 | | 5,52 | 2,38 | 13,14 | |
| | | 6,30 | | | | 82,69 |
| | K0+020,30 | | 5,51 | 2,38 | 13,11 | |
| | | 6,29 | | | | 82,78 |
| | K0+026,59 | | 5,55 | 2,38 | 13,21 | |
| | | 5,21 | | | | 89,92 |
| | K0+031,80 | | 8,95 | 2,38 | 21,31 | |
| | | 1,25 | | | | 26,75 |
| | K0+033,05 | | 9,03 | 2,38 | 21,49 | |
| | | | | | | |
| TRAMO P(K36-LA FLORA)8 & P(K36-LA FLORA)9 | | | | | | |
| | K0+000,00 | | 9,03 | 2,38 | 21,49 | |
| | | 1,25 | | | | 26,69 |
| | K0+001,25 | | 8,91 | 2,38 | 21,21 | |
| | | 6,29 | | | | 111,30 |
| | K0+007,54 | | 5,96 | 2,38 | 14,18 | |
| | | 6,32 | | | | 82,25 |
| | K0+013,86 | | 4,98 | 2,38 | 11,85 | |
| | | 6,32 | | | | 84,37 |
| | K0+020,18 | | 6,24 | 2,38 | 14,85 | |
| | | 1,37 | | | | 20,16 |
| | K0+021,55 | | 6,13 | 2,38 | 14,58 | |
| | | | | | | |
| TRAMO P(K36-LA FLORA)9 & P(K36-LA FLORA)10 | | | | | | |
| | K0+000,00 | | 6,13 | 2,38 | 14,58 | |
| | | 1,25 | | | | 18,29 |
| | K0+001,25 | | 6,17 | 2,38 | 14,68 | |
| | | 6,31 | | | | 76,89 |
| | K0+007,56 | | 4,07 | 2,38 | 9,69 | |
| | | 6,32 | | | | 58,21 |
| | K0+013,88 | | 3,67 | 2,38 | 8,73 | |
| | | 6,23 | | | | 53,86 |
| | K0+020,11 | | 3,60 | 2,38 | 8,56 | |
| | | 6,27 | | | | 52,35 |
| | K0+026,38 | | 3,42 | 2,38 | 8,14 | |
| | | 6,29 | | | | 54,25 |
| | K0+032,67 | | 3,83 | 2,38 | 9,11 | |
| | | 5,26 | | | | 59,39 |
| | K0+037,93 | | 5,66 | 2,38 | 13,47 | |
| | | 1,33 | | | | 18,17 |
| | K0+039,26 | | 5,82 | 2,38 | 13,85 | |
| | | | | | | |
| TRAMO P(K36-LA FLORA)10 & P(K36-LA FLORA)10A | | | | | | |
| | K0+000,00 | | 5,82 | 2,38 | 13,85 | |
| | | 1,25 | | | | 17,16 |
| | K0+001,25 | | 5,71 | 2,38 | 13,60 | |
| | | 6,31 | | | | 71,65 |
| | K0+007,56 | | 3,83 | 2,38 | 9,11 | |
| | | 6,25 | | | | 55,78 |
| | K0+013,81 | | 3,67 | 2,38 | 8,74 | |
| | | 6,36 | | | | 54,76 |
| | K0+020,17 | | 3,56 | 2,38 | 8,48 | |
| | | 6,34 | | | | 56,96 |
| | K0+026,51 | | 3,99 | 2,38 | 9,49 | |
| | | 1,45 | | | | 13,88 |
| | K0+027,96 | | 4,06 | 2,38 | 9,66 | |
| | | | | | | |
| TRAMO P(K36-LA FLORA)10A & P(K36-LA FLORA)11 | | | | | | |
| | K0+000,00 | | 3,56 | 2,38 | 8,48 | |
| | | 1,25 | | | | 11,14 |
| | K0+001,25 | | 3,93 | 2,38 | 9,35 | |
| | | 6,30 | | | | 59,63 |
| | K0+007,55 | | 4,03 | 2,38 | 9,58 | |
| | | 6,28 | | | | 59,79 |
| | K0+013,83 | | 3,97 | 2,38 | 9,46 | |
| | | 6,30 | | | | 61,08 |
| | K0+020,13 | | 4,17 | 2,38 | 9,93 | |
| | | 6,32 | | | | 64,75 |
| | K0+026,45 | | 4,44 | 2,38 | 10,56 | |
| | | 1,25 | | | | 15,64 |
| | K0+027,70 | | 6,08 | 2,38 | 14,46 | |
| TOTAL EXCAVACIÓN DE 0,00MTS A 2,50MTS DE PROFUNDIDAD, PARA RED PEAD 1800MM DESDE P(K36-LA FLORA)1 (K0+030) A P(K36-LA FLORA)11 (K0+351) | | | | | | 3.933,61 |
| **SUBTOTAL "D" - E.C.A.L. EN TIERRA DE 0,00MTS A 2,50MTS DE PROFUNDIDAD, PARA RED PEAD 1800MM DESDE P(K36-LA FLORA)1 (K0+030) A P(K36-LA FLORA)11 (K0+351) (80%)** | | | | | | **3146,89** |
| | | | | | | - |
| **TOTAL ACTA #12 - E.C.A.L EN TIERRA DE 0,00MTS A 2,50MTS DE PROFUNDIDAD (SUMA DE SUBTOTALES "A" +"B" + "C" + "D")** | | | | | | **5551,91** |


BARRIO SAN MARTIN - SECCIONES EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+323 A K4+273,8

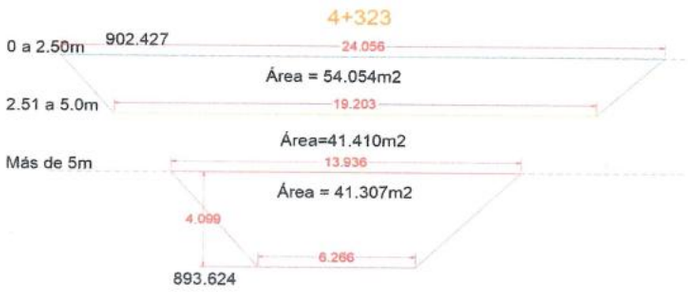









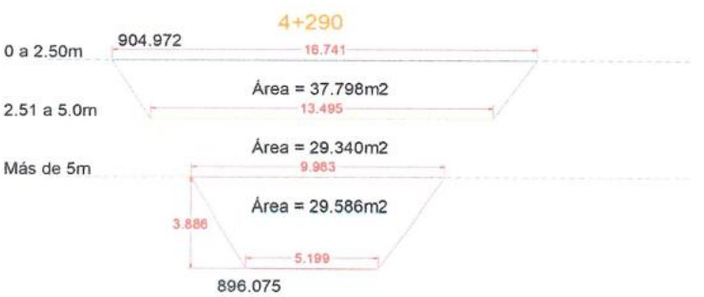


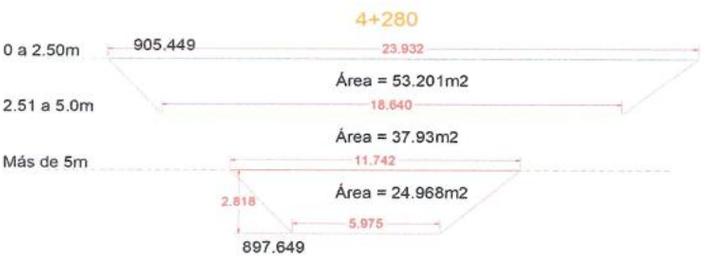
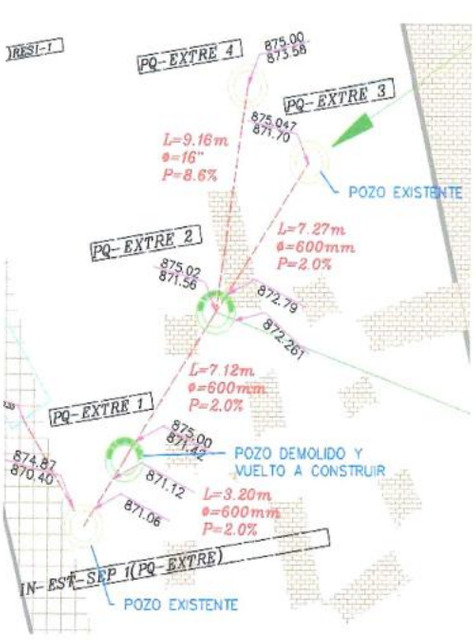

BARRIO SAN MARTIN - SECCIONES EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+323 A K4+273,8

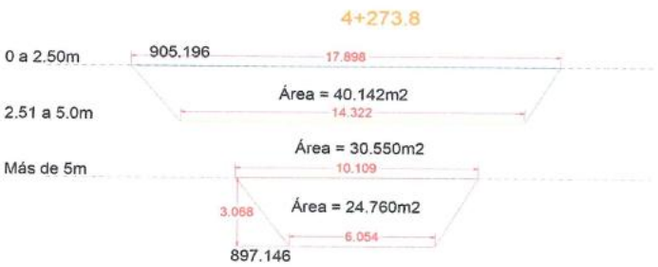


BARRIO SAN MARTIN - SECCIONES EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN No. 7, ABSCISA K4+645

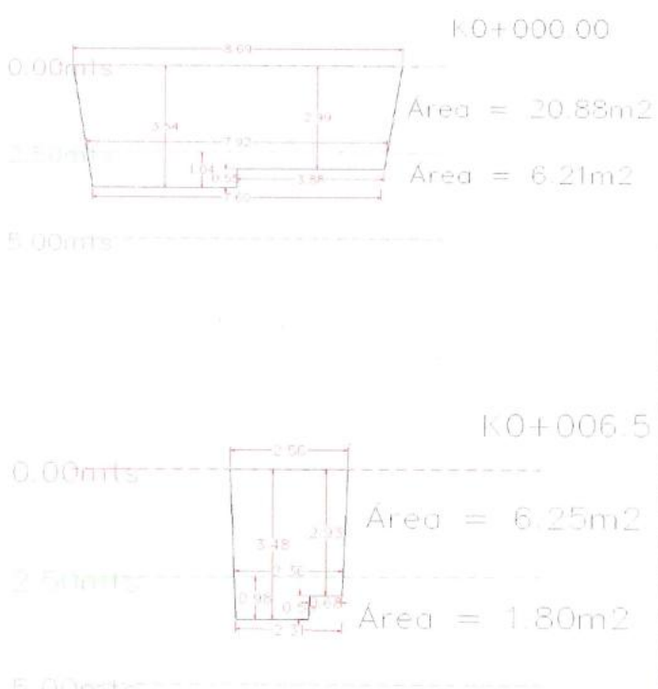



BARRIO SAN MARTIN - RED ALCANTARILLADO MIXTO DENTRO DEL PARQUE EXTREMO




BARRIO SAN MARTIN - SECCIONES EXCAVACIÓN RED ALCANTARILLADO MIXTO DENTRO DEL PARQUE EXTREMO DE POZO "PQ-EXTRE3" AL POZO "PQ-EXTRE2"

K0+000.00

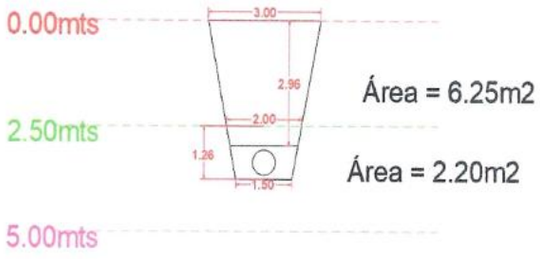



K0+006.67

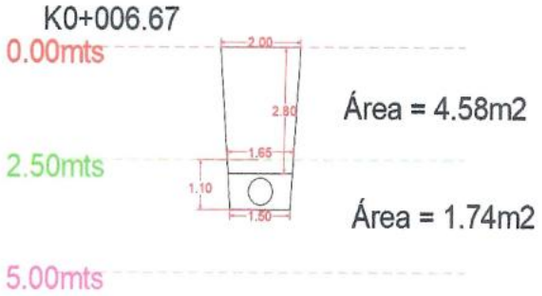



BARRIO SAN MARTIN - SECCIONES EXCAVACIÓN RED ALCANTARILLADO MIXTO DENTRO DEL PARQUE EXTREMO DE POZO "PQ-EXTRE1" AL POZO "IN-EST-SEP 1(PQ-EXTRE)"

K0+000.00





K0+002.30

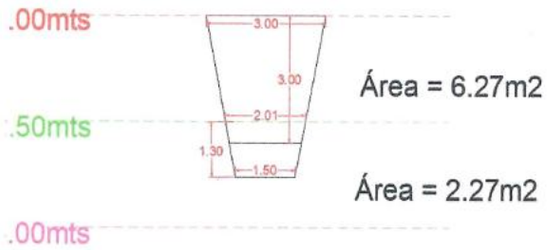



BARRIO SAN MARTIN - SECCIONES EXCAVACIÓN RED ALCANTARILLADO MIXTO DENTRO DEL PARQUE EXTREMO DE POZO "PQ-EXTRE2" AL POZO "PQ-EXTRE1"

K0+000.00

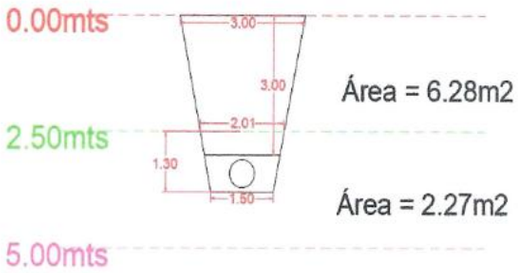



K0+007.12

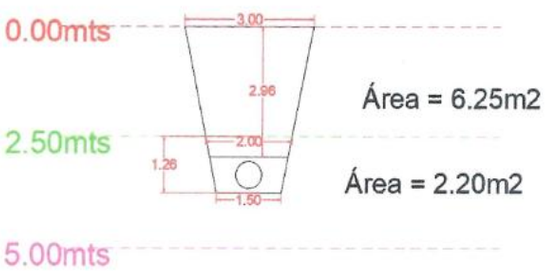



PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - MANEJO DE AGUAS CARRERA 36 (DESCOLE)

K0+000

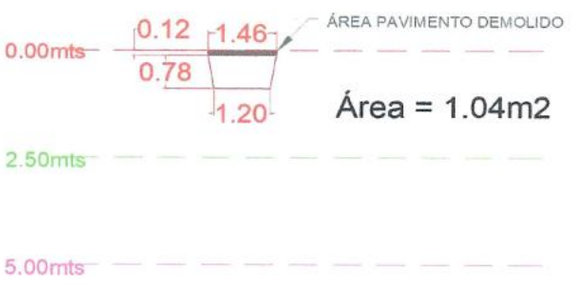



K0+003.99

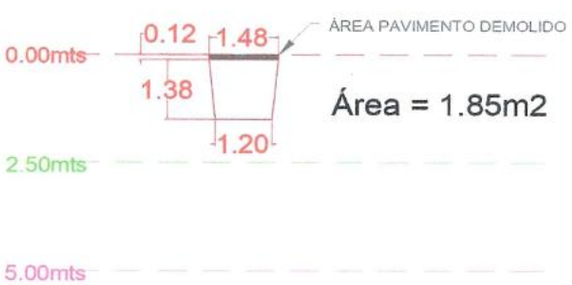


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - MANEJO DE AGUAS CARRERA 36 (DESCOLE)


## K0+008.33

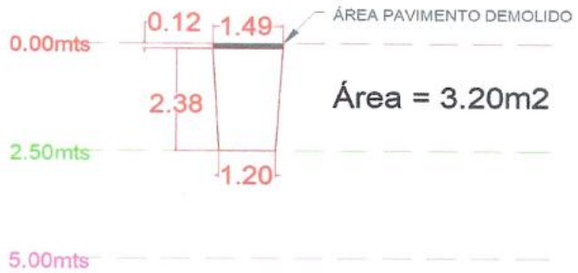



## K0+012.67

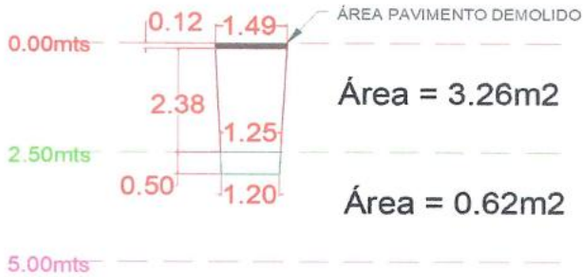


## K0+016.99

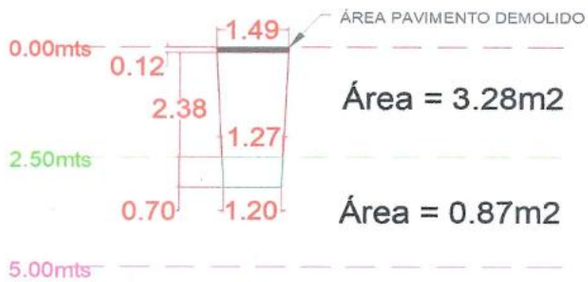



## K0+025.67

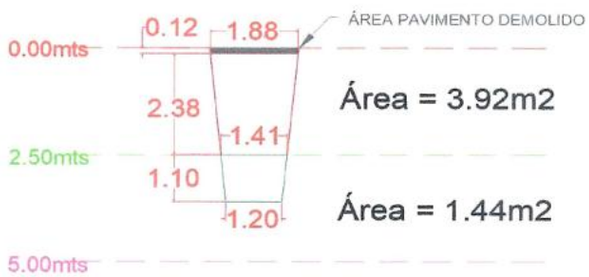



PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - MANEJO DE AGUAS CARRERA 36 (DESCOLE)

## K0+030.0

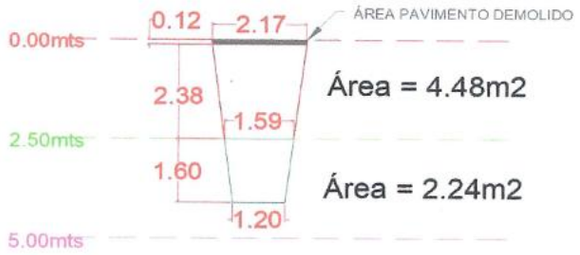



PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)1 & P(K36-LA FLORA)2


## K0+000.00

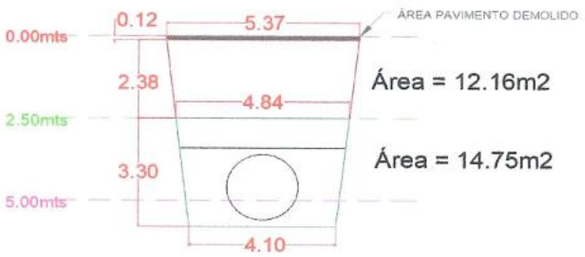



## K0+004.00




## K0+007.50





## K0+014.47

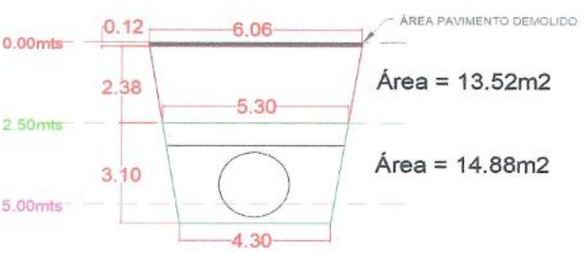


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)2 & P(K36-LA FLORA)3


K0+000.00

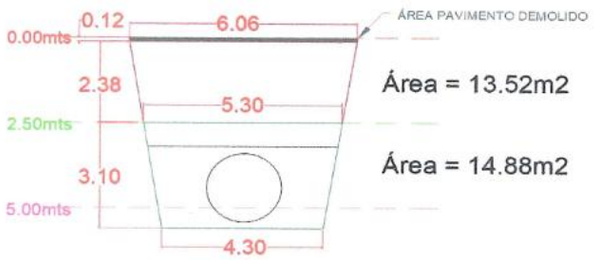



K0+003.00





K0+005.00




K0+011.30





K0+012.60





PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)3 & P(K36-LA FLORA)4


K0+000.0





K0+001.25





K0+007.75

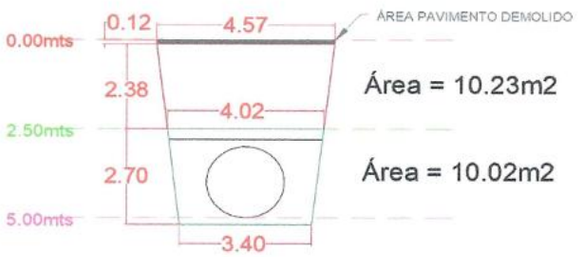


K0+012.89

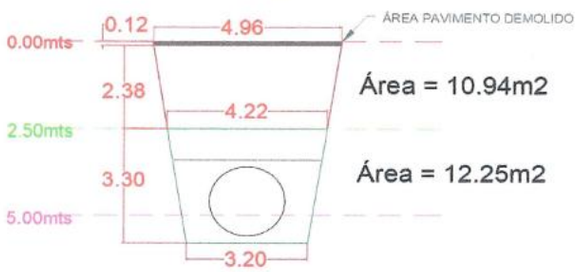



K0+019.19

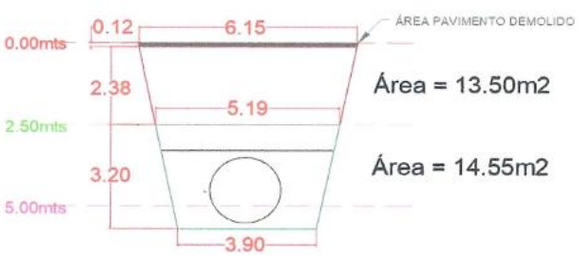

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)3 & P(K36-LA FLORA)4

K0+024.32





Área = 13.58m2

Área = 14.33m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)4 & P(K36-LA FLORA)5


K0+000.00




Área = 13.58m2

Área = 14.33m2


K0+001.25




Área = 13.43m2

Área = 14.61m2


K0+007.57

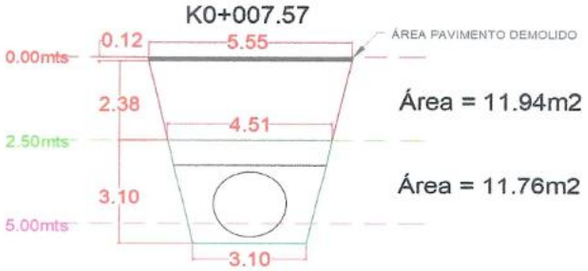


Área = 11.94m2

Área = 11.76m2

K0+013.97

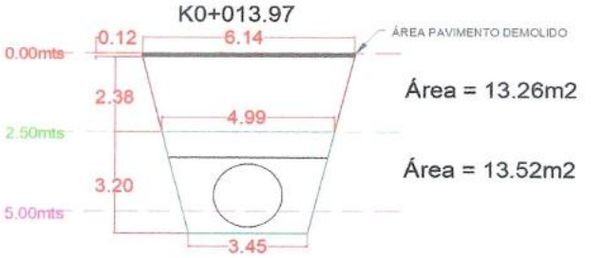



Área = 13.26m2

Área = 13.52m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)4 & P(K36-LA FLORA)5


K0+020.25




Área = 12.99m2

Área = 12.41m2


K0+026.51




Área = 12.53m2

Área = 12.72m2


K0+032.81

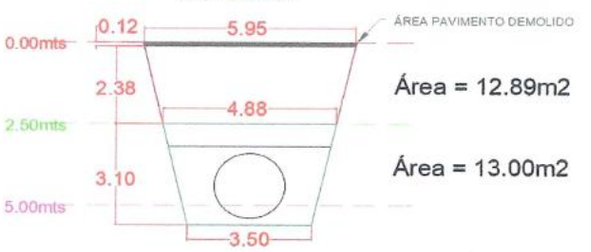


Área = 12.89m2

Área = 13.00m2

K0+034.06

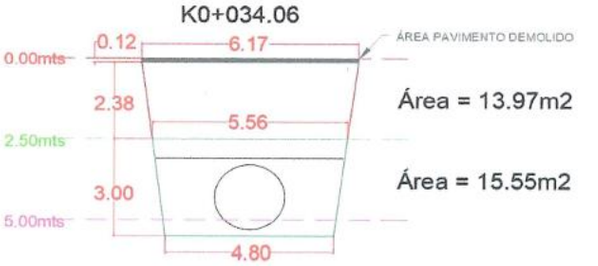



Área = 13.97m2

Área = 15.55m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)5 & P(K36-LA FLORA)6

K0+000.0

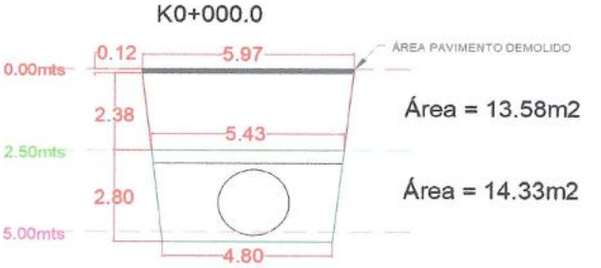



Área = 13.58m2

Área = 14.33m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)5 & P(K36-LA FLORA)6

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)5 & P(K36-LA FLORA)6

## K0+001.25




Área = 14.00m2

Área = 11.34m2


## K0+033.010




Área = 14.15m2

Área = 12.76m2

## K0+007.720

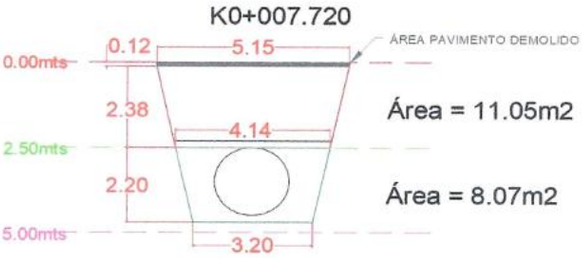


Área = 11.05m2

Área = 8.07m2


## K0+039.33




Área = 13.20m2

Área = 13.16m2

## K0+014.040

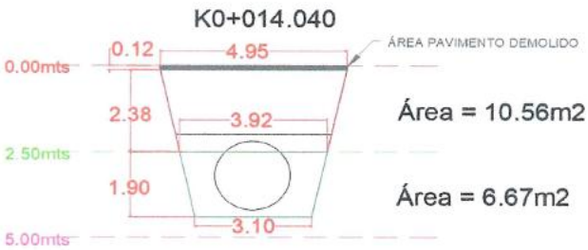


Área = 10.56m2

Área = 6.67m2


## K0+045.63




Área = 12.93m2

Área = 10.98m2

## K0+020.36

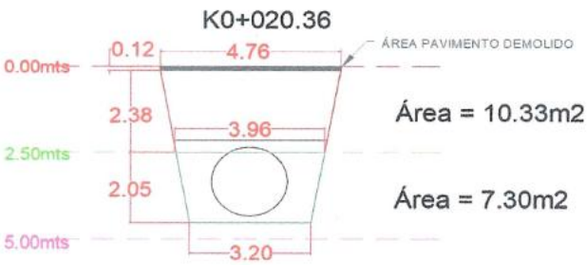


Área = 10.33m2

Área = 7.30m2


## K0+049.77




Área = 12.34m2

Área = 7.65m2

## K0+026.67

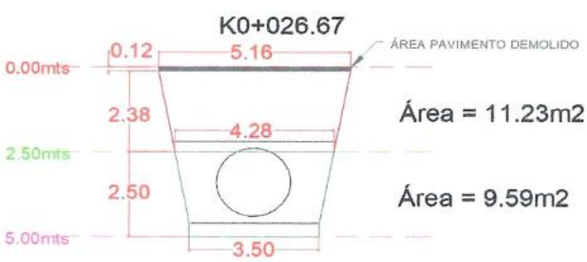


Área = 11.23m2

Área = 9.59m2

## K0+053.90





Área = 13.74m2

Área = 9.47m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)5 & P(K36-LA FLORA)6

K0+054.90





PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)6 & P(K36-LA FLORA)7


K0+000.0





K0+001.45




K0+007.77





K0+014.22




PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)6 & P(K36-LA FLORA)7


K0+020.55





K0+026.73




K0+033.04





K0+034.02




PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)7 & P(K36-LA FLORA)8

K0+000.00



PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)7 & P(K36-LA FLORA)8

K0+001.25




Área = 14.27m2

Área = 9.12m2


K0+007.69




Área = 11.94m2

Área = 6.71m2

K0+014.00




Área = 13.14m2

Área = 7.40m2

K0+020.30




Área = 13.11m2

Área = 7.64m2


K0+026.59




Área = 13.21m2

Área = 7.59m2

K0+031.80





Área = 21.31m2

Área = 18.36m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)7 & P(K36-LA FLORA)8

K0+033.05





Área = 21.49m2

Área = 18.41m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)8 & P(K36-LA FLORA)9


K0+000.00




Área = 21.49m2

Área = 18.41m2


K0+001.25




Área = 21.21m2

Área = 13.70m2

K0+007.54




Área = 14.18m2

Área = 6.71m2


K0+013.86




Área = 11.85m2

Área = 5.87m2

K0+020.18




Área = 14.85m2

Área = 10.43m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)8 & P(K36-LA FLORA)9

K0+021.55





PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)9 & P(K36-LA FLORA)10

K0+020.11





PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)9 & P(K36-LA FLORA)10


K0+000.00

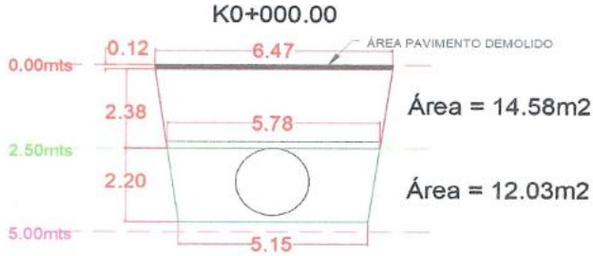


K0+026.38




K0+001.25




K0+032.67





K0+007.56





K0+037.93




K0+013.88

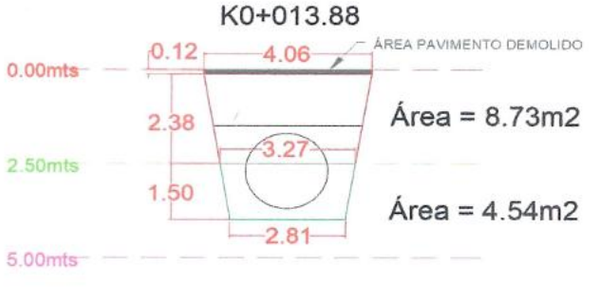


K0+039.26

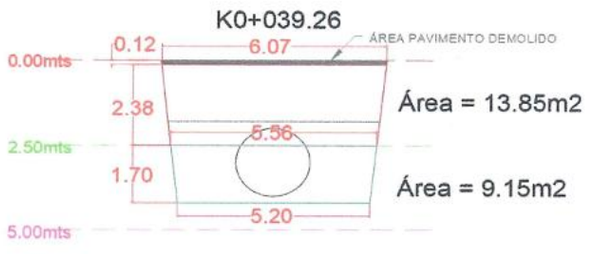

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)10 & P(K36-LA FLORA)10A


K0+000.00




Área = 13.85m2

Área = 9.15m2


K0+001.25




Área = 13.60m2

Área = 6.22m2


K0+007.56




Área = 9.11m2

Área = 3.98m2


K0+013.81

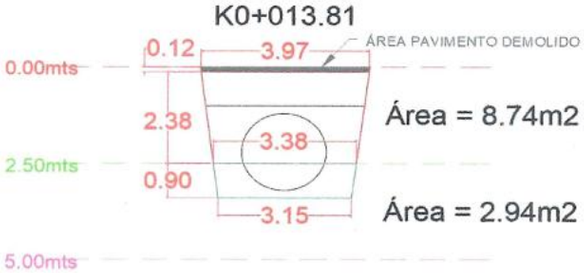


Área = 8.74m2

Área = 2.94m2

K0+020.17

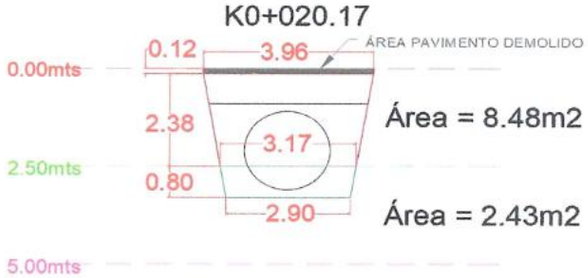


Área = 8.48m2

Área = 2.43m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)10 & P(K36-LA FLORA)10A

K0+026.51




Área = 9.49m2

Área = 3.46m2

K0+027.96




Área = 9.66m2

Área = 4.64m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)10A & P(K36-LA FLORA)11


K0+000.00




Área = 8.48m2

Área = 2.43m2

K0+001.25

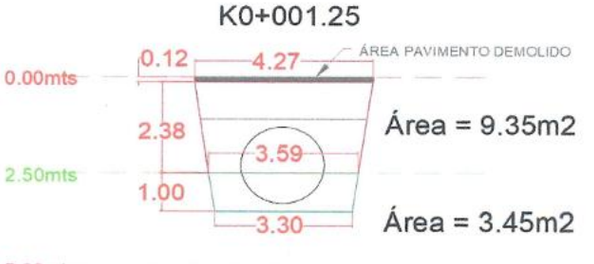


Área = 9.35m2

Área = 3.45m2

K0+007.55





Área = 9.58m2


Área = 4.57m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)10A & P(K36-LA FLORA)11


## K0+013.83





## K0+020.13

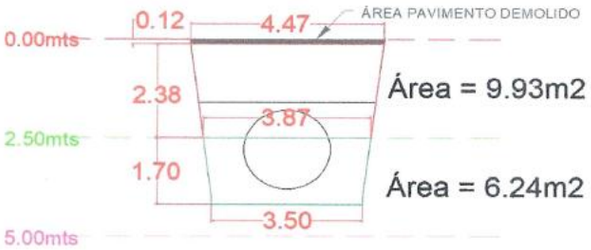


## K0+026.45

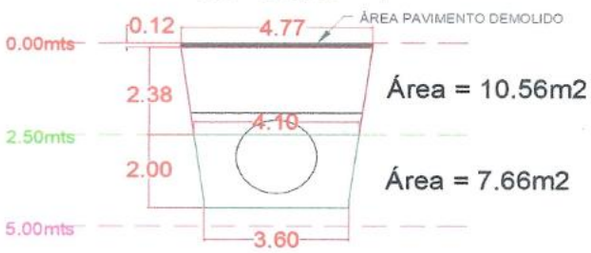


## K0+027.70

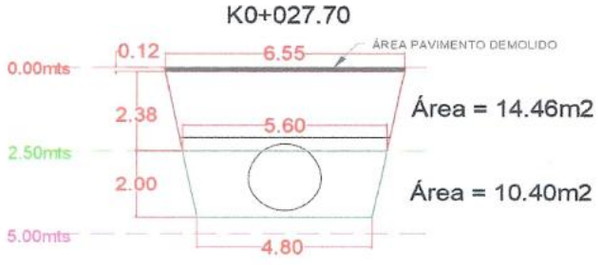


**OBSERVACIONES:**

| | PRESENTE ACTA 12 | | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | % EJECUTADO |
| | 5.551,91 | $ 191.735.211,85 | 29.931,95 | $ 1.033.699.893,25 | 88,37% |

| TOTALES | 5.551,91 |
|---|---|

**CONTRATISTA:** CONSORCIO LA FLORA 2023

**Firma:**

REPRESENTANTE LEGAL

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

**Firma:**

REPRESENTANTE LEGAL

| Secretaria de Infraestructura Fisica<br>Alcaldía de Bucaramanga | Alcaldía de Bucaramanga | Consorcio La Flora 2023 | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA |
|---|---|---|---|

| FECHA | DD | 23 | MM | 12 | AAAA | 2025 | ACTA No. | 12 | ELABORÓ | DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO LA FLORA 2023 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA |

CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRA

| 2.01.01.01.2 | B | Excavación con acarreo libre | En tierra sin entibados | De 2.51 a 5.00 m de profundidad | UNIDAD | m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO










| | Abscisado | DIMENSIONES Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Área (m2) | Volumen (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTA #12** | | | | | |
| | **CARRERA 36** | | | | | |
| | **RED PEAD 1800MM DESDE P(K36-LA FLORA)1 (K0+030) A P(K36-LA FLORA)11 (K0+351)** | | | | | |
| | MANEJO DE AGUAS CARRERA 36 (DESCOLE) | | | | | |
| | K0+000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 3,99 | | | | - |
| | K0+003,99 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4,34 | | | | - |
| | K0+008,33 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4,34 | | | | 1,35 |
| | K0+012,67 | | 1,24 | 0,50 | 0,62 | |
| | | 4,32 | | | | 3,22 |
| | K0+016,99 | | 1,24 | 0,70 | 0,87 | |
| | | 8,68 | | | | 10,03 |
| | K0+025,67 | | 1,31 | 1,10 | 1,44 | |
| | | 4,33 | | | | 7,97 |
| | K0+030,00 | | 1,40 | 1,60 | 2,24 | |
| | TRAMO P(K36-LA FLORA)1 & P(K36-LA FLORA)2 | | | | | |
| | K0+000,00 | | 4,47 | 3,30 | 14,75 | |
| | | 4,00 | | | | 47,28 |
| | K0+004,00 | | 4,23 | 2,10 | 8,89 | |
| | | 3,50 | | | | 31,87 |
| | K0+007,50 | | 4,44 | 2,10 | 9,32 | |
| | | 6,97 | | | | 84,34 |
| | K0+014,47 | | 4,80 | 3,10 | 14,88 | |
| | TRAMO P(K36-LA FLORA)2 & P(K36-LA FLORA)3 | | | | | |
| | K0+000,00 | | 4,80 | 3,10 | 14,88 | |
| | | 3,00 | | | | 30,57 |
| | K0+003,00 | | 3,93 | 1,40 | 5,50 | |
| | | 2,00 | | | | 10,92 |
| | K0+005,00 | | 3,87 | 1,40 | 5,42 | |
| | | 6,30 | | | | 40,89 |
| | K0+011,30 | | 3,98 | 1,90 | 7,56 | |
| | | 1,30 | | | | 10,66 |
| | K0+012,60 | | 4,02 | 2,20 | 8,84 | |
| | TRAMO P(K36-LA FLORA)3 & P(K36-LA FLORA)4 | | | | | |
| | K0+000,00 | | 4,02 | 2,20 | 8,84 | |
| | | 1,25 | | | | 11,78 |
| | K0+001,25 | | 4,35 | 2,30 | 10,00 | |
| | | 6,50 | | | | 65,75 |
| | K0+007,75 | | 3,79 | 2,70 | 10,23 | |
| | | 5,14 | | | | 57,77 |
| | K0+012,89 | | 3,71 | 3,30 | 12,25 | |
| | | 6,30 | | | | 84,42 |
| | K0+019,19 | | 4,55 | 3,20 | 14,55 | |
| | | 5,13 | | | | 74,08 |
| | K0+024,32 | | 5,12 | 2,80 | 14,33 | |
| | TRAMO P(K36-LA FLORA)4 & P(K36-LA FLORA)5 | | | | | |
| | K0+000,00 | | 5,12 | 2,80 | 14,33 | |
| | | 1,25 | | | | 18,09 |
| | K0+001,25 | | 4,43 | 3,30 | 14,61 | |
| | | 6,32 | | | | 83,33 |
| | K0+007,57 | | 3,79 | 3,10 | 11,76 | |
| | | 6,40 | | | | 80,90 |
| | K0+013,97 | | 4,23 | 3,20 | 13,52 | |
| | | 6,28 | | | | 81,42 |
| | K0+020,25 | | 4,14 | 3,00 | 12,41 | |
| | | 6,26 | | | | 78,66 |
| | K0+026,51 | | 4,39 | 2,90 | 12,72 | |
| | | 6,30 | | | | 81,02 |
| | K0+032,81 | | 4,19 | 3,10 | 13,00 | |
| | | 1,25 | | | | 17,84 |
| | K0+034,06 | | 5,18 | 3,00 | 15,55 | |
| | TRAMO P(K36-LA FLORA)5 & P(K36-LA FLORA)6 | | | | | |
| | K0+000,00 | | 5,12 | 2,80 | 14,33 | |
| | | 1,25 | | | | 16,04 |
| | K0+001,25 | | 5,15 | 2,20 | 11,34 | |
| | | 6,47 | | | | 62,79 |
| | K0+007,72 | | 3,67 | 2,20 | 8,07 | |

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - MANEJO DE AGUAS CARRERA 36 (DESCOLE)


## K0+012.67

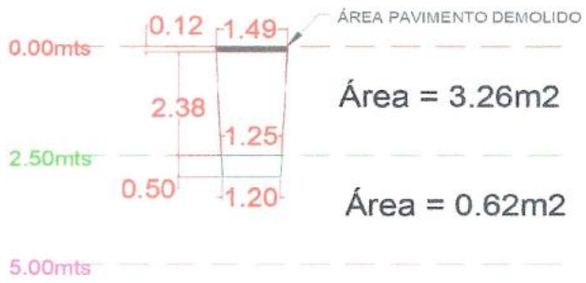


Área = 3.26m2

Área = 0.62m2


## K0+016.99

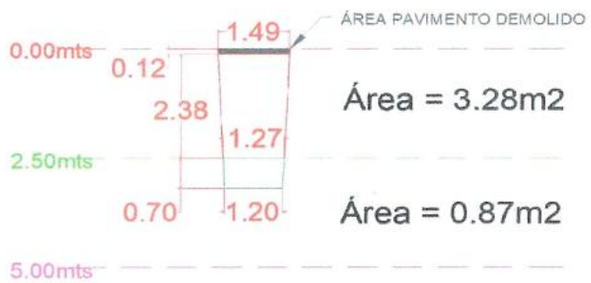


Área = 3.28m2

Área = 0.87m2


## K0+025.67

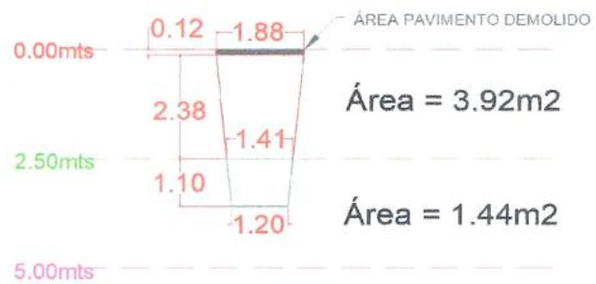


Área = 3.92m2

Área = 1.44m2

## K0+030.0

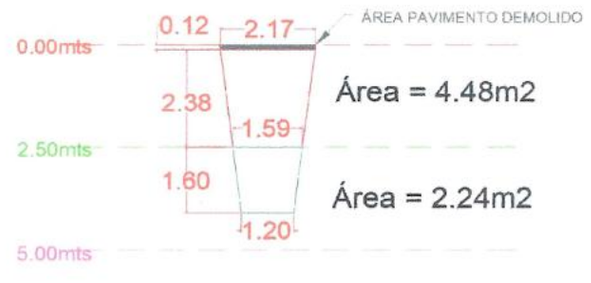



Área = 4.48m2

Área = 2.24m2


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6,32 | | | | 46,58 |
| | K0+014,04 | | 3,51 | 1,90 | 6,67 | |
| | | 6,32 | | | | 44,15 |
| | K0+020,36 | | 3,56 | 2,05 | 7,30 | |
| | | 6,31 | | | | 53,29 |
| | K0+026,67 | | 3,84 | 2,50 | 9,59 | |
| | | 6,34 | | | | 70,85 |
| | K0+033,01 | | 4,89 | 2,61 | 12,76 | |
| | | 6,32 | | | | 81,91 |
| | K0+039,33 | | 4,87 | 2,70 | 13,16 | |
| | | 6,30 | | | | 76,04 |
| | K0+045,63 | | 4,39 | 2,50 | 10,98 | |
| | | 4,14 | | | | 38,56 |
| | K0+049,77 | | 3,83 | 2,00 | 7,65 | |
| | | 4,13 | | | | 35,35 |
| | K0+053,90 | | 4,12 | 2,30 | 9,47 | |
| | | 1,00 | | | | 10,64 |
| | K0+054,90 | | 5,13 | 2,30 | 11,81 | |
| | TRAMO P(K36-LA FLORA)6 & P(K36-LA FLORA)7 | | | | | |
| | K0+000,00 | | 5,13 | 2,30 | 11,81 | |
| | | 1,45 | | | | 14,42 |
| | K0+001,45 | | 5,05 | 1,60 | 8,08 | |
| | | 6,32 | | | | 41,96 |
| | K0+007,77 | | 3,47 | 1,50 | 5,20 | |
| | | 6,45 | | | | 35,35 |
| | K0+014,22 | | 3,39 | 1,70 | 5,76 | |
| | | 6,33 | | | | 40,58 |
| | K0+020,55 | | 3,92 | 1,80 | 7,06 | |
| | | 6,18 | | | | 47,71 |
| | K0+026,73 | | 4,19 | 2,00 | 8,38 | |
| | | 6,31 | | | | 53,29 |
| | K0+033,04 | | 4,05 | 2,10 | 8,51 | |
| | | 0,98 | | | | 10,03 |
| | K0+034,02 | | 5,43 | 2,20 | 11,95 | |
| | TRAMO P(K36-LA FLORA)7 & P(K36-LA FLORA)8 | | | | | |
| | K0+000,00 | | 5,43 | 2,20 | 11,95 | |
| | | 1,25 | | | | 13,17 |
| | K0+001,25 | | 5,36 | 1,70 | 9,12 | |
| | | 6,44 | | | | 50,97 |
| | K0+007,69 | | 3,95 | 1,70 | 6,71 | |
| | | 6,31 | | | | 44,52 |
| | K0+014,00 | | 4,11 | 1,80 | 7,40 | |
| | | 6,30 | | | | 47,38 |
| | K0+020,30 | | 4,24 | 1,80 | 7,64 | |
| | | 6,29 | | | | 47,90 |
| | K0+026,59 | | 3,99 | 1,90 | 7,59 | |
| | | 5,21 | | | | 67,60 |
| | K0+031,80 | | 7,98 | 2,30 | 18,36 | |
| | | 1,25 | | | | 22,98 |
| | K0+033,05 | | 8,00 | 2,30 | 18,41 | |
| | TRAMO P(K36-LA FLORA)8 & P(K36-LA FLORA)9 | | | | | |
| | K0+000,00 | | 8,00 | 2,30 | 18,41 | |
| | | 1,25 | | | | 20,07 |
| | K0+001,25 | | 7,83 | 1,75 | 13,70 | |
| | | 6,29 | | | | 64,19 |
| | K0+007,54 | | 4,07 | 1,65 | 6,71 | |
| | | 6,32 | | | | 39,75 |
| | K0+013,86 | | 3,91 | 1,50 | 5,87 | |
| | | 6,32 | | | | 51,51 |
| | K0+020,18 | | 5,49 | 1,90 | 10,43 | |
| | | 1,37 | | | | 15,39 |
| | K0+021,55 | | 5,47 | 2,20 | 12,03 | |
| | TRAMO P(K36-LA FLORA)9 & P(K36-LA FLORA)10 | | | | | |
| | K0+000,00 | | 5,47 | 2,20 | 12,03 | |
| | | 1,25 | | | | 12,10 |
| | K0+001,25 | | 5,24 | 1,40 | 7,33 | |
| | | 6,31 | | | | 38,24 |
| | K0+007,56 | | 3,42 | 1,40 | 4,79 | |
| | | 6,32 | | | | 29,48 |
| | K0+013,88 | | 3,03 | 1,50 | 4,54 | |
| | | 6,23 | | | | 28,91 |
| | K0+020,11 | | 3,16 | 1,50 | 4,74 | |
| | | 6,27 | | | | 30,75 |
| | K0+026,38 | | 2,98 | 1,70 | 5,07 | |
| | | 6,29 | | | | 32,14 |
| | K0+032,67 | | 3,43 | 1,50 | 5,15 | |
| | | 5,26 | | | | 36,53 |
| | K0+037,93 | | 5,14 | 1,70 | 8,74 | |
| | | 1,33 | | | | 11,90 |
| | K0+039,26 | | 5,38 | 1,70 | 9,15 | |
| | TRAMO P(K36-LA FLORA)10 & P(K36-LA FLORA)10A | | | | | |
| | K0+000,00 | | 5,38 | 1,70 | 9,15 | |
| | | 1,25 | | | | 9,61 |
| | K0+001,25 | | 5,18 | 1,20 | 6,22 | |
| | | 6,31 | | | | 32,18 |
| | K0+007,56 | | 3,32 | 1,20 | 3,98 | |
| | | 6,25 | | | | 21,63 |
| | K0+013,81 | | 3,27 | 0,90 | 2,94 | |
| | | 6,36 | | | | 17,08 |
| | K0+020,17 | | 3,04 | 0,80 | 2,43 | |
| | | 6,34 | | | | 18,67 |

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)1 & P(K36-LA FLORA)2


## K0+000.00

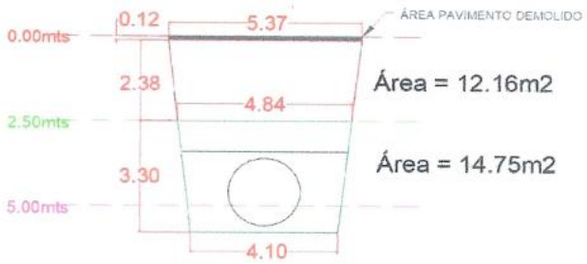



## K0+004.00




## K0+007.50





## K0+014.47

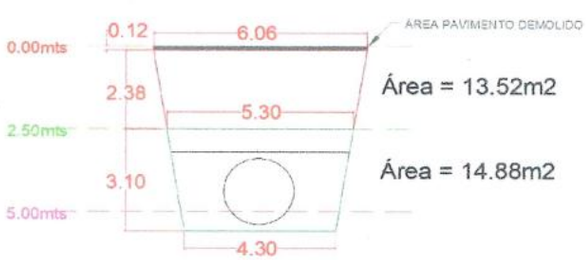


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | K0+026,51 | | 3,84 | 0,90 | 3,46 | |
| | | 1,45 | | | | 5,87 |
| | K0+027,96 | | 3,87 | 1,20 | 4,64 | |
| TRAMO P(K36-LA FLORA)10A & P(K36-LA FLORA)11 | | | | | | |
| | K0+000,00 | | 3,04 | 0,80 | 2,43 | |
| | | 1,25 | | | | 3,68 |
| | K0+001,25 | | 3,45 | 1,00 | 3,45 | |
| | | 6,30 | | | | 25,26 |
| | K0+007,55 | | 3,52 | 1,30 | 4,57 | |
| | | 6,28 | | | | 29,80 |
| | K0+013,83 | | 3,51 | 1,40 | 4,92 | |
| | | 6,30 | | | | 35,15 |
| | K0+020,13 | | 3,67 | 1,70 | 6,24 | |
| | | 6,32 | | | | 43,92 |
| | K0+026,45 | | 3,83 | 2,00 | 7,66 | |
| | | 1,25 | | | | 11,29 |
| | K0+027,70 | | 5,20 | 2,00 | 10,40 | |
| TOTAL EXCAVACIÓN DE 2,51MTS A 5,00MTS DE PROFUNDIDAD, PARA RED PEAD 1800MM DESDE P(K36-LA FLORA)1 (K0+030) A P(K36-LA FLORA)11 (K0+351) | | | | | | 2.753,32 |
| **TOTAL ACTA #12 - E.C.A.L. EN TIERRA DE 2,51MTS A 5,00MTS DE PROFUNDIDAD, PARA RED PEAD 1800MM DESDE P(K36-LA FLORA)1 (K0+030) A P(K36-LA FLORA)11 (K0+351) (80%)** | | | | | | **2202,66** |

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)2 & P(K36-LA FLORA)3


K0+000.00

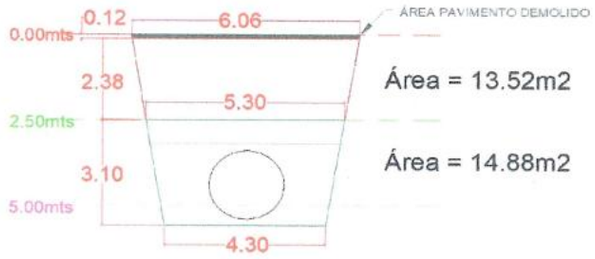


Área = 13.52m2

Área = 14.88m2


K0+003.00




Área = 11.42m2

Área = 5.50m2


K0+005.00




Área = 11.59m2

Área = 5.42m2


K0+011.30




Área = 12.01m2

Área = 7.56m2

K0+012.60





Área = 12.11m2

Área = 8.84m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)3 & P(K36-LA FLORA)4


K0+000.0




Área = 12.11m2

Área = 8.84m2


K0+001.25




Área = 10.00m2

Área = 8.43m2


K0+007.75

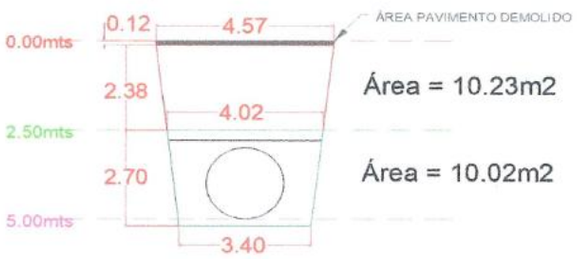


Área = 10.23m2

Área = 10.02m2


K0+012.89

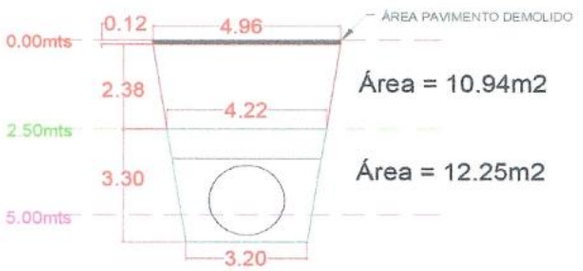


Área = 10.94m2

Área = 12.25m2

K0+019.19

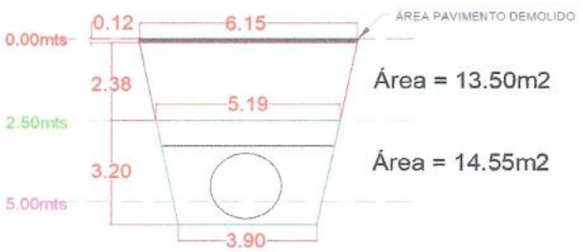



Área = 13.50m2

Área = 14.55m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)3 & P(K36-LA FLORA)4

K0+024.32





Área = 13.58m2

Área = 14.33m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)4 & P(K36-LA FLORA)5


K0+000.00




Área = 13.58m2

Área = 14.33m2


K0+001.25




Área = 13.43m2

Área = 14.61m2


K0+007.57

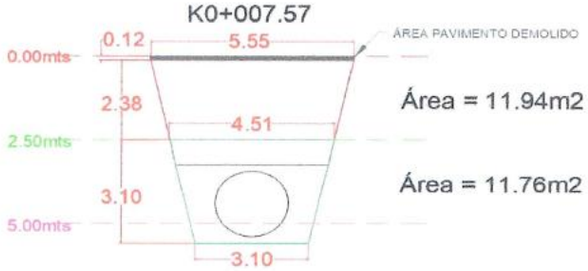


Área = 11.94m2

Área = 11.76m2

K0+013.97

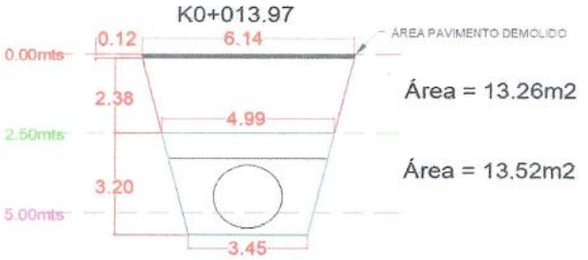



Área = 13.26m2

Área = 13.52m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)4 & P(K36-LA FLORA)5


K0+020.25




Área = 12.99m2

Área = 12.41m2


K0+026.51




Área = 12.53m2

Área = 12.72m2


K0+032.81




Área = 12.89m2

Área = 13.00m2

K0+034.06

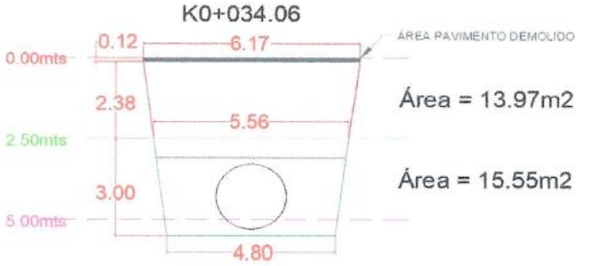



Área = 13.97m2

Área = 15.55m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)5 & P(K36-LA FLORA)6

K0+000.0





Área = 13.58m2

Área = 14.33m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)5 & P(K36-LA FLORA)6

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)5 & P(K36-LA FLORA)6

K0+001.25




Área = 14.00m2

Área = 11.34m2


K0+033.010




Área = 14.15m2

Área = 12.76m2

K0+007.720

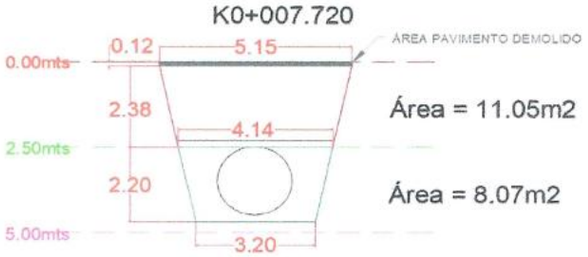


Área = 11.05m2

Área = 8.07m2


K0+039.33




Área = 13.20m2

Área = 13.16m2

K0+014.040




Área = 10.56m2

Área = 6.67m2


K0+045.63




Área = 12.93m2

Área = 10.98m2

K0+020.36

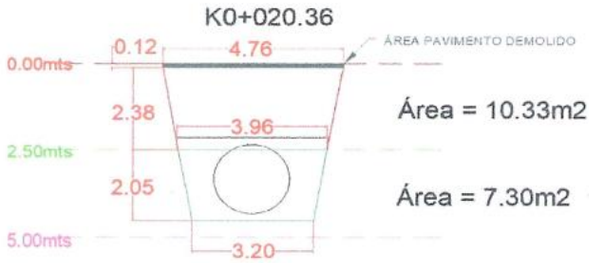


Área = 10.33m2

Área = 7.30m2


K0+049.77




Área = 12.34m2

Área = 7.65m2

K0+026.67

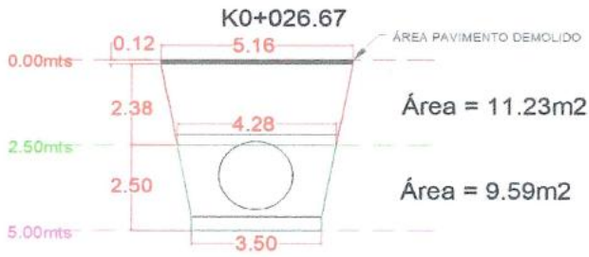


Área = 11.23m2

Área = 9.59m2

K0+053.90





Área = 13.74m2

Área = 9.47m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)5 & P(K36-LA FLORA)6

K0+054.90





PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)6 & P(K36-LA FLORA)7


K0+000.0





K0+001.45




K0+007.77

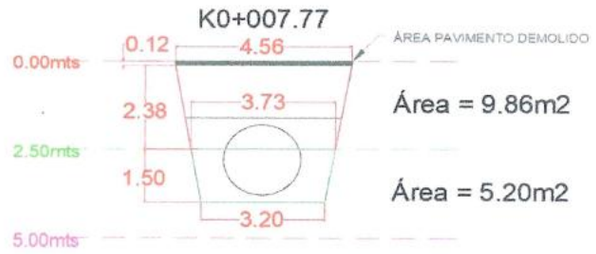



K0+014.22





PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)6 & P(K36-LA FLORA)7


K0+020.55




K0+026.73




K0+033.04

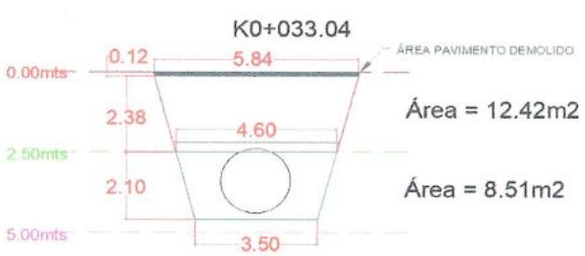


K0+034.02




PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)7 & P(K36-LA FLORA)8

K0+000.00



PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)7 & P(K36-LA FLORA)8

K0+001.25




Área = 14.27m2

Área = 9.12m2

K0+007.69




Área = 11.94m2

Área = 6.71m2

K0+014.00




Área = 13.14m2

Área = 7.40m2

K0+020.30




Área = 13.11m2

Área = 7.64m2

K0+026.59




Área = 13.21m2

Área = 7.59m2

K0+031.80




Área = 21.31m2

Área = 18.36m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)7 & P(K36-LA FLORA)8

K0+033.05





Área = 21.49m2

Área = 18.41m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)8 & P(K36-LA FLORA)9

K0+000.00




Área = 21.49m2

Área = 18.41m2


K0+001.25




Área = 21.21m2

Área = 13.70m2


K0+007.54




Área = 14.18m2

Área = 6.71m2

K0+013.86




Área = 11.85m2

Área = 5.87m2

K0+020.18





Área = 14.85m2

Área = 10.43m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)8 & P(K36-LA FLORA)9

K0+021.55





PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)9 & P(K36-LA FLORA)10

K0+020.11





PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)9 & P(K36-LA FLORA)10

K0+000.00




K0+026.38





K0+001.25




K0+032.67




K0+007.56




K0+037.93




K0+013.88





K0+039.26



PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)10 & P(K36-LA FLORA)10A

K0+000.00




K0+001.25




K0+007.56




K0+013.81





K0+020.17





PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)10 & P(K36-LA FLORA)10A

K0+026.51

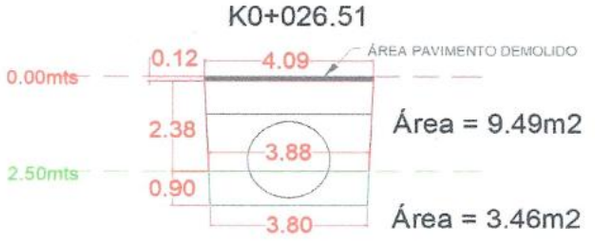



K0+027.96

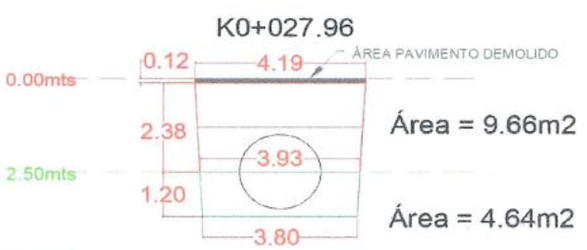



PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)10A & P(K36-LA FLORA)11


K0+000.00




K0+001.25

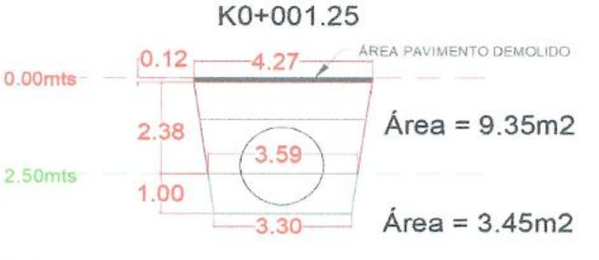



K0+007.55

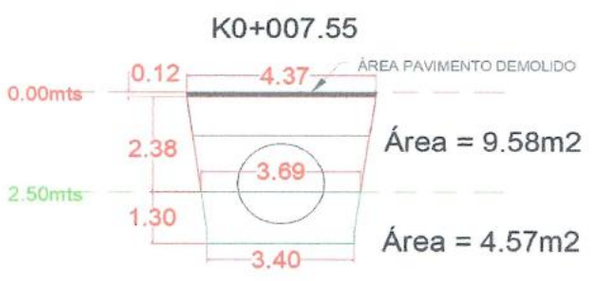


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)10A & P(K36-LA FLORA)11


## K0+013.83

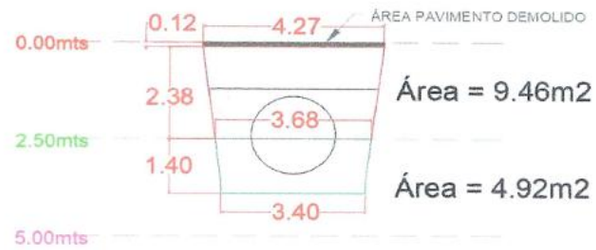


## K0+020.13

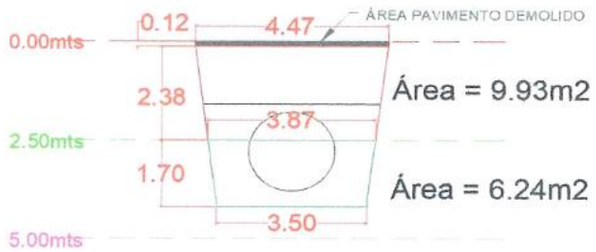


## K0+026.45

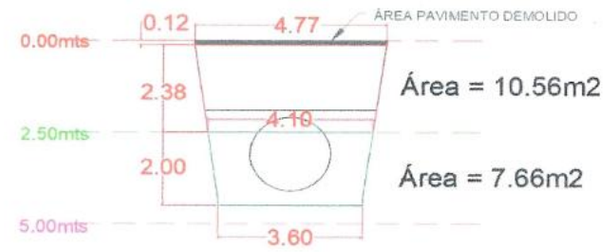


## K0+027.70




**OBSERVACIONES:**

| PRESENTE ACTA 12 | | ACUMULADO | | | TOTALES | 2.202,66 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | % EJECUTADO | | |
| 2.202,66 | $ 94.520.545,92 | 2.202,66 | $ 94.520.545,92 | 73,38% | | |

**CONTRATISTA:** CONSORCIO LA FLORA 2023

**Firma:**

REPRESENTANTE LEGAL

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

**Firma:**

REPRESENTANTE LEGAL

| Secretaria de Infraestructura Fisica<br>Alcaldía de Bucaramanga | Alcaldía de Bucaramanga | Consorcio La Flora 2023 | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA |
|---|---|---|---|

| FECHA | DD | 23 | MM | 12 | AAAA | 2025 | ACTA No. | 12 | ELABORÓ | DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO LA FLORA 2023 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA |

**CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.01.01.4 B | Excavación con acarreo libre | En material granular sin entibados | De 2.51 a 5.00 m de profundidad | UNIDAD | m3 |

**ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN**


**REGISTRO FOTOGRÁFICO**








| | Abscisado | DIMENSIONES Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Área (m2) | Volumen (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **ACTA #12** | | | | | | |
| **BARRIO SAN MARTIN** | | | | | | |
| **EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+273,8 A K4+323.** | | | | | | |
| MOD 92 | K4+323,00 | | 16,56 | 2,50 | 41,41 | |
| | | 13,00 | | | | 609,38 |
| MOD 93 | K4+310,00 | | 20,94 | 2,50 | 52,34 | |
| | | 10,00 | | | | 536,15 |
| MOD 94 | K4+300,00 | | 21,96 | 2,50 | 54,89 | |
| | | 10,00 | | | | 421,15 |
| MOD 95 | K4+290,00 | | 11,74 | 2,50 | 29,34 | |
| | | 10,00 | | | | 336,35 |
| MOD 96 | K4+280,00 | | 15,17 | 2,50 | 37,93 | |
| | | 6,20 | | | | 212,29 |
| MOD 97 | K4+273,80 | | 12,22 | 2,50 | 30,55 | |
| **SUBTOTAL EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+273,8 A K4+323.** | | | | | | 2.115,32 |
| **SUBTOTAL "A" EXCAVACIÓN PARA BOX E.C.A.L EN MATERIAL GRANULAR SIN ENTIBADOS DE 2,51 A 5,00MTS DE PROFUNDIDAD (80%)** | | | | | | **1692,26** |
| **EXCAVACIÓN RED ALCANTARILLADO MIXTO DENTRO DEL PARQUE EXTREMO** | | | | | | |
| DE POZO "PQ-EXTRE3" AL POZO "PQ-EXTRE2" | | | | | | |
| | 0,00 | | 1,75 | 1,26 | 2,20 | |
| | | 6,67 | | | | 13,14 |
| | 6,67 | | 1,58 | 1,10 | 1,74 | |
| DE POZO "PQ-EXTRE2" AL POZO "PQ-EXTRE1" | | | | | | |
| | 0,00 | | 1,75 | 1,30 | 2,27 | |
| | | 7,12 | | | | 15,91 |
| | 7,12 | | 1,75 | 1,26 | 2,20 | |
| DE POZO "PQ-EXTRE1" AL POZO "IN-EST-SEP 1(PQ-EXTRE)" | | | | | | |
| | 0,00 | | 1,68 | 1,31 | 2,20 | |
| | | 2,30 | | | | 5,14 |
| | 2,30 | | 1,75 | 1,30 | 2,27 | |
| **SUBTOTAL EXCAVACIÓN DE POZO "PQ-EXTRE3" AL POZO "PQ-EXTRE2"** | | | | | | 34,19 |
| **SUBTOTAL "B" EXCAVACIÓN DE POZO "PQ-EXTRE3" AL POZO "PQ-EXTRE2" (100%)** | | | | | | **34,19** |
| **ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN 7** | | | | | | |
| EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN No.03 UBICADA EN K4+910 | | | | | | |
| | 0,00 | | 5,97 | 1,04 | 6,21 | |
| | | 6,50 | | | | 26,03 |
| | 6,50 | | 1,84 | 0,98 | 1,80 | |
| **SUBTOTAL EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN No.03 UBICADA EN K4+910** | | | | | | 26,03 |
| **SUBTOTAL "C" EXCAVACIÓN ARA ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN No.03 UBICADA EN K4+910 (100%)** | | | | | | **26,03** |
| **TOTAL ACTA #12 E.C.A.L EN TIERRA SIN ENTIBADOS DE 2,51 A 5,00MTS DE PROFUNDIDAD (SUMA DE SUBTOTALES "A" +"B" + "C")** | | | | | | **1.752,48** |


BARRIO SAN MARTIN - SECCIONES EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+323 A K4+273,8

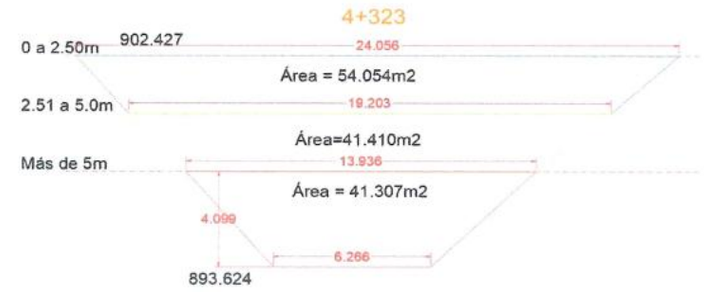





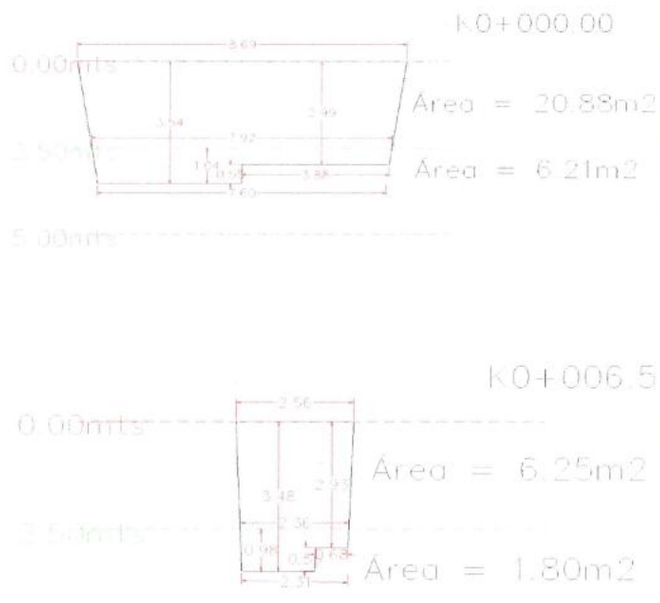


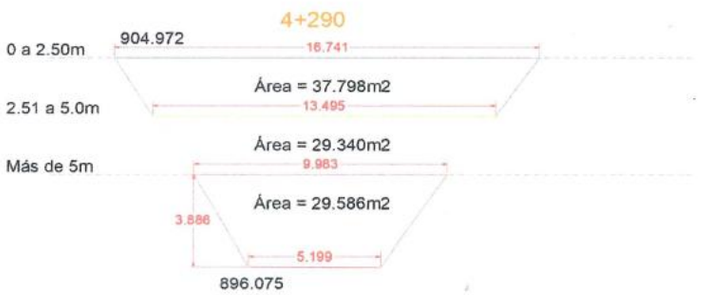
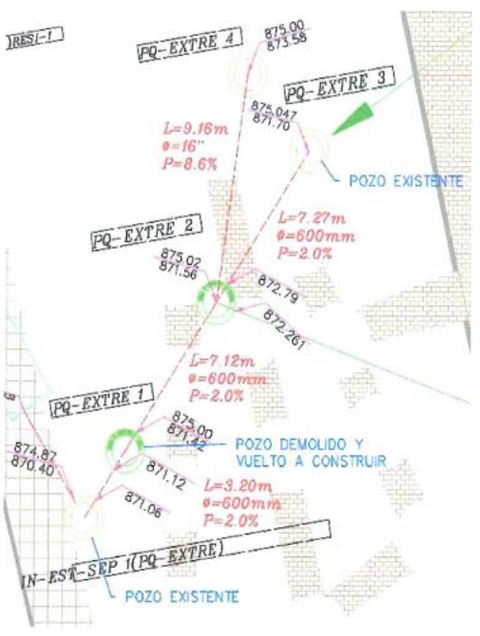

BARRIO SAN MARTIN - SECCIONES EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+323 A K4+273,8

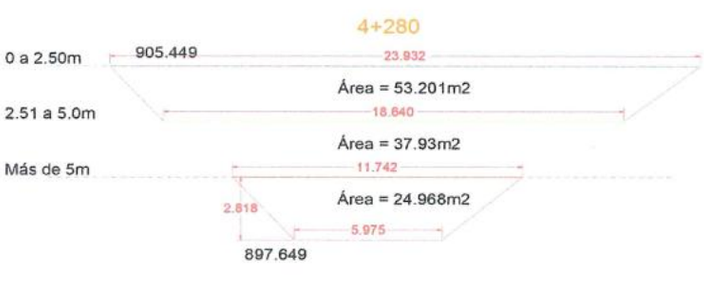


BARRIO SAN MARTIN - SECCIONES EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN No. 7, ABSCISA K4+645

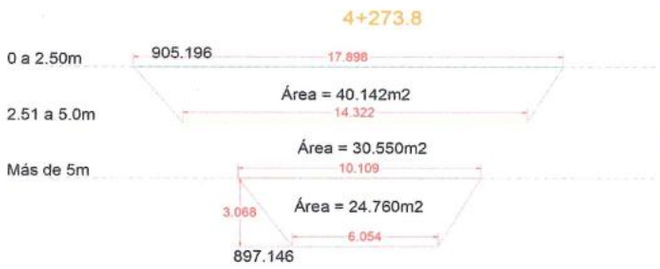



BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMA RED ALCANTARILLADO MIXTO DENTRO DEL PARQUE EXTREMO




BARRIO SAN MARTIN - SECCIONES EXCAVACIÓN RED ALCANTARILLADO MIXTO DENTRO DEL PARQUE EXTREMO DE POZO "PQ-EXTRE3" AL POZO "PQ-EXTRE2"

K0+000.00

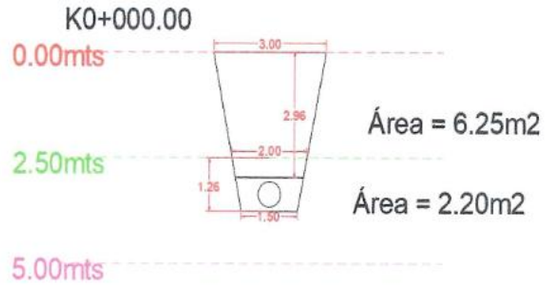



K0+006.67

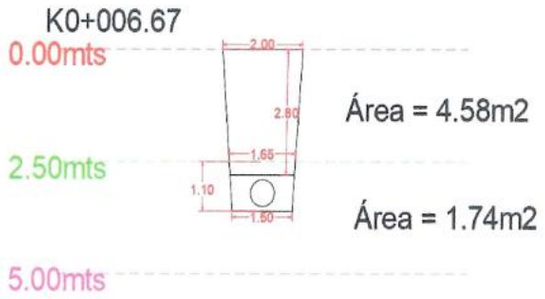



BARRIO SAN MARTIN - SECCIONES EXCAVACIÓN RED ALCANTARILLADO MIXTO DENTRO DEL PARQUE EXTREMO DE POZO "PQ-EXTRE2" AL POZO "PQ-EXTRE1"

K0+000.00

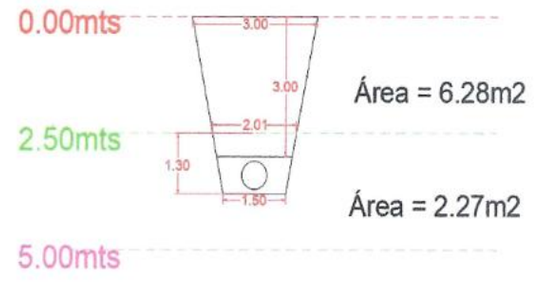



K0+007.12

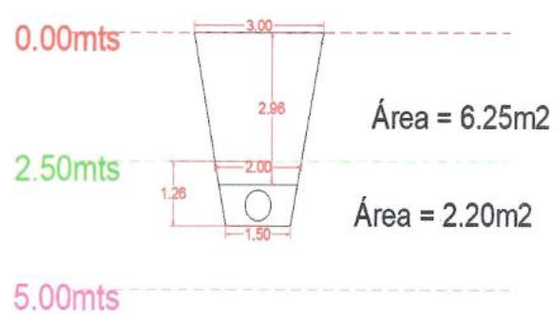



BARRIO SAN MARTIN - SECCIONES EXCAVACIÓN RED ALCANTARILLADO MIXTO DENTRO DEL PARQUE EXTREMO DE POZO "PQ-EXTRE1" AL POZO "IN-EST-SEP 1(PQ-EXTRE)"

K0+000.00




K0+002.30

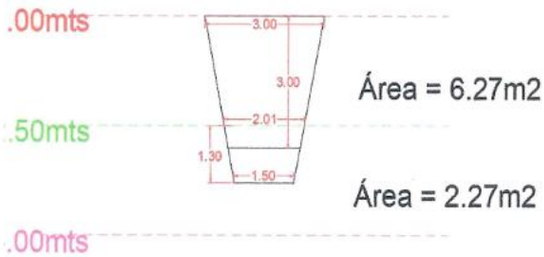


| OBSERVACIONES: | PRESENTE ACTA 12 | | ACUMULADO | | | TOTALES | 1.752,48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | % EJECUTAD | | |
| | 1.752,48 | $ 78.169.370,40 | 17.490,88 | $ 780.180.702,40 | 100,00% | | |

**CONTRATISTA:** CONSORCIO LA FLORA 2023

**Firma:**

REPRESENTANTE LEGAL

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACIÓN BGA

**Firma:**

REPRESENTANTE LEGAL

| Secretaria de Infraestructura Fisica<br>Alcaldía de Bucaramanga | Alcaldía de Bucaramanga | Consorcio La Flora 2023 | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA |
|---|---|---|---|

| FECHA | DD | 23 | MM | 12 | AAAA | 2025 | ACTA No. | 12 | ELABORÓ | DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO LA FLORA 2023 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA |

**CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01.01.01.4 C | Excavación con acarreo libre | En material granular sin entibados | A más de 5.00 m de profundidad | UNIDAD | m3 |

**ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

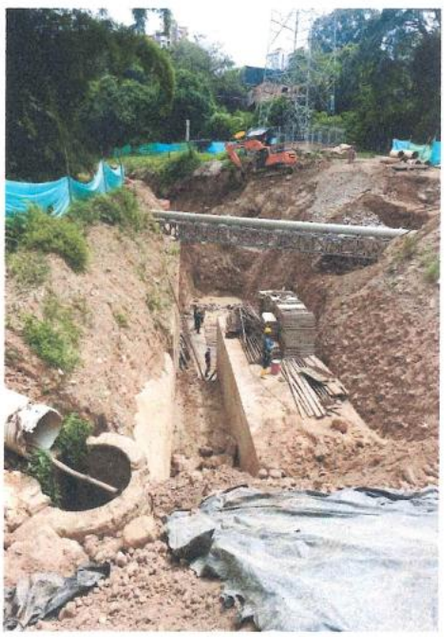






| | Abscisado | DIMENSIONES Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Área (m2) | Volumen (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA #12** | | | | | | |
| **BARRIO SAN MARTIN** | | | | | | |
| **EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+273,8 A K4+323.** | | | | | | |
| MOD 92 | K4+323,00 | | 10,08 | 4,10 | 41,31 | |
| | | 13,00 | | | | 623,94 |
| MOD 93 | K4+310,00 | | 12,18 | 4,49 | 54,68 | |
| | | 10,00 | | | | 652,80 |
| MOD 94 | K4+300,00 | | 14,65 | 5,18 | 75,88 | |
| | | 10,00 | | | | 527,35 |
| MOD 95 | K4+290,00 | | 7,61 | 3,89 | 29,59 | |
| | | 10,00 | | | | 272,80 |
| MOD 96 | K4+280,00 | | 8,85 | 2,82 | 24,97 | |
| | | 6,20 | | | | 154,16 |
| MOD 97 | K4+273,80 | | 8,07 | 3,07 | 24,76 | |
| **SUBTOTAL EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+273,8 A K4+323.** | | | | | | 2.231,05 |
| **TOTAL ACTA #12 E.C.A.L EN TIERRA SIN ENTIBADOS A MÁS DE 5,00MTS DE PROFUNDIDAD (80%)** | | | | | | **1784,84** |

BARRIO SAN MARTIN - SECCIONES EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+323 A K4+273,8

BARRIO SAN MARTIN - SECCIONES EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+323 A K4+273,8

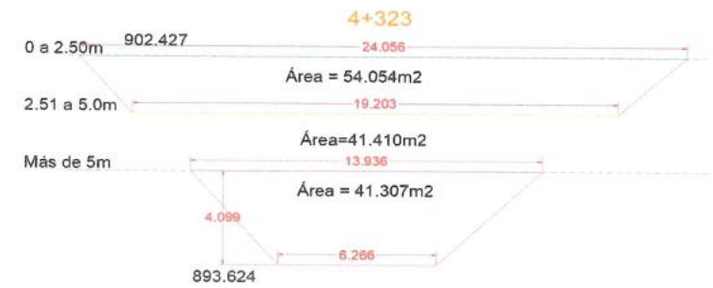











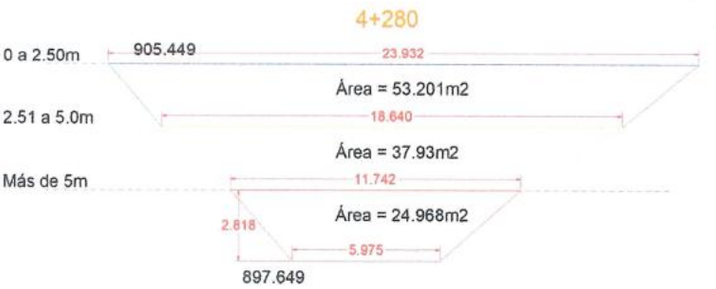
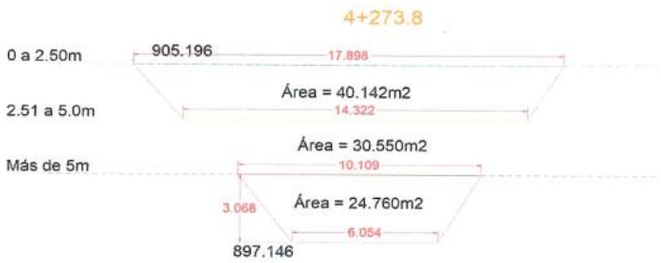
| OBSERVACIONES: | PRESENTE ACTA 12 | | ACUMULADO | | | TOTALES | 1.784,84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | % EJECUTAD | | |
| | 1.784,84 | $ 123.719.754,28 | 13.858,16 | $ 960.606.076,72 | 100,00% | | |

**CONTRATISTA:** CONSORCIO LA FLORA 2023

**Firma:** REPRESENTANTE LEGAL

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

**Firma:** REPRESENTANTE LEGAL

| Secretaria de Infraestructura Fisica<br>Alcaldía de Bucaramanga | Alcaldía de Bucaramanga | Consorcio La Flora 2023 | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA |
|---|---|---|---|

| FECHA | DD | 23 | MM | 12 | AAAA | 2025 | ACTA No. | 12 | ELABORÓ | DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| ENTIDAD CONTRATANTE: | ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO LA FLORA 2023 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA |


**CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRA**

| 2.01.01.01.5 | Excavación con acarreo libre | En roca a cualquier profundidad | UNIDAD | m3 |
|---|---|---|---|---|

**ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**




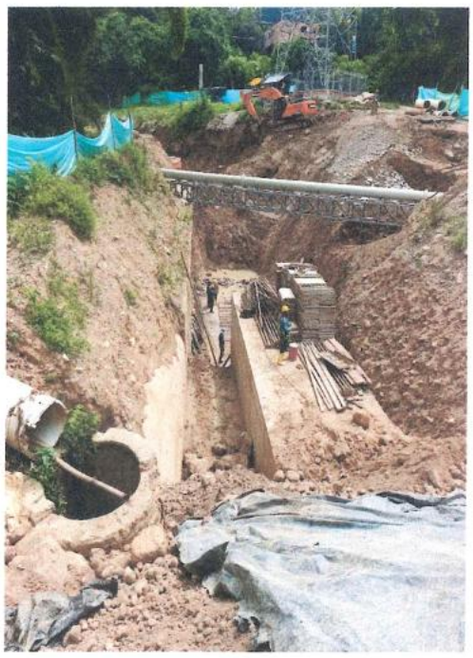






| | Abscisado local (m) | DIMENSIONES Longitud (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Área (m2) | Volumen (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ACTA #12** | | | |
| | | | **BARRIO SAN MARTIN** | | | |
| | | | **BOX-CULVERT DE K4+273,8 A K4+323.** | | | |
| MOD 92 | K4+323,00 | | 15,03 | 9,10 | 136,77 | |
| | | 13,00 | | | | 2.026,83 |
| MOD 93 | K4+310,00 | | 18,45 | 9,49 | 175,05 | |
| | | 10,00 | | | | 1.866,25 |
| MOD 94 | K4+300,00 | | 19,47 | 10,18 | 198,20 | |
| | | 10,00 | | | | 1.474,65 |
| MOD 95 | K4+290,00 | | 10,88 | 8,89 | 96,73 | |
| | | 10,00 | | | | 1.064,15 |
| MOD 96 | K4+280,00 | | 14,85 | 7,82 | 116,10 | |
| | | 6,20 | | | | 655,80 |
| MOD 97 | K4+273,80 | | 11,83 | 8,07 | 95,45 | |
| TOTAL EXCAVACIÓN A CUALQUIER PROFUNDIDAD, BOX-CULVERT DE K4+273,8 A K4+323 | | | | | | 7.087,68 |
| **SUBTOTAL "A" - E.C.A.L. EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, PARA BOX-CULVERT DE K4+273,8 A K4+323. (20%)** | | | | | | **1417,54** |
| | | | **CARRERA 36** | | | |
| | | | **RED PEAD 1800MM DESDE P(K36-LA FLORA)1 (K0+030) A P(K36-LA FLORA)11 (K0+351)** | | | |
| | | | MANEJO DE AGUAS CARRERA 36 (DESCOLE) | | | |
| | K0+000,00 | | 1,33 | 0,78 | 1,04 | |
| | | 3,99 | | | | 5,77 |
| | K0+003,99 | | 1,34 | 1,38 | 1,85 | |
| | | 4,34 | | | | 10,96 |
| | K0+008,33 | | 1,34 | 2,38 | 3,20 | |
| | | 4,34 | | | | 15,36 |
| | K0+012,67 | | 1,35 | 2,88 | 3,88 | |
| | | 4,32 | | | | 17,34 |
| | K0+016,99 | | 1,35 | 3,08 | 4,15 | |
| | | 8,68 | | | | 41,27 |
| | K0+025,67 | | 1,54 | 3,48 | 5,36 | |
| | | 4,33 | | | | 26,15 |
| | K0+030,00 | | 1,69 | 3,98 | 6,72 | |
| | | | TRAMO P(K36-LA FLORA)1 & P(K36-LA FLORA)2 | | | |
| | K0+000,00 | | 4,74 | 5,68 | 26,91 | |
| | | 4,00 | | | | 95,14 |
| | K0+004,00 | | 4,61 | 4,48 | 20,66 | |
| | | 3,50 | | | | 74,80 |
| | K0+007,50 | | 4,93 | 4,48 | 22,08 | |
| | | 6,97 | | | | 175,92 |
| | K0+014,47 | | 5,18 | 5,48 | 28,40 | |
| | | | TRAMO P(K36-LA FLORA)2 & P(K36-LA FLORA)3 | | | |
| | K0+000,00 | | 5,18 | 5,48 | 28,40 | |
| | | 3,00 | | | | 67,98 |
| | K0+003,00 | | 4,48 | 3,78 | 16,92 | |
| | | 2,00 | | | | 33,93 |
| | K0+005,00 | | 4,50 | 3,78 | 17,01 | |
| | | 6,30 | | | | 115,23 |
| | K0+011,30 | | 4,57 | 4,28 | 19,57 | |
| | | 1,30 | | | | 26,34 |
| | K0+012,60 | | 4,57 | 4,58 | 20,95 | |
| | | | TRAMO P(K36-LA FLORA)3 & P(K36-LA FLORA)4 | | | |
| | K0+000,00 | | 4,57 | 4,58 | 20,95 | |
| | | 1,25 | | | | 25,59 |
| | K0+001,25 | | 4,27 | 4,68 | 20,00 | |
| | | 6,50 | | | | 131,50 |
| | K0+007,75 | | 4,03 | 5,08 | 20,46 | |
| | | 5,14 | | | | 112,18 |
| | K0+012,89 | | 4,08 | 5,68 | 23,19 | |
| | | 6,30 | | | | 161,41 |
| | K0+019,19 | | 5,03 | 5,58 | 28,05 | |
| | | 5,13 | | | | 143,54 |
| | K0+024,32 | | 5,39 | 5,18 | 27,91 | |
| | | | TRAMO P(K36-LA FLORA)4 & P(K36-LA FLORA)5 | | | |
| | K0+000,00 | | 5,39 | 5,18 | 27,91 | |
| | | 1,25 | | | | 34,97 |

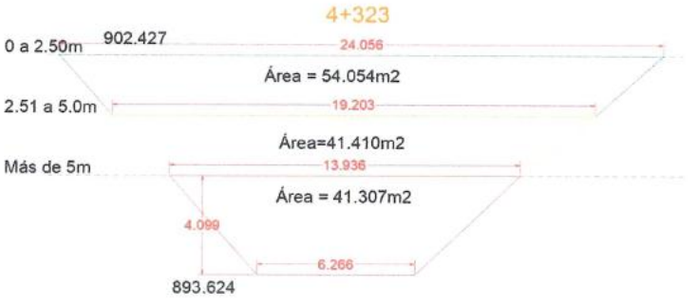
BARRIO SAN MARTIN - SECCIONES EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+323 A K4+273,8









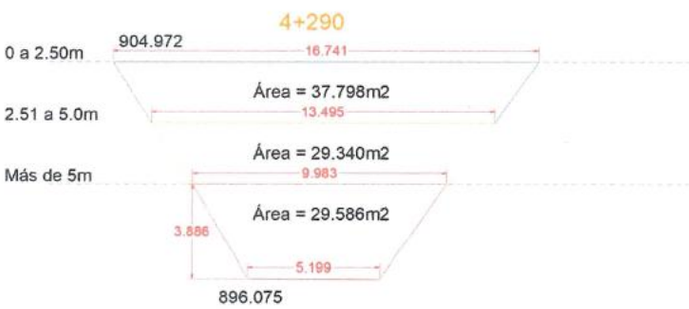



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | K0+001,25 | | 4,94 | 5,68 | 28,04 | |
| | | 6,32 | | | | 163,50 |
| | K0+007,57 | | 4,32 | 5,48 | 23,70 | |
| | | 6,40 | | | | 161,54 |
| | K0+013,97 | | 4,80 | 5,58 | 26,78 | |
| | | 6,28 | | | | 163,85 |
| | K0+020,25 | | 4,72 | 5,38 | 25,40 | |
| | | 6,26 | | | | 158,53 |
| | K0+026,51 | | 4,78 | 5,28 | 25,25 | |
| | | 6,30 | | | | 161,09 |
| | K0+032,81 | | 4,72 | 5,48 | 25,89 | |
| | | 1,25 | | | | 34,63 |
| | K0+034,06 | | 5,49 | 5,38 | 29,52 | |
| | TRAMO P(K36-LA FLORA)5 & P(K36-LA FLORA)6 | | | | | |
| | K0+000,00 | | 5,39 | 5,18 | 27,91 | |
| | | 1,25 | | | | 33,28 |
| | K0+001,25 | | 5,53 | 4,58 | 25,34 | |
| | | 6,47 | | | | 143,83 |
| | K0+007,72 | | 4,17 | 4,58 | 19,12 | |
| | | 6,32 | | | | 114,87 |
| | K0+014,04 | | 4,03 | 4,28 | 17,23 | |
| | | 6,32 | | | | 110,16 |
| | K0+020,36 | | 3,98 | 4,43 | 17,63 | |
| | | 6,31 | | | | 121,31 |
| | K0+026,67 | | 4,27 | 4,88 | 20,82 | |
| | | 6,34 | | | | 151,30 |
| | K0+033,01 | | 5,39 | 4,99 | 26,91 | |
| | | 6,32 | | | | 168,33 |
| | K0+039,33 | | 5,19 | 5,08 | 26,36 | |
| | | 6,30 | | | | 158,35 |
| | K0+045,63 | | 4,90 | 4,88 | 23,91 | |
| | | 4,14 | | | | 90,87 |
| | K0+049,77 | | 4,56 | 4,38 | 19,99 | |
| | | 4,13 | | | | 89,21 |
| | K0+053,90 | | 4,96 | 4,68 | 23,21 | |
| | | 1,00 | | | | 24,67 |
| | K0+054,90 | | 5,58 | 4,68 | 26,12 | |
| | TRAMO P(K36-LA FLORA)6 & P(K36-LA FLORA)7 | | | | | |
| | K0+000,00 | | 5,58 | 4,68 | 26,12 | |
| | | 1,45 | | | | 35,02 |
| | K0+001,45 | | 5,58 | 3,98 | 22,19 | |
| | | 6,32 | | | | 117,71 |
| | K0+007,77 | | 3,88 | 3,88 | 15,06 | |
| | | 6,45 | | | | 100,23 |
| | K0+014,22 | | 3,93 | 4,08 | 16,02 | |
| | | 6,33 | | | | 109,89 |
| | K0+020,55 | | 4,47 | 4,18 | 18,70 | |
| | | 6,18 | | | | 122,36 |
| | K0+026,73 | | 4,77 | 4,38 | 20,90 | |
| | | 6,31 | | | | 131,97 |
| | K0+033,04 | | 4,67 | 4,48 | 20,93 | |
| | | 0,98 | | | | 23,24 |
| | K0+034,02 | | 5,79 | 4,58 | 26,50 | |
| | TRAMO P(K36-LA FLORA)7 & P(K36-LA FLORA)8 | | | | | |
| | K0+000,00 | | 5,79 | 4,58 | 26,50 | |
| | | 1,25 | | | | 31,18 |
| | K0+001,25 | | 5,73 | 4,08 | 23,39 | |
| | | 6,44 | | | | 135,37 |
| | K0+007,69 | | 4,57 | 4,08 | 18,65 | |
| | | 6,31 | | | | 123,64 |
| | K0+014,00 | | 4,91 | 4,18 | 20,54 | |
| | | 6,30 | | | | 130,06 |
| | K0+020,30 | | 4,96 | 4,18 | 20,75 | |
| | | 6,29 | | | | 130,67 |
| | K0+026,59 | | 4,86 | 4,28 | 20,80 | |
| | | 5,21 | | | | 157,52 |
| | K0+031,80 | | 8,48 | 4,68 | 39,67 | |
| | | 1,25 | | | | 49,73 |
| | K0+033,05 | | 8,53 | 4,68 | 39,90 | |
| | TRAMO P(K36-LA FLORA)8 & P(K36-LA FLORA)9 | | | | | |
| | K0+000,00 | | 8,53 | 4,68 | 39,90 | |
| | | 1,25 | | | | 46,76 |
| | K0+001,25 | | 8,45 | 4,13 | 34,91 | |
| | | 6,29 | | | | 175,49 |
| | K0+007,54 | | 5,18 | 4,03 | 20,89 | |
| | | 6,32 | | | | 122,01 |
| | K0+013,86 | | 4,57 | 3,88 | 17,72 | |
| | | 6,32 | | | | 135,88 |
| | K0+020,18 | | 5,91 | 4,28 | 25,28 | |
| | | 1,37 | | | | 35,54 |
| | K0+021,55 | | 5,81 | 4,58 | 26,61 | |
| | TRAMO P(K36-LA FLORA)9 & P(K36-LA FLORA)10 | | | | | |
| | K0+000,00 | | 5,81 | 4,58 | 26,61 | |
| | | 1,25 | | | | 30,39 |
| | K0+001,25 | | 5,82 | 3,78 | 22,01 | |
| | | 6,31 | | | | 115,13 |
| | K0+007,56 | | 3,83 | 3,78 | 14,48 | |
| | | 6,32 | | | | 87,69 |
| | K0+013,88 | | 3,42 | 3,88 | 13,27 | |
| | | 6,23 | | | | 82,77 |
| | K0+020,11 | | 3,43 | 3,88 | 13,30 | |


BARRIO SAN MARTIN - SECCIONES EXCAVACIÓN PARA BOX-CULVERT DE K4+323 A K4+273,8

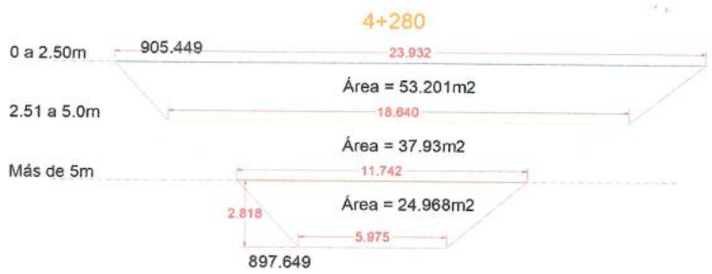

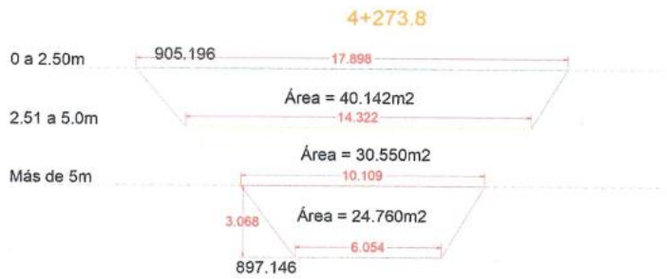
PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - MANEJO DE AGUAS CARRERA 36 (DESCOLE)

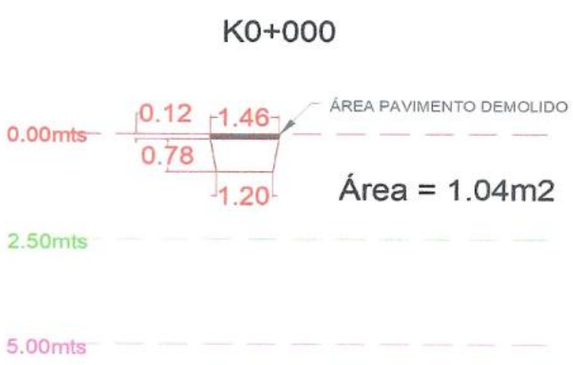




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6,27 | | | | 83,11 |
| | K0+026,38 | | 3,24 | 4,08 | 13,21 | |
| | | 6,29 | | | | 86,39 |
| | K0+032,67 | | 3,68 | 3,88 | 14,26 | |
| | | 5,26 | | | | 95,92 |
| | K0+037,93 | | 5,44 | 4,08 | 22,21 | |
| | | 1,33 | | | | 30,06 |
| | K0+039,26 | | 5,64 | 4,08 | 23,00 | |
| | TRAMO P(K36-LA FLORA)10 & P(K36-LA FLORA)10A | | | | | |
| | K0+000,00 | | 5,64 | 4,08 | 23,00 | |
| | | 1,25 | | | | 26,76 |
| | K0+001,25 | | 5,54 | 3,58 | 19,82 | |
| | | 6,31 | | | | 103,83 |
| | K0+007,56 | | 3,66 | 3,58 | 13,09 | |
| | | 6,25 | | | | 77,41 |
| | K0+013,81 | | 3,56 | 3,28 | 11,68 | |
| | | 6,36 | | | | 71,84 |
| | K0+020,17 | | 3,43 | 3,18 | 10,91 | |
| | | 6,34 | | | | 75,64 |
| | K0+026,51 | | 3,95 | 3,28 | 12,95 | |
| | | 1,45 | | | | 19,76 |
| | K0+027,96 | | 3,99 | 3,58 | 14,30 | |
| | TRAMO P(K36-LA FLORA)10A & P(K36-LA FLORA)11 | | | | | |
| | K0+000,00 | | 3,43 | 3,18 | 10,91 | |
| | | 1,25 | | | | 14,82 |
| | K0+001,25 | | 3,79 | 3,38 | 12,80 | |
| | | 6,30 | | | | 84,89 |
| | K0+007,55 | | 3,85 | 3,68 | 14,15 | |
| | | 6,28 | | | | 89,58 |
| | K0+013,83 | | 3,80 | 3,78 | 14,38 | |
| | | 6,30 | | | | 96,23 |
| | K0+020,13 | | 3,96 | 4,08 | 16,17 | |
| | | 6,32 | | | | 108,67 |
| | K0+026,45 | | 4,16 | 4,38 | 18,22 | |
| | | 1,25 | | | | 26,93 |
| | K0+027,70 | | 5,68 | 4,38 | 24,86 | |
| | TOTAL EXCAVACIÓN A CUALQUIER PROFUNDIDAD, PARA RED PEAD 1800MM DESDE P(K36-LA FLORA)1 (K0+030) A P(K36-LA FLORA)11 (K0+351) | | | | | 6.686,79 |
| | **SUBTOTAL "B" - E.C.A.L. EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, PARA RED PEAD 1800MM DESDE P(K36-LA FLORA)1 (K0+030) A P(K36-LA FLORA)11 (K0+351) (20%)** | | | | | **1337,36** |
| | | | | | | - |
| | **TOTAL ACTA #12 - E.C.A.L EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD (SUMA DE SUBTOTALES "A" +"B")** | | | | | **2754,90** |

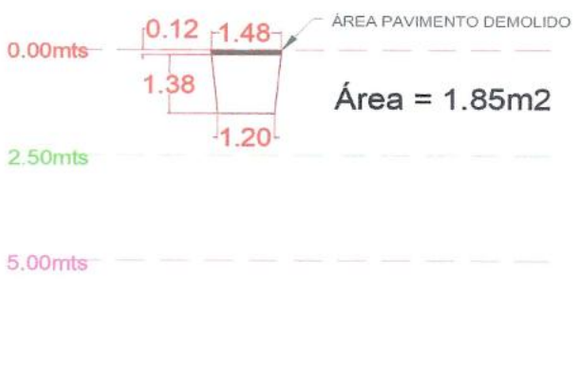PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - MANEJO DE AGUAS CARRERA 36 (DESCOLE)


## K0+008.33

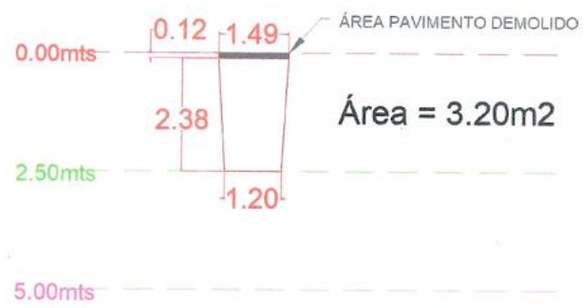



## K0+012.67

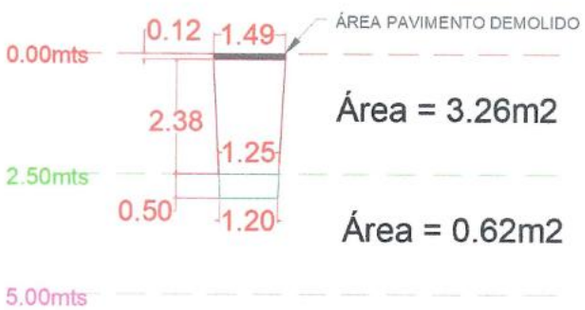


## K0+016.99

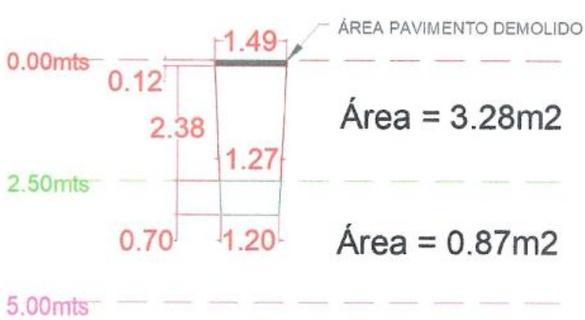



## K0+025.67

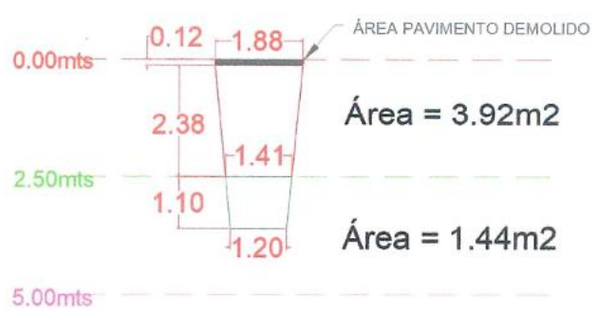



PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - MANEJO DE AGUAS CARRERA 36 (DESCOLE)

## K0+030.0

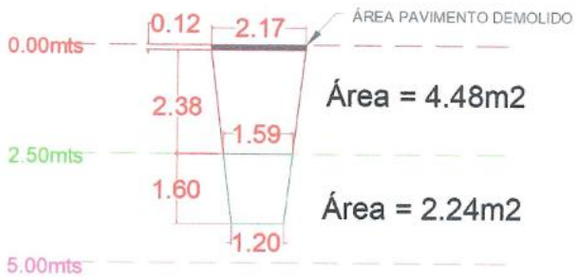



PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)1 & P(K36-LA FLORA)2


## K0+000.00

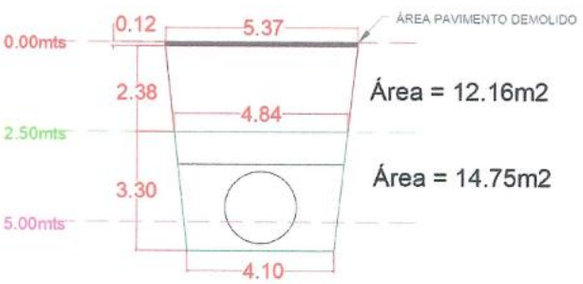



## K0+004.00

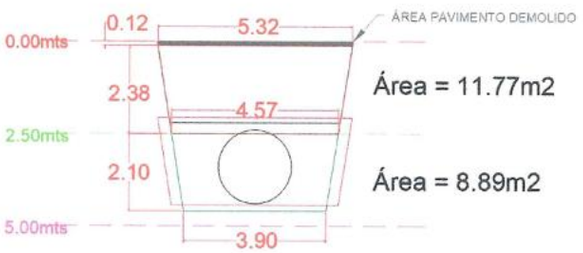


## K0+007.50





## K0+014.47

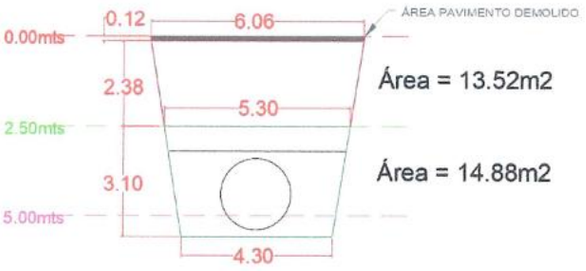


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)2 & P(K36-LA FLORA)3


K0+000.00

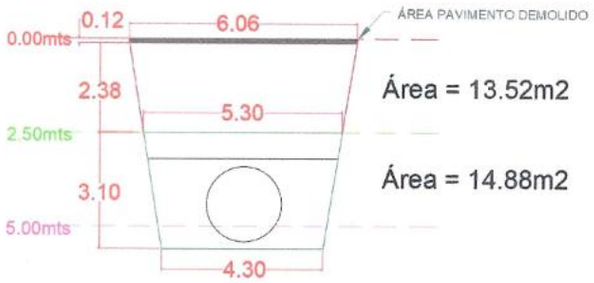



K0+003.00





K0+005.00




K0+011.30





K0+012.60

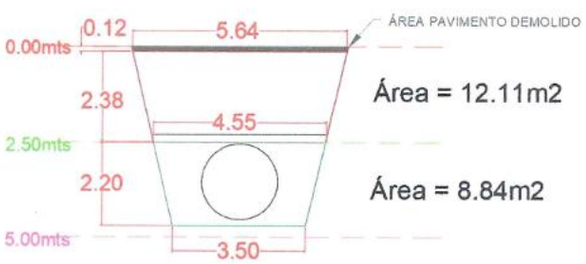



PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)3 & P(K36-LA FLORA)4


K0+000.0





K0+001.25

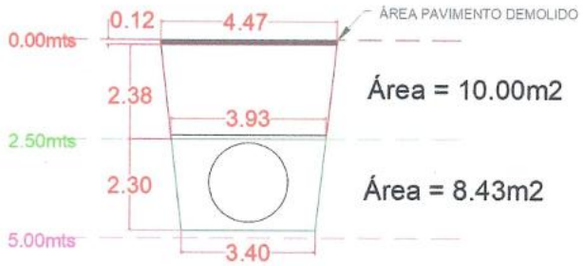



K0+007.75

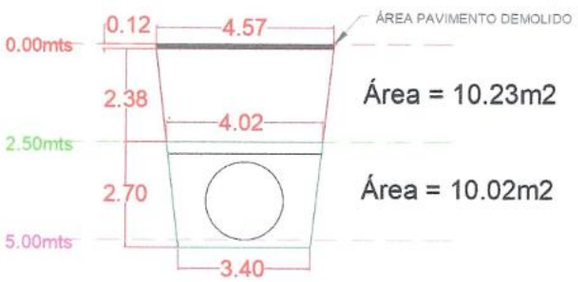


K0+012.89

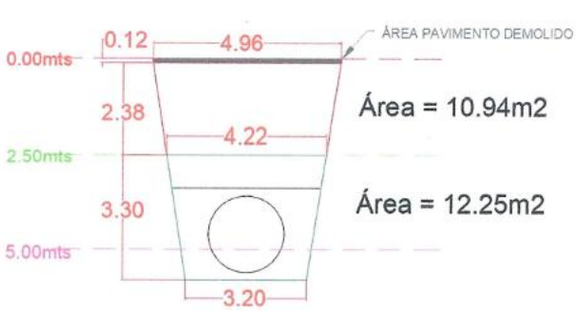



K0+019.19

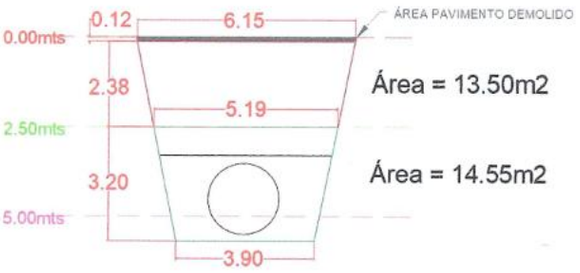


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)3 & P(K36-LA FLORA)4

K0+024.32

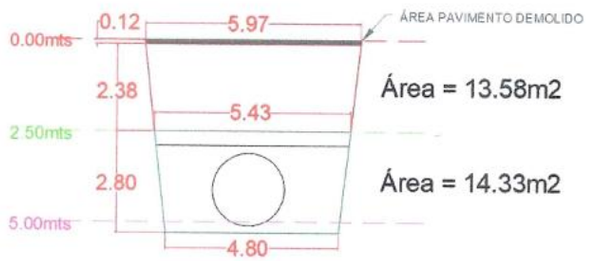



PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)4 & P(K36-LA FLORA)5


K0+000.00

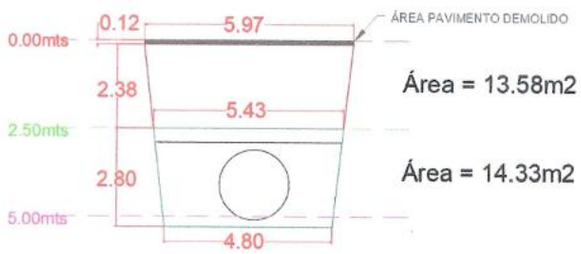



K0+001.25

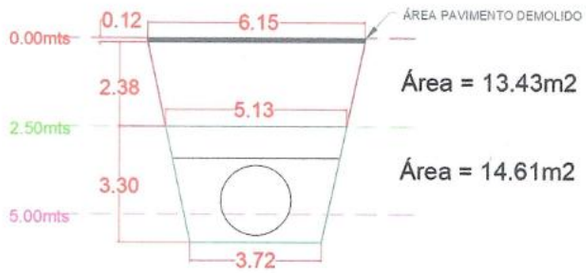


K0+007.57

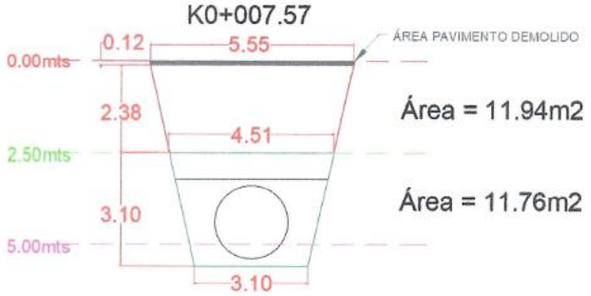



K0+013.97

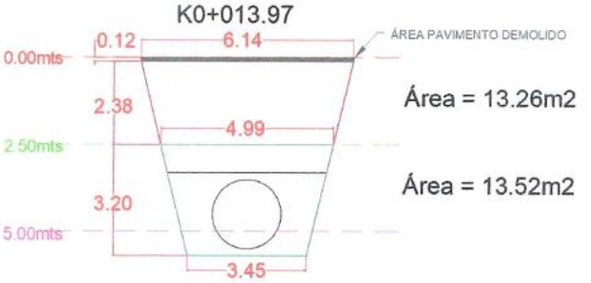



PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)4 & P(K36-LA FLORA)5


K0+020.25

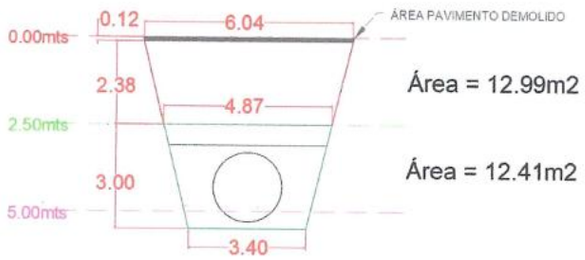



K0+026.51

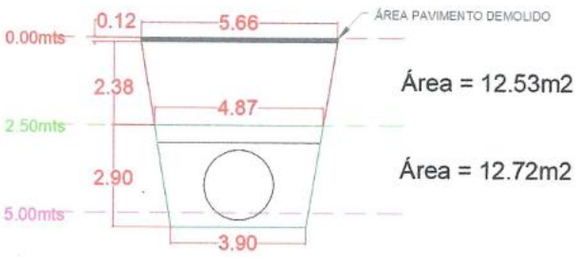


K0+032.81

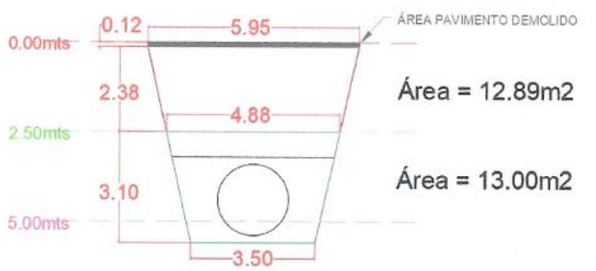


K0+034.06

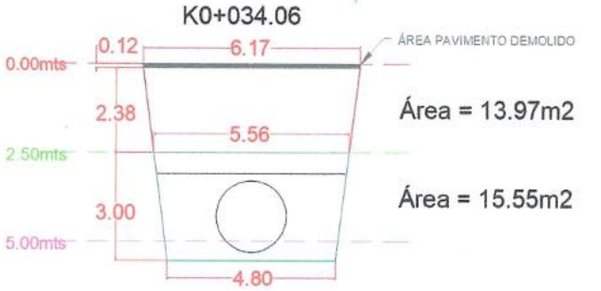


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)5 & P(K36-LA FLORA)6

K0+000.0

