
Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			**ELABORACIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE BOJACÁ**	**195 días**	**mar 20/01/26**	**lun 7/09/26**	
2			**PROGRAMACIÓN ENTREGABLES**	**195 días**	**mar 20/01/26**	**lun 7/09/26**	
3			**ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 1 KM DE MALLA VIAL**	**107 días**	**mar 20/01/26**	**mar 26/05/26**	
4			VOLUMEN I ESTUDIO DE TRANSPORTE	15 días	mar 20/01/26	jue 5/02/26	
5			VOLUMEN II ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL Y ANDENES, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO.	15 días	jue 5/02/26	mar 24/02/26	4
6			VOLUMEN III ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS	10 días	mar 24/02/26	sáb 7/03/26	5
7			VOLUMEN IV ESTUDIO GEOTÉCNICO Y PAVIMENTOS	11 días	sáb 7/03/26	vie 20/03/26	6
8			VOLUMEN V ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	10 días	vie 20/03/26	mié 1/04/26	7
9			VOLUMEN VI ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA	10 días	mié 1/04/26	lun 13/04/26	8
10			VOLUMEN VII ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS (HIDRAULICA - CUNETAS, SUMIDEROS)	11 días	lun 13/04/26	sáb 25/04/26	9
11			VOLUMEN VIII ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y UN PRESUPUESTO DE OBRA, Y PROGRAMACIÓN	15 días	sáb 25/04/26	mié 13/05/26	10
12			VOLUMEN IX INFORME FINAL EJECUTIVO	10 días	mié 13/05/26	mar 26/05/26	11
13			**ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ALAMEDA (CICLORUTA)**	**90 días**	**mar 20/01/26**	**mar 5/05/26**	
14			VOLUMEN I ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO VIAL Y ANDENES, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	12 días	mar 20/01/26	mar 3/02/26	4CC
15			VOLUMEN II ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTOS	8 días	mar 3/02/26	jue 12/02/26	14
16			VOLUMEN III ESTUDIO GEOTÉCNICO Y PAVIMENTOS	8 días	jue 12/02/26	vie 20/02/26	15
17			VOLUMEN IV ESTUDIO DE FUENTE DE MATERIALES	8 días	sáb 21/02/26	mar 3/03/26	16
18			VOLUMEN V ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA	10 días	mar 3/03/26	sáb 14/03/26	17
19			VOLUMEN VI ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	11 días	sáb 14/03/26	vie 27/03/26	18
20			VOLUMEN VII ESTUDIO DE ILUMINACIÓN SOLAR	10 días	vie 27/03/26	mié 8/04/26	19
21			VOLUMEN VIII ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y UN PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	13 días	mié 8/04/26	jue 23/04/26	20
22			VOLUMEN IX INFORME FINAL EJECUTIVO	10 días	jue 23/04/26	mar 5/05/26	21
23			**AJUSTE Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS CUBIERTAS: "CUBIA SECTOR LA CHUCUA" Y "GUBIA SECTOR LA ESCUELA" DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ**	**96 días**	**mar 20/01/26**	**mar 12/05/26**	
24			VOLUMEN I LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (Plano de localización y replanteo del predio con coordenadas, Carteras topográficas, Curvas y cortes de Terreno, Calibración de equipos, Registro Fotográfico)	11 días	mar 20/01/26	lun 2/02/26	4CC
25			VOLUMEN II ESTUDIO DE ARQUITECTURA (Programa arquitectónico, zonificación por usos, relación con el paisaje (urbano y/o rural), sistemas de movilidad, espacio público, equipamientos y usos del suelo)	12 días	lun 2/02/26	lun 16/02/26	24
26			VOLUMEN III ESTUDIO DE SUELOS	11 días	lun 16/02/26	sáb 28/02/26	25
27			VOLUMEN IV ESTUDIO DE ESTRUCTURAS	12 días	sáb 28/02/26	sáb 14/03/26	26
28			VOLUMEN V DISEÑO ELÉCTRICOS ILUMINACIÓN Y VOZ Y DATOS	11 días	sáb 14/03/26	vie 27/03/26	27
29			VOLUMEN VI DISEÑO HIDROSANITARIOS	11 días	vie 27/03/26	jue 9/04/26	28
30			VOLUMEN VII DISEÑO RED CONTRAINCENDIOS	11 días	jue 9/04/26	mié 22/04/26	29
31			VOLUMEN VIII ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y UN PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	17 días	mié 22/04/26	mar 12/05/26	30
32			**ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PROTECCIÓN Y HOGAR DIA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ CUNDINAMARCA**	**164 días**	**mié 25/02/26**	**lun 7/09/26**	
33			VOLUMEN I LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	20 días	sáb 14/03/26	mar 7/04/26	35
34			VOLUMEN II REVISIÓN ESTUDIO DE ARQUITECTURA	30 días	mar 7/04/26	mar 12/05/26	33
35			VOLUMEN III REVISIÓN ESTUDIO DE SUELOS	15 días	mié 25/02/26	sáb 14/03/26	5FC+1 día
36			VOLUMEN IV REVISIÓN ESTUDIO DE ESTRUCTURAS	30 días	mié 6/05/26	jue 11/06/26	34FC-5 días
37			VOLUMEN V REVISIÓN DISEÑOS ELÉCTRICOS ILUMINACIÓN Y VOZ Y DATOS	15 días	jue 11/06/26	lun 29/06/26	36
38			VOLUMEN VI REVISIÓN DISEÑO HIDROSANITARIOS	20 días	lun 29/06/26	mié 22/07/26	37
39			VOLUMEN VII REVISIÓN DISEÑO RED CONTRAINCENDIOS	15 días	mié 22/07/26	sáb 8/08/26	38
40			VOLUMEN VIII REVISIÓN ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTUTRACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	24 días	sáb 8/08/26	lun 7/09/26	39

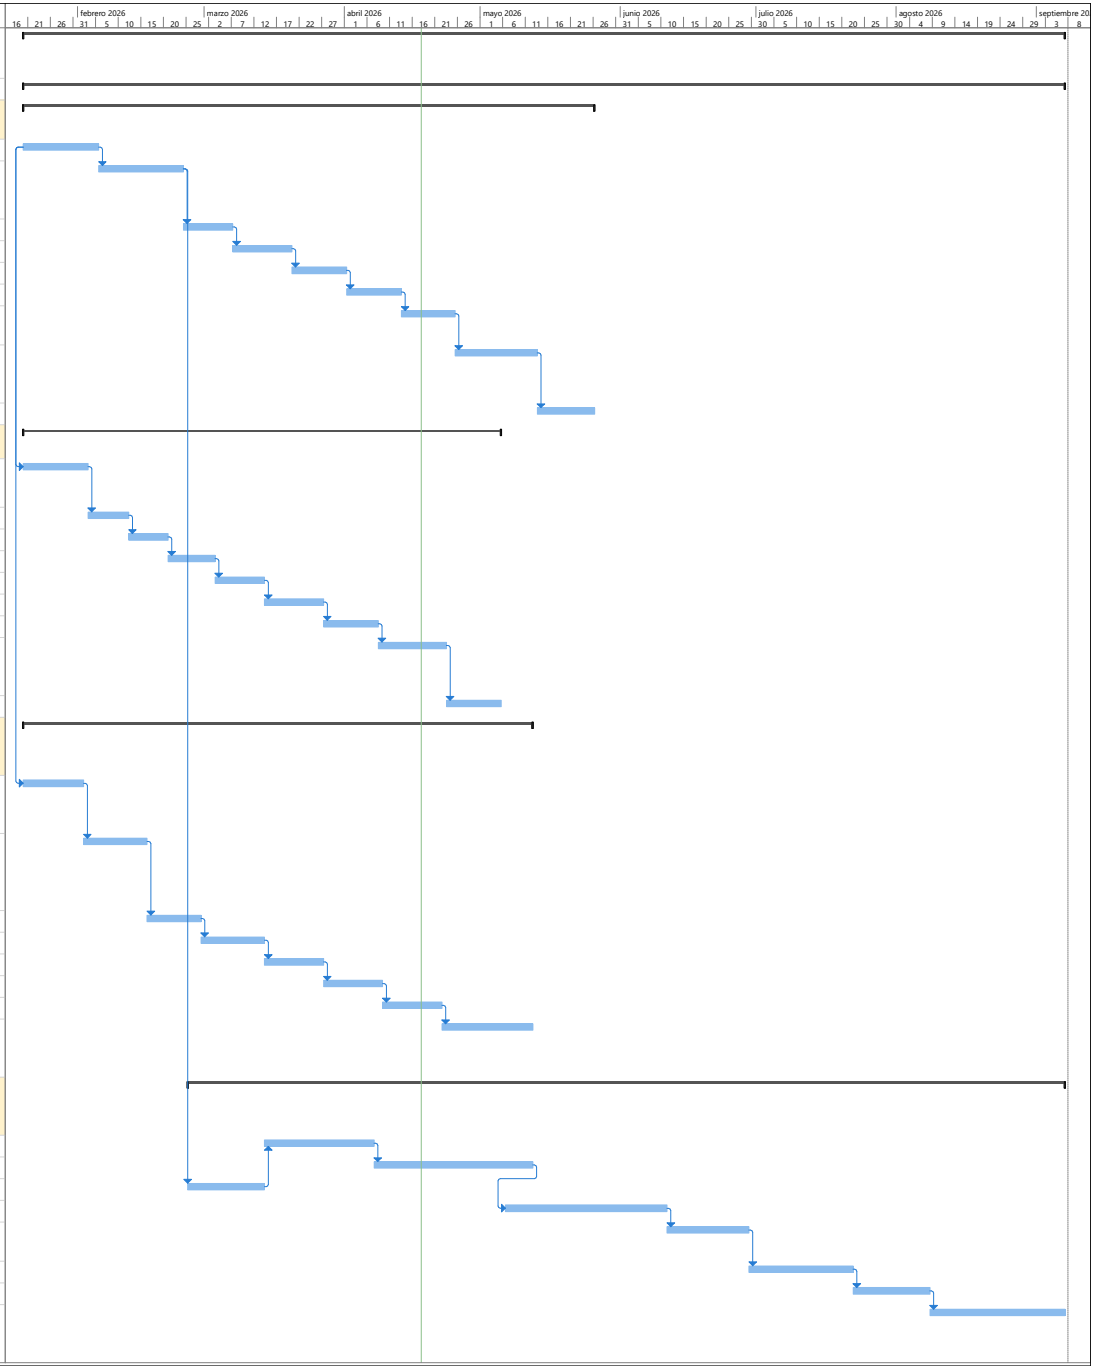

Proyecto: PROGRAMACION BO
Fecha: sáb 18/04/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual
