



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pre	Costo
0	**CRONOGRAMA PAQUES PP**	**74,63 día**	**lun 2/03/26**	**mié 10/06/26**		**$ 198.596.191,00**
1	**INICIO DEL PROYECTO**	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26		$ 0,00
2	**PRELIMINARES**	**3 días**	**mar 3/03/26**	**jue 5/03/26**		**$ 7.692.226,00**
7	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**3 días**	**mar 3/03/26**	**jue 5/03/26**		**$ 2.177.215,00**
10	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**8 días**	**mar 3/03/26**	**jue 12/03/26**		**$ 2.511.360,00**
14	**CONCRETOS**	**5 días**	**lun 4/05/26**	**vie 8/05/26**	**10**	**$ 1.281.361,00**
17	**PISOS**	**6 días**	**mié 27/05/26**	**mié 3/06/26**		**$ 159.417.680,00**
21	**ACERO DE REFUERZO**	**4 días**	**mié 6/05/26**	**sáb 9/05/26**	**14**	**$ 41.100,00**
23	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y SANITARIAS**	**4 días**	**mié 6/05/26**	**sáb 9/05/26**	**14**	**$ 1.138.850,00**
25	**JUEGOS INFANTILES**	**7 días**	**mar 19/05/26**	**mié 27/05/26**		**$ 2.404.191,00**
27	**AMOBLAMIENTO URBANO**	**3 días**	**jue 4/06/26**	**sáb 6/06/26**		**$ 4.943.752,00**
29	**PASAMANOS Y CICLOPARQUEADEROS**	**8 días**	**jue 23/04/26**	**mar 5/05/26**		**$ 8.828.100,00**
31	**SEÑALETICA**	**3 días**	**lun 4/05/26**	**mié 6/05/26**		**$ 3.899.823,00**
34	**PAISAJISMO**	**13 días?**	**lun 25/05/26**	**mié 10/06/26**		**$ 4.260.533,00**

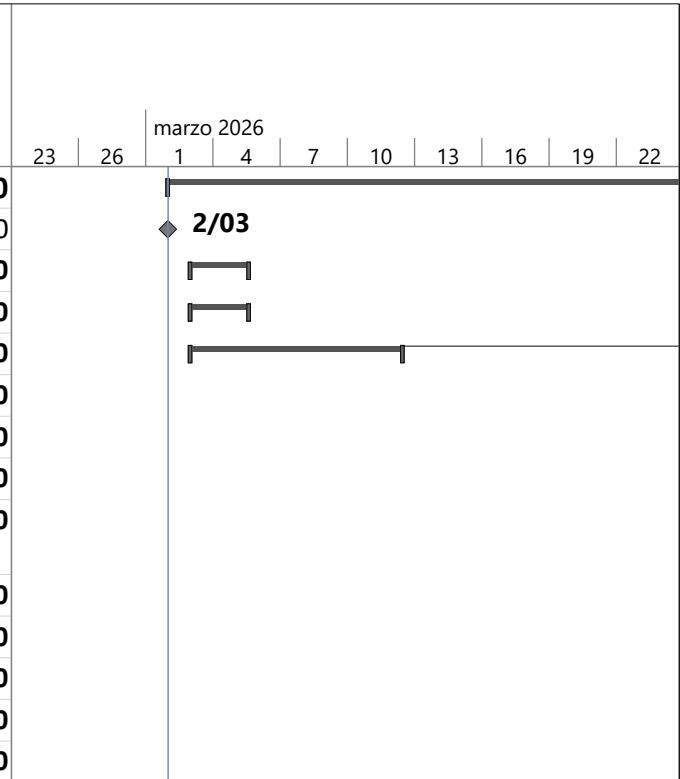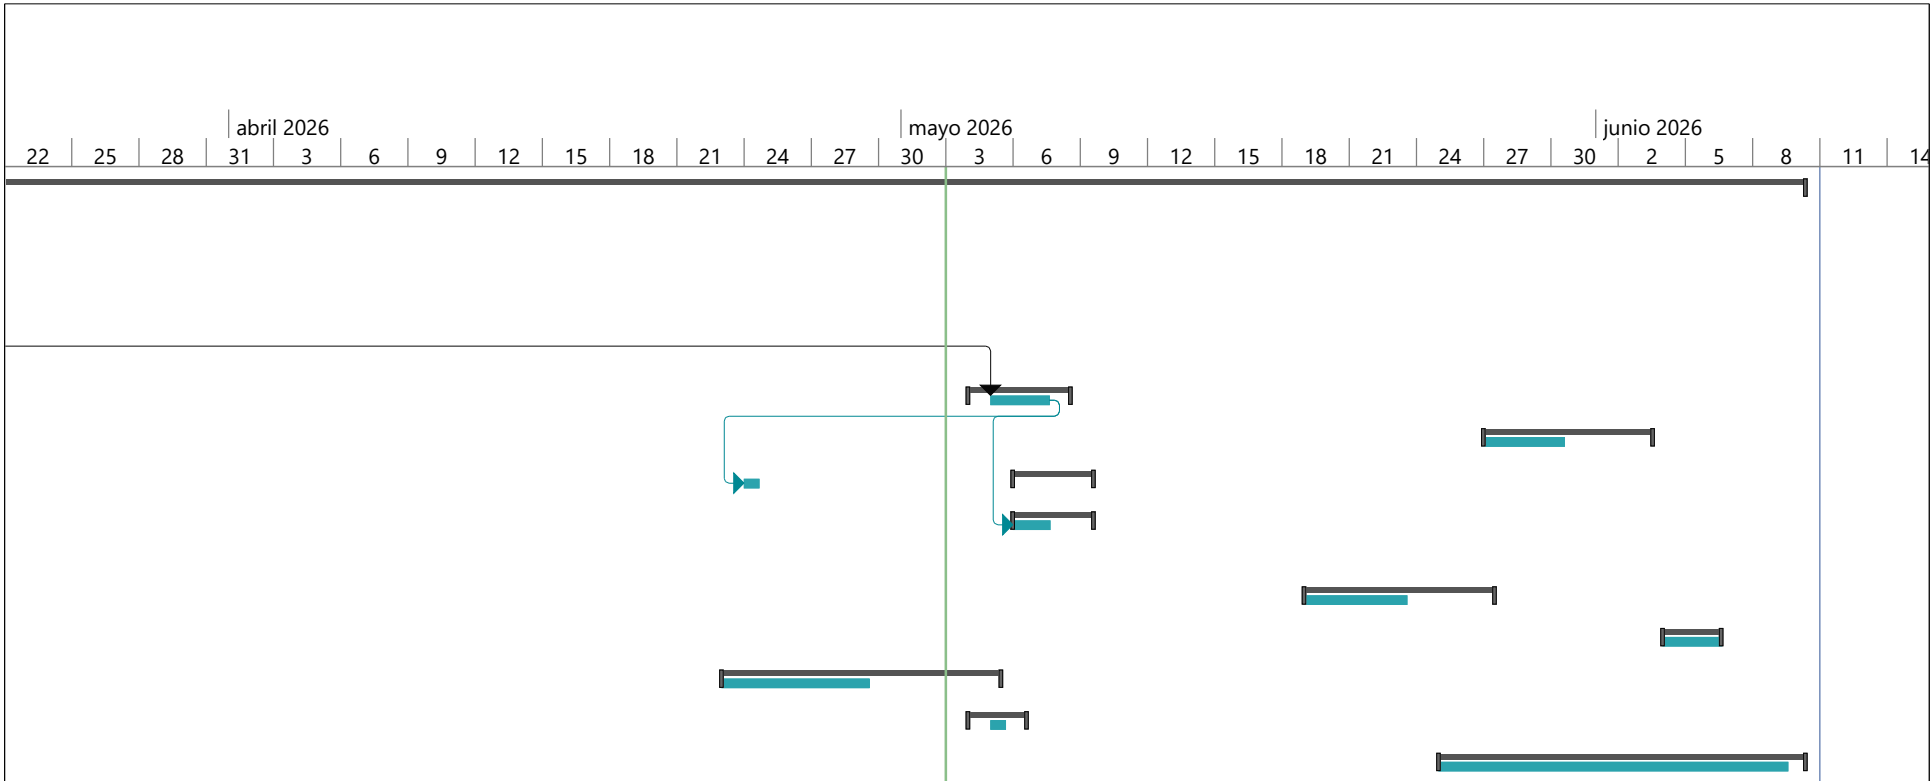




abril 2026
mayo 2026
junio 2026
22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8 11 14


julio 2026
agosto 2026
septiembre 202
14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	P	Costo
0		**CRONOGRAMA PAQUES PP**	**75,44 día**	**lun 2/03/26**	**mié 10/06/26**		**$ 507.835.166,00**
1		**INICIO DEL PROYECTO**	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26		$ 0,00
2		**PRELIMINARES**	**3 días**	**mar 3/03/26**	**jue 5/03/26**		**$ 33.886.209,00**
6		**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**8 días**	**mar 3/03/26**	**jue 12/03/26**		**$ 3.846.472,00**
10		**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**12 días**	**jue 2/04/26**	**vie 17/04/26**		**$ 25.864.059,00**
17		**CONCRETOS**	**25 días**	**mié 15/04/26**	**mar 19/05/26**	1	**$ 183.638.442,00**
23		**PISOS**	**18 días**	**mié 22/04/26**	**vie 15/05/26**		**$ 47.236.688,00**
26		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y SANITARIAS**	**7 días**	**lun 11/05/26**	**mar 19/05/26**	1	**$ 9.297.760,00**
28		**JUEGOS INFANTILES**	**10 días**	**lun 25/05/26**	**vie 5/06/26**		**$ 27.148.898,00**
32		**AMOBLAMIENTO URBANO**	**12 días**	**jue 14/05/26**	**vie 29/05/26**		**$ 75.362.254,00**
36		**PAISAJISMO**	**17 días?**	**mié 20/05/26**	**mié 10/06/26**		**$ 101.554.384,00**

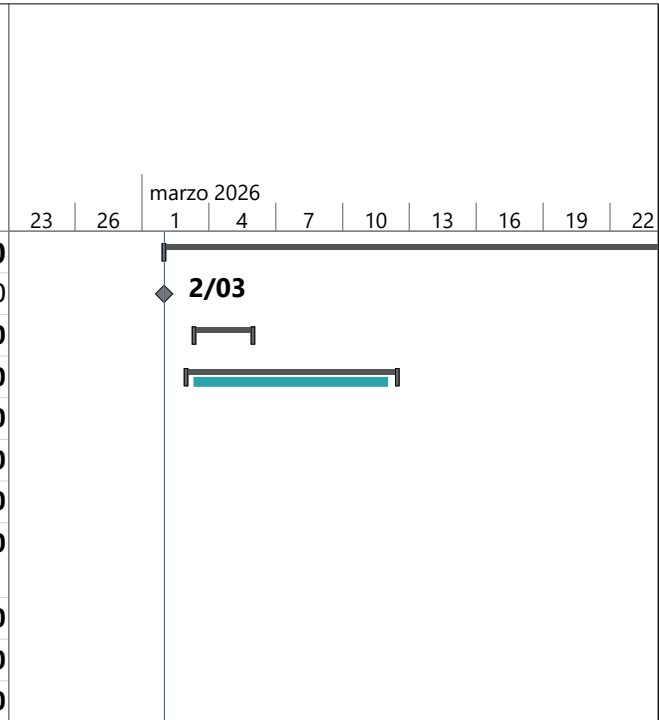


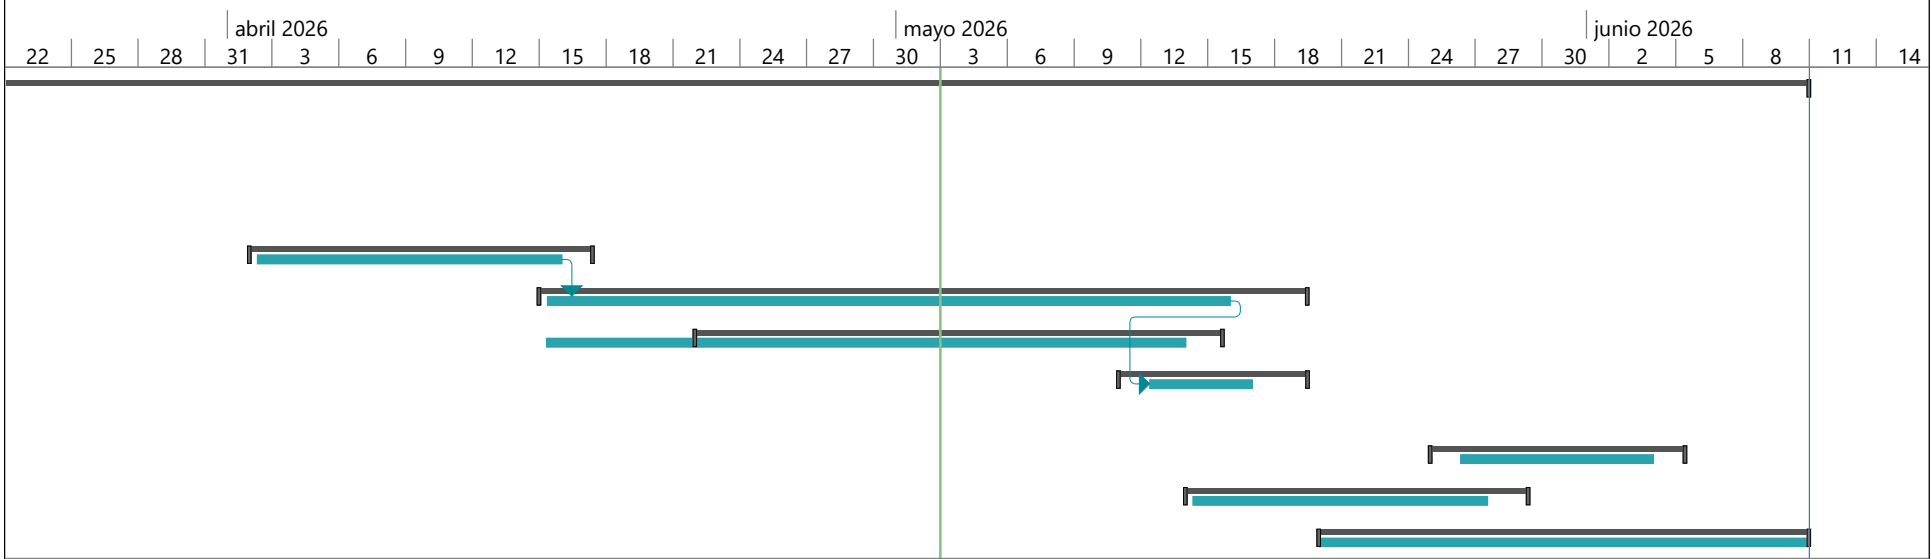

abril 2026
mayo 2026
junio 2026
22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8 11 14

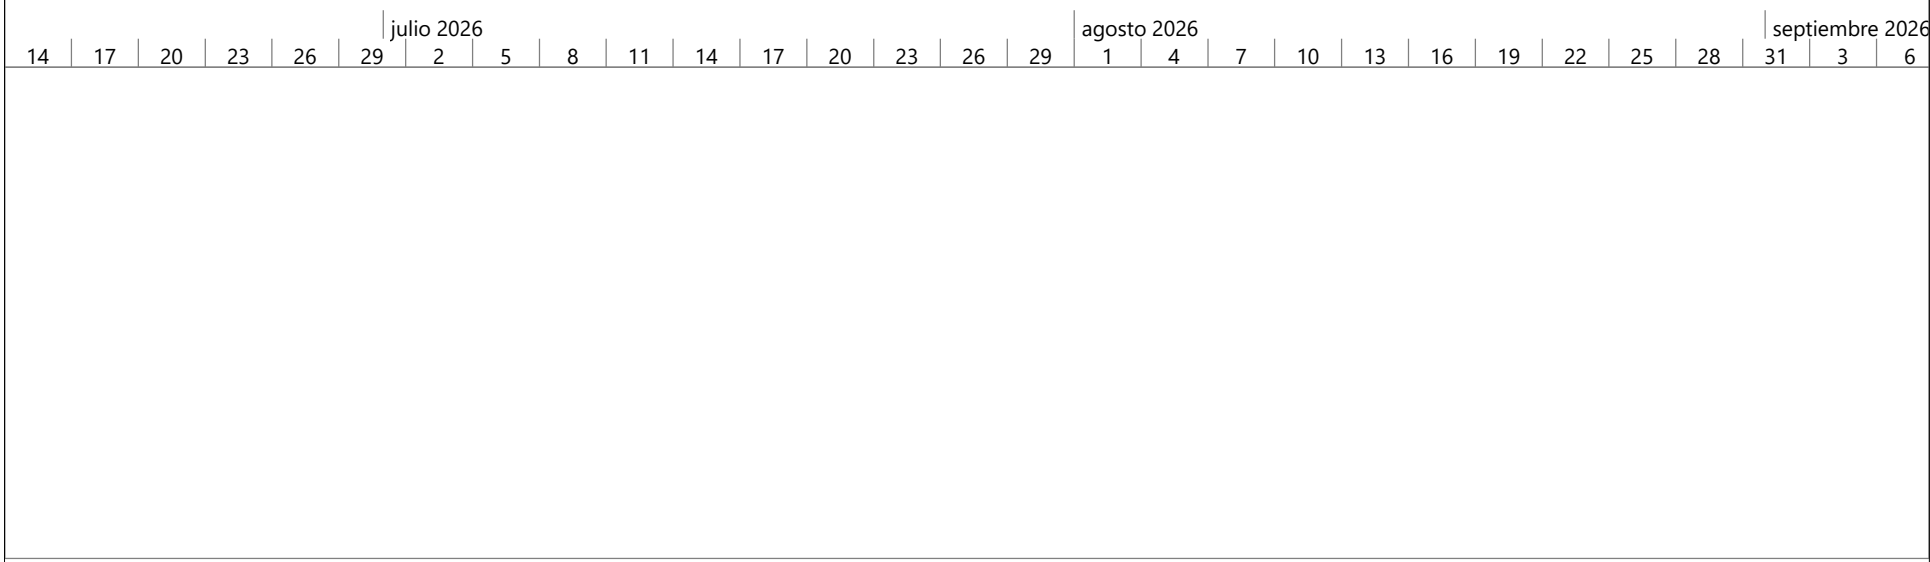
julio 2026
agosto 2026
septiembre 2026
14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pre	Costo
0		**CRONOGRAMA PAQUES PP**	**75 días?**	**lun 2/03/26**	**mié 10/06/26**		**$ 61.118.437,00**
1		**INICIO DEL PROYECTO**	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26		$ 0,00
2		**PRELIMINARES**	**5 días**	**mar 12/05/26**	**sáb 16/05/26**		**$ 17.546.776,00**
9		**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**5 días**	**lun 11/05/26**	**vie 15/05/26**		**$ 1.759.753,00**
12		**ACERO DE REFUERZO**	**1 día**	**mié 29/04/26**	**mié 29/04/26**		**$ 41.100,00**
14		**AMOBLAMIENTO URBANO**	**7 días**	**mar 2/06/26**	**mié 10/06/26**		**$ 29.662.512,00**
16		**SEÑALETICA**	**3 días**	**mié 3/06/26**	**vie 5/06/26**		**$ 3.899.823,00**
19		**PAISAJISMO**	**13 días?**	**lun 25/05/26**	**mié 10/06/26**		**$ 8.208.473,00**

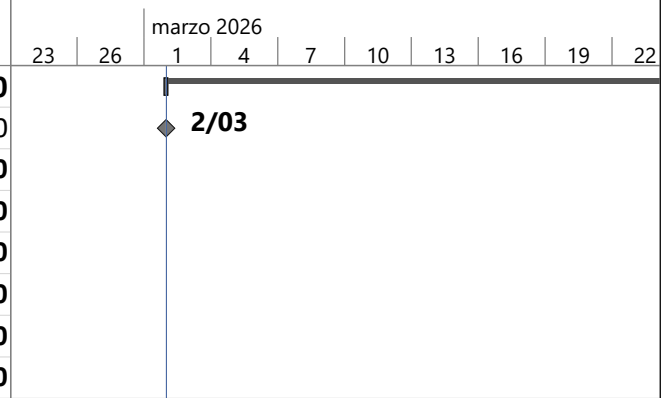


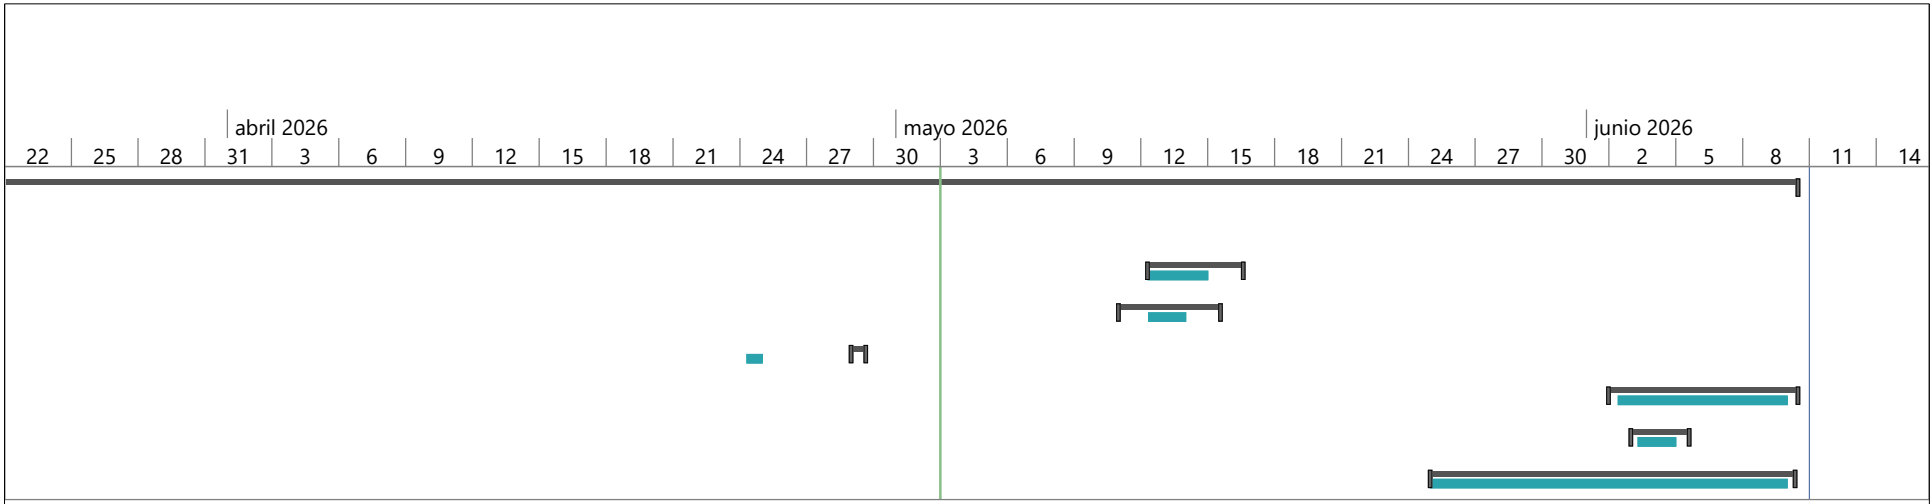
abril 2026
mayo 2026
junio 2026
22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8 11 14

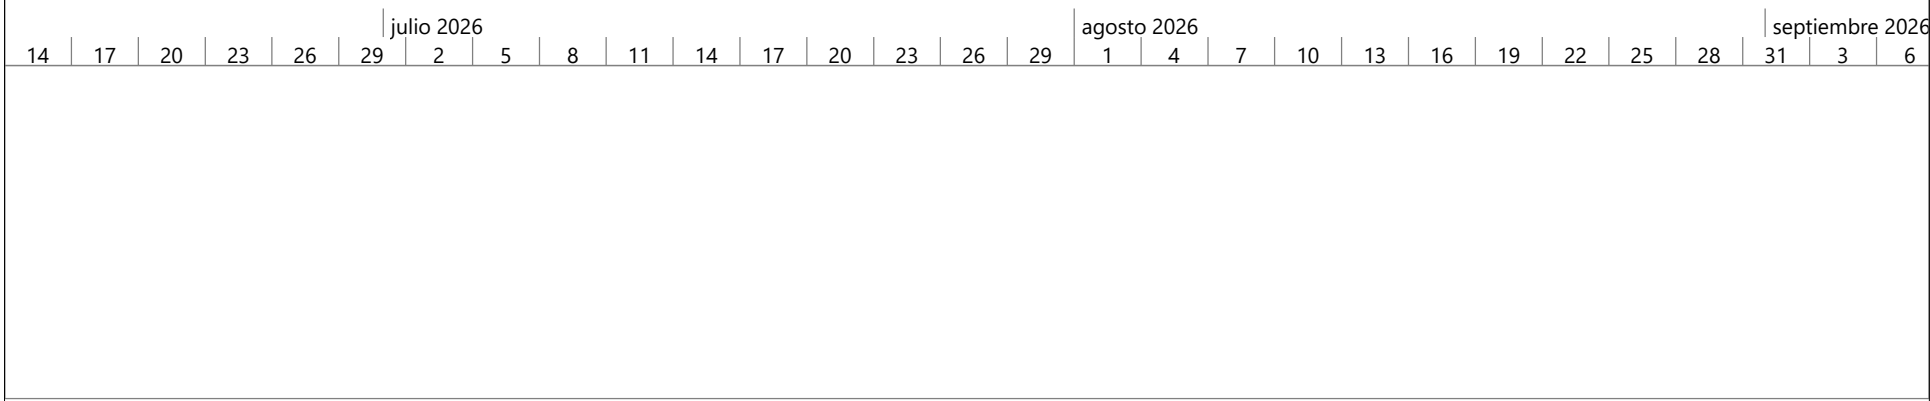
julio 2026
agosto 2026
septiembre 2026
14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pre	Costo
0	**CRONOGRAMA PAQUES PP**	**75,44 d**	**lun 2/03/26**	**mié 10/06/26**		**$ 318.525.698,00**
1	**INICIO DEL PROYECTO**	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26		$ 0,00
2	**PRELIMINARES**	**3 días**	**mar 3/03/26**	**jue 5/03/26**		**$ 16.970.650,00**
7	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**12 días**	**mar 3/03/26**	**mié 18/03/26**		**$ 13.786.725,00**
20	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**5,19 día**	**mar 3/03/26**	**sáb 7/03/26**		**$ 10.046.682,00**
27	**CONCRETOS**	**21 días**	**vie 10/04/26**	**vie 8/05/26**		**$ 159.551.295,00**
37	**PISOS**	**16 días**	**sáb 25/04/26**	**mar 19/05/26**		**$ 4.286.492,00**
41	**PINTURAS**	**7 días**	**mar 12/05/26**	**mié 20/05/26**		**$ 18.509.952,00**
43	**ACERO DE REFUERZO**					**$ 1.726.200,00**
45	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y SANITARIAS**	**8 días**	**lun 4/05/26**	**mié 13/05/26**		**$ 5.694.878,00**
47	**JUEGOS INFANTILES**	**13 días**	**lun 25/05/26**	**mié 10/06/26**		**$ 37.719.917,00**
53	**AMOBLAMIENTO URBANO**	**12 días**	**lun 25/05/26**	**mar 9/06/26**		**$ 18.739.874,00**
58	**PASAMANOS Y CICLOPARQUEADEROS**	**4 días**	**lun 25/05/26**	**jue 28/05/26**		**$ 2.811.603,00**
60	**SEÑALETICA**	**4 días**	**jue 4/06/26**	**mar 9/06/26**		**$ 5.965.030,00**
63	**PAISAJISMO**	**17 días**	**mié 20/05/26**	**mié 10/06/26**		**$ 22.716.400,00**

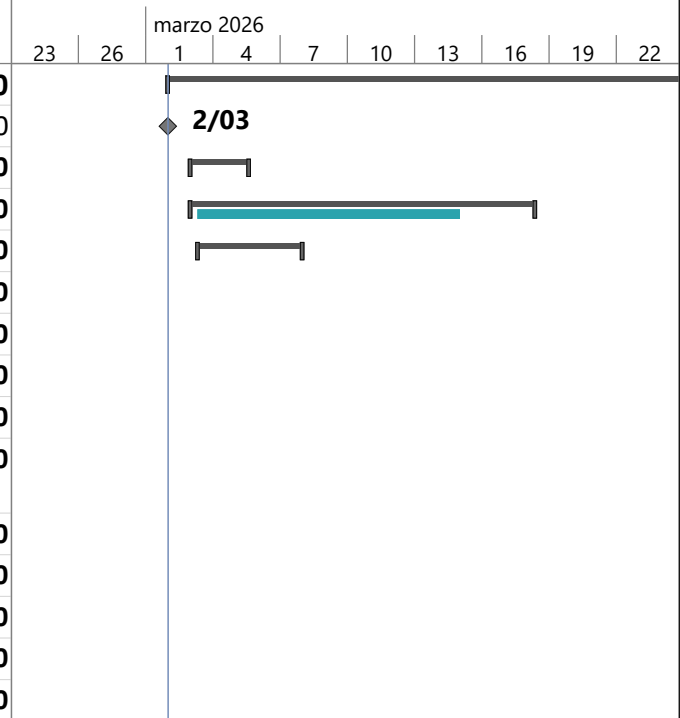


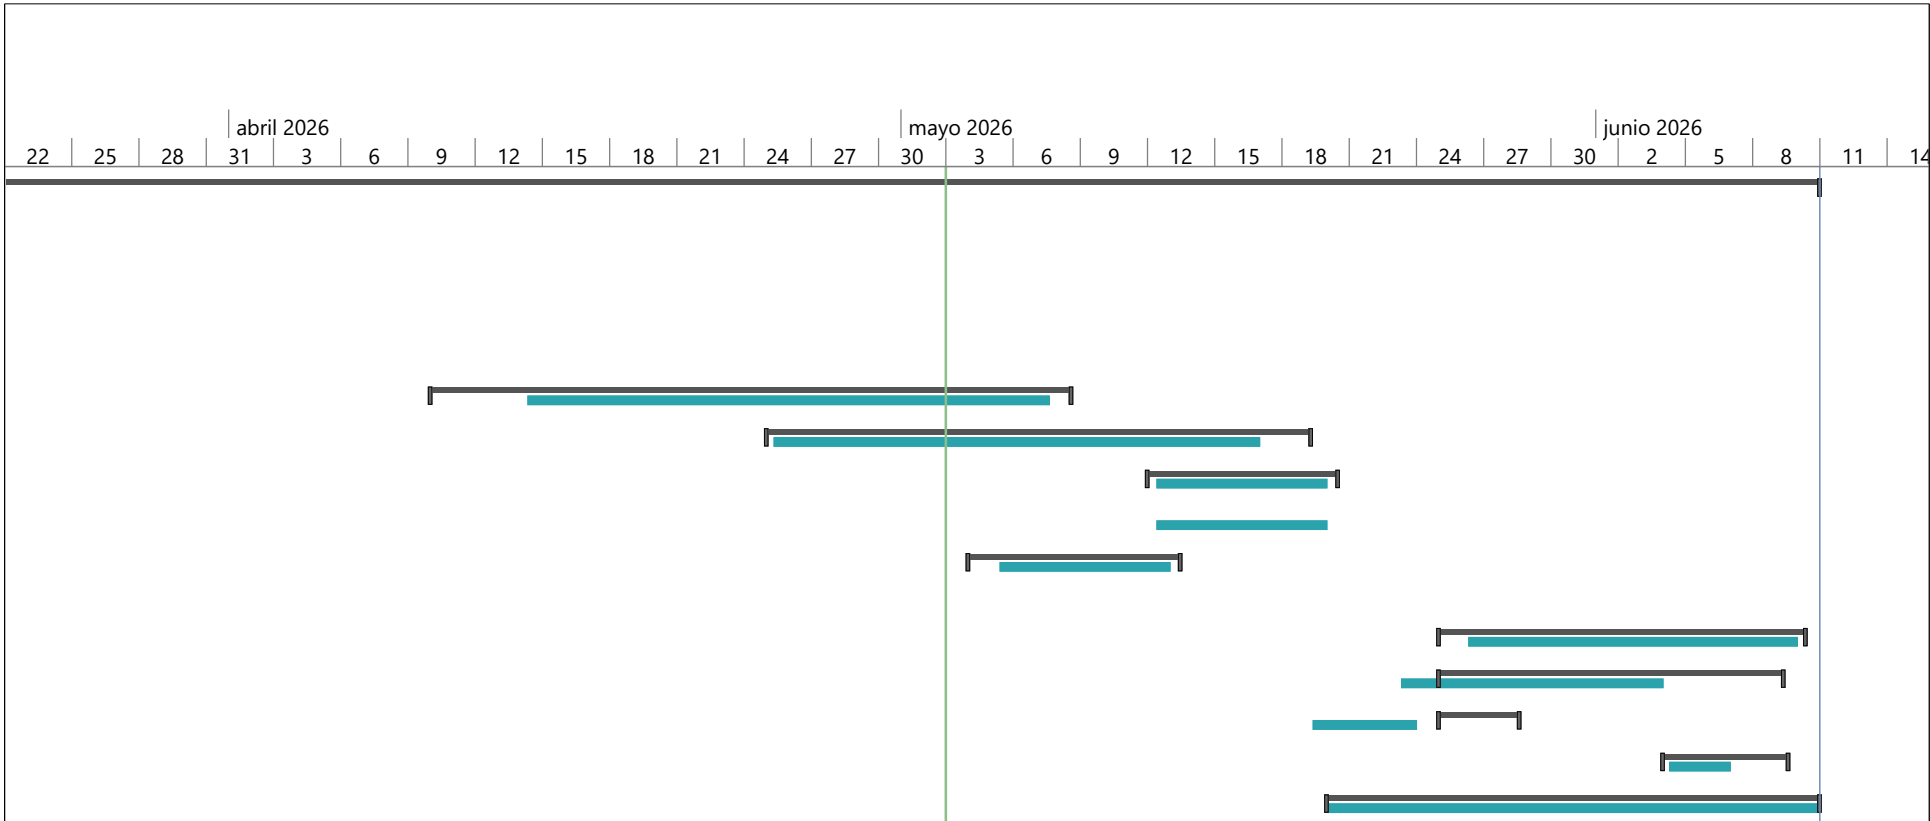

abril 2026
mayo 2026
junio 2026
22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8 11 14

julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 202

14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pred	Costo
0	**CRONOGRAMA PAQUES PP**	**75,19 días?**	**lun 2/03/26**	**mié 10/06/26**		**$ 569.242.666,00**
1	**INICIO DEL PROYECTO**	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26		$ 0,00
2	**PRELIMINARES**	**3 días**	**mar 3/03/26**	**jue 5/03/26**		**$ 25.944.887,00**
7	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**13,31 días**	**mar 3/03/26**	**jue 19/03/26**		**$ 26.565.457,00**
22	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**14 días**	**vie 6/03/26**	**mié 25/03/26**		**$ 28.075.347,00**
29	**CONCRETOS**	**20 días**	**jue 16/04/26**	**mié 13/05/26**		**$ 154.404.347,00**
43	**PISOS**	**4 días**	**vie 5/06/26**	**mié 10/06/26**		**$ 140.577.652,00**
46	**PINTURAS**	**5 días**	**lun 11/05/26**	**vie 15/05/26**		**$ 2.883.244,00**
48	**ACERO DE REFUERZO**	**24 días**	**jue 16/04/26**	**mar 19/05/26**		**$ 10.432.500,00**
51	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y SANITARIAS**	**10 días**	**vie 15/05/26**	**jue 28/05/26**		**$ 3.719.104,00**
53	**JUEGOS INFANTILES**	**12 días**	**lun 25/05/26**	**mar 9/06/26**		**$ 74.649.594,00**
60	**AMOBLAMIENTO URBANO**	**13 días**	**lun 25/05/26**	**mié 10/06/26**		**$ 49.893.679,00**
67	**PASAMANOS Y CICLOPARQUEADEROS**	**16 días**	**mié 20/05/26**	**mié 10/06/26**		**$ 29.531.652,00**
70	**SEÑALETICA**	**4 días**	**jue 4/06/26**	**mar 9/06/26**		**$ 3.899.823,00**
73	**PAISAJISMO**	**14 días?**	**vie 22/05/26**	**mié 10/06/26**		**$ 18.665.380,00**

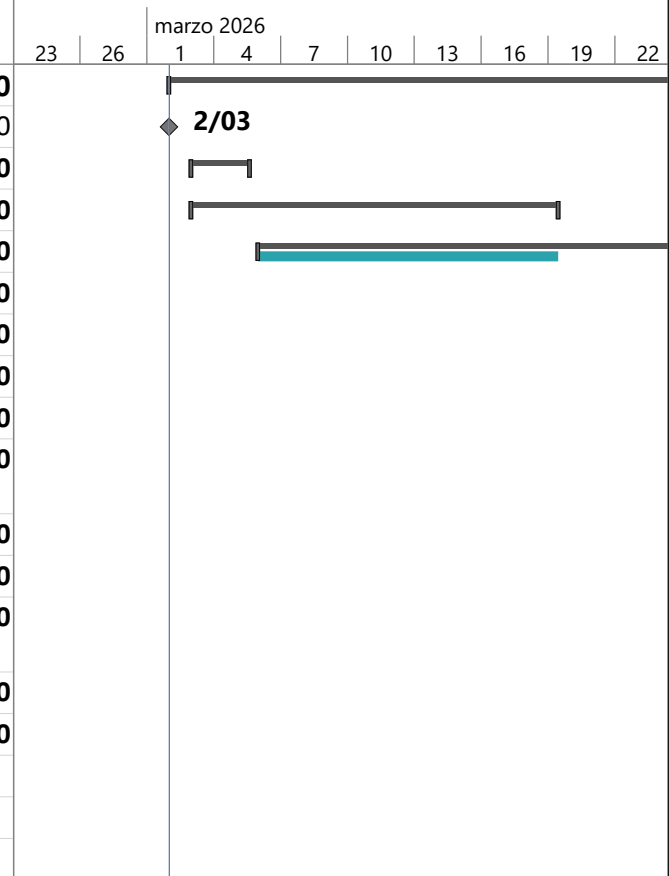


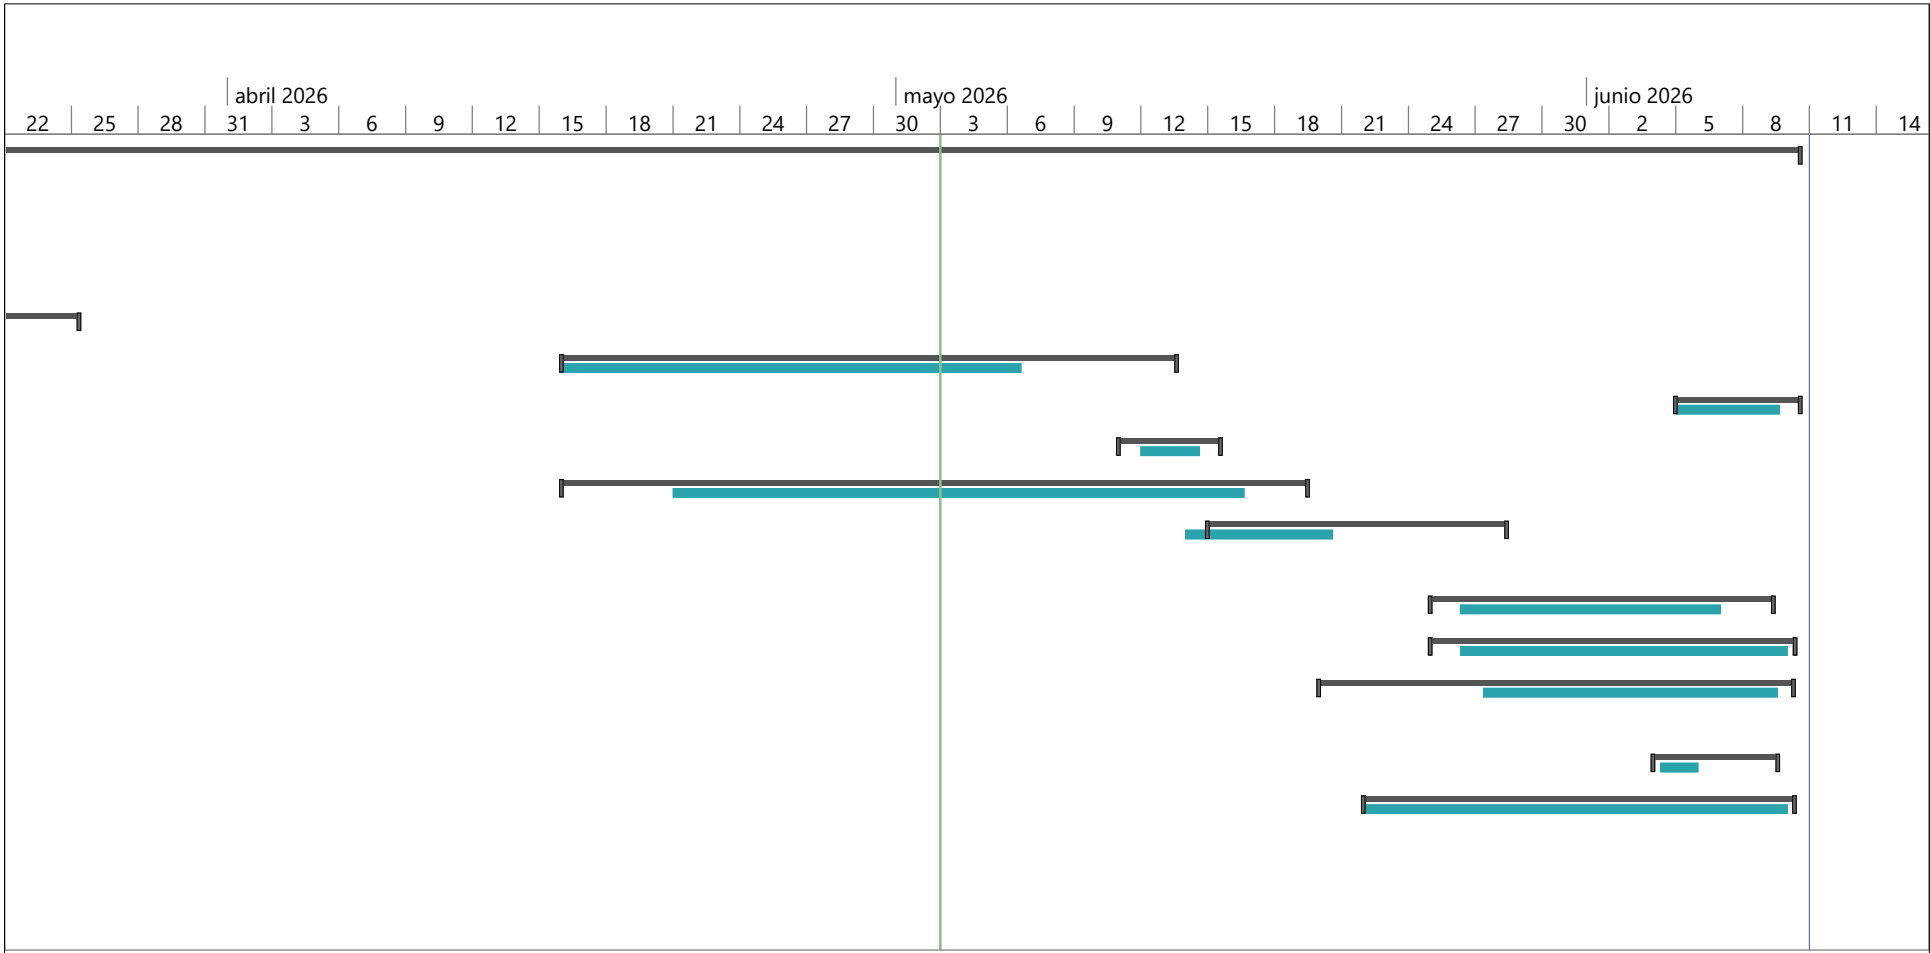

abril 2026
mayo 2026
junio 2026
22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8 11 14

julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026

14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pre	Costo
0	**CRONOGRAMA PAQUES PP**	**74,75 día**	**lun 2/03/26**	**mié 10/06/26**		**$ 235.227.850,00**
1	**INICIO DEL PROYECTO**	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26		$ 0,00
2	**PRELIMINARES**	**3 días**	**mar 3/03/26**	**jue 5/03/26**		**$ 28.953.568,00**
7	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**6 días**	**lun 13/04/26**	**sáb 18/04/26**		**$ 11.300.605,00**
17	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**5 días**	**jue 2/04/26**	**mié 8/04/26**		**$ 11.746.928,00**
25	**CONCRETOS**	**7 días?**	**vie 17/04/26**	**sáb 25/04/26**	**17**	**$ 91.022.086,00**
38	**PISOS**	**26 días**	**mar 5/05/26**	**sáb 6/06/26**		**$ 29.607.570,00**
43	**PINTURAS**	**3 días**	**vie 17/04/26**	**mar 21/04/26**	**38**	**$ 1.254.912,00**
45	**ACERO DE REFUERZO**	**5 días**	**mié 27/05/26**	**mar 2/06/26**	**25**	**$ 4.216.860,00**
48	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y SANITARIAS**	**0 días**	**sáb 25/04/26**	**sáb 25/04/26**	**25**	**$ 0,00**
50	**JUEGOS INFANTILES**	**6 días**	**lun 25/05/26**	**sáb 30/05/26**		**$ 16.575.477,00**
53	**AMOBLAMIENTO URBANO**	**11 días**	**mié 27/05/26**	**mié 10/06/26**		**$ 28.013.204,00**
58	**PASAMANOS Y CICLOPARQUEADERO**	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26		$ 0,00
59	**SEÑALETICA**	**3 días**	**mié 3/06/26**	**vie 5/06/26**		**$ 3.899.823,00**
62	**PAISAJISMO**	**16 días?**	**mié 20/05/26**	**mié 10/06/26**		**$ 8.636.817,00**

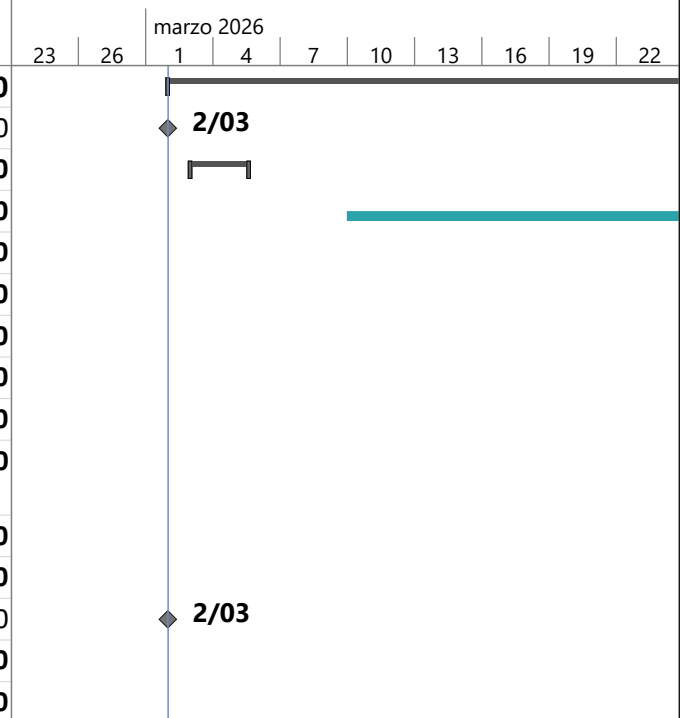


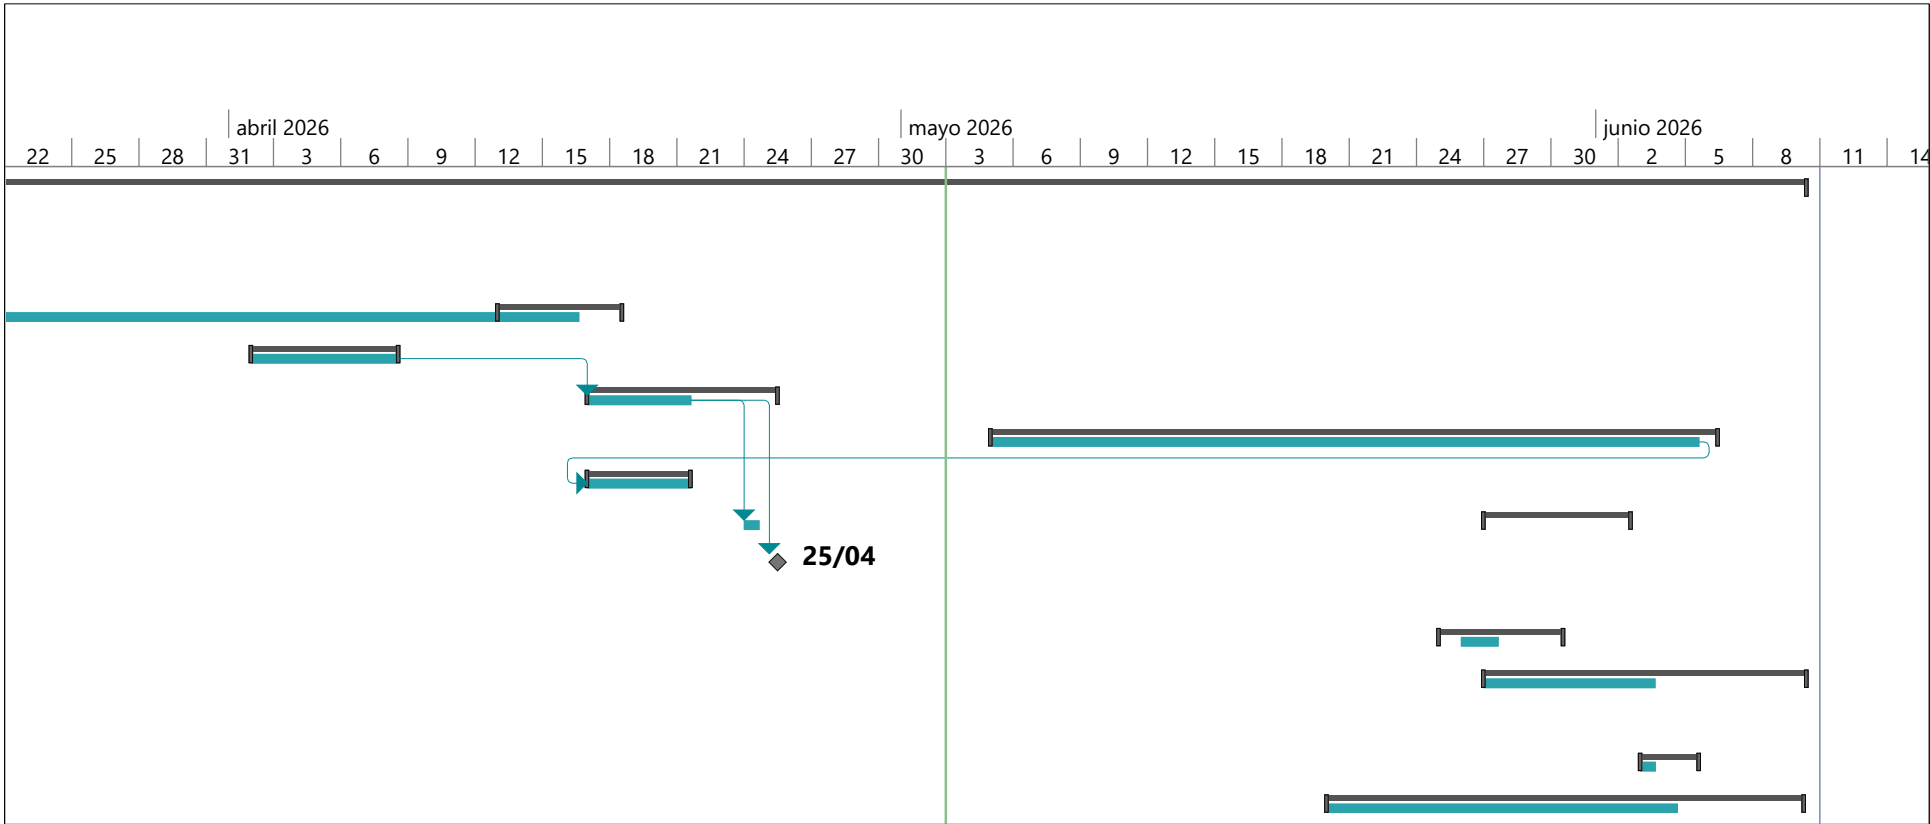

abril 2026
mayo 2026
junio 2026
22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8 11 14
25/04

julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 202

14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pre	Costo
0	**CRONOGRAMA PAQUES PP**	**74,94 día**	**lun 2/03/26**	**mié 10/06/26**		**$ 402.392.940,00**
1	**INICIO DEL PROYECTO**	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26		$ 0,00
2	**PRELIMINARES**	**4 días**	**mar 3/03/26**	**vie 6/03/26**		**$ 38.229.306,00**
7	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**8,38 días**	**mar 3/03/26**	**jue 12/03/26**		**$ 6.945.947,00**
16	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**10,19 día**	**jue 12/03/26**	**mié 25/03/26**		**$ 25.481.382,00**
24	**CONCRETOS**	**27 días**	**jue 26/03/26**	**jue 30/04/26**		**$ 140.383.631,00**
34	**PISOS**	**7 días**	**jue 21/05/26**	**vie 29/05/26**		**$ 30.566.485,00**
39	**PINTURAS**	**3 días**	**vie 5/06/26**	**mar 9/06/26**		**$ 784.320,00**
41	**ACERO DE REFUERZO**	**15 días**	**lun 30/03/26**	**vie 17/04/26**		**$ 6.587.388,00**
44	**JUEGOS INFANTILES**	**10 días?**	**lun 25/05/26**	**vie 5/06/26**		**$ 71.889.686,00**
49	**AMOBLAMIENTO URBANO**	**8 días**	**lun 1/06/26**	**mié 10/06/26**		**$ 28.066.496,00**
53	PASAMANOS Y CICLOPARQUEADEROS	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26		$ 0,00
54	**SEÑALETICA**	**3 días**	**mié 27/05/26**	**vie 29/05/26**		**$ 5.965.030,00**
57	**PAISAJISMO**	**15 días?**	**lun 11/05/26**	**vie 29/05/26**		**$ 47.493.269,00**

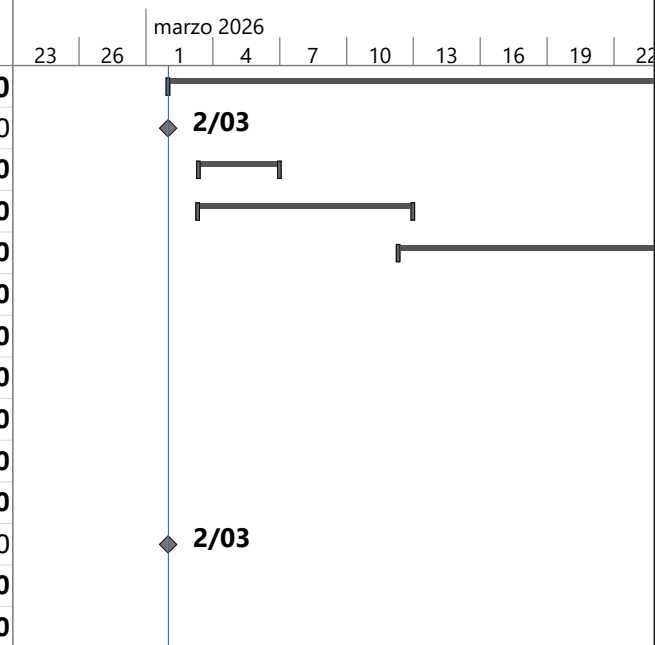


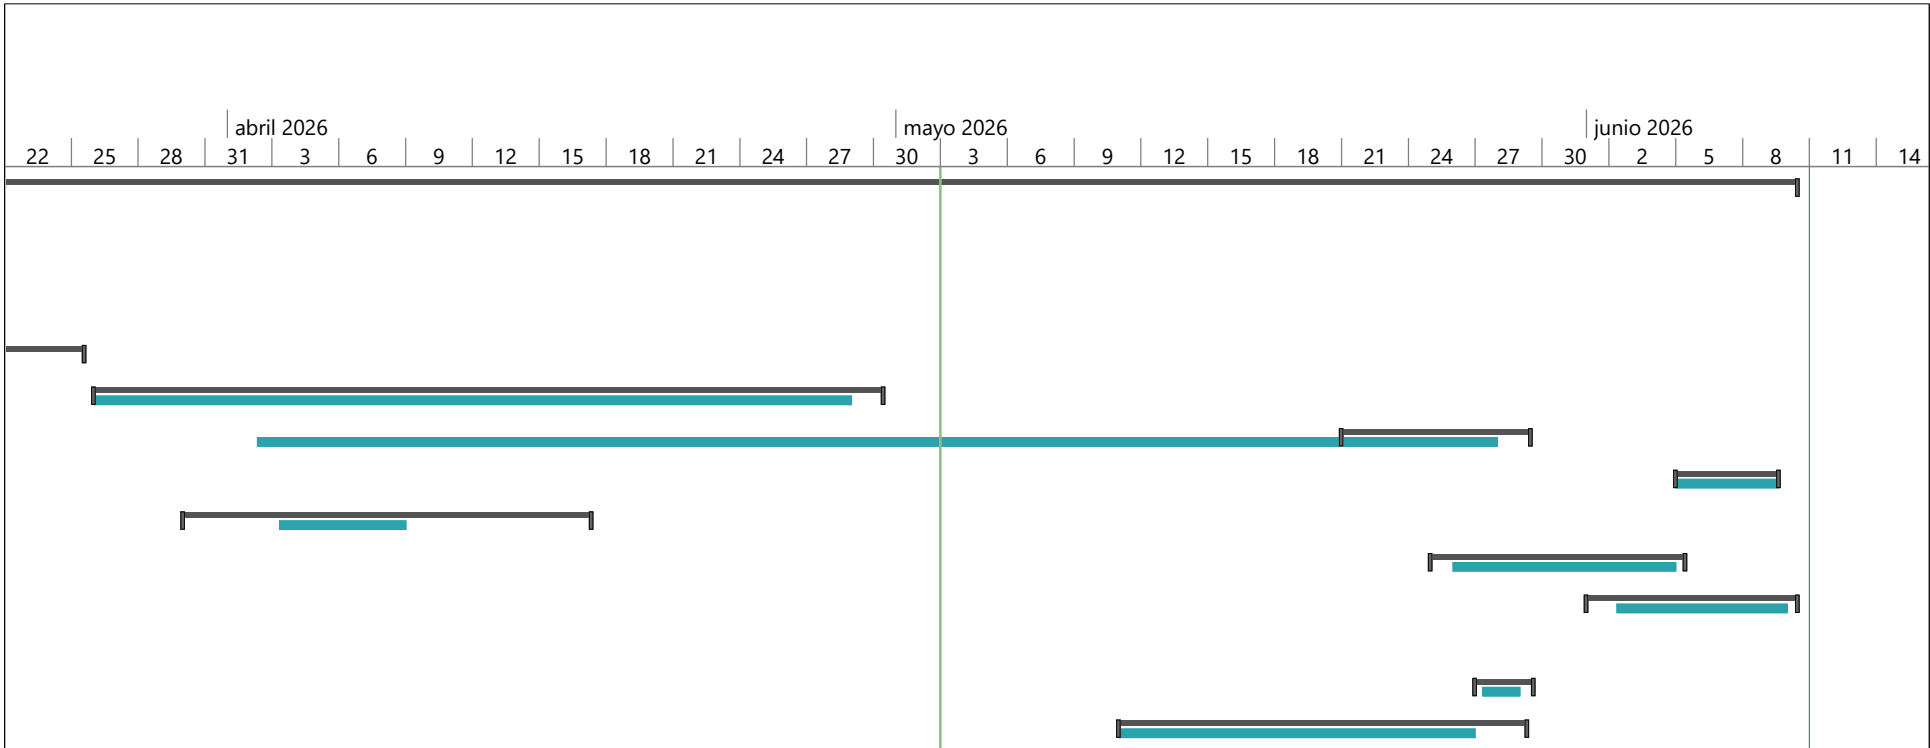

abril 2026
mayo 2026
junio 2026
22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8 11 14


julio 2026
agosto 2026
septiembre 2026
14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pred	Costo
0	**CRONOGRAMA PAQUES PP**	**74,94 días?**	**lun 2/03/26**	**mié 10/06/26**		**$ 241.066.089,00**
1	**INICIO DEL PROYECTO**	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26		$ 0,00
2	**PRELIMINARES**	**6 días**	**mar 5/05/26**	**mar 12/05/26**		**$ 11.060.776,00**
8	**RETIROS Y DEMOLICIONES**	**5 días**	**vie 22/05/26**	**jue 28/05/26**		**$ 5.898.819,00**
28	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**10 días**	**lun 18/05/26**	**vie 29/05/26**		**$ 3.724.215,00**
33	**CONCRETOS**	**8 días**	**mié 20/05/26**	**vie 29/05/26**		**$ 39.996.883,00**
38	**PISOS**	**8 días**	**lun 1/06/26**	**mié 10/06/26**		**$ 95.930.158,00**
42	**PINTURAS**	**0 días**	**vie 29/05/26**	**vie 29/05/26**		**$ 0,00**
45	**ACERO DE REFUERZO**	**3 días**	**lun 18/05/26**	**mié 20/05/26**		**$ 41.100,00**
47	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y SANITARIAS**	**0 días**	**lun 2/03/26**	**lun 2/03/26**		**$ 0,00**
50	**JUEGOS INFANTILES**	**10 días**	**lun 18/05/26**	**vie 29/05/26**		**$ 1.602.794,00**
52	**AMOBLAMIENTO URBANO**	**13 días**	**lun 25/05/26**	**mié 10/06/26**	**38;3**	**$ 42.025.568,00**
55	**PASAMANOS Y CICLOPARQUEADEROS**	**10 días**	**vie 22/05/26**	**jue 4/06/26**		**$ 26.299.680,00**
58	**SEÑALETICA**	**3 días**	**mié 3/06/26**	**vie 5/06/26**		**$ 5.965.030,00**
61	**PAISAJISMO**	**13 días?**	**lun 25/05/26**	**mié 10/06/26**		**$ 8.521.066,00**

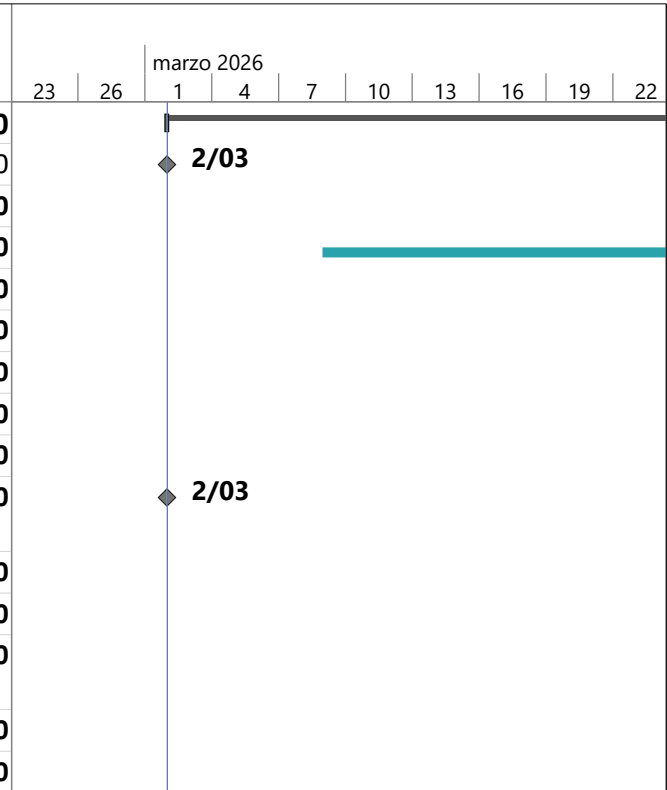

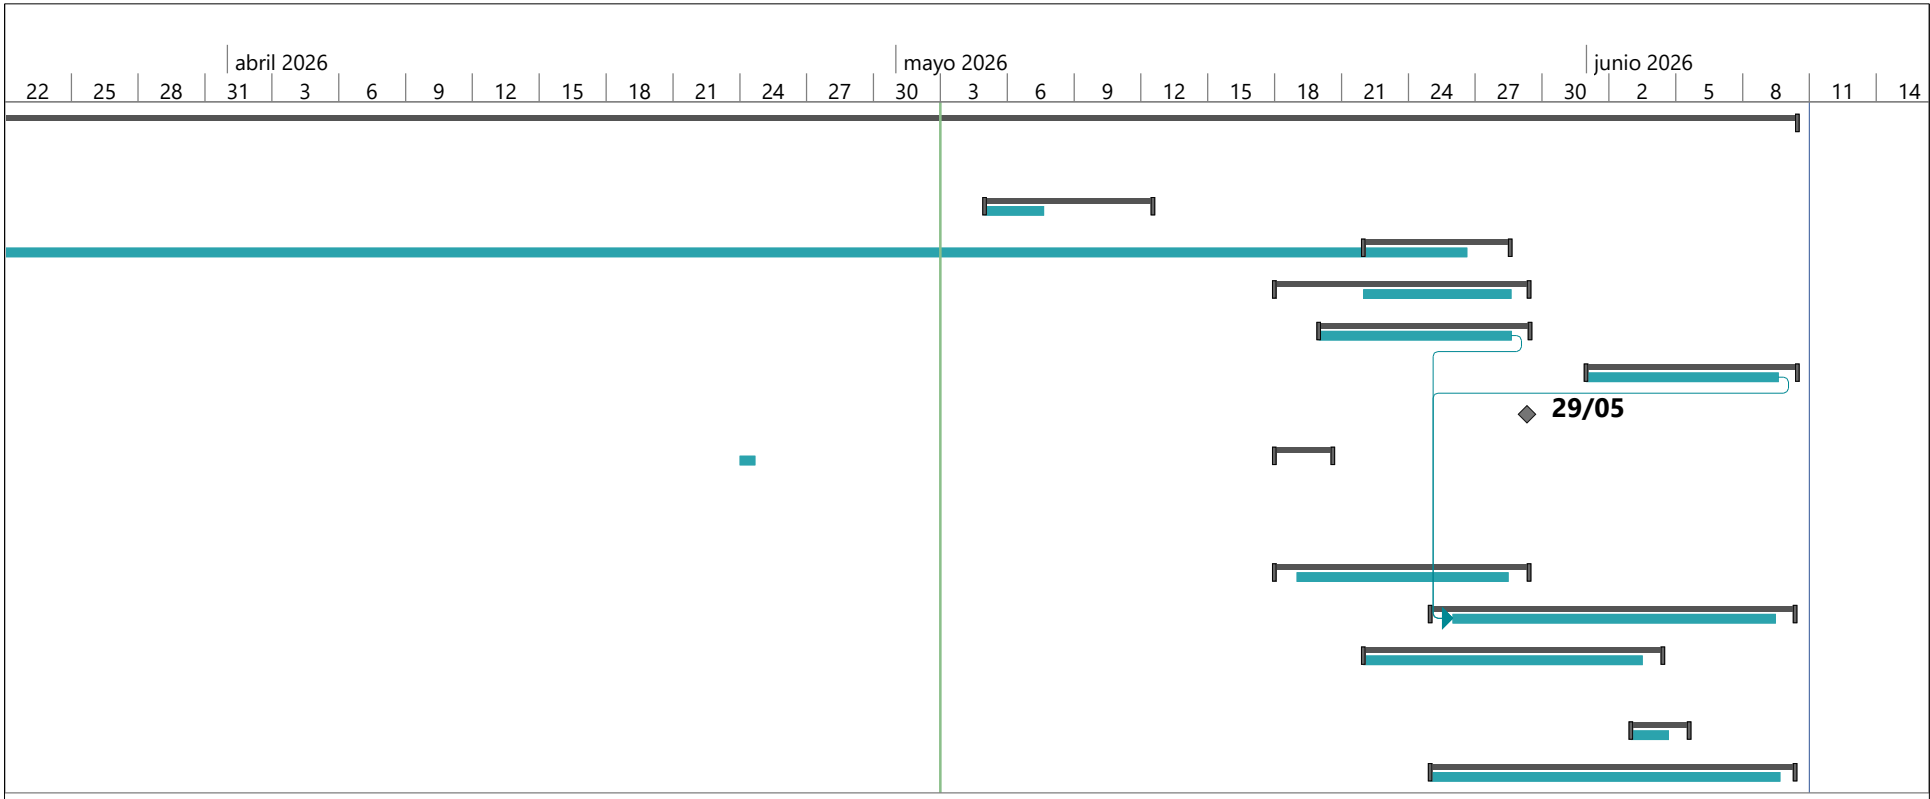
abril 2026
mayo 2026
junio 2026
22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8 11 14
29/05

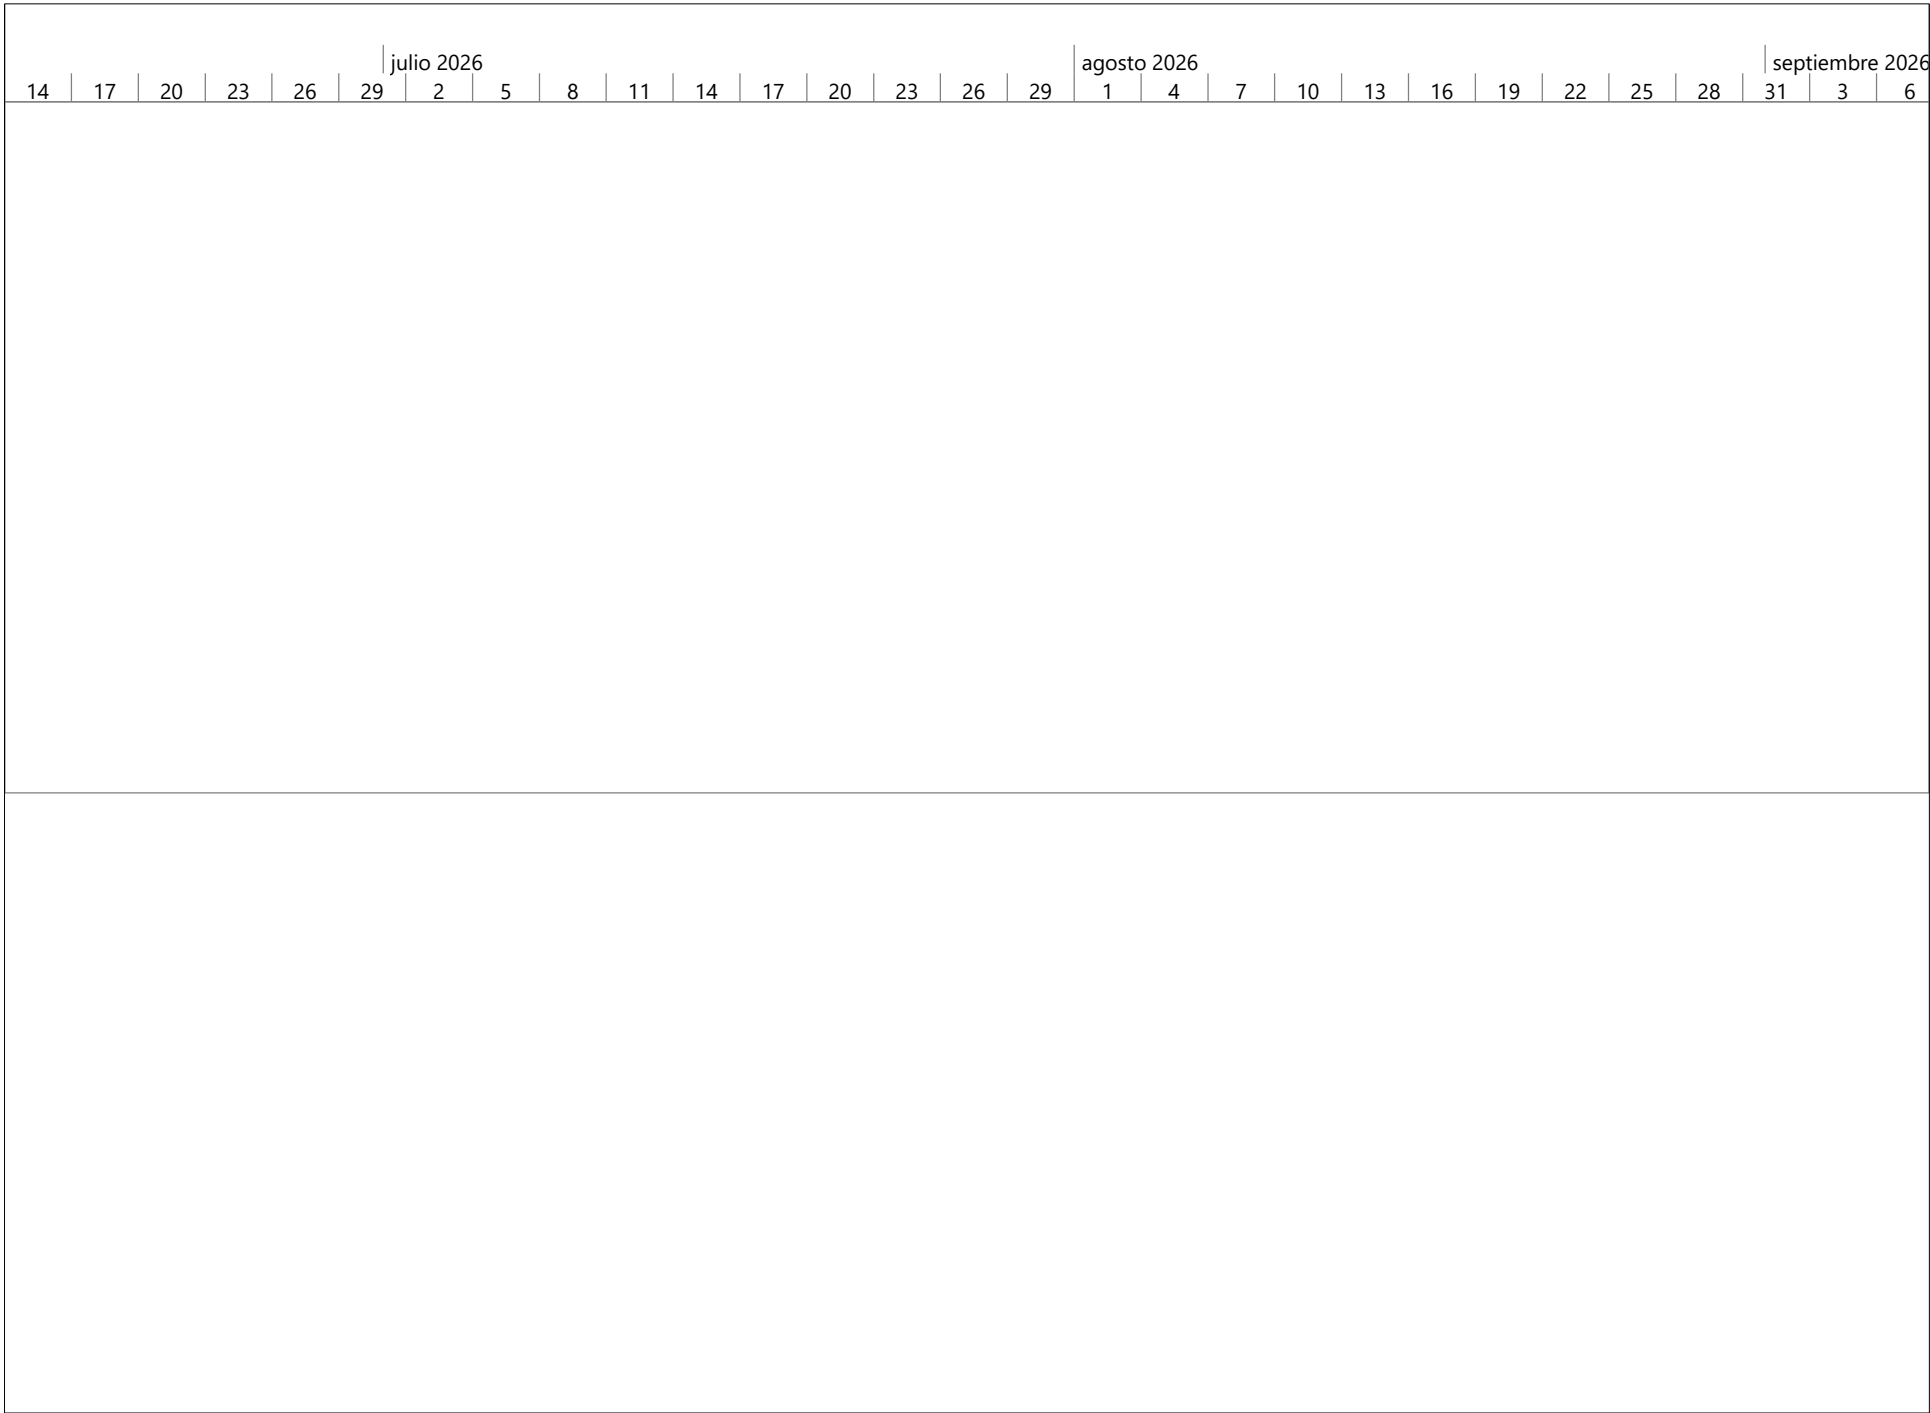
julio 2026
agosto 2026
septiembre 2026
14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6
