INFORME DE SUPERVISIÓN	
CONTRATO No	19-6-0197-0-2025
FECHA	12 / 12 / 2022
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO MERITOS
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL POMCA LA FLORESTA
C.C O NIT	901.990.212-1
REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN ALBERTO PALACIOS BRITO UNIÓN TEMPORAL POMCA LA FLORESTA
INTERVENTOR	WENDY BRITO CALDERON
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	"FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA2802-02 RÍO MEDIO CESAR EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCESAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR"
ACTIVIDADES PARA EL PRESENTE INFORME	**1. FASE I APRESTAMIENTO.** 1.1. Acciones Previas. 1.2. Plan de Trabajo. 1.3. Caracterización y priorización de actores. 1.4. Estrategias de participación 1.5. Recopilación y análisis de información existente 1.6. Análisis situacional y Síntesis ambiental inicial. 1.7. Plan Operativo Detallado. 1.8. Conformación del Consejo de Cuenca 1.9. Preparación y coordinación del Proceso de Preconsulta. **2. FASE II DIAGNOSTICO** 2.1. Caracterización de la cuenca hidrográfica 2.2. Caracterización Básica 2.3. Caracterización fisicobiótica de la Cuenca. 2.4. Caracterización socioeconómica y cultural 2.5. Caracterización político administrativa 2.6. Caracterización funcional de la cuenca 2.7. Caracterización de los Consejos Comunitarios 2.8. Caracterización gestión del riesgo 2.9. Análisis situacional y síntesis ambiental 2.10. Participación en la fase de Diagnóstico
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($2.673.142.055.94)

PLAZO	NUEVE (09) MESES
FORMA DE PAGO	5 actas Parciales (Acta 1: 15% ; Acta. 2 : 30% ; Acta 3. 25% ; Acta 4. : 20% y Acta 5: 10%)
FECHA DE INICIACIÓN	16 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15 julio de 2026

CONTROL DE POLIZA No. 1:

PÓLIZA	**No.**	**COMPAÑÍA**	**FECHA EXPEDICIÓN**		**TIPO MOVIMIENO**	**VALOR ASEGURADO TOTAL**
	14-44-101166321	BERKELEY INTENAL SEGUROS COLOMBIA	29-09-2025		EMISION ORIGINAL	$267.314.205,59
Plazo Inicial:	15 meses					
AMPAROS	**CUMPLIMIENTO**	**ANTICIPO**	**SALARIOS**	**CALIDAD**	**ESTABILIDAD**	**RESPONSABILIDAD CIVIL**
VALOR ASEGURADO	$267.314.205,59	801.942.616,78	267.314.205,59	267.314.205,59	-	-
VIGENCIA DESDE	29-09-2025	29-09-2025	29-09-2025	29-09-2025	-	-
VIGENCIA HASTA	29-11-2026	29-11-2026	29-06-2029	29-06-2027	-	-

DESARROLLO DEL INFORME:

1. El presente documento corresponde a la verificación del Informe de Interventoría, del segundo mes correspondiente del 16 al 30 diciembre para la fase de aprestamiento, el cual para este periodo de evalúan el tercer informe, con fecha de radicado No 00572 del 15 de enero de 2026.

Los documentos son lo validados y aprobado por la respectiva Interventoría UT INTER POMCA LA FLORESTA, en cabeza de la Rep. Legal WENDY BRITO CALDERON, donde sustentan el cumplimiento de la Cláusula 3 Actividades específicas del contrato para las actividades FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA QUEBRADA LA FLORESTA Y OTROS DIRECTOS – NSS (2805-01), EN JURISDICCIÓN DE CORPOCESAR, CESAR y que se sujetará y deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Título IV “De Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas” del Decreto 1640 de 2012, compilado en el Decreto 1076 de 2015 y seguir los criterios, procedimientos y lineamientos de la Guía Técnica para la formulación de los Planes

de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y sus anexos, expedida por la Resolución 1907 de 2013 o aquella que la modifique o sustituya.

Para el caso específico del presente informe de supervisión corresponde a las actividades desarrolladas para fase de Aprestamiento y diagnóstico, el cual contempla los siguientes avances aprobados y citados en el Ítem 3. del tercer informe de avance de la Consultoría y aprobado por la respectiva interventoría:

Resumen porcentual del proyecto

FASE DEL POMCA	PONDERACIÓN DE PORCENTAJE DE FASE	PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE GLOBAL
Realizar fase de Aprestamiento	7.8%	99.0%	7.73%
Realizar fase de Diagnostico	74.5%	5.7%	4.21%
Realizar fase de prospectiva y zonificación ambiental	11.1%	0.0%	0.00%
Realizar fase de Formulación	6.6%	0.0%	0.00%
TOTAL	**100.0%**		**11.9%**

Fuente: UT Interpomca La Floresta.


Detalle de Avance del proyecto

Fase / Actividades	PORCENTAJE DE PONDERACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE GLOBAL
FASE DE APRESTAMIENTO			
A.1 – Elaboración y entrega del plan de trabajo	12.50%	100%	4.17%
A.2 – Identificación, caracterización y priorización de actores	12.50%	100%	4.17%
A.3 - Definición de las Estrategia de participación	12.50%	100%	12.50%
A.4 - Conformación del Consejo de Cuenca	12.50%	97%	12.13%
A.5 – Recopilación y análisis de la información existente	12.50%	100.00%	12.50%
A.6 – Análisis situacional inicial	12.50%	98%	12.25%
A.7 – Elaboración del Plan Operativo	12.50%	100%	12.50%
A.8 - Participación en la Fase de Aprestamiento	12.50%	98.57%	12.32%
TOTAL AVANCE FASE	**100.00%**		**98.99%**
FASE DE DIAGNÓSTICO			
D1 – Caracterización de la cuenca hidrográfica	85.00%	11.62%	5.66%
D1.1 - Caracterización Básica	2.00%	70.00%	1.40%

Fase / Actividades	PORCENTAJE DE PONDERACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE GLOBAL
D1.2 - Caracterización fisicobiótica de la Cuenca	73.00%	11.33%	4.26%
D1.3 - Caracterización socioeconómica y cultural	2.00%	0.00%	0.00%
D1.3 - Caracterización político administrativa	2.00%	0.00%	0.00%
D1-4 - Caracterización funcional de la cuenca	2.00%	0.00%	0.00%
D1-4 - Caracterización de los Consejos Comunitarios	2.00%	0.00%	0.00%
D1-5 - Caracterización gestión del riesgo	2.00%	0.00%	0.00%
D2 – Análisis situacional y síntesis ambiental	5.00%	0.00%	0.00%
D3 – Participación en la fase de Diagnóstico	10.00%	0.00%	0.00%
TOTAL AVANCE FASE	**100.00%**		**5.66%**
FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN			
Avance	16.67%	0.00%	0.00%
TOTAL AVANCE FASE	**100.00%**		**0.00%**
FASE DE FORMULACIÓN			
Avance	16.67%	0.00%	0.00%
TOTAL AVANCE FASE	**100.00%**		**0.00%**

Fuente: UT Interpomca La Floresta.

2. ESTADO DE EJECUCIÓN: Hace referencia a lo programado Vs Ejecutado

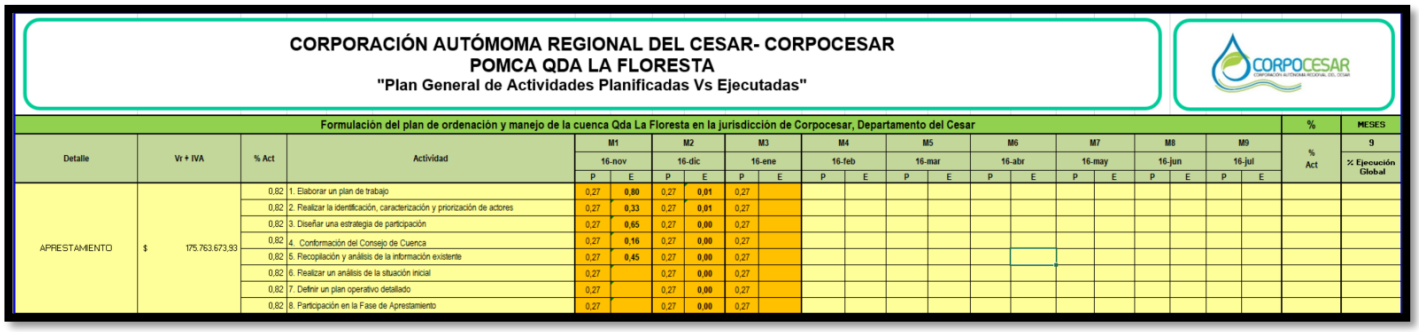

CORPORACIÓN AUTÓMOMA REGIONAL DEL CESAR- CORPOCESAR
POMCA QDA LA FLORESTA
"Plan General de Actividades Planificadas Vs Ejecutadas"

Formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca Qda La Floresta en la jurisdicción de Corpocesar, Departamento del Cesar																									%	MESES
Detalle	Vr + IVA	% Act	Actividad	M1		M2		M3		M4		M5		M6		M7		M8		M9					% Act	9
				16-nov		16-dic		16-ene		16-feb		16-mar		16-abr		16-may		16-jun		16-jul						% Ejecución Global
				P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E					
APRESTAMIENTO	$ 175.763.673,93	0,82	1. Elaborar un plan de trabajo	0,27	0,80	0,27	0,01	0,27																		
		0,82	2. Realizar la identificación, caracterización y priorización de actores	0,27	0,33	0,27	0,01	0,27																		
		0,82	3. Diseñar una estrategia de participación	0,27	0,65	0,27	0,00	0,27																		
		0,82	4. Conformación del Consejo de Cuenca	0,27	0,16	0,27	0,00	0,27																		
		0,82	5. Recopilación y análisis de la información existente	0,27	0,45	0,27	0,00	0,27																		
		0,82	6. Realizar un análisis de la situación inicial	0,27		0,27	0,00	0,27																		
		0,82	7. Definir un plan operativo detallado	0,27		0,27	0,00	0,27																		
		0,82	8. Participación en la Fase de Aprestamiento	0,27		0,27	0,00	0,27																		

Para el mes de diciembre, la interventoría reporta el recibido a satisfacción de los documentos y/o productos correspondientes a la Identificación y Caracterización de actores, Análisis y Revisión de la Información y Plan operativo detallado correspondientes a la fase de aprestamiento.

3. En cumplimiento al objeto contractual del contrato 19-6-0197-0-2022, el contratista a la fecha no reporta pagos salud, pensión, riesgos profesionales y Parafiscales.

4. ESTADO FINANCIERO:

El análisis se realizó a partir del Balance del contrato Nº19-6-0197-0-2022 del 1 al 30 de diiembre de 2025, teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha es el siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$2.673.142.055.94**
1.1 Contrato inicial	**$2.673.142.055.94**	
1.2 Adiciones	$	
2. PAGOS EFECTUADOS		
2.1 Anticipo 30 %	$0	$ 801.942.616,78
2.2 Acta Parcial (DD/MM/AA)	$0	$
2.2.1 Amortización del Anticipo	$0	$
2.2.2 Valor Pago Acta Parcial No.1	$0	$0
3. VALOR PAGADO A LA FECHA	$0	$ 801.942.616,78
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0	**$1.871.199.439,16**
5. SALDO A FAVOR DE CORPOCESAR	**$**	**$0**
6. VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR	**$1.871.199.439,16**	**$0**
7. SUMAS IGUALES	**$2.673.142.055.94**	**$2.673.142.055.94**

Por las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta el informe de Interventoría No. 3, firmado por la representante Legal con fecha 15 de enero de 2026, la Ingeniera WENDY BRITO CALDERON, valida y aprueba los porcentajes y valores presupuestados para las actividades ejecutadas a la fecha, correspondientes a la fase de aprestamiento y Diagnostico, de acuerdo al tercer informe parcial del contrato de Consultoría Nº19-6-0197-0-2022.

Para constancia se firma a los 30 días del mes enero de 2025.

LIBARDO LASCARRO DITA
Supervisor
