CONTRATO [ ] CONVENIO [X]

Proyecto Aunar esfuerzos para determinar la estrategia de conservación de la especie mono aullador negro (*Alouatta palliata*); y ejecutar estrategias de control y manejo de especies invasoras de fauna y flora en municipios del departamento de Córdoba.

LOCALIZACIÓN: Las actividades se desarrollarán, teniendo en cuenta el área de distribución de las especies: Mono aullador negro (*Alouatta palliata*): Dos áreas protegidas en el departamento de Córdoba (DCS Ciénaga de Bañó y una Reserva Natural de la Sociedad civil). Hidrila (*Hydrilla verticillata*): DCS Ciénaga de Bañó y áreas aledañas. Caracol gigante africano (*Lissachatina fulica*): Municipio de Montería, Montelíbano y Sahagún, departamento de Córdoba. Hormiga loca (*Nylanderia fulva*): Municipios de Sahagún y Pueblo Nuevo, departamento de Córdoba.

Vereda: _____

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: Abril 2026

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL
DATOS DEL CONTRATO:

CONVENIO N°:	**010 – 2026**
TIPO DE CONVENIO:	**Convenio de Asociación**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO:	28/01/2026
CONVENIANTE:	FUNDACIÓN OMACHA
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO TRUJILLO GONZALEZ
OBJETO:	Aunar esfuerzos para determinar la estrategia de conservación de la especie mono aullador negro (*Alouatta palliata*); y ejecutar estrategias de control y manejo de especies invasoras de fauna y flora en municipios del departamento de Córdoba.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$389.111.111
ANTICIPO (40%):	Si_X_ No___ Valor: $140.080.000
PLAZO INICIAL:	Siete (7) meses

FECHA DE INICIO:	Enero 30 de 2026
FECHA DE TERMINACION:	30 de Agosto de 2026

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	NA	NA
	Reinicio No. 1	**NA**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**NA**		
PRÓRROGAS:	**NA**		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	**NA**		
VALOR DE ADICIÓN	**NA**		
APORTE CVS DE LA ADICIÓN	**NA**		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	juridico@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**25-44-101211362**			**ANEXO No 0**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	Si	(28/01/2026)	(05/03/2027)	$38.911.111,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Si	(28/01/2026)	(05/03/2027)	$140.080.000,00
Calidad del servicio	Si	(28/01/2026)	(05/03/2027)	$38.911.111,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Si	(28/01/2026)	(05/09/2029)	$19.455.555,00
POLIZA RCE No	**25-40-101056104**			

Pago de responsabilidad civil extracontractual	Si	(28/01/2026)	(05/09/2026)	$350.181.000,00

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO:

NA

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
Estrategia de conservación de la especie mono aullador negro (*Alouatta palliata*) en el departamento de Córdoba	Febrero Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrato. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para fases de campo Reunión de Comité No 1 Acciones documentales (llamadas telefónicas, revisión información secundaria, evaluación cartográfica) para definición de la segunda área de evaluación, y, seguimiento de condiciones de inundación en áreas de acción para definir inicio de actividades de campo - Fecha: 01 – 28 febrero de 2026 Marzo Se llevaron a cabo visitas de acercamiento comunitario en dos localidades del área de estudio: vereda El Mundo, municipio de San Pelayo, y vereda Maracayo, municipio de Lorica. Se realizó un taller comunitario en la vereda El Mundo, a la cual asistieron 37 personas, logrando confirmar el reconocimiento de la especie en varios lugares de la localidad. Se realizó un trabajo de campo orientado al reconocimiento preliminar de la presencia de la especie en el DCS Ciénaga de Bañó, durante el cual se registró una tropa de siete	50%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	individuos. - Fecha: 01 – 30 marzo de 2026 Abril Se realizaron cinco talleres comunitarios en cinco localidades, tres en el municipio de Lorica (corregimiento Cotocá Arriba, veredas Maracayo, Monpós) y dos en el municipio de San Pelayo (corregimiento Sabana Nueva, vereda El Mundo), con una asistencia total de 132 personas y una asistencia promedio por taller de 26 personas. Entre el 30% y el 74% de los asistentes a los talleres reconocen la especie como mono aullador negro y la han visto en vida silvestre, y, consideran que la mayor amenaza que enfrenta es la pérdida de hábitat como consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola. - Fecha: 01 – 30 abril de 2026	
Formular protocolo de manejo para la especie invasora (*Hydrilla verticillata*) con evaluación de presencia en el DCS Ciénaga de Bañó y áreas aledañas.	Febrero Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrato. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para fases de campo Reunión de Comité No 1 Acciones documentales (revisión información secundaria) para identificar acciones realizadas por CVS, y, realizar seguimiento de condiciones de inundación en áreas de acción para definir inicio de actividades de campo - Fecha: 01 – 28 febrero de 2026 Marzo Se realizó un trabajo de campo orientado al reconocimiento preliminar de la presencia de la especie en el DCS Ciénaga de Bañó, con	50%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	resultados de confirmación. Se realizó un acercamiento comunitario con diferentes asociaciones pertenecientes a los distritos de conservación de Ciénaga de Bañó, Ciénaga de Los Negros (Secretario de la asociación de pescadores artesanales) y Ciénaga Corralito (Vicepresidente y asesor de la asociación de pescadores artesanales y cultivadores indígenas de Severá y Asociación de piscicultores de la Ciénaga de Corralito). - Fecha: 01 – 30 marzo de 2026 Abril Se realizaron acercamientos con líderes comunitarios de las ciénagas de Bañó, Los Negros y Corralito, con el fin de recopilar información sobre la presencia de la especie. A partir de esto, se aplicaron 51 encuestas semiestructuradas a pobladores vinculados principalmente a actividades productivas como la pesca, la agricultura y oficios varios. La encuesta incluyó variables sociodemográficas y preguntas sobre reconocimiento de la especie, tiempo de observación, percepción de su carácter invasor, acciones de control y conocimientos sobre posibles usos como una estrategia de control de su población. Los resultados mostraron un alto reconocimiento visual de la especie, pero un bajo nivel de conocimiento sobre su impacto ecológico, carácter invasor y potenciales usos. También se evidenció una limitada percepción de acciones institucionales y comunitarias de control. - Fecha: 01 – 30 abril de 2026	
Identificación y seguimiento de áreas de presencia de la especie caracol gigante africano (*Lissachatina fulica*) en los municipios de Montería, Montelíbano y Sahagún	Febrero Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrato. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para fases de campo	50%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	Reunión de Comité No 1 Visita al ICA para informar sobre el inicio de actividades y consulta sobre insecticidas aprobados y vigentes para el control de las especies objetivo - Fecha: 01 – 28 febrero de 2026 Marzo Se realizaron visitas de Seguimiento en 9 puntos (6 en Montelíbano, 2 Montería y 1 Sahagún), a partir de las cuales se identificaron dos nuevos focos de infestación en el municipio de Montelíbano. Se llevaron a cabo tres jornadas educativas con estudiantes de grado 9°, 10° y 11° de la Institución Educativa San José, Sahagún – Córdoba, con la asistencia y participación de 85 estudiantes. - Fecha: 01 – 30 marzo de 2026 Abril Se realizaron jornadas de monitoreo y control de caracol gigante africano en el municipio de Montelíbano. - Fecha: 01 – 30 abril de 2026	
Identificación de áreas de presencia de la especie hormiga loca (*Nylanderia fulva*) en los municipios de Pueblo Nuevo y Sahagún.	Febrero Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrato. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para fases de campo Reunión de Comité No 1 Visita al ICA para informar sobre el inicio de actividades y consulta sobre insecticidas aprobados y vigentes para el control de las especies objetivo	50%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	- Fecha: 01 – 28 febrero de 2026 Marzo Se realiza la primera medida (punto "0" 2026) de abundancia de individuos a través de trampas en las cinco parcelas de monitoreo, encontrando promedios superiores a 100 individuos en La Corocita (101,25) y El Crucero (133,75). Se realizaron dos monitoreos de seguimiento en áreas afectadas (veredas La Corocita y El Crucero). Se llevó a cabo una jornada educativa, desarrollada en el municipio de Sahagún, en la I.E. San José, con la participación de 29 estudiantes de los grados 9° y 11°. - Fecha: 01 – 30 marzo de 2026 Abril Se realizaron aplicaciones de control en cinco áreas establecidas previamente para manejo de la especie y, de manera complementaria, se logró intervenir 51 hectáreas en nuevos puntos afectados por la presencia de *Nylanderia fulva*, ampliando la cobertura de atención y fortaleciendo las acciones de control en los municipios priorizados. - Fecha: 01 – 30 abril de 2026	
Implementación de medidas de control y manejo de la especie hormiga loca (*Nylanderia fulva*) y caracol africano (*Lissachatina fulica*) en municipios afectados.	Febrero Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrato. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para fases de campo Reunión de Comité No 1 Visita al ICA para informar sobre el inicio de actividades y consulta sobre insecticidas	50%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	aprobados y vigentes para el control de las especies objetivo - Fecha: 01 – 28 febrero de 2026 Marzo Reconocimiento de áreas con mayor infestación para diseño y planeación de medidas de control. - Fecha: 01 – 30 marzo de 2026 Abril Se realizaron jornadas de monitoreo y control de caracol gigante africano en el municipio de Montelíbano. Se realizaron aplicaciones de control en cinco áreas establecidas previamente para manejo de la especie y, de manera complementaria, se logró intervenir 51 hectáreas en nuevos puntos afectados por la presencia de *Nylanderia fulva*. - Fecha: 01 – 30 abril de 2026	
Videoclip resumen de actividades del proyecto en formato HD, de máximo 5 minutos.	Febrero Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrato. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para fases de campo Reunión de Comité No 1 - Fecha: 01 – 28 febrero de 2026 Marzo Se realizó taller con el área de comunicaciones sobre lineamientos para desarrollo del guión y toma de fotográficas y video gráficas durante la ejecución del	50%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	Convenio. - Fecha: 01 – 30 marzo de 2026 Abril Se realizó reunión interinstitucional entre el área de comunicaciones de CVS y el área de comunicaciones de Fundación Omacha para la redefinición del mensaje del video clip. Se concluyó que se producirán dos videos cortos (uno sobre el objetivo ecosistémico y general del convenio y otro sobre acciones y resultados puntuales del Convenio). Se elaboraron los guiones de los dos videos y se dio inicio al levantamiento de imágenes en campo. - Fecha: 01 – 30 abril de 2026	

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO: **$389.111.111**
VALOR ANTICIPO: **$140.080.000**
% AVANCE FINANCIERO: **40%**

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	11/03/2026	$140.080.000				$140.080.000		$140.080.000
ACTA 01								
ACTA FINAL								

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
- Registro mensual de afiliación y cobertura de ARL y Seguridad social para trabajadores y contratistas. - Elementos de protección personal	- Certificados vigentes - Uso de elementos de protección personal (EPP) en el desarrollo de actividades diarias	Se cuenta con los respectivos soportes documentales

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO: N/A


REGISTRO FOTOGRAFICO

- **Componente 1**




Cierres de los talleres comunitarios realizados en localidades de la zona ribereña de las subregiones Bajo y Medio Sinú con presencia confirmada de Alouatta palliata, en el marco de la ejecución del Componente 1 del Convenio de Asociación 010-2026 (Focales).

- **Componente 2.**

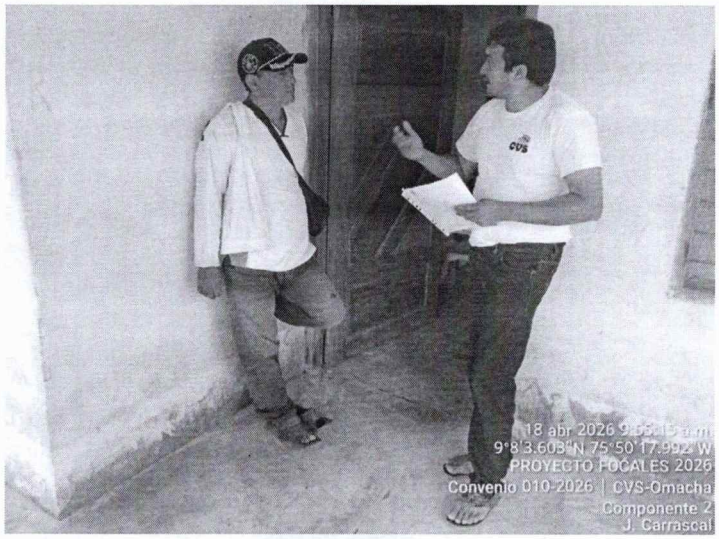


Aplicación de la encuesta diseñada para el sondeo comunitario de presencia de H. verticillata, en el marco del convenio de cooperación 010 – 2026.

- **Componente 3.**

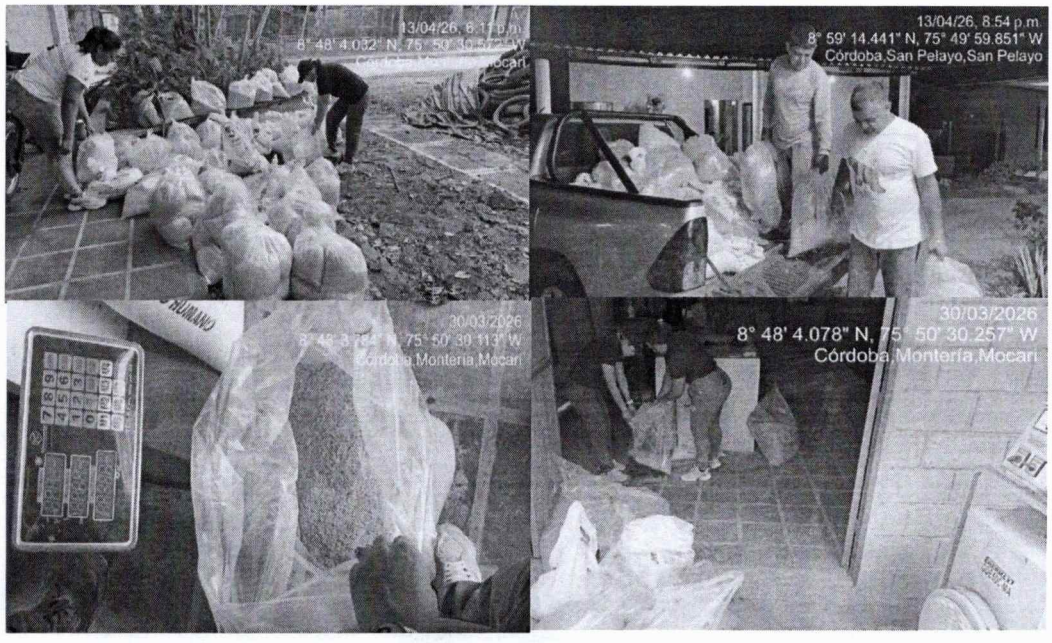

Pesaje y empaque de los insumos utilizados para la preparación del cebo tóxico, empleado como medida de control para hormiga loca (Nylanderia fulva).

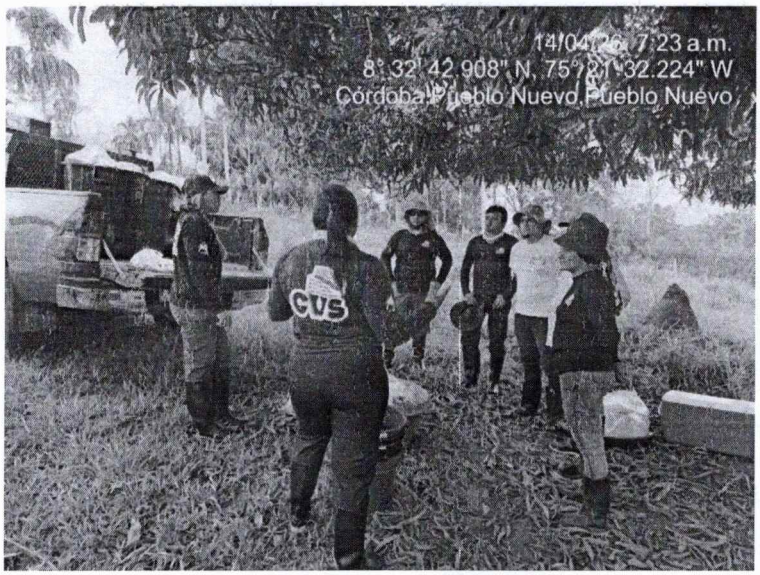

Inducción al personal de apoyo para la aplicación de cebo como medida de control de hormiga loca (Nylanderia fulva).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- Porcentaje de avance: **50%**
- El cronograma se ha adaptado a la realidad del territorio, luego de la emergencia climática, logrando dar cumplimiento al plan de trabajo.

Recomendaciones:

Tal como se hace conocer al representante del conveniante y/o contratista e interventoría, quienes se dan por informado por la firma de este documento.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de abril del año 2026 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

Dalila Caicedo H. Firmado digitalmente por Dalila Caicedo H. Fecha: 2026.05.04 11:51:10 -05'00'

ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ
Supervisor CVS

DALILA CAICEDO HERRERA
Supervisora Fundación Omacha

Abril 30 de 2026
