Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE DEL 01 de abril de 2026 AL 31 de abril de 2026 CONTRATO No. 3512 de 2025

REGISTRO BPyP No.: 2025004150014

FECHA INICIACIÓN: 4 de NOVIEMBRE de 2025 FECHA TERMINACIÓN 03 de NOVIEMBRE de 2026

CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACÁ AGROSOSTENIBLE SUPERVISOR: SARA LORENA VEGA FLOREZ

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES CON ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
			VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**T**	**P**	**N**	**OBSERVACIONES**
1	Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible.	Para el presente informe se ha cumplido con la actividad en su totalidad sin novedad para reportar.	X			
2	Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.	La actividad se da por terminada en el mes de marzo con la entrega de los resultados de los análisis de suelos en cada una de las áreas de producción destinadas para el proyecto por parte de los beneficiarios seleccionados en los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá. Se realizan labores de seguimiento y acompañamiento por parte del equipo técnico y operativo a cada uno de los procesos que permiten fortalecer la producción ganadera en los municipios beneficiados con visitas a los beneficiarios seleccionados en los municipios anteriormente mencionados. Se realizó el servicio de transporte para el desplazamiento a cada uno de los municipios.	X			
3	Capacitar en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje.	La actividad se da por terminada en el mes de marzo realizando las respectivas capacitaciones en buenas prácticas Ganaderas (BPG) para la calidad e innocuidad de la producción de ensilaje en los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá, atendiendo a cada uno de los beneficiarios seleccionados.	X			
4	Capacitar en procesos de ensilaje para determinar el periodo de cosecha de biomasa y oferta forrajera.	La ejecución de la presente actividad se tiene programada para los siguientes meses de ejecución del contrato.		X		
5	Desarrollar capacidades que fortalezcan los procesos asociativos y los canales de comercialización del sector ganadero.	La ejecución de la presente actividad se tiene programada para los siguientes meses de ejecución del contrato.		X		

Firma: SARA LORENA VEGA FLOREZ
Nombre: **SARA LORENA VEGA FOREZ**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Gobernación de Boyacá
Contratación
MARILYN PACHECO BUENO
FECHA 14/05/2026

Firma: Edgar Monroy
Nombre: **EDGAR IVAN MONROY JAIMES**
CONTRATISTA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.

INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES

PARTE 1. IDENTIFICACIÓN

No. INFORME	CONTRATO No.	PERIODO INFORME DESDE	HASTA
6	**3512 de 2025**	**01 de ABRIL de 2026**	**30 de ABRIL de 2026**
DEPENDENCIA **DESPACHO DEL GOBERNADOR**		FECHA INICIO CONTRATO **4 de NOVIEMBRE de 2025**	FECHA TERMINACION **03 de NOVIEMBRE de 2026**
OPERADOR **CONSORCIO BOYACÁ AGROSOSTENIBLE**		IDENTIFICACION **NIT: 901.999.279**	
Objeto del contrato: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES CON ACCESO A FACTORES PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR GANADERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"			
Supervisor **SARA LORENA VEGA FLOREZ**			

PARTE 2. INFORME DE ACTIVIDADES

1. ACTIVIDADES MGA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 3512 de 2025

ACTIVIDAD MGA			
1.1	Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible.		
PRODUCTO MGA 1.1.1 Realizar eventos de Sensibilización PRODUCTO MGA 1.1.2 Realizar de actas de compromiso producto de la transferencia de conocimiento a la población beneficiaria. Cantidad Total: 410	Para el periodo reportado se da por terminada la actividad. El valor de la actividad es de $182.730.158,44 del cual fue ejecutado el valor de $173.619.806,68 y quedo un remanente de $9.110.351,76	TIEMPO N/A	EVIDENCIAS (Adjuntarlas) ***N/A***

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	SALDO TOTAL DE LA ACTIVIDAD
$ 182.730.158,44	$ 9.110.351,76

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO SGR	SALDO POR EJECUTAR
$ 182.730.158,44	$ 0	$ 9.110.351,76
CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA SGR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO SGR	CANTIDAD POR EJECUTAR SGR
410	0	0

ACTIVIDAD MGA			
1.2	Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.		
PRODUCTO MGA 1.2.1 Establecer y mantener sistemas productivos forrajeros (Componente técnico) PRODUCTO MGA 1.2.2 Realizar actas de entrega de equipos de ensilaje, Picapastos, fumigadora	Para el periodo de abril se realizó la labor del equipo técnico y operativo para el seguimiento y acompañamiento a cada uno de los procesos por medio de visitas a los beneficiarios seleccionados del proyecto en los municipios de Zetaquira, Garagoa, Motavita, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubara, Soracá, Santa María y	TIEMPO 330 Días	EVIDENCIAS (Adjuntarlas) ***Soporte digital*** ***- Informe mes de Abril*** ***- Reporte de transporte Abril 2026***

PRODUCTO MGA 1.2.3 Realizar actas de entrega de kit de Insumos PRODUCTO MGA 1.2.4 Realizar Análisis de suelos y entregar los resultados PRODUCTO MGA 1.2.5 Reportar compendios de evidencia de Transporte Cantidad Total: 1222	Chiquinquirá. así como servicio de transporte para el desplazamiento a cada uno de los Municipios.		

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	SALDO TOTAL DE LA ACTIVIDAD
$ 11.403.847.402	$ 613.524.582,62

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO SGR	SALDO POR EJECUTAR
$ 11.403.847.402	$ 96.963.933,52	$ 613.524.582,62
CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA SGR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO SGR	CANTIDAD POR EJECUTAR SGR
1222	2	12

ACTIVIDAD MGA

2.1 | Capacitar en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje.

PRODUCTO MGA 2.1.1 Realizar capacitación en los municipios en Buenas Prácticas Ganadera (BPG) para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje. Cantidad Total: 10	Para el periodo reportado se da por terminada la actividad. El valor de la actividad es de $104.409.269 del cual fue ejecutado el valor de $ 103.651.082,18. Quedando un remanente de $758.186,85	TIEMPO 30 Días	EVIDENCIAS (Adjuntarlas) ***N/A***

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	SALDO TOTAL DE LA ACTIVIDAD
$ 104.409.269	$ 758.186,85

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO SGR	SALDO POR EJECUTAR
$ 104.409.269	$ 0	$ 758.186,85
CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA SGR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO SGR	CANTIDAD POR EJECUTAR SGR
10	0	0

ACTIVIDAD MGA

2.2. | Capacitar en procesos de ensilaje para determinar el periodo de cosecha de biomasa y oferta forrajera.

PRODUCTO MGA 2.2.1 Realizar capacitación en los municipios sobre procesos de ensilaje para determinar el periodo de cosecha de biomasa y oferta forrajera. Cantidad Total: 10	N/A	TIEMPO N/A	EVIDENCIAS (Adjuntarlas) **N/A**

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	SALDO TOTAL DE LA ACTIVIDAD
$ 104.409.269	$ 104.409.269

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO SGR	SALDO POR EJECUTAR
$ 104.409.269	$ 0	$ 104.409.269
CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA SGR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO SGR	CANTIDAD POR EJECUTAR SGR
10	0	10

ACTIVIDAD MGA			
3.1	Desarrollar capacidades que fortalezcan los procesos asociativos y los canales de comercialización del sector ganadero.		
PRODUCTO MGA 3.1.1 Realizar capacitación en los municipios sobre procesos asociativos y los canales de comercialización del sector ganadero. Cantidad Total: 10	N/A	TIEMPO N/A	EVIDENCIAS (Adjuntarlas) **N/A**
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD		SALDO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	
$ 104.409.269		$ 104.409.269	
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO SGR	SALDO POR EJECUTAR	
$ 104.409.269	$ 0	$ 104.409.269	
CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA SGR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO SGR	CANTIDAD POR EJECUTAR SGR	
10	0	10	

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATO 3512

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
1.1 Actividad 1. *Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible.* ***Código 1.1.1*** **Realizar eventos de Sensibilización**	Para el presente informe se ha cumplido con la actividad en cada uno de los municipios a cada uno de los beneficiarios seleccionados. Realizando 10 jornadas de sensibilización en los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Belén, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá.	X			**N/A**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
1.1 Actividad 1. *Realizar la transferencia de conocimiento técnico a la población beneficiaria en la*	Para el presente informe se ha cumplido con la actividad en cada uno de los municipios a cada uno de los beneficiarios seleccionados	X			**N/A**

aplicación de sistemas de producción ganadera sostenible. ***Código 1.1.2*** **- Realizar de actas de compromiso producto de la transferencia de conocimiento a la población beneficiaria**	con la firma de 400 actas de compromiso. Correspondiente a los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Belén, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá. Así como la recepción de la documentación requerida para la participación en el proyecto.				

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
1.2 Actividad 2 *Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.* ***Código 1.2.1*** **- Establecer y mantener sistemas productivos forrajeros (Componente técnico)**	Para el periodo a reportar se realizó el respectivo seguimiento por parte del equipo técnico a cada uno de los beneficiarios seleccionados con el propósito de fortalecer los posesos de producción ganadera en cada uno de los municipios priorizados en el presente contrato en el departamento de Boyacá.		X		***Soporte digital*** **Evidencias Fotográficas**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
1.2 Actividad 2 *Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.* ***Código 1.2.2*** **- Realizar actas de entrega de equipos de ensilaje, picapastos, fumigadora**	La presente actividad se da por culminada en el mes de febrero del presente año con la entrega de equipos de ensilaje, picapastos, fumigadora a cada uno de los beneficiarios seleccionados en los 10 municipios priorizados y se reúnen las respectivas actas de entrega.	X			**N/A**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
1.2 Actividad 2 *Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.* ***Código 1.2.3*** **- Realizar actas de entrega de kit de**	Para el presente informe se ha cumplido con la actividad en cada uno de los municipios por medio de la entrega del kit de Insumos a cada uno de los beneficiarios seleccionados en los 10 municipios del proyecto con la correspondiente acta de entrega.	X			**N/A**

Insumos					

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
1.2 Actividad 2 *Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.* ***Código 1.2.4*** **- Realizar Análisis de suelos y entregar los resultados**	La actividad se da por terminada en el mes de marzo con la entrega de los resultados los análisis de suelos en cada una de las áreas de producción destinadas para el proyecto por parte de los beneficiarios seleccionados en los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá	X			**N/A**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
1.2 Actividad 2 *Establecer sistemas sostenibles que fortalezca la producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá.* ***Código 1.2.5*** **- Reportar compendios de evidencia de Transporte**	Para el presente informe se realizó el servicio de transporte para el desplazamiento a cada uno de los municipios donde se llevó a cabo el proceso de visitas y seguimiento cada una de los beneficiarios seleccionados.		X		***Soporte digital*** **Reporte de transporte abril 2026**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
2.1 Actividad 3 *Capacitar en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje.* ***Código 2.1.1*** **-Realizar capacitación en los municipios en Buenas Prácticas Ganadera (BPG) para la calidad e inocuidad de la producción de ensilaje.**	Para el presente informe se ha cumplido con la actividad de la Capacitación en buenas prácticas Ganaderas (BPG) para la calidad e incocuidad de la producción de ensilaje en los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá, atendiendo a cada uno de los beneficiarios seleccionados.	X			**N/A**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO			
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**

		T	P	N	
2.2 Actividad 4 *Capacitar en procesos de ensilaje para determinar el periodo de cosecha de biomasa y oferta forrajera.* ***Código 2.2.1*** **-Realizar capacitación en los municipios sobre procesos de ensilaje para determinar el periodo de cosecha de biomasa y oferta forrajera.**	**N/A**			X	**N/A**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
3.1 Actividad 5. *Desarrollar capacidades que fortalezcan los procesos asociativos y los canales de comercialización del sector ganadero.* ***Código 3.1.1*** **-Realizar capacitación en los municipios sobre procesos asociativos y los canales de comercialización del sector ganadero.**	**N/A**			X	**N/A**

3.2 APOYO A LA SUPERVISION (TÉCNICA, JURIDICA Y FINANCIERA)

ACTIVIDAD MGA **3.2.** | Realizar el apoyo a la Supervisión			
PRODUCTO MGA 3.2.1 3.2.1 Realizar apoyo a la supervisión con los componentes técnicos, jurídicos y financieros Cantidad Total: 13	Para el mes de abril de 2026, se realizó el seguimiento al desarrollo de la actividad 2, así como la revisión de lo ejecutado conforme al presupuesto e informe presentado, verificando cada uno de los anexos y soportes relacionados con el componente técnico, jurídico y financiero correspondientes.	TIEMPO 360 días	EVIDENCIAS (Adjuntarlas) ***Soporte digital 6*** ***-*** *Documentos correspondientes*

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	SALDO TOTAL DE LA ACTIVIDAD
$329.856.000	$ 192.988.467

COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD EN EL PERIODO SGR	SALDO POR EJECUTAR
$329.856.000	$ 20.054.000	$ 192.988.467
CANTIDAD TOTAL PROGRAMADA SGR	CANTIDAD EJECUTADA EN EL PERIODO SGR	CANTIDAD POR EJECUTAR SGR

13	1	7

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISION					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
1. Efectuar según lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliación al sistema de seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato y mantener dichas afiliaciones y sus correspondientes pagos.	**Desde el componente jurídico:** Del informe aportado referente a la parte jurídica se verifico el cumplimiento de las obligaciones correspondientes con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales por parte del contratista. **Desde el componente financiero:** Para el presente informe se realizó la revisión al informe de ejecución del mes de abril revisando cada uno de los valores y porcentajes de avance financiero presentados de la siguiente manera: Para la actividad 2 se realizó el seguimiento a los valores por parte del equipo de talento humano y servicio de transporte. **Desde el componente técnico** se realizó el acompañamiento y seguimiento al proceso de ensilaje realizadas en los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Belén, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá, atendiendo a cada uno de los beneficiarios seleccionados.		X		**N/A**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN**			**OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)**
		T	P	N	
2. Verificar el cumplimiento de las metas contractuales en cuanto a cronogramas y planes de trabajo planteados	Se estuvo al pendiente del cumplimiento de cada una de las actividades tanto de seguimiento a las visitas realizadas por parte del personal técnico.		X		**N/A**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
3. Verificar las condiciones de los informes presentados por los contratistas en cuanto al porcentaje de ejecución del contrato, informe de actividades, reporte de pagos al sistema de seguridad social y parafiscales de contratistas, de equipo de trabajo y de más obligaciones contractuales a verificar.	Para el informe del mes de abril se realizó la revisión corroborando cada uno de los porcentajes de avance frente a lo presentado en cada una de las actividades, así como la revisión de los pagos a seguridad social por parte de los contratistas.		X		N/A

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
4. Velar por la debida ejecución administrativa, legal y financiera de los contratos, para lo cual suscribirá actas de iniciación, actas parciales, finales de liquidación y autorizará los pagos correspondientes a los contratistas	Se actuó diligente y cuidadosamente de acuerdo con el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta las cláusulas establecidas en el contrato verificando el cumplimiento del desarrollo técnico jurídico y financiero.		X		N/A

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
5. Adelantar estricto seguimiento y supervisión técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable a las actividades pactadas en el contrato	Por parte del equipo contratado por parte de la supervisión durante el mes de abril se realizó el acompañamiento al desarrollo del proyecto a cada uno de los beneficiarios seleccionados en los municipios de Motavita, Zetaquira, Garagoa, Belén, Floresta, Santa Rosa, Toca, Cubará, Soracá, Santa María y Chiquinquirá.		X		N/A

PARTE 3. BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO	SGR Valor Ejecutado Contrato 3512 de 2025	SGR Valor Ejecutado del Apoyo a la Supervisión	Valor Ejecutado acumulado
Valor total	**$ 11.899.805.368,00**	**$ 329.856.000,00**	**$ 12.229.661.368,00**
Valor ejecutado previo al presente informe	**$ 10.970.629.775,19**	**$ 116.813.533,00**	**$ 11.087.443.308,19**

Valor ejecutado en el periodo de (fecha de informe)	**$ 96.963.933,52**	**$ 20.054.000,00**	**$ 117.017.933,52**
Valor por ejecutar	**$ 832.211.659,29**	**$ 192.988.467,00**	**$ 1.025.200.126,29**

Tunja 05 de mayo de 2026

SARA LORENA VEGA FLOREZ
SUPERVISORA

Vo.Bo ANDRÉS LEONARDO BECERRA
Director Técnico Operación Contrato
Consorcio Boyacá Agrosostenible

Gobernación de Boyacá

Siembra

CONSORCIO BOYACÁ AGROSOSTENIBLE

Abril 2026

Informe de Implementación
y Acompañamiento Técnico



Fortalecimiento de las capacidades productivas sostenibles con acceso a factores productivos para el

sector ganadero en el Departamento de Boyacá

Contenido

Lista de Imágenes 3

Introducción 5

1. Avance General De Implementación 6

2. Municipio de Chiquinquirá. 8

2.1. Preparación y Acondicionamiento de Suelos. 8

2.2. Establecimiento de Pasturas 9

2.3. Uso de Insumos Suministrados por el Proyecto. 11

3. Municipio de Cubará. 12

3.1. Preparación y Acondicionamiento de Suelos. 12

3.2. Establecimiento de Pasturas 13

3.3. Uso de Insumos Suministrados por el Proyecto. 14

4. Municipio de Floresta. 15

4.1. Preparación y Acondicionamiento de Suelos. 15

4.2. Establecimiento de Pasturas 16

4.3. Uso de Insumos Suministrados por el Proyecto. 17

5. Municipio de Garagoa. 18

5.1. Preparación y Acondicionamiento de Suelos. 18

5.2. Establecimiento de Pasturas 19

5.3. Uso de Insumos Suministrados por el Proyecto. 20

6. Municipio de Motavita. 21

6.1. Preparación y Acondicionamiento de Suelos. 21

6.2. Establecimiento de Pasturas..... 22

6.3. Uso de Insumos Suministrados por el Proyecto. 23

7. Municipio de Santa María. 24

7.1. Preparación y Acondicionamiento de Suelos..... 24

7.2. Establecimiento de Pasturas..... 25

7.3. Uso de Insumos Suministrados por el Proyecto. 26

8. Municipio de Santa Rosa de Viterbo..... 27

8.1. Preparación y Acondicionamiento de Suelos..... 27

8.2. Establecimiento de Pasturas..... 28

8.3. Uso de Insumos Suministrados por el Proyecto. 29

9. Municipio de Soracá..... 30

9.1. Preparación y Acondicionamiento de Suelos..... 30

9.2. Establecimiento de Pasturas..... 30

9.3. Uso de Insumos Suministrados por el Proyecto. 31

10. Municipio de Toca..... 33

10.1. Preparación y Acondicionamiento de Suelos..... 33

10.2. Establecimiento de Pasturas..... 33

10.3. Uso de Insumos Suministrados por el Proyecto. 34

11. Municipio de Zetaquira. 36

11.1. Preparación y Acondicionamiento de Suelos..... 36

11.2. Establecimiento de Pasturas..... 37

11.3. Uso de Insumos Suministrados por el Proyecto. 38

Siembra
Sistema especial para la modernización del minifundio boyacense

Lista de Imágenes

Imagen 1. Preparación de terreno, predio el Porvenir - Sandra Maribel Bustos Chacón.....9
Imagen 2. Pastura establecida, predio de - Onaida Farfán Rincón. 10
Imagen 3. Aplicación de EM, predio El Recuerdo - Ángel Pastor Barreto Cortés. 11
Imagen 4. Preparación de terreno, predio El Delirio - María Nelly Pacheco Chapeta. 12
Imagen 5. Pastura establecida, predio de Luz Marina Torres Castro. 13
Imagen 6. Aplicación de EM, predio Villa Marta-Luis Ernesto Angarita Villamizar. 14
Imagen 7. Verificación de preparación del terreno, predio La Capilla-Samuel Rincón Cely.....15
Imagen 8. Evaluación de germinación predio Santa lucia - Norma Mariño Velandia.....16
Imagen 9. Aplicación de EM, predio Campo Hermoso - José Enrique Reyes Cely. 17
Imagen 10. Preparación de suelo finca San José- José Aladino Fonseca. 18
Imagen 11. Germinación de la semilla Mombaza finca La Brisas- Jorge Ernesto Martínez. 19
Imagen 12. Aplicación de abonos finca El Fique- Héctor Gildardo López 20
Imagen 13. Suelo preparado finca El Fique- Guillermo Quintero Suárez. 21
Imagen 14. Germinación de semilla finca Las Mañanitas- Miguel Arturo Rivera. 22
Imagen 15. Mecanización predio El Guadual- José Claudio Sánchez Alfonso. 24
Imagen 16. Pastura establecida finca El Porvenir- Pedro Torres Piñeros. 25
Imagen 17. Predio Nuevo Mundo mecanizado- Héctor Báez Gómez. 27
Imagen 18. Pastura establecida, predio La Esperanza-Blanca Lilia Rincón Álvarez. 28
Imagen 19. Activación de EM, predio La Cabaña - Luis Humberto Puerto Torres.....29
Imagen 20. Preparación de suelos finca La Sacristía- Luis Alejandro Sora. 30
Imagen 21. Pastura establecida finca Buena Vista-María Del Carmen Ramírez Suesca. 31
Imagen 22. Aplicación de abonos finca Lote de Terreno-José Trinidad Guayacán.....31
Imagen 23. Pastura establecida, predio de Sebastián Camilo Garzón Cuervo. 33
Imagen 24. Activación de EM, predio Las Manitas - Carolina Monguí Guio 35
Imagen 25. Preparación manual de suelos finca El Porvenir-Andrea Del Pilar Alba Pulido 36

Imagen 26. Siembra finca El Aljibe-Beyer Omar Vanegas Bohórquez.....37
Imagen 27. Uso de insumos finca El Retiro- Nohora Elcy Pulido Castillo. 38

Introducción

El presente informe hace parte de los indicadores para el cumplimiento de la Actividad 2. *Establecer modelos sostenibles que fortalezcan los sistemas de producción ganadera en los municipios beneficiados del departamento de Boyacá*, actividad que contempla los aspectos concernientes a la entrega de insumos, herramientas, semillas y equipos, así como la implementación y seguimiento del desarrollo de pasturas y el acompañamiento técnico a cada una de las familias beneficiarias.

Este Informe detalla los avances realizados durante el mes de abril de 2026 en el marco del proyecto en este documento sistematizan las acciones ejecutadas en los diez municipios beneficiarios, el enfoque central del periodo reportado se enfocas en el desarrollo de acciones como la preparación y acondicionamiento de suelos mediante el acompañamiento y supervisión de labores de mecanización y el seguimiento al uso de insumos entregados, así mismo el establecimiento de Pasturas.

A lo largo del informe, se identifican tanto los logros en la ejecución como los desafíos operativos enfrentados, entre los que destacan la variabilidad climática (escasez de lluvias y altas temperaturas) y las limitaciones en la disponibilidad de maquinaria agrícola en sectores específicos, entre otros.

1. Avance General De Implementación.

A nivel general la implementación de los sistemas productivos de pasturas registra un avance promedio del 81%. El desarrollo de las actividades relacionadas a dicha implementación tales como la preparación de suelos y la siembra presentan un avance del 87% y 73% respectivamente.

Tabla 1. Porcentajes de avance en el desarrollo de actividades.

Municipio	Preparación de Suelos	Siembra	Activación EM
Chiquinquirá	90%	90%	88%
Cubará	100%	43%	90%
Floresta	83%	68%	88%
Garagoa	93%	63%	90%
Motavita	90%	90%	100%
Santa María	90%	75%	100%
Santa Rosa De Viterbo	78%	75%	75%
Soracá	100%	100%	100%
Toca	100%	98%	80%
Zetaquira	48%	25%	25%
Total	**87%**	**73%**	**84%**

La tabla anterior muestra a nivel porcentual el avance por actividades realizadas en los predios de beneficiarios del proyecto, donde se observa diferencias significativas entre municipios, especialmente en Cubará y Zetaquira. Lo anterior debido a dificultades de tipo topográfico de algunos predios caracterizados por terrenos montañosos que impiden el acceso de maquinaria a los predios y limitaciones en la disponibilidad de maquinaria agrícola que han retrasado los avances en la mecanización y preparación de suelos y por consiguiente la siembra. A nivel general se identifican otras dificultades en relación a las condiciones climáticas adversas, periodos de escasez de lluvias y altas temperaturas, que dificultan la germinación, sumado a la inexistencia de infraestructura para riego (reservorios, sistemas de riego etc), así como, proliferación severa de malezas en algunos

predios. Ante lo anterior, el equipo técnico y profesional ha realizado visitas de acompañamiento y ha establecido recomendaciones y compromisos para poder avanzar en las actividades que presentan retraso en su ejecución

En los siguientes capítulos se desarrolla el avance total y durante el mes reportado de cada uno de los municipios visualizando las dificultades y acciones de mitigación en torno a cada situación identificada.

2. Municipio de Chiquinquirá.

A continuación, se describen las actividades llevadas a cabo en el municipio de Chiquinquirá durante el mes de abril.

2.1. Preparación y Acondicionamiento de Suelos.

En el municipio de Chiquinquirá, las actividades de preparación y adecuación de suelos se han desarrollado de manera progresiva en los predios de los beneficiarios, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el establecimiento de praderas mejoradas para ensilaje.

A la fecha, 36 beneficiarios ya han realizado la mecanización de sus predios, adelantando labores de preparación que permiten mejorar la estructura del suelo y facilitar el establecimiento de las pasturas.

Durante el seguimiento técnico realizado en campo, se identificaron algunas dificultades relacionadas con la forma en que se efectuó la preparación de ciertos terrenos. Lo anterior se presentó debido a la limitada disponibilidad de aperos para tractor, ya que algunos productores únicamente contaban con implementos tipo renovador de praderas, lo que ocasionó una preparación superficial del suelo, dejando algunos terrenos poco aptos para la siembra adecuada de la semilla, sin embargo, los beneficiarios efectuaron la siembra sin informar la insuficiente preparación del terreno.

Ante esta situación, fue necesario realizar visitas técnicas específicas a dichos beneficiarios, con el fin de aclarar que el procedimiento implementado no correspondía a las orientaciones brindadas previamente durante las jornadas de capacitación y asistencia técnica realizadas por el proyecto. En estas visitas se reiteró la importancia de efectuar una adecuada preparación del terreno, asegurando mejores condiciones de afinamiento y cobertura del suelo para optimizar el establecimiento de las praderas.

De igual forma, se ha insistido permanentemente en la importancia del riego durante la etapa inicial de germinación, teniendo en cuenta que la humedad es un factor fundamental para el adecuado

desarrollo de las semillas. Sin embargo, algunos beneficiarios no cuentan con reservorios de agua, dependiendo exclusivamente de las precipitaciones para disponer del recurso hídrico necesario. En este sentido, se dejaron las respectivas recomendaciones técnicas para mejorar la incorporación de la semilla y garantizar una siembra adecuada, minimizando riesgos de pérdida y favoreciendo un mejor establecimiento de la pastura.

Imagen 1. Preparación de terreno, predio el Porvenir - Sandra Maribel Bustos Chacón.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

2.2. Establecimiento de Pasturas.

En el componente de establecimiento de praderas en el municipio de Chiquinquirá, los 36 beneficiarios realizaron la siembra de las pasturas contempladas dentro del proyecto, dando cumplimiento a las actividades programadas para esta fase.

Se efectuaron visitas de seguimiento y revisión técnica a los predios sembrados, evidenciándose en varios casos una baja germinación de la misma y una considerable proliferación de malezas, las cuales están afectando el adecuado proceso de germinación y desarrollo de las pasturas debido a la competencia por nutrientes, agua, luz y espacio. En algunos predios, la presencia de estas malezas se

observó en niveles elevados, generando afectaciones directas sobre el crecimiento uniforme del pasto establecido.

Como medida de manejo y plan de acción, se realizaron recomendaciones técnicas relacionadas con la aplicación de herbicidas de uso local, seleccionados de acuerdo con el tipo de maleza identificada en cada predio. Asimismo, durante las visitas se brindaron orientaciones enfocadas en la importancia del control oportuno, con el propósito de reducir la competencia y favorecer el adecuado desarrollo de las praderas sembradas.

Imagen 2. Pastura establecida, predio de - Onaida Farfán Rincón.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

Adicionalmente, se presentó una situación particular con una beneficiaria que realizó la siembra en un predio diferente al que se encontraba registrado dentro del proyecto. Debido a este inconveniente, fue necesaria la intervención del equipo de coordinación y del componente jurídico, donde se realizó la visita al caso con el fin de analizar la situación presentada y plantear a la beneficiaria las posibles alternativas de solución frente a dicha novedad.

2.3. Uso de Insumos Suministrados por el Proyecto.

En el municipio de Chiquinquirá, 35 beneficiarios realizaron la activación de los Microorganismos Eficientes (EM), actividad que se desarrolló una vez avanzaron las labores de siembra en los predios. Durante el acompañamiento técnico se brindaron orientaciones sobre la correcta activación, multiplicación y aplicación de los EM, resaltando su importancia en el fortalecimiento de la actividad biológica del suelo y la disponibilidad de nutrientes para las pasturas.

De igual forma, se evidenció que los beneficiarios que ya realizaron la siembra han utilizado los abonos entregados por el proyecto de acuerdo con las recomendaciones técnicas, realizando aplicaciones previas para acondicionar el suelo o posteriores a la siembra como apoyo a su germinación y desarrollo inicial de las praderas.

Imagen 3. Aplicación de EM, predio El Recuerdo - Ángel Pastor Barreto Cortés.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

3. Municipio de Cubará.

A continuación, se describen las actividades llevadas a cabo en el municipio de Cubará durante el mes de abril.

3.1. Preparación y Acondicionamiento de Suelos.

En el municipio de Cubará, se ha logrado avanzar en las actividades de preparación y acondicionamiento de suelos, contando actualmente con 40 predios debidamente acondicionados para el establecimiento de las pasturas. Durante el acompañamiento técnico, se brindaron recomendaciones relacionadas con la adecuada preparación del terreno y el manejo de los suelos, teniendo en cuenta que, según los análisis realizados, en gran parte de los predios predominan los suelos de contextura arenosa, condición que influye directamente en la retención de humedad y nutrientes, por esta razón, se recomendó a los beneficiarios realizar la incorporación de los insumos al momento de la siembra y de manera localizada, buscando optimizar.

Imagen 4. Preparación de terreno, predio El Delirio - María Nelly Pacheco Chapeta.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

3.2. Establecimiento de Pasturas.

En este municipio 17 beneficiarios han realizado la siembra de pasturas, estas siembras se han desarrollado bajo las recomendaciones técnicas brindadas, buscando garantizar un establecimiento uniforme y eficiente del cultivo. No obstante, el avance de esta actividad también se ha visto influenciado por las condiciones climáticas, donde la falta de lluvias puede afectar la germinación, mientras que los excesos de precipitación generan saturación del suelo, impactando negativamente el desarrollo inicial de las pasturas.

Como plan de acción, se han venido realizando visitas a los predios, incentivando a los productores a efectuar la siembra oportunamente y brindando recomendaciones técnicas para mejorar el establecimiento de las praderas bajo las condiciones presentes, y de igual forma, el uso de productos comerciales como hidroretenedores agrícolas para garantizar un mejor manejo del recurso hídrico y contar con la debida humedad en el suelo.

Imagen 5. Pastura establecida, predio de Luz Marina Torres Castro.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

3.3. Uso de Insumos Suministrados por el Proyecto.

Respecto al uso de los insumos entregados por el proyecto, 36 beneficiarios realizaron la activación de los Microorganismos Eficientes (EM), actividad desarrollada siguiendo las orientaciones técnicas brindadas durante las capacitaciones y visitas de campo. Los 4 beneficiarios restantes manifestaron su compromiso de realizar dicha activación en los días posteriores al generar el compromiso.

Asimismo, los productores indicaron que la aplicación del acondicionador de suelos y Carbox Compost se realizará de manera localizada al momento de la siembra, con el fin de que los nutrientes queden directamente en el área donde se ubicará la semilla, facilitando así una absorción más eficiente por parte de la planta. Esta recomendación técnica se realizó considerando las características arenosas de los suelos y la necesidad de evitar pérdidas de los insumos por efecto de las lluvias.

Imagen 6. Aplicación de EM, predio Villa Marta-Luis Ernesto Angarita Villamizar.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

4. Municipio de Floresta.

A continuación, se describen las actividades llevadas a cabo durante el mes de abril en el municipio de Floresta.

4.1. Preparación y Acondicionamiento de Suelos.

En el municipio de Floresta, se evidenció avance en las labores de preparación y acondicionamiento de suelos, logrando que 33 beneficiarios realizaran la mecanización de sus predios para el establecimiento de las pasturas. Los beneficiarios restantes manifestaron encontrarse a la espera de que el tractor del municipio culminara su proceso de reparación y estuviera nuevamente disponible, debido a que la administración municipal les estaba subsidiando dicha labor.

Imagen 7. Verificación de preparación del terreno, predio La Capilla-Samuel Rincón Cely.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

En las visitas de seguimiento realizadas por el equipo coordinador a los beneficiarios pendientes en el desarrollo de esta actividad, se recordó que, de acuerdo con el acta de compromiso firmada al inicio del proyecto, cada beneficiario debía asumir por su cuenta la mecanización requerida para el establecimiento de las praderas. Como medida de apoyo y plan de acción, se facilitó el contacto de

un tractorista de un municipio aledaño, buscando que los beneficiarios se organizaran grupalmente para contratar el servicio y avanzar con la adecuación de los terrenos y la posterior siembra.

4.2. Establecimiento de Pasturas.

En relación con el establecimiento de las pasturas, 27 beneficiarios realizaron la siembra en sus respectivos predios. Sin embargo, varios productores decidieron posponer esta actividad debido a las condiciones climáticas presentadas en el municipio, principalmente por la falta de lluvias y la limitada disponibilidad de agua para riego.

Imagen 8. Evaluación de germinación predio Santa lucia - Norma Mariño Velandia.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

Durante las visitas técnicas se evidenció que muchos beneficiarios no cuentan con reservorios de agua, dependiendo exclusivamente de las precipitaciones para garantizar la humedad necesaria para la germinación y el adecuado desarrollo inicial de las semillas. Como plan de acción, se han venido realizando visitas a los predios, incentivando a los productores a efectuar la siembra oportunamente y brindando recomendaciones técnicas para mejorar el establecimiento de las praderas bajo las condiciones presentes, y de igual forma, el uso de productos comerciales como

hidroretenedores agrícolas para garantizar un mejor manejo del recurso hídrico y contar con la debida humedad en el suelo.

4.3. Uso de Insumos Suministrados por el Proyecto.

Respecto al uso de los insumos entregados por el proyecto, 35 beneficiarios realizaron la activación y multiplicación de los Microorganismos Eficientes (EM), siguiendo las orientaciones técnicas suministradas durante las capacitaciones y acompañamientos realizados en campo. Esta actividad permitió fortalecer el componente biológico del suelo y favorecer la disponibilidad de nutrientes para el desarrollo de las pasturas.

De igual forma, los beneficiarios realizaron la incorporación de los insumos, tales como acondicionador de suelos y Carbox Compost, de manera gradual conforme avanzaban los procesos de mecanización y siembra, aplicándolos de acuerdo con las recomendaciones técnicas brindadas por el equipo profesional del proyecto.

Imagen 9. Aplicación de EM, predio Campo Hermoso - José Enrique Reyes Cely.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

5. Municipio de Garagoa.

A continuación, se describen las actividades llevadas a cabo durante el mes de abril en el municipio de Garagoa.

5.1. Preparación y Acondicionamiento de Suelos.

Durante el mes de abril, 19 beneficiarios del municipio realizaron la mecanización de sus lotes, completando así un total de 37 predios con mecanización completa, las labores se desarrollaron conforme a las recomendaciones derivadas de los análisis de suelos, incluyendo el alistamiento del lote y la incorporación de prácticas orientadas a mejorar la fertilidad y las condiciones físicas del suelo. Se presentaron limitaciones operativas debido a la topografía montañosa, que en algunos casos impidió el ingreso del tractor, y a la alta demanda del servicio de maquinaria, lo cual generó demoras en la preparación del terreno.

Imagen 10. Preparación de suelo finca San José- José Aladino Fonseca.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

5.2. Establecimiento de Pasturas.

Se realizó el establecimiento de pasturas en 25 predios de beneficiarios, dando cumplimiento a las labores recomendadas a partir de los análisis de suelos, las cuales incluyeron la preparación y adecuación del terreno, así como la incorporación de enmiendas y prácticas orientadas a mejorar la fertilidad y las condiciones físicas del suelo.

Posterior a la siembra, se efectuó verificación de germinación en campo, y se recomendaron labores de manejo inicial como control oportuno de malezas, protección del área para evitar pastoreo y, cuando fue requerido, refuerzo de fertilización de arranque de acuerdo con las recomendaciones técnicas derivadas del análisis de suelos.

Imagen 11. Germinación de la semilla Mombaza finca La Brisas- Jorge Ernesto Martínez.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

En los 15 predios restantes, los beneficiarios reportan el terreno previamente preparado y manifiestan su compromiso de culminar la siembra durante el mes de mayo, con el fin de completar la totalidad de áreas previstas por el proyecto, ante esta situación, se suscribieron compromisos con los beneficiarios, en los cuales se acordó realizar las siembras pendientes en el menor tiempo posible. En este sentido, se estableció que durante el mes de mayo quedará ejecutada la siembra en los 15

predios restantes, con acompañamiento y seguimiento técnico para asegurar el cierre de la meta prevista.

5.3. Uso de Insumos Suministrados por el Proyecto.

Los 40 beneficiarios realizaron la activación de EM, actividad que contribuye al fortalecimiento de la actividad biológica del suelo y favorece los procesos de mineralización y disponibilidad de nutrientes. En cuanto a los abonos entregados por el proyecto, se evidencia que los beneficiarios que ya realizaron la siembra los han utilizado en su totalidad, aplicándolos según las recomendaciones técnicas: algunos realizaron el abonamiento previo a la siembra para acondicionar el suelo, mientras que otros efectuaron la aplicación posterior, como apoyo al prendimiento y desarrollo inicial de la pastura.

Imagen 12. Aplicación de abonos finca El Fique- Héctor Gildardo López



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.


6. Municipio de Motavita.

A continuación, se describen las actividades llevadas a cabo durante el mes de abril en el municipio de Motavita.

6.1. Preparación y Acondicionamiento de Suelos.

En el municipio de Motavita, los predios avanzaron en la adecuación y preparación del suelo conforme a las recomendaciones técnicas brindadas por la profesional del municipio, relacionadas con la preparación previa a la siembra y el manejo del lote. Durante esta etapa, se emplearon los insumos suministrados por el proyecto (Carbox Compost y Acondicionador Orgánico) para el acondicionamiento del suelo según indicaciones técnicas. Si bien se presentaron retrasos asociados a la gestión y préstamo del tractor, actualmente se reporta que 36 predios cuentan con el terreno preparado y 4 predios se encuentra pendientes por culminar la preparación.

Imagen 13. Suelo preparado finca El Fique- Guillermo Quintero Suárez.

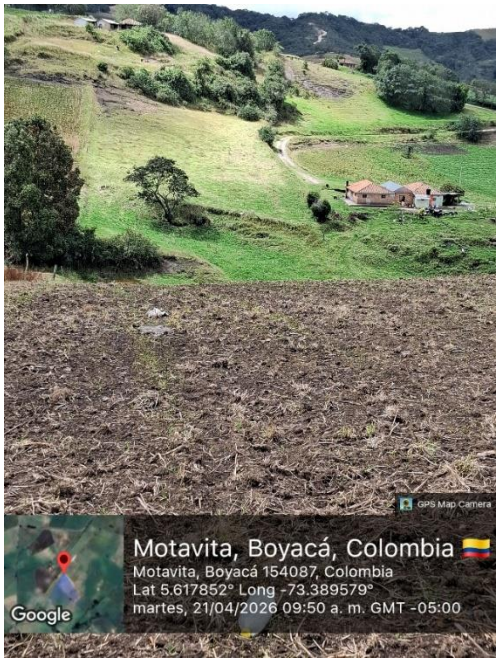

Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

Los beneficiarios que se encuentran pendientes en el desarrollo de la actividad se comprometieron a culminar las actividades en el mes de mayo, teniendo en cuenta que el tractor del municipio no tuvo disponibilidad, los productores manifestaron que contratarán un servicio particular para avanzar en las labores requeridas.

6.2. Establecimiento de Pasturas.

A la fecha, se evidencia que 36 beneficiarios realizaron la siembra utilizando los insumos suministrados por el proyecto conforme a las indicaciones técnicas, incluyendo la adecuada distribución de las semillas y el manejo inicial del lote.

Imagen 14. Germinación de semilla finca Las Mañanitas- Miguel Arturo Rivera.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

En este contexto, hacen falta 4 beneficiarios por culminar la siembra; estos productores manifestaron su compromiso de realizarla a inicios de mayo, con el fin de completar las metas del proyecto.

6.3. Uso de Insumos Suministrados por el Proyecto.

Los beneficiarios en su totalidad ya realizaron la activación de EM y varios los han aplicado durante la preparación del terreno, continuando su uso después de la siembra, de acuerdo con las recomendaciones técnicas impartidas para favorecer la actividad biológica del suelo y el establecimiento inicial de la pastura.

Así mismo respecto al restante de insumos como abonos se han usado al momento de la siembra.

7. Municipio de Santa María.

A continuación, se describen las actividades llevadas a cabo durante el mes de abril en el municipio de Santa María.

7.1. Preparación y Acondicionamiento de Suelos.

En el municipio de Santa María, la preparación del terreno avanzó conforme a las recomendaciones técnicas derivadas de los análisis de suelos y a las orientaciones impartidas por el proyecto para optimizar las condiciones de fertilidad y favorecer el establecimiento del material forrajero. A la fecha, 36 beneficiarios ya realizaron la preparación del terreno y 4 beneficiarios se encuentran pendientes por culminar esta labor. Durante esta etapa, los beneficiarios realizaron labores de alistamiento y acondicionamiento del lote; además, activaron los microorganismos y, en los predios donde fue posible avanzar, aplicaron los abonos entregados por el proyecto como apoyo al mejoramiento del suelo.

Imagen 15. Mecanización predio El Guadual- José Claudio Sánchez Alfonso.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

No obstante, se presentaron retrasos en la preparación debido a que la Alcaldía había prometido la asignación de horas de tractor provenientes de municipios aledaños, dado que Santa María no cuenta con maquinaria propia; sin embargo, aunque se programaban las jornadas, en varios casos ni el tractor ni el operario se desplazaban a los predios, lo cual aplazó la ejecución de la labor.

Se suscribieron compromisos con los beneficiarios que presentan actividades pendientes, en las cuales se dejó constancia de que realizarán la preparación del terreno y la siembra, según corresponda, en el menor tiempo posible. En este sentido, los productores manifestaron que, ante la falta de disponibilidad de maquinaria por parte de la Alcaldía, contratarán tractor particular para adelantar las labores requeridas o, en su defecto, realizarán la preparación de manera manual, de acuerdo con las condiciones de cada predio. Con estas acciones se espera dar continuidad a las actividades programadas durante el mes de mayo, con acompañamiento y seguimiento técnico para asegurar el cumplimiento de la meta establecida en el municipio.

7.2. Establecimiento de Pasturas.

Imagen 16. Pastura establecida finca El Porvenir- Pedro Torres Piñeros.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

A la fecha, se evidencia que 30 beneficiarios ya realizaron la siembra, dando cumplimiento a las indicaciones técnicas del proyecto y a las recomendaciones derivadas de los análisis de suelos

para asegurar un establecimiento adecuado de la pradera. En esta etapa se efectuó la distribución de semilla, el cubrimiento conforme a la condición de cada lote y el uso de los abonos suministrados por el proyecto en los predios ya establecidos.

Los 10 beneficiarios restantes presentan la siembra pendiente como consecuencia de los retrasos logísticos asociados a la disponibilidad de maquinaria; sin embargo, se espera que inicien esta labor durante los primeros días de mayo, con el fin de completar el establecimiento de pasturas en el municipio.

En este sentido, las personas que aún no han realizado la siembra manifestaron su disponibilidad y adquirieron un compromiso con el equipo del proyecto para ejecutar esta labor en los días estipulados, de manera que se garantice el cumplimiento del cronograma y la culminación del establecimiento de pasturas en el municipio.

7.3. Uso de Insumos Suministrados por el Proyecto.

Los 40 beneficiarios realizaron la activación de EM, y en los predios donde ya se establecieron las praderas se utilizaron los abonos entregados por el proyecto tanto en la preparación del terreno como durante la siembra, conforme a las recomendaciones técnicas realizadas.

8. Municipio de Santa Rosa de Viterbo.

A continuación, se describen las actividades llevadas a cabo durante el mes de abril en el municipio de Santa Rosa de Viterbo.

8.1. Preparación y Acondicionamiento de Suelos.

En el municipio de Santa Rosa de Viterbo, se ha avanzado en las actividades de preparación y acondicionamiento de suelos, evidenciando que 31 beneficiarios realizaron la mecanización de sus predios para el establecimiento de las pasturas.

Imagen 17. Predio Nuevo Mundo mecanizado- Héctor Báez Gómez.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

Durante este proceso, varios productores contrataron únicamente un tractor que contaba con arado de cincel, implemento con el cual realizaron la preparación inicial del terreno. No obstante, durante el acompañamiento técnico realizado por el proyecto, se recomendó complementar dicha labor mediante el uso de retobo, con el fin de lograr un mejor afinamiento del suelo y generar condiciones más adecuadas para la siembra. Sin embargo, algunos beneficiarios manifestaron que no contratarían nuevamente otro servicio de mecanización para realizar esta labor adicional, razón por

la cual decidieron efectuar la siembra únicamente con la preparación realizada mediante arado de cincel. Adicionalmente, la renuncia del tractorista del municipio ocasionó retrasos en la disponibilidad de la maquinaria municipal, situación que ha generado que algunos beneficiarios permanezcan a la espera de poder continuar con las labores pendientes de adecuación del terreno.

8.2. Establecimiento de Pasturas.

En cuanto al establecimiento de las pasturas, 30 beneficiarios realizaron la siembra en sus respectivos predios, algunos siguiendo las orientaciones técnicas brindadas durante el acompañamiento realizado por el proyecto.

Imagen 18. Pastura establecida, predio La Esperanza-Blanca Lilia Rincón Álvarez.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

Durante las visitas de seguimiento se evidenció la presencia significativa de malezas en algunos terrenos, situación que está generando competencia por nutrientes, agua y espacio, afectando el adecuado desarrollo de las pasturas establecidas.

Como plan de acción, se recomendó a los beneficiarios la aplicación localizada de herbicidas específicos para el tipo de maleza presente en cada predio, actividad que debía ser ejecutada

directamente por cada productor siguiendo las recomendaciones técnicas suministradas por el equipo de coordinación y supervisión del proyecto.

8.3. Uso de Insumos Suministrados por el Proyecto.

Respecto al uso de los insumos entregados por el proyecto, 30 beneficiarios realizaron la activación y multiplicación de los Microorganismos Eficientes (EM), con el propósito de fortalecer las condiciones biológicas del suelo y favorecer el desarrollo inicial de las pasturas. Durante las visitas técnicas se brindó orientación sobre la correcta preparación y aplicación de estos microorganismos en campo.

De igual forma, los beneficiarios realizaron la incorporación de los insumos suministrados, tales como acondicionador de suelos y Carbox Compost, aplicándolos en diferentes etapas según las recomendaciones técnicas: algunos durante las labores de mecanización y otros al momento de la siembra, buscando mejorar las propiedades físicas y nutricionales del suelo para favorecer el establecimiento de las praderas.

Imagen 19. Activación de EM, predio La Cabaña - Luis Humberto Puerto Torres.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible

9. Municipio de Soracá.

A continuación, se describen las actividades llevadas a cabo durante el mes de abril en el municipio de Soracá.

9.1. Preparación y Acondicionamiento de Suelos.

En el municipio de Soracá, la totalidad de beneficiaros realizaron las actividades recomendadas para la preparación de suelos, para el desarrollo de esta actividad, a la mayoría de productores les correspondió gestionar y contratar tractor particular, debido a que el tractor del municipio no pudo prestar el servicio por un percance presentado por el operario. En consecuencia, los beneficiarios adelantaron la preparación del terreno y efectuaron la siembra de manera simultánea, asegurando una adecuada implantación del material forrajero.

Imagen 20. Preparación de suelos finca La Sacristía- Luis Alejandro Sora.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

9.2. Establecimiento de Pasturas.

En el municipio de Soracá, durante al mes de abril de 2026, la totalidad de los beneficiarios culmino la siembra en sus predios, dando cumplimiento a las actividades establecidas por el proyecto y ejecutando las labores pertinentes para el establecimiento de las praderas, durante esta etapa, los

productores realizaron el tapado de la semilla incorporando el abono suministrado por el proyecto, con el fin de mejorar el contacto semilla-suelo y aportar nutrientes para el establecimiento inicial. Adicionalmente, se llevó a cabo la activación de los microorganismos y su aplicación se ha venido realizando conforme a las recomendaciones de la profesional del municipio, utilizándolos tanto en las labores posteriores a la siembra como en el manejo inicial del lote para favorecer la actividad biológica del suelo y el desarrollo de la pastura

Imagen 21. Pastura establecida finca Buena Vista-María Del Carmen Ramírez Suesca.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

9.3. Uso de Insumos Suministrados por el Proyecto.

Durante la siembra, los productores realizaron el tapado de la semilla incorporando el abono suministrado por el proyecto, con el fin de mejorar el contacto semilla-suelo y aportar nutrientes para el establecimiento inicial. Adicionalmente, se llevó a cabo la activación de los microorganismos y su aplicación se ha venido realizando conforme a las recomendaciones de la profesional del municipio, utilizándolos tanto en la preparación del terreno como en las labores posteriores a la siembra para favorecer la actividad biológica del suelo y el desarrollo de la pastura.

Imagen 22. Aplicación de abonos finca Lote de Terreno-José Trinidad Guayacán.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible

10. Municipio de Toca.

A continuación, se describen las actividades llevadas a cabo durante el mes de abril en el municipio de Toca durante el mes.

10.1. Preparación y Acondicionamiento de Suelos.

En el municipio de Toca, en el mes de febrero se reportó la totalidad de predios mecanizados, a pesas de ello se recomendó al beneficiario que falta por realizar siembra se realice antes de la siembra incorporación de abonos, apoyado de maquinaria agrícola.

10.2. Establecimiento de Pasturas.

En cuanto al establecimiento de praderas en el municipio de Toca, se evidencia un avance destacado, ya que de los 40 beneficiarios son 39 que ya han realizado la siembra de las pasturas, cumpliendo con las recomendaciones técnicas brindadas en el marco del proyecto.

Imagen 23. Pastura establecida, predio de Sebastián Camilo Garzón Cuervo.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

No obstante, y como se reportó en el informe de ejecución se presentó una novedad con una beneficiaria que manifestó haber realizado la siembra y aplicado la totalidad de los insumos suministrados; sin embargo, durante el proceso de seguimiento y acompañamiento técnico no se evidenció germinación de la semilla ni aplicación de los insumos en el predio. Como medida de verificación, se efectuó un muestreo de suelo para realizar pruebas de germinación en bolsa y determinar la posible presencia de semilla latente; no obstante, dicha prueba no presentó respuesta favorable; adicionalmente, la beneficiaria no asistió a tres citaciones realizadas por el equipo de coordinación para efectuar la respectiva verificación del predio. Posteriormente, manifestó que fue víctima de hurto en su vivienda, indicando la pérdida de la Picapasto y la fumigadora a motor entregadas por el proyecto. Frente a esta situación, como plan de acción se acudió ante las autoridades competentes, realizando la respectiva denuncia ante la Policía y la Fiscalía, proceso que actualmente se encuentra activo.

Por otra parte, el beneficiario que falta por sembrar informó que fue sometido a una intervención quirúrgica, motivo por el cual se encontraba bajo incapacidad médica. No obstante, manifestó su compromiso de realizar la siembra una vez finalice su proceso de recuperación.

10.3. Uso de Insumos Suministrados por el Proyecto.

En cuanto al uso de los insumos suministrados por el proyecto, 32 beneficiarios realizaron la activación de los Microorganismos Eficientes (EM), siguiendo las recomendaciones técnicas brindadas durante las capacitaciones y acompañamientos en campo. Esta actividad contribuye al fortalecimiento de la actividad microbiológica del suelo y favorece la disponibilidad de nutrientes para las pasturas establecidas. De igual forma, se evidenció que los beneficiarios que realizaron la siembra incorporaron los insumos entregados conforme a las orientaciones técnicas dadas por los profesionales del proyecto, aplicándolos en función de las necesidades del suelo y del establecimiento inicial de las praderas.

Imagen 24. Activación de EM, predio Las Manitas - Carolina Monguí Guio



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible

11. Municipio de Zetaquira.

A continuación, se describen las actividades llevadas a cabo durante el mes de abril en el municipio.

11.1. Preparación y Acondicionamiento de Suelos.

Al cierre del mes de abril se cuenta con 19 predios totalmente preparados en condiciones para la realización de siembras, en cuanto a los 21 beneficiarios restantes, se informa que han venido adelantando labores de arreglo y adecuación del terreno, incluyendo la eliminación de malezas y la limpieza de los lotes**,** con el propósito de dejar los predios listos para una pronta siembra.

Imagen 25. Preparación manual de suelos finca El Porvenir-Andrea Del Pilar Alba Pulido.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

Los beneficiarios que se encuentran pendientes se comprometieron a culminar la preparación del terreno haciendo uso de recursos propios para garantizar la continuidad de las actividades programadas. En este sentido, los productores asumirán con sus propios medios los costos y labores

requeridas para avanzar en el alistamiento de los predios y en el establecimiento de las pasturas durante el mes de mayo, con acompañamiento y seguimiento técnico por parte del proyecto para verificar el cumplimiento de la meta prevista en el municipio.

11.2. Establecimiento de Pasturas.

A la fecha, se reporta que 10 beneficiarios ya realizaron la siembra en sus predios, dando inicio al establecimiento de la pastura conforme a las orientaciones técnicas del proyecto. Los beneficiarios que ya sembraron utilizaron los abonos suministrados, destinando aproximadamente una parte para la siembra y reservando el restante para la fertilización de sostenimiento en el segundo corte, conforme a la estrategia de manejo nutricional definida. En cuanto a los 30 beneficiarios restantes, se informa que continúan adelantando la adecuación del terreno y adquirieron el compromiso de realizar el establecimiento durante el mes de mayo, con el fin de completar la meta prevista en el municipio.

Imagen 26. Siembra finca El Aljibe-Beyer Omar Vanegas Bohórquez.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible.

11.3. Uso de Insumos Suministrados por el Proyecto.

Respecto a los insumos entregados por el proyecto, los beneficiarios que ya sembraron utilizaron los abonos suministrados destinando aproximadamente la mitad para la siembra y reservando la otra mitad para la fertilización de sostenimiento en el segundo corte, conforme a la estrategia de manejo nutricional del establecimiento.

Imagen 27. Uso de insumos finca El Retiro- Nohora Elcy Pulido Castillo.



Fuente. Equipo Consorcio Boyacá Agrosostenible
