*20262300006039*

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20262300006039

**Pública** ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C, 19-05-2026

El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al Contrato que se describe a continuación:

| **INFORMACIÓN GENERAL** | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | Obra |
| **CONTRATISTA:** | PRODYM E.S.P. S.A.S. |
| **CONTRATO No.:** | 2240298 - 2024 |
| **OBJETO:** | Ejecución de actividades para la puesta en funcionamiento de la red de media tensión ejecutadas bajo el contrato de obra No. 2141407 con el fin de poner en funcionamiento las redes eléctricas existentes del tramo Arusí, Partadó y Termales y del tramo de la "Y" al punto denominado "Casa de Máquinas" en el municipio de Nuquí departamento del Chocó. |
| **PLAZO INICIAL:** | 6 meses |
| **FECHA DE INICIO:** | 21 de enero de 2025 |
| **PRÓRROGA:** | - Prórroga 1: por 4 meses suscrita desde el 21-07-2025 hasta 21-11-2025<br>- Prórroga 2: por 1 mes suscrita desde el 21-04-2026 hasta 21-05-2026 |
| **SUSPENSIONES** | - Suspensión 1: por 1 mes suscrita desde el 10-11-2025 hasta 10-12-2025<br>- Prórroga 1 a la Suspensión 1: por 1 mes y 15 días suscrita desde el 10-12-2025 hasta 25-01-2026<br>- Prórroga 2 a Suspensión 1: por 1 mes suscrita el 25-01-2026 hasta 25-02-2026<br>- Prórroga 3 a Suspensión 1: por 1 mes y 15 días suscrita el 25-02-2026 hasta 09-04-2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 21 de mayo de 2026 |
| **PLAZO FINAL:** | 11 meses |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | *Cuatro mil catorce millones cuatrocientos diecisiete mil quinientos setenta pesos M/cte ($4.014.417.570)* |
| **ADICIONES / REDUCCIONES:** | *Adición No. 1 con la cual se adiciona la suma de cuatrocientos veintitrés millones ciento setenta mil setecientos sesenta y cuatro pesos M/cte ($423.170.764).*<br>*Adición No. 2 con la cual se adiciona la suma de mil sesenta y nueve millones ochocientos trece mil doscientos pesos con noventa y un centavos M/cte ($1.069.813.200,91)* |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | *Cinco mil quinientos siete millones cuatrocientos un mil quinientos treinta y cuatro pesos con noventa y un centavos M/cte ($5.507.401.534,91).* |

| | |
|---|---|
| **PÓLIZA** | |

| **Cumplimiento** | | |
|---|---|---|
| Póliza No. 65-45-101089968 Anexo 19 | | |
| **Amparo** | **Vigencia desde** | **Vigencia hasta** |
| Cumplimiento de contrato | 21/01/2025 | 21/01/2027 |
| Salarios y Prestaciones Sociales | 21/01/2025 | 21/05/2029 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | 5 años | |
| **Responsabilidad Civil Extracontractual** | | |
| Póliza No. 65-40-101079574 Anexo 16 | | |
| **Amparo** | **Vigencia desde** | **Vigencia hasta** |
| Predios Labores y Operaciones | 21/01/2025 | 21/05/2026 |
| Perjuicios Extrapatrimoniales | | |
| Responsabilidad Civil Patronal | | |
| Contratistas y subcontratistas | | |
| Gastos Médicos | | |
| Responsabilidad Civil Cruzada | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | |
| Bienes bajo cuidado tenencia y control | | |

| | |
|---|---|
| **SUPERVISOR-ENTerritorio S.A:** | Luz Andrea Molina Hurtado<br>Contratista |

**INFORMACIÓN DEL CONVENIO**

| **CLIENTE** | **FECHA FIRMA** | **FECHA INICIO** | **FECHA VENCIMIENTO** |
|---|---|---|---|
| Departamento Administrativo para la Prosperidad Social | 27/12/2012 | 28/12/2012 | 31/05/2027 |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO O CONTRATO DE LÍNEA DE NEGOCIO** | 212080 |
| **SUBGERENCIA** | Subgerencia Desarrollo de Proyectos |
| **GERENTE DE UNIDAD** | Grupo de Desarrollo de Proyectos 3 |
| **CONTRATISTA O COLABORADOR APOYO A LA GERENCIA DEL CONVENIO** | Luis Carlos Mejía Freyle<br>Contratista |
| **SUPERVISOR** | N/A |
| **INTERVENTOR** | N/A |

**TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE)**

**ADICIÓN** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **SUSPENSIÓN** ■

**PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN** ☐ **TERMINACIÓN ANTICIPADA** ☐ **CESIÓN** ☐

**REINICIO** ☐ **ACLARACIÓN** ☐

**ANTECEDENTES**

FONADE (hoy ENTerritorio S.A.) suscribió el Convenio Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 212080 con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el siguiente objeto: «FONADE SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL A ADELANTAR LA GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS ENTREGADOS POR ESTE», según Otrosí No. 24 del 31 de diciembre de 2025, el convenio fue prorrogado hasta el 31 de mayo de 2027, por lo que se encuentra vigente.

Así mismo, ENTerritorio S.A. suscribió el Contrato de Obra No. 2240298 con PRODYM E.S.P. S.A.S. el 27 de diciembre de 2024, cuyo objeto es la *"EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN EJECUTADAS BAJO EL CONTRATO DE OBRA NO. 2141407 CON EL FIN DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES DEL TRAMO ARUSÍ, PARTADÓ Y TERMALES Y DEL TRAMO DE LA "Y" AL PUNTO DENOMINADO "CASA DE MÁQUINAS" EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"*, por un valor de $4.014.417.570,00 M/CTE y un plazo inicial de seis (6) meses.

El 21 de enero de 2025 se firmó el acta de inicio del Contrato de Obra No. 2240298, con fecha de terminación el 21 de julio de 2025.

El 21 de julio de 2025 las partes suscribieron la Adición No. 1 y Prórroga No. 1 al Contrato de Obra No. 2240298 en la cual se establece que:

A) INCORPORAR 20 Ítems Nuevos No Previstos al Contrato Derivado. Dicha modificación se realiza de conformidad con lo establecido en los formatos F-GG14 F-GG-28 y F-GG-33
B) ADICIONAR $423.170.764 al Contrato: MENORES CANTIDADES DE OBRA por valor de $418.164.676,70 MAYORES CANTIDADES DE OBRA por valor de $278.238.421,80 ÍTEMS NUEVOS NO PREVISTOS: por valor de $563.097.018,90.
C) MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA VALOR por la suma de $4.437.588.334,00 M/CTE, incluido el IVA, costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
D) PRORROGAR el plazo de ejecución por 4 meses contados a partir de su vencimiento actual es decir hasta el 21 de noviembre de 2025.
E) MODIFICAR la CLÁUSULA CUARTA PLAZO del Contrato: El plazo máximo previsto es de 10 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

El 10 de noviembre de 2025 las partes suscribieron la Suspensión No. 1 al Contrato de Obra No. 2240298, en atención a: "*1. Condiciones Climáticas Adversas y 2. Mayores cantidades de obra e ítems no previstos",* por el término de un (01) mes, contado a partir del 10 de noviembre de 2025 hasta el 10 de diciembre de 2025, con reinicio el 11 de diciembre de 2025 o antes si se superan los motivos que dieron origen a la suspensión.

El 10 de diciembre de 2025 las partes suscribieron la Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 al Contrato de Obra No. 2240298, en atención a: *"**a. Condiciones Climáticas** - **Persistencia de las condiciones climáticas adversas** y **b. Mayores cantidades de obra e ítems no previstos**",* por el término de un (01) mes y quince (15) días, contados a partir del 10 de diciembre de 2025 hasta el 25 de enero de 2026, con reinicio el 26 de enero de 2026 o antes su se superan los motivos que dieron origen a la suspensión. El contrato tiene pendiente doce (12) días por ejecutar, por lo que la nueva fecha de terminación del contrato será el 06 de febrero de 2026.

El 25 de enero de 2026 las partes suscribieron la Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 1 al Contrato de Obra No. 2240298, en atención a: *"**a. Condiciones Climáticas** y **b. Mayores cantidades de obra e ítems no***

***previstos**", por el término de un (01) mes, contado a partir del 25 de enero de 2026 hasta el 25 de febrero de 2026, con reinicio el 26 de febrero de 2026 o antes si se superan los motivos que dieron origen a la solicitud de suspensión. El contrato tiene pendiente doce (12) días por ejecutar, por lo que la nueva fecha de terminación del contrato será el 09 de marzo de 2026.

El 25 de febrero de 2026 las partes suscribieron la Prórroga No. 3 a la Suspensión No. 1 al Contrato de Obra No. 2240298, en atención a: "**a. Condiciones Climáticas** y **b. Mayores cantidades de obra e ítems no previstos**", por el término de un (01) mes y quince (15) días, contados a partir del 25 de febrero de 2026 hasta el 09 de abril de 2026, con reinicio el 10 de abril de 2026 o antes si se superan los motivos que dieron origen a la solicitud de suspensión. El contrato tiene pendiente doce (12) días por ejecutar, por lo que la nueva fecha de terminación del contrato será el 21 de abril de 2026.

El 10 de abril de 2026 las partes suscribieron la novedad de Reinicio No. 1, Adición No. 2 y Prórroga No. 2 al Contrato de Obra No. 2240298 en la cual se establece que:

A) REINICIAR el Contrato de Obra a partir del 10 de abril de 2026, precisando que el contrato terminará el 21 de abril de 2026.
B) INCORPORAR 47 Ítems Nuevos No Previstos al Contrato Derivado. Dicha modificación se realiza de conformidad con lo establecido en los formatos F-GG14 F-GG-28 y F-GG-33
C) ADICIONAR $1.069.813.200,91 al Contrato: MENORES CANTIDADES DE OBRA por valor de $304.895.264. MAYORES CANTIDADES DE OBRA por valor de $718.704.999,50. ÍTEMS NUEVOS NO PREVISTOS: por valor de $656.003.465,41.
D) MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA VALOR por la suma de $5.507.401.534,91 M/CTE, incluido el IVA, costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
E) PRORROGAR el plazo de ejecución por 1 mes contado a partir de su vencimiento actual es decir hasta el 21 de mayo de 2026.
F) MODIFICAR la CLÁUSULA CUARTA PLAZO del Contrato: El plazo máximo previsto es de 11 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Por lo anterior, a la fecha el contrato se encuentra vigente.

**JUSTIFICACIÓN**

Mediante oficio radicado DG: 037/2026 de fecha 13 de mayo de 2026 el contratista de obra PRODYM E.S.P. S.A.S., solicita a la interventoría PROINGES S.A.S. la Suspensión del contrato de obra 2240298/2024, así:

> *"En atención a la mesa de trabajo desarrollada el día de ayer 12 de mayo de 2026, se evidencio que pese a los esfuerzos realizados, no se pudo obtener las declaraciones de cumplimiento del constructor inicial de la red existente del proyecto de la referencia, exigidas por la Norma Técnica – RETIE, para gestionar en su completitud la certificación RETIE del proyecto de infraestructura eléctrica, trámite técnico indispensable para acreditar el cumplimiento de la reglamentación aplicable y permitir la adecuada puesta en funcionamiento de las redes e instalaciones proyectadas.*
>
> *Dicho proceso demanda un término de tiempo razonable, en la medida en que comprende actividades de revisión documental, verificación técnica e inspección por parte del organismo competente. Esta circunstancia, reviste vital importancia para la normal ejecución del proyecto, por lo que constituye un fundamento adicional que justifica la suspensión temporal del contrato hasta tanto se reúnan las condiciones necesarias para su continuidad.*

*En mérito de lo expuesto, solicitamos de manera respetuosa se estudie y autorice la suspensión temporal del contrato de obra, mientras se adoptan las medidas necesarias para superar las situaciones aquí descritas. De igual forma, requerimos con carácter urgente la realización de otra mesa de trabajo con el cliente, con el fin de analizar de manera conjunta las alternativas de solución y definir el camino técnico y administrativo a seguir.*

*Se deja expresa constancia de que la superación de las circunstancias antes descritas es indispensable y determinante para garantizar la correcta, segura e idónea ejecución del objeto contractual. (…)*

Mediante oficio ENT-058-26 de fecha 14 de mayo de 2026, con radicado ENTerritorio S.A. No. 202651010075212 de la misma fecha, la firma interventora PROINGES S.A.S., remite a ENTerritorio S.A. el aval y recomendación de la Suspensión No. 2 del Contrato de obra No. 2240298, indicando:

*"Mediante comunicaciones **DG-037-26** del 13 de mayo de 2026, el **contratista PRODYM E.S.P. S.A.S.** solicitó la Suspensión del Contrato de Obra No. 2240298, por el término de un **(1) mes** argumentando la imposibilidad de obtener la documentación técnica del constructor inicial de las redes eléctricas existentes del tramo Arusí – La Y – Partadó – Termales, lo que impide completar el trámite de Certificación RETIE requerido para la puesta en funcionamiento del Sistema de Distribución Local (SDL).*

*La Interventoría, tras analizar la documentación técnica presentada y verificar las gestiones adelantadas por el contratista, confirma que la causa invocada es objetiva, sobreviniente y ajena a la voluntad de **PRODYM E.S.P. S.A.S.**, constituyendo un impedimento técnico y normativo que justifica la suspensión temporal del contrato.*

*Con base en lo anterior, la Interventoría **avala** la suspensión solicitada con el fin de definir las alternativas técnicas y administrativas viables para lograr la certificación RETIE de la línea existente, adelantar las gestiones ante el organismo de inspección competente y dar cumplimiento a los requisitos normativos que habiliten la puesta en funcionamiento del SDL. Lo anterior resulta no solo procedente sino más que prudente, habida cuenta de que la obtención de la Certificación RETIE es una actividad fundamental e inherente al cumplimiento del objeto contractual.*

*En atención a lo anterior, la Interventoría **avala** la Suspensión del Contrato de Obra No. 2240298 por el término de un **(1) mes**, comprendido entre el **19 de mayo de 2026** y el **19 de junio de 2026**, con reinicio de actividades a partir del **20 de junio de 2026** y nueva fecha de terminación el **21 de junio de 2026**. (…)*

La supervisión técnica mediante comunicado con radicado ENTerritorio S.A. No. 202651010075752 del 15 de mayo de 2026 emite Recomendación y aval de suspensión No. 2 del Contrato de Obra No. 2240298, señalando:

*"(…) Así las cosas, teniendo en cuenta los soportes y justificaciones técnicas presentadas por el contratista de obra, y teniendo en cuenta que ENTerritorio S.A. cumplió con la entrega de documentación solicitada por el contratista de obra e interventoría entregando planos y memorias de cálculo de las redes existentes no obstante está pendiente declaraciones de cumplimiento del constructor inicial de la red existente; asimismo, la solicitud frente al Contrato de Interventoría No. 2240297, con el fin de cumplir con la obtención de la certificación RETIE y los tramites que se deben realizar , está supervisión avala la Suspensión No. 2 de los referidos contratos por el término de un mes comprendido entre el 19 de mayo de 2026 y el 19 de junio de 2026, con reinicio el 20 de junio de 2026 o antes si se superan los motivos que dieron origen a la suspensión 2.(…)"*

**Línea de Tiempo**

| **Plataforma** | SECOP II | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato** | 2240298 | **Contratista** | PRODYM E.S.P. SAS |
| **Objeto** | Ejecución de actividades para la puesta en funcionamiento de la red de media tensión ejecutadas bajo el contrato de obra No. 2141407 con el fin de poner en funcionamiento las redes eléctricas existentes del tramo Arusí, Partadó y Termales y del tramo de la "Y" al punto denominado "Casa de Máquinas" en el municipio de Nuquí departamento del Chocó | | |
| **Valor Inicial** | $ 4.014.417.570,00 | | |
| **Adición No. 1** | $ 423.170.764,00 | | |
| **Adición No. 2** | $ 1.069.813.200,91 | | |
| **Valor Total del Contrato** | $ 5.507.401.534,91 | | |
| **Plazo Inicial** | 6 meses | | |
| **Inicio** | 21/01/2025 | **Hasta** | 21/07/2025 |
| **Novedad** | **Fecha de Suscripción** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Terminación** |
| **Prórroga No. 1** | 21/07/2025 | 21/07/2025 | 21/11/2025 |
| **Suspensión No. 1** | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/12/2025 |
| **Prórroga No. 1 a Suspensión No. 1** | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 25/01/2026 |
| **Prórroga No. 2 a Suspensión No. 1** | 25/01/2026 | 25/01/2026 | 25/02/2026 |
| **Prórroga No. 3 a Suspensión No. 1** | 25/02/2026 | 25/02/2026 | 09/04/2026 |
| **Reinicio No. 1** | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 21/04/2026 |
| **Prórroga No. 2** | 10/04/2026 | 21/04/2026 | 21/05/2026 |
| **Porcentaje De Ejecución** | 98,97% | | |

**Ficha financiera**

| **BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA 2240298** | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial | $ 4.014.417.570,00 | | |
| Adición No. 1 | $ 423.170.764,00 | | |
| Adición No. 2 | $1.069.813.200,91 | | |
| Valor Total | $ 5.507.401.534,91 | | |
| **PAGOS REALIZADOS** | | | |
| Porcentaje ejecutado | 98,97% | Valor | $ 5.450.675.299,10 |
| Porcentaje pagado | 59,63% | Valor | $3.284.031.411,00 |
| Porcentaje por pagar | 39,34% | Valor | $ 2.166.643.888,10 |

| **SOLICITUD** |
|---|
| **SUSPENSIÓN: Suspensión No. 2**: Suspender la ejecución del Contrato de Obra No. 2240298 por el término de UN (01) mes, contado a partir del 19 de mayo de 2026 hasta el 19 de junio de 2026, precisando que el referido contrato se reiniciará el día 20 de junio de 2026 o antes si se superan los motivos que dieron |

origen a la presente solicitud de suspensión. El contrato tiene dos (02) días por ejecutar, por lo que le nueva fecha de terminación del contrato será el 21 de junio de 2026.

**Parágrafo 1:** La presente novedad no generará gastos adicionales por permanencia en interventoría, lucro cesante o ningún otro concepto a cargo del contratista o de ENTerritorio S.A, ni reclamación alguna de su parte que tenga como causa la presente novedad.

**Parágrafo 2:** En virtud del principio de la autonomía de la voluntad de las partes y de conformidad con lo acá acordado, el contratista manifiesta su autorización para que ENTerritorio S.A., realice el trámite de reinicio de manera unilateral en la plataforma SECOP II, si al término de esta suspensión o antes si son superados los motivos que dieron origen a dicha suspensión, el contratista no apruebe la novedad del reinicio en la plataforma antes señalada.

**NO PURGA DE INCUMPLIMIENTOS:** La modificación y demás disposiciones contenidas en el presente documento no significan convalidación ni purgan eventuales incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista frente a la ejecución del objeto, alcance y obligaciones contractuales.

**VIGENCIA:** Las demás cláusulas del contrato, que no hayan sido objeto de modificación en la presente novedad, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas.

**GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA se obliga a modificar la póliza que ampara el Contrato de Obra No. 2240298 de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la presente novedad.

**PERFECCIONAMIENTO:** La presente novedad se perfecciona con la firma de las partes.

| | | |
|---|---|---|
| **YEISON JAVIER HERRERA**<br>Gestor de Convenio | **ÁLVARO VILORIA ROMERO**<br>Gerente Grupo Desarrollo de Proyectos 3 | **OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ**<br>Subgerente Desarrollo de Proyectos |
| **LUZ ANDREA MOLINA HURTADO**<br>Supervisor – Contratista | **Laura Ávila**<br>**Contratista**<br>**Abogada Cv 212080**<br><br>**Luis Carlos Mejía**<br>**Contratista – Supervisor General Cv 212080** | **Leidy Carolina Moreno**<br>**Contratista**<br>**Abogada Grupo DP3** |

**Anotación:** Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o dependencias solicitantes, agregue más filas para firma.

**Anotación columna 2**: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez en la casilla número 2.

**Anotación 3:** Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben estar actualizados de conformidad con la última novedad suscrita.

**Anotación 4:** El formato también aplica para las novedades de los Contratos o Convenios Interadministrativos Derivados.

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | 2240298 |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA |
| **LINEA DE NEGOCIO** | OBRA |
| **OBJETO:** | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN EJECUTADAS BAJO EL CONTRATO DE OBRA No 2141407 CON EL FIN DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES DEL TRAMO ARUSÍ, PARTADÓ Y TERMALES Y DEL TRAMO DE LA "Y" AL PUNTO DENOMINADO "CASA DE MAQUINAS" EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ |
| **ALCANCE** | EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN F-PR-26 Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. |
| **VALOR:** | CUATRO MIL CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS ($4,014,417,570.00) M/CTE. INCLUIDO EL IVA. |
| **CONTRATANTE** | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIA S.A. – ENTERRITORIO S.A. |
| **CONTRATISTA:** | PRODYM E.S.P. SAS. |
| **PLAZO:** | SEIS (6) MESES |

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del Contrato No. 2240298 anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

**Garantías:**

| Póliza No. | Fecha Expedición | Amparo | Vigencia | Tomador | Beneficiario | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-45-101089968 | 31/12/2024 | CUMPLIMIENTO | 27/02/2026 | PRODYM E.S.P. S.A.S. | ENTERRITORIO S.A. | $1.204.325.271,00 |
| 65-45-101089968 | 31/12/2024 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 27/06/2028 | PRODYM E.S.P. S.A.S. | ENTERRITORIO S.A. | $200.720.878,50 |
| 65-45-101089968 | 31/12/2024 | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 5 AÑOS UNA VEZ FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO. | PRODYM E.S.P. S.A.S. | ENTERRITORIO S.A. | $1.204.325.271,00 |
| 65-40-101079574 | 14/01/2025 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 27/06/2025 | PRODYM E.S.P.S.A.S. | ENTERRITORIO S.A. | $1.204.325.271,00 |

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato No. 2240298 el día 21 del mes ENERO del año 2025, el cual debe concluir el día 20 del mes JULIO del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

| | |
|---|---|
| | DARWIN VALENCIA MURILLO Firmado digitalmente por DARWIN VALENCIA MURILLO Fecha: 2025.01.21 15:12:24 -05'00' |
| **JAMES MARTINEZ GALLEGO**<br>**REPRESENTANTE LEGAL**<br>**PROINGES S.A.S. - INTERVENTOR** | **DARWIN VALENCIA MURILLO**<br>**REPRESENTANTE LEGAL**<br>**PRODYM E.S.P. S.A.S. – CONTRATISTA DE OBRA** |

**Nota Generales:**

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio S.A.
- Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte de ENTerritorio S.A. en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato – F-GG-18, la cual deberá estar anexa al Acta de Inicio.

Anexos (según aplique):

- La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- La comprobación por el contratista ante ENTerritorio S.A, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de delegación correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente.
- Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:

| N° | COMPONENTE | ESTADO / OBSERVACIÓN | RADICADO |
|---|---|---|---|
| 1 | Concepto productos etapa previa | Radicado por interventoría | 202561010007692 |
| 2 | Aprobación de Personal | Radicado por interventoría | |
| 3 | Permisos y licencias:<br>• Construcción<br>• Ambientales<br>• Disponibilidad servicios públicos<br>• Otros que apliquen: _____ | | |

*(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas).

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

# ACLARACIÓN ACTA DE INICIO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | 2240298 |
| **TIPO DE CONTRATO** | **OBRA** |
| **LINEA DE NEGOCIO** | **OBRA** |
| **OBJETO:** | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN EJECUTADAS BAJO EL CONTRATO DE OBRA No 2141407 CON EL FIN DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES DEL TRAMO ARUSÍ, PARTADÓ Y TERMALES Y DEL TRAMO DE LA "Y" AL PUNTO DENOMINADO "CASA DE MAQUINAS" EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. |
| **ALCANCE** | EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN FPR-26 Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. |
| **VALOR:** | CUATRO MIL CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS ($4,014,417,570.00) M/CTE. INCLUIDO EL IVA |
| **CONTRATANTE** | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – ENTERRITORIO S.A. |
| **CONTRATISTA:** | PRODYM E.S.P. SAS. |
| **PLAZO:** | SEIS (6) MESES. |

**MOTIVO DE LA ACLARACIÓN.**

Por error de digitación, en el documento de acta de inicio de fecha 21 de enero de 2025 se estableció como fecha de terminación del contrato de la referencia el día 20 de julio de 2025, siendo lo correcto 21 de julio de 2025, esto de acuerdo con el plazo establecido en la aceptación de oferta.

En consecuencia, las partes acuerdan aclarar el documento de acta de inicio del contrato N° 2240298 de 2025, con fecha de inicio el día 21 del mes de enero del año 2025, el cual debe concluir el día 21 del mes de julio del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los 10 días del mes de julio de 2025 bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

| | |
|---|---|
| **Firma** | **Firma** |
| **JAMES MARTINEZ GALLEGO**<br>**REPRESENTANTE LEGAL**<br>**PROINGES S.A.S. - INTERVENTOR** | **DARWIN VALENCIA MURILLO**<br>**REPRESENTANTE LEGAL ,**<br>**PRODYM E.S.P. S.A.S. – CONTRATISTA DE OBRA** |

Medellín, 13 de mayo de 2026 **DG: 037/2026**

Ingeniero
**JAMES MARTINEZ GALLEGO**
Director de Interventoría
**PROINGES SAS**
Calle 76 Nro 38B – 57
Barranquilla – Atlántico

**Referencia**: JECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN EJECUTADAS BAJO EL CONTRATO DE OBRA No 2141407 CON EL FIN DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES DEL TRAMO ARUSÍ, PARTADÓ Y TERMALES Y DEL TRAMO DE LA "Y" AL PUNTO DENOMINADO "CASA DE MAQUINAS" EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

**Asunto:** SOLCITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRANTO DE OBRA 2240298/2024

Respetado ingeniero:

En atención a la mesa de trabajo desarrollada el día de ayer 12 de mayo de 2026, se evidencio que pese a los esfuerzos realizados, no se pudo obtener las declaraciones de cumplimiento del constructor inicial de la red existente del proyecto de la referencia, exigidas por la Norma Técnica – RETIE, para gestionar en su completitud la certificación RETIE del proyecto de infraestructura eléctrica, trámite técnico indispensable para acreditar el cumplimiento de la reglamentación aplicable y permitir la adecuada puesta en funcionamiento de las redes e instalaciones proyectadas.

Dicho proceso demanda un término de tiempo razonable, en la medida en que comprende actividades de revisión documental, verificación técnica e inspección por parte del organismo competente. Esta circunstancia, reviste vital importancia para la normal ejecución del proyecto, por lo que constituye un fundamento adicional que justifica la suspensión temporal del contrato hasta tanto se reúnan las condiciones necesarias para su continuidad.

En mérito de lo expuesto, solicitamos de manera respetuosa se estudie y autorice la suspensión temporal del contrato de obra, mientras se adoptan las medidas necesarias para superar las situaciones aquí descritas. De igual forma, requerimos con carácter urgente la realización de otra mesa de trabajo con el cliente, con el fin de analizar de manera conjunta las alternativas de solución y definir el camino técnico y administrativo a seguir.




Calle 47 Nº 77B – 27 Int 201
PBX: (604) 205 9469 / Cel:310 401 0525
Email: info@prodym.com.co
**www.prodym.com.co**
Medellín - Colombia

Se deja expresa constancia de que la superación de las circunstancias antes descritas es indispensable y determinante para garantizar la correcta, segura e idónea ejecución del objeto contractual.

Por su oportuna gestión, mil gracias.

Atentamente,



**DARWIN VALENCIA MURILLO**
RL PRODYM ESP S.A.S



Calle 47 Nº 77B – 27 Int 201
PBX: (604) 205 9469 / Cel:310 401 0525
Email: info@prodym.com.co
**www.prodym.com.co**
Medellín - Colombia

| | |
|---|---|
| Radicado N°: 202651010075212 | |
| Asunto: AVAL Y RECOMENDACIÓN DE LA SUSPENSI | |
| Fecha Radicado: 2026-05-14 15:33 | |
| Usuario Radicador: RADICADOR-2 | Folios:1 |
| Destino: GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3 | |
| Remitente: PROINGES S.A.S. 802023429 | |
| Visita nuestra página web: https://www.enterritorio.gov.co | |
| Calle 26 No 13 -19 | |

**Datos del Radicado**

| | |
|---|---|
| Radicado: | 202651010075212 |
| Fecha: | 2026-05-14 15:33 |
| Caso: | 152311 |
| Área Responsable: | GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3 |

**Datos del Solicitante**

| | |
|---|---|
| Tipo de identificación: | NIT |
| Número de identificación: | 802023429 |
| Nombre: | PROINGES S.A.S. |
| Dirección: | CALLE 76 N° 38B-57 |
| Teléfono: | 3003003 |
| Correo Electrónico: | intenterritorionuqui@gmail.com |

**Datos del Documento**

| | |
|---|---|
| Tipo de Tramite: | COMUNICACIONES OFICIALES - COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS RECIBIDAS |
| Asunto: | AVAL Y RECOMENDACIÓN DE LA SUSPENSIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE OBRA No. 2240298 |
| Canal y Medio de Entrada: | Electrónico - Correo Electrónico |

**Adjunto**

58. ENT - 058 - 26 AVAL Y RECOMENDACION DE LA SUSPENSION NO. 2 DEL CONTRATO DE OBRA N 2240298 - 14-05-26.pdf, SOLICITUD SUSPENSION Nº2 CONTRATO DE OBRA.zip

Barranquilla, 14 de mayo de 2026
Sr. ENTerritorio.
Ing. Luz A. Molina Hurtado
Desarrollo de Proyectos 2
Calle 26 No 13-19, Bogotá

**REFERENCIA:** CONTRATO No. 2240297 DE 2024 "INTERVENTORIA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN EJECUTADAS BAJO EL CONTRATO DE OBRA No 2141407 CON EL FIN DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES DEL TRAMO ARUSÍ, PARTADÓ Y TERMALES Y DEL TRAMO DE LA "Y" AL PUNTO DENOMINADO "CASA DE MAQUINAS" EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ'

**ASUNTO:** AVAL Y RECOMENDACIÓN DE LA SUSPENSIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE OBRA No. 2240298

Cordial Saludo.

Mediante comunicación **DG-037-2026** del 13 de mayo de 2026, el **contratista PRODYM E.S.P. S.A.S.** solicitó la Suspensión del Contrato de Obra No. 2240298 de 2024, por el término de un **(1) mes**, argumentando la imposibilidad de obtener la documentación técnica del constructor inicial de las redes eléctricas existentes del tramo Arusí – La Y – Partadó – Termales, lo que impide completar el trámite de Certificación RETIE requerido para la puesta en funcionamiento del Sistema de Distribución Local (SDL).

La Interventoría, tras analizar la documentación técnica presentada y verificar las gestiones adelantadas por el contratista, confirma que la causa invocada es objetiva, sobreviniente y ajena a la voluntad de **PRODYM E.S.P. S.A.S.**, constituyendo un impedimento técnico y normativo que justifica la suspensión temporal del contrato.

En el marco de la presente solicitud, la Interventoría remite los siguientes documentos de soporte:

1) DG-037-2026 – Solicitud de Suspensión PRODYM
2) Informe Aval Solicitud Suspensión No. 2 – Contrato 2240298
3) F-GG-06_V03 – Informe semanal de interventoría (11-05-26)
4) F-GG-14_V04 – Acta de justificación de novedad contractual PRODYM – Parte A
5) F-GG-14_V04 – Acta de justificación de novedad contractual PRODYM – Parte B
6) Reprogramación firmada
7) Póliza de Cumplimiento No. 65-45-101089968-19

8) Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – RCE No. 65-40-101079574-16
9) RUT PRODYM E.S.P. S.A.S. (mayo)
10) Certificado de existencia y representación legal PRODYM E.S.P. S.A.S. (mayo)
11) REDAM PRODYM

Con base en lo anterior y en la información presentada en los anexos, la **Interventoría avala y recomienda** la aprobación de la Suspensión del Contrato de Obra No. 2240298 de 2024, por el período comprendido entre el **19 de mayo de 2026** y el **19 de junio de 2026**, con reinicio de actividades a partir del 20 **de junio de 2026** y nueva fecha de terminación el **21 de junio de 2026**, o antes, en caso de que se superen las causas que dieron origen a la suspensión.

Cordialmente,

**JAMES MARTINEZ GALLEGO**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**PROINGES SAS**
**NIT 802.023.429-4**
**Correo: gerencia@proinges.com.co**

Barranquilla, 14 de mayo del 2026
Ingeniera Luz Andrea Molina
ENTerritorio S.A.
Desarrollo de Proyectos 2
Calle 26 No 13-19, Bogotá

**REFERENCIA:** CONTRATO No. 2240298 DE 2024 "EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN EJECUTADAS BAJO EL CONTRATO DE OBRA No 2141407 CON EL FIN DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES DEL TRAMO ARUSÍ, PARTADÓ Y TERMALES Y DEL TRAMO DE LA "Y" AL PUNTO DENOMINADO "CASA DE MAQUINAS" EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"

**ASUNTO:** AVAL SOLICITUD DE SUSPENSIÓN NO.2 CONTRATO 2240298

En atención a la solicitud de Suspensión No. 2, presentada por el contratista **PRODYM E.S.P. S.A.S.**, mediante comunicación **DG:037/2026** del 13 de mayo de 2026, **PROINGES S.A.S**. como firma interventora del contrato de la referencia, ha efectuado un estudio y análisis de la documentación presentada como soporte, con el fin de avalar la solicitud, al tener en cuenta lo siguiente.

## I. ANTECEDENTES

Se relacionan a continuación en orden cronológico, las diferentes actividades desarrolladas previamente que soportan el presente análisis y evaluación.

- El 27 de diciembre de 2024 se suscribió el contrato de interventoría 2240297 entre ENTerritorio y PROINGES SAS.
- El 27 de diciembre de 2024 se suscribió el contrato de obra 2240298 entre ENTerritorio y PRODYM ESP SAS.
- El 09 de enero de 2025 se realizó por parte de ENTerritorio reunión explicativa previa al inicio de los contratos de obra e interventoría donde se dieron las indicaciones para tener en cuenta durante la ejecución del proyecto.
- El 21 de enero de 2025 se suscribió acta de inicio al contrato de interventoría 2240297
- El 21 de enero de 2025 se suscribió acta de inicio al contrato de obra 2240298
- El contrato de obra 2240298 tiene como plazo de ejecución hasta el 20 de julio de 2025.
- Mediante comunicaciones ENT-017-25 del 29 enero 2025 se presentaron observaciones a los diseños iniciales
- El 25/02/2025 se envió mediante comunicación ENT-020-25 el informe de Replanteo de campo
- En reunión del 05 de marzo se socializo ante ENTerritorio el Informe de Replanteo
- El 28 de abril de 2025 se envió a ENTerritorio 20 ítems no previsto para su evaluación

bajo el comunicado ENT-042-25, correspondientes a la Primera Etapa, los cuales fueron aprobados con radicado 202541010002983 del 26/05/2025

- El contratista PRODYM ESP SAS envío las comunicaciones **DG:036/2025** Solicitando ajuste del contrato por valor de 423.170.764 y una ampliación en tiempo por cuatro
- (4) meses.
- Por un error de digitación, en el Acta de Inicio del contrato, suscrita el 21 de enero de 2025, se consignó como fecha de terminación el 20 de julio de 2025, cuando en realidad la fecha correcta corresponde al 21 de julio de 2025, conforme al plazo establecido en la aceptación de la oferta. Debido a ello, el 10 de julio de 2025 se presentó el documento aclaratorio al acta de inicio.
- El 21 de julio de 2025 se suscribió la Primera Novedad Contractual, mediante la cual se dio trámite a la solicitud presentada por el contratista PRODYM ESP S.A.S en la que solicitó un ajuste al valor del contrato por la suma de $423.170.764 y una ampliación del plazo de ejecución por cuatro (4) meses, petición que fue aprobada por la Entidad Contratante.
- Mediante comunicación ENT-086-25 del 21 de agosto de 2025, la interventoría remitió Ítems no Previstos correspondientes a la Central de Generación.
- La supervisión de ENTerritorio envío observaciones a los Ítems no Previstos el 26 de agosto de 2025 para continuar con el trámite de aprobación.
- La interventoría remitió nuevamente mediante comunicación ENT-108-25 del 8 de octubre de 2025, documentación solicitada de los Ítems no Previstos de la Central de Generación.
- Se llevó a cabo una mesa de trabajo conjunta entre la Supervisión y el Grupo de Planeación Contractual de ENTerritorio y la Interventoría, con el propósito de socializar y revisar los ítems no previstos presentados. Como resultado de dicha reunión, 23 ítems fueron objeto de observaciones y 21 ítems obtuvieron aprobación por parte de la entidad.
- La Interventoría remitió, mediante comunicación ENT-122-25 del 31 de octubre de 2025, toda la documentación requerida para avalar la solicitud de suspensión por un (1) mes presentado por el contratista PRODYM, sustentada en las dificultades derivadas de las condiciones climáticas y en el trámite de los ítems no previstos.
- Mediante comunicación ENT-126-25 del 10 de noviembre de 2025, la Interventoría entregó a la Supervisión los ítems no previstos que fueron objeto de observación por parte de ENTerritorio.
- El 10 de noviembre de 2025, PRODYM aceptó en el SECOP la novedad contractual de suspensión del contrato de obra por un (1) mes, desde el 10 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2025, quedando como nueva fecha de terminación contractual el 22 de diciembre de 2025.
- El 27 de noviembre de 2025, el contratista remitió solicitud de prórroga de la suspensión, argumentando que los motivos que dieron origen a la misma no habían sido superados.
- El 28 de noviembre de 2025, la Interventoría remitió la documentación correspondiente y emitió aval a la solicitud presentada por PRODYM E.S.P. S.A.S., mediante comunicación ENT-130-25.

- El 2 de diciembre de 2025, el grupo de Planeación Contractual de ENTerritorio emitió respuesta al trámite de los Ítems No Previstos de la Central de Generación, en la cual no se dio respuesta a dos (2) ítems presentados y cuatro (4) ítems fueron objeto de observaciones. Adicionalmente, no se emitió pronunciamiento frente al trámite de cambio de especificaciones del tanque de combustible.2 de diciembre de 2025, el grupo de planeación contractual de ENTerritorio remitió respuesta al trámite de los Ítems No Previstos de la Central de Generación, en el cual, no se dio respuesta a 2 ítems de los presentados, y 4 fueron objeto de observaciones, adicionalmente, no se dio respuesta trámite del cambio de especificaciones del tanque de combustible.
- El mismo 2 de diciembre de 2025, se llevó a cabo una segunda mesa de trabajo conjunta entre la Interventoría, el grupo de Planeación Contractual y la Supervisión de ENTerritorio, con el fin de socializar las observaciones formuladas en la respuesta emitida.
- En atención a lo anterior, la Interventoría remitió el 3 de diciembre de 2025, mediante comunicación ENT-132-25, respuesta al memorando de revisión y validación de los ítems, solicitando la revisión y validación de los ítems pendientes, así como los ajustes correspondientes a aquellos que presentaron observaciones.
- El 10 de diciembre de 2025, el contratista aceptó, a través del SECOP, la prórroga de la suspensión del contrato de obra solicitada.
- El 24 de diciembre de 2025, el grupo de Planeación Contractual remitió memorando modificatorio, dando respuesta a los ítems pendientes solicitados por la Interventoría, así como a aquellos que fueron objeto de ajuste.
- El 13 de enero de 2026 se llevó a cabo una reunión presencial en las oficinas de ENTerritorio, con la participación de la Interventoría, el contratista y la Supervisión. Durante la misma, el contratista socializó cuáles de las valoraciones correspondientes a los Ítems No Previstos, resultantes del trámite adelantado, aceptaba, y cuáles no aceptaba, exponiendo la respectiva justificación. Así mismo, informó que los ítems no aceptados serían nuevamente tramitados.
- En la reunión del 13 de enero de 2026, el contratista adquirió el compromiso de remitir respuesta formal al trámite a más tardar el 24 de enero de 2026.
- El 24 de enero de 2026 se aceptó en el SECOP la novedad contractual correspondiente a la Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría, por el término de un (1) mes, la cual había sido solicitada el 16 de enero de 2026, comprendida entre el 25 de enero y el 25 de febrero de 2026, estableciéndose como nueva fecha de terminación contractual el 09 de marzo de 2026.
- En la misma fecha y bajo las mismas condiciones, el contratista PRODYM E.S.P. S.A.S. aceptó en el SECOP la novedad contractual correspondiente al Contrato de Obra, manteniéndose la concordancia en los plazos y condiciones de suspensión entre ambos contratos.
- El 18 de febrero de 2026, PRODYM E.S.P. S.A.S. remitió oficialmente, mediante comunicación DG-016/2026, la aceptación de los Ítems No Previstos previamente aprobados por ENTerritorio, adjuntando los respectivos Análisis de Precios Unitarios (APU) y el Formato F-GG-28 debidamente firmado. Este fue enviado a ENTerritorio mediante comunicación ENT-026-26.

- El 25 de febrero de 2026 PRODYM E.S.P. S.A.S. aceptó en el SECOP la novedad contractual correspondiente a la Prórroga No. 3 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra, por el término de un (1) mes y quince (15) días, comprendida entre el 25 de febrero y el 9 de abril de 2026, estableciéndose como nueva fecha de terminación contractual el 21 de abril de 2026.
- En la misma fecha y bajo las mismas condiciones, la Interventoría aceptó en el SECOP la novedad contractual correspondiente al Contrato de Obra, manteniéndose la concordancia en los plazos y condiciones de suspensión entre ambos contratos.
- Mediante comunicación ENT--038--26 del 13 de marzo de 2026 junto con la documentación correspondiente, la Interventoría remitió a ENTerritorio el aval del cambio de especificaciones de la estructura de la cubierta y la teja de la central de generación, solicitada por el contratista el 11 de marzo de 2026.
- Mediante comunicación ENT--040--26 del 13 de marzo de 2026 junto con la documentación correspondiente, la Interventoría remitió a ENTerritorio para trámite de estudio y aprobación, los ítems no previstos de la losa contrapiso y el cielo raso.
- El 26 de marzo de 2026 se realizó una mesa de trabajo virtual entre la Interventoría y la Supervisión y Grupo de Planeación Contractual de ENTerritorio para la revisión de los INP y cambio de especificaciones, quedando como única observación, el tramitar el cambio de especificaciones bajo la figura de No Previstos por su cambio en la valoración.
- El 30 de marzo de 2026 la Interventoría remitió nuevamente la documentación de los Ítems No Previstos teniendo en cuenta las directrices dadas por ENTerritorio en la mesa de trabajo.
- El 8 de abril de 2026, el grupo de Planeación Contractual remitió memorando de aprobación de los ítems no previstos mediante radicado 202641010001233.
- El 9 de abril de 2026, PRODYM E.S.P. S.A.S. remitió oficialmente, mediante comunicación DG-033/2026, la aceptación de los Ítems No Previstos previamente aprobados por ENTerritorio. Este fue enviado a ENTerritorio mediante comunicación ENT-047-26, adjuntando los respectivos Análisis de Precios Unitarios (APU) y el Formato F-GG-28 debidamente firmado
- El 9 de abril de 2026, mediante comunicaciones DG-034/2026 y DG-035/2026, el contratista solicitó formalmente la adición y prórroga del Contrato de Obra No. 2240298, fundamentando su solicitud en la necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra derivadas del replanteo técnico en la Central de Generación, la incorporación y ejecución de cuarenta y siete (47) Ítems No Previstos previamente aprobados por ENTerritorio S.A., la actualización de las memorias de cantidades, la insuficiencia del plazo contractual vigente para culminar dichas actividades y la necesidad de garantizar la puesta en funcionamiento integral, segura y conforme a normativa del sistema eléctrico intervenido.
- El 10 de abril de 2026, el contratista aprobó la segunda novedad contractual para el contrato, con una adición presupuestal de $1.069.813.200,91 y una prórroga de un (1) mes.
- En el marco de la ejecución del contrato, las obras objeto del contrato se encuentran prácticamente concluidas con un avance físico acumulado del 97,93%; no obstante, la puesta en funcionamiento del Sistema de Distribución Local (SDL) se encuentra

condicionada a la obtención del Dictamen de Inspección RETIE, trámite que enfrenta un impedimento técnico y normativo de fondo: el tramo de red existente entre Arusí, Partadó y Termales no se enmarca en ninguna de las tres figuras previstas en el RETIE para tramitar dicho Dictamen, razón por la cual PRODYM, como constructor actual, no se encuentra en posibilidad de suscribir la autodeclaración correspondiente. Esta situación fue advertida oportunamente por la interventoría y persiste a la fecha, por lo que el contratista continúa adelantando gestiones con el constructor de la línea existente, con el fin de que este firme la autodeclaración.

## II. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

El contratista **PRODYM E.S.P. S.A.S.** presenta su solicitud de suspensión por 1 mes, sustentado en las siguientes justificaciones:

- **Imposibilidad de obtener las declaraciones de cumplimiento del constructor inicial de la red existente.** Pese a los esfuerzos realizados y según lo evidenciado en la mesa de trabajo del 12 de mayo de 2026, no fue posible obtener las declaraciones de cumplimiento exigidas por el RETIE al constructor que ejecutó originalmente las redes eléctricas existentes del proyecto, documento técnico indispensable para tramitar en su completitud la certificación RETIE de la infraestructura eléctrica.

- **Imposibilidad de obtener la certificación RETIE sin la documentación previa del constructor inicial.** La certificación RETIE es un trámite técnico obligatorio para acreditar el cumplimiento de la reglamentación aplicable y habilitar la puesta en funcionamiento de las redes e instalaciones proyectadas. Sin las declaraciones de cumplimiento del constructor inicial, dicho trámite no puede ser completado.

- **Complejidad y duración del proceso de certificación RETIE.** El trámite de certificación demanda un tiempo razonable, en razón a que comprende actividades de revisión documental, verificación técnica e inspección por parte del organismo de inspección competente, lo que impide la continuidad inmediata de la ejecución contractual.

**Concepto Interventoría.**

Las obras objeto del contrato se encuentran prácticamente concluidas en sus componentes civil, de generación, de combustibles y de redes eléctricas nuevas, con un ejecutado del 98,97%. El trámite de la Certificación RETIE constituye en la actualidad el requisito técnico determinante y pendiente para habilitar la puesta en funcionamiento del Sistema de Distribución Local (SDL), razón por la cual su obtención condiciona directamente el cierre y liquidación del contrato.

Al respecto, la interventoría había informado, que el tramo de red existente entre Arusí, Partadó y Termales no se enmarca en ninguna de las tres figuras previstas en el RETIE

para tramitar el Dictamen de Inspección, motivo por el cual ninguna de dichas figuras le resulta aplicable a **PRODYM E.S.P. S.A.S**. para efectos de suscribir la autodeclaración de cumplimiento correspondiente. Esta situación fue comunicada inicialmente mediante el oficio **ENT-056-25 del 16 de junio de 2025**, y precisada con mayor rigor técnico y normativo a través del oficio **ENT-041-26 del 16 de marzo de 2026**. En ese mismo contexto, la Interventoría informó que el contratista se encontraba adelantando gestiones directas con el constructor inicial de la línea existente, con el propósito de obtener la documentación técnica requerida para viabilizar el trámite de certificación.

No obstante, mediante comunicación remitida a esta Interventoría, **PRODYM E.S.P. S.A.S.** reportó que, pese a las múltiples gestiones adelantadas, incluyendo desplazamiento a la ciudad de Quibdó el 9 de mayo de 2026 para reunión presencial con el constructor de la línea existente correspondiente al tramo Arusí – La Y – Partadó – Termales—, no fue posible obtener la información técnica necesaria para adelantar el proceso de certificación RETIE de dicha infraestructura. En consecuencia, el contratista declaró fallidas dichas gestiones, informando que no se cuenta con los planos de diseño de las redes existentes, los cálculos de regulación y pérdidas de media tensión, ni la declaración de cumplimiento del constructor responsable de dichas obras, documentos cuya ausencia imposibilita la remisión de la documentación completa al organismo de inspección RETIE competente.

En consecuencia, la solicitud de suspensión encuentra sustento técnico y normativo en una circunstancia objetiva, ajena al incumplimiento del contratista.

Con base en lo anterior, la Interventoría **avala** la suspensión solicitada con el fin de definir las alternativas técnicas y administrativas viables para lograr la certificación RETIE de la línea existente, adelantar las gestiones ante el organismo de inspección competente y dar cumplimiento a los requisitos normativos que habiliten la puesta en funcionamiento del SDL. Lo anterior resulta no solo procedente sino más que prudente, habida cuenta de que la obtención de la Certificación RETIE es una actividad fundamental e inherente al cumplimiento del objeto contractual.

## III. AVAL A LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 2240298

Con fundamento en las circunstancias expuestas en los apartados anteriores, relacionadas con la imposibilidad de obtener la documentación técnica del constructor inicial de las redes existentes y con la consecuente inviabilidad de completar el trámite de Certificación RETIE bajo las figuras normativas actualmente aplicables, esta Interventoría considera que se **configura una causa objetiva, sobreviniente y ajena a la voluntad del contratista**, que impide la continuidad inmediata de la ejecución contractual y justifica la suspensión temporal del contrato.

Teniendo en cuenta que el contratista **PRODYM E.S.P. S.A.S.** ha solicitado la suspensión del contrato de obra por un término de un **(1) mes**, la Interventoría avala la solicitud presentada, toda vez que:

- Las gestiones adelantadas por PRODYM E.S.P. S.A.S. para obtener la documentación técnica del constructor inicial de la línea existente, incluyendo el desplazamiento a la ciudad de Quibdó el 9 de mayo de 2026, resultaron fallidas, sin que sea posible obtener los planos de diseño, los cálculos de regulación y pérdidas, ni la declaración de cumplimiento requerida por el RETIE.

- La obtención de la Certificación RETIE es una actividad fundamental e inherente al cumplimiento del objeto contractual, sin la cual no es posible habilitar la puesta en funcionamiento del Sistema de Distribución Local (SDL) ni proceder al cierre y liquidación del contrato.

- El período de suspensión solicitado resulta necesario para que el contratista y la interventoría definan las alternativas técnicas y administrativas viables que permitan dar cumplimiento a los requisitos normativos exigibles.

En atención a lo anterior, la Interventoría **avala** la Suspensión del Contrato de Obra No. 2240298 por el término de un **(1) mes**, comprendido entre el **19 de mayo de 2026** y el **19 de junio de 2026**, con reinicio de actividades a partir del 20 **de junio de 2026** y nueva fecha de terminación el **21 de junio de 2026**.

En el eventual caso de que, durante el período de suspensión, se defina una alternativa técnica o administrativa viable para adelantar y suscribir la Certificación RETIE, superándose así las causales que dieron origen a la presente suspensión, se procederá al reinicio anticipado del contrato.

Atentamente.

**JAMES MARTÍNEZ G.**
**PROINGES S.A.S**
Representante Legal

| | |
|---|---|
| Radicado N°: 202651010075752 | |
| Asunto: Recomendación y aval de suspensión | |
| Fecha Radicado: 2026-05-15 09:31 | |
| Usuario Radicador: RADICADOR-5 | Folios:1 |
| Destino: GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3 | |
| Remitente: LUZ ANDREA MOLINA HURTADO 52385667 | |
| Visita nuestra página web: https://www.enterritorio.gov.co | |
| Calle 26 No 13 -19 | |

**Datos del Radicado**

| | |
|---|---|
| Radicado: | 202651010075752 |
| Fecha: | 2026-05-15 09:31 |
| Caso: | 152458 |
| Área Responsable: | GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3 |

**Datos del Solicitante**

| | |
|---|---|
| Tipo de identificación: | Cédula de Ciudadanía |
| Número de identificación: | 52385667 |
| Nombre: | LUZ ANDREA MOLINA HURTADO |
| Dirección: | CL 183 9 20 |
| Teléfono: | |
| Correo Electrónico: | lmolina@enterritorio.gov.co |

**Datos del Documento**

| | |
|---|---|
| Tipo de Tramite: | COMUNICACIONES OFICIALES - COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS RECIBIDAS |
| Asunto: | Recomendación y aval de suspensión No. 2 Contrato Obra No.2240298 y suspensión Contrato de Interventoría No. 2240297. |
| Canal y Medio de Entrada: | Electrónico - Correo Electrónico |

**Adjunto**

AVAL SUSPENSION 2 CONTRATOS OBRA E INTERVENTORIA NUQUI.pdf, CORREO.pdf

Bogotá D.C, 15 mayo de 2026

Ingeniero
**ALVARO DE LA CANDELARIA ROMERO VILORIA**
Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 3
Dirección: Calle 26 # 13-19 Piso 20
Teléfonos: 5940407 Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** Convenio No. 069/2012 - 212080. "FONADE se compromete con el DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ a adelantar la Gerencia integral de los Proyectos entregados por el DPS".

**Proyecto** PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN EJECUTADAS BAJO EL CONTRATO DE OBRA No 2141407 CON EL FIN DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES DEL TRAMO ARUSÍ, PARTADÓ Y TERMALES Y DEL TRAMO DE LA "Y" AL PUNTO DENOMINADO "CASA DE MAQUINAS" EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"

**ASUNTO:** Recomendación y aval de suspensión No. 2 Contrato Obra No.2240298 y suspensión Contrato de Interventoría No. 2240297.

Respetado Ingeniero.

Según el **MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE ENTERRITORIO M- GG-02 del 19/02/2026** y de acuerdo con la GUÍA PARA EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE ENTERRITORIO G-GG-03 – 2024-12-13 en el capítulo 2.5 NOVEDADES DEL CONTRATO Y TOMA DE DECISIONES y la Actividad No. 3 – Solicitar suspensión del contrato, haciendo referencia a la responsabilidad del supervisor cuando se indica:

*"(…) Supervisor ENTERRITORIO S.A.: verificar el concepto técnico remitido por el Interventor / supervisor, dentro de los siguientes tres (3) días hábiles, el cual debe soportar de manera detallada la solicitud de suspensión. Una vez realizado lo anterior, avala la solicitud para continuar con el trámite, solicitando concepto al Gerente de Convenio y si este aprueba, se procede con los trámites al interior de la Empresa. En caso contrario devuelve al Interventor para revisión y ajustes o con la negativa definitiva. (…)"*

Así las cosas, mediante oficio radicado DG-037-2026 del 13 de mayo de 2026 el contratista de obra PRODYM E.S.P. S.A.S., solicita a la interventoría PROINGES S.A.S. la suspensión 2 del Contrato de Obra No. 2240298 por el término de un mes a partir de 19 de mayo de 2026, sustentando:

*"(…) En atención a la mesa de trabajo desarrollada el día de ayer 12 de mayo de 2026, se evidencio que pese a los esfuerzos realizados, no se pudo obtener las declaraciones de cumplimiento del constructor inicial de la red existente del proyecto de la referencia, exigidas por la Norma Técnica – RETIE, para gestionar en su completitud la certificación RETIE del proyecto de infraestructura eléctrica, trámite técnico indispensable para acreditar el cumplimiento de la reglamentación aplicable y permitir la adecuada puesta en funcionamiento de las redes e instalaciones proyectadas.*

*Dicho proceso demanda un término de tiempo razonable, en la medida en que comprende actividades de revisión documental, verificación técnica e inspección por parte del organismo competente. Esta circunstancia, reviste vital importancia para la normal ejecución del proyecto, por lo que constituye un fundamento adicional que justifica la suspensión temporal del contrato hasta tanto se reúnan las condiciones necesarias para su continuidad.*

*En mérito de lo expuesto, solicitamos de manera respetuosa se estudie y autorice la suspensión temporal del contrato de obra, mientras se adoptan las medidas necesarias para superar las situaciones aquí descritas.. (…)"*

Por su parte, la interventoría Proinges S.A.S. mediante oficio ENT-058-26 del 14 de Mayo de 2026 avala la solicitud sustentando:

*"(…) Mediante comunicación **DG-037-2026** del 13 de mayo de 2026, el **contratista PRODYM E.S.P. S.A.S.** solicitó la Suspensión del Contrato de Obra No. 2240298 de 2024, por el término de un **(1) mes**, argumentando la imposibilidad de obtener la documentación técnica del constructor inicial de las redes eléctricas existentes del tramo Arusí – La Y – Partadó – Termales, lo que impide completar el trámite de Certificación RETIE requerido para la puesta en funcionamiento del Sistema de Distribución Local (SDL).*
*La Interventoría, tras analizar la documentación técnica presentada y verificar las gestiones adelantadas por el contratista, confirma que la causa invocada es objetiva, sobreviniente y ajena a la voluntad de **PRODYM E.S.P. S.A.S.**, constituyendo un impedimento técnico y normativo que justifica la suspensión temporal del contrato.*

*Con base en lo anterior y en la información presentada en los anexos, la **Interventoría avala y recomienda** la aprobación de la Suspensión del Contrato de Obra No. 2240298 de 2024, por el período comprendido entre el **19 de mayo de 2026** y el **19 de junio de 2026**, con reinicio de actividades a partir del **19 de junio de 2026** y nueva fecha de terminación el **21 de junio de 2026**, o antes, en caso de que se superen las causas que dieron origen a la suspensión..* (…)

Por lo anterior, a través de oficio No. ENT – 059 – 26 del 14 de mayo de 2026, la interventoría PROINGES S.A.S. solicita a su vez la suspensión 2 del Contrato de Interventoría No. 2240297, señalando:

*"(…) Mediante comunicación DG-037-2026 del 13 de mayo de 2026, el contratista PRODYM E.S.P. S.A.S. solicitó la suspensión del Contrato de Obra No. 2240298 de 2024, argumentando la imposibilidad de obtener la documentación técnica del constructor inicial de las redes eléctricas existentes del tramo Arusí – Partadó – Termales, lo que impide completar el trámite de Certificación RETIE requerido para la puesta en funcionamiento del Sistema de Distribución Local (SDL). Posteriormente, la Interventoría, mediante comunicación ENT-058-26 del 14 de mayo de 2026 y sus respectivos anexos, analizó la documentación presentada y avaló la suspensión solicitada, verificando que la causa invocada es objetiva, sobreviniente y ajena a la voluntad del contratista.*

*En atención a lo anterior, se solicita a ENTerritorio S.A. que el Contrato de Interventoría No. 2240297 sea suspendido por el mismo período de tiempo, es decir, por un (1) mes, comprendido entre el 19 de mayo de 2026 y el 19 de junio de 2026, con reinicio a partir del **19 de junio de 2026** y nueva fecha de terminación el **21 de junio de 2026**, manteniendo la vigencia contractual en concordancia con la suspensión y posterior reanudación del Contrato de Obra No. 2240298, teniendo en cuenta que la duración del contrato de interventoría debe corresponder al período de ejecución y liquidación del contrato de obra objeto de su supervisión.(…)"*

Así las cosas, teniendo en cuenta los soportes y justificaciones técnicas presentadas por el contratista de obra, y teniendo en cuenta que ENTerritorio S.A cumplió con la entrega de documentación solicitada por el contratista de obra e interventoría entregando planos y memorias de cálculo de las redes existentes no obstante está pendiente declaraciones de cumplimiento del constructor inicial de la red existente; asimismo, la solicitud frente al Contrato de Interventoría No. 2240297, con el fin de cumplir con la obtención de la certificación RETIE y los tramites que se deben realizar , está supervisión avala la Suspensión No. 2 de los referidos contratos por el término de un mes comprendido entre el 19 de mayo de 2026 y el 19 de junio de 2026, con reinicio el 20 de junio de 2026 o antes si se superan los motivos que dieron origen a la suspensión 2.

Se adjunta una (1) carpeta con los soportes requeridos para el trámite correspondiente de la novedad contractual.

Atentamente,



**LUZ ANDREA MOLINA HURTADO**
Contratista – Supervisora

| | ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL | CÓDIGO: | F-GG-14 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 04 |
| | | VIGENCIA: | 2024-05-17 |
| | GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS | CLASIFICACIÓN: | IP |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONVENIO ASOCIADO** | 212080 | | | | | | | | | | | | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA | | | | | | | | | | | | | |
| **CONTRATO No.** | 2240298 | | | | | | | | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | PRODYM ESP SAS | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETO** | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN EJECUTADAS BAJO EL CONTRATO DE OBRA No 2141407 CON EL FIN DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES DEL TRAMO ARUSÍ, PARTADÓ Y TERMALES Y DEL TRAMO DE LA "Y" AL PUNTO DENOMINADO "CASA DE MAQUINAS" EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAZO INICIAL (Días )** | 6 MESES | | | **PLAZO ACTUAL (Días o Meses)** | | | | | 11 MESES | | | | | |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 21 | DE | ENERO | DE | 2025 | **FECHA TERMINACION ACTUAL** | 21 | DE | MAYO | DE | 2026 | | | |
| **VALOR INICIAL** | $ | | 4.014.417.570,0 | **PLAZO ACTUAL** | | | | | 11 MESES | | | | | |
| **INTERVENTOR** | PROINGES SAS | | | | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** | | | 2240297 | | | |
| **SUPERVISOR** | LUZ ANDREA MOLINA HURTADO | | | | | | | | | | | | | |

**SOLICITUD DE** **ADICIÓN** | **PRÓRROGA** | **SUSPESIÓN** X

**PRÓRROGAS/DISMINUCIONES**

| PRÓRROGA No. | TIEMPO (días) |
|---|---|
| 1 | 4 Meses |
| 2 | 1 Mes |
| 3 | |
| 4 | |

**SUSPENSIONES**

| ACTA No. | TIEMPO (Días) | INICIO | FIN |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mes | 10/11/2025 | 10/12/2025 |
| 2 | 1,5 Meses | 10/12/2025 | 25/01/2026 |
| 3 | 1 Mes | 25/01/2026 | 25/02/2026 |
| 4 | 1,5 Meses | 25/02/2026 | 9/04/2026 |

**ADICIONES/REDUCCIONES**

| ADICIÓN No. | VALOR |
|---|---|
| 1 | $ 423.170.764,00 |
| 2 | $ 1.069.813.200,91 |
| 3 | |
| 4 | |

**CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| PLAZO ACTUAL | 11 MESES |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 21 de MAYO de 2026 |
| VALOR ACTUAL | $ 5.507.401.534,91 |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA 14 DEL MES DE MAYO DE 2026

**ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO**

HASTA EL DÍA 14 MAYO DE 2026 EL CONTRATO PRESENTABA UN **AVANCE REAL** DEL 98,97 % CONTRA UN **AVANCE PROGRAMADO** DE 97,79 %

Notas:
1. Si el contrato es de Obra. el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del provecto. v el avance proaramado corresponde al VALOR PLANEADO
2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

**ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO**

HASTA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2026 EL CONTRATO PRESENTABA UN VALOR PAGADO DE $ 3.284.031.411,00 QUE CORRESPONDE AL 59,63 %
CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO.

**SOLICITUD DE ADICION / REDUCCION**

**1. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE ADICIÓN / REDUCCION**
EL <SOLICITANTE>, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, DEL MES DE DE SOLICITA:
UNA ADICIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No
POR VALOR DE $ -
ARGUMENTANDO, QUE:

**2. RECURSOS A SUPRIMIR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES QUE NO SE VAN A EJECUTAR (MENORES CANTIDADES)**
EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES ORIGINALES DEL CONTRATO A SUPRIMIR, QUE CORRESPONDEN A:

| ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **A SUPRIMIR** | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **MENORES CANTIDADES** | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | $ - |
| ADMINISTRACION | | | | 29% | $ - |
| IMPREVISTOS | | | | 5% | $ - |
| UTILIDAD | | | | 5% | $ - |
| **IVA / UTILIDAD** | | | | **19%** | $ - |
| **VALOR TOTAL** | | | | | $ - |
| VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA) | | | | | |
| **VALOR TOTAL FINAL (TOTAL MAS AJUSTES)** | | | | | $ - |

**EL VALOR DE LOS RECURSOS A SUPRIMIR ASCIENDE A LA SUMA DE** $ -

**3. RECURSOS PARA MAYORES CANTIDADES**
EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES ORIGINALES DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE CORRESPONDEN A :

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | $ - |
| ADMINISTRACION | | | | 29% | $ - |
| IMPREVISTOS | | | | 5% | $ - |
| UTILIDAD | | | | 5% | $ - |
| **IVA / UTILIDAD** | | | | **19%** | $ - |
| **VALOR TOTAL** | | | | | $ - |
| VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA) | | | | | |
| **VALOR TOTAL FINAL (TOTAL MAS AJUSTES)** | | | | | $ - |

**DICTAMEN RETIE**

| ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **VALOR TOTAL RETIE (NO SE LE APLICA AIU)** | | | | | - |
| **VALOR TOTAL MAYORES Y MENORES** | | | | | - |

**EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA MAYORES CANTIDADES DE OBRA, ASCIENDE A LA SUMA DE** $ -

**4. RECURSOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS (ÍTEMS NO PREVISTOS)**
EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE CORRESPONDEN A:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | - |
| ADMINISTRACION | | | | 29% | - |
| IMPREVISTOS | | | | 5% | - |
| UTILIDAD | | | | 5% | - |
| **IVA / UTILIDAD** | | | | **19%** | - |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | | | | | - |

**EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS, ASCIENDE A LA SUMA DE** $ -

LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS SE SOPORTAN CON EL ACTA No. DE COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS.
POR MEDIO DEL ACTA No. SE SOPORTAN LAS CANTIDADES Y VALORES CORRESPONDIENTES A MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS

**5. VALOR DE LA ADICIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| A | VALOR DEL CONTRATO: | $ 5.507.401.534,91 |
| B. | VALOR RECURSOS SUPRIMIDOS: | $ - |
| C. | VALOR RECURSOS POR MAYORES CANTIDADES: | $ - |
| E. | VALOR RECURSOS POR ACTIVIDADES NO PREVISTAS: | $ - |
| G. | **VALOR ADICIÓN (C+D+E+F-B):** | $ - |
| H. | **NUEVO VALOR DEL CONTRATO:** | **$ 5.507.401.534,91** |

**SOLICITUD DE PRÓRROGA**

**6. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA**
EL <SOLICITANTE>, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, DEL MES DE DE SOLICITA:
UNA PRÓRROGA PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No
POR MES, ARGUMENTANDO QUE:

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA PRORROGA SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 0 ES EL DE MAYO DE

**SOLICITUD DE SUSPENSIÓN**

**7. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN**
EL CONTRATISTA PRODYM E.S.P. S.A.S., A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA DG:037-2026, DE FECHA: 13 DEL MES DE MAYO DE 2026 SOLICITA:
UNA SUSPENSIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No **2240298**
POR 1 MES, CONTADA A PARTIR DEL 19 DEL MES DE MAYO DE 2026 **AL** 19 DEL MES DE JUNIO DE 2026
ARGUMENTANDO QUE:

i. **Imposibilidad de obtener las declaraciones de cumplimiento del constructor inicial de la red existente.** Pese a los esfuerzos realizados y según lo evidenciado en la mesa de trabajo del 12 de mayo de 2026, no fue posible obtener l as declaraciones de cumplimiento exigidas por el RETIE al constructor que ejecutó originalmente las redes eléctricas existentes del proyecto, documento técnico indispensable para tramitar en su completitud la certificación RETIE de la infraestructura eléctrica.
ii. **Imposibilidad de obtener la certificación RETIE sin la documentación previa del constructor inicial.** La certificación RETIE es un trámite técnico obligatorio para acreditar el cumplimiento de la reglamentación aplicable y habilitar la puesta en funcionamiento de las redes e instalaciones proyectadas. Sin las declaraciones de cumplimiento del constructor inicial, dicho trámite no puede ser completado.
iii. **Complejidad y duración del proceso de certificación RETIE.** El trámite de certificación demanda un tiempo razonable, en razón a que comprende actividades de revisión documental, verificación técnica e inspección por parte del organismo de inspección competente, lo que impide la continuidad inmediata de la ejecución contractual.

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA SUSPENSION SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 2240298 ES EL 21 DE JUNIO DE 2026

FIRMA:
**NOMBRE: DARWIN VALENCIA MURILLO**
**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA**
**PRODYM SAS**

| | ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL | CÓDIGO: | F-GG-14 |
|---|---|---|---|
| enterritorio | | VERSIÓN: | 04 |
| | | VIGENCIA: | 2024-05-17 |
| | GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS | CLASIFICACIÓN: | IP |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO ASOCIADO** | 212080 |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA |
| **CONTRATO No.** | 2240298 |
| **CONTRATISTA** | PRODYM ESP SAS |
| **OBJETO** | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN EJECUTADAS BAJO EL CONTRATO DE OBRA No 2141407 CON EL FIN DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES DEL TRAMO ARUSÍ, PARTADÓ Y TERMALES Y DEL TRAMO DE LA "Y" AL PUNTO DENOMINADO "CASA DE MAQUINAS" EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLAZO INICIAL** | 6 MESES | | | | | **PLAZO ACTUAL** | | | | | 10 MESES | | | | |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 21 | DE | ENERO | DE | 2025 | **FECHA TERMINACION ACTUAL** | 21 | DE | MAYO | DE | 2026 | | | | |
| **VALOR INICIAL** | $ | | | | 4.014.417.570 | **PLAZO ACTUAL** | | | | | 11 MESES | | | | |
| **INTERVENTOR** | PROINGES SAS | | | | | | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** | | | 2240297 | | |
| **SUPERVISOR** | LUZ ANDREA MOLINA HURTADO | | | | | | | | | | | | | | |

**SOLICITUD DE** **AD** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **SUSPENSIÓN** X

**PRÓRROGAS**

| PRÓRROGA No. | TIEMPO (dias) |
|---|---|
| 1 | 4 Meses |
| 2 | 1 Mes |
| 3 | |
| 4 | |

**SUSPENSIONES**

| ACTA No. | TIEMPO (Dias) | INICIO | FIN |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mes | 10/11/2025 | 10/12/2025 |
| 2 | 1,5 Meses | 10/12/2025 | 25/01/2026 |
| 3 | 1 Mes | 25/01/2026 | 25/02/2026 |
| 4 | 1,5 Meses | 25/02/2026 | 9/04/2026 |

**ADICIONES**

| ADICIÓN No. | VALOR |
|---|---|
| 1 | $ 423.170.764,00 |
| 2 | $ 1.069.813.200,91 |
| 3 | |
| 4 | |

**CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| PLAZO ACTUAL | 11 MESES |
| FECHA DE TERMINACION | 21 de MAYO de 2026 |
| VALOR ACTUAL | $ 5.507.401.534,91 |

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA 14 DEL MES DE MAYO DE 2026

**ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO**

HASTA EL DÍA 14 MAYO DE 2026 EL CONTRATO PRESENTABA UN **AVANCE REAL** DEL 98,97 % CONTRA UN **AVANCE PROGRAMADO** DE 97,79 %

Notas:
1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO
2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

**ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO**

HASTA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2026 EL CONTRATO PRESENTABA UN VALOR PAGADO DE $ 3.284.031.411,00 QUE CORRESPONDE AL 59,63 % CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO.

**CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOBRE LA ADICIÓN, PRÓRROGA y/o SUSPENSION**

TOMANDO COMO REFERENCIA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA O LA SUPERVISIÓN, COMO GARANTE DE LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO 2240298 Y LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE ENTerritorio S.A, ÉSTA SE MANIFIESTA FRENTE A LA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO EN MENCIÓN BAJO LOS SIGUIENTES TERMINOS:

**CONCEPTO FRENTE A LA ADICION/REDUCCION DE RECURSOS ECONOMICOS**

ANTE LA SOLICITUD DE ADICION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR VALOR DE $ - , LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN CONSIDERA QUE LA MISMA ES
ACEPTABLE ☐ INVIABLE ☐ POR LO CUAL

**CONCEPTO FRENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO**

ANTE LA SOLICITUD DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR ☐ MES, LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN CONSIDERA QUE LA MISMA ES
ACEPTABLE ☐ INVIABLE ☐ POR LO CUAL ☐ MESES
LO CUAL DEFINE QUE LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO ES EL ☐ DE ☐ DE ☐

**CONCEPTO FRENTE A LA SUSPENSION DEL CONTRATO**

ANTE LA SOLICITUD DE SUSPESION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR 1 MES, CONTADOS A PARTIR DEL 19 DE MAYO DE 2026
HASTA 19 DE JUNIO DE 2026 LA INTERVENTORIA CONSIDERA QUE LA MISMA ES ACEPTABLE X INVIABLE ☐
POR LO CUAL LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SERÍA EL: 21 DE JUNIO DE 2026
COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, "INFORME AVAL SOLICITUD SUSPENSIÓN No.2 CONTRATO 2240298" DE FECHA 14 DE MAYO 2026 REMITIDA POR LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN EN LA CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS Y CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

**SOLICITUD DE APROBACIÓN/RECHAZO**

TENIENDO EN CUENTA LAS RAZONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS, LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOLICITA A ENTERRITORIO S.A. AUTORIZAR, TOTAL, LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA TOMANDO COMO REFERENCIA LA COMUNICACIÓN Y SOPORTES, QUE PARA EL CASO, ANEXA LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN A LA PRESENTE.

**OBLIGACIONES PARAFISCALES (Aplica cuando la solicitud es VIABLE)**

EL CONTRATISTA ANEXA A ESTA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO No. **2240298**

i LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DEL CONTRATO, EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

ii COPIA DE LA COMUNICACIÓN ENVADA

Recibe

FIRMA
**NOMBRE: JAMES MARTINEZ GALLEGO**
**REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA**

FIRMA
**NOMBRE: LUZ ANDREA MOLINA HURTADO**
**SUPERVISORA**

**Nota:** En caso de ser un contrato de interventoría ( de obra o consultoría) esta sección del formato debe ser diligenciada y firmada unicamente por el supervisor

| enterritorio | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO: | F-GG-06 |
|---|---|---|---|
| Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. | | VERSIÓN: | 03 |
| | | VIGENCIA: | 2024-05-10 |
| | GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS | CLASIFICACIÓN: | IP |

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 046

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **4/05/2026** al **10/05/2026** | Fecha **11/05/2026**

## 1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° CONTRATO** | 2240298 | **NOMBRE DEL PROYECTO** | GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REDES EN ARUSI-PARTADO-TERMALES Y SECTOR DE LA "Y" |
| **OBJETO DEL PROYECTO** | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN EJECUTADAS BAJO EL CONTRATO DE OBRA No 2141407 CON EL FIN DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES DEL TRAMO ARUSÍ, PARTADÓ Y TERMALES Y DEL TRAMO DE LA "Y" AL PUNTO DENOMINADO "CASA DE MAQUINAS" EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | | |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** | **DEPARTAMENTO** CHOCÓ | **MUNICIPIO** | NUQUI (ARUSI-PARTADO-TERMALES) |
| **GERENCIA A CARGO** | GRUPO DESARROLLO DE PROYECTOS 3 | **ESTADO DEL PROYECTO** | EN EJECUCION |

## 2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

### 2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato No. | 2240298 | | |
| Contratista | PRODYM SAS | | |
| Valor inicial | $ | 4.014.417.570,00 | |
| Valor actual | $ | 5.507.401.534,91 | |
| Variación del valor | $ | 1.492.983.964,91 | |
| Fecha de Inicio | 21/01/2025 | | |
| Plazo inicial (Días) | 180 Días | | |
| Plazo actual (Días) | 336 Días | | |
| Variación en plazo | 156 Días | | |
| Fecha Contractual de terminación | 21/05/2026 | | |
| Tiempo Transcurrido (días) | 304 | 90,48% | |
| Días remanentes del Contrato | 10 | 2,98% | |
| Acumulado a última acta pagada | $ | 3.284.031.411,00 | |
| Estimado ejecutado por llevar a acta | $ | 1.672.629.971,00 | |

### 2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato No. | 2240297 | | |
| Interventor | PROINGES SAS | | |
| Valor inicial | $ | 477.696.821,00 | |
| Valor actual | $ | 716.545.231,50 | |
| Variación del valor | $ | 238.848.410,50 | |
| Fecha de Inicio | 21/01/2025 | | |
| Plazo inicial | 180 Días | | |
| Plazo actual | 336 Días | | |
| Variación en plazo | 156 Días | | |
| Fecha Contractual de terminación | 21/05/2026 | | |
| Ejecución del Contrato | | | |
| Días remanentes del Contrato | 10 | 2,98% | |
| Acumulado a última acta pagada | $ | 499.625.535,92 | |
| Estimado ejecutado por llevar a acta | $ | 145.265.172,42 | |

## 3. ESTADO DEL PROYECTO

### INFORME DE DESEMPENO


Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.507.401.534,91

| | Programado (PV) Inversión | % | Ejecutado (EV) Inversión | % | Desviación (SV) Inversión | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acumulado Anterior | $ 4.850.214.031,74 | 88,07% | $ 5.393.355.362,91 | 97,93% | $ 543.141.331,17 | 9,86% |
| Durante el Periodo | $ 535.734.039,83 | 9,73% | $ 57.515.933,37 | 1,04% | -$ 478.218.106,46 | -8,68% |
| **Acumulado a la Fecha** | **$ 5.385.948.071,57** | **97,79%** | **$ 5.450.871.296,28** | **98,97%** | **$ 64.923.224,71** | **1,18%** |

**Semaforo**

$ 0,01

Desviación en días






**Observaciones al desempeño del proyecto**

*Actualmente, de acuerdo con el cronograma actualizado y las actividades ejecutadas a la fecha de corte, se evidencia que el proyecto presenta un adelanto del 1,18% frente a lo programado, con un ejectado del 98,97%.*

*Lo anterior evidencia que las obras contratadas se encuentran prácticamente concluidas, siendo el trámite de la Certificación RETIE el requisito determinante y pendiente para la puesta en funcionamiento del Sistema de Distribución Local (SDL). Al respecto, la interventoría advirtió esta situación desde el oficio ENT-056-25 del 16 de junio de 2025, y la formalizó con mayor precisión técnica y normativa mediante el oficio ENT-041-26 del 16 de marzo de 2026, en el cual se señaló expresamente que el tramo de red existente entre Arusí, Partadó y Termales no se enmarca en ninguna de las tres figuras previstas en el RETIE para tramitar el Dictamen de Inspección, razón por la cual ninguna de dichas figuras le resulta aplicable a PRODYM para efectos de suscribir la autodeclaración correspondiente. No obstante lo anterior, el contratista se encuentra adelantando las gestiones necesarias con la finalidad de obtener la certificación de esta línea y dar cumplimiento al objeto del contrato.*

**Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)**

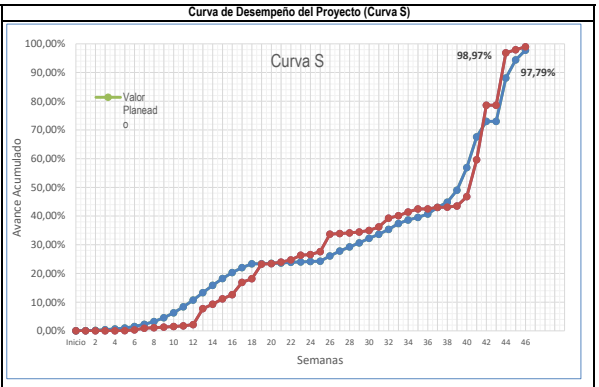

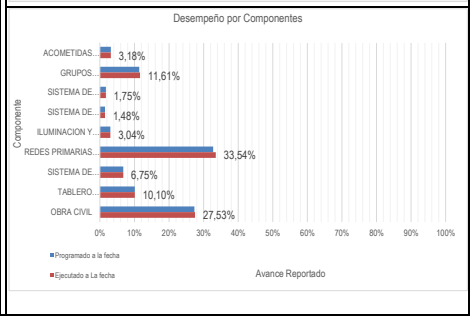

### CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

1) Se aprobó la primera novedad contractual para el contrato de obra No. 2240298 en el mes de Julio de 2025, que contempla una prórroga de cuatro (4) meses y una adición presupuestal por valor de $423.170.764.
2) En el mes de abril de 2026 se aprobó la segunda novedad contractual para el contrato, con una adición presupuestal de $1.069.813.200,91 y una prórroga de un (1) mes.
3) Considerando el nuevo cronograma y las actividades ejecutadas por el contratista hasta la fecha, se registra un avance del 98,97% .

## 4. OTROS INDICADORES

### AVANCE FISICO

| | Programado | Ejecutado | Desviación | Semáforo |
|---|---|---|---|---|
| | % | % | % | |
| Acumulado Anterior | 88,07% | 97,93% | 9,86% | 1,18% |
| Durante el Periodo | 9,73% | 1,04% | -8,68% | |
| **Acumulado a la Fecha** | **97,79%** | **98,97%** | **1,18%** | |

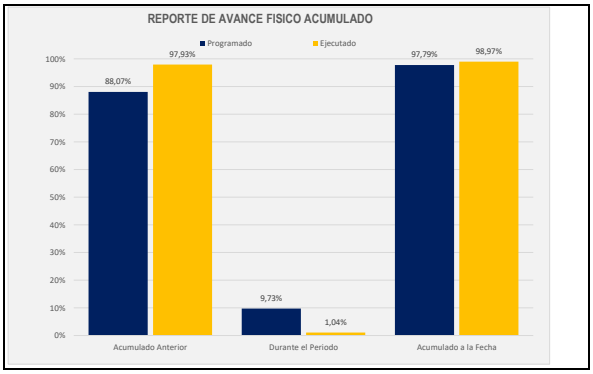



### AVANCE FINANCIERO

**AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL**

| Valor Inicial Contrato | Valor Actual Contrato | Variación | Anticipo Pagado | Anticipo Valor Amortizado | Anticipo Saldo por Amortizar |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 4.014.417.570,00 | $ 5.507.401.534,91 | $ 1.492.983.964,91 | | | $ - |

| No. Pagos tramitados | Valor Pagos tramitados Valor en Pesos | % | No. Pagos realizados | Valor Pagos realizados Valor en Pesos | % | Fecha última acta pagada | Valor última Acta pagada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $ 3.284.031.411,00 | 59,63% | 5 | $ 3.284.031.411,00 | 59,63% | 20/02/2026 | $ 128.586.416,00 |











**AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR**

| Valor Inicial Contrato | Valor Actual Contrato | Variación | Anticipo Pagado | Anticipo Valor Amortizado | Anticipo Saldo por Amortizar |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 477.696.821,00 | $ 716.545.231,50 | $ 238.848.410,50 | | | $ - |

| No. Pagos tramitados | Valor Pagos tramitados Valor en Pesos | % | No. Pagos realizados | Valor Pagos realizados Valor en Pesos | % | Fecha última acta pagada | Valor última Acta pagada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | $ 499.625.535,92 | 69,73% | 6 | $ 499.625.535,92 | 69,73% | 20/11/2025 | $ 39.750.765,20 |









| | | | |
|---|---|---|---|
| enterritorio<br>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. | **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO: | **F-GG-06** |
| | | VERSIÓN: | **03** |
| | | VIGENCIA: | **2024-05-10** |
| | **GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS** | CLASIFICACIÓN: | **IP** |

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 046**

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **4/05/2026** al **10/05/2026** Fecha **11/05/2026**

**OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO**

En el presente periodo el contratista presenta un adelanto en el cronograma del 1,18%

## 5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

**ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE**

1) Acabados central de Generación.
2) Pruebas de sincronismo.


**ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE**

1) Gestiones para la certificación RETIE.


## 6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

**INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO**

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | |
|---|---|---|
| | PERIODO | ACUMULADO |
| Accidentes de Trabajo | 0 | 1 |
| Incidentes de Trabajo | 0 | 0 |
| Enfermedades | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 |




| Item | Factor | Hh Perdidas por Semana | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Acumulado Anterior | Semana Actual | Acumulado | %Hr/Total |
| 1 | Factores climáticos | 67 | 0 | 67 | 98,5% |
| 2 | Permisos de Trabajo | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 3 | Deficiencia de recursos | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 4 | Operativos | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 5 | Accidentes | 1 | 0 | 1 | 1,5% |
| 6 | Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 7 | Imputables al Contratista | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 8 | Interesados | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 9 | Otros. Cual? | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | **Total** | **68** | **0** | **68** | **100,00%** |




OBSERVACIONES

**GESTION SOCIAL Y PQR´s**

| Foro No. | Fecha de realización | Lugar de realización | Cant. Asistentes | Compromisos | Responsable | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Tipología PQR | Radicado por | Fecha | Asunto | Dirigido a |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

**IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS**

| PROBLEMA IDENTIFICADO | ACCION ESTRATEGICA | ACTIVIDADES DETALLADAS | | RESPONSABLE | SOPORTE | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| enterritorio<br>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. | **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO: | **F-GG-06** |
| | | VERSIÓN: | **03** |
| | | VIGENCIA: | **2024-05-10** |
| | **GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS** | CLASIFICACIÓN: | **IP** |

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 046**

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **4/05/2026** al **10/05/2026** Fecha **11/05/2026**

**8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**




**FOTOS DE ARUSI**




**FOTOS DE ARUSI**



**FOTOS DE ARUSI**




**FOTOS DE ARUSI**

**9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR**

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Actualmente, de acuerdo con el cronograma actualizado y las actividades ejecutadas a la fecha de corte, se evidencia que el proyecto presenta un adelanto del 1,18% frente a lo programado, registrando un avance físico acumulado del 98,97%, lo cual refleja un ritmo de ejecución superior al planificado para el período vigente.


Lo anterior evidencia que las obras contratadas se encuentran prácticamente concluidas, siendo el trámite de la Certificación RETIE el requisito determinante y pendiente para la puesta en funcionamiento del Sistema de Distribución Local (SDL). Al respecto, la interventoría advirtió esta situación desde el oficio ENT-056-25 del 16 de junio de 2025, y la formalizó con mayor precisión técnica y normativa mediante el oficio ENT-041-26 del 16 de marzo de 2026, en el cual se señaló expresamente que el tramo de red existente entre Arusí, Partadó y Termales no se enmarca en ninguna de las tres figuras previstas en el RETIE para tramitar el Dictamen de Inspección, razón por la cual ninguna de dichas figuras le resulta aplicable a PRODYM para efectos de suscribir la autodeclaración correspondiente. No obstante lo anterior, el contratista se encuentra adelantando las gestiones necesarias con la finalidad de obtener la certificación de esta línea y dar cumplimiento al objeto del contrato.

En virtud de lo expuesto, esta interventoría realizará seguimiento permanente a las gestiones que adelante el contratista ante PRODYM, por cuanto la obtención de la autodeclaración constituye una condición sine qua non para el trámite del Dictamen de Inspección RETIE y, en consecuencia, para la energización y puesta en funcionamiento del Sistema de Distribución Local (SDL), tal como lo establece el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. En el evento en que dichas gestiones no arrojen un resultado favorable en el corto plazo, no será posible dar cumplimiento al objeto del contrato.

| | |
|---|---|
| **Firma** | **Firma** |
| Juan Sebastian Martinez | Luz A.Molina Hurtado |
| Director de Interventoría Proinges S.A.S. | Supervisor desarrollo de proyectos 2<br>Enterritorio |


Presupuesto Generral del Proyecto (BAC) $ 5.507.401.534,91

| Semanas | Programado (PV) | | Ejecutado (EV) | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | Valor |
| Inicio | 0,00% | $ - | 0,00% | $ - |
| 1 | 0,08% | $ 4.405.921,23 | 0,00% | $ - |
| 2 | 0,21% | $ 11.565.543,22 | 0,00% | $ - |
| 3 | 0,39% | $ 21.478.865,99 | 0,04% | $ 2.202.960,61 |
| 4 | 0,64% | $ 35.247.369,82 | 0,05% | $ 2.753.700,77 |
| 5 | 1,01% | $ 55.624.755,50 | 0,06% | $ 3.304.440,92 |
| 6 | 1,53% | $ 84.263.243,48 | 0,35% | $ 19.275.905,37 |
| 7 | 2,26% | $ 124.467.274,69 | 0,93% | $ 51.218.834,27 |
| 8 | 3,26% | $ 179.541.290,04 | 1,09% | $ 60.030.676,73 |
| 9 | 4,59% | $ 252.789.730,45 | 1,32% | $ 72.697.700,26 |
| 10 | 6,29% | $ 346.415.556,55 | 1,51% | $ 83.161.763,18 |
| 11 | 8,36% | $ 460.418.768,32 | 1,76% | $ 96.930.267,01 |
| 12 | 10,75% | $ 592.045.665,00 | 2,15% | $ 118.409.133,00 |
| 13 | 13,31% | $ 733.035.144,30 | 7,71% | $ 424.620.658,34 |
| 14 | 15,87% | $ 874.024.623,59 | 9,27% | $ 510.536.122,29 |
| 15 | 18,25% | $ 1.005.100.780,12 | 11,18% | $ 615.727.491,60 |
| 16 | 20,33% | $ 1.119.654.732,05 | 12,62% | $ 695.034.073,71 |
| 17 | 22,03% | $ 1.213.280.558,14 | 16,90% | $ 930.750.859,40 |
| 18 | 23,36% | $ 1.286.528.998,55 | 18,16% | $ 1.000.144.118,74 |
| 19 | 23,37% | $ 1.287.079.738,71 | 23,28% | $ 1.282.123.077,33 |
| 20 | 23,55% | $ 1.296.993.061,47 | 23,43% | $ 1.290.384.179,63 |
| 21 | 23,64% | $ 1.301.949.722,85 | 23,95% | $ 1.319.022.667,61 |
| 22 | 23,89% | $ 1.315.718.226,69 | 24,69% | $ 1.359.777.438,97 |
| 23 | 24,02% | $ 1.322.877.848,69 | 26,38% | $ 1.452.852.524,91 |
| 24 | 24,16% | $ 1.330.588.210,83 | 26,56% | $ 1.462.765.847,67 |
| 25 | 24,30% | $ 1.338.298.572,98 | 27,60% | $ 1.520.042.823,64 |
| 26 | 26,10% | $ 1.437.431.800,61 | 33,72% | $ 1.857.095.797,57 |
| 27 | 27,83% | $ 1.532.709.847,17 | 33,93% | $ 1.868.661.340,79 |
| 28 | 29,28% | $ 1.612.567.169,42 | 34,13% | $ 1.879.676.143,86 |
| 29 | 30,66% | $ 1.688.569.310,60 | 34,44% | $ 1.896.749.088,62 |
| 30 | 32,23% | $ 1.775.035.514,70 | 35,00% | $ 1.927.590.537,22 |
| 31 | 33,66% | $ 1.853.791.356,65 | 36,21% | $ 1.994.230.095,79 |
| 32 | 35,36% | $ 1.947.417.182,74 | 39,26% | $ 2.162.205.842,61 |
| 33 | 37,37% | $ 2.058.115.953,60 | 40,11% | $ 2.209.018.755,65 |
| 34 | 38,63% | $ 2.127.509.212,94 | 41,43% | $ 2.281.716.455,91 |
| 35 | 39,53% | $ 2.177.075.826,75 | 42,50% | $ 2.340.645.652,34 |
| 36 | 40,71% | $ 2.242.063.164,86 | 42,50% | $ 2.340.645.652,34 |
| 37 | 43,00% | $ 2.368.182.660,01 | 43,01% | $ 2.368.733.400,16 |
| 38 | 44,82% | $ 2.468.417.367,95 | 43,14% | $ 2.375.893.022,16 |
| 39 | 49,03% | $ 2.700.278.972,57 | 43,51% | $ 2.396.270.407,84 |
| 40 | 56,90% | $ 3.133.711.473,36 | 46,74% | $ 2.574.159.477,42 |
| 41 | 67,58% | $ 3.721.901.957,29 | 59,63% | $ 3.284.063.535,27 |
| 42 | 73,02% | $ 4.021.277.014,69 | 78,62% | $ 4.329.886.962,48 |
| 43 | 73,02% | $ 4.021.277.014,69 | 78,62% | $ 4.329.886.962,48 |
| 44 | 88,07% | $ 4.850.214.031,74 | 96,88% | $ 5.335.839.429,54 |
| 45 | 94,43% | $ 5.200.639.269,42 | 97,93% | $ 5.393.398.323,14 |
| 46 | 97,79% | $ 5.385.948.071,57 | 98,97% | $ 5.450.871.296,28 |
| | | $ - | | $ - |
| | | $ - | | $ - |
| | | $ - | | $ - |
| | | $ - | | $ - |
| | **97,79%** | **$ 5.385.948.071,57** | **98,97%** | **$ 5.450.871.296,28** |

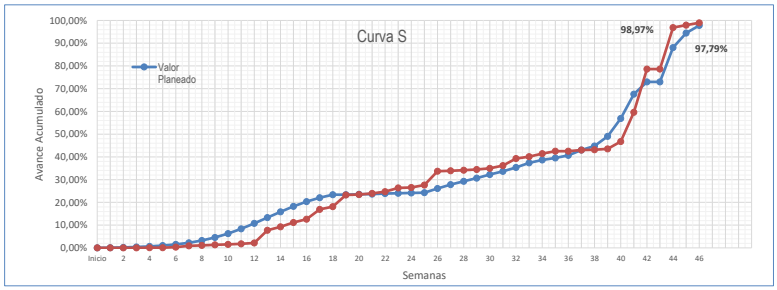


Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) | $ 5.507.401.534,91

| No. | COMPONENTE O CAPITULO | Incidencia | | Programado a la fecha | | Ejecutado a La fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | $ | % | $ | % | Valor Ejecutado |
| 1 | ACOMETIDAS ELECTRICAS | 3,18% | $ 174.916.204,90 | 3,18% | $ 174.916.204,90 | 3,18% | $ 174.916.204,90 |
| 2 | GRUPOS ELECTROGENOS | 11,61% | $ 639.143.728,49 | 11,40% | $ 627.690.265,15 | 11,61% | $ 639.143.728,49 |
| 3 | SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS | 1,75% | $ 96.478.477,87 | 1,75% | $ 96.478.477,87 | 1,75% | $ 96.478.477,87 |
| 4 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | 1,48% | $ 81.496.491,57 | 1,48% | $ 81.496.491,57 | 1,48% | $ 81.496.491,57 |
| 5 | ILUMINACION Y TOMAS DE FUERZA | 3,04% | $ 167.492.552,27 | 3,04% | $ 167.492.552,27 | 3,04% | $ 167.492.552,27 |
| 6 | REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS | 34,57% | $ 1.903.785.565,88 | 32,75% | $ 1.803.785.565,88 | 33,54% | $ 1.847.255.327,25 |
| 7 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y TRASIEGO DE COMBIUSTIBLE | 6,75% | $ 371.634.230,31 | 6,75% | $ 371.634.230,31 | 6,75% | $ 371.634.230,31 |
| 8 | TABLERO ELECTRICOS | 10,10% | $ 556.504.750,44 | 10,10% | $ 556.504.750,44 | 10,10% | $ 556.504.750,44 |
| 9 | OBRA CIVIL | 27,53% | $ 1.515.949.533,18 | 27,34% | $ 1.505.949.533,18 | 27,53% | $ 1.515.949.533,18 |
| | | **100,00%** | **$ 5.507.401.534,91** | **97,79%** | **$ 5.385.948.071,57** | **98,97%** | **$ 5.450.871.296,28** |

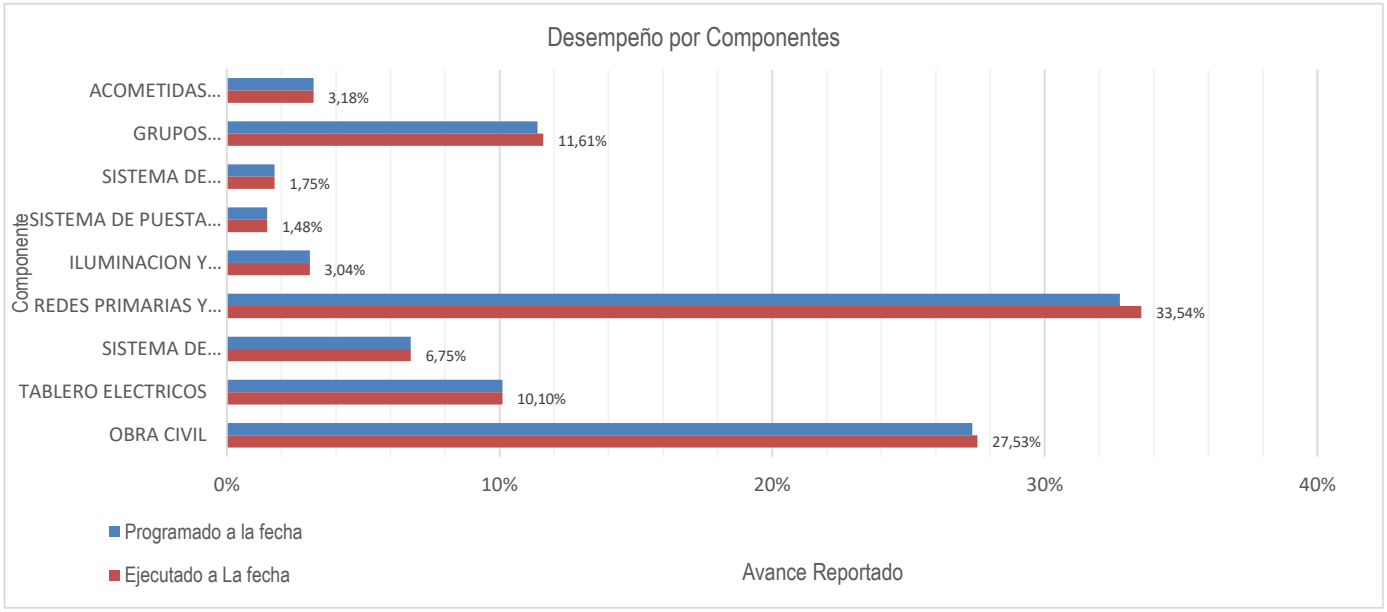


# CRONOGRAMA PRÓRROGA N2

| Id | Modo de | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo | % Planeado | Costo planeado a la fecha (CPTP) | %Ejecutado (Actividades) | %Retraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL TRAMO ARUSÍ, PARTADÓ Y TERMALES Y DEL TRAMO DE LA "Y" AL PUNTO DENOMINADO CASA DE MAQUINAS** | **254,75 días** | **mar 21/01/25** | **jue 21/06/26** | **$ 507.401.534,91** | **10,00%** | **$ 550.764.737,21** | **44,2365%** | **0,000%** |
| 2 | | **INICIO** | **0 días** | **mar 21/01/25** | **mar 21/01/25** | **$ 0,00** | **0,00%** | **$ 0,00** | **0,0000%** | **0** |
| 3 | | **1. ACOMETIDAS ELECTRICAS** | **40 días** | **mié 8/10/25** | **jue 30/04/26** | **$ 128.087.075,28** | **5,83%** | **$ 7.464.709,69** | **7,9331%** | **0,000%** |
| 4 | | **1.1 ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN 220 V** | **13,25 días** | **mar 14/04/26** | **jue 30/04/26** | **$ 61.563.202,60** | **0,00%** | **$ 0,00** | **0,0000%** | **0,000%** |
| 5 | | 1.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3 X (4X250 KCMIL), THHN/THWN; 90 C | 5 días | mar 14/04/26 | lun 20/04/26 | $ 22.905.092,26 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 6 | | 1.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 4 X (2X2/0 AWG), THHN/THWN; 90 C | 7 días | mié 22/04/26 | jue 30/04/26 | $ 18.779.468,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 7 | | 1.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE OJO PARA CABLE 250 KCMIL | 5 días | mar 14/04/26 | lun 20/04/26 | $ 9.789.702,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 8 | | 1.1.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE OJO PARA CABLE 2/0 AWG | 7 días | mié 22/04/26 | jue 30/04/26 | $ 10.088.938,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 9 | | **1.2 ACOMETIDAS DE MEDIA TENSIÓN 13,2 KV** | **40 días** | **mié 8/10/25** | **jue 30/04/26** | **$ 66.523.872,68** | **11,22%** | **$ 7.464.709,69** | **15,2746%** | **0,000%** |
| 10 | | 1.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLPE 133%,(3X2 AWG), 15 KV | 4 días | lun 27/04/26 | jue 30/04/26 | $ 15.463.291,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 11 | | 1.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15 KV | 4 días | lun 27/04/26 | jue 30/04/26 | $ 9.943.087,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 12 | | 1.2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR 15 KV | 4 días | lun 27/04/26 | jue 30/04/26 | $ 9.636.152,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 13 | | 1.2.4 SUMINISTRO DE TUBERIA ELECTRICA PVC 4" | 27 días | mié 8/10/25 | mié 15/04/26 | $ 11.719.056,78 | 63,70% | $ 7.464.709,69 | 86,7070% | 0,000% |
| 14 | | 1.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE OJO PARA CABLE 2 AWG | 3 días | mar 14/04/26 | jue 16/04/26 | $ 9.518.874,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 15 | | 1.2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFLORAMIENTO METÁLICO GALVANIZADO 4", INCLUYE TERMINAL ENCOGIBLE EN FRIO PARA MEDIA TENSIÓN. | 1 día | mié 15/04/26 | jue 16/04/26 | $ 10.243.408,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 16 | | **2. GRUPOS ELECTROGENOS** | **8 días** | **vie 10/04/26** | **lun 20/04/26** | **$ 515.865.090,34** | **0,00%** | **$ 0,00** | **0,0000%** | **0,000%** |
| 17 | | **2.1 GRUPOS ELECTROGENOS** | **8 días** | **vie 10/04/26** | **lun 20/04/26** | **$ 515.865.090,34** | **0,00%** | **$ 0,00** | **0,0000%** | **0,000%** |
| 18 | | 2.1.1 SUMINISTRO, TRASLADO E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTROGENO 100 KW - 220 V, INCLUYE CABINA INSONORIZADA TIPO RESIDENCIAL | 3 días | vie 10/04/26 | mar 14/04/26 | $ 231.378.148,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 19 | | 2.1.2 SUMINISTRO, TRASLADO E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTROGENO 80 KW - 220 V, INCLUYE CABINA INSONORIZADA TIPO RESIDENCIAL | 3 días | vie 10/04/26 | mar 14/04/26 | $ 199.224.979,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 20 | | 2.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ESCAPE PARA GRUPO ELECTROGENO | 5 días | mar 14/04/26 | lun 20/04/26 | $ 85.261.961,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 21 | | **3. SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS** | **7 días** | **lun 11/05/26** | **mié 20/05/26** | **$ 79.316.421,00** | **0,00%** | **$ 0,00** | **0,0000%** | **0,000%** |
| 22 | | **3.1 ACOMETIDAS DE MEDIA TENSIÓN 13,2 KV** | **5 días** | **lun 11/05/26** | **vie 15/05/26** | **$ 50.189.292,44** | **0,00%** | **$ 0,00** | **0,0000%** | **0,000%** |
| 23 | | 3.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL | 3 días | lun 11/05/26 | mié 13/05/26 | $ 9.959.964,32 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 24 | | 3.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL | 3 días | lun 11/05/26 | mié 13/05/26 | $ 9.250.581,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 25 | | 3.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ ESTROBOSCÓPICA CON ALARMA SONORA | 3 días | lun 11/05/26 | mié 13/05/26 | $ 9.356.916,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 26 | | 3.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES DE HUMO TECNOLOGÍA DUAL | 5 días | lun 11/05/26 | vie 15/05/26 | $ 11.323.230,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 27 | | 3.1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2X18 AWG, FPL. INCLUYE TUBO EMT 3/4", CON ACCESORIOS | 5 días | lun 11/05/26 | vie 15/05/26 | $ 10.298.598,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 28 | | **3.2 SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS** | **2 días** | **sáb 16/05/26** | **mié 20/05/26** | **$ 29.127.128,56** | **0,00%** | **$ 0,00** | **0,0000%** | **0,000%** |
| 29 | | 3.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR CALSE BC, TIPO ROBOT 150 LB | 2 días | sáb 16/05/26 | mié 20/05/26 | $ 16.430.997,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 30 | | 3.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR CALSE BC, 20LB, CON GABINETE TIPO EXTERIOR | 2 días | sáb 16/05/26 | mié 20/05/26 | $ 12.696.130,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 31 | | **4. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA** | **65 días** | **lun 8/09/25** | **sáb 2/05/26** | **$ 63.552.970,68** | **77,31%** | **$ 49.135.605,77** | **98,4180%** | **0,000%** |
| 32 | | **4.1 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA** | 65 días | lun 8/09/25 | sáb 2/05/26 | $ 63.552.970,68 | 77,31% | $ 49.135.605,77 | 98,4180% | 0,000% |
| 33 | ✓ | 4.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE COBRE DESNUDO BLANDO 19 HILOS 2/0 AWG SEGÚN PLANO | 50 días | lun 8/09/25 | lun 13/04/26 | $ 13.927.898,78 | 59,60% | $ 8.301.564,18 | 100,0000% | 0,000% |
| 34 | ✓ | 4.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA DE COBRE 5/8" X 2,4 M SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1,38 días | lun 8/09/25 | mar 9/09/25 | $ 11.647.834,78 | 74,83% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 35 | ✓ | 4.1.3 INSTALACIÓN SOLDADURA EXOTÉRMICA CONEXIÓN EN DERIVACIÓN | 2,17 días | lun 8/09/25 | mié 10/09/25 | $ 9.359.783,78 | 93,12% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 36 | ✓ | 4.1.4 INSTALACIÓN SOLDADURA EXOTÉRMICA CONEXIÓN EN CRUZ | 2 días | lun 8/09/25 | mar 9/09/25 | $ 8.963.118,78 | 97,24% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 37 | ✓ | 4.1.5 INSTALACIÓN SOLDADURA EXOTÉRMICA CONEXIÓN EN DERIVACIÓN COLILLA A EQUIPO | 50 días | lun 8/09/25 | lun 13/04/26 | $ 9.525.025,78 | 87,16% | $ 8.301.564,18 | 90,3650% | 0,000% |
| 38 | | 4.1.6 CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN 0,3X0,3X0,5 M | 65 días | lun 8/09/25 | sáb 2/05/26 | $ 10.129.308,78 | 63,04% | $ 6.385.818,60 | 99,1344% | 0,000% |
| 39 | | **5. ILUMINACION Y TOMAS DE FUERZA** | **16,25 días** | **vie 10/04/26** | **jue 30/04/26** | **$ 189.723.120,14** | **0,00%** | **$ 0,00** | **23,7512%** | **0,000%** |
| 40 | | **5.1 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN** | **16,25 días** | **vie 10/04/26** | **jue 30/04/26** | **$ 189.723.120,14** | **0,00%** | **$ 0,00** | **23,7512%** | **0,000%** |
| 41 | | 5.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFLORAMIENTO METÁLICO GALVANIZADO 1", INCLUYE TERMINAL CAPACETE 1". | 2 días | sáb 11/04/26 | mar 14/04/26 | $ 9.063.099,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 42 | | 5.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR TABLERO DE CONTROL (4X12 AWG, CU, THHN), TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE ACCESORIOS | 8 días | mié 15/04/26 | vie 24/04/26 | $ 69.747.758,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 43 | | 5.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO, ACTIVA REACTIVA 100 A, INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS | 1 día | jue 16/04/26 | jue 16/04/26 | $ 9.125.059,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 44 | ✓ | 5.1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA SOBREPONER TRIFÁSICO CON PUERTA Y CHAPA PLÁSTICA, CERRADURA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, TRIFÁSICO, 24 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR 50 A. INCLUYE CONDUCTOR 8 AWG,CU, COLOR VERDE HASTA SPT. | 5 días | vie 10/04/26 | jue 16/04/26 | $ 9.491.642,78 | 0,00% | $ 0,00 | 100,0000% | 0,000% |
| 45 | ✓ | 5.1.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 1 X 20 A | 2 días | jue 16/04/26 | sáb 18/04/26 | $ 8.878.216,78 | 0,00% | $ 0,00 | 100,0000% | 0,000% |
| 46 | ✓ | 5.1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 20 A | 2 días | jue 16/04/26 | sáb 18/04/26 | $ 9.044.844,78 | 0,00% | $ 0,00 | 100,0000% | 0,000% |
| 47 | ✓ | 5.1.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 30 A | 2 días | jue 16/04/26 | sáb 18/04/26 | $ 8.823.369,78 | 0,00% | $ 0,00 | 100,0000% | 0,000% |
| 48 | ✓ | 5.1.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 50 A | 2 días | jue 16/04/26 | sáb 18/04/26 | $ 8.823.369,78 | 0,00% | $ 0,00 | 100,0000% | 0,000% |
| 49 | | 5.1.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELÉCTRICO LUMINARIA LED HERMÉTICA 2×18W, 120 V, TUBERÍA EMT 1/2" | 8 días | mar 21/04/26 | jue 30/04/26 | $ 13.395.215,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 50 | | 5.1.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELÉCTRICO LUMINARIA DE EMERGENCIA, TUBERÍA EMT 1/2" | 5 días | mar 21/04/26 | lun 27/04/26 | $ 10.473.277,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 51 | | 5.1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELÉCTRICO REFLECTOR 70W 220V, TUBERÍA EMT 1/2" | 3 días | mar 21/04/26 | jue 23/04/26 | $ 11.379.044,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 52 | | 5.1.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELÉCTRICO INTERRUPTOR SENCILLO, TUBERÍA EMT 1/2" | 8 días | mar 21/04/26 | jue 30/04/26 | $ 11.129.420,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 53 | | 5.1.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELÉCTRICO TOMACORRIENTE DOBLE | 4 días | mar 21/04/26 | vie 24/04/26 | $ 10.348.798,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 54 | | **6. REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA** | **213,75 días** | **vie 31/01/25** | **vie 7/11/25** | **$ 1.174.082.666,50** | **18,56%** | **$ 217.888.823,50** | **98,3305%** | **0,000%** |
| 55 | | **6.1 DESMONTE** | **137,63 días** | **vie 31/01/25** | **mié 30/07/25** | **$ 73.428.403,68** | **71,22%** | **$ 52.293.317,64** | **94,7522%** | **0,000%** |
| 56 | ✓ | 6.1.1 DESMONTE DE TENDIDO CABLE DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA EXISTENTE | 90 días | vie 31/01/25 | mié 28/05/25 | $ 11.193.494,78 | 77,86% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 57 | | 6.1.2 DESMONTE DE TRANSFORMADOR | 47 días | jue 29/05/25 | mié 30/07/25 | $ 10.922.984,78 | 79,79% | $ 8.715.552,94 | 93,4624% | 0,000% |
| 58 | | 6.1.3 DESMONTE DE ESTRUCTURA RED PRIMARIA | 91 días | lun 31/03/25 | mar 29/07/25 | $ 12.317.266,78 | 70,76% | $ 8.715.552,94 | 91,8175% | 0,000% |
| 59 | | 6.1.4 DESMONTE DE ESTRUCTURA RED SECUNDARIA | 91 días | lun 31/03/25 | mar 29/07/25 | $ 14.131.730,78 | 61,67% | $ 8.715.552,94 | 94,4541% | 0,000% |
| 60 | | 6.1.5 DESMONTE DE APOYOS/POSTES | 91 días | lun 31/03/25 | mar 29/07/25 | $ 11.112.616,78 | 78,43% | $ 8.715.552,94 | 95,2550% | 0,000% |
| 61 | | 6.1.6 DESMONTE DE TEMPLETES | 91 días | lun 31/03/25 | mar 29/07/25 | $ 13.750.309,78 | 63,38% | $ 8.715.552,94 | 94,0138% | 0,000% |
| 62 | | **6.2 REDES PRIMARIAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CABLE DE GUARDA** | **91,63 días** | **sáb 24/05/25** | **lun 22/09/25** | **$ 205.418.535,12** | **16,97%** | **$ 34.862.211,76** | **92,6033%** | **0,000%** |
| 63 | | 6.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO SUSPENSIÓN DE RED TRIFÁSICA MT COMPACTA CON CABLE ECOLÓGICO | 91 días | sáb 24/05/25 | sáb 20/09/25 | $ 18.864.221,78 | 46,20% | $ 8.715.552,94 | 96,1902% | 0,000% |
| 64 | | 6.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO RETENCIÓN DE RED TRIFÁSICA MT COMPACTA CON CABLE ECOLÓGICO | 43 días | sáb 24/05/25 | lun 21/07/25 | $ 30.218.181,78 | 28,84% | $ 8.715.552,94 | 52,0968% | 0,000% |
| 65 | ✓ | 6.2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA PRIMARIA TERMINAL DE RED TRIFÁSICA MT COMPACTA CON CABLE ECOLÓGICO | 74,12 días | sáb 24/05/25 | sáb 30/08/25 | $ 39.246.599,78 | 22,21% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 66 | ✓ | 6.2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED ÁEREA CABLE 2 AWG XLPE-TK ECOLOGICO | 90 días | mar 27/05/25 | lun 22/09/25 | $ 117.089.531,78 | 7,44% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 67 | | **6.3 REDES SECUNDARIA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CABLE DE GUARDA** | **95,88 días** | **mar 20/05/25** | **lun 22/09/25** | **$ 317.778.520,90** | **13,71%** | **$ 43.577.764,70** | **99,8257%** | **0,000%** |
| 68 | ✓ | 6.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA SECUNDARIA TIPO TERMINAL DE RED TRIFÁSICA BT COMPACTA CON CABLE CUADRUPLEX TRENZADO | 46 días | mar 20/05/25 | vie 18/07/25 | $ 19.219.700,78 | 45,35% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 69 | ✓ | 6.3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA SECUNDARIA TIPO RETENCIÓN DE RED TRIFÁSICA BT COMPACTA CON CABLE CUADRUPLEX TRENZADO | 46 días | mar 20/05/25 | vie 18/07/25 | $ 11.436.124,78 | 76,21% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 70 | | 6.3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA SECUNDARIA TIPO SUSPENSIÓN DE RED TRIFÁSICA BT COMPACTA CON CABLE CUADRUPLEX TRENZADO | 47 días | mar 20/05/25 | lun 21/07/25 | $ 48.122.848,78 | 18,11% | $ 8.715.552,94 | 98,8493% | 0,000% |
| 71 | ✓ | 6.3.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED ÁEREA CABLE CUADRUPLEX AL 3X2 + 2 AWG | 34,38 días | jue 22/05/25 | lun 7/07/25 | $ 216.402.704,78 | 4,03% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 72 | ✓ | 6.3.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED ÁEREA CABLE ACSR # 2 | 76 días | sáb 14/06/25 | lun 22/09/25 | $ 22.597.141,78 | 38,57% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 73 | ✓ | **6.4 EQUIPOS** | **113,88 días** | **mié 11/06/25** | **vie 7/11/25** | **$ 330.097.711,12** | **10,56%** | **$ 34.862.211,76** | **100,0000%** | **0,000%** |
| 74 | ✓ | 6.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA | 35 días | mié 11/06/25 | sáb 26/07/25 | $ 53.360.285,78 | 16,33% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 75 | ✓ | 6.4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA | 80 días | mié 11/06/25 | mar 23/09/25 | $ 110.583.347,78 | 7,88% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 76 | ✓ | 6.4.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN POLIMÉRICA AMP CON RESORTE 10 USUARIOS TRIFÁSICA | 61 días | mié 11/06/25 | sáb 30/08/25 | $ 98.084.257,78 | 8,89% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 77 | ✓ | 6.4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO CONVENCIONAL 225KVA | 15 días | lun 20/10/25 | vie 7/11/25 | $ 68.069.819,78 | 12,80% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 78 | ✓ | **6.5 CIMENTACIONES** | **56 días** | **mar 15/07/25** | **mié 24/09/25** | **$ 33.765.487,56** | **51,62%** | **$ 17.431.105,88** | **100,0000%** | **0,000%** |
| 79 | ✓ | 6.5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIMENTACIÓN POSTE 8M | 20 días | mar 15/07/25 | sáb 9/08/25 | $ 14.381.768,78 | 60,60% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 80 | ✓ | 6.5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIMENTACIÓN POSTE 12M | 56 días | mar 15/07/25 | mié 24/09/25 | $ 19.383.718,78 | 44,96% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 81 | ✓ | **6.6 SOPORTES** | **134,5 días** | **lun 31/03/25** | **mar 23/09/25** | **$ 213.594.008,12** | **16,32%** | **$ 34.862.211,76** | **100,0000%** | **0,000%** |
| 82 | ✓ | 6.6.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 8M DE F.V.R 750 KGF | 42 días | mié 2/04/25 | mar 27/05/25 | $ 66.559.229,78 | 13,09% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 83 | ✓ | 6.6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 12M DE F.V.R 750 KGF | 131 días | lun 31/03/25 | jue 18/09/25 | $ 113.443.368,78 | 7,68% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 84 | ✓ | 6.6.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETE A TIERRA RED SECUNDARIA | 60 días | mar 29/04/25 | jue 17/07/25 | $ 20.503.917,78 | 42,51% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 85 | ✓ | 6.6.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETE A TIERRA RED PRIMARIA | 111 días | vie 2/05/25 | mar 23/09/25 | $ 13.087.491,78 | 66,59% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 86 | | **7. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y TRASIEGO DE COMBUSTIBLE** | **13,25 días** | **mié 15/04/26** | **jue 30/04/26** | **$ 209.620.566,04** | **0,00%** | **$ 0,00** | **0,0000%** | **0,000%** |
| 87 | | **7.1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO** | **5 días** | **jue 23/04/26** | **mié 29/04/26** | **$ 39.370.136,78** | **0,00%** | **$ 0,00** | **0,0000%** | **0,000%** |
| 88 | | 7.1.2 SUMINISTRO, TRASLADO E INSTALACIÓN DE TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTALES DE ABASTECIMIENTO DIARIOS 1.83 M3 | 5 días | jue 23/04/26 | mié 29/04/26 | $ 39.370.136,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 89 | | **7.2 SISTEMA DE TRASIEGO Y BOMBEO** | **13,25 días** | **mié 15/04/26** | **jue 30/04/26** | **$ 170.250.429,26** | **0,00%** | **$ 0,00** | **0,0000%** | **0,000%** |
| 90 | | 7.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A - 36 -2" | 9 días | mié 15/04/26 | sáb 25/04/26 | $ 14.841.757,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 91 | | 7.2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA 10 HP, 3F, 220 V | 3 días | lun 27/04/26 | mié 29/04/26 | $ 13.239.822,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 92 | | 7.2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA 5 HP, 3F, 220 V | 3 días | mié 22/04/26 | vie 24/04/26 | $ 11.169.611,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 93 | | 7.2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO BOLA 2" | 9 días | mié 15/04/26 | sáb 25/04/26 | $ 10.045.650,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 94 | | 7.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO RETENCIÓN 2" | 9 días | mié 15/04/26 | sáb 25/04/26 | $ 8.959.820,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |

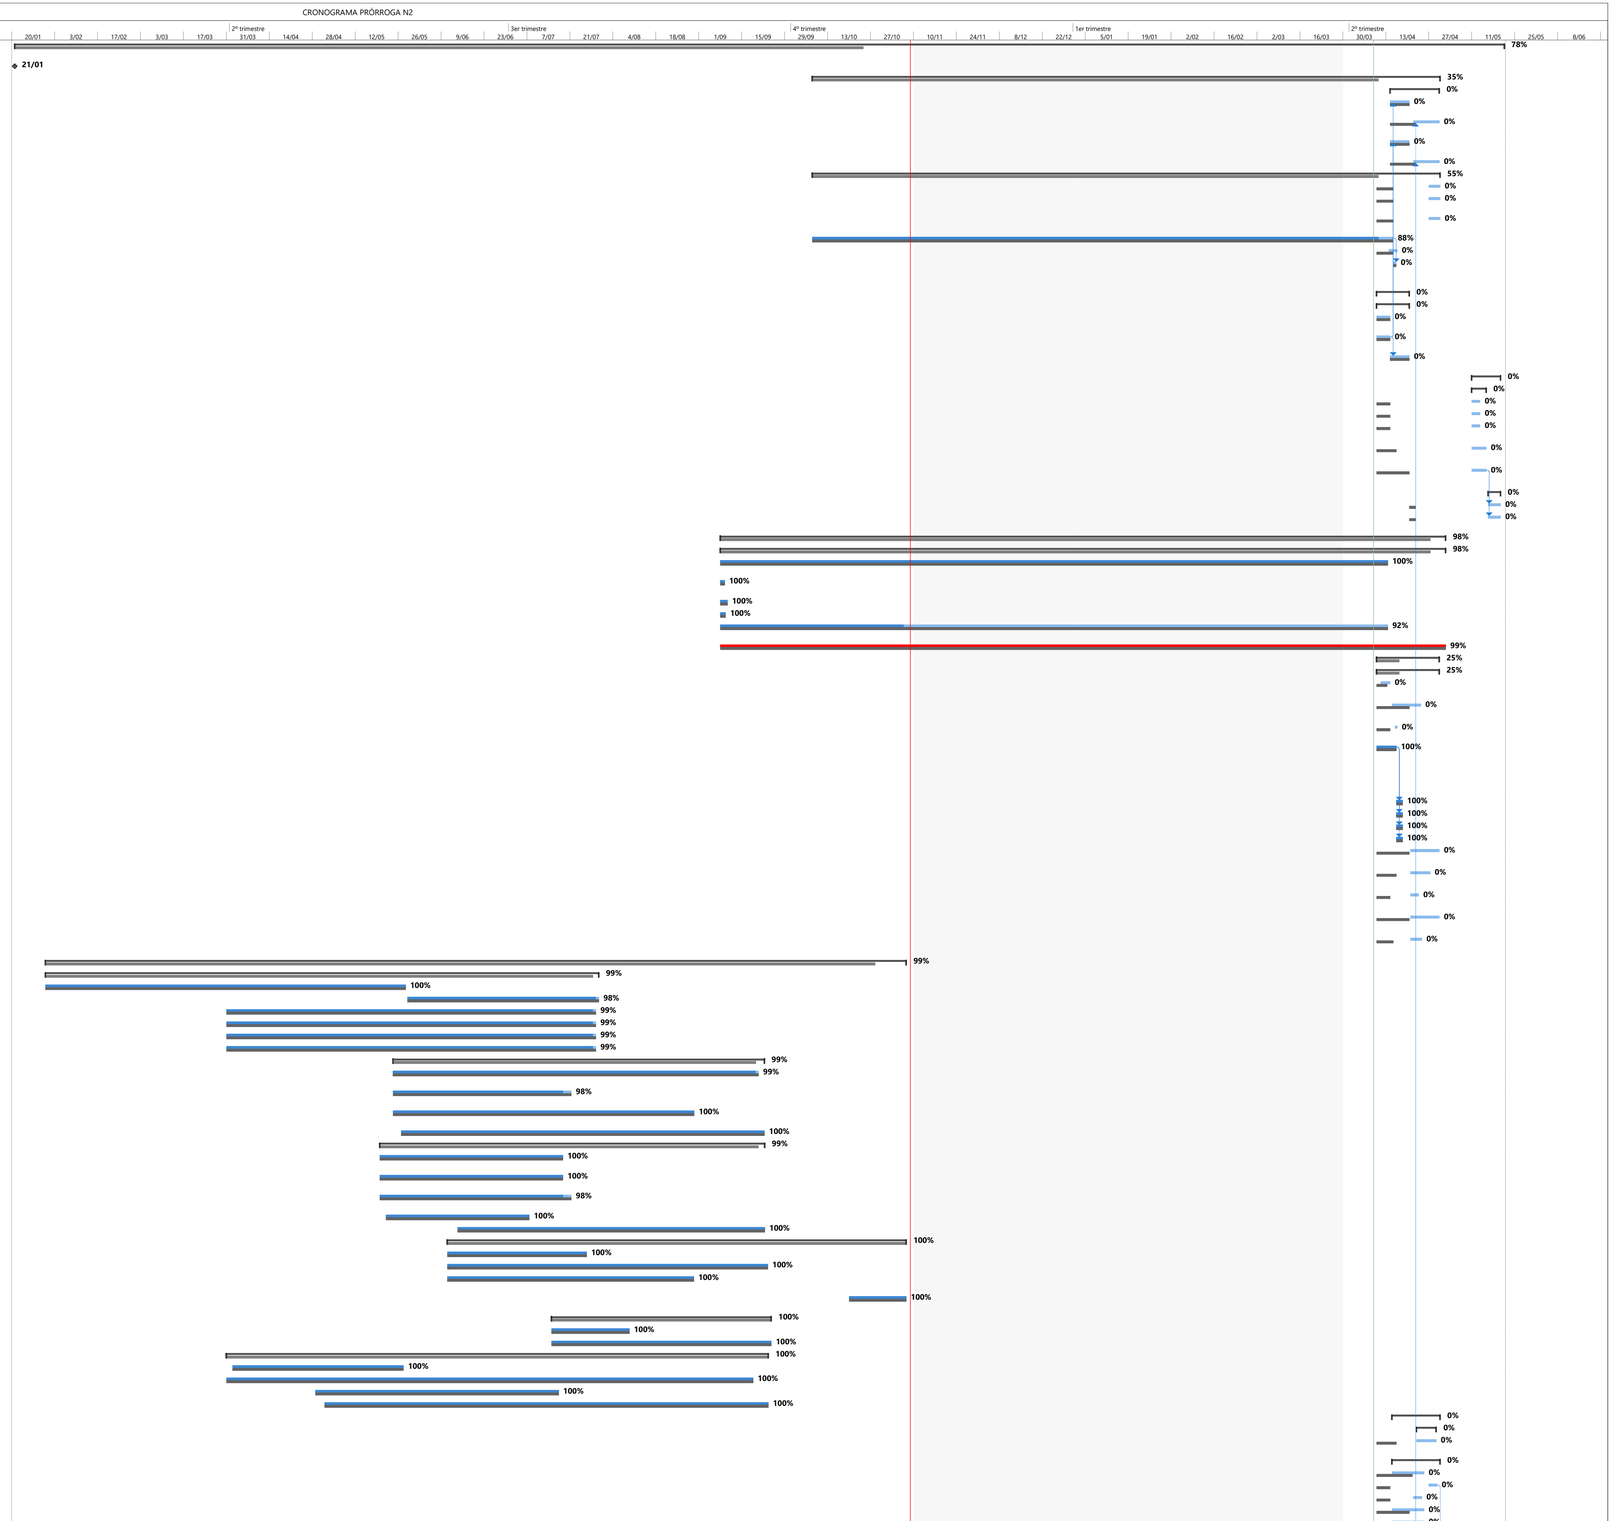


Tareas críticas · División crítica · Progreso de tarea crítica · Tarea · División · Progreso de tarea · Tarea manual · solo el comienzo · solo fin · solo duración · Línea base · División de la línea base · Hito de línea base · Hito · Progreso del resumen · Resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Fecha límite


| Id | Modo de | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo | % Planeado | Costo planeado a la fecha (CPTP) | %Ejecutado (Actividades) | %Retraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | | 7.2.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (1 X VARILLA 5/8" X 2,4 M, INCLUYE CABLE Y ACCESORIOS, EN | 1 día | jue 30/04/26 | jue 30/04/26 | $ 9.080.235,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 96 | | 7.2.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA SOBREPONER TRIFÁSICO CON PUERTA Y CHAPA PLÁSTICA, CERRADURA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, TRIFÁSICO, 12 CIRCUITOS, INCLUYE TOTALIZADOR 100 A | 1 día | mié 29/04/26 | mié 29/04/26 | $ 9.306.667,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 97 | | 7.2.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 1 X 20 A | 1 día | mié 29/04/26 | mié 29/04/26 | $ 8.859.352,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 98 | | 7.2.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELÉCTRICO INTERRUPTOR SENCILLO | 2 días | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | $ 8.844.780,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 99 | | 7.2.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELÉCTRICO TOMACORRIENTE DOBLE | 2 días | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | $ 8.867.527,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 100 | | 7.2.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE MOTOR 100 A | 1 día | lun 27/04/26 | lun 27/04/26 | $ 9.469.642,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 101 | | 7.2.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE MOTOR 30 A | 1 día | mié 22/04/26 | mié 22/04/26 | $ 9.097.912,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 102 | | 7.2.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR MOTOR 5HP (3X10 AWG + 1 X 10 AWG, CU, THHN), TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE ACCESORIOS | 2 días | mar 21/04/26 | mié 22/04/26 | $ 9.239.256,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 103 | | 7.2.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CHEQUE DE 2" | 9 días | mié 15/04/26 | sáb 25/04/26 | $ 9.410.370,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 104 | | 7.2.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45°X2" | 9 días | mié 15/04/26 | sáb 25/04/26 | $ 9.605.902,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 105 | | 7.2.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90°X2" | 9 días | mié 15/04/26 | sáb 25/04/26 | $ 11.049.384,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 106 | | 7.2.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 2" | 9 días | mié 15/04/26 | sáb 25/04/26 | $ 9.162.729,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 107 | | **8. TABLERO ELECTRICOS** | **5 días** | **jue 16/04/26** | **mié 22/04/26** | **$ 449.570.435,12** | **0,00%** | **$ 0,00** | **0,0000%** | **0,000%** |
| 108 | | **8.1 CELDA DE BAJA TENSIÓN** | **5 días** | **jue 16/04/26** | **mié 22/04/26** | **$ 61.234.014,78** | **0,00%** | **$ 0,00** | **0,0000%** | **0,000%** |
| 109 | | 8.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE BAJA TENSIÓN 2,2 X 2,2 X 0,8 M | 5 días | jue 16/04/26 | mié 22/04/26 | $ 61.234.014,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 110 | | **8.2 TABLERO DE CONTROL** | **5 días** | **jue 16/04/26** | **mié 22/04/26** | **$ 124.119.583,78** | **0,00%** | **$ 0,00** | **0,0000%** | **0,000%** |
| 111 | | 8.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE TABLERO DE CONTROL; 0,8 X 2,2 X 0,8 M, INCLUYE SISTEMA DE CONTROL PROGRAMABLE DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR (PLANO AX 03-05). | 5 días | jue 16/04/26 | mié 22/04/26 | $ 124.119.583,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 112 | | **8.3 CELDA DE MEDIA TENSIÓN** | **5 días** | **jue 16/04/26** | **mié 22/04/26** | **$ 111.141.186,78** | **0,00%** | **$ 0,00** | **0,0000%** | **0,000%** |
| 113 | | 8.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDIA TENSIÓN 0,7 X 2,2 X 1,3 M, INCLUYE RELÉ DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE 24 A, 13,2 KV / 220 V. | 5 días | jue 16/04/26 | mié 22/04/26 | $ 111.141.186,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 114 | | **8.4 CELDA DE MEDIDA** | **5 días** | **jue 16/04/26** | **mié 22/04/26** | **$ 153.075.649,78** | **0,00%** | **$ 0,00** | **0,0000%** | **0,000%** |
| 115 | | 8.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN | 5 días | jue 16/04/26 | mié 22/04/26 | $ 153.075.649,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 116 | | **9. OBRA CIVIL** | **233,88 días** | **mar 11/02/25** | **vie 15/05/26** | **$ 1.490.727.879,56** | **9,76%** | **$ 145.542.304,14** | **56,4350%** | **0,000%** |
| 117 | | **9.1 PRELIMINARES** | **216,38 días** | **mar 11/02/25** | **mié 22/04/26** | **$ 104.678.960,46** | **41,63%** | **$ 43.577.764,70** | **62,4875%** | **0,000%** |
| 118 | | 9.1.1 ROCERÍA Y LIMPIEZA DE BOSQUE FRANJA 15 M | 211 días | mar 11/02/25 | mié 15/04/26 | $ 19.330.475,78 | 45,09% | $ 8.715.552,94 | 64,8587% | 0,000% |
| 119 | | 9.1.2 LIMPIEZA BOSQUE, DESCAPOTE Y NIVELACIÓN | 83 días | lun 28/07/25 | mar 14/04/26 | $ 18.454.217,78 | 47,23% | $ 8.715.552,94 | 88,5028% | 0,000% |
| 120 | | 9.1.3 CAMPAMENTO 18 M2 | 10 días | vie 10/04/26 | mié 22/04/26 | $ 13.240.615,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 121 | | 9.1.4 CERCA EN TELA VERDE H = 2,10 M | 187,5 días | lun 10/03/25 | lun 13/04/26 | $ 12.184.862,78 | 71,53% | $ 8.715.552,94 | 99,2804% | 0,000% |
| 122 | | 9.1.5 LETRINA DE 2.0x1.0 | 4 días | vie 10/04/26 | mié 15/04/26 | $ 11.245.281,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 123 | | 9.1.6 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN | 114,75 días | lun 16/06/25 | mar 14/04/26 | $ 13.679.991,78 | 63,71% | $ 8.715.552,94 | 80,6907% | 0,000% |
| 124 | | 9.1.7 RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) | 77 días | mar 5/08/25 | mié 15/04/26 | $ 16.543.514,78 | 52,68% | $ 8.715.552,94 | 81,0327% | 0,000% |
| 125 | | **9.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **95,25 días** | **lun 4/08/25** | **jue 7/05/26** | **$ 79.363.370,34** | **18,33%** | **$ 14.545.681,09** | **24,3180%** | **0,000%** |
| 126 | | 9.2.1 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN SECO DE 2 - 4 m MANUAL | 82 días | lun 4/08/25 | lun 20/04/26 | $ 22.134.441,78 | 36,30% | $ 8.034.650,37 | 41,4414% | 0,000% |
| 127 | | 9.2.2 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | 85 días | mar 19/08/25 | jue 7/05/26 | $ 48.398.626,78 | 13,45% | $ 6.511.030,73 | 20,9237% | 0,000% |
| 128 | | 9.2.3 RELLENO EN GRAVA | 5 días | jue 6/11/25 | lun 13/04/26 | $ 8.830.301,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 129 | | **9.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **94,25 días** | **lun 4/08/25** | **mié 6/05/26** | **$ 216.111.666,24** | **27,64%** | **$ 59.727.854,94** | **53,4551%** | **0,000%** |
| 130 | | 9.3.1 CONCRETO CICLOPEO | 94,25 días | lun 4/08/25 | mié 6/05/26 | $ 16.183.146,78 | 50,28% | $ 8.136.354,80 | 54,3098% | 0,000% |
| 131 | | 9.3.2 ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI | 7,15 días | mié 6/08/25 | vie 15/08/25 | $ 14.021.164,78 | 62,16% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 132 | | 9.3.3 VIGAS DE FUNDACIÓN ENLACE ZAPATAS CONCRETO 3000 PSI | 70,75 días | jue 28/08/25 | mar 28/04/26 | $ 16.272.376,78 | 53,56% | $ 8.715.552,94 | 74,6529% | 0,000% |
| 133 | | 9.3.4 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI | 57,5 días | vie 5/09/25 | lun 20/04/26 | $ 18.090.914,78 | 41,63% | $ 7.530.543,55 | 67,6415% | 0,000% |
| 134 | | 9.3.5 VIGAS EN CONCRETO 3000 PSI | 53,88 días | jue 18/09/25 | mar 28/04/26 | $ 41.003.111,78 | 15,64% | $ 6.413.331,41 | 34,5320% | 0,000% |
| 135 | | 9.3.6 CONCRETO DIQUE DE CONTENCIÓN Y FOSO DE VERTIMIENTO DE ACEITE | 52,25 días | mié 24/09/25 | lun 4/05/26 | $ 42.216.659,78 | 14,82% | $ 6.258.508,76 | 31,3967% | 0,000% |
| 136 | | 9.3.7 CÁMARAS DE INSPECCIÓN TRAMPAS DE GRASAS - INCLUYE ACERO DE REFUERZO | 7 días | mié 5/11/25 | mar 14/04/26 | $ 11.527.828,78 | 54,81% | $ 6.318.775,88 | 83,4080% | 0,000% |
| 137 | | 9.3.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO FIGURADO 60000 PSI | 85 días | mar 5/08/25 | vie 24/04/26 | $ 56.796.462,78 | 13,45% | $ 7.639.234,66 | 55,1070% | 0,000% |
| 138 | | **9.4 ESTRUCTURAS METALICAS** | **13 días** | **vie 10/04/26** | **lun 27/04/26** | **$ 71.579.520,56** | **0,00%** | **$ 0,00** | **0,0000%** | **0,000%** |
| 139 | | 9.4.3 MALLA ESLABONADA C.12 MARCO EN ÁNGULO Y TUBO PERIMETRAL AGUAS NEGRAS 2" e = 2.7 mm | 13 días | vie 10/04/26 | lun 27/04/26 | $ 37.464.551,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 140 | | 9.4.4 PUERTA MALLA ESLABONADA C.12 MARCO EN ÁNGULO Y TUBO PERIMETRAL AGUAS NEGRAS 2" e = 2.7 mm | 9 días | vie 10/04/26 | mar 21/04/26 | $ 34.114.968,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 141 | | **9.5 MAMPOSTERIA** | **41 días** | **jue 2/10/25** | **lun 27/04/26** | **$ 32.462.802,56** | **26,85%** | **$ 8.715.552,94** | **34,0504%** | **0,000%** |
| 142 | | 9.5.2 MURO EN BLOQUE No.5 | 39 días | jue 2/10/25 | jue 23/04/26 | $ 12.039.632,78 | 72,39% | $ 8.715.552,94 | 91,8109% | 0,000% |
| 143 | | 9.5.3 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | 2 días | vie 24/04/26 | lun 27/04/26 | $ 20.423.169,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 144 | | **9.7 TUBERIAS Y DUCTOS DE DESAGÜE AGUAS LLUVIAS** | **36,75 días** | **mar 28/10/25** | **vie 15/05/26** | **$ 64.606.203,68** | **17,32%** | **$ 11.188.117,42** | **33,8209%** | **0,000%** |
| 145 | | 9.7.2 REJILLA PISO 0.5 M | 10 días | vie 10/04/26 | mié 22/04/26 | $ 9.416.255,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 146 | | 9.7.3 TUBERIA NOVAFORT DE 4" | 3 días | mié 15/04/26 | vie 17/04/26 | $ 9.531.923,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 147 | | 9.7.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE 6"X4" | 3 días | mar 5/05/26 | jue 7/05/26 | $ 8.980.925,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 148 | | 9.7.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" | 10 días | lun 4/05/26 | vie 15/05/26 | $ 10.392.584,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 149 | | 9.7.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION 0.60X0.60M | 23 días | mié 29/10/25 | mar 28/04/26 | $ 8.942.366,78 | 34,96% | $ 3.126.230,95 | 50,4144% | 0,000% |
| 150 | | 9.7.7 TUBERIA REDONDA EN ACERO AL CARBON CON COSTURA DIAMETRO 2" NORMA ASTM A36, GRADO B | 9 días | mar 28/10/25 | sáb 8/11/25 | $ 17.342.146,78 | 46,49% | $ 8.061.886,47 | 100,0000% | 0,000% |
| 151 | | **9.8 TANQUES DE ALMACENAMIENTO** | **8 días** | **vie 10/04/26** | **lun 20/04/26** | **$ 75.189.419,78** | **0,00%** | **$ 0,00** | **0,0000%** | **0,000%** |
| 152 | | 9.8.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE VERTICAL EN ACERO AL CARBON PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD DE 3336 GALONES | 8 días | vie 10/04/26 | lun 20/04/26 | $ 75.189.419,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 153 | | **9.9 TRANSPORTE - BOLSA MONTO AGOTABLE** | **201,88 días** | **vie 14/03/25** | **jue 7/05/26** | **$ 846.735.935,94** | **0,92%** | **$ 7.787.333,06** | **71,8234%** | **0,000%** |
| 154 | | 9.9.1 TRANSPORTE DE MATERIALES EN TRACTOMULA DESDE CALI - BUENAVENTURA, BUENAVENTURA - NUQUÍ Y NUQUÍ HASTA LA ZONA DEL PROYECTO (INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE) | 201,88 días | vie 14/03/25 | jue 7/05/26 | $ 846.735.935,94 | 0,92% | $ 7.787.333,06 | 71,8234% | 0,000% |
| 155 | | **10. NO PREVISTOS APROBADOS** | **152,88 días** | **mar 3/06/25** | **jue 21/05/26** | **$ 1.206.855.310,24** | **10,83%** | **$ 130.733.294,10** | **26,7422%** | **0,000%** |
| 156 | | 10.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA NC-RA2-711 - SUSPENSIÓN CON CRUCETA DE 1500 MM RED COMPACTA | 70 días | mar 3/06/25 | mar 2/09/25 | $ 23.305.214,78 | 37,40% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 157 | | 10.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA NC-RA2-7411 - TERMINAL CON CRUCETA DE 1500 MM RED COMPACTA | 128 días | mar 3/06/25 | vie 17/04/26 | $ 19.671.223,78 | 44,31% | $ 8.715.552,94 | 69,0089% | 0,000% |
| 158 | | 10.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA NC-RA2-737 - RETENCIÓN CON CRUCETA DE 1500 MM RED COMPACTA | 17,25 días | mar 3/06/25 | mié 25/06/25 | $ 15.773.820,78 | 55,25% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 159 | | 10.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA NC-RA2-725 - ÁNGULO AISLADOR PIN DOBLE RED OMPACTA | 31 días | mar 3/06/25 | lun 14/07/25 | $ 11.644.558,78 | 74,85% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 160 | | 10.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPACIADOR POLIGONAL POLIMÉRICO 15KV CABLE CUBIERTO | 84 días | mar 3/06/25 | vie 19/09/25 | $ 63.159.199,78 | 13,80% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 161 | | 10.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXION Y PROTECCION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO | 87 días | mar 3/06/25 | mar 23/09/25 | $ 31.234.448,78 | 27,90% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 162 | | 10.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA NC-RA2-040 - AISLADERO TRIFÁSICO | 127 días | mar 3/06/25 | jue 16/04/26 | $ 29.670.367,78 | 29,37% | $ 8.715.552,94 | 81,7256% | 0,000% |
| 163 | | 10.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTES VERTICALES LINEA DE MT | 10 días | mar 3/06/25 | sáb 14/06/25 | $ 9.025.912,78 | 96,56% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 164 | | 10.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45 KVA | 28 días | mar 3/06/25 | mié 9/07/25 | $ 25.284.276,78 | 34,47% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 165 | | 10.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETE EN Y RED PRIMARIA | 87 días | mar 3/06/25 | mar 23/09/25 | $ 13.451.568,78 | 64,79% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 166 | | 10.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETE POSTE A POSTE | 47 días | mar 3/06/25 | vie 1/08/25 | $ 11.076.361,78 | 78,69% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 167 | | 10.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN MEDIA TENSIÓN | 84 días | mar 3/06/25 | vie 19/09/25 | $ 18.554.320,78 | 46,97% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 168 | | 10.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSIÓN | 46 días | mar 3/06/25 | jue 31/07/25 | $ 21.019.492,78 | 41,46% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 169 | | 10.14 DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE USUARIOS A CAJA DE DISTRIBUCIÓN | 46 días | mar 3/06/25 | jue 31/07/25 | $ 29.513.916,78 | 29,53% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 170 | | 10.15 REUBICACIÓN DE POSTES DE MT EXISTENTES | 68 días | mar 3/06/25 | sáb 30/08/25 | $ 11.873.769,78 | 73,40% | $ 8.715.552,94 | 100,0000% | 0,000% |
| 171 | | 10.16 DICTAMEN DE INSPECCION RETIE LINEA DE MT | 12 días | mié 6/05/26 | jue 21/06/26 | $ 18.393.568,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 172 | | 10.17 DICTAMEN DE INSPECCION RETIE LINEA DE BT | 12 días | mié 6/05/26 | jue 21/06/26 | $ 9.644.141,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 173 | | 10.18 DICTAMEN DE INSPECCION RETIE TRONSFOMMADOR TIPO POSTE | 12 días | mié 6/05/26 | jue 21/06/26 | $ 12.138.000,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 174 | | 10.19 DICTAMEN DE INSPECCION RETIE SUBESTACION 225 KVA TIPO PATIO | 12 días | mié 6/05/26 | jue 21/06/26 | $ 4.165.000,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 175 | | 10.20 DICTAMEN DE INSPECCION RETIE DE GENERACION | 12 días | mié 6/05/26 | jue 21/06/26 | $ 9.520.000,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 176 | | 10.21 DESMONTE, TENDIDO Y TENSIONADO DE RED TRIFÁSICA EN LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN ARUSÍ - PARTADÓ - TERMALES | 9 días | vie 10/04/26 | mar 21/04/26 | $ 18.171.380,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 177 | | 10.22 APLOMADO DE POSTES EN LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN ARUSÍ - PARTADÓ - TERMALES. | 9 días | vie 10/04/26 | mar 21/04/26 | $ 14.247.492,38 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 178 | | 10.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN EN CABLE 3X3 N°1/0 (F) + 3X1 N°1/0 (N), THHN/THWN; 90 C | 5 días | mié 22/04/26 | mar 28/04/26 | $ 23.579.571,38 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 179 | | 10.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 3N°2 (F) + 1N°2 (N) + 1N°4 (T), THHN/THWN; 90 °C, EN TUBERÍA PVC DE 1 1/2". INCLUYE ACCESORIOS | 5 días | vie 10/04/26 | jue 16/04/26 | $ 47.123.377,28 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 180 | | 10.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 3N°4 (F) +1 N°4 (N) + 1N°8 (T), THHN/THWN; 90 °C, EN TUBERÍA PVC DE 1/ 1/2". INCLUYE ACCESORIOS. | 3 días | vie 10/04/26 | mar 14/04/26 | $ 10.367.194,48 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 181 | | 10.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE OJO PARA CABLE 1/0 AWG. | 5 días | vie 10/04/26 | jue 16/04/26 | $ 9.187.587,98 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 182 | | 10.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE COBRE DESNUDO BLANDO N° 2 AWG. | 3 días | mar 14/04/26 | jue 16/04/26 | $ 11.696.572,07 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 183 | | 10.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE COBRE DESNUDO BLANDO N° 6 AWG. | 3 días | mar 14/04/26 | jue 16/04/26 | $ 11.210.891,48 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 184 | | 10.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE OJO PARA CABLE 6 AWG | 3 días | mar 14/04/26 | jue 16/04/26 | $ 8.994.326,68 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 185 | | 10.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA EQUIPOTENCIAL 3/16"x1"x 25 CM | 1 día | sáb 11/04/26 | lun 13/04/26 | $ 9.298.805,98 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |

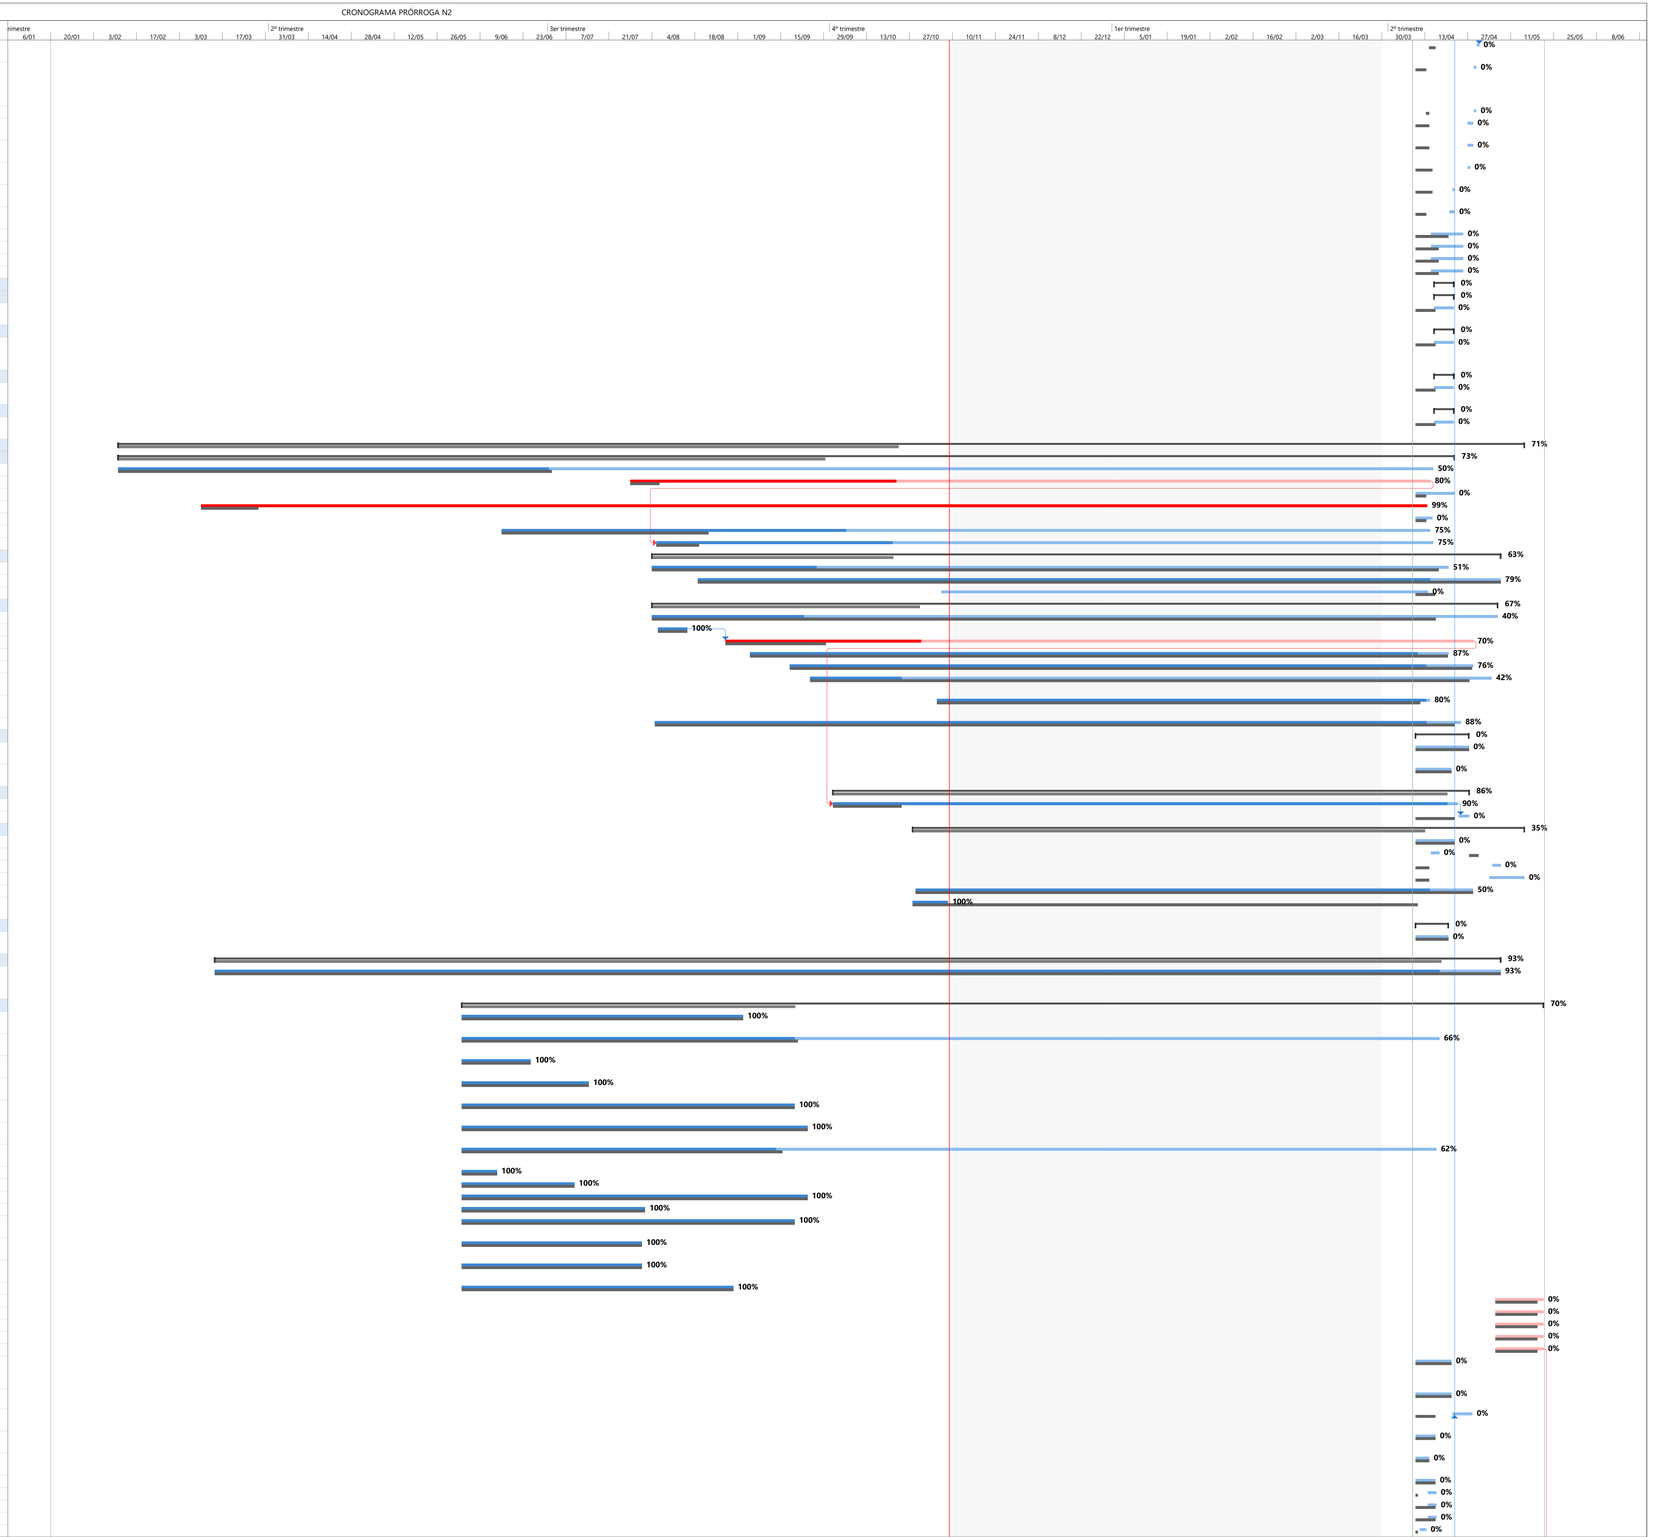


Tareas críticas | Progreso de tarea crítica | División | Tarea manual | solo fin | Línea base | Hito de línea base | Progreso del resumen | Resumen manual | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo
División crítica | Tarea | Progreso de tarea | solo el comienzo | solo duración | División de la línea base | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Fecha límite

# CRONOGRAMA PRÓRROGA N2

| Id | Modo de | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo | % Planeado | Costo planeado a la fecha (CPTP) | %Ejecutado (Actividades) | %Retraso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | | 10.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELÉCTRICO CON CAJA MULTISERVICIOS (TOMA DOBLE, TOMA BIFÁSICO Y TOMA TRIFÁSICO). | 1 día | lun 13/04/26 | lun 13/04/26 | $ 9.364.416,98 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 187 | | 10.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA COMPACTA DE REMONTE DE BARRAS AISLADAS A GAS SF6 24 KV - 630A | 5 días | vie 10/04/26 | jue 16/04/26 | $ 38.280.308,18 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 188 | | 10.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 1N°10 (F) +1 N°10 (N) + 1N°12 (T), THHN/THWN; 90 °C, EN TUBERÍA IMC 3/4" . INCLUYE ACCESORIOS | 15 días | mar 14/04/26 | lun 4/05/26 | $ 20.887.492,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 189 | | 10.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2N°12 (F) + 1N°12 (T), THHN/THWN; 90 °C, EN TUBERÍA IMC 3/4" . INCLUYE ACCESORIOS | 7 días | mar 14/04/26 | mié 22/04/26 | $ 10.248.128,88 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 190 | | 10.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 3N°10 (F) +1 N°10 (N) + 1N°12 (T), THHN/THWN; 90 C, EN TUBERÍA PVC 1". INCLUYE ACCESORIOS | 3 días | mar 14/04/26 | jue 16/04/26 | $ 10.015.509,68 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 191 | | 10.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL TRIFÁSICA DE 60A, CON SU GABINETE | 1 día | mié 15/04/26 | mié 15/04/26 | $ 17.305.985,28 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 192 | | 10.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APANTALLAMINETO CON CINCO PUNTAS DE CAPTACIÓN FRANKLIN DE 1M | 2 días | jue 16/04/26 | vie 17/04/26 | $ 16.548.795,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 193 | | 10.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN BANDEJA TIPO ESCALERA GALVANIZADA DE 8 CM DE ALTURA. ESPACIAMIENTO ENTRE PELDAÑOS: 15 CM, MANGUERA CORAZA Y CONECTOR RECTO CORAZA LIQUID | 2 días | lun 20/04/26 | mar 21/04/26 | $ 16.086.201,08 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 194 | | 10.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 3N°6 (F) + 1N°8 (T), THHN/THWN; 90 °C, EN TUBERÍA PVC DE 1". INCLUYE ACCESORIOS. | 1 día | vie 17/04/26 | vie 17/04/26 | $ 9.468.343,98 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 195 | | 10.40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2N°12 (F) + 1N°12 (T), THHN/THWN; 90 °C, EN TUBERÍA PVC 3/4". INCLUYE ACCESORIOS | 3 días | mar 14/04/26 | jue 16/04/26 | $ 11.940.396,28 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 196 | | 10.41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL BLINDADO CALIBRE 8 X 14, EN TUBERÍA PVC 1 1/2". INCLUYE ACCESORIOS. | 3 días | mié 22/04/26 | vie 24/04/26 | $ 12.178.849,58 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 197 | | 10.42 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL BLINDADO CALIBRE 8 X 14, EN BANDEJA PORTACABLE. | 3 días | mié 22/04/26 | vie 24/04/26 | $ 11.799.314,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 198 | | 10.43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE ENCAUCHETADO THHN/THWN 2 x 12, EN BANDEJA PORTACABLES, PARA PRECALENTADORES DE CAMISA DE LOS GENERADORES. | 2 días | jue 23/04/26 | vie 24/04/26 | $ 10.694.961,90 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 199 | | 10.44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELETROBOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA DE 3/4 HP, 120 VOLTIOS. | 1 día | mar 28/04/26 | mar 28/04/26 | $ 9.540.491,48 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 200 | | 10.45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN ACERO AL CARBÓN SCH 40. DIÁMETRO 1/2", GRADO B PARA COMBUSTIBLE. | 8 días | lun 20/04/26 | mié 29/04/26 | $ 10.490.719,58 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 201 | | 10.46 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN ACERO AL CARBÓN SCH 40. DIÁMETRO 3/4", GRADO B PARA COMBUSTIBLE. | 8 días | lun 20/04/26 | mié 29/04/26 | $ 10.375.530,63 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 202 | | 10.47 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN ACERO AL CARBÓN SCH 40. DIÁMETRO 1", GRADO B PARA COMBUSTIBLE. | 8 días | lun 20/04/26 | mié 29/04/26 | $ 10.355.091,98 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 203 | | 10.48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN DE TUBERÍA DE COMBUSTIBLE A TANQUES, GRUPOS ELECTRÓGENOS Y CAJAS DE INSPECCIÓN. | 8 días | lun 20/04/26 | mié 29/04/26 | $ 26.583.417,38 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 204 | | 10.49 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVCS- NOVAFORT DE 6" | 2 días | jue 16/04/26 | vie 17/04/26 | $ 10.192.074,26 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 205 | | 10.50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA TERMO ACÚSTICA CRESTA ALTA UPVC 2,5 MM | 6 días | lun 27/04/26 | mié 6/05/26 | $ 25.629.176,24 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 206 | | 10.51 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA CALADO DE 15X20X20. | 20 días | vie 10/04/26 | mié 6/05/26 | $ 22.678.283,39 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 207 | | 10.52 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO DIMENSIONES 15X20X40 | 20 días | vie 10/04/26 | mié 6/05/26 | $ 26.909.250,91 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 208 | | 10.53 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 1.000 LTS EN POLIETILENO | 2 días | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | $ 9.441.095,66 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 209 | | 10.54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTES EN MADERA TIPO ESTRUCTURAL REDONDO (TRUNTAGO) DIMENSION 5 M | 6 días | vie 10/04/26 | vie 17/04/26 | $ 24.764.551,38 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 210 | | 10.55 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA VENTILACIÓN INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS. | 3 días | mié 6/05/26 | sáb 9/05/26 | $ 33.826.837,88 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 211 | | 10.56 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE 2.03 M X 0.7 M EN MARCO MADERA FINA Y NAVE EN MADERA ENTAMBORADA , INCLUYE CERRADURA EN ACERO INOXIDABLE SATINADO Y ACCESORIOS | 2 días | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | $ 10.532.499,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 212 | | 10.57 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA EN CONCRETO DE 0.76M X 0.98M SEGÚN NORMA EPM NC-RS4-003 PARA REGISTRO ELÉCTRICO | 7 días | mar 21/04/26 | mié 29/04/26 | $ 16.931.443,78 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 213 | | 10.58 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERAS PARA CUBIERTA EN MADERA ESTRUCTURAL CHOIBÁ DE 2 1/2" X 6"x 6 M | 8 días | vie 17/04/26 | lun 27/04/26 | $ 44.775.928,62 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 214 | | 10.59 LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000PSI-0,1 M DE ESPESOR | 4 días | vie 10/04/26 | mié 15/04/26 | $ 64.810.135,91 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 215 | | 10.60 ACOMETIDA HIDRÁULICA, INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS HASTA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y EL TANQUE ELEVADO. | 4 días | mié 29/04/26 | mar 5/05/26 | $ 10.475.000,16 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 216 | | 10.61 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO FALSO EN SUPER BOARD DE 1/2", INCLUYE PERFILES DE ALUMINIO | 4 días | mar 5/05/26 | vie 8/05/26 | $ 13.141.662,63 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 217 | | 10.62 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL DE 0,40 X 0,20 M EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, INCLUYE GANCHO DE FIJACIÓN DE 1/2". | 2 días | mié 6/05/26 | vie 8/05/26 | $ 14.435.886,16 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 218 | | 10.63 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA EN LÁMINA TIPO ALFAJOR, INCLUYE MARCO EN ÁNGULO DE 0,9 M DE ANCHO. | 3 días | mié 22/04/26 | vie 24/04/26 | $ 15.497.648,38 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 219 | | 10.64 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN CONCRETO DE 1,0 M X 1,0 M. | 2 días | mié 22/04/26 | jue 23/04/26 | $ 9.761.271,18 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 220 | | 10.65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍA SANITARIA PVCS – NOVAFORT DE 6". | 2 días | jue 16/04/26 | vie 17/04/26 | $ 8.833.562,28 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 221 | | 10.66 ANDÉN EN CONCRETO DE 3000 PSI CON ESPESOR DE 0,07 M. | 2 días | lun 13/04/26 | mar 14/04/26 | $ 15.599.236,96 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 222 | | 10.67 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA COMPACTA DE REMONTE DE BARRAS AISLADAS EN AIRE DE 17,5 KV. | 1 día | sáb 18/04/26 | lun 20/04/26 | $ 14.459.444,28 | 0,00% | $ 0,00 | 0,0000% | 0,000% |
| 223 | | **FIN** | **0 días** | **jue 21/05/26** | **jue 21/05/26** | **$ 0,00** | **0,00%** | **$ 0,00** | **0,0000%** | **0** |

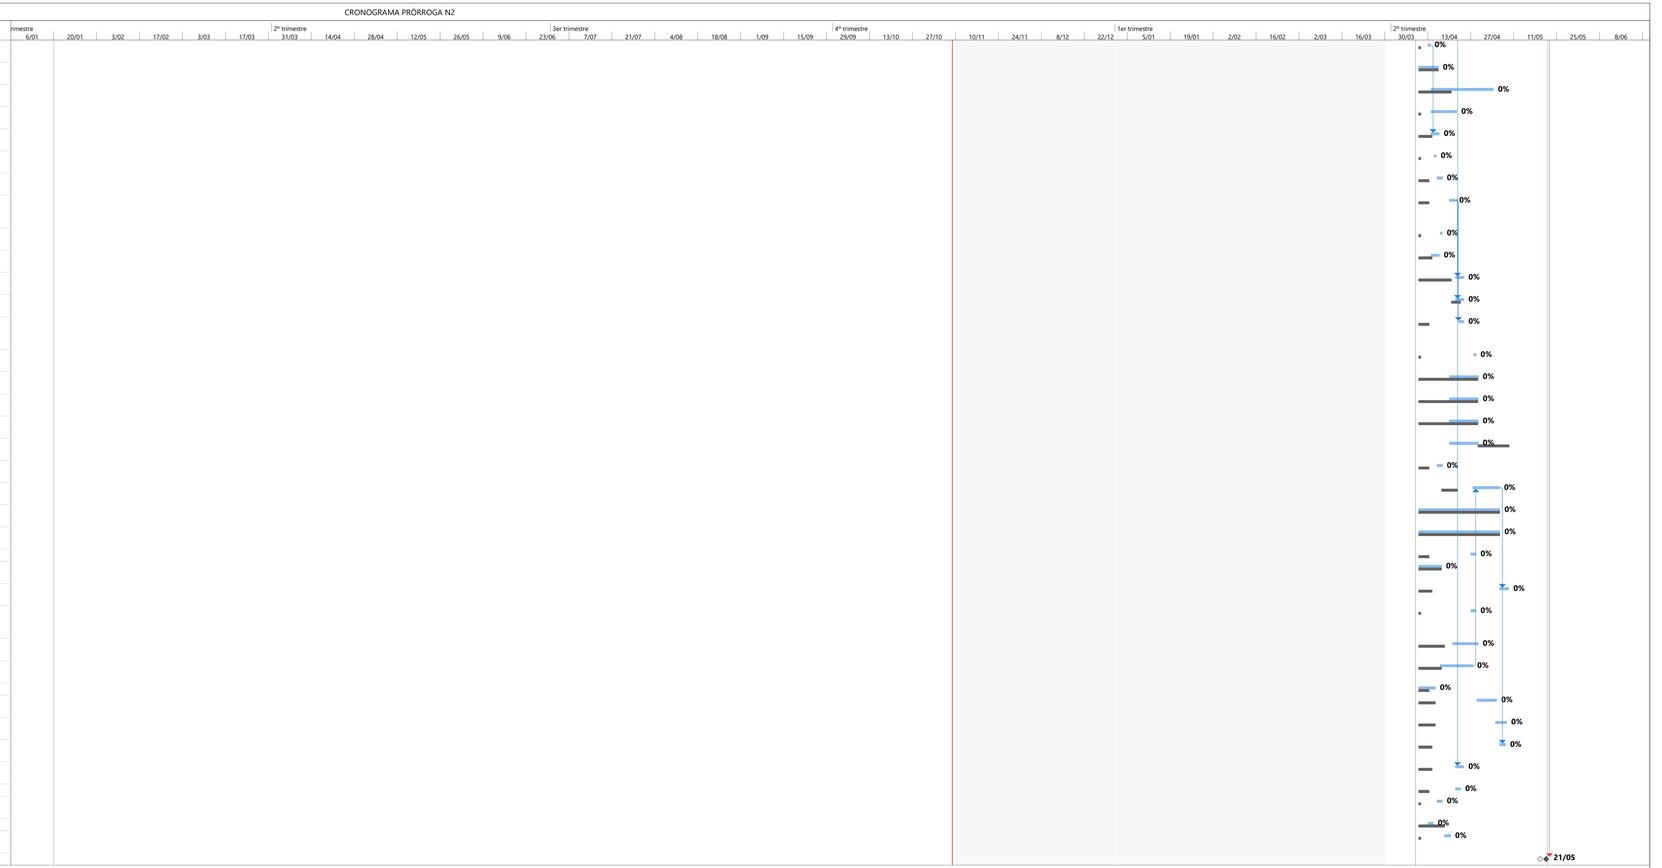


**FIRMA:**_____
**DARWIN VALENCIA MURILLO**
**R.L. PRODYM-ESP S.A.S.**

**FIRMA:**_____
**JAMES MARTINEZ G.**
**R.L. PROINGES S.A.S.**

Tareas críticas · División crítica · Tarea · Progreso de tarea crítica · Progreso de tarea · División · Tarea manual · solo el comienzo · solo fin · solo duración · Línea base · División de la línea base · Hito de línea base · Hito · Progreso del resumen · Resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Fecha límite

Cámara de Comercio del Chocó
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**
Fecha de expedición: 07/05/2026 - 11:32:51 AM

Recibo No.: 0001485438 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vonjciVnLdBRZkic

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

## NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: PRODYM E.S.P. SAS

Sigla: No reportó

Nit: 900318353-6

Domicilio principal: QUIBDO, CHOCO, COLOMBIA

## MATRÍCULA

Matrícula No.: 29-040863-12
Fecha de matrícula: 16 de Octubre de 2009
Último año renovado: 2026
Fecha de renovación: 31 de Marzo de 2026
Grupo NIIF: GRUPO II.

## UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 4 26 104 Edificio Timbali apto 502.
Municipio: QUIBDO, CHOCO, COLOMBIA
Correo electrónico: facturacionprodymsas@gmail.com
info@prodym.com.co
Teléfono comercial 1: 3104010525
Teléfono comercial 2: 3127768641
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 4 26 104 Edificio Timbali apto 502.
Municipio: QUIBDO, CHOCO, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: facturacionprodymsas@gmail.com
info@prodym.com.co
Teléfono para notificación 1: 3104010525
Teléfono para notificación 2: 3127768641
Teléfono para notificación 3: No reportó

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

La persona jurídica PRODYM E.S.P. SAS SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

**CONSTITUCIÓN**

Que por Documento Privado de octubre 02 de 2009, del Accionista, inscrito en esta Cámara de Comercio en octubre 16 de 2009, con el No. 3658 del Libor I, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificadas denominada: PRODYM SAS

**REFORMAS ESPECIALES**

Acta No. 002, del 14 de octubre de 2011, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de noviembre de 2011, con el No. el No. 4551 del Libro IX, mediante la cual entre otras reformas la sociedad cambia su razón social por la de: PRODYM E.S.P. SAS

**TERMINO DE DURACIÓN**

Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

La sociedad tendrá como objeto principal la prestación de Servicios Públicos Domiciliarios, Diseño, Construcción, Consultoría y Suministros en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecánica y Civil. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

**CAPITAL**

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

| QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES: | | NRO. ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|---|---|---|---|
| AUTORIZADO | $300,000,000.00 | 30,000 | $10,000.00 |
| SUSCRITO | $300,000,000.00 | 30,000 | $10,000.00 |
| PAGADO | $300,000,000.00 | 30,000 | $10,000.00 |

## REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año por la asamblea general de accionistas.

## FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantia de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

## NOMBRAMIENTOS

## REPRESENTANTES LEGALES

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

Por Documento Privado del 2 de octubre de 2009, del Accionista, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de octubre de 2009, con el No. 3658 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| REPRESENTANTE LEGAL | DARWIN VALENCIA MURILLO | 71.779.865 |

## REVISORES FISCALES

Por Acta No. 001 DE 2026 del 22 de enero de 2026, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de febrero de 2026 con el No. 18810 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|---|
| REVISOR FISCAL | EDWIN MAURICIO MARTINEZ RICARD | C.C. 11.805.820<br>TP. 128804-T |

## REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCION |
|---|---|
| Acta del 16/03/2011 de Accionista | 4351 del 24/06/2011 del L. IX |
| Acta No.002 del 14/10/2011 de Asamblea | 4551 del 16/11/2011 del L. IX |
| Acta No.001 del 21/01/2012 de Asamblea | 4895 del 28/02/2012 del L. IX |

## RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Choco, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos,

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4220
Actividad secundaria código CIIU: 7112
Otras actividades código CIIU: 4290, 4663

## ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

| | |
|---|---|
| Nombre: | PRODYM S.A.S. |
| Matrícula No.: | 29-041108-02 |
| Fecha de Matrícula: | 16 de Octubre de 2009 |
| Ultimo año renovado: | 2026 |
| Categoría: | Establecimiento-Principal |
| Dirección: | Carrera 4 26 104 Edificio Timbali apto 502. |
| Municipio: | QUIBDO, CHOCO, COLOMBIA |

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

PROPIEDAD.

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es pequeña.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $3,420,144,992.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4220

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

De conformidad con el artículo 12 del decreto 2150 de 1995 la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio del Chocó, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio del Chocó. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, de manera ilimitada durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a http://www.camarachoco.org.co y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento.

Cámara de Comercio del Chocó
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**
Fecha de expedición: 07/05/2026 - 11:32:51 AM

Recibo No.: 0001485438 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: vonjciVnLdBRZkic

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a http://virtuales.camaramedellin.com.co/quibdo/e-cer/ y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

EDUARDO HENRY RIVAS
SECRETARIO

| enterritorio<br>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. | SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN Y NOVEDADES CONTRACTUALES | CÓDIGO | F-PR-48 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 03 |
| | | VIGENCIA | 2025-10-07 |
| | GESTION DE PROVEEDORES | CLASIFICACION | IP |

SUBGERENCIA: DESARROLLO DE PROYECTOS

GERENCIA O GRUPO DE TRABAJO: DESARROLLO DE PROYECTOS 3

GERENCIA DE CONVENIO O CONTRATO DE LINEA DE NEGOCIO: CONVENIO 212080

| | | | TIPO DE NOVEDAD | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. CONTRATO | CONTRATISTA | TIPOLOGIA | MODIFICACIÒN | ADICIÒN | PRÒRROGA | SUSPENSION | REINICIO | TERMINACIÒN ANTICIPADA | CESIÓN | REDUCCIÓN | OBSERVACIONES |
| 2240298 | PRODYM ESP S.A.S. | Obra | | | | 1 Mes Desde 19-05-2026 hasta 19-06-2026 | | | | | Se solicita la aprobación de la novedad de suspensión en atención a los trámites de certificación RETIE que se adelantan frente a la empresa certificadora para el trámite final de energización de las redes eléctricas del proyecto de Nuquí, proceso de demanda un tiempo considerable. |
| 2240297 | PROINGES S.A.S. | Interventoría | | | | 1 Mes Desde 19-05-2026 hasta 19-06-2026 | | | | | Se solicita la aprobación de la novedad de suspensión en atención a los trámites de certificación RETIE que se adelantan frente a la empresa certificadora para el trámite final de energización de las redes eléctricas del proyecto de Nuquí, proceso de demanda un tiempo considerable. |
| | | | | | | | | | | | |

**ÁLVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO**
Gerente Grupo de Desarrollo de Proyectos 3

**ÓSCAR JAVIER PÉREZ RUIZ**
Subgerente de Desarrollo de Proyectos

**ESMERALDA MOLINA GÓMEZ**
Presidencia

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 19 de mayo de 2026, a las 22:25:40, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 71779865 |
| Código de Verificación | 71779865260519222540 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 296255177

PIB
22:27:54



Bogotá DC, 19 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DARWIN VALENCIA MURILLO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 71779865:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 19/05/2026 10:32:08 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **71779865** y Nombre: **DARWIN VALENCIA MURILLO.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **140459109** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**
Que siendo las 10:23:46 PM horas del 19/05/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **71779865**
Apellidos y Nombres: **VALENCIA MURILLO DARWIN**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.
