ACTA No. GEE - 541			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ASESORIA DE SEGUIMIENTO A LA PUESTA EN MARCHA EMPRESA FE CRIA, LEVANTE, CEBA Y COMERCIALIZACION DE CERDOS EN PIE EL RENACER			
CIUDAD Y FECHA:	Maicao, 30 de abril de 2026	**HORA INICIO:** 03:00 P.M.	**HORA FIN:** 4:00 PM.
LUGAR Y/O ENLACE:	https://goo.su/UUtWvky	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira, Centro Agroempresarial y acuícola	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Saludo de Bienvenida 2. Seguimiento a la validación de avances de la puesta en marcha			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Realizar seguimiento puesta en marcha CRIA, LEVANTE, CEBA Y COMERCIALIZACION DE CERDOS EN PIE EL RENACER			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Inicio y desarrollo de la reunión

Participantes

En la reunión participó la emprendedora Angelina Rincón Cuartas y el orientador de Emprendimiento Rafael José García Cujia, Por parte del Centro de Desarrollo Empresarial del SENA.

Desarrollo de la Agenda

Aspectos Generales:

Datos de la emprendedora:

Nombre: Angelina Rincón Cuartas

E – mail: angeelina69@gmail.com

Teléfono: 3206581702

Estado civil: Casada

Población: ninguna

Dirección residencia: Finca la Buena Vista Vereda el Mamey

Ciudad: Dibulla

Se da inicio al seguimiento, dando saludo de bienvenida, a la emprendedora Angelina Rincón Cuartas quien es la Líder de la asociación, con la cual se desarrolla el siguiente seguimiento:

se realiza visita mensual con el fin de verificar las condiciones de las operaciones, el estado de avance en la ejecución del plan de negocio y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría.

1. Lugar de Operaciones

Se confirma que la emprendedora cargó en la plataforma los documentos de sana posesión, contrato de arrendamiento y certificado de uso de suelo, los cuales fueron revisados y aprobados, validando la idoneidad del lugar para el desarrollo de las actividades productivas.

2. Acondicionamiento del Lugar

A pesar de haber recibido desembolsos de la fiducia, se evidencia que las adecuaciones de las cochineras y demás infraestructura productiva aún no se han ejecutado. Este retraso constituye un impedimento crítico para la aprobación de los demás componentes del proyecto y refleja falta de compromiso por parte de los emprendedores. Se recomienda dar inicio inmediato a las construcciones y adecuaciones pendientes.

3. Maquinaria y Equipos

La adquisición de maquinaria y equipos se encuentra condicionada a la finalización de las adecuaciones del lugar de operaciones. El retraso en infraestructura impide avanzar en este componente, generando un cuello de botella en la ejecución del plan de inversión.

4. Semovientes

La compra de los cerdos no ha podido gestionarse debido a la falta de adecuaciones en las cochineras. Este atraso limita la posibilidad de iniciar la fase productiva y afecta directamente la proyección de producción.

5. Insumos

La adquisición de insumos está igualmente detenida, dado que depende de la compra de semovientes y de la operatividad inicial del proyecto.

6. Publicidad y Mercadeo

La emprendedora mantiene el compromiso de realizar siete (7) eventos de mercadeo, pero su ejecución está supeditada al inicio de la producción.

7. Capacidad de Producción y Comercialización

El proyecto tiene proyectada una producción de 136 cerdos en pie y ventas por $122.400.000 en el primer año. Sin embargo, los atrasos en infraestructura y semovientes impiden avanzar hacia estas metas.

8. Información Tributaria y Contable
No se registra información tributaria ni contable, dado que la empresa aún no ha iniciado operaciones.

9. Generación de Empleo
El compromiso de generar tres empleos directos (administrador, líder de producción y operario agropecuario) no se ha cumplido, debido al atraso en la puesta en marcha.

10. Ejecución Presupuestal y Contrapartidas
Aunque se han recibido desembolsos de la fiducia, no se evidencia ejecución presupuestal efectiva ni aportes por contrapartidas, lo que refleja falta de avance en la gestión financiera del proyecto.

11. Asistencia Técnica
Se recomienda el acompañamiento urgente de un especialista en manejo de porcinos, que oriente la correcta implementación técnica y apoye la emprendedora en la superación de los retrasos actuales.

CONCLUSIONES

De acuerdo con el seguimiento realizado, se concluye que el proyecto presenta un atraso total en la fase de adecuación de infraestructura productiva, a pesar de contar con recursos desembolsados por la fiducia. La falta de ejecución de las construcciones de las cochineras y demás adecuaciones refleja un bajo nivel de compromiso por parte de los emprendedores, lo cual constituye el principal impedimento para avanzar hacia la adquisición de semovientes, insumos y equipos, y en consecuencia, para iniciar la operación productiva.

Este retraso genera un riesgo alto de incumplimiento del cronograma establecido, afectando la ejecución de los recursos, los indicadores de gestión y la viabilidad del proyecto.

Se recomienda actuar con ligereza y compromiso responsable, ejecutando de manera inmediata las adecuaciones pendientes, con el fin de habilitar las siguientes fases del proyecto y garantizar la operatividad idónea de la iniciativa empresarial. Solo mediante una gestión diligente y organizada será posible alcanzar las metas de producción, comercialización y generación de empleo previstas, asegurando la consolidación y éxito del proyecto al finalizar el periodo de ejecución.


ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	**FECHA**	**RESPONSABLE**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Terminar adecuaciones urgentemente	10 de mayo del 2026	Angelina Rincón Cuartas	Participación virtual

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	**DEPENDENCIA/ EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Angelina Rincón Cuartas	Empresaria	SI	No hay observaciones	Participación Virtual
Rafael José García	Orientador de Emprendimiento – SBDC Maicao	SI	No hay observaciones	Participación Virtual

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Evidencias Fotográficas:
Seguimiento Empresa Puesta En Marcha F.E. Cría, levante, ceba y comercialización de cerdos en pie el renacer

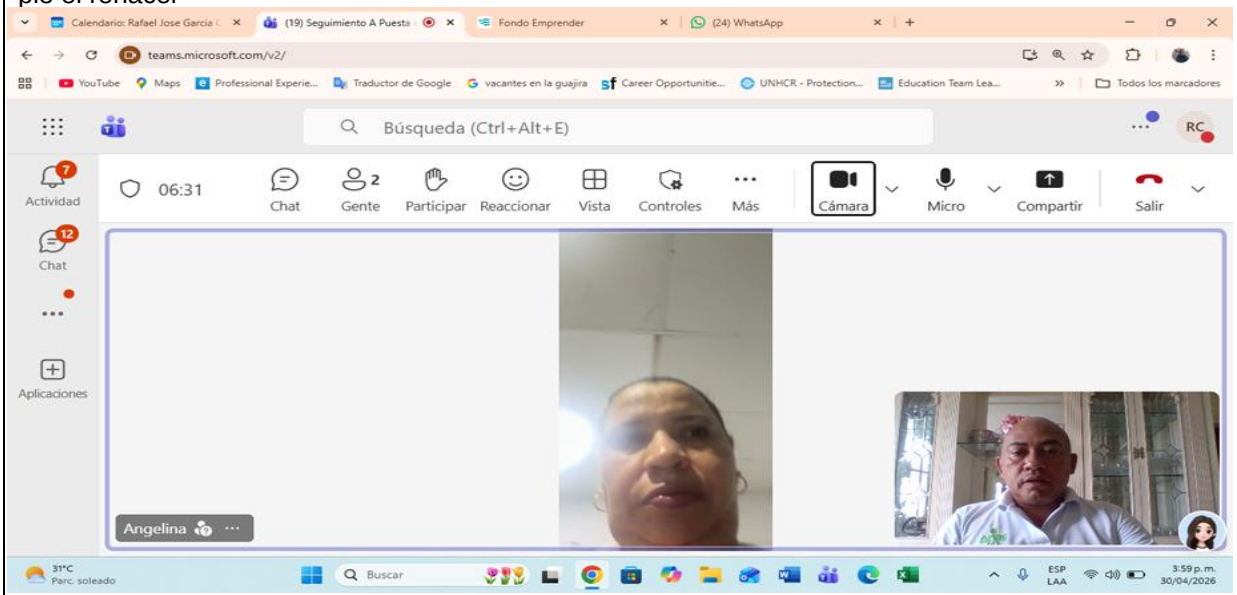

Fuente: García, R. (30 de abril 2026) Emprendimiento Regional Guajira. SENA
