

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**Coronograma por frentes**	**174 días**	**jue 4/12/25**	**mar 4/08/26**	
2		**Frente 1**	**174 días**	**jue 4/12/25**	**mar 4/08/26**	
3		**Carrera 43B**	**174 días**	**jue 4/12/25**	**mar 4/08/26**	
4		PRELIMINARES	40 días	jue 4/12/25	mié 28/01/26	
5		DEMOLICIONES Y RETIROS	44 días	jue 1/01/26	mar 3/03/26	4CC+20 días
6		EXCAVACIONES, LLENOS Y OTROS	52 días	jue 22/01/26	vie 3/04/26	5CC+15 días
7		FILTROS	13 días	mié 8/04/26	vie 24/04/26	6FC+2 días
8		PAVIMENTOS	17 días	mié 8/07/26	jue 30/07/26	9CC+1 día
9		CONCRETOS Y PREFABRICADOS	22 días	vie 5/06/26	lun 6/07/26	
10		PAISAJISMO Y URBANISMO	106 días	lun 15/12/25	lun 11/05/26	
11		ACERO DE REFUERZO	9 días	lun 25/05/26	jue 4/06/26	9CC-9 días
12		REDES DE ALCANTARILLADO	12 días	mar 31/03/26	mié 15/04/26	6CC+48 días
13		SEÑALIZACIÓN VIAL	2 días	lun 3/08/26	mar 4/08/26	8FC+1 día
14		REDES ELÉCTRICAS	46 días	jue 19/03/26	jue 21/05/26	
15		**Frente 2**	**109 días**	**lun 5/01/26**	**jue 4/06/26**	
16		**Bolivia**	**109 días**	**lun 5/01/26**	**jue 4/06/26**	
17		PRELIMINARES	39 días	lun 5/01/26	jue 26/02/26	
18		DEMOLICIONES Y RETIROS	43 días	lun 2/02/26	mié 1/04/26	17CC+20 días
19		EXCAVACIONES, LLENOS Y OTROS	53 días	lun 23/02/26	mié 6/05/26	18CC+15 días
20		PAVIMENTOS	4 días	lun 20/04/26	jue 23/04/26	6FC+10 días
21		CONCRETOS Y PREFABRICADOS	52 días	lun 23/03/26	mar 2/06/26	
22		PAISAJISMO Y URBANISMO	40 días	mar 27/01/26	lun 23/03/26	21CC-39 días
23		ACERO DE REFUERZO	4 días	vie 17/04/26	mié 22/04/26	21CC-7 días
24		REDES DE ALCANTARILLADO	8 días	vie 1/05/26	mar 12/05/26	23CC+10 días
25		REDES ELÉCTRICAS	71 días	jue 19/02/26	jue 28/05/26	21CC-35 días
26		REDES DE SEMÁFOROS	10 días	vie 22/05/26	jue 4/06/26	25FC-5 días
27		**Echeverry**	**109 días**	**lun 5/01/26**	**jue 4/06/26**	
28		PRELIMINARES	39 días	lun 5/01/26	jue 26/02/26	
29		DEMOLICIONES Y RETIROS	43 días	lun 2/02/26	mié 1/04/26	17CC+20 días
30		EXCAVACIONES, LLENOS Y OTROS	53 días	lun 23/02/26	mié 6/05/26	18CC+15 días
31		PAVIMENTOS	4 días	lun 20/04/26	jue 23/04/26	6FC+10 días
32		CONCRETOS Y PREFABRICADOS	14 días	jue 9/04/26	mar 28/04/26	8CC-7 días
33		PAISAJISMO Y URBANISMO	40 días	vie 13/02/26	jue 9/04/26	21CC-39 días
34		ACERO DE REFUERZO	4 días	mar 31/03/26	vie 3/04/26	21CC-7 días



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
35		REDES DE ALCANTARILLADO	20 días	vie 1/05/26	jue 28/05/26	23CC+10 días
36		REDES ELÉCTRICAS	59 días	lun 2/02/26	jue 23/04/26	21CC-35 días
37		REDES DE SEMÁFOROS	10 días	vie 22/05/26	jue 4/06/26	25FC-5 días
38		**Frentes 3 intervenciones Leves**	**83 días**	**mar 10/02/26**	**jue 4/06/26**	
39		**Versalles**	**36 días**	**mié 25/03/26**	**mié 13/05/26**	
40		PRELIMINARES	5 días	mié 25/03/26	mar 31/03/26	
41		DEMOLICIONES Y RETIROS	3 días	lun 30/03/26	mié 1/04/26	40CC+3 días
42		PAVIMENTOS	7 días	mié 29/04/26	jue 7/05/26	
43		SEÑALIZACIÓN VIAL	31 días	mié 1/04/26	mié 13/05/26	40
44		**Los Balsos**	**15 días**	**vie 15/05/26**	**jue 4/06/26**	
45		PRELIMINARES	6 días	mar 19/05/26	mar 26/05/26	
46		DEMOLICIONES Y RETIROS	7 días	vie 22/05/26	lun 1/06/26	45CC+3 días
47		EXCAVACIONES, LLENOS Y OTROS	7 días	mié 27/05/26	jue 4/06/26	46CC+3 días
48		CONCRETOS Y PREFABRICADOS	5 días	vie 29/05/26	jue 4/06/26	47CC+2 días
49		SEÑALIZACIÓN VIAL	11 días	jue 21/05/26	jue 4/06/26	45CC+2 días
50		**Av Nutivara**	**79 días**	**lun 16/02/26**	**jue 4/06/26**	
51		PRELIMINARES	8 días	lun 16/02/26	mié 25/02/26	
52		DEMOLICIONES Y RETIROS	7 días	lun 23/02/26	mar 3/03/26	51CC+5 días
53		EXCAVACIONES, LLENOS Y OTROS	7 días	mar 3/03/26	mié 11/03/26	52CC+6 días
54		CONCRETOS Y PREFABRICADOS	13 días	mié 13/05/26	vie 29/05/26	
55		PAISAJISMO Y URBANISMO	4 días	lun 1/06/26	jue 4/06/26	54
56		**Calle 80 con cra 75 y 73**	**77 días**	**mar 10/02/26**	**mié 27/05/26**	
57		PRELIMINARES	8 días	mar 10/02/26	jue 19/02/26	
58		DEMOLICIONES Y RETIROS	33 días	vie 20/02/26	mar 7/04/26	57
59		EXCAVACIONES, LLENOS Y OTROS	11 días	vie 20/03/26	vie 3/04/26	58CC+20 días
60		CONCRETOS Y PREFABRICADOS	17 días	lun 27/04/26	mar 19/05/26	
61		PAISAJISMO Y URBANISMO	6 días	mié 20/05/26	mié 27/05/26	60
62		**Minorista**	**19 días**	**lun 11/05/26**	**jue 4/06/26**	
63		PRELIMINARES	11 días	lun 11/05/26	lun 25/05/26	
64		DEMOLICIONES Y RETIROS	5 días	lun 18/05/26	vie 22/05/26	63CC+5 días
65		EXCAVACIONES, LLENOS Y OTROS	6 días	jue 21/05/26	jue 28/05/26	64CC+3 días
66		CONCRETOS Y PREFABRICADOS	6 días	lun 25/05/26	lun 1/06/26	65CC+2 días
67		REDES ELÉCTRICAS	7 días	mié 27/05/26	jue 4/06/26	65CC+4 días
68		REDES DE SEMÁFOROS	4 días	lun 1/06/26	jue 4/06/26	67CC+3 días

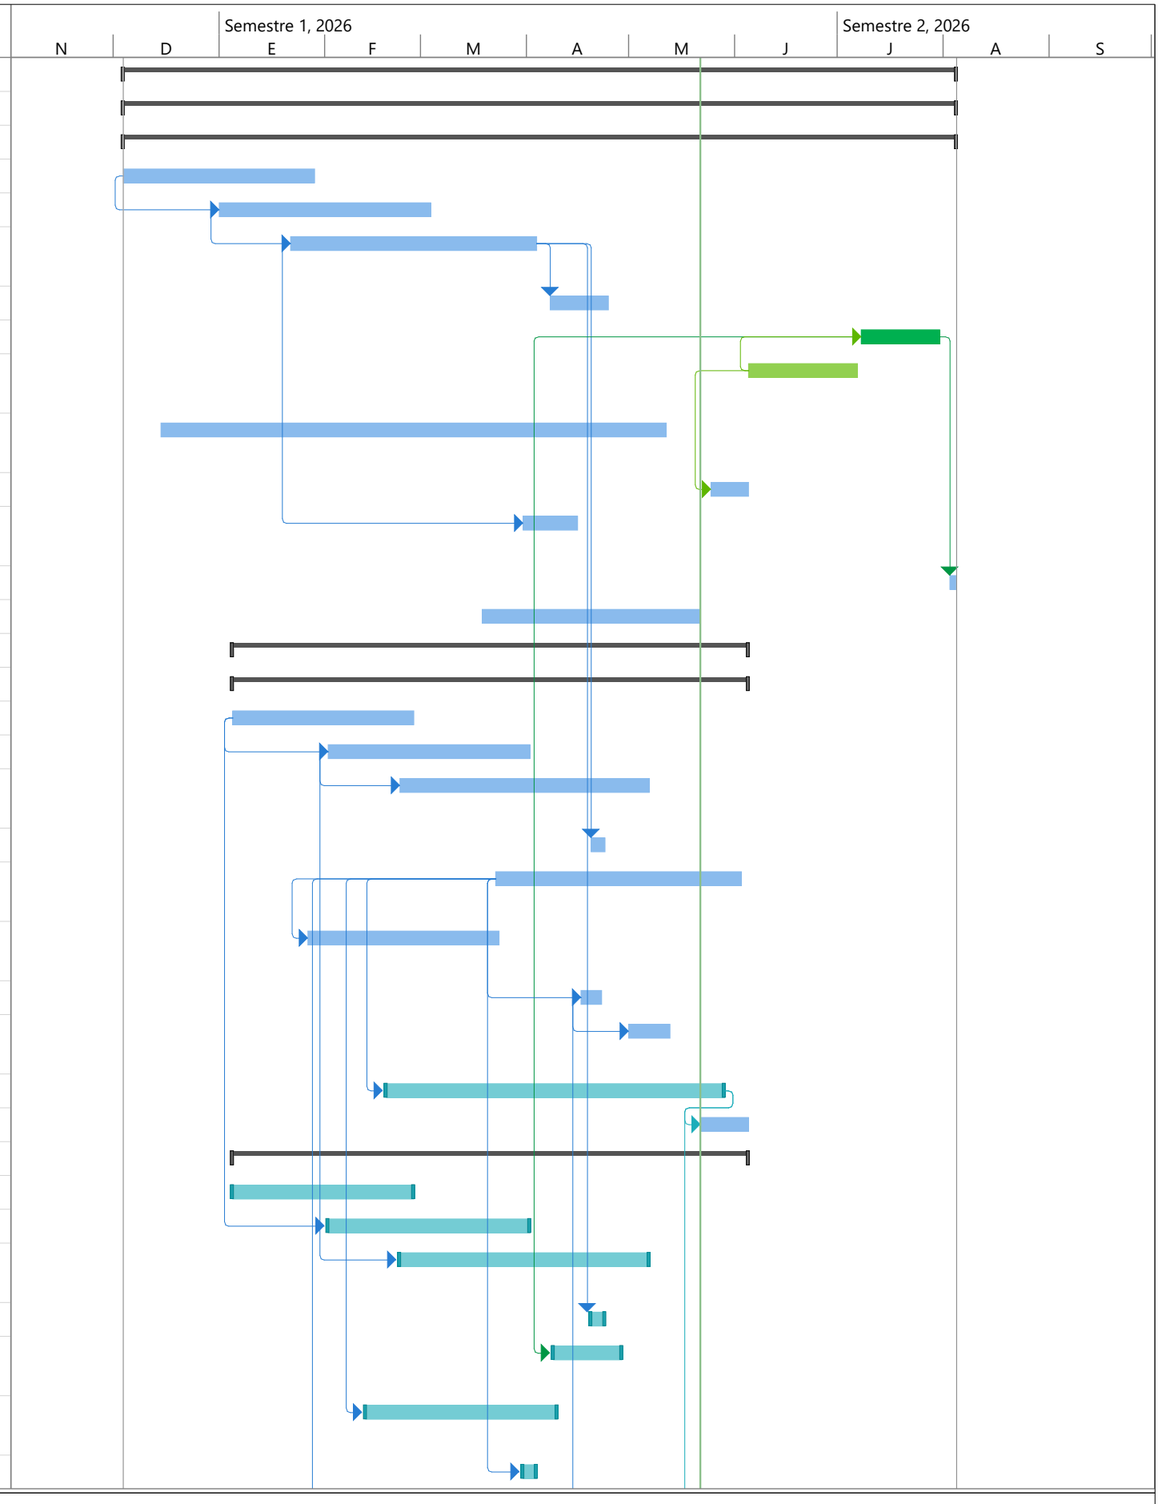

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
69		**Bolivaria**	**17 días**	**lun 11/05/26**	**mar 2/06/26**	
70		PRELIMINARES	5 días	lun 11/05/26	vie 15/05/26	
71		DEMOLICIONES Y RETIROS	5 días	jue 14/05/26	mié 20/05/26	70CC+3 días
72		EXCAVACIONES, LLENOS Y OTROS	5 días	jue 21/05/26	mié 27/05/26	71
73		CONCRETOS Y PREFABRICADOS	6 días	vie 22/05/26	vie 29/05/26	72CC+1 día
74		PAISAJISMO Y URBANISMO	7 días	lun 25/05/26	mar 2/06/26	73CC+1 día

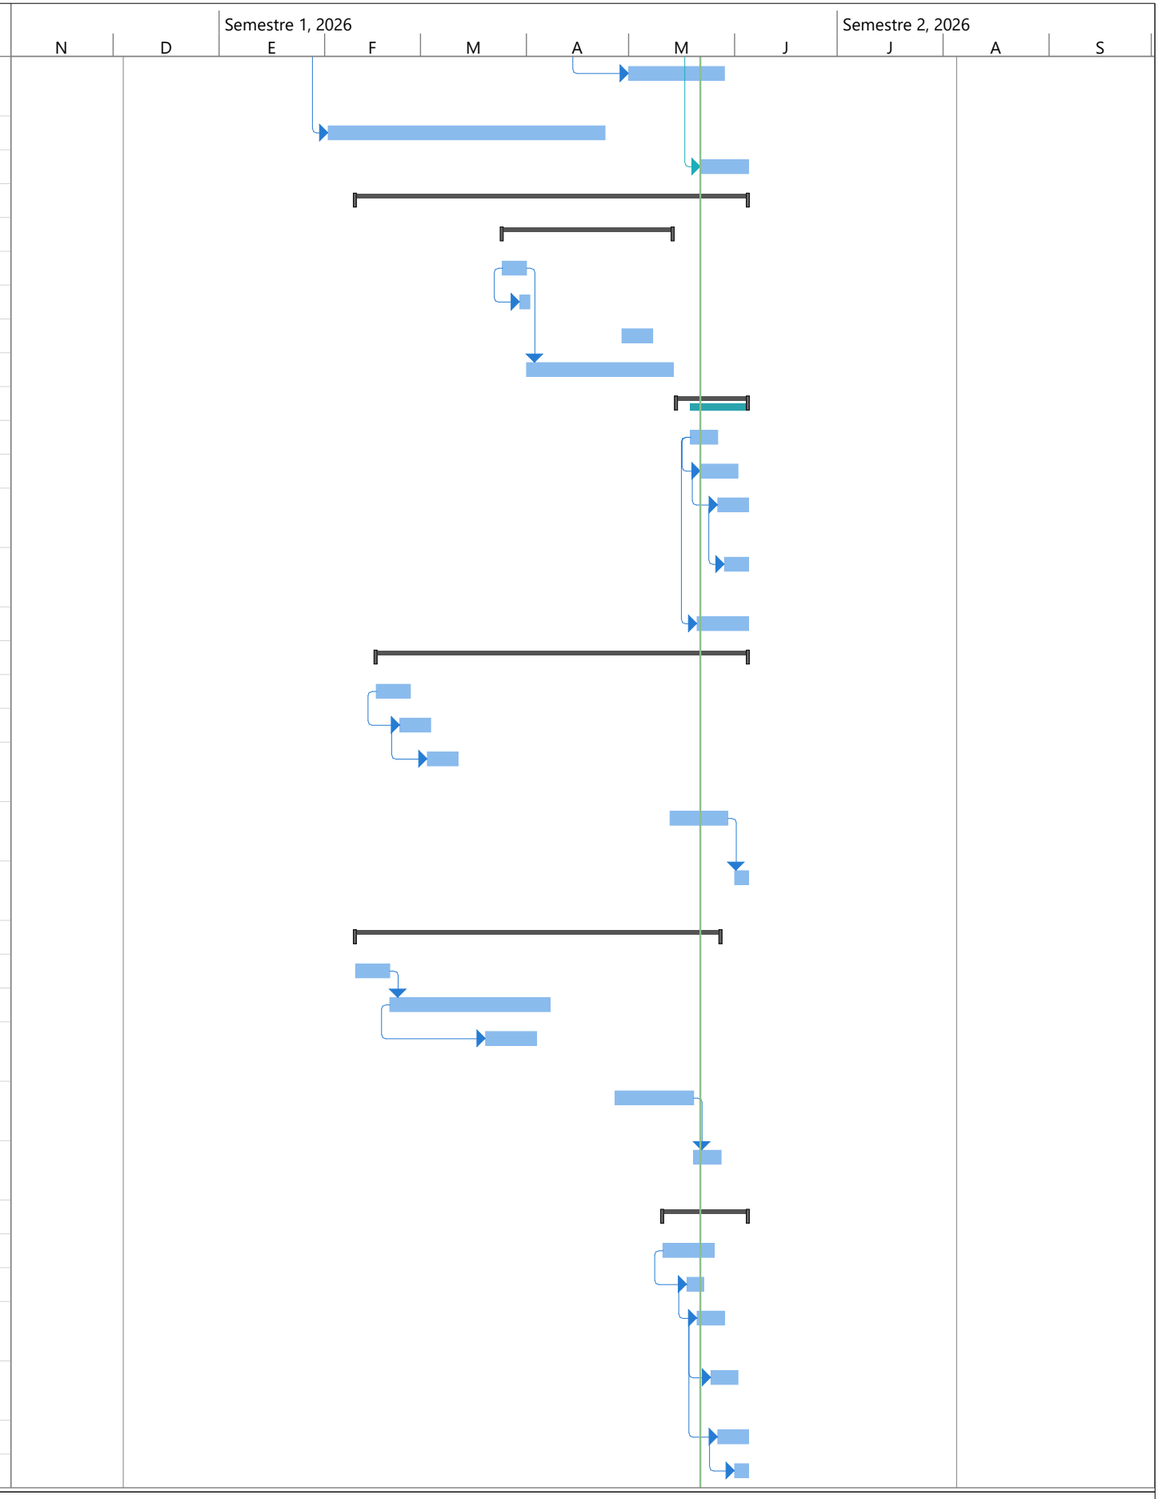
