acuatodos s.a.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

ACTA No. 12 DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	033 DE 24 DE AGOSTO DE 2023	FECHA DE INICIACION:		21/11/2023	ACTA No. 12 DE
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEPARTAMENTO DE CASANARE.	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:		11 MESES	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS
		FECHA SUSPENSION No. 3:		13/12/2024	
		FECHA REINICIACION No. 3:		27/02/2025	
		FECHA PRORROGA No. 1		9/12/2024	
		PLAZO PRORROGA:		5 MESES	
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S - R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN :		19/09/2025	
		VALOR INICIAL :	$	16.840.474.491,00	
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - R/L. LUIS ANDRES LÓPEZ MESA	VALOR ANTICIPO :	$	8.420.237.245,50	FECHA
		VALOR ADICIÓN:		N/A	
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ING. ROBERT ASIS HERNANDEZ CADHAY	VALOR TOTAL:	$	16.840.474.491,00	11/04/2025

B. DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
NP 1	Tubería PVC alcantarillado 6". Suministro e instal.	m	

I. Equipo

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. Materiales

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Tubería alcantarillado PVC 6"	m	1,0000	$ 42.668,00	$ 42.668,00
Lubricante 500 gr	und	0,0100	$ 26.143,00	$ 267,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	$ 42.935,00

III. Transportes

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	$ -

IV. Mano de Obra

MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cuadrilla 8B (Instalaciones)	h	0,1786	$ 25.944,00	$ 4.634,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 4.634,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 47.569,00

V. Costos Indirectos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Administración	%	27,0	$ 47.569,00	$ 12.843,00
Imprevistos	%	2,0	$ 47.569,00	$ 952,00
Utilidad	%	5,0	$ 47.569,00	$ 2.378,00
			SUBTOTAL	$ 16.169,00

VALOR TOTAL UNITARIO $ 63.709,00

Firma:
Nombre: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Cargo: R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
Contratista

C. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: UNION TEMPORAL DELTA 2023
Cargo: R/L LUIS ANDRES LÓPEZ MESA
Interventor

Original: Oficina Jurídica
Copia 1: Interventor
Copia 2: Contratista
Copia 3: Supervisor Proyecto y/o Contrato

acuatodos s.a.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

ACTA No. 12 DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	033 DE 24 DE AGOSTO DE 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	21/11/2023	ACTA No. 12 DE	
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEPARTAMENTO DE CASANARE.	PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	11 MESES	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS	
		FECHA SUSPENSION No. 3:	13/12/2024		
		FECHA REINICIACION No. 3:	27/02/2025		
		FECHA PRORROGA No. 1	9/12/2024		
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S - R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO	PLAZO PRORROGA:	5 MESES		
		NUEVA FECHA TERMINACIÓN :	19/08/2025		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - R/L LUIS ANDRES LOPEZ MESA	VALOR INICIAL :	$ 16.840.474.491,00		
		VALOR ANTICIPO :	$ 8.420.237.245,50	FECHA	
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ING. ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY	VALOR ADICIÓN:	N/A		
		VALOR TOTAL:	$ 16.840.474.491,00	11/04/2025	

B. DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
MP 2	Tubería PVC alcantarillado 8". Suministro e instal.	m	

I. Equipo

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. Materiales

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Tubería alcantarillado PVC 8"	m	1,0000	$ 60.990,00	$ 60.990,00
Lubricante 500 gr	und	0,0187	$ 28.140,00	$ 526,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	$ 61.516,00

III. Transportes

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	$ -

IV. Mano de Obra

MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cuadrilla 0B (Instalaciones)	h	0,2143	$ 25.944,00	$ 5.560,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 5.560,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 67.076,00

V. Costos Indirectos

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Administracion	%	27,0	$ 67.076,00	$ 18.111,00
Imprevistos	%	2,0	$ 67.076,00	$ 1.342,00
Utilidad	%	5,0	$ 67.076,00	$ 3.354,00
			SUBTOTAL	$ 22.807,00

VALOR TOTAL UNITARIO $ 89.883,00

(Firma)
Nombre: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Cargo: R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
Contratista

C. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

(Firma)
Nombre: UNION TEMPORAL DELTA 2023
Cargo: R/L LUIS ANDRES LOPEZ MESA

Chulavita: Oficina Jurídica
Yopal sede: Interventoría
Zona urbana: Constructoras
Tanque elevado: Supervisor Proyecto vía Cravinho

acuatodos S.A.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

ACTA No. 12 DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	003 DE 24 DE AGOSTO DE 2023	FECHA DE INICIACION:	21/11/2023	ACTA No. 12 DE	
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEPARTAMENTO DE CASANARE	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	11 MESES	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS	
		FECHA SUSPENSION No. 3:	13/12/2024		
		FECHA REINICIACION No. 3:	27/02/2025		
		FECHA PRORROGA No. 1	9/12/2024		
		PLAZO PRORROGA:	5 MESES		
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S - R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN :	19/08/2025		
		VALOR INICIAL :	$ 16.840.474.491,00		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - R/L LUIS ANDRES LOPEZ MESA	VALOR ANTICIPO :	$ 8.420.237.245,50	FECHA	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ING. ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY	VALOR TOTAL:	$ 16.840.474.491,00	11/04/2025	

B. DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Nº 3	Kit Silla Yee PVC 8 x 6 (200 x 160 mm), Suministro e instal.	und	

I. Equipo

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. BB	Gbi	HR	$ 2.584,00	1,0000	$ 2.584,00
					$ -
				SUBTOTAL	$ 2.584,00

II. Materiales

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Kit Silla Yee 8"6 (Incl. Hdtros. y Abrazaderas)	und	1,0000	$ 179.889,00	$ 179.889,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	$ 179.889,00

III. Transportes

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	$ -

IV. Mano de Obra

MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cuadrilla BB (Instalaciones)	h	1,0000	$ 25.944,00	$ 25.944,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 25.944,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 208.427,00

V. Costos Indirectos

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Administracion	%	27,5	$ 208.427,00	$ 56.275,00
Imprevistos	%	2,0	$ 208.427,00	$ 4.166,00
Utilidad	%	6,0	$ 208.427,00	$ 13.421,00
			SUBTOTAL	$ 73.862,00

VALOR TOTAL UNITARIO $ 279.292,00

Firma:
Nombre: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NUnd: R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
Contratista

C. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: UNION TEMPORAL DELTA 2023
NUnd: R/L LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Interventor

Elaboró: Diomy Jurado
Vo.Bo. Interventor
Vo.Bo. Supervisor Proyectos Comite

acuatodos s.a.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

ACTA No. 12 DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

DISEÑO Y CONSTRUCCION ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	033 DE 24 DE AGOSTO DE 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	21/11/2023	ACTA No.	12 DE
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEPARTAMENTO DE CASANARE.	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	11 MESES	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS	
		FECHA SUSPENSION No. 3:	13/12/2024		
		FECHA REINICIACION No. 3:	27/02/2025		
		FECHA PRORROGA No. 1	9/12/2024		
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S - R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO	PLAZO PRORROGA:	5 MESES		
		NUEVA FECHA TERMINACIÓN :	19/08/2025		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - R/L LUIS ANDRES LOPEZ MESA	VALOR INICIAL :	$ 16.840.474.491,00		
		VALOR ANTICIPO :	$ 8.420.237.245,50	FECHA	
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ING. ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY	VALOR ADICIÓN:	N/A		
		VALOR TOTAL:	$ 16.840.474.491,00	11/04/2025	

B. DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
nP 4	Relleno en arena lavada aplomada para atraque de la tubería con transporte	m³	

I. Equipo

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA+I	Ilog	HR	$ 4.915,00	0,3810	$ 1.873,00
					$ -
				SUBTOTAL	$ 1.873,00

II. Materiales

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Arena lavada de rio	m³	1,1000	$ 27.345,00	$ 30.079,50
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	$ 30.079,50

III. Transportes

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales (arena, piedra, coman, tierra) - m³	m³	1,0000	$ 227.868,00	$ 227.868,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 227.868,00

IV. Mano de Obra

MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA+I	h	0,3810	$ 48.147,00	$ 18.725,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 18.725,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 278.540,00

V. Costos Indirectos

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Administracion	%	27,0	$ 278.540,00	$ 75.208,00
Imprevistos	%	2,0	$ 278.540,00	$ 5.571,00
Utilidad	%	5,0	$ 278.540,00	$ 13.927,00
			SUBTOTAL	$ 94.704,00

VALOR TOTAL UNITARIO $ 373.244,00

Firma
Nombre SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Rol/Cargo R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
Contratista

C. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Firma
Nombre UNION TEMPORAL DELTA 2023
Rol/Cargo R/L LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Interventor

Original: Oficina Jurídica
Vto. Bueno: Interventor
Vto. Bueno: Coordinador
Vto. Bueno: Supervisor Proyectos vía Contrato

acuatodos s.a.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

ACTA No. 12 DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	003 DE 24 DE AGOSTO DE 2023	FECHA DE INICIACION:	21/11/2023	ACTA No. 12 DE	
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEPARTAMENTO DE CASANARE.	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	11 MESES	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS	
		FECHA SUSPENSIÓN No. 3:	13/12/2024		
		FECHA REINICIACIÓN No. 3:	27/02/2025		
		FECHA PRORROGA No. 1	9/12/2024		
		PLAZO PRORROGA:	5 MESES		
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S - R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN :	19/08/2025		
		VALOR INICIAL :	$ 16.840.474.491,00		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023 - R/L LUIS ANDRES LOPEZ MESA	VALOR ANTICIPO :	$ 8.420.237.245,50	FECHA	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ING. ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY	VALOR TOTAL:	$ 16.840.474.491,00	11/04/2025	

B. DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
N° 5	Pozo de Inspeccion tipico (sin comp incluidos) H=1.0 - 1.5 m Ø 1.20 m	und	

I. Equipo

DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA-2	Gip	HR	$ 3.195,00	9,0000	$ 27.994,00
					$ -
				SUBTOTAL	$ 27.994,00

II. Materiales

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Acero de refuerzo 37000 Psi	kg	41,0600	$ 3.300,00	$ 261.142,00
Acero de refuerzo 60000 Psi	kg	68,5400	$ 6.237,00	$ 433.721,00
Alambre negro No 18 e 17	kg	3,3200	$ 8.388,00	$ 27.842,00
Concreto 2500 Psi ,140 kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)	m³	0,1100	$ 794.073,00	$ 87.348,00
Concreto 4000 Psi 280 kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)	m³	0,8300	$ 946.784,00	$ 791.783,00
Formaleta (1 uso)	m²	0,3767	$ 56.690,00	$ 21.397,00
Geotextil NT 1600 2008	m²	6,9900	$ 8.215,00	$ 57.423,00
Ladrillo tolete comun	und	626,0000	$ 657,00	$ 411.382,00
Mortero Impermeabilizado 1:4 (desperdicio 5%)	m³	0,4000	$ 1.027.335,00	$ 410.934,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 2.463.852,00

III. Transportes

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - I	t	2,8200	$ 98.312,00	$ 277.248,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 277.248,00

IV. Mano de Obra

MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA-2	h	9,0000	$ 31.059,00	$ 279.531,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 279.531,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 3.047.577,00

V. Costos Indirectos

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Administracion	%	27,2	$ 3.047.577,00	$ 922.946,00
Imprevistos	%	2,0	$ 3.047.577,00	$ 60.952,00
Utilidad	%	5,0	$ 3.047.577,00	$ 152.379,00
			SUBTOTAL	$ 1.036.177,00

VALOR TOTAL UNITARIO $ 4.083.754,00

Firma:
Nombre: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Rl/ MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
Cargo: Contratista

C. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: UNION TEMPORAL DELTA 2023
R/L LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Cargo: Interventor

DIGNOS Oficina Asesora
Profesional Universitario
Ejecutivo Contratista
Profesional Universitario Proyecto en Ejecución

acuatodos S.A.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

ACTA No. 12 DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

DISEÑO Y CONSTRUCCION ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	033 DE 24 DE AGOSTO DE 2023	FECHA DE INICIACION:	21/11/2023	ACTA No. 12 DE	
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEPARTAMENTO DE CASANARE.	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	11 MESES	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS	
		FECHA SUSPENSION No. 3:	13/12/2024		
		FECHA REINICIACION No. 3:	27/02/2025		
		FECHA PRORROGA No. 1	9/12/2024		
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S - Rtl. MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO	PLAZO PRORROGA:	5 MESES		
		NUEVA FECHA TERMINACIÓN :	19/08/2025		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - Rtl. LUIS ANDRES LOPEZ MESA	VALOR INICIAL :	$ 16.840.474.491,00		
		VALOR ANTICIPO :	$ 8.420.237.245,50	FECHA	
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ING. ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY	VALOR ADICIÓN:	N/A		
		VALOR TOTAL:	$ 16.840.474.491,00	11/04/2025	

B. DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 6	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=2.0 - 2.5 m Ø 1.20 m	und	

I. Equipo

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VR UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA-2	Eqp	HR	$ 3.106,00	14,0000	$ 43.484,00
					$ -
				SUBTOTAL	$ 43.484,00

II. Materiales

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
Acero de refuerzo 37000 Psi	kg	41,0800	$ 6.960,00	$ 291.142,80
Acero de refuerzo 60000 Psi	kg	75,3800	$ 6.237,00	$ 470.099,80
Alambre negro No 16 o 17	kg	3,4900	$ 8.386,00	$ 29.267,00
Concreto 2000 Psi .140 kg/cm2 (Basico, 5% Desperdicio)	m³	8,1100	$ 794.070,00	$ 87.348,00
Concreto 4000 Psi 280 kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)	m³	1,8200	$ 918.784,00	$ 751.763,00
Formaleta (1 uso)	m²	0,3767	$ 56.830,00	$ 21.397,00
Geotextil No Tejido 2002	m²	12,5800	$ 8.215,00	$ 103.345,00
Ladrillo tolete comun	und	1.126,0000	$ 657,00	$ 741.088,00
Mortero impermeabilizado 1:4 (desperdicio 5%)	m³	0,7280	$ 1.027.936,00	$ 738.681,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 3.206.896,00

III. Transportes

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
Transporte de materiales - I.	t	6,0800	$ 99.312,00	$ 499.425,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 499.425,00

IV. Mano de Obra

MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
Cuadrilla AA-2	h	14,0000	$ 31.066,00	$ 434.924,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 434.924,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 4,182,794,00

V. Costos Indirectos

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
Administracion	%	27,0	$ 4.182.794,00	$ 1.129.354,00
Imprevistos	%	2,0	$ 4.182.794,00	$ 83.656,00
Utilidad	%	5,0	$ 4.182.794,00	$ 209.140,00
			SUBTOTAL	$ 1.422.150,00

VALOR TOTAL UNITARIO $ 5.604.944,00

(Firma)
Nombre: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Rl Legal: Rtl. MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
Contratista

C. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

(Firma)
Nombre: UNION TEMPORAL DELTA 2023
Rl Legal: Rtl. LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Interventor

Original: Oficina Juridica
1 era Copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto vía Cambios

acuatodos S.A.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

ACTA No. 12 DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	035 DE 24 DE AGOSTO DE 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	21/11/2023	ACTA No. 12 DE	
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEPARTAMENTO DE CASANARE.	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	11 MESES	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS	
		FECHA SUSPENSION No. 2:	13/12/2024		
		FECHA REINICIACION No. 2:	27/02/2025		
		FECHA PRORROGA No. 1	5/12/2024		
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S - R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO	PLAZO PRORROGA:	5 MESES		
		NUEVA FECHA TERMINACIÓN :	19/09/2025		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - R/L LUIS ANDRES LOPEZ MESA	VALOR INICIAL :	$ 16.840.474.491,00		
		VALOR ANTICIPO :	$ 8.420.237.245,50	FECHA	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ING. ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY	VALOR TOTAL:	$ 16.840.474.491,00	11/04/2025	

B. DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 7	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=2.5 - 3.0 m Ø 1.20 m	und	

I. Equipo

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA-2	Equ	HR	$ 3.136,00	17,0000	$ 52.992,00
					$ -
				SUBTOTAL	$ 52.992,00

II. Materiales

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Acero de refuerzo 37000 Psi	kg	41,0800	$ 6.360,00	$ 261.142,00
Acero de refuerzo 60000 Psi	kg	78,3700	$ 6.237,00	$ 488.770,00
Alambre negro No 16 o 17	kg	3,8890	$ 9.386,00	$ 36.502,00
Concreto 2500 Psi .140 kg/cm2 (Basico, 5% Desperdicio)	m³	0,1130	$ 784.075,00	$ 67.348,00
Concreto 4000 Psi 280 kgcm2 (Basico, 0% desperdicio)	m³	0,8200	$ 916.784,00	$ 751.763,00
Formaleta (1 uso)	m²	0,3797	$ 98.800,00	$ 37.997,00
Geotextil No Tejido 2000	m²	15,3700	$ 8.215,00	$ 126.268,00
Ladrillo soleta comun	und	1.378,9000	$ 667,00	$ 919.948,00
Mortero Impermeabilizado 1:4 (Desperdicio 5%)	m³	0,8800	$ 1.027.335,00	$ 904.255,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 3.584.791,00

III. Transportes

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - 1	1	6,2000	$ 98.312,00	$ 609.534,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 609.534,00

IV. Mano de Obra

MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA-2	h	17,0000	$ 31.349,00	$ 529.933,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 529.933,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 4.775.120,00

V. Costos Indirectos

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Administracion	%	27,0	$ 4.775.120,00	$ 1.289.502,00
Imprevistos	%	2,0	$ 4.775.120,00	$ 95.502,00
Utilidad	%	5,0	$ 4.775.120,00	$ 238.806,00
			SUBTOTAL	$ 1.623.868,00

VALOR TOTAL UNITARIO $ 6.400.000,00

Firma
Nombre: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Cargo: R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
Contratista

C. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Firma
Nombre: UNION TEMPORAL DELTA 2023
Cargo: R/L LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Interventor

Original: Oficina Juridica
Archivo: Ingeniería
Duplicado: Contratista
Archivo: Supervisor Proyecto en Campo

acuatodos s.a.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre departamento responsable del proyecto o contrato (representante legal para documentación)

ACTA No. 12 DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	033 DE 24 DE AGOSTO DE 2023	FECHA DE INICIACION:	21/11/2023	ACTA No. 12 DE	
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEPARTAMENTO DE CASANARE.	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	11 MESES	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS	
		FECHA SUSPENSION No. 3:	13/12/2024		
		FECHA REINICIACION No. 3:	27/03/2025		
		FECHA PRORROGA No. 1	5/12/2024		
		PLAZO PRORROGA:	5 MESES		
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S - R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN :	19/08/2025		
		VALOR INICIAL :	$ 16.840.474.491,00		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - R/L LUIS ANDRES LOPEZ MESA	VALOR ANTICIPO :	$ 8.420.237.245,50	FECHA	
		VALOR ADICIÓN	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ING. ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY	VALOR TOTAL:	$ 16.840.474.491,00	11/04/2025	

B. DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
N° 8	Pozo de Inspecion recto (sin cono truncado) H=3.5 - 4.0 m Ø 1.20 m	und	

I. Equipo

DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. AA-2	Eqs	mR	$ 3.106,00	23,0000	$ 71.438,00
					$ -
				SUBTOTAL	$ 71.438,00

II. Materiales

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Acero de refuerzo 37000 Psi	kg	41,0600	$ 6.360,00	$ 261.142,00
Acero de refuerzo 60000 Psi	kg	87,0100	$ 6.237,00	$ 542.661,00
Alambre negro No 18 o 17	kg	3,8400	$ 8.388,00	$ 32.202,00
Concreto 3000 Psi (140 kg/cm2) (Basico, 5% Desperdicio)	m³	0,1100	$ 794.073,00	$ 87.348,00
Concreto 4000 Psi 280 kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)	m³	0,8200	$ 916.794,00	$ 751.763,00
Formaleta (1 uso)	m²	0,3767	$ 56.680,00	$ 21.357,00
Geotextil No Tejido 2030	m²	20,9700	$ 8.215,00	$ 172.269,00
Ladrillo tolete comun	und	1.479,3060	$ 857,00	$ 1.234.903,00
Mortero impermeabilizado 1:4 (desperdicio 5%)	m³	1,2100	$ 1.027.335,00	$ 1.243.075,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 4.346.369,00

III. Transportes

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales - 1	t	8,4600	$ 98.312,00	$ 831.720,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 831.720,00

IV. Mano de Obra

MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA-2	h	23,0000	$ 31.059,00	$ 714.357,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 714.357,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 5.963.886,00

V. Costos Indirectos

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Administracion	%	27,0	$ 5.963.886,00	$ 1.610.250,00
Imprevistos	%	2,0	$ 5.963.886,00	$ 119.278,00
Utilidad	%	5,0	$ 5.963.886,00	$ 298.196,00
			SUBTOTAL	$ 2.027.724,00

VALOR TOTAL UNITARIO $ 7.991.610,00

(Firma)
(Nombre) SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
(Cargo) R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
Contratista

C. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

(Firma)
(Nombre) UNION TEMPORAL DELTA 2023
(Cargo) R/L LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Interventoria

Destinos: Oficina asesora
Veh-calle Interventor
Arc-copia Contratista
Sob-copia Supervisor Proyecto-ve Cassino

acuatodos s.a. e.s.p.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

ACTA No. 12 DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	033 DE 24 DE AGOSTO DE 2023	FECHA DE INICIACION:		21/11/2023	ACTA No. 12 DE
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEPARTAMENTO DE CASANARE.	PLAZO DE EJECUCION INICIAL:		11 MESES	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS
		FECHA SUSPENSION No. 3:		13/12/2024	
		FECHA REINICIACION No. 3:		27/02/2025	
		FECHA PRORROGA No. 1		5/12/2024	
		PLAZO PRORROGA:		5 MESES	
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S - R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN :		19/09/2025	
		VALOR INICIAL :	$	16.840.474.491,00	
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - R/L LUIS ANDRES LOPEZ MESA	VALOR ANTICIPO :	$	5.420.237.245,50	FECHA
		VALOR ADICIÓN:		N/A	
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ING. ROBERT ASIS HERNANDEZ CADHAY	VALOR TOTAL:	$	16.840.474.491,00	11/04/2025

B. DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
NP 9	Caja de inspección 60 x 60	und	

I. Equipo

DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
Herramienta menor 15% M.O. AA	Equ	HR	$ 2.292,00	4,9080	$ 10.807,80
					$ -
				SUBTOTAL	$ 10.807,80

II. Materiales

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cemento gris	kg	82,8300	$ 540,00	$ 44.728,00
Acero de refuerzo 60000 Psi	kg	10,9600	$ 6.237,00	$ 68.367,00
Alambre negro No 18 o 17	kg	0,1100	$ 8.386,00	$ 922,00
Agua para obra	l	41,7500	$ 100,00	$ 4.175,00
Arena lavada de río	m³	0,1700	$ 27.340,00	$ 4.648,00
Triturado de 1/2" - 3/4"	m³	0,1300	$ 59.302,00	$ 7.709,00
Ladrillo tolete comun	und	101,0000	$ 687,30	$ 69.427,00
Ciudo de río clasificado T.m. 6"	m³	0,0400	$ 40.460,00	$ 1.618,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 196.712,80

III. Transportes

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Transporte de material (triturado) - m³	m³	0,1300	$ 287.489,00	$ 37.374,00
Transporte de materiales - t	t	0,4972	$ 98.312,00	$ 48.881,00
Transporte de materiales (arena, piedra, cemun, tierra) - m³	m³	0,2100	$ 227.888,00	$ 47.852,00
			SUBTOTAL	$ 134.087,00

IV. Mano de Obra

MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cuadrilla AA	h	4,9080	$ 22.316,00	$ 109.555,08
				$ -
			SUBTOTAL	$ 109.555,08

TOTAL COSTO DIRECTO $ 448.661,00

V. Costos Indirectos

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Administracion	%	27,0	$ 448.661,00	$ 121.138,50
Imprevistos	%	2,0	$ 448.661,00	$ 8.973,00
Utilidad	%	5,0	$ 448.661,00	$ 22.433,00
			SUBTOTAL	$ 152.544,50

VALOR TOTAL UNITARIO $ 601.205,50

Firma:
Nombre: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Cargo: R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
Contratista

C. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: UNION TEMPORAL DELTA 2023
Cargo: R/L LUIS ANDRES LOPEZ MESA
INTERVENTOR

Original: Oficina Jurídica
Una copia: Interventor
Una copia: Contratista
Una copia: Supervisor Proceso via Correo

209

acuatodos S.A.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

ACTA No. 12 DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	033 DE 24 DE AGOSTO DE 2023	FECHA DE INICIACION:	21/11/2023	ACTA No.	12 DE
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEPARTAMENTO DE CASANARE.	PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	11 MESES	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS	
		FECHA SUSPENSION No. 3:	13/10/2024		
		FECHA REINICIACION No. 3:	27/02/2025		
		FECHA PRORROGA No. 1	9/12/2024		
		PLAZO PRORROGA:	5 MESES		
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S - R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN :	19/08/2025		
		VALOR INICIAL :	$ 16.840.474.491,00		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - R/L LUIS ANDRES LOPEZ MESA	VALOR ANTICIPO :	$ 8.420.237.245,50	FECHA	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ING. ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY	VALOR TOTAL:	$ 16.840.474.491,00	11/04/2025	

B. DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
NP 10	Tubería PF+UAD de 1/2". Suministro e instal.	m	

I. Equipo

DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
Herramienta menor 5% M.O. EE	Eqi	HR	$ 12.972,00	0,0430	$ 558,00
					$ -
				SUBTOTAL	$ 558,00

II. Materiales

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Tubería PF+UAD 1/2"	m	1,0000	$ 3.104,00	$ 3.104,00
Unión PF+UAD 1/2"	und	0,0110	$ 4.525,00	$ 50,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	$ 3.154,00

III. Transportes

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	$ -

IV. Mano de Obra

MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cuadrilla EE (Instalaciones)	h	0,040	$ 28.944,00	$ 1.116,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 1.116,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 4.828,00

V. Costos Indirectos

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Administracion	%	27,0	$ 4.828,00	$ 1.304,00
Imprevistos	%	2,0	$ 4.828,00	$ 97,00
Utilidad	%	5,0	$ 4.828,00	$ 241,00
			SUBTOTAL	$ 1.642,00

VALOR TOTAL UNITARIO $ 6.470,00

Firma:
Nombre: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Cargo: R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
Contratista

C. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: UNION TEMPORAL DELTA 2023
Cargo: R/L LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Interventor

Original: Oficina Jurídica
1 en copia: Interventoría
2 en copias: Contratista
1 en copia: Supervisor. Proceso via Correo

acuatodos S.A.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre departamento, Municipio o Distrito o nombre (representante legal para Nacionalizados)

ACTA No. 12 DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	033 DE 24 DE AGOSTO DE 2023	FECHA DE INICIACION:		21/11/2023	ACTA No. 12 DE	
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEPARTAMENTO DE CASANARE.	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:		11 MESES	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS	
		FECHA SUSPENSIÓN No. 3:		13/12/2024		
		FECHA REINICIACION No. 3:		27/02/2025		
		FECHA PRORROGA No. 1		9/12/2024		
		PLAZO PRORROGA:		5 MESES		
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S - R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN :		19/06/2025		
		VALOR INICIAL :	$	16.840.474.491,00		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - R/L LUIS ANDRES LOPEZ MESA	VALOR ANTICIPO :	$	8.420.237.245,50	FECHA	
		VALOR ADICIÓN:		N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ING. ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY	VALOR TOTAL:	$	16.840.474.491,00	11/04/2025	

B. DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
NP 11	Tapon solcado PVC 2" Suministro e Instal	und	

I. Equipo

DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	V UNITARIO
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. Materiales

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 780 gr	und	0,0036	$ 58.420,00	$ 214,00
Soldadura liquida PVC 1/4 gl	und	0,0030	$ 123.170,00	$ 370,00
Tapon solidico presion PVC 2"	und	1,0000	$ 7.477,00	$ 7.477,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	$ 8.061,00

III. Transportes

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	$ -

IV. Mano de Obra

MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cuadrilla B3 (instalaciones)	h	0,0667	$ 26.946,00	$ 1.730,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 1.730,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 9.791,00

V. Costos Indirectos

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Administracion	%	27,0	$ 9.791,00	$ 3.644,00
Imprevistos	%	2,0	$ 9.791,00	$ 196,00
Utilidad	%	5,0	$ 9.791,00	$ 490,00
			SUBTOTAL	$ 3.330,00

VALOR TOTAL UNITARIO $ 13.121,00

Firma
Nombre: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Cargo: R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
Contratista

C. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Firma
Nombre: UNION TEMPORAL DELTA 2023
Cargo: R/L. LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Interventor

Original: Oficina Jurídica
1era Copia: Interventor
Segunda Copia: Contratista
3era Copia: Supervisor Proceso y/o Contrato

111

acuatodos S.A.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (subdependencia bajo esta responsabilidad)

ACTA No. 12 DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	033 DE 24 DE AGOSTO DE 2023	FECHA DE INICIACION:	21/11/2023	ACTA No. 12 DE	
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEPARTAMENTO DE CASANARE.	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	11 MESES	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS	
		FECHA SUSPENSION No. 3:	13/12/2024		
		FECHA REINICIACION No. 3:	27/02/2025		
		FECHA PRORROGA No. 1	9/12/2024		
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S - R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO	PLAZO PRORROGA:	5 MESES		
		NUEVA FECHA TERMINACIÓN :	19/08/2025		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - R/L LUIS ANDRES LOPEZ MESA	VALOR INICIAL :	$ 19.840.474.491,00		
		VALOR ANTICIPO :	$ 8.428.237.245,00	FECHA	
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ING. ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY	VALOR ADICIÓN:	NA		
		VALOR TOTAL:	$ 19.840.474.491,00	11/04/2025	

B. DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
NP 12	Suministro e instalación de Acometida Trifásica para usuario en cable antifraude.	und	

I. Equipo

DESCRIPCION	MARCA	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec	Eqp	HR	$ 3.427,00	1,6000	$ 5.483,00
					$ -
				SUBTOTAL	$ 5.483,00

II. Materiales

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cable de cobre 8 - AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C (3x8+1x8)	m	80,0000	$ 8.120,00	$ 649.600,00
Tensor para acometidas	und	1,0000	$ 14.464,00	$ 14.464,00
Alambre galvanizado No. 12	kg	0,1400	$ 9.148,00	$ 1.281,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	$ 665.345,00

III. Transportes

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Transporte de materiales (electrico y otros) - I	I	0,0010	$ 218.872,00	$ 219,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 219,00

IV. Mano de Obra

MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF I Electrica	1	1,6000	$ 34.265,00	$ 54.824,00
				$ -
			SUBTOTAL	$ 54.824,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 725.871,00

V. Costos Indirectos

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Administracion	%	27,0	$ 725.871,00	$ 195.985,00
Imprevistos	%	2,0	$ 725.871,00	$ 14.517,00
Utilidad	%	5,0	$ 725.871,00	$ 36.294,00
			SUBTOTAL	$ 246.796,00

VALOR TOTAL UNITARIO $ 972.667,00

Firma:
Nombre: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Cargo: R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
Contratista

C. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: UNION TEMPORAL DELTA 2023
Cargo: R/L LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Interventor

Original: Oficina Jurídica
Copia 1: Interventor
Copia 2: Contratista
Copia 3: Supervisor Proceso en Contrato

acuatodos s.a.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proceso o servicio (representante legal este documento)

ACTA No. 12 DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

A. DATOS GENERALES

						ACTA No. 12 DE
CONTRATO No.	033 DE 24 DE AGOSTO DE 2023	FECHA DE INICIACION:		21/11/2023		
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEPARTAMENTO DE CASANARE.	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:		11 MESES		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS
		FECHA SUSPENSION No. 3:		13/12/2024		
		FECHA REINICIACION No. 3:		27/02/2025		
		FECHA PRORROGA No. 1		9/12/2024		
		PLAZO PRORROGA:		5 MESES		
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S - R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN :		19/09/2025		
		VALOR INICIAL :	$	16.840.474.491,00		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - R/L. LUIS ANDRES LOPEZ MESA	VALOR ANTICIPO :	$	5.426.237.245,80	FECHA	
		VALOR ADICIÓN:		N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ING. ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY	VALOR TOTAL:	$	16.840.474.491,00	11/04/2025	

B. DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Nº 13	Estructura 711 transformador trifasico 45 KVA 13,2KV/208-120V, suministro, transporte y montaje	und	

I. Equipo

DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr UNITARIO
Herramienta menor 10% M.O. FF-1 Elec. Sta	Eqp	HR	$ 6.702,00	5,0000	$ 33.510,00
Camion grua hidraulica para postes	Eqp	HR	$ 241.917,00	1,0000	$ 241.917,00
				SUBTOTAL	$ 275.427,00

II. Materiales

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Arandela de presión de 5/8"	und	10,0000	$ 240,00	$ 2.400,00
Cable de aluminio aislado N° 2 THHN	m	6,0000	$ 2.400,00	$ 14.400,00
Conectorcito de cañuela para 15 KV 100 Amperios	und	3,0000	$ 180.799,80	$ 542.379,00
Fusible de 15 Kil, T a 5 A, Tipo H	und	3,0000	$ 3.921,00	$ 11.763,00
Pararrayos polimerico de 12 Kv, 10 KA	und	3,0000	$ 119.829,00	$ 359.517,00
Transformador trifasico 45 KVA 13,2 KV/ 208/120V. (en aceite).	und	1,0000	$ 14.725.868,00	$ 14.725.868,00
Arandela de presión de 1/2"	und	8,0000	$ 120,00	$ 960,00
Arandela redonda plana de 1/2"	und	8,0000	$ 312,00	$ 2.496,00
Arandela redonda plana de 5/8"	und	10,0000	$ 992,00	$ 9.920,00
Collarin para transformador en platina galvanizada de 3/8"	und	1,0000	$ 38.382,00	$ 38.382,00
Cruceta metalica de 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16" x 2 mts	und	3,0000	$ 94.231,00	$ 282.693,00
Espárrago galvanizado de 5/8" X 10" con 4 tuercas y 4 arandelas	und	3,0000	$ 6.373,00	$ 19.119,00
Perno de maquina 5/8" X 8"	und	2,0000	$ 5.068,00	$ 10.136,00
Diagonal recta en angulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16 x 0,64 m	und	3,0000	$ 18.836,00	$ 56.508,00
Perno de maquina 1/2" X 2"	und	8,0000	$ 1.568,80	$ 12.440,00
			SUBTOTAL	$ 16.082.340,00

III. Transportes

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Transporte de material (eléctrico y otros) - t	t	0,39482	$ 218.672,00	$ 84.149,00
			SUBTOTAL	$ 84.149,00

IV. Mano de Obra

MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cuadrilla FF-1 (Electrica Especializada)	h	5	$ 67.820,00	$ 339.100,00
			SUBTOTAL	$ 339.100,00
			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 16.777.016,00

V. Costos Indirectos

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Administracion	%	27,0	$ 16.777.016,00	$ 4.529.794,00
Imprevistos	%	2,0	$ 16.777.016,00	$ 335.540,00
Utilidad	%	5,0	$ 16.777.016,00	$ 838.851,00
			SUBTOTAL	$ 5.704.185,00
			VALOR TOTAL UNITARIO	$ 22.481.201,00

(Firma)
Nombre: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
R/Legal: R/L. MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
Contratista

C. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

(Firma)
Nombre: UNION TEMPORAL DELTA 2023
R/Legal: R/L. LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Interventor

Destinar: Oficina Jurídica
Una copia: Interventor
Otra copia: Contratista
Una copia: Supervisor Proceso y/o Calidad

213

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

ACTA No. 13 DE CONTROL DE AJUSTES

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
CONTRATO No.	033 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEPARTAMENTO DE CASANARE.
LOCALIZACION DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	DIECISEIS (16) MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	21 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	20 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO	19 DE AGOSTO DEL 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.849.474.491,00 DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S - R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - R.L. LUIS ANDRES LOPEZ MESA
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY

2. DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL		
				CONTRATISTA	INTERVENTORIA	VALOR PACTADO
N.P. 1	Tubería PVC alcantarillado 6". Suministro e instal.	m	416,42	$63.769,00	$63.769,00	$ 63.769,00
N.P. 2	Tubería PVC alcantarillado 8". Suministro e instal.	m	289,47	$89.882,00	$89.883,00	$ 89.883,00
N.P. 3	Kit Silla Yee PVC 6 x 6 (200 x 160 mm). Suministro e instal.	und	33,00	$279.292,00	$279.292,00	$ 279.292,00
N.P. 4	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte	m³	490,76	$373.244,00	$373.244,00	$ 373.244,00
N.P. 5	Pozo de inspección recto (sin cono truncado) H=1.0 - 1.5 m Ø 1.20 m	und	2,00	$4.083.753,00	$4.083.754,00	$ 4.083.754,00
N.P. 6	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=2.0 - 2.5 m Ø 1.20 m	und	1,00	$5.604.944,00	$5.604.944,00	$ 5.604.944,00
N.P. 7	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=2.5 - 3.0 m Ø 1.20 m	und	1,00	$6.400.001,00	$6.400.000,00	$ 6.400.000,00
N.P. 8	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=3.5 - 4.0 m Ø 1.20 m	und	1,00	$7.991.619,00	$7.991.620,00	$ 7.991.620,00
N.P. 9	Caja de inspección 60 x 60	und	37,00	$601.208,00	$601.205,00	$ 601.205,00

N.P. 10	Tuberia PF+UAD de 1/2". Suministro e Instal.	m	829,55	$8.470,00	$8.470,00	$ 8.470,00
N.P. 11	Tapón soldado PVC 2". Suministro e Instal	und	15,00	$13.120,00	$13.121,00	$ 13.121,00
N.P. 12	Suministro e instalación de Acometida Trifásica para usuario en cable antifraude.	und	14,00	$972.667,00	$972.667,00	$ 972.667,00
N.P. 13	Estructura 711 transformacor trifásico 45 KVA 13,2KV/208-120V, suministro, transporte y montaje	und	3,00	$22.481.201,00	$22.481.201,00	$ 22.481.201,00

OBSERVACIONES

(Firma)
(Nombre) MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
(Cargo) SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Contratista

(Firma)
(Nombre) LUIS ANDRES LOPEZ MESA
(Cargo) CONTROL TEMPORAL DELTA 2023
Interventor

Opción: Obras Juntas
Una sola: Interventor
Dos casa: Contratista
Una sola: Supervisor Proyecto en CONTRATO

acuatodos s.a. E.S.P

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	033- 2023
	21	4	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

(Nombre descriptivo responsable del proyecto o contrato, incluyendo cada fase como denominación)

ACTA No. 14 DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐
CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA
(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o no contrato, o Estudio o Diseño, Suministro para mantenimiento o cualquier tipología alternativa existente)

CONTRATO No. 033 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA (___) **CONCURSO DE MERITOS** (___)

CONTRATACIÓN DIRECTA (___) ACUA-SPO-002-2023 (___)
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa ejecutada)

OBJETO DEL CONTRATO OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE DEPARTAMENTO DE CASANARE.
(Indique el objeto del contrato de ejecución sucesivo)

LOCALIZACION DEL PROYECTO CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DIECISEIS (16) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 21 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DEL 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 16.840.474.491,00
(Indique el valor del contrato suscrito en número)
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO 20 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DEL 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 19 (Día) DE AGOSTO (Mes) DEL 2025 (Año)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 16.840.474.491,00
(Indique el valor del contrato suscrito en número)
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S - R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR UNION TEMPORAL DELTA 2023 - R.L. LUIS ANDRES LOPEZ MESA
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

APOYO A LA SUPERVISIÓN N / A
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

SUPERVISOR SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ING. ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

GERENTE GENERAL ACUATODOS S.A E.S.P. ING. JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
(Escriba el nombre del Secretario de Despacho o Director de Planeación o Director entre descentralizada según sea el caso)

En YOPAL ; a los VEINTIUN (21) días del mes de ABRIL de 2025 , se reunieron: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO , Representante Legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S en calidad de Contradista, LUIS ANDRES LOPEZ MESA Representante Legal de UNION TEMPORAL DELTA 2023 en calidad de interventor, N / A en calidad de profesional de apoyo a la supervisión, ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY , Subgerente Tecnico y Operativo, en calidad de supervisor por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos del Departamento de Casanare S.A. E.S.P., JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ Gerente de ACUATODOS SA ESP, con , con el fin de **Pactar y Fijar los precios** Unitarios No Previstos en el Contrato anteriormente citado, previo estudio de la Interventoría.

A continuación se relacionan dichos precios unitarios pactados al origen del contrato. TREINTA Y TRES (033) de AGOSTO de 2023 indicando los ítems correspondientes y cantidades estimadas de obra de los mismos.

2.16

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD APROX	PRECIO UNITARIO
N.P. 1	Tubería PVC alcantarillado 6". Suministro e instal.	m	416,42	$ 63.769,00
N.P. 2	Tubería PVC alcantarillado 8". Suministro e instal.	m	289,47	$ 89.883,00
N.P. 3	Kit Silla Yee PVC 8 x 6 (200 x 160 mm), Suministro e instal.	und	33,00	$ 279.292,00
N.P. 4	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte	m^3	490,76	$ 373.244,00
N.P. 5	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=1.0 - 1.5 m Ø 1.20 m	und	2,00	$ 4.063.754,00
N.P. 6	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=2.0 - 2.5 m Ø 1.20 m	und	1,00	$ 5.604.944,00
N.P. 7	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=2.5 - 3.0 m Ø 1.20 m	und	1,00	$ 6.400.000,00
N.P. 8	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=3.5 - 4.0 m Ø 1.20 m	und	1,00	$ 7.991.620,00
N.P. 9	Caja de Inspección 60 x 60	und	37,00	$ 601.205,00
N.P. 10	Tubería PF+UAD de 1/2". Suministro e Instal.	m	829,55	$ 8.470,00
N.P. 11	Tapón soldado PVC 2". Suministro e Instal	und	15,00	$ 13.121,00
N.P. 12	Suministro e instalación de Acometida Trifásica para usuario en cable antifraude.	und	14,00	$ 972.667,00
N.P. 13	Estructura 711 transformador trifásico 45 KVA 13,2KV/208-120V, suministro, transporte y montaje	und	3,00	$ 22.481.201,00

Se anexa y hace parte de la presente acta el cuadro de evaluación económica del contrato teniendo en cuenta los precios no previstos del contrato anteriormente mencionado y el análisis de precios unitarios de dichos ítems.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTIUN (21) días del mes de ABRIL de 2025

(Firma)
(Nombre)
Rl.Legal
MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Contratista

(Firma)
(Nombre)
Rl.Legal
LUIS ANDRES LOPEZ MESA
UNION TEMPORAL DELTA 2023
Interventor

(Firma)
(Nombre)
Rl.Legal
N/A
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare
Apoyo de la Supervisión

(Firma)
(Nombre)
Rl.Legal
ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
Subgerente Técnico y Operativo
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare
Supervisor

VoBo.
(Nombre)
Rl.Legal
JULIO CESAR CUELLAS JIMENEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare
ACUATODOS S.A. E.S.P.

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto vía Canaguay

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

ACTA No. 18 DE MODIFICACIÓN

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐

CONTRATO No.	033 DE 2022	FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE NOVIEMBRE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	ONCE (11) MESES
		PRORROGA 1:	CINCO (5) MESES
		FECHA SUSPENSION 2:	13 DE DICIEMBRE 2024
		FECHA REINICIACION 2:	27 DE FEBRERO 2025
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	NUEVA FECHA TERMINACIÓN :	19 DE AGOSTO DE 2025
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2022	VALOR INICIAL :	$ 16.840.474.491
		VALOR ANTICIPO :	$ 5.420.237.246
SUPERVISOR	ROBERT AXIS HERNANDEZ CACHAY "ACUATODOS S.A. E.S.P."	VALOR ADICIÓN:	$ -
		VALOR TOTAL:	$ 16.840.474.491

ACTA No. 18 DE

MODIFICATORIA DE CANTIDADES No. 1

19 DE MAYO DE 2025

	CONDICIONES GENERALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES			NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO		VALOR	CANTIDAD		VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**PRELIMINARES**										
1.1	Demolición de estructuras a nivel en concreto reforzado con retiro	m³	742,82	$262.785,00	$	195.201.953,70	-463,42	-$	119.151.974,70	280,40	$ 76.049.979,00
1.2	Sondeo, limpieza y retiro material solido de tuberías alcantarillado y pozos de inspección	m	774,44	$18.810,00	$	14.567.216,40	0,00	$	-	774,44	$ 14.567.216,40
1.3	Movilización y desmovilización de equipo pesado	lgo	422,00	$43.201,00	$	18.230.822,00	-422,00	-$	18.230.822,00	-	$ -
1.4	Retiro de tubería existente con manejo de aguas residuales de 24" a 36"	m	237,34	$19.029,00	$	4.516.242,86	-104,66	-$	1.991.576,14	132,68	$ 2.524.757,72
	TOTAL PRELIMINARES				$	232.516.334,96		$	(139.374.371,84)		$ 93.141.963,12
2	**OPTIMIZACIÓN RED PLUVIAL CENTRO POBLADO**										
2.1	Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado	m	1.966,72	$6.560,00	$	12.900.611,80	667,28	$	4.377.560,40	2.643,40	$ 17.393.572,20
2.2	Excavación manual en material común	m³	1.184,95	$45.646,00	$	54.338.593,08	539,00	$	24.602.258,40	1.724,95	$ 78.076.845,48
2.3	Excavación mecánica en material común 0 - 2 m (área restringida)	m³	3.310,31	$10.212,00	$	33.804.885,72	2.394,49	$	24.452.531,88	5.704,80	$ 58.257.417,60
2.4	Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	2.704,96	$408.470,00	$	1.104.995.826,14	74,28	$	30.341.181,60	2.779,24	$ 1.135.336.975,74
2.5	Tubería PVC alcantarillado 12", Suministro e instal.	m	666,36	$189.815,00	$	127.330.075,40	-4,90	-$	909.025,50	661,46	$ 126.421.051,90
2.6	Tubería PVC alcantarillado 16", Suministro e instal.	m	15,88	$337.190,00	$	5.347.833,40	-4,01	-$	1.352.131,90	11,88	$ 3.995.701,50
2.7	Tubería PVC alcantarillado 20", Suministro e instal.	m	222,31	$557.597,00	$	123.959.388,07	-2,39	-$	1.332.666,83	219,92	$ 122.626.732,24
2.8	Tubería PVC alcantarillado 24", Suministro e instal.	m	374,72	$810.775,00	$	303.813.458,00	-5,60	-$	4.499.282,50	369,22	$ 299.304.345,50
2.9	Tubería PVC alcantarillado 27", Suministro e instal.	m	201,99	$984.719,00	$	198.933.390,81	-2,40	-$	2.963.325,93	199,59	$ 196.940.065,21
2.10	Tubería PVC alcantarillado 30", Suministro e instal.	m	357,04	$1.212.279,00	$	432.892.084,16	-3,61	-$	4.376.327,19	353,43	$ 428.466.756,97
2.11	Tubería PVC alcantarillado 36", Suministro e instal.	m	86,06	$2.689.543,00	$	248.874.075,58	-4,92	-$	14.216.681,56	81,14	$ 234.457.519,02
2.12	Sumidero lateral SL-200 en mampostería	und	43,20	$4.518.029,00	$	194.275.247,00	3,00	$	13.554.087,00	46,00	$ 207.829.334,00
2.13	Sumidero lateral SL-250 en mampostería	und	16,00	$5.711.875,00	$	83.390.000,00	0,00	$	-	16,00	$ 83.390.000,00
2.14	Demolición de pozos de inspección D=1.20m Hs: 2.0 a 3.0 m	und	3,00	$227.165,00	$	681.495,00	0,00	$	-	3,00	$ 681.495,00
2.15	Pozo de inspección recto (sin cono truncado) H=1.0 - 1.5 m Ø 1.50 m	und	12,00	$4.839.601,00	$	58.077.612,00	1,00	$	4.839.601,00	13,00	$ 62.917.413,00
2.16	Pozo de inspección recto (sin cono truncado) H=1.5 - 2.0 m Ø 1.50 m	und	3,00	$5.725.095,00	$	17.175.285,00	0,00	$	-	3,00	$ 17.175.285,00
2.17	Tapa bocasuelo con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en x/a (Inc. marco y tapa)	und	15,00	$1.543.135,00	$	23.102.025,00	16,00	$	24.642.160,00	31,00	$ 47.744.185,00
2.18	Placa de cubierta para pozos en Concreto de 4000 Psi, resistencia 280 kg/cm²	m³	4,01	$1.758.692,00	$	7.053.557,92	-0,04	-$	70.359,68	3,97	$ 6.983.198,24
2.19	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	2.835,21	$35.579,00	$	100.873.936,09	2.287,50	$	81.390.620,40	5.122,81	$ 182.264.456,99
2.20	Replanteo y localización de tuberías de acueducto	m	1.762,39	$4.646,00	$	8.648.233,94	404,17	$	1.877.356,82	2.166,31	$ 8.307.690,66
2.21	Retiro de tubería existente de acueducto PVC Ø 3"	m	1.539,57	$2.546,00	$	3.919.745,22	353,14	$	899.094,44	1.892,71	$ 4.818.839,66
2.22	Retiro y traslado de tubería existente de polietileno para acueducto diámetros de 1/2" a 4"	m	222,47	$1.240,00	$	275.862,80	51,03	$	63.277,20	273,50	$ 339.140,00
2.23	Tubería presión PVC RDE 21 2". Suministro e instal.	m	1.660,29	$37.037,00	$	57.798.979,23	332,68	$	12.313.321,02	1.992,71	$ 70.100.300,27
2.24	Codo presion PVC 90° ø 2. Suministro e instal.	und	3,00	$24.369,00	$	73.107,00	0,00	$	-	3,00	$ 73.107,00
2.25	Tee de presión PVC 2". Suministro e instal.	und	9,00	$31.699,00	$	285.291,00	8,00	$	253.592,00	17,00	$ 538.883,00
2.26	Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=1 m) Ø=1/2". Suministro e instal.	und	70,00	$169.509,00	$	11.865.630,00	52,00	$	8.814.468,00	122,00	$ 20.680.098,00
2.27	Unión de reparación (u.m) RDE 21 2". Suministro e instal.	und	14,00	$59.431,00	$	832.034,00	0,00	$	-	14,00	$ 832.034,00
2.28	Unión de reparación (u.m) RDE 21 3". Suministro e instal.	und	2,00	$99.303,00	$	198.606,00	0,00	$	-	2,00	$ 198.606,00
2.29	Válvula de compuerta elástica vástago no ascendente exterro. x a Ø 2". Suministro e instal.	und	2,00	$533.431,00	$	1.066.862,00	0,00	$	-	2,00	$ 1.066.862,00
2.30	Reparación de acometida PF+UAD de 1/2" para acueducto	m	400,00	$15.045,00	$	7.218.000,00	-376,00	-$	6.784.920,00	24,00	$ 433.080,00
2.31	Reparación de acometida domiciliaria alcantarillado Ø= 6"	m	400,00	$110.990,00	$	44.396.000,00	-306,00	-$	33.740.960,00	94,00	$ 10.655.040,00
2.32	Reparación tubería de gas Polietileno PE-80 de 1/2"	und	100,00	$97.943,00	$	9.794.500,00	-74,00	-$	7.247.550,00	26,00	$ 2.546.970,00
2.33	Tubería PVC alcantarillado 42". Suministro e instal.	m	12,00	$3.403.663,00	$	40.843.956,00	-12,00	-$	40.843.956,00	-	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS OPTIMIZACIÓN RED PLUVIAL CENTRO POBLADO										
2.34	NP-1 Tubería PVC alcantarillado 6". Suministro e instal.	m		$63.799,00	$	-	416,42	$	26.564.666,58	416,42	$ 26.564.666,58
2.35	NP-2 Tubería PVC alcantarillado 8". Suministro e instal.	m		$95.893,00	$	-	209,47	$	20.088.432,01	209,47	$ 20.088.432,01
2.36	NP-3 Kit silla Yee PVC 8 x 6 (200 x 160 mm). Suministro e instal.	und		$279.282,00	$	-	33,00	$	9.216.606,00	33,00	$ 9.216.606,00
2.37	NP-4 Relleno en Arena Lavada Apisonada para Atraque de la Tubería con Transporte	m³		$373.344,00	$	-	581,00	$	216.854.784,00	581,00	$ 216.854.784,00
2.38	NP-5 Pozo de inspección recto (sin cono truncado) H=1.0 - 1.5 m Ø 1.20 m	und		$4.093.784,00	$	-	2,00	$	8.187.568,00	2,00	$ 8.187.568,00
2.39	NP-6 Pozo de inspección recto (sin cono truncado) H=2.0 - 2.5 m Ø 1.20 m	und		$5.804.944,00	$	-	1,00	$	5.804.944,00	1,00	$ 5.804.944,00
2.40	NP-7 Pozo de inspección recto (sin cono truncado) H=2.5 - 3.0 m Ø 1.20 m	und		$6.400.000,00	$	-	1,00	$	6.400.000,00	1,00	$ 6.400.000,00
2.41	NP-8 Pozo de inspección recto (sin cono truncado) H=3.5 - 4.0 m Ø 1.20 m	und		$7.991.620,00	$	-	1,00	$	7.991.620,00	1,00	$ 7.991.620,00
2.42	NP-9 Caja de inspección 60X60	und		$601.205,00	$	-	37,00	$	22.244.585,00	37,00	$ 22.244.585,00
2.43	NP-10 Tubería PF+UAD 1/2". Suministro e instal.	m		$8.472,00	$	-	829,55	$	7.027.188,60	829,55	$ 7.027.188,60
2.44	NP-11 Tapón soldado PVC 2". Suministro e instal.	und		$13.121,00	$	-	15,00	$	196.815,00	15,00	$ 196.815,00
	TOTAL OPTIMIZACIÓN RED PLUVIAL CENTRO POBLADO				$	3.317.542.115,58		$	449.596.351,89		$ 3.767.538.467,47
3	**CONSTRUCCIÓN EMISARIO A ESTRUCTURA DE DESCARG**										
3.1	Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado	m	366,47	$6.560,00	$	1.755.372,60	1,43	$	9.409,40	367,90	$ 1.763.782,00

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

ACTA No. 19 DE MODIFICACION

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	023 DE 2022	FECHA DE INICIACION:	21 DE NOVIEMBRE 2023	ACTA No.	19 DE
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	ONCE (11) MESES	MODIFICATORIA DE CANTIDADES No. 1	
		PRORROGA 1:	CINCO (5) MESES		
		FECHA SUSPENSION 3:	13 DE DICIEMBRE 2024		
		FECHA REINICIACION 3:	27 DE FEBRERO 2025		
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	NUEVA FECHA TERMINACIÓN :	19 DE AGOSTO DE 2025		
		VALOR INICIAL :	$ 16.840.474.491		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023	VALOR ANTICIPO :	$ 5.420.237.248		
		VALOR ADICION:	$ -	19 DE MAYO DE 2025	
SUPERVISOR	ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY " ACUATODOS S.A. E.S.P."	VALOR TOTAL:	$ 16.840.474.491		

	CONDICIONES GENERALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES			NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO MODIFICATORIO No. 1		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRUNTARIO		VALOR	CANTIDAD		VALOR	CANTIDAD		VALOR
3.2	Excavación a mano en material comun 2 a 3 m	m³	142,28	$77.443,00	$	11.018.590,04	-3,97	-$	284.215,81	138,61	$	10.734.374,23
3.3	Excavación mecánica en material comun 2 - 4 m (área restringida)	m³	1.394,52	$11.937,00	$	16.646.416,74	350,09	$	4.184.992,83	1.744,61	$	20.825.409,57
3.4	Entibado tipo 3: apuntalamiento metálico tipo tablestacado.	m²	1.131,17	$64.998,00	$	60.851.579,66	215,46	$	11.763.685,08	1.366,63	$	74.615.264,74
3.5	Relleno zona de atraque de tubería con material base granular Wp/300 (tamaño máximo 1 1/2")	m³	979,82	$408.470,00	$	398.811.501,40	-6,43	-$	2.626.462,10	969,19	$	396.885.039,30
3.6	Tubería PVC alcantarillado 60". Suministro e instal.	m	269,47	$9.399.690,00	$	1.705.333.729,63	-2,07	-$	19.347.397,60	264,40	$	1.680.078.382,03
3.7	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	992,71	$35.579,00	$	35.319.629,09	-218,92	-$	7.788.984,68	773,79	$	27.530.674,41
3.8	Pozo de inspeccion recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 2.5 m Ø 1,00 m	und	3,00	$6.624.990,00	$	19.874.970,00	0,00	$	-	3,00	$	19.874.970,00
3.9	Placa de cubierta para pozos en Concreto de 4000 Psi, resistencia 280 kg/cm²	m³	1,83	$1.758.992,00	$	2.887.156,96	-1,06	-$	1.864.551,52	0,57	$	1.002.626,44
3.10	Tapa cuticulante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo rec. en s/a (Inc. marco y tapa)	und	3,00	$1.540.135,00	$	4.620.405,00	1,00	$	1.540.135,00	4,00	$	6.160.540,00
	TOTAL CONSTRUCCIÓN EMISARIO A ESTRUCTURA DE DESCARGA				$	2.358.788.361,09		$	(8.313.279,40)		$	2.250.467.671,69
4	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE DESCARGA											
4.1	Desalojos manual con retiro	m³	216,84	$10.781,00	$	2.338.415,24	0,00	$	-	216,84	$	2.338.415,24
4.2	Excavación mecánica en material comun 0 - 6 m (área	m³	1.783,18	$13.805,00	$	24.616.523,80	-722,38	-$	9.972.466,90	1.060,78	$	14.644.067,90
4.3	Entibado tipo 3: apuntalamiento metálico tipo tablestacado.	m²	249,51	$64.998,00	$	13.822.746,98	-103,52	-$	6.851.994,96	145,99	$	7.970.762,02
4.4	Sub base granular seleccionada o clasificada	m³	19,16	$91.022,00	$	1.743.981,93	3,28	$	298.662,78	22,44	$	2.042.253,68
4.5	Geomalla triaxial para refuerzo TX-5. Suministro e instal.	m²	189,66	$19.699,00	$	3.733.172,34	-102,93	-$	2.019.738,47	86,93	$	1.712.434,07
4.6	Pisa o pisca en Piedra Pegada e = 0,25 m	m²	6,40	$196.820,00	$	1.259.248,00	0,00	$	-	6,40	$	1.259.248,00
4.7	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	3.528,80	$10.440,00	$	36.846.812,80	1.440,32	$	15.048.463,36	4.969,92	$	51.915.276,16
4.8	Placa o losa de fondo en Concreto 4000 Psi impermeabilizado, resistencia 280 Kg/cm²	m³	32,88	$1.837.375,00	$	37.436.392,80	0,88	$	1.408.142,80	23,72	$	38.838.535,60
4.9	Dilatación en Corte PVC 015	m	77,37	$95.199,00	$	7.362.451,83	0,00	$	-	77,37	$	7.362.451,83
4.10	Muro en concreto 4000 psi impermeabilizado, resistencia 280 kg/cm²	m³	39,14	$2.035.269,00	$	79.669.389,52	7,36	$	14.979.572,48	46,50	$	94.639.962,00
4.11	Compuerta charpentier D.N. 60" (1500 mm), segun AWWA C-561, cuerpo circular, obturador y brazos en acero inoxidable, con tornillería y empaques. Incluye transporte, montaje e instalación	und	1,00	$151.082.880,00	$	151.082.880,00	0,00	$	-	1,00	$	151.082.880,00
4.12	Reja de retención de sólidos gruesos, en tubo HG Ø 1" c/5 cm, altura 1,86 m, ancho 2,0 m, incluye, soldadura, pintura, corte boca de pez, transporte, montaje e instalación	und	1,00	$12.000.203,00	$	12.000.203,00	0,00	$	-	1,00	$	12.000.203,00
4.13	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	228,91	$35.579,00	$	8.144.388,89	390,25	$	13.884.704,75	619,16	$	22.029.093,64
4.14	Sonoras en Tubo HG Ø=2" e=2,5 mm H=2,90 m	m	26,94	$334.536,00	$	9.015.461,84	28,59	$	9.565.994,04	55,53	$	18.536.475,88
	TOTAL CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE DESCARGA				$	393.858.068,46		$	37.481.249,98		$	426.331.318,42
5	OBRAS DE PROTECCIÓN											
5.1	Replanteo y localización manual para obras de protección (planimetría y altimetría)	m²	1.170,00	$6.726,00	$	7.869.420,00	59,00	$	396.834,00	1.229,00	$	8.266.254,00
5.2	Manejo, control y extracción de agua	h	312,00	$35.950,00	$	11.216.400,00	168,00	$	6.039.600,00	480,00	$	17.256.000,00
5.3	Excavación de cortes, canales y préstamo en Río (Incluye: Transporte acarreo max. 200 m)	m³	919,13	$17.607,00	$	16.183.121,91	1.223,27	$	21.538.114,89	2.142,40	$	37.721.236,80
5.4	Excavación a mano en material comun	m³	39,42	$45.949,00	$	4.426.471,32	14,80	$	678.520,80	111,22	$	5.098.992,12
5.5	Perfilado mecánico de talud. 1:1 o 45°	m²	993,15	$5.445,00	$	5.407.701,75	126,85	$	690.698,25	1.120,00	$	6.098.400,00
5.6	Geotextil No Tejido 3055	m²	1.819,36	$17.112,00	$	31.132.898,32	193,44	$	3.310.142,28	2.012,80	$	34.443.053,80
5.7	Concreto ciclópeo de resistencia 1500 psi	m³	186,36	$942.133,00	$	177.466.171,88	39,46	$	22.902.440,18	211,82	$	199.562.812,06
5.8	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	387,84	$10.440,00	$	3.738.577,92	228,62	$	2.368.621,76	586,16	$	6.124.199,68
5.9	Bolsacreto con cemento - arena de 1.20 x 2.0 Relación 1:8	und	1.199,50	$564.499,00	$	664.796.341,00	207,00	$	114.773.013,00	1.406,00	$	779.569.354,00
	ITEMS NO PREVISTOS OBRAS DE PROTECCIÓN											
5.10	Excavación mecánica en material comun 2 - 4 m (área restringida)	m³		$11.937,00	$	-	5.082,50	$	60.431.062,50	5.082,50	$	60.431.062,50
5.11	Entibado tipo 3: apuntalamiento metálico tipo tablestacado.	m²		$64.998,00	$	-	240,00	$	13.109.520,00	240,00	$	13.109.520,00
5.12	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³		$35.579,00	$	-	942,20	$	33.523.533,80	942,20	$	33.523.533,80
	TOTAL OBRAS DE PROTECCIÓN				$	922.332.094,10		$	278.975.104,49		$	1.201.187.198,58
6	TRANSPORTE											
6.1	Transporte de material Pétreo (a la permitida)	m³-km	477.779,15	$2.074,00	$	990.913.922,48	-102.918,88	-$	213.453.797,12	374.860,22	$	777.460.099,28
6.2	Transporte de material Pétreo (a la desapada)	m³-km	474.615,00	$2.193,00	$	1.040.630.695,00	-102.237,32	-$	224.206.398,90	372.377,70	$	816.424.296,10
6.3	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	14.390,12	$17.984,00	$	257.865.103,68	-145,29	-$	2.596.460,56	14.244,83	$	254.499.643,12
	TOTAL TRANSPORTE				$	2.289.809.052,06		$	(440.256.656,58)		$	1.848.584.039,50
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS											
7.1	Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms)	m³	11.082,00	$19.558,00	$	216.741.756,00	-89,85	-$	1.757.289,30	10.992,15	$	214.984.469,70
7.2	Terraplén o rellenos con material de corte (a. libre 2Km)	m³	449,80	$21.128,00	$	9.503.374,40	155,44	$	3.284.136,32	605,24	$	12.787.510,72
7.3	Conformación vía urbana (incluye perfilado, escarificado, conformar, y cunetiado)	km	1,58	$2.264.873,00	$	4.464.460,42	0,87	$	158.541,53	2,05	$	4.643.001,95
7.4	Geomalla triaxial para refuerzo TX-5. Suministro e instal.	m²	23.685,40	$19.699,00	$	470.518.484,60	-5.776,24	-$	113.825.349,76	18.107,16	$	356.692.944,84
7.5	Geotextil tejido de alto modulo 80/80 (W8080)	m²	23.685,40	$23.982,00	$	572.819.952,80	-6.501,30	-$	158.312.376,60	17.284,10	$	414.507.288,20
7.6	Sub base granular seleccionada o clasificada	m³	5.254,24	$91.022,00	$	478.260.535,48	-1.139,25	-$	103.696.813,50	4.115,09	$	374.563.721,98
7.7	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	25.821,60	$10.440,00	$	269.594.376,60	11.726,84	$	122.542.920,32	37.640,44	$	392.326.697,12

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

ACTA No. 6 DE MODIFICACION

DISEÑO Y CONSTRUCCION ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	020 DE 2023	FECHA DE INICIACION:	21 DE NOVIEMBRE 2023
		PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CINCO (11) MESES
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PILTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	PRORROGA 1:	CINCO (5) MESES
		FECHA SUSPENSION 2:	10 DE DICIEMBRE 2024
		FECHA REINICIACION 2:	27 DE FEBRERO 2025
		NUEVA FECHA TERMINACIÓN :	19 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA	SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	VALOR INICIAL :	$ 16.845.474.491
		VALOR ANTICIPO :	$ 5.423.237.246
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023	VALOR ADICIÓN:	$ -
		VALOR TOTAL:	$ 16.845.474.491
SUPERVISOR	ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY "ACUATODOS S.A. E.S.P."	ACTA No. 15 DE	MODIFICATORIA DE CANTIDADES No. 1
			19 DE MAYO DE 2025

CONDICIONES GENERALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES		NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	PUNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
7.8	Acero de Transferencias tipo de 60000 Psi	Kg	11.430,00	$9.935,00	$ 113.563.209,70	2.275,27	$ 22.604.807,45	13.705,69	$ 136.168.017,15
7.9	Losa de pavimento en Concreto MR 41 kg/cm² e=0.18 m	m²	16.167,17	$244.178,00	$ 3.947.694.901,92	223,08	$ 54.470.782,08	16.390,25	$ 4.002.165.684,00
7.10	Junta de dilatación 6 mm x 6 mm	m	9.878,27	$16.471,00	$ 162.709.906,67	-2.847,09	-$ 46.894.419,39	7.031,18	$ 115.815.507,28
7.11	Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.25 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m	m	5.709,00	$103.422,06	$ 379.750.776,00	-716,36	-$ 73.286.601,82	2.992,64	$ 306.812.174,08
7.12	Sardinel Prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) Incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m	m	368,70	$82.431,00	$ 22.149.209,70	321,03	$ 26.462.823,93	689,73	$ 48.612.033,63
7.13	Sardinel especial A-100 para rampa (0.8 x 0.20 x 0.5)	und	218,50	$75.095,00	$ 16.934.710,00	460,00	$ 32.692.750,00	888,00	$ 49.627.460,00
7.14	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm	und	32,00	$523.156,00	$ 16.740.992,00	0,00	$ -	32,00	$ 16.740.992,00
7.15	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	m²	284,76	$38.994,00	$ 11.095.268,64	0,00	$ -	284,76	$ 11.095.268,64
7.16	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	m	6.710,00	$4.538,00	$ 30.449.980,00	0,00	$ -	6.710,00	$ 30.449.980,00
7.17	Estoperol metálico 14 x 4 cm	und	363,00	$28.978,00	$ 10.519.014,00	0,00	$ -	363,00	$ 10.519.014,00
7.18	Pintura imprimante base para líneas de tráfico ancho 12 cms.	m	6.710,00	$2.725,00	$ 18.311.590,00	0,00	$ -	6.710,00	$ 18.311.590,00
7.19	Pintura imprimante base para marcas viales, demarcación (símbolos y letreros)	m²	284,76	$22.695,00	$ 6.464.065,40	0,00	$ -	284,76	$ 6.464.065,40
	TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS				**$ 6.757.456.144,33**		**$ (295.339.366,84)**		**$ 6.933.117.858,49**
8	**TRASLADO REDES ELÉCTRICAS**								
8.1	**DESMANTELAMIENTO RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV**								
8.1.1	Desmantelamiento de red primaria tres hilos 3 N° 2 ACSR.	m	281,69	$1.975,00	$ 556.337,75	208,70	$ 412.182,50	490,39	$ 968.520,25
8.1.2	Retiro de poste de ferroconcreto.	und	60,00	$601.310,00	$ 37.878.630,00	-9,00	-$ 5.681.790,00	51,00	$ 32.196.840,00
8.1.3	Desarrollo de estructura de red de 13.2 KV.	und	4,00	$84.957,00	$ 339.828,00	0,00	$ -	4,00	$ 339.828,00
8.1.4	Desmantelamiento de transformador existente.	und	3,00	$296.362,00	$ 889.086,00	0,00	$ -	3,00	$ 889.086,00
8.1.5	Desmantelamiento de red de baja tensión hilos 4 N° 2 ACSR.	m	3.648,32	$2.172,00	$ 6.603.575,04	-970,90	-$ 2.108.784,60	2.066,42	$ 4.494.790,24
	TOTAL DESMANTELAMIENTO RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV				**$ 46.267.426,79**		**$ (7.378.482,30)**		**$ 38.889.024,49**
8.2	**RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV**								
8.2.1	Replanteo en media tensión.	km	0,29	$611.307,00	$ 177.279,03	0,05	$ 30.565,35	0,34	$ 207.844,38
8.2.2	Apertura de hueco para poste o templete de M.T.	und	5,00	$103.631,00	$ 518.155,00	4,00	$ 412.124,00	9,00	$ 930.279,00
8.2.3	Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, armado, hincada y plomada	und	5,00	$2.883.435,00	$ 14.417.175,00	2,00	$ 5.766.870,00	7,00	$ 20.184.045,00
8.2.4	Cimentación poste extraforzado de M.T.	und	5,00	$244.809,00	$ 1.224.045,00	4,00	$ 979.236,00	9,00	$ 2.203.281,00
8.2.5	Suministro, tendido y templado de red de media tensión 3ø en cable semiaislado para red compacta (3 x N° 1/0)	m	285,67	$966.203,00	$ 19.467.191,61	58,13	$ 3.564.840,39	344,00	$ 23.461.892,00
8.2.6	Suministro y vestido de estructura LA484	und	2,00	$1.072.033,00	$ 2.144.066,00	4,00	$ 4.288.132,00	6,00	$ 6.432.198,00
8.2.7	Suministro y vestido de estructura LA481	und	1,00	$518.898,00	$ 518.898,00	1,00	$ 518.898,00	2,00	$ 1.037.796,00
8.2.8	Suministro y vestido de estructura de anclaje Terminal (VCEL 730)	und	2,00	$1.816.100,00	$ 3.632.200,00	0,00	$ -	2,00	$ 3.632.200,00
8.2.9	Suministro y colocación de espaciadores red compacta	und	41,00	$102.328,00	$ 4.195.648,00	0,00	$ -	41,00	$ 4.195.648,00
8.2.10	Suministro, tendida y templada de cable mensajero en acero galvanizado 3/8	m	285,67	$12.307,00	$ 3.516.202,69	58,13	$ 715.405,91	344,00	$ 4.233.608,00
8.2.11	Suministro e instalación de puesta a tierra para cable mensajero.	und	2,00	$761.138,00	$ 1.522.276,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.522.276,00
8.2.12	estructura R-550, con aislador suspensivo antiescalo-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	und	2,00	$1.015.624,00	$ 2.031.248,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.031.248,00
8.2.13	Descargadores de sobre tensión (pára) -15 KV cambio red compacta abierta . Suministro e instalación	und	2,00	$735.096,00	$ 1.470.192,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.470.192,00
	TOTAL RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV				**$ 55.671.569,73**		**$ 16.675.899,65**		**$ 71.347.429,38**
8.3	**RED TRENZADA BAJA TENSIÓN**								
8.3.1	Replanteo de red de B.T.	km	3,20	$611.307,00	$ 1.956.182,40	-1,09	-$ 666.324,63	2,11	$ 1.289.857,77
8.3.2	Apertura de hueco para poste o templete de B.T.	und	92,00	$97.734,00	$ 8.995.728,00	6,00	$ 525.404,00	106,00	$ 9.212.070,00
8.3.3	Suministro, armado, hincada y plomada de poste de ferroconcreto de 12 m a 510 kgf	und	48,00	$1.799.375,00	$ 82.771.250,00	5,00	$ 8.996.875,00	51,00	$ 91.768.125,00
8.3.4	Suministro, armado, hincada y plomada de poste de ferroconcreto de 15 m a 1.050 kgf.	und	53,00	$1.961.413,00	$ 103.424.889,00	1,00	$ 1.961.413,00	54,00	$ 105.376.302,00
8.3.5	Cimentación poste extraforzado de B.T.	und	51,00	$206.191,00	$ 10.515.741,00	3,00	$ 618.543,00	54,00	$ 11.133.774,00
8.3.6	Suministro e instalación de puesta a tierra en acero revestidas para Terminal de ramal en baja tensión e iluminación.	und	34,00	$616.633,00	$ 20.965.522,00	0,00	$ -	34,00	$ 20.965.522,00
8.3.7	Suministro y vestido de estructura de suspensión, LA 320 (L-3000) sin caja de distribución de acometidas.	und	43,00	$117.812,00	$ 5.065.916,00	0,00	$ -	43,00	$ 5.065.916,00
8.3.8	Suministro y vestido de estructura de suspensión, LA 321 (L-3002) sin caja de distribución de acometidas.	und	28,00	$139.672,00	$ 3.910.816,00	0,00	$ -	28,00	$ 3.910.816,00
8.3.9	Suministro y vestido de estructura de suspensión, LA 322 (L-3003) sin caja de distribución de acometidas.	und	2,00	$286.493,00	$ 572.986,00	0,00	$ -	2,00	$ 572.986,00
8.3.10	Suministro y vestido de estructura de suspensión, LA 324 (L-3005) sin caja de distribución de acometidas.	und	15,00	$178.782,00	$ 2.681.730,00	0,00	$ -	15,00	$ 2.681.730,00
8.3.11	Suministro y vestido de estructura de suspensión, LA 327 (L-3009) sin caja de distribución de acometidas.	und	16,00	$356.977,00	$ 5.711.632,00	0,00	$ -	16,00	$ 5.711.632,00
8.3.12	Estructura L3010 de transición de circuito secundario aéreo de red trenzada a red abierta. Suministro y vestido.	und	11,00	$167.738,00	$ 1.845.118,00	-1,00	-$ 167.738,00	10,00	$ 1.677.380,00
8.3.13	Suministro e instalación de caja tipo intemperie para acometidas (caja de distribución de acometidas).	und	66,00	$707.029,00	$ 46.663.914,00	8,00	$ 5.656.232,00	74,00	$ 52.320.146,00
8.3.14	Suministro, tendida y templada de red trenzada de baja tensión 3ø , 4 H en cable aluminio XLPE (3 x 35 + 3 x 50 mm2)	m	3.203,99	$38.079,00	$ 121.998.726,21	-1.096,17	-$ 42.897.227,43	2.107,82	$ 82.371.497,78

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

ACTA No. 18 DE MODIFICACION

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐

CONTRATO No.	033 DE 2023	FECHA DE INICIACION:	21 DE NOVIEMBRE 2023	ACTA No. 18 DE	
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	ONCE (11) MESES.	MODIFICATORIA DE CANTIDADES No. 1	
		PRORROGA 1:	CINCO (5) MESES.		
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S	FECHA SUSPENSION 2:	12 DE DICIEMBRE 2024		
		FECHA REINICIACION 2:	27 DE FEBRERO 2025		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023	NUEVA FECHA TERMINACIÓN :	19 DE AGOSTO DE 2025		
		VALOR INICIAL :	$ 16.840.474.491		
SUPERVISOR	ROBERT AGIS HERNANDEZ CACHAY "ACUATODOS S.A. E.S.P."	VALOR ANTICIPO :	$ 5.420.237.246		
		VALOR ADICION:	$ -	19 DE MAYO DE 2025	
		VALOR TOTAL:	$ 16.840.474.491		

	CONDICIONES GENERALES					MAYORES Y MENORES CANTIDADES		NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRUNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	TOTAL RED TRENZADA BAJA TENSIÓN				$ 419.979.577,61		$ (25.921.822,66)		$ 394.057.754,95
8.4	SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN								
8.4.1	Desmonte, traslado y montaje de transformador de 45 KVA 13.2 KV/208-120V existente, incluye suministro e instalación de estructura 711.	und	3,00	52.694.396,00	$ 8.083.194,00	0,00	$ -	3,00	$ 8.083.194,00
8.4.2	Puesto a tierra para descargadores de sobretensión, con varilla de cobre de 5/8" x 2.4 m incluye: cable de cobre desnudo AWG N° 2, tubo metálico galvanizado EMC 1/2", cinta bandit, hebilla cinta bandit. Suministro e instalación.	und	5,00	$1.427.175,00	$ 7.135.880,00	1,00	$ 1.427.175,00	6,00	$ 8.563.056,00
	TOTAL SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN				$ 15.219.074,00		$ 1.427.175,00		$ 16.646.250,00
8.5	ALUMBRADO								
8.5.1	Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable encauchetado 2X12 AWG y conector.	und	77,00	$179.762,00	$ 13.841.674,00	9,00	$ 1.617.858,00	86,00	$ 15.459.532,00
8.5.3	Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude.	und	101,00	$445.953,00	$ 45.041.253,00	-83,00	$ -36.956.919,00	78,00	$ 34.784.334,00
	TOTAL ALUMBRADO				$ 58.882.927,00		$ (35.339.061,00)		$ 50.243.866,00
8.6	ITEMS NO PREVISTOS TRASLADO REDES ELÉCTRICAS								
8.6.1	NP-12 Suministro e instalacion de Acometida Trifásica para usuario en cable antifraude	und		$672.697,00	$ -	14,00	$ 13.617.336,00	14,00	$ 13.617.336,00
8.6.2	NP-13 Estructura 711 transformador trifasico 45 KVA 13.2KV/208-120V, suministro, transporte y montaje.	und		$22.481.201,00	$ -	3,00	$ 67.443.603,00	3,00	$ 67.443.603,00
	TOTAL ITEMS NO PREVISTOS TRASLADO REDES ELECTRICAS				$ -		$ 81.060.941,00		$ 81.060.941,00
	SUB TOTAL DEL PROYECTO				$ 16.761.997.335,73				$ 16.761.993.175,67
	Programa de Adaptación de la Guía Aeronaves PAGA				$ 16.696.996,00				$ 16.696.996,00
	Plan de Manejo de Tráfico PMT				$ 58.780.157,00				$ 58.780.157,00
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Ajustado al peso)				$ 16.840.474.491,00				$ 16.840.470.334,00
	SALDO A FAVOR DE ACUATODOS								$ 4.157,00
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				$ 16.840.474.491,00				$ 16.840.474.491,00

SON: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($16.840.474.491,00)

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato

Para constancia de lo anterior, firman lo presente Acta Modificatoria No. 1, los que en ella intervinieron, en la Ciudad de Yopal a los 16 días del mes de mayo de 2025

MARIA DORIS HERRERA ALFONSO
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S
Contratista

PRIMITIVO ALEXIS GONZALEZ SANCHEZ
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S
Director de Obra

LUIS ANDRES LOPEZ MESA
UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023
Interventor / Director de Interventoría

N.I.A.
Apoyo a la Supervisión
ACUATODOS S.A. E.S.P.

ROBERT AGIS HERNANDEZ CACHAY
Subgerente Técnico y Operativo
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare ACUATODOS S.A. E.S.P.
Supervisor

JULIO CESAR CUERVO JIMENEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare
ACUATODOS S.A. E.S.P.

NOTAS

a) Los Contratista y Vuelen Compromiso en lo siguiente NOL con Responsabilidad Social contenido y en Contrato.
b) El incumplimiento o dependencia que acierta el juego de lo anterior sea a su nombre incurrirá sobre daño el principio de confidencialidad y responsabilidad con que los interventores y el contratista realizan en ambiente en SIGOS y los términos documentales por parte de la interventoría, supervisor de acuerdo a manuales

NOTA: EN CASO DE REQUERIRSE, SE AUTORIZA ADICIONAR LAS CASILLAS QUE SE REQUIERAN, PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

aguatodos

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "AGUATODOS S.A. E.S.P."

ACTA No. 10 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2

DISEÑO Y CONSTRUCCION ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☒ OTRO ☐

CONTRATO No.	033-24-2023
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO INDICADO EN PALOS, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA	SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. MARIA DORIS BARRERA ALFONSO
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - LUIS ANDRES LOPEZ MEGA
SUPERVISOR	ING. ROBERT ADELFO HERNANDEZ CADAVID
PROFESIONAL DE APOYO	N/A
GERENTE	ING. JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

FECHA DE INICIACION:	21 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DOCE (12) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL:	CINCO (5) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIECISIETE (17) MESES
FECHA TERMINACIÓN:	19 DE AGOSTO DE 2025
VALOR INICIAL:	$ 16.806.474.467,08
VALOR ANTERIOR:	$8.429.237.245,68
VALOR ADICIÓN:	$0,00
VALOR TOTAL:	$ 16.806.474.467,08
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESENTE ACTA:	21,25%

ACTA No. 10 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2

FECHA 16 DE JULIO DE 2024

PERIODO PAGO MES

DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 y DEL 27 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES MODIFICACION No. 1		CANTIDADES ACUMULADAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
Cap.	Subcap.	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	PRECIO/UNIT	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1		**PRELIMINARES**												
	1.1	Demolición de estructuras a nivel en concreto reforzado con retiro	m²	342,82	$302.765,00	$ 195.291.853,70	259,48	$ 78.543.079,00	265,48	$ 79.949.979,80		$ -	259,48	$ 78.049.979,80
	1.2	Servicio, limpieza y retiro material sobra de tuberías alcantarillado y pozos de inspección	m	774,44	$18.590,00	$ 14.567.216,60	774,44	$ 14.567.216,60	774,44	$ 14.567.216,60		$ -	774,44	$ 14.567.216,60
	1.3	Movilización y desmovilización de equipo pesado	km	422,80	$43.231,60	$ 18.280.612,08	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
	1.4	Retiro de tubería existente con manejo de aguas residuales de 14" a 36"	m	237,34	$15.029,00	$ 4.016.342,08	132,68	$ 2.534.767,72	132,68	$ 2.534.767,72		$ -	132,68	$ 2.534.767,72
		TOTAL PRELIMINARES				$ 232.316.334,56		$ 93.141.963,12		$ 93.141.963,12		$ -		$ 93.141.963,12
2		**OPTIMIZACIÓN RED PLUVIAL CENTRO POBLADO**												
	2.1	Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado	m	1.696,80	$8.040,00	$ 12.370.611,08	2.943,49	$ 17.385.572,00	1.571,35	$ 10.359.480,00	748,60	$ 4.913.154,40	2.319,95	$ 15.272.637,40
	2.2	Excavación manual en material común	m³	1.134,80	$48.646,00	$ 54.326.950,08	1.721,68	$ 78.979.848,48	1.916,74	$ 88.611.078,26	280,62	$ 11.631.927,58	1.257,39	$ 57.645.391,84
	2.3	Excavación mecánica en material común 0 - 2 m (para zanjeria)	m³	3.318,31	$19.212,80	$ 59.884.869,72	5.764,69	$ 98.257.417,60	5.900,31	$ 33.782.748,72	1.834,67	$ 10.833.530,04	5.124,98	$ 52.336.245,76
	2.4	Relleno zona de atraque de tubería con material tipo granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	2.344,96	$408.470,00	$ 1.104.656.828,14	2.779,24	$ 1.135.239.979,78	2.159,68	$ 882.164.489,68	619,56	$ 255.071.673,28	2.779,24	$ 1.135.236.162,96
	2.5	Tubería PVC alcantarillado 12". Suministro e instal.	m	486,36	$185.515,00	$ 127.330.815,48	681,45	$ 126.421.251,90	518,12	$ 96.119.031,58	163,34	$ 30.302.220,32	681,46	$ 126.421.251,90
	2.6	Tubería PVC alcantarillado 16". Suministro e instal.	m	15,80	$337.190,00	$ 5.341.613,09	11,85	$ 3.995.701,50	-	$ -	11,85	$ 3.995.701,50	11,85	$ 3.995.701,50
	2.7	Tubería PVC alcantarillado 20". Suministro e instal.	m	222,51	$552.197,00	$ 122.856.369,07	219,82	$ 122.626.732,24	219,82	$ 122.626.732,24	-	$ -	219,82	$ 122.626.732,24
	2.8	Tubería PVC alcantarillado 24". Suministro e instal.	m	374,72	$969.772,00	$ 363.331.808,09	369,22	$ 359.194.345,50	184,61	$ 179.684.186,75	184,61	$ 179.510.158,75	369,22	$ 359.194.345,50
	2.9	Tubería PVC alcantarillado 27". Suministro e instal.	m	291,80	$664.119,00	$ 198.993.340,61	699,59	$ 196.540.965,21	199,59	$ 134.540.965,21	-	$ -	199,59	$ 196.540.965,21
	2.10	Tubería PVC alcantarillado 30". Suministro e instal.	m	357,34	$1.312.279,00	$ 412.602.854,16	315,45	$ 428.495.766,57	163,43	$ 428.495.766,57	-	$ -	255,45	$ 428.495.766,57
	2.11	Tubería PVC alcantarillado 36". Suministro e instal.	m	86,36	$2.668.541,00	$ 218.671.578,58	81,14	$ 234.457.519,02	81,14	$ 234.457.519,02	-	$ -	81,14	$ 234.457.519,02
	2.12	Suministro tanque SL-200 en monoposteria	und	43,00	$4.518.029,00	$ 194.275.247,00	46,00	$ 207.829.334,00	20,00	$ 90.330.668,00	26,00	$ 117.498.754,00	46,00	$ 207.829.334,00
	2.13	Suministro tanque SL-250 en monoposteria	und	18,00	$5.211.071,00	$ 93.330.900,00	15,00	$ 83.330.900,00	9,00	$ 46.998.915,00	7,00	$ 36.663.125,00	16,00	$ 83.330.900,00
	2.14	Demolición de pozos de inspección Di=1.20m Hi= 2.0 a 3.0 m	und	3,00	$227.165,00	$ 681.495,09	3,00	$ 681.495,09	3,00	$ 681.495,09		$ -	3,00	$ 681.495,09
	2.15	Pozo de inspección recto (sin cono truncado) H=1.0 - 1.5 m Ø 1.50 m	und	12,00	$4.839.601,90	$ 58.077.612,00	13,00	$ 62.917.413,00	11,00	$ 53.237.811,00	2,00	$ 9.679.602,00	13,00	$ 62.917.413,00
	2.16	Pozo de inspección recto (sin cono truncado) H=1.5 - 2.0 m Ø 1.50 m	und	3,00	$5.725.085,00	$ 17.175.255,00	3,00	$ 17.175.255,00	3,00	$ 17.175.255,00		$ -	3,00	$ 17.175.255,00
	2.17	Tapa levadiza con cerradura de seguridad en 3 aperturas para pozo aguas, en via (tec. asfalto y tapa)	und	15,00	$1.540.123,00	$ 23.102.025,00	31,00	$ 47.744.185,00	14,00	$ 21.961.890,00	17,00	$ 26.182.295,00	31,00	$ 47.744.185,00
	2.18	Placa de cubierta para pozos en Concreto de 4000 Psi reforzada 200 kg/cm²	m²	4,01	$1.758.990,00	$ 7.053.557,62	3,97	$ 6.982.138,24	-	$ -		$ -	-	$ -
	2.19	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	2.835,21	$35.575,00	$ 100.873.936,59	5.122,81	$ 182.264.456,98	2.498,73	$ 88.902.314,67	1.799,23	$ 64.014.804,17	4.297,96	$ 152.917.118,84
	2.20	Replanteo y localización de tuberías de acueducto	m	1.792,04	$4.536,00	$ 8.618.233,84	2.166,21	$ 9.647.580,68	1.649,12	$ 7.425.985,92		$ -	1.649,12	$ 7.425.985,92
	2.21	Retiro de tubería existente de acueducto PVC Ø 3"	m	1.519,57	$2.546,00	$ 3.918.745,22	1.662,71	$ 4.818.326,68	1.487,58	$ 3.788.193,40		$ -	1.487,58	$ 3.788.193,40
	2.22	Retiro y traslado de tubería subterra de polietileno para acueducto domiciliario de 1/2" a 4"	m	222,47	$3.246,00	$ 375.862,80	273,58	$ 338.148,09	152,22	$ 188.152,80		$ -	152,22	$ 188.152,80
	2.23	Tubería presión PVC RDE 21 2". Suministro e instal.	m	1.598,29	$37.637,00	$ 57.398.976,28	1.882,71	$ 70.858.326,27	1.487,58	$ 55.167.282,30		$ -	1.487,58	$ 55.167.282,30
	2.24	Curva presión PVC 90° x 2. Suministro e instal.	und	3,00	$24.508,00	$ 73.167,80	3,00	$ 73.167,00		$ -		$ -	-	$ -
	2.25	Tee de presión PVC 2". Suministro e instal.	und	8,00	$13.696,00	$ 396.291,60	17,00	$ 538.800,00		$ -		$ -	-	$ -
	2.26	Acometida domiciliaria acueducto PF+UND (L=1 m) Ø=1/2". Suministro e instal.	und	19,00	$169.505,00	$ 11.865.430,00	122,00	$ 20.683.098,00		$ -		$ -	-	$ -
	2.27	Unión de reparación liv.m) RDE 21 2". Suministro e instal.	und	14,00	$58.431,00	$ 832.004,80	14,00	$ 832.004,00		$ -		$ -	-	$ -
	2.28	Unión de reparación liv.m) RDE 21 3". Suministro e instal.	und	2,00	$93.503,00	$ 186.406,00	2,00	$ 186.406,00		$ -		$ -	-	$ -
	2.29	Válvula de compuerta sólidos vástago no ascendente extremos p. Ø 2". Suministro e instal.	und	3,00	$533.431,00	$ 1.868.862,80	2,00	$ 1.868.862,00		$ -		$ -	-	$ -

JCUAltodos

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES MODIFICACIÓN No. 1		CANTIDADES ACUMULADAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
Cap.	Subcap.	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	2.20	Reparación de acometida PP+UNID de 1/2" para acueducto	m	400.00	$18.045,00	$ 7.218.000,00	24.00	$ 433.080,00		$ -		$ -	-	$ -
	2.21	Reparación de acometida domiciliaria alcantarillado Ø= 6"	m	40.00	$116.980,00	$ 4.679.200,00	96.00	$ 10.835.040,00		$ -		$ -	-	$ -
	2.22	Reparación tubería de gas Polietileno PE-80 de 1/2"	und	150.00	$97.945,00	$ 9.791.500,00	26.80	$ 2.544.079,80		$ -		$ -	-	$ -
	2.23	Tubería PVC alcantarillado 42". Suministro e instal.	m	12.00	$3.403.963,00	$ 40.843.956,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
		ITEMS NO PREVISTOS OPTIMIZACIÓN RED PLUVIAL CENTRO POBLADO												
	2.24	NP-1 Tubería PVC alcantarillado 8". Suministro e instal.	m		$83.799,00	$ -	196.47	$ 20.534.686,53		$ -	94.05	$ 9.836.167,45	94.05	$ 9.836.167,45
	2.25	NP-2 Tubería PVC alcantarillado 8". Suministro e instal.	m		$98.483,00	$ -	209.47	$ 20.718.432,31		$ -	209.47	$ 20.718.432,31	209.47	$ 20.718.432,31
	2.26	NP-3 Kit silla Yee PVC 8 x 6 (200 x 160 mm). Suministro e instal.	und		$278.282,80	$ -	33.80	$ 9.216.636,38		$ -	10.00	$ 2.782.828,00	10.00	$ 2.782.828,00
	2.27	NP-4 Relleno en Arena Lavada Aplicada para Anclaje de la Tubería con Transporte	m³		$373.244,80	$ -	581.80	$ 216.994.764,36		$ -	54.50	$ 20.491.085,60	54.50	$ 20.491.085,60
	2.28	NP-5 Pozo de inspección recto (sin cono) buzonado H=1.8 - 1.5 m Ø 1.20 m	und		$1.383.754,80	$ -	2.00	$ 8.167.508,00		$ -	2.00	$ 8.167.508,00	2.00	$ 8.167.508,00
	2.29	NP-6 Pozo de inspección recto (sin cono) buzonado H=2.8 - 2.5 m Ø 1.20 m	und		$5.804.944,30	$ -	1.00	$ 5.804.944,30		$ -	1.00	$ 5.804.944,30	1.00	$ 5.804.944,00
	2.30	NP-7 Pozo de inspección recto (sin cono) buzonado H=2.8 - 3.0 m Ø 1.20 m	und		$6.400.080,00	$ -	1.00	$ 6.400.080,00		$ -	1.00	$ 6.400.080,00	1.00	$ 6.400.000,00
	2.31	NP-8 Pozo de inspección recto (sin cono) buzonado H=3.5 - 4.0 m Ø 1.20 m	und		$7.891.620,80	$ -	1.00	$ 7.891.620,08		$ -	1.00	$ 7.891.620,08	1.00	$ 7.891.620,80
	2.32	NP-9 Caja de inspección HOMO	und		$869.295,00	$ -	37.00	$ 32.164.595,00		$ -		$ -	-	$ -
	2.33	NP-10 Tubería PP+UM 0.9". Suministro e instal.	m		$8.470,00	$ -	626.97	$ 5.961.138,18		$ -		$ -	-	$ -
	2.34	NP-11 Tapón roscado PVC 2". Suministro e instal.	und		$11.121,20	$ -	15.00	$ 166.815,00		$ -		$ -	-	$ -
		TOTAL OPTIMIZACIÓN RED PLUVIAL CENTRO POBLADO				$ 3.317.342.115,58		$ 3.757.539.467,47		$ 2.556.208.920,86		$ 880.499.426,28		$ 3.994.798.262,16
3		CONSTRUCCIÓN EMBARRO A ESTRUCTURA DE DESCARGA												
	3.1	Replanteo y localización de tuberías en alcantarillado	m	286.47	$6.598,20	$ 1.753.372,68	257.30	$ 1.782.762,09	268.47	$ 1.753.372,60		$ -	268.47	$ 1.753.372,60
	3.2	Excavación a mano en material común 2 A 3 m	m³	142.25	$77.445,30	$ 11.018.558,04	138.61	$ 10.734.374,23	138.61	$ 10.734.374,23		$ -	138.61	$ 10.734.374,23
	3.3	Excavación mecánica en material común 2 - 4 m (área restringida)	m³	1.394.02	$11.537,30	$ 16.040.418,74	1.394.02	$ 16.040.418,74	1.394.02	$ 16.040.418,74		$ -	1.394.02	$ 16.040.418,74
	3.4	Entibado tipo 3, apuntalamiento metálico tipo tablestacado	m²	1.151.11	$54.598,30	$ 62.861.378,68	1.308.50	$ 74.035.264,74	1.151.11	$ 62.848.320,78		$ -	1.151.11	$ 62.848.320,78
	3.5	Relleno zona de atraque de tubería con material hare granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	975.62	$405.478,30	$ 395.581.503,40	968.19	$ 395.581.839,30	968.19	$ 395.865.839,30		$ -	968.19	$ 395.865.839,30
	3.6	Tubería PVC alcantarillado 60". Suministro e instal.	m	286.47	$6.590.680,20	$ 1.708.332.720,69	264.40	$ 1.892.075.392,00	264.40	$ 1.892.075.392,00		$ -	264.40	$ 1.892.075.392,00
	3.7	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	962.71	$35.578,30	$ 35.249.629,09	773.79	$ 27.530.614,41	773.79	$ 27.530.674,41		$ -	773.79	$ 27.530.674,41
	3.8	Pozo de inspección recto (sin cono buzonado) H= 2.0 - 2.5 m Ø 1.50 m	und	3.00	$6.424.990,30	$ 19.674.970,00	3.00	$ 19.674.970,00	3.00	$ 19.674.970,00		$ -	3.00	$ 19.674.970,00
	3.9	Placa de tubería para pozos en Concreto de 4000 Psi, resistencia 280 kg/cm²	m²	1.83	$1.788.992,30	$ 2.997.108,98	0.57	$ 1.002.625,64	-	$ -		$ -	-	$ -
	3.10	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en hierro marca y tipo)	und	3.00	$1.540.135,00	$ 4.620.405,00	4.00	$ 6.160.540,00	3.00	$ 4.620.405,00		$ -	3.00	$ 4.620.405,00
		TOTAL CONSTRUCCIÓN EMBARRO A ESTRUCTURA DE DESCARGA				$ 2.258.780.351,09		$ 2.250.467.071,89		$ 2.231.982.948,06		$ -		$ 2.231.982.948,06
4		CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE DESCARGA												
	4.1	Desagote manual con bote	m³	296.84	$10.797,30	$ 3.205.415,24	296.84	$ 3.205.415,24	296.84	$ 3.205.415,24		$ -	296.84	$ 3.205.415,24
	4.2	Excavación mecánica en material común 0 - 8 m (área restringida)	m³	1.783.16	$13.805,30	$ 24.616.523,80	1.960.78	$ 30.634.067,80	474.44	$ 6.549.920,30		$ -	474.44	$ 6.549.920,30
	4.3	Entibado tipo 3, apuntalamiento metálico tipo tablestacada	m²	249.51	$54.598,30	$ 13.622.786,68	145.84	$ 7.870.782,32	145.84	$ 7.870.782,02		$ -	145.84	$ 7.870.782,02
	4.4	Sub base granular seleccionada o clasificada	m³	19.16	$91.522,00	$ 1.743.081,52	22.44	$ 2.941.533,68	16.80	$ 1.715.764,79		$ -	16.80	$ 1.715.764,79
	4.5	Geomalla biaxial para refuerzo TX-5. Suministro e instal.	m²	185.46	$19.999,70	$ 3.732.172,54	86.85	$ 1.712.434,37	44.80	$ 883.500,15		$ -	44.80	$ 883.500,15
	4.6	Paso o plaza en Piedra Pegada e = 0.25 m	m²	6.40	$198.820,00	$ 1.253.246,80	6.40	$ 1.253.246,80	-	$ -		$ -	-	$ -
	4.7	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	5.528,60	$10.448,00	$ 55.666.852,80	5.960,42	$ 51.815.276,16	2.638,20	$ 27.562.413,60		$ -	2.638,20	$ 27.562.513,60
	4.8	Placa a tosa de Rieda en Concreto 4000 Psi impermeabilizado, resistencia 280 kg/cm²	m³	22.96	$1.631.375,00	$ 37.459.362,50	23.72	$ 38.838.535,00	16.21	$ 23.267.098,75		$ -	16.21	$ 23.267.098,75
	4.9	Dilatación en Canto PVC 015	m	77.37	$95.759,00	$ 7.362.451,83	77.37	$ 7.362.451,83	38.11	$ 3.529.689,49		$ -	38.11	$ 3.529.689,49
	4.10	Muro en concreto 4000 psi impermeabilizado, resistencia 280 kg/cm²	m³	39.14	$2.016.268,00	$ 78.959.380,52	46.50	$ 94.639.962,00	28.84	$ 69.325.343,52		$ -	28.84	$ 69.325.343,52
	4.11	Compuerta chapaleta D.N. 60" (1500 mm) según AWWA C-561, cuerpo circular, obturador y brazos en acero inoxidable, con lenteleria y empaques incluye transporte montaje e instalación	und	1.00	$151.062.880,00	$ 151.062.880,00	1.00	$ 151.062.880,00	1.00	$ 151.062.880,00		$ -	1.00	$ 151.062.880,00
	4.12	Rejilla para retención de sólidos gruesos, en tubo HC ø 1" c/8 cm, altura 1.95 m, ancho 2.0 m, incluye soldadura pintura, corte boca de pez, transporte, montaje e instalación.	und	1.00	$12.806.203,00	$ 12.000.200,00	1.00	$ 12.000.200,00		$ -		$ -	-	$ -

acuatodos

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES MODIFICACION No. 1		CANTIDADES ACUMULADAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
Cap.	Subcap.	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	PRECIO/UNIT	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	4.13	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	228,84	$35.570,00	$ 8.144.368,80	639,16	$ 22.825.080,84	219,26	$ 7.801.051,54		$ -	219,26	$ 7.801.051,54
	4.14	Rasgada en Tubo H.D (8"x2" a12.5 atm H.D 60 m	m	26,64	$134.836,00	$ 3.626.481,84	55,32	$ 6.526.479,88	-	$ -		$ -	-	$ -
		TOTAL CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE DESCARGA				$ 388.858.388,66		$ 426.331.318,42		$ 295.003.319,31		$ -		$ 295.003.319,31
5		OBRAS DE PROTECCIÓN												
	5.1	Replanteo y localización manual para obras de protección (planimetría y altimetría)	m²	1.170,00	$6.726,00	$ 7.868.420,00	1.228,00	$ 8.266.254,00		$ -	1.228,79	$ 8.264.841,54	1.228,79	$ 8.264.841,54
	5.2	Manejo, control y extracción de agua	h	312,00	$36.950,00	$ 11.216.400,00	480,00	$ 17.256.000,00		$ -	480,00	$ 17.256.000,00	480,00	$ 17.256.000,00
	5.3	Excavación de cortes, canales y pretiles en Piz (incluye Transporte acarreo max. 2.00 m)	m³	919,13	$17.607,00	$ 16.189.121,91	2.142,40	$ 37.721.296,88		$ -	2.140,19	$ 37.682.326,33	2.140,19	$ 37.682.326,33
	5.4	Excavación a mano en material común	m³	86,40	$45.846,00	$ 4.629.471,32	111,22	$ 5.098.592,12		$ -	111,09	$ 5.093.032,14	111,09	$ 5.093.032,14
	5.5	Perfilada mecánica de talud 1:1 a 45°	m²	883,20	$5.645,00	$ 4.987.121,75	1.120,00	$ 6.098.400,00		$ -	1.120,00	$ 6.098.400,00	1.120,00	$ 6.098.400,00
	5.6	Concreto Nd Tipo3 3000	m³	1.819,36	$17.112,00	$ 31.132.088,32	2.012,00	$ 34.443.032,08		$ -	1.590,63	$ 27.218.688,14	1.590,63	$ 27.218.688,14
	5.7	Concreto ciclopeo de resistencia 1500 psi	m³	186,39	$952.135,00	$ 177.460.171,68	211,82	$ 205.561.612,06		$ -	191,43	$ 180.352.528,19	191,43	$ 180.352.528,19
	5.8	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	267,54	$10.540,00	$ 3.795.277,92	596,16	$ 8.124.130,08		$ -	424,12	$ 4.431.205,76	424,12	$ 4.431.205,76
	5.9	Bolsacreto con cemento - arena de 1.25 x 2 (Potosinor 1.0	acat	1.189,80	$704.459,00	$ 684.798.341,00	1.408,00	$ 778.580.354,08		$ -	1.134,00	$ 628.706.906,08	1.134,00	$ 628.706.906,08
		ITEMS NO PREVISTOS OBRAS DE PROTECCIÓN												
	5.10	Excavación mecánica en material común 2 - 4 m (para estribos)	m³		$11.937,00	$ -	5.662,54	$ 68.131.662,00		$ -	5.658,53	$ 68.083.408,61	5.658,53	$ 68.083.408,61
	5.11	Enrocado tipo 3 (guarda lateral) acuatodos tipo (enterrocado)	m³		$54.586,00	$ -	248,00	$ 13.193.530,00		$ -	240,00	$ 13.105.529,00	240,00	$ 13.105.529,00
	5.12	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³		$35.570,00	$ -	942,28	$ 33.522.533,60		$ -	940,54	$ 33.463.472,68	940,54	$ 33.463.472,68
		TOTAL OBRAS DE PROTECCIÓN				$ 922.232.054,10		$ 1.281.197.169,56		$ -		$ 1.022.116.122,67		$ 1.022.116.122,67
6		TRANSPORTE												
	6.1	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	m³ Km	477.775,16	$2.074,80	$ 990.915.653,40	374.860,22	$ 777.468.095,28	328.123,30	$ 680.527.724,28	26.453,00	$ 55.005.850,92	354.537,23	$ 735.541.175,02
	6.2	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	m³ Km	474.615,28	$2.130,80	$ 1.048.630.665,00	272.327,79	$ 580.629.399,10	325.999,30	$ 710.889.897,90	26.268,49	$ 61.998.299,57	254.215,79	$ 776.795.227,47
	6.3	Cargue y retiro mecánico de material, con cucharon y 0.4 cms	m³	16.398,10	$17.864,30	$ 267.665.163,60	16.264,83	$ 264.488.625,12	9.681,17	$ 171.106.648,99	2.388,80	$ 42.112.924,80	11.982,37	$ 213.019.183,89
		TOTAL TRANSPORTE				$ 3.268.089.632,85		$ 1.868.534.635,50		$ 1.566.673.390,98		$ 183.712.484,39		$ 1.739.385.887,37
7		OBRAS COMPLEMENTARIAS												
	7.1	Excavación de cortes, canales y pretiles (Acarreo hasta 5 kms)	m³	11.982,06	$19.658,80	$ 216.741.756,80	18.992,16	$ 214.566.465,76	7.134,21	$ 139.530.879,18	3.857,88	$ 75.452.417,84	10.992,08	$ 215.983.296,22
	7.2	Terraplén o rellenos con material de corte (a 1Km 2Km)	m³	418,08	$21.126,00	$ 8.831.374,08	685,24	$ 12.787.548,72	375,42	$ 7.901.973,78	229,82	$ 4.835.636,96	605,24	$ 12.737.610,72
	7.3	Conformación vía urbana (incluye perfilada, nivelación, conformar, y cunetiada)	km	1,00	$2.264.879,00	$ 4.484.460,40	2,85	$ 4.643.091,95	1,32	$ 2.989.648,28	0,71	$ 1.653.361,67	2,85	$ 4.643.091,95
	7.4	Cosmetilla triaxial para refuerzo TX-5, Suministro e instal.	m²	23.885,16	$19.836,00	$ 473.818.164,60	18.197,16	$ 326.662.644,24	10.722,76	$ 211.227.649,24	7.384,40	$ 145.445.295,60	18.107,16	$ 356.672.944,84
	7.5	Geocreal tejido de alto modulo 80-80 (998080)	m²	23.885,16	$25.982,00	$ 572.818.862,80	17.284,00	$ 414.507.288,28	10.235,36	$ 245.464.403,52	7.048,74	$ 169.042.882,68	17.284,10	$ 414.507.286,20
	7.6	Sub base granular seleccionada o clasificada	m³	5.254,34	$81.302,00	$ 427.208.525,68	4.116,00	$ 324.963.771,08	3.402,82	$ 327.855.982,64	551,50	$ 46.937.753,00	4.114,32	$ 374.493.626,84
	7.7	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	25.871,68	$10.448,00	$ 269.784.376,80	37.550,64	$ 392.326.697,12	13.953,01	$ 145.761.048,48	25.987,34	$ 269.545.008,32	37.550,35	$ 392.326.056,80
	7.8	Acero de Transferencia fmc de 60000 Psi	Kg	11.418,62	$9.976,00	$ 113.953.289,78	13.705,80	$ 136.165.017,15	4.861,64	$ 48.508.443,49	9.674,24	$ 95.517.473,40	13.705,88	$ 136.162.551,80
	7.9	Corte de pavimento en Concreto MR 41 kg/cm² con 18 cm	m²	16.167,17	$264.576,00	$ 3.967.630.981,92	16.390,20	$ 4.000.105.446,08	4.813,76	$ 1.131.404.681,76	8.191,50	$ 2.241.914.152,80	13.005,26	$ 3.417.318.834,56
	7.10	Junta de dilatación 6 cm x 6 mm	m	9.878,57	$36.471,00	$ 362.709.926,47	7.931,68	$ 115.975.507,68	-	$ -		$ -	-	$ -
	7.11	Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.60) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.02 m	m	3.708,00	$182.422,00	$ 676.788.776,00	2.992,64	$ 506.342.174,08	1.977,61	$ 280.550.721,42	1.015,00	$ 193.991.402,66	2.992,64	$ 506.512.174,08
	7.12	Sardinel Prefabricado (0.60 x 0.20 x 0.40) Incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m	m	268,19	$82.431,00	$ 22.148.288,78	588,73	$ 48.612.033,63	287,54	$ 23.953.580,74	122,19	$ 26.558.443,88	588,73	$ 48.612.033,63
	7.13	Sardinel especial A-180 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5)	und	218,00	$73.055,00	$ 15.924.718,00	858,00	$ 48.627.460,00	180,80	$ 12.123.770,80	802,00	$ 36.885.899,00	668,00	$ 48.827.460,00
	7.14	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm	und	32,00	$323.156,00	$ 10.340.992,00	32,00	$ 10.340.992,00	-	$ -		$ -	-	$ -
	7.15	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	m²	284,76	$38.984,00	$ 11.099.388,64	284,76	$ 11.099.388,64	-	$ -		$ -	-	$ -
	7.16	Líneas de demarcación de ancho 12" cm (en pintura acrílica, incluye cinco esferas (MV. 708.1)	ml	6.710,80	$4.536,80	$ 30.449.980,80	6.710,80	$ 30.449.980,80	-	$ -		$ -	-	$ -
	7.17	Estoperol metálico 14 x 4 cm	und	360,80	$28.978,80	$ 10.519.014,80	360,80	$ 10.519.014,80	-	$ -		$ -	-	$ -
	7.18	Pintura imprimante base para líneas de ancho 12 cms	ml	6.710,80	$2.726,80	$ 18.311.590,80	6.710,80	$ 18.311.590,80	-	$ -		$ -	-	$ -
	7.19	Pintura imprimante base para marcas viales demarcación (símbolos y letreros)	m²	284,76	$22.685,80	$ 6.464.365,42	284,76	$ 6.454.085,40	-	$ -		$ -	-	$ -
		TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS				$ 8.757.456.144,33		$ 6.522.117.658,49		$ 2.533.654.512,83		$ 2.194.317.549,82		$ 5.727.972.131,84
8		TRASLADO REDES ELÉCTRICAS												
	8.1	DESMANTELAMIENTO RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV												
	8.1.1	Desmantelamiento de red primaria con hasta 3 Nº 2 ACSR	m	281,60	$14.875,00	$ 596.337,75	480,80	$ 868.520,25	201,60	$ 596.337,75		$ -	281,60	$ 596.337,75
	8.1.2	Retiro de postes de hormigón/otro	und	40,00	$43.131.316,00	$ 37.870.660,00	51,00	$ 32.196.615,00	48,00	$ 30.554.156,00		$ -	48,00	$ 30.554.156,00

Cap.	Subcap.	PARTIDAS DE PAGO	UNID	CONDICIONES GENERALES CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CONDICIONES MODIFICACION No. 1 CANTIDAD	VALOR	CANTIDADES ACUMULADAS ANTERIORES CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	TOTAL ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
	8.1.3	Cruceta de estructura de red de 13.2 KV.	und	4.00	$84.967,00	$ 339.828,00	4,00	$ 339.828,00	4,00	$ 339.828,00		$ -	4,00	$ 339.828,00
	8.1.4	Cromarterlamiento de transformador existente.	und	3,00	$296.362,50	$ 889.088,00	3,00	$ 889.088,00	3,00	$ 889.088,00		$ -	3,00	$ 889.088,00
	8.1.5	Cromarterlamiento de red de baja tensión fase a fase a HP 2 ACSR	m	3.849,52	$2.172,50	$ 8.693.575,84	2.069,42	$ 4.494.780,24	2.069,42	$ 4.494.780,24		$ -	2.069,42	$ 4.494.780,24
		TOTAL DESMANTELAMIENTO RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV				$ 46.057.426,79		$ 38.895.934,49		$ 37.314.221,93		$ -		$ 37.314.221,93
	8.2	RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV												
	8.2.1	Seccionamiento en media tensión	tipo	8,29	$511.397,25	$ 177.279,83	0,34	$ 207.644,38	8,29	$ 177.279,83		$ -	8,29	$ 177.279,83
	8.2.2	Apertura de hueco para poste o templete de B.T.	und	5,00	$103.031,00	$ 515.155,00	8,00	$ 927.279,00	5,00	$ 515.155,00		$ -	5,00	$ 515.155,00
	8.2.3	Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, izamiento, hincada y plomada	und	5,00	$2.883.435,00	$ 14.417.175,00	7,80	$ 20.984.045,00	5,00	$ 14.417.175,00		$ -	5,00	$ 14.417.175,00
	8.2.4	Cimentación poste estructurado de B.T.	und	5,00	$244.809,00	$ 1.224.045,00	8,00	$ 2.000.361,00	5,00	$ 1.224.045,00		$ -	5,00	$ 1.224.045,00
	8.2.5	Suministro, tendida y tensionada de red de media tensión 3ff en cable suministrado para red compacta (3 x n° 1/0)	m	395,67	$58.200,00	$ 69.497.191,61	344,00	$ 23.951.800,00	285,67	$ 16.497.191,61		$ -	285,67	$ 16.497.191,61
	8.2.6	Suministro y vestida de estructura LA1H1	und	2,00	$1.072.035,00	$ 2.144.070,00	6,00	$ 6.432.180,00	2,00	$ 2.144.070,00		$ -	2,00	$ 2.144.070,00
	8.2.7	Suministro y vestida de estructura LA1R1	und	1,00	$518.898,00	$ 518.898,00	2,00	$ 1.037.796,00	1,00	$ 518.898,00		$ -	1,00	$ 518.898,00
	8.2.8	Suministro y vestido de estructura de pórtico TIPO(A) (KCEL 7.00)	und	2,00	$1.916.100,00	$ 3.832.200,00	2,00	$ 3.832.200,00	2,00	$ 3.832.200,00		$ -	2,00	$ 3.832.200,00
	8.2.9	Suministro y colocación de empalmadores red compacta	und	41,00	$102.528,00	$ 4.203.648,00	41,00	$ 4.203.648,00	41,00	$ 4.203.648,00		$ -	41,00	$ 4.203.648,00
	8.2.10	Suministro, tendida y tensionada de cable mensajero cu acero extrafortizado 3/8	m	285,67	$12.307,00	$ 3.516.202,69	344,00	$ 4.233.808,00	285,67	$ 3.516.202,69		$ -	285,67	$ 3.516.202,69
	8.2.11	Suministro e instalación de guaya a tierra para cable mensajero	und	2,00	$761.138,00	$ 1.522.276,00	2,00	$ 1.522.276,00	2,00	$ 1.522.276,00		$ -	2,00	$ 1.522.276,00
	8.2.12	Estructura R-550, con aislador suspensión antifalco-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	und	2,00	$1.015.624,00	$ 2.031.248,00	2,00	$ 2.031.248,00	2,00	$ 2.031.248,00		$ -	2,00	$ 2.031.248,00
	8.2.13	Descargadores de sobre tensión (pp/a) 15 KV cambio red compacta abierta. Suministro e instalación	und	2,00	$735.096,00	$ 1.470.192,00	2,00	$ 1.470.192,00	2,00	$ 1.470.192,00		$ -	2,00	$ 1.470.192,00
		TOTAL RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV				$ 55.071.568,73		$ 71.747.628,38		$ 55.071.568,73		$ -		$ 55.071.568,73
	8.3	RED TRENZADA BAJA TENSIÓN												
	8.3.1	Reglaneo de red de B.T.	km	3,20	$611.307,00	$ 1.956.182,40	2,11	$ 1.289.657,77	2,11	$ 1.289.657,77		$ -	2,11	$ 1.289.657,77
	8.3.2	Apertura de hueco para poste o templete de B.T.	und	99,00	$97.734,00	$ 9.675.666,00	165,00	$ 16.125.990,00	99,00	$ 9.675.666,00		$ -	99,00	$ 9.675.666,00
	8.3.3	Suministro, izamiento, hincada y plomada de poste de fortalecimiento de 10 m x 510 kgf	und	48,00	$1.599.535,00	$ 32.171.359,69	81,99	$ 65.568.125,00	48,36	$ 62.771.359,69		$ -	48,00	$ 62.771.359,69
	8.3.4	Suministro, izamiento, hincada y plomada de poste de fortalecimiento de 10 m x 1.050 kgf	und	53,00	$1.951.410,00	$ 103.424.889,00	94,00	$ 183.378.302,00	53,00	$ 103.424.889,00		$ -	53,00	$ 103.424.889,00
	8.3.5	Cimentación poste estructurado de B.T.	und	51,00	$206.181,00	$ 10.515.231,00	94,00	$ 19.379.714,00	51,00	$ 10.515.231,00		$ -	51,00	$ 10.515.231,00
	8.3.6	Suministro e instalación de puesta a tierra en acero inoxidable para Terminal de cabal en baja tensión e iluminación	und	34,00	$616.633,00	$ 20.965.522,00	34,00	$ 20.965.522,00	34,00	$ 20.965.522,00		$ -	34,00	$ 20.965.522,00
	8.3.7	Suministro y vestida de estructura de suspensión LA 320 (L-3000) sin caja de distribución de acometidas.	und	45,00	$117.552,00	$ 5.665.936,00	45,00	$ 5.665.936,00	45,00	$ 5.665.936,00		$ -	45,00	$ 5.665.936,00
	8.3.8	Suministro y vestida de estructura de suspensión LA 321 (L-3000) sin caja de distribución de acometidas.	und	28,00	$126.672,00	$ 3.548.816,00	28,00	$ 3.548.816,00	28,00	$ 3.548.816,00		$ -	28,00	$ 3.548.816,00
	8.3.9	Suministro y vestida de estructura de tangencial LA 323 (L-3000) sin caja de distribución de acometidas.	und	2,00	$286.140,00	$ 572.986,00	2,00	$ 572.986,00	2,00	$ 572.986,00		$ -	2,00	$ 572.986,00
	8.3.10	Suministro y vestida de estructura de tangencial LA 324 (L-3000) sin caja de distribución de acometidas.	und	15,00	$118.782,00	$ 2.481.730,00	15,00	$ 2.481.730,00	15,00	$ 2.481.730,00		$ -	15,00	$ 2.481.730,00
	8.3.11	Suministro y vestida de estructura de suspensión LA 327 (L-3000) sin caja de distribución de acometidas.	und	18,00	$395.977,00	$ 5.711.632,00	18,00	$ 5.711.632,00	18,00	$ 5.711.632,00		$ -	18,00	$ 5.711.632,00
	8.3.12	Estructura L3/180 de terminación de circuito secundario salvo de red trenzada a red abierta. Suministro y vestida.	und	11,00	$167.736,00	$ 1.845.116,00	10,00	$ 1.677.360,00	10,00	$ 1.677.360,00		$ -	10,00	$ 1.677.360,00
	8.3.13	Suministro e instalación de caja tipo intemperie para acometidas (caja de distribución de acometidas).	und	66,00	$707.629,00	$ 46.663.914,00	19,00	$ 12.520.149,00	66,00	$ 46.663.914,00		$ -	66,00	$ 46.663.914,00
	8.3.14	Suministro, tendida y tensionada de red trenzada de baja tensión 3Ø, 4 H en cable aluminio XLPE (3 x 35 + 1 x 50 mm2)	m	3.283,59	$39.974,00	$ 125.338.725,24	2.107,82	$ 82.371.697,78	2.107,82	$ 82.371.697,78		$ -	2.107,82	$ 82.371.697,78
		TOTAL RED TRENZADA BAJA TENSIÓN				$ 418.979.977,05		$ 394.057.734,55		$ 376.308.287,55		$ -		$ 376.308.287,55
	8.4	SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN												
	8.4.1	Desmontaje, traslado y montaje de transformador de 45 KVA, 13.2 KV/208-120V existente incluye suministro e instalación de estructura T15.	und	3,00	$2.694.398,00	$ 8.083.194,00	3,00	$ 8.083.194,00	3,00	$ 8.083.194,00		$ -	3,00	$ 8.083.194,00
	8.4.2	Puesta a tierra para descargadores de sobretensión, con varilla de cobre de 5/8" x 2.4 m. Incluye cable de cobre desnuda AWG N° 2, tubo metálico galvanizado EMC 1/2" conta bandit, hebilla cinta bandit. Suministro e instalación	Und	5,00	$1.427.176,00	$ 7.135.880,00	5,00	$ 8.563.056,00	5,00	$ 7.135.880,00		$ -	5,00	$ 7.135.880,00

acuatodos

CONDICIONES GENERALES							CONDICIONES MODIFICACIÓN No. 1		CANTIDADES ACUMULADAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
Cap.	Subcap.	FACTORES DE PAGO	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		TOTAL SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN				$ 15.219.074,00		$ 16.845.238,00		$ 15.219.074,00		$ -		$ 15.219.074,00
	5.0	ALUMBRADO												
	5.5.1	Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente incluye: cable encauchetado 3X12 AWG y conector	und	77,00	$179.762,00	$ 13.841.674,00	66,00	$ 15.456.512,00	77,00	$ 13.841.674,00		$ -	77,00	$ 13.841.674,00
	5.5.2	Suministro e instalación de Luminaria Monofónica para alumbrado en cable antifraude	und	161,00	$415.953,00	$ 65.049.250,00	78,00	$ 32.784.334,00	82,00	$ 51.927.676,00	-16,00	$ -6.243.342,00	78,00	$ 32.784.334,00
		TOTAL ALUMBRADO				$ 58.890.937,00		$ 48.240.846,00		$ 54.889.350,00		$ (5.243.342,00)		$ 46.626.085,00
	6.0	ITEMS NO PREVISTOS TRASLADO REDES ELÉCTRICAS												
	6.6.1	NP-12 Suministro e instalación de Acometida Trifásica para usuario en cable antifraude	und		$912.667,00	$ -	14,00	$ 13.017.338,00		$ -	14,00	$ 13.017.338,00	14,00	$ 13.017.338,00
	6.6.2	NP-13 Estructura 711 transformador trifásico 45 KVA 13.2/6/20-120V, suministro, transporte y montaje	und		$22.491.201,00	$ -	3,00	$ 67.443.603,00		$ -	3,00	$ 67.443.603,00	3,00	$ 67.443.603,00
		TOTAL ITEMS NO PREVISTOS TRASLADO REDES ELÉCTRICAS				$ -		$ 81.060.941,00		$ -		$ 81.060.941,00		$ 81.060.941,00
		SUB TOTAL DEL PROYECTO				$ 10.701.997.335,73		$ 10.701.093.170,67		$ 9.845.489.656,52		$ 5.283.303.190,20		$ 15.193.712.626,00
		Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA				$ 18.096.969,00		$ 18.096.969,00		$ 12.883.970,00				$ 12.883.970,00
		Plan de Manejo de Tráfico PMT				$ 59.780.157,00		$ 59.780.157,00		$ 35.956.616,00				$ 35.956.616,00
		COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Ajustado al peso)				$ 10.840.474.481,00		$ 10.840.474.334,00		$ 9.893.710.303,00		$ 5.283.303.190,00		$ 15.151.802.542,00
		SALDO A FAVOR DE ACUATODOS S.A. E.S.P.						$ 4.157,00		$ -				
		COSTO TOTAL DEL PROYECTO						$ 10.840.474.491,00		$ 9.893.710.303,00		$ 5.283.303.190,00		$ 15.151.802.542,00
		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL (incluido AIU)				$ 5.283.303.190,00								
		Saldo Amortización del Anticipo				$ 2.933.286.796,50								
		VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA				$ 2.349.016.483,50								

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO	
EJECUTADO PRESENTE ACTA	34,79%
EJECUTADO ACUMULADO	98,00%
POR EJECUTAR	10,00%

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($5.263.303.190,00)

El inicio por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que haya referencia el citado contrato

Para constancia de lo anterior firman la presente Acta de Recibo Parcial de Obra No 7, hoy [illegible] en la ciudad de Yopal a los veintiún (21) días del mes de julio de 2023

Firma
Nombre: MARIA DORY BARRERA ALFONSO
Cargo: SINERGIA CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A.S
Contratista

Firma
Nombre: [illegible]
Cargo: [illegible]

Firma
Nombre: LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Cargo: EL SUPERVISOR UNION TEMPORAL DEL 04.2023
[illegible]

Firma
Nombre: N/A
Cargo: Profesional de apoyo a la supervisión
ACUATODOS S.A. E.S.P.

Firma
Nombre: ING. FERNANDO LUIS GONZALEZ SANCHEZ
Cargo: [illegible] CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Director de obra

Firma
Nombre: ING. ROBERT ALEXIS HERNANDEZ CARMO
Cargo: Subgerente Técnico y Operativo
SUPERVISOR [illegible] S.A. E.S.P.

Firma
Nombre: ING. JULIO CESAR CUEVAS [illegible]
Cargo: [illegible]
ACUATODOS S.A. E.S.P.

NOTAS

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

Original: Oficina de obra
Una copia: Interventor
Una copia: Contratista
Una copia: Supervisor Proyecto [illegible]

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	033 DE 2023
	19	8	2025		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

(Nombre dependiendo de la naturaleza del contrato / convenio / interventoría de la obra entre corchetes)

ACTA No. 17 **DE TERMINACIÓN DE CONTRATO POR**

Cumplimiento Objeto Contractual ☐ **Vencimiento de Plazo** ☑ **Obra Terminada** ☐

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐

CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA

(Indique en este espacio si el tipo de Obra Pública o corresponde a Estudios o Diseños, Diagnósticos para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO DE OBRA No. 033 (Número de contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

VIGENCIA PLAZO DE EJECUCION MAS OCHO (8) MESES

(Indique la vigencia del contrato según especificación establecida en el pliego de condiciones)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐ **CONCURSO DE MERITOS** ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. ACUA-SPO-002-2023

(Indique en este espacio la identificación de la solicitud pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

(Indique el objeto del contrato de ejecución vigente)

LOCALIZACION DEL PROYECTO CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO ONCE (11) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 21 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DEL 2023 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA No. 1 (09/12/2024)	CINCO (5) MESES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSION

ACTAS No	FECHA
ACTA No. 3 DE SUSPENSION No. 1	18 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA No. 4 DE REINICIACION No. 1	1 DE FEBRERO DE 2024
ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2	7 DE OCTUBRE DE 2024
ACTA No. 6 DE REINICIACION No. 2	7 DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA No. 9 DE SUSPENSION No. 3	13 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA No. 10 DE AMPLIACION No.1 SUSPENSION No.3	24 DE ENERO DE 2025
ACTA No. 11 DE REINICIACION No. 3	27 DE FEBRERO DE 2025

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO 20 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DEL 2024 (Año)

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 16.840.474.491,00

(Indique el valor del contrato suscrito en número)

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MICTE

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - RL MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO

(Escriba el nombre o razón social del contratista contratado)

INTERVENTOR UNION TEMPORAL DELTA 2023 - RL LUIS ANDRES LOPEZ MESA

(Escriba el nombre o razón social del interventor contratado)

SUPERVISOR SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - MIGUEL ANGEL FARIAS OSORIO

(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

CONTRATANTE GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Yopal Casanare; a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2025, se reunieron: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO, Representante Legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. en calidad de CONTRATISTA, LUIS ANDRES LOPEZ MESA Representante Legal de la UNION TEMPORAL DELTA 2023 en calidad de Interventor Contratado, el ingeniero JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ, Gerente General de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P." en calidad de CONTRATANTE, el ingeniero MIGUEL ANGEL FARIAS OSORIO, Subgerente Técnico y Operativo de ACUATODOS S.A. E.S.P en calidad de SUPERVISOR, con el fin de aprobar la presente Acta de Terminación del contrato de Obra Pública, anteriormente citado, dado que se venció el plazo de ejecución pactado.

(Cumplir o No Cumplir)

A. TRABAJO EJECUTADO

El trabajo Ejecutado se Relaciona a Continuación:

A.1. Consultoría

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR

A. 2. Obra Pública

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V.UNIT	V. TOTAL
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				SUBTOTAL	$ -
				AIU 0%	$ -
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$ -
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS	$ -
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA + AJUSTES	$ -

B. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

1. La presente acta se suscribe, por vencimiento del plazo contractual, una vez el contratista entregue la totalidad de los documentos y soportes que evidencien el cumplimiento del objeto contractual, se suscribirá el acta de recibo final.

2. El contratista se compromete a ejecutar cada una de las actividades y observaciones que sean realizadas por la interventoría del contrato, previo a la suscripción del acta de recibo final del contrato.

3. Para recibo y final y liquidación de la obra, la interventoría realizará una inspección general del proyecto, verificara en campo las cantidades ejecutadas y calidad de los productos a entregar y dado el caso, solicitará las correcciones pertinentes.

4. Para recibo de la obra, el contratista deberá realizar las reparaciones que la interventoría considere necesarias, y labores de limpieza general de la obra, las cuales se verificará en campo.

5. La terminación del contrato, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Nota: Las obras y trabajos que presentan observaciones por parte de la interventoría están relacionadas en esta Acta y se tendrán en cuenta para la Liquidación del Contrato de Obra de Acuerdo con la Clausula No. 33. LIQUIDACION del contrato anteriormente citado.

C. TRABAJO FALTANTE

SI NO

A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

C.1. Consultoría

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR

C. 2. Obra Pública

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V.UNIT	V. TOTAL
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				SUBTOTAL	$ -
				AIU 0%	$ -
				VALOR TOTAL OBRA FALTANTE	$ -

Los trabajos descritos son el soporte para que ACUATODOS S.A. E.S.P. inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las multas previstas en la Cláusula No 25 PENAL del Contrato en mención.

La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes Así mismo, el **Contratista** se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el Contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2025

(Firma)
(Nombre) **MARIA DIORY BARRERA ALFONSO**
R/Legal SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
Contratista

(Firma)
(Nombre) **LUIS ANDRES LOPEZ MESA**
R/Legal UNION TEMPORAL DELTA 2023
Interventor

(Firma)
(Nombre) **MIGUEL ANGEL FARIAS OSORIO**
R/Legal Subgerente Tecnico y Operativo
Supervisor

(Nombre) **JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ**
R/Legal Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto ylo Contrato

ANEXO 2.7.4
INFORME FINAL PARA RECIBO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 033 DE 2023, INFORME JURIDICO

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 – 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

2. INFORME JURIDICO

2.1 CUADRO CONTROL DE POLIZAS, GARANTIAS APROBADAS DEL CONTRATO DE OBRA

Pólizas iniciales

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	% SEGÚN CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
69974-0	CUMPLIMIENTO	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	20%	$ 3.368.094.898,20	25/08/2023	26/03/2025
69974-0	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	50%	$ 8.420.237.246,00	25/08/2023	26/03/2025
69974-O	SALARIOS Y PRESTACIONES	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	5%	$ 842.023.275,00	25/08/2023	26/07/2027
69974-O	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	20%	$ 3.368.094.898,20	24/07/2024	24/07/2029
20438-0	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	5%	$ 842.023.275,00	25/08/2023	26/07/2024

TABLA 2. INFORMACION DE POLIZAS INICIALES

Pólizas actualizadas según acta de inicio

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	% SEGÚN CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
69974-1	CUMPLIMIENTO	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	20%	$ 3.368.094.898,20	21/11/2023	22/06/2025
69974-1	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	50%	$ 8.420.237.246,00	21/11/2023	22/06/2025
69974-1	SALARIOS Y PRESTACIONES	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	5%	$ 842.023.275,00	21/11/2023	22/10/2027
69974-1	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	20%	$ 3.368.094.898,20	21/11/2024	22/10/2029

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	% SEGÚN CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
20438-1	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	5%	$ 842.023.275,00	21/11/2023	22/10/2024

TABLA 3. INFORMACION DE POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO

Pólizas actualizadas según acta de reinicio no. 1

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	% SEGÚN CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
69974-2	CUMPLIMIENTO	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	20%	$ 3.368.094.898,20	21/11/2023	07/08/2025
69974-2	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	50%	$ 8.420.237.246,00	21/11/2023	07/08/2025
69974-2	SALARIOS Y PRESTACIONES	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	5%	$ 842.023.275,00	21/11/2023	07/08/2027
69974-2	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	20%	$ 3.368.094.898,20	21/11/2024	05/12/2029
20438-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	5%	$ 842.023.275,00	21/11/2023	07/12/2024

TABLA 4. INFORMACION DE POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO No. 1

Pólizas actualizadas según acta de reinicio no. 2

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	% SEGÚN CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
69974-3	CUMPLIMIENTO	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	20%	$ 3.368.094.898,20	21/11/2023	07/09/2025
69974-3	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	50%	$ 8.420.237.246,00	21/11/2023	07/09/2025
69974-3	SALARIOS Y PRESTACIONES	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	5%	$ 842.023.275,00	21/11/2023	07/01/2028
69974-3	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	20%	$ 3.368.094.898,20	21/11/2024	04/01/2030

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	% SEGÚN CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
20438-3	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	5%	$ 842.023.275,00	21/11/2023	07/01/2025

TABLA 5. INFORMACION DE POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO No. 2

Pólizas actualizadas según acta de prorroga no. 1

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	% SEGÚN CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
69974-4	CUMPLIMIENTO	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	20%	$ 3.368.094.898,20	21/11/2023	05/02/2026
69974-4	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	50%	$ 8.420.237.246,00	21/11/2023	05/02/2026
69974-4	SALARIOS Y PRESTACIONES	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	5%	$ 842.023.275,00	21/11/2023	05/06/2028
69974-4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	20%	$ 3.368.094.898,20	21/11/2024	05/06/2030
20438-4	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	5%	$ 842.023.275,00	21/11/2023	05/06/2025

TABLA 6. INFORMACION DE POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA No.1

Pólizas actualizadas según acta de reinicio no. 3

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	% SEGÚN CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
69974-5	CUMPLIMIENTO	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	20%	$ 3.368.094.898,20	21/11/2023	19/04/2026
69974-5	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	50%	$ 8.420.237.246,00	21/11/2023	19/04/2026
69974-5	SALARIOS Y PRESTACIONES	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	5%	$ 842.023.275,00	21/11/2023	19/08/2028
69974-5	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	BERKELEY INTERNATIONAL	20%	$ 3.368.094.898,20	21/11/2024	19/08/2030

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	% SEGÚN CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
		SEGUROS COLOMBIA S.A.				
20438-5	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	BERKELEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	5%	$ 842.023.275,00	21/11/2023	19/08/2025

TABLA 7. INFORMACION DE POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE REINICIO No.3

Teniendo en cuenta que durante el periodo de ejecución se realizaron solicitudes de prórroga, se adjuntan las pólizas correspondientes con su respectiva aprobación emitida por la entidad contratante ACUATODOS S.A E.S.P.

Ver en el **ANEXO 2.7.1 COPIA GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA 033 DE 2023.**

2.2 CUADRO CONTROL DE PRORROGAS

ACTA No.	NOMBRE DEL ACTA	FECHA	OBSERVACIONES
8	Acta De solicitud de Prorroga No.1	09 de diciembre de 2024	Cinco (5) Meses

TABLA 8. INFORMACION PRORROGAS EN EL PROYECTO

Ver en el **ANEXO 2.7.2 COPIA PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA 033 DE 2023.**

2.3 RELACION DE ADICIONALES EN EL PROYECTO.

Durante el proyecto no se efectuaron adicionales al valor contratado inicialmente.

2.4 SANCIONES

Durante el proyecto no se efectuaron sanciones.

2.5 ACCIONES LEGALES

Durante el proyecto no se presentaron acciones legales.

2.6 RELACION DE ACTAS CONTRACTUALES

ACTA N°	NOMBRE DEL ACTA	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO	21/11/2023		
2	ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO	27/11/2023	$ 8.420.237.245,50	

ACTA N°	NOMBRE DEL ACTA	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
3	ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	18/12/2023		
4	ACTA DE REINICIO N° 1	01/02/2024		
5	ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	06/10/2024		
6	ACTA DE REINICIO N°2	06/11/2024		
7	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 1.	02/12/2024		
8	ACTA DE PRORROGA DE OBRA N° 1	03/12/2024		
9	ACTA DE SUSPENSIÓN N° 3	13/12/2024		
10	ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.	24/01/2025		
11	ACTA DE REINICIO N° 3	27/02/2025		
12	ACTA No. 12 DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS	11/04/2025		
13	ACTA No. 13 DE CONTROL DE AJUSTES	21/04/2025		
14	ACTA No. 14 DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS	21/04/2025		
15	ACTA No. 15 DE MODIFICATORIA DE CANTIDADES No. 1	19/05/2025		
16	ACTA No. 16 DE RECIBO PARCIAL No. 2	18/07/2025		
17	ACTA No. 17 DE TERMINACION	19/08/2025		

TABLA 9. INFORMACION DE ACTAS TRAMITADAS

Ver en el **ANEXO 2.7.3 COPIA DE ACTAS TRAMTADAS DEL CONTRATO DE OBRA 033 DE 2023.**

2.7 ANEXOS

2.7.1 COPIA DE GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA 033 DE 2023.

2.7.3 COPIA PRORROGAS DEL CONTRATO DE OBRA 033 DE 2023.

2.7.3 COPIA DE ACTAS TRAMITADAS DEL CONTRATO DE OBRA 033 DE 2023.

3. INFORME ADMINISTRATIVO

3.1. CONTROL DE PERSONAL

A continuación, se relaciona el control de personal del contratista de obra:

3.1.1. CONTROL DE PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO

Se presenta la relación del personal profesional mínimo requerido presente durante la ejecución del proyecto de acuerdo al pliego de condiciones.

Tabla 18. PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA

No.	CARGO	NOMBRE	Cedula de Ciudadania No.	PROFESION	No. Matricula Profesional
1	Director de Obra	Primitivo Alexis González Sánchez	6.761.218	Ingeniero Civil	25202-11082CND
2	Residente de Obra	Edwin Gerardo Rodríguez Vargas	7.177.526	Ingeniero Civil	15202-127814 BYC
3	Especialista en Geologia	José Mauricio Guerrero Fagua	7.161.696	Ingeniero Geólogo	15223-70757BYC
4	Profesional Ambiental	Edict Jasmin Pacheco Reina	68.285.674	Ingeniera Ambiental	68834-129682STD
5	Profesional SG-SST de Obra	María Doris Bernal Alfonso	47.440.878	Ingeniera Industrial	25228-220845CND
6	Profesional área social	María Angelica Trujillo Delgado	23.914.357	Trabajadora Social	T.P. 150982313-1
7	Inspector de Obra	Stela Alexandra Delgado Carvajal	1.118.551.069	Ingeniera Civil	15202-326357 BYC
8	Especialista Adicional	Wilson Alexander González Riveros	86.066.292	Ingeniero Civil	25202-115057CND

Durante la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023, no se presentó por parte del contratista de obra el cambio del personal propuesto en la oferta.

3.1.2. RELACION DE PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO Y DE OBRA

Tabla 19. PERSONAL DE OBRA VINCULADO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	PERONAL OPERATIVO	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO
1	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	1.116.801.662	AYUDANTE DE OBRA
2	ALVAREZ OJEDA EDGAR	74.812.238	OFICIAL DE OBRA
3	AVILA HERNANDEZ OVEL	96.195.666	OFICIAL DE OBRA
4	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS	47.440.878	COORDINADOR SG-SST
5	BURGOS MENDIVELSO RONEY ESTIVEN	1.006.450.593	CADENERO
6	CHAVEZ CUEVAS CRISTIAN	1.029.641.722	AYUDANTE DE OBRA
7	COCINERO ROSAS FRANCISCO JAVIER	1.118.542.464	INGENIERO DE OBRA
8	CRUZ PEREZ GUSTAVO ALONSO	74.849.320	OFICIAL DE OBRA
9	DELGADO CARVAJAL STELA ALEXANDRA	1.118.551.069	INSPECTOR DE OBRA
10	DUARTE CIRO RAMON	17.546.330	AYUDANTE DE OBRA
11	DUQUE NAVAS JHONNATAN	1.006.450.633	AYUDANTE DE OBRA
12	FARFAN ALONSO	74.847.784	AUXILIAR ELECTRICO
13	FARFAN FARFAN ANGEL MARIA	74.847.387	AYUDANTE DE OBRA
14	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	1.127.140.233	AYUDANTE DE OBRA
15	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	1.127.130.234	AYUDANTE DE OBRA
16	GAITAN LEON GERMAN YESID	5.860.488	MAESTRO DE OBRA
17	GAITAN LEON NELSON ALFREDO	14.250.896	OFICIAL DE OBRA
18	GALVIZ MORALES LUIS ALFONSO	18.493.248	OFICIAL DE OBRA
19	GARCIA ACEVEDO DIEGO ARMANDO	1.120.865.525	AYUDANTE DE OBRA
20	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER	86.066.292	ESPECIALISTA ADICIONAL
21	GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEXIS	6.761.218	INGENIERO DIRECTOR
22	GRIMALDO SOLER KEVIN	1.127.142.288	AYUDANTE DE OBRA
23	GUALDRON LUIS ARMANDO	74.847.746	BODEGUERO DE MAQUINARIA
24	GUANARO GUEVARA ELISERIO	74.812.128	OFICIAL DE OBRA
25	GUERRERO FAGUA JOSE MAURICIO	7.161.696	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA
26	GUTIERREZ FARFAN JORGE LUIS	1.116.666.733	OFICIAL DE OBRA

UNION TEMPORAL DELTA 2023
NIT 901.754.751-7

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

No.	PERONAL OPERATIVO	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO
27	HUMO GAITAN JUAN RODULFO	4.214.408	CADENERO 1
28	LEMUS MURILLO LILIANA DEL PILAR	1.118.555.027	SUPERVISORA SST
29	LIZARAZO MORENO JORGE FERNANDO	1.115.860.460	AUXILIAR DE INGENIERIA
30	MACHADO PEREZ BRAYAN	1.116.662.008	AYUDANTE DE OBRA
31	MAUCO BARRETO JOSE YORNEY	1.127.722.127	AYUDANTE DE OBRA
32	MERCHAN TAPIAS PABLO ELICEO	9.395.501	TOPOGRAFO
33	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	1.057.606.408	TOPOGRAFO
34	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	1.006.450.718	AYUDANTE DE OBRA
35	NUÑEZ HOLGUIN GONZALO	9.654.803	ALMACENISTA
36	OROPEZA AGUILAR JORGE ALIRIO	6.671.773	BODEGUERO DE MAQUINARIA
37	OROPEZA GUANAY MARLON JULIAN	1.116.663.572	AYUDANTE DE OBRA
38	OROPEZA PEREZ GELMAN JOHAN	1.006.449.989	AYUDANTE DE OBRA
39	OROPEZA PEREZ MARCO FIDEL	74.866.197	AYUDANTE DE OBRA
40	OROPEZA SALCEDO YEINY MILDRES	1.116.615.344	CONTROLADORA VIAL
41	OROPEZA SALCEDO YURY ESPERANZA	1.116.665.801	CONTROLADORA VIAL
42	ORTIZ RINCON DIEGO FERNANDO	1.116.040.819	AUXILIAR DE INGENIERIA
43	OROPEZA FIDEL	74.847.375	BODEGUERO DE MAQUINARIA
44	PACHECO REINA EDICT JASMIN	68.285.674	PROFESIONAL AMBIENTAL
45	PALMERO PEREZ DUVAN	7.760.449	AYUDANTE DE OBRA
46	PADILLA ESPINOSA JOSE DANIEL	74.858.394	ALMACENISTA
47	PEREZ GARCIA LIDA ROCIO	47.426.874	CONTROLADORA VIAL
48	PIRACHICAN HIGUERA JOSE LUIS	1.002.459.533	TOPOGRAFO
49	QUINTERO YAHAIRA	1.007.206.913	CONTROLADORA VIAL
50	RAMIREZ FONSECA JHON CARLOS	9.434.431	OFICIAL DE OBRA
51	REYES CARO JULIO CESAR	1.118.570.267	SUPERVISOR SST
52	RIAÑO RIVERA OLFAN DIOMEDEZ	1.006.782.904	AYUDANTE DE OBRA
53	RICAURTE GUALDRON LADY JHINET	1.116.666.869	CONTROLADORA VIAL
54	RINCON ESTEVEZ YEISON	1.115.913.997	AYUDANTE DE OBRA

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

No.	PERONAL OPERATIVO	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO
55	RINCON JHON ROBINSON	1.118.554.258	SUPERVISOR SST
56	RIOS SIBO RUBEN DARIO	1.118.528.289	AYUDANTE DE OBRA
57	RODRIGUEZ GARCIA JOSE ALDEMAR	1.114.059.563	AYUDANTE DE OBRA
58	RODRIGUEZ VARGAS EDWIN GERARDO	7.177.526	RESIDENTE DE OBRA
59	SALAMANCA VALDERRAMA JULIO ARMANDO	74.378.292	TOPOGRAFO
60	SANCHEZ SANCHEZ PATROCINIO	17.560.045	AYUDANTE DE OBRA
61	SOLER FARFAN CARLOS EUGENIO	74.866.167	CADENERO
62	SOLER RODRIGUEZ WILSON	1.116.667.591	AYUDANTE DE OBRA
63	SUAREZ CUBURUCO MATEO DANIEL	1.116.667.590	AYUDANTE DE OBRA
64	SUAREZ MARTHA LUIS FELIPE	74.866.119	TECNICO ELECTRICISTA
65	SUAREZ MARTHA RAUL SEUDIEL	1.118.560.101	BODEGUERO DE MAQUINARIA
66	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER	1.142.271	OFICIAL DE OBRA
67	SUESCUN REGULO	9.434.435	OFICIAL DE OBRA
68	TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	1.006.450.594	AYUDANTE DE OBRA
69	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	1.116.790.980	OFICIAL DE OBRA
70	TOLEDO PEREZ CARLOS MARCIAL	1.116.797.503	OFICIAL DE OBRA
71	TORRES MENDOZA JUAN CARLOS	1.118.541.446	TOPOGRAFO
72	TRUJILLO DELGADO MARIA ANGELICA	23.914.357	TRABAJADORA SOCIAL

Ver Anexo 3.5.1 Copia nóminas del Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023.

3.1.3. ANÁLISIS DE SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

La presente interventoría verifico que todo el personal vinculado al proyecto se encontrara afiliado al sistema de seguridad social integral de acuerdo a la legislación vigente y además verifico el pago de las planillas durante el periodo correspondiente del 21/11/2023 al 18/12/2023; del 1/02/2024 al 7/10/2024; del 7/11/2024 al 13/12/2024 y del 27/02/2025 al 19/08/2025.

Ver Anexo 3.5.2 Copia pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscales del contrato de Obra Pública No. 033 de 2023.

3.2. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

En el Pliego de condiciones definitivo para la Solicitud Publica de Ofertas No. ACUA-SPO-002-2023, en el numeral 5.2.2. CAPACIDAD OPERATIVA DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA se encuentra especificada mínima la siguiente maquinaria y/o equipo requerido para la ejecución de la obra:

Tabla 20. MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMA

Ítem	Condiciones técnicas del equipo	Cantidad Requerida
1	Excavadora Hidráulica de Oruga Potencia Mínima de 90HP	1
2	Retrocavadora de Llantas potencia mínima de 85 HP	1
3	Vibro compactador con peso operativo mínimo de 10 Toneladas	1
4	Volqueta con capacidad mínima de carga 12 m³	2

3.2.1. MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

A continuación, se relaciona el control de maquinaria y equipo del contratista de obra:

Tabla 21. RELACION MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

No.	MAQUINARIA / EQUIPO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO	MOTOR	CAPACIDAD	CAN	ESTADO
1	Vibrocompactadora	Ingersoll Rand	SD45D	2007		4.620 kg	1	BUENO
2	Excavadora	Komatsu	PC130	2021	93HP	Cucharon 0,80m³	1	BUENO
3	Retrocavadora	Caterpillar	420	2024	89HP	Cucharon 1,00m³	1	BUENO
4	Volqueta	Varias	Doble troque			16.980kg/12m³	20	BUENO
5	Excavadora	Komatsu	PC210-10M0	2019	165HP	Cucharon 1,00m³	1	BUENO
6	Autohormigonera	Dieci	L 3500	2023			1	BUENO
7	Autohormigonera	Dieci	L 4700	2024			1	BUENO
8	Carrotanque	Freightliner	M2106	2015		10.000lt	1	BUENO
9	Motoniveladora	Case	845	2008			1	BUENO
10	Viborcompactador	Dinapac	CA250D	2014			1	BUENO
11	Miniexcavadora	Bobcat	E26	2017			1	BUENO
12	Minicargador		236D	2018			1	BUENO

3.2.2. REGISTRO FOTOGRAFICO MAQUINARIA Y/O EQUIPO

3.2.2.1. REGISTRO FOTOGRAFICO MAQUINARIA

1 Vibrocompactador



2 Excavadoras


















3 Retrocavadora

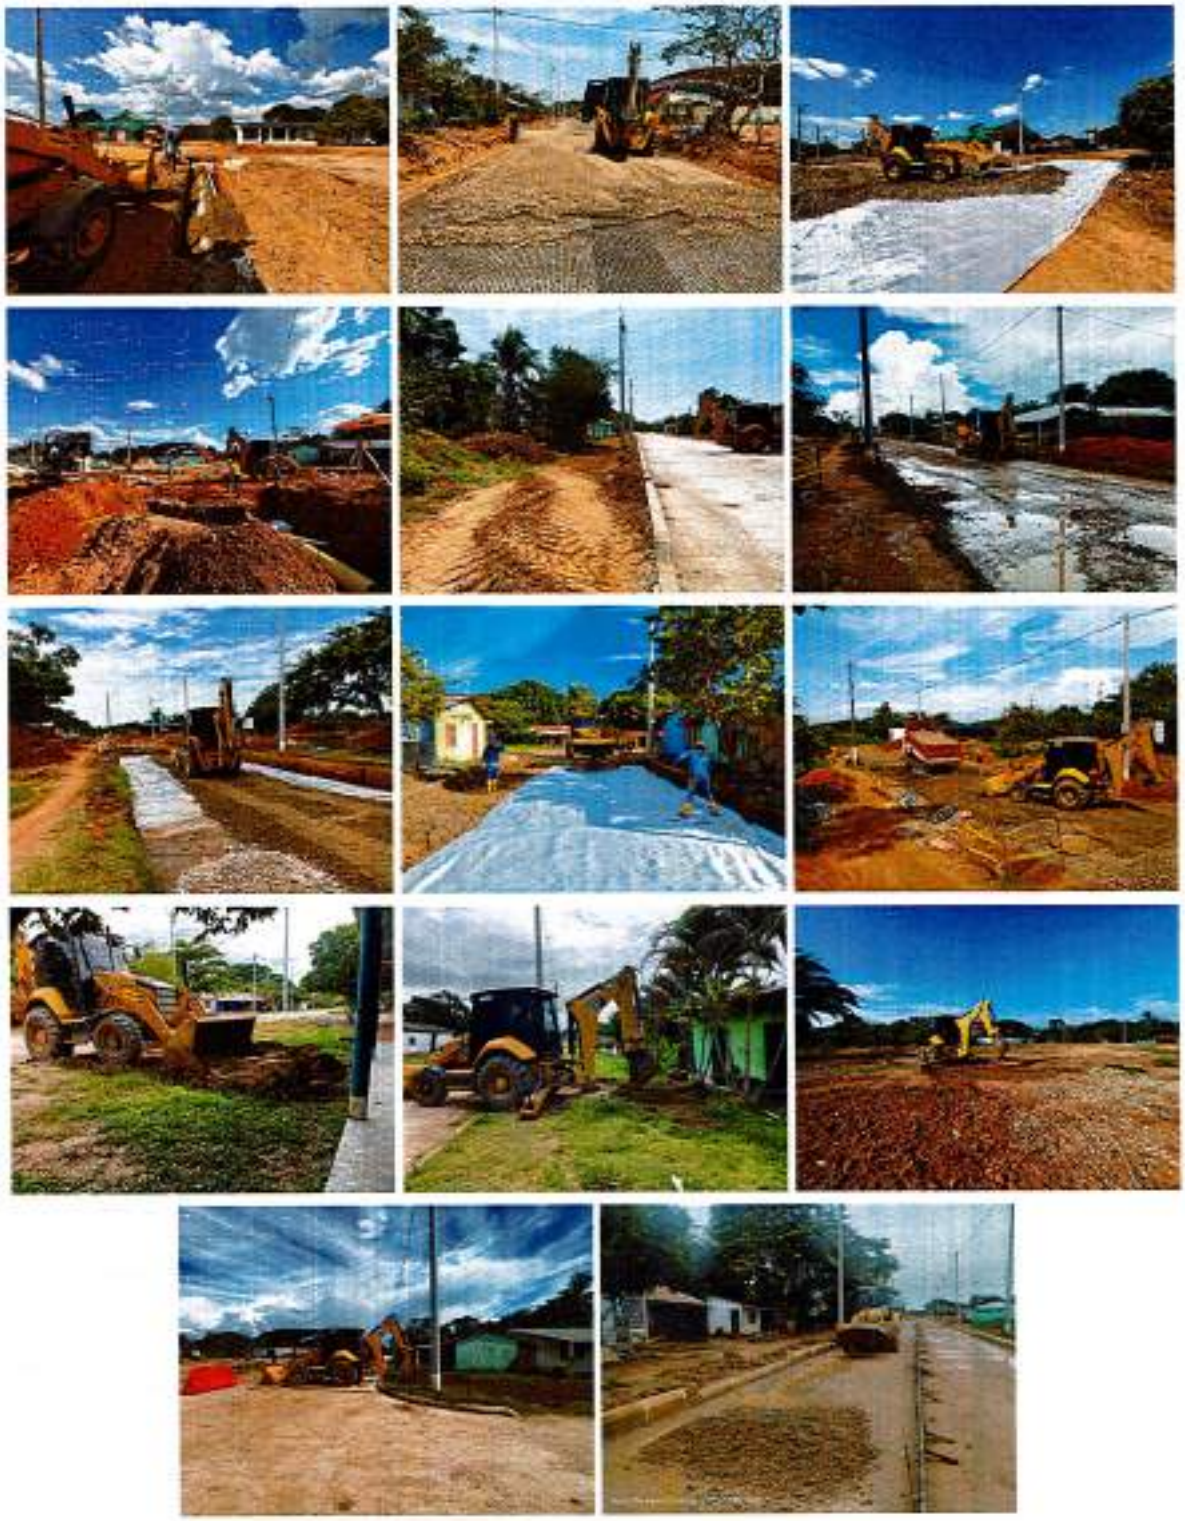

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

4 Volquetas

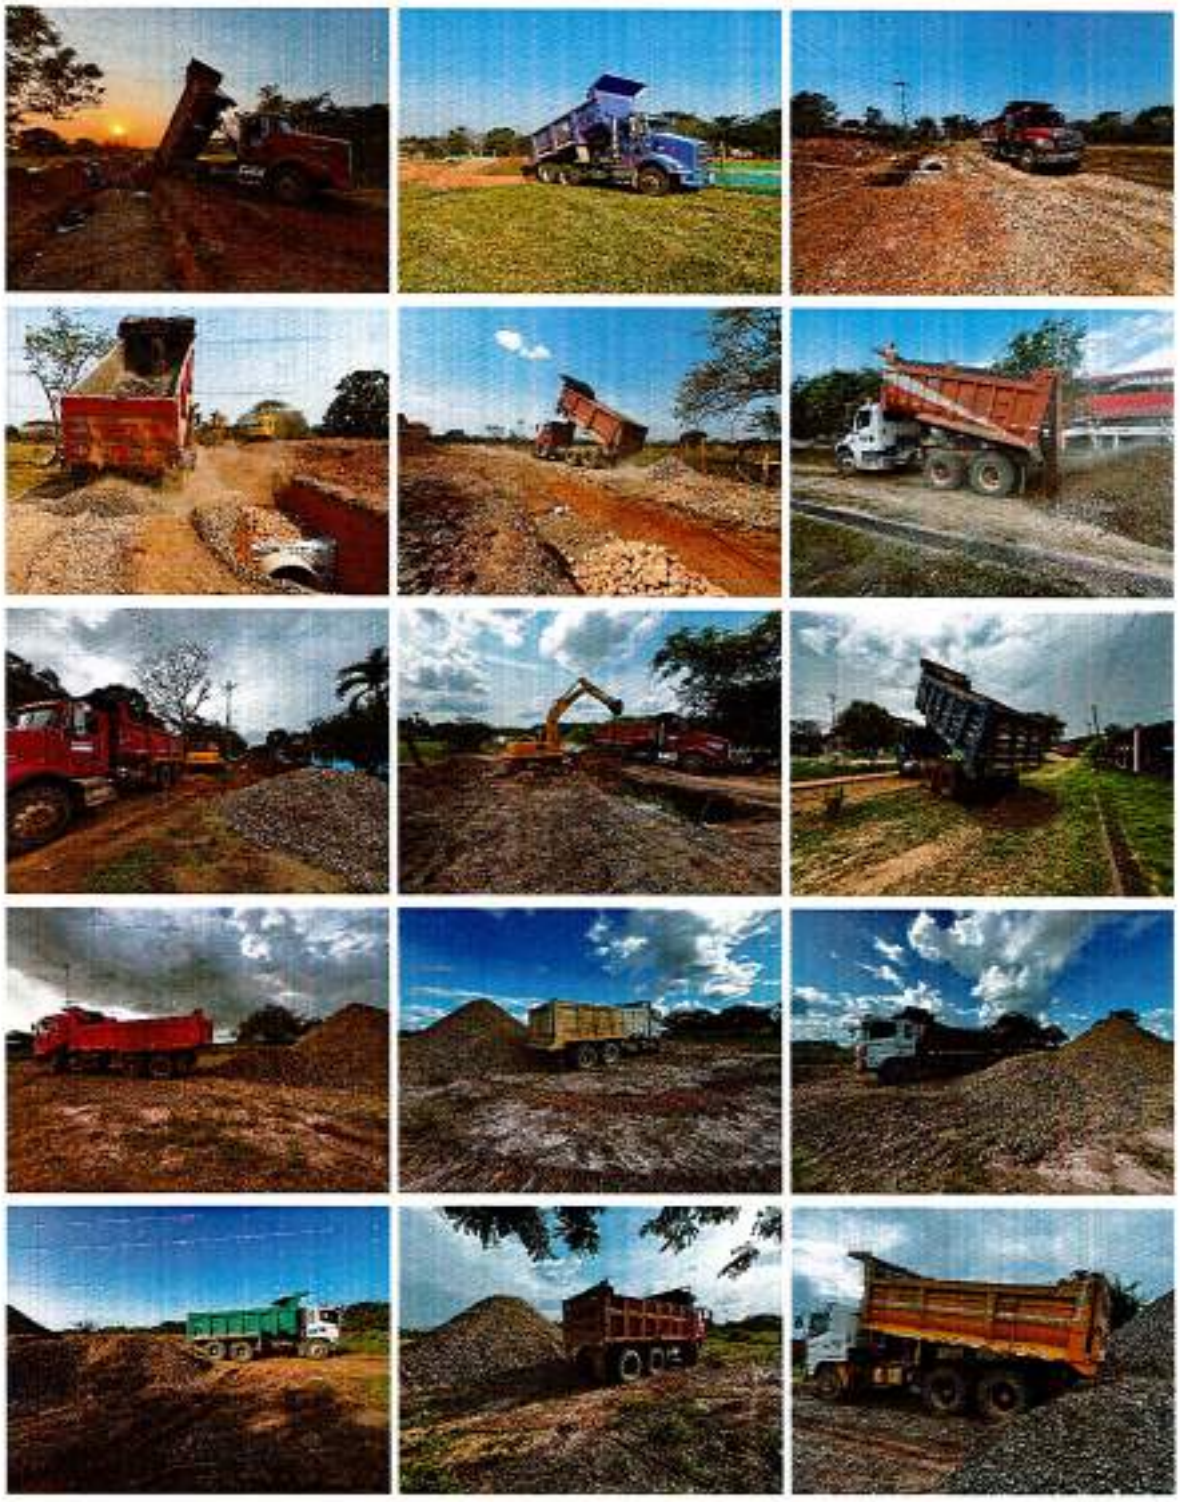

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263



Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

5 Autohormigoneras
















6 Carrotanque





7 Motoniveladora







8 Miniexcavadora



9 Minicargador



10 Tractocamion




11 Grua











3.2.2.2. EGISTRO FOTOGRAFICO EQUIPOS




Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.



Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

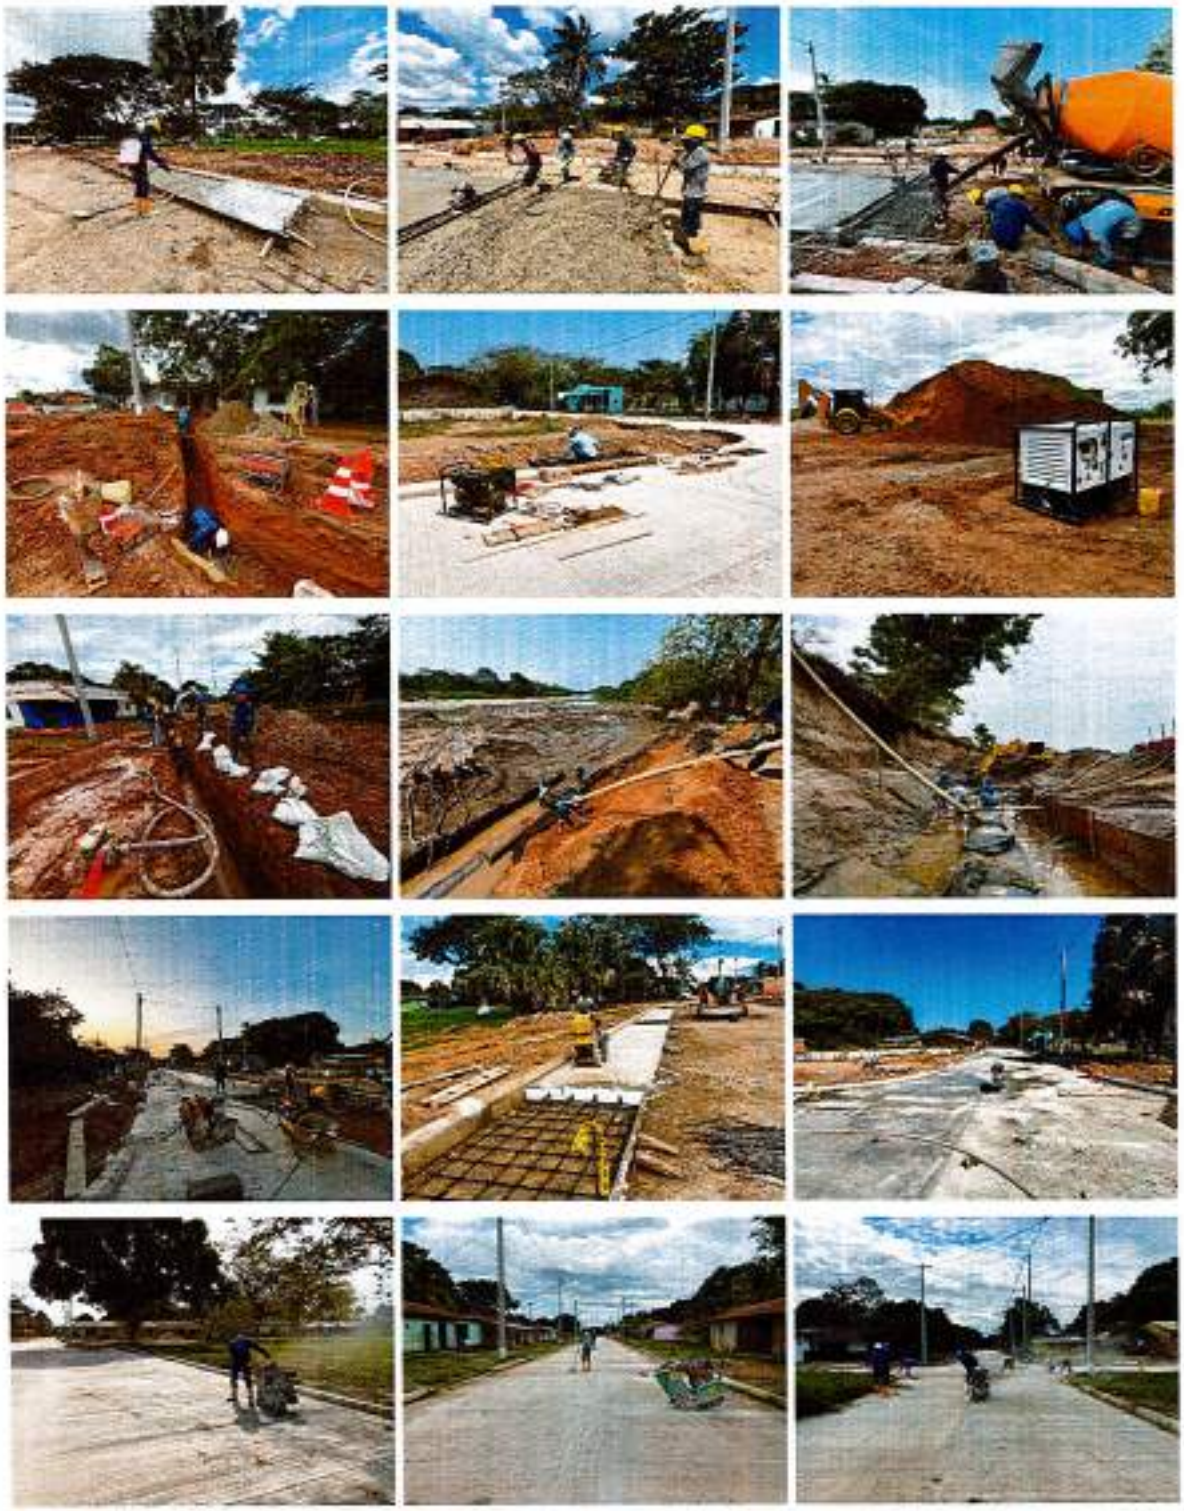

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

3.3. CORRESPONDENCIA

3.3.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida durante la ejecución del proyecto:

Tabla 22. RELACION CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA DE RECIBIDO	CONSECUTIVO	REMITENTE	DIRIGIDO A:	REFERENCIA/ ASUNTO
30/10/2023	130.20.8.0833	CAMILO RAMIREZ MORALES (Subgerente Técnico y Operativo "ACUATODOS SA ESP")	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Solicitud Información
20/11/2023	130.20.8.0879	CAMILO RAMIREZ MORALES (Subgerente Técnico y Operativo "ACUATODOS SA ESP")	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Traslado oficio radicado interno No. 1284 de 16 de noviembre del 2023.
27/11/2023		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	OVED QUIROGA FLOREZ (Gerente general "ACUATODOS SA ESP")	Entrega contrato y certificación de fiducia para giro del anticipo.
28/11/2023		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Entrega información acuerdo al radicado interno No. 1284 del 16 de noviembre de 2023
29/11/2023		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Solicitud suspensión contrato de obra
13/12/2023		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Solicitud suspensión contrato de obra
02/01/2024	20230216374	ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO (Gerente de Gas "ENERCA SA ESP")	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Respuesta radicado 20230112212
08/02/2024	130.20.10.0053	CAMILO RAMIREZ MORALES (Subgerente Técnico y Operativo "ACUATODOS SA ESP")	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Solicitud instalación de valla informativa

UNION TEMPORAL DELTA 2023
NIT 901.754.751-7

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

FECHA DE RECIBIDO	CONSECUTIVO	REMITENTE	DIRIGIDO A:	REFERENCIA/ ASUNTO
14/02/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	OVED QUIROGA FLOREZ (Gerente general "ACUATODOS SA ESP")	Entrega reprogramación
19/02/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	OVED QUIROGA FLOREZ (Gerente general "ACUATODOS SA ESP")	Solicitud aprobación pólizas reiniciación No. 1
11/03/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Entrega de informe de obra No. 1 del periodo 21 de noviembre de 2023 al 18 de diciembre de 2023
21/03/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	OVED QUIROGA FLOREZ (Gerente general "ACUATODOS SA ESP")	Actividades permiso de aprovechamiento forestal.
22/04/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Entrega de informe de obra No. 2 del periodo 01 al 29 de febrero de 2024
3/05/2024	S.P.O.I.1300.07.176	FRAGNY YEXENIA ARIZA CARTILLO (Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Solicitud a comité
15/05/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Acciones control de seguridad vial y cumplimiento del decreto No. 009 de 2017
21/05/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Entrega de informe de obra No. 3 del periodo 1 al 31 de marzo de 2024
30/05/2024		JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Subgerente Técnico y Operativo ACUATODOS S.A. E.S.P)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Asistencia a comité de obra
13/06/2024		ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA (APOYO A LA SUPERVISION)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA	Queja vía el Merey – Miramar (volquetas)

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

UNION TEMPORAL DELTA 2023
NIT 901.754.751-7

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

FECHA DE RECIBIDO	CONSECUTIVO	REMITENTE	DIRIGIDO A:	REFERENCIA/ ASUNTO
			(R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	
14/06/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Entrega de informe de obra No. 4 del periodo 1 al 30 de abril de 2024
14/06/2024		JUAN PABLO BATENCOUR BARRERA (Veedor)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Derecho de petición de veeduria
18/06/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Via 85325.412 Intersección vial Ye el Merey – Miramar de Guanapalo en K94+520 hacia Yopitos.
20/06/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	Empresas de transporte pétreo y demás prestadores servicios de transporte de carga	Solicitud única ruta autorizada por el contratista de obra vehiculos de carga que prestan servicio al contrato de referencia y cumplimiento a las normas SST.
20/06/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	Empresas de transporte pétreo y demás prestadores servicios de transporte de carga	Acciones de control de seguridad vial y cumplimiento del decreto No. 009 de 2017
20/06/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Respuesta solicitud fuentes de materiales pétreos y licencias.
21/06/2024	130.20.8.0494	PAOLA ANDREA RAMIREZ GOMEZ (Profesional de apoyo Subgerencia Técnica y Operativa)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Disponibilidad para el Plan de Gestión Social del PDA
26/06/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Respuesta linea de aseguramiento plan de gestión social del plan departamental para el manejo de los servicios públicos de agua y saneamiento PDA.
4/07/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA	LUIS ANDRES LOPEZ MESA	Solicitud reprogramación del plan de inversión anticipo del contrato en referencia.

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

FECHA DE RECIBIDO	CONSECUTIVO	REMITENTE	DIRIGIDO A:	REFERENCIA/ ASUNTO
		CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	(R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	
9/07/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	Secretaria de Planeación del Municipio de Trinidad - Casanare	Solicitud de autorización y viabilidad técnica del (PMT) Plan de Manejo de Tránsito.
12/07/2024		JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Subgerente Técnico y Operativo - Supervisor "ACUATODOS SA ESP")	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Asistencia comité de obra y seguimiento
16/07/2024		JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TRINIDAD	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Derecho de petición e información
19/07/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Respuesta demora en la ejecución de las actividades del Capítulo 7. OBRAS COMPLEMENTARIAS
22/07/2024		JUAN PABLO BETANCOUR BARRERA (Veedor)	HUGO FABIAN ROJAS BARRETO (Juez promiscuo municipal de Trinidad)	Pronunciamiento previo a la sentencia
25/07/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Entrega informe de obra No. 5 del periodo 01 al 31 de mayo de 2024.
30/07/2024		HUGO FABIAN ROJAS BARRETO (Juez promiscuo municipal de Trinidad)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Sentencia acción de tutela
02/08/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Entrega informe de obra No. 6 del periodo 01 al 30 de junio de 2024.
12/08/2024		ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY (Subgerente Técnico y Operativo - Supervisor "ACUATODOS SA ESP")	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Asistencia a comité de seguimiento

UNION TEMPORAL DELTA 2023
NIT 901.754.751-7

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

FECHA DE RECIBIDO	CONSECUTIVO	REMITENTE	DIRIGIDO A:	REFERENCIA/ ASUNTO
12/08/2024		JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TRINIDAD	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Notificación Auto Concede impugnación
21/08/2024		JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA OROCUE	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Acta de reparto impugnación 2024-00157
22/08/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Respuesta solicitud conexión cunetas a los sumideros.
27/08/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Entrega informe de obra No. 7 del periodo 01 al 31 de julio de 2024.
04/09/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO (MUNICIPIO DE TRINIDAD)	Radicación Plan de contingencia para autorizar el cierre temporal de las calles o carreras.
17/09/2024		JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA OROCUE	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Notificación sentencia 2 instancia
27/09/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Entrega informe de obra No. 8 del periodo 01 al 31 de agosto de 2024.
2/10/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Solicitud suspensión contrato de obra No. 2.
4/10/2024		ROBERTO RIOS (Profesional de apoyo supervisión)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Apoyo para la suspensión temporal del contrato de Obra No. 038 de 2023, Intervención vía Bocas Trinidad - Casanare
5/10/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	EMPRESAS DE TRANSPORTE PETREO Y DEMAS PRESTADORES SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	Transito vehiculos de carga por circunvalar centro poblado el Convento - Trinidad.
01/11/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)		Autorización y Acuerdo, con el señor JORGE ELIECER FORERO

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

UNION TEMPORAL DELTA 2023
NIT 901.754.751-7

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

FECHA DE RECIBIDO	CONSECUTIVO	REMITENTE	DIRIGIDO A:	REFERENCIA/ ASUNTO
05/11/2024		DIDIER GARCIA DUARTE (Veeduria)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Invitación reunión de seguimiento Obra Pluvial Bocas del Pauto
06/11/2024		OFELIA COBA TORRES (SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFORMACION, MUNICIPIO DE TRINIDAD)	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	Solicitud para aprovechamiento del material sobrante por excavación del proceso de cajeo para conformación de vía urbana en el centro Poblado de Bocas del Pauto.
07/11/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Entrega informe de obra No. 9 del periodo 01 de septiembre al 7 de octubre de 2024.
15/11/2024		YEXENIA ARIZA (SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA, MUNICIPIO DE TRINIDAD)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Invitación para realizar visita técnica de revisión de vía pavimentada en mal estado
18/11/2024		YEXENIA ARIZA (SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA, MUNICIPIO DE TRINIDAD)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Cancelación y reprogramación de reunión del 19 de noviembre de 2024
20/11/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)		Acta de entrega de 30 viajes de material al señor JORGE ELIECER FORERO
22/11/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Solicitud aprobación de pólizas según Reinicio No. 2 al contrato en referencia.
25/11/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Solicitud de Prorroga No. 1
25/11/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Entrega informe de obra No. 10 del periodo 21 de noviembre de 2023 al 24 de noviembre de 2024.
12/12/2024		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Solicitud de Suspensión Contrato de Obra No. 3.
25/02/2025		LEONELA SASRAVIA MENDEZ (SUBGERENTE JURIDICA)	PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISION e INTERVENTORES	Directrices para adicionales y/o prorrogas.

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

UNION TEMPORAL DELTA 2023
NIT 901.754.751-7

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

FECHA DE RECIBIDO	CONSECUTIVO	REMITENTE	DIRIGIDO A:	REFERENCIA/ ASUNTO
03/03/2025		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Entrega de reprogramación obra y flujo de Inversión de acuerdo al acta No. 10 Reinicio No. 3.
04/03/2025		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Solicitud aprobación de pólizas de acuerdo al Reinicio No. 3.
05/03/2025		jadmin01ypl@ notificacionesrj.gov.co	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Presentación de memorial a través de la ventanilla única - JCA
08/04/2025		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Solicitud de aprobación ítems no previstos
05/05/2025		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Solicitud aprobación acta Modificatoria No. 1
07/05/2025		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Entrega de informe de Obra No. 13 del periodo 27 de febrero al 31 de marzo de 2025.
16/06/2025		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Entrega de informe de Obra No. 14 del periodo 01 de abril al 30 de abril de 2025.
25/06/2025		OSWALDO ALEXIS BARRERA CRUZ (Personero municipio de Trinidad Casanare)	Interventoria técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental	Solicitud preventiva urgente por deterioro del desvió vial habilitado durante la ejecución del contrato No. 033 de 2023 – Centro poblado de Bocas del Pauto
1/07/2025		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Entrega de informe de obra - acta parcial de Obra No. 2, del periodo 25 de noviembre del 2024 al 22 de junio de 2025.
2/07/2025		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	OSWALDO ALEXIS BARRERA CRUZ (Personero municipio de Trinidad, Casanare)	Respuesta a oficio "Solicitud preventiva urgente por deterioro del desvió vial habilitado durante la ejecución contrato No. 033 2023 Centro poblado de Bocas del Pauto"

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

FECHA DE RECIBIDO	CONSECUTIVO	REMITENTE	DIRIGIDO A:	REFERENCIA/ ASUNTO
4/07/2025		FRAGNY YEXENIA ARIZA CASTILLO (secretaria de Obras Públicas e Infraestructura)	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Solicitud de información Técnica y Financiera del proyecto en referencia.
15/07/2025		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Uso de dotación y elementos de protección personal.
29/07/2025		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Entrega de informe de Obra No. 15 del periodo 01 de mayo del 2025 al 31 de mayo de 2025.
6/08/2025		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Entrega de informe de Obra No. 16 del periodo 01 de junio del 2025 al 30 de junio de 2025.
15/08/2025		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Respuesta a la solicitud de documentos y soportes para recibo y liquidación final de obra.
19/08/2025		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Entrega de informe de Obra No. 17 del periodo 01 de julio del 2025 al 31 de julio de 2025.
29/09/2025		MIGUEL ANGEL FARIAS OSORIO (Subgerente Técnico y Operativo ACUATODOS S.A. E.S.P)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Asistencia comité de obra y seguimiento.
18/02/2026		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Entrega de informe de liquidación Fiduciario No. 16691.
05/03/2026		MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	Entrega de informe de Obra No. 18 del periodo 01 de agosto del 2025 al 19 de agosto de 2025.

ANEXO 3.5.7 OFICIOS Y CORRESPONDENCIA RECIBIDA

3.3.2. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

A continuación, se relaciona la correspondencia generada durante la ejecución del proyecto:

Tabla 23. RELACION CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA OFICIO	CONSECUTIVO	ENVIADO POR:	DIRIGIDO A:	REFERENCIA / ASUNTO
20/11/2023		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	OVED QUIROGA FLOREZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP)	Entrega informe de Interventoria No. 1, - Etapa preconstructiva
21/11/2023		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	Solicitud información de acuerdo al oficio radicado interno No. 1284, según oficio 130.20.8.0879 del 20 de noviembre de 2023.
27/11/2023		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	OVED QUIROGA FLOREZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP)	Cambio de secretaria (o) / Auxiliar administrativo
27/11/2023		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	OVED QUIROGA FLOREZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP)	Solicitud desembolso anticipo contrato de obra
29/11/2023		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	OVED QUIROGA FLOREZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP)	Respuesta oficio 130.20.8.0879 del 20 de noviembre de 2023.
30/11/2023		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	OVED QUIROGA FLOREZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP)	Solicitud suspensión contrato de obra
7/12/2023		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	ENERCA SA ESP	Solicitud de información redes de gas domiciliario centro poblado de Bocas del Pauto
14/12/2023		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	OVED QUIROGA FLOREZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP)	Solicitud suspensión contrato de obra

UNION TEMPORAL DELTA 2023
NIT 901.754.751-7

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

FECHA OFICIO	CONSECUTIVO	ENVIADO POR:	DIRIGIDO A:	REFERENCIA / ASUNTO
08/02/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	Solicitud medidas para garantizar la calidad de la tubería durante el transporte
08/02/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	Solicitud instalación valla informativa del proyecto.
12/02/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ (Subgerente Jurídica "ACUATODOS SA ESP)	Solicitud aprobación de garantías con vigencias actualizadas según actas de suspensión y Reiniciación No. 1.
15/03/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	OVED QUIROGA FLOREZ (Gerente general "ACUATODOS SA ESP")	Entrega informe de Interventoria No. 2, noviembre – diciembre de 2023, e informe de obra No.1
20/03/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	Limpieza y retiro de materiales y escombros de las áreas de trabajo.
25/04/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	OVED QUIROGA FLOREZ (Gerente general "ACUATODOS SA ESP")	Entrega informe de Interventoria No. 3, febrero de 2024, e informe de obra No.2
25/04/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	Solicitud mejora e incremento de los elementos utilizados como señalización preventiva.
11/05/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	Seguridad vial y cumplimiento del decreto No. 009 de 2017
28/05/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	OVED QUIROGA FLOREZ (Gerente general "ACUATODOS SA ESP")	Entrega informe de Interventoria No. 4, marzo de 2024, e informe de obra No. 3
14/06/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA	Via 85325.412 Intersección vial Ye el Merey – Miramar de Guanapalo en K94+520 hacia Yopitos.

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

FECHA OFICIO	CONSECUTIVO	ENVIADO POR:	DIRIGIDO A:	REFERENCIA / ASUNTO
		(R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	
18/06/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	Solicitud fuentes de materiales pétreos y licencias.
19/06/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Subgerente Técnico y Operativo - Supervisor "ACUATODOS SA ESP")	Via 85325.412 Intersección vial Ye el Merey – Miramar de Guanapalo en K94+520 hacia Yopitos.
25/06/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	OVED QUIROGA FLOREZ (Gerente general "ACUATODOS SA ESP")	Entrega informe de Interventoria No.5, abril de 2024, e informe de obra No.4
24/06/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	Linea de aseguramiento PLAN DE GESTION SOCIAL del plan Departamental para el Manejo empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento PDA.
5/07/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Subgerente Técnico y Operativo - Supervisor "ACUATODOS SA ESP")	Solicitud aprobación reprogramación del plan de inversión del anticipo.
12/07/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	Asistencia a comité de obra y seguimiento.
17/07/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	Demora en la ejecución de las actividades del Capitulo 7. OBRAS COMPLEMENTARIAS
19/07/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JUAN PABLO BETANCOUR BARRERA (Veedor)	Respuesta a derecho de petición.
19/07/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE TRINIDAD	Contestación tutela

UNION TEMPORAL DELTA 2023
NIT 901.754.751-7

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

FECHA OFICIO	CONSECUTIVO	ENVIADO POR:	DIRIGIDO A:	REFERENCIA / ASUNTO
23/07/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	HUGO FABIAN ROJAS BARRETO (Juez promiscuo municipal de Trinidad)	Pronunciamiento previo a la sentencia
31/07/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE TRINIDAD	Interposición recurso de apelación
31/07/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Entrega informe de Interventoria No. 6, mayo de 2024 e informe de Obra No. 5.
08/08/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Entrega informe de Interventoria No. 7, junio de 2024 e informe de Obra No. 6.
12/08/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	Asistencia a comité de seguimiento
16/08/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	Solicitud conexión cunetas a los sumideros
02/09/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Entrega informe de Interventoria No. 8, julio de 2024 e informe de Obra No. 7.
23/09/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	SECRETARIA DE PLANEACIÓN (MUNICIPIO DE TRINIDAD)	Acometidas domiciliarias para acueducto y alcantarillado sanitario, Parque central.
01/10/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Entrega informe de Interventoria No. 9, agosto de 2024 e informe de Obra No. 8.
04/10/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Solicitud Suspensión No. 2 contrato de obra.
04/10/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Solicitud Suspensión No. 2 contrato de Consultoria.
12/11/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Entrega informe de Interventoria No. 10, septiembre - octubre de 2024 e informe de Obra No. 9.

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

UNION TEMPORAL DELTA 2023
NIT 901.754.751-7

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

FECHA OFICIO	CONSECUTIVO	ENVIADO POR:	DIRIGIDO A:	REFERENCIA / ASUNTO
18/11/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Solicitud aprobación de garantías con vigencias actualizadas según actas de Suspensión y Reinicio No. 2.
26/11/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Solicitud prorroga No. 1 Contrato de Obra Pública.
28/11/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Solicitud prorroga No. 1 Contrato de Consultoria.
29/11/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Entrega informe para Acta Recibo Parcial de Obra No. 1, del periodo 21 de noviembre de 2023 al 24 de noviembre de 2024.
12/12/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Solicitud Suspensión No. 3 Contrato de Obra.
12/12/2024		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Solicitud Suspensión No. 3 Contrato de Consultoría.
04/03/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Solicitud aprobación de garantías con vigencias actualizadas según Prorroga No. 1.
05/03/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Entrega informe ejecutivo de Interventoria No. 5, del periodo comprendido del 1 de diciembre de 2024 al 4 de marzo de 2025
05/03/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	IVEN ROBLES CONTRERAS (Secretario Juzgado Primero Administrativo de Yopal - Casanare)	Respuesta a oficio recibido el 26 de febrero de 2025
06/03/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Remisión informe diseño ampliación red alcantarillado sanitario calle 4 entre carrera 6 y vía a Trinidad.
11/03/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	Solicitud incremento de turnos obras de protección.
12/03/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	Solicitud limpieza de tubería alcantarillado pluvial.

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

UNION TEMPORAL DELTA 2023
NIT 901.754.751-7

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

FECHA OFICIO	CONSECUTIVO	ENVIADO POR:	DIRIGIDO A:	REFERENCIA / ASUNTO
11/04/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Solicitud de aprobación análisis de precios unitarios no previstos
25/04/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Solicitud cambio de residente de interventoría.
07/05/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Entrega informe ejecutivo de Interventoría No. 6, del periodo comprendido del 5 de marzo al 30 de abril de 2025
12/05/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Entrega informe de Interventoría No. 13, febrero – marzo de 2025 e informe de Obra No. 13
15/05/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Solicitud acta de Modificación No. 1
19/06/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Entrega informe de Interventoría No. 14, abril de 2025 e informe de Obra No. 14.
02/07/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	OSWALDO ALEXIS BARRERA CRUZ (Personero municipio de Trinidad, Casanare)	Solicitud preventiva urgente por deterioro del desvió vial habilitado durante la ejecución del contrato No. 0333 de 2023 – Centro poblado de Bocas del Pauto
09/07/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Entrega informe ejecutivo de Interventoría No. 14, periodo comprendido del 1 de mayo al 30 de junio de 2025.
09/07/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	Uso de dotación y los elementos de protección personal.
14/07/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Entrega informe para acta parcial de Obra No. 2, del periodo 25 de noviembre al 13 de diciembre de 2024, y del 27 de febrero al 22 de junio de 2025.
04/08/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	SECRETARIA DE PLANEACION (Municipio de Trinidad, Casanare)	Señalización vertical y demarcación horizontal.
06/08/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Entrega informe de interventoría No. 15, mayo de 2025 e Informe de Obra No. 15.

FECHA OFICIO	CONSECUTIVO	ENVIADO POR:	DIRIGIDO A:	REFERENCIA / ASUNTO
11/08/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	Solicitud documentos y soportes para recibo y liquidación final de obra.
13/08/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Entrega informe de interventoría No. 16, junio de 2025 e Informe de Obra No. 16.
26/08/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Entrega informe de interventoría No. 17, julio de 2025 e Informe de Obra No. 17.
29/09/2025		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO (R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S)	Asistencia comité de obra y seguimiento.
10/03/2026		LUIS ANDRES LOPEZ MESA (R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023)	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ (Gerente "ACUATODOS SA ESP")	Entrega informe de interventoría No. 18, agosto de 2025 e Informe de Obra No. 18.

ANEXO 3.5.8 OFICIOS Y CORRESPONDENCIA ENVIADA

3.4. RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉS TECNICOS

Durante la ejecución del proyecto: "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE", se adelantaron varios comités, los cuales son relacionados a continuación:

Tabla 24. RELACION ACTAS DE COMITE

ACTA No.	FECHA	OBJETO O TEMAS A TRATAR	CONCLUSIONES
1	12/10/2023	Socialización del proyecto	- Presentación del proyecto a la comunidad del centro poblado de Bocas del Pauto, municipio de Trinidad. - Preguntas y respuestas para aclarar el proyecto
2	18/10/2023	Aclaraciones observaciones identificadas por la interventoría del proyecto.	- Unión Temporal Delta 2023, realizará los ajustes mencionados anteriormente durante la ejecución del proyecto. Si se presentan más inconvenientes hidráulicos durante le ejecución se informarán oportunamente al diseñador.

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

ACTA No.	FECHA	OBJETO O TEMAS A TRATAR	CONCLUSIONES
3	23/02/2024	Inspección y verificación de la red de media y baja tensión.	- La empresa Electrovichada informa y sugiere que por vida útil e inspección visual seria necesario la instalación de transformadores nuevos. - Por las pérdidas de energia se hace necesario analizar la posibilidad de implementar luminarias tecnologia LED. - Hacer entrega infraestructura desmantelada al municipio de Trinidad. - Procedimiento y costos para respectivos cortes – Encargado Electrovichada. - Realizar programación de actividades con respectivo aviso a usuarios para la instalación y desinstalación de acometidas residenciales – Contratista de Obra.
4	14/03/2024	Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto.	- La tubería del sistema del alcantarillado pluvial del centro poblado de Bocas del Pauto en algunos tramos se encuentra ubicada muy superficial, no cumple con la Profundidad de instalación a la cota clave que debe ser mínimo de 1,20m". Para solucionar este inconveniente se recomendó proteger la tubería en los tramos críticos mediante un recubrimiento en concreto ciclópeo desde la parte media del tubo y hasta 15 cm sobre la cota clave. - Se evidencia que en las redes eléctricas nuevas no se incluye el cambio de los tres (3) transformadores de 45 KVA, por lo tanto, la empresa Electrovichada operadora del servicio de energía eléctrica informa y sugiere que por vida útil e inspección visual sería necesario la instalación de transformadores nuevos. - En la actualidad el centro poblado de Bocas del Pauto para el alumbrado público tiene instaladas luminarias de sodio sin mantenimiento y el proyecto no contempla la reposición de estos elementos, la empresa Electrovichada operadora del servicio de energía eléctrica recomienda para evitar las pérdidas de energía analizar la posibilidad de implementar luminarias tecnología LED dentro de las actividades del proyecto. - Realizar por parte del contratista de obra la solicitud de los Análisis de Precios Unitarios de actividades no previstas, para realizar la

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

ACTA No.	FECHA	OBJETO O TEMAS A TRATAR	CONCLUSIONES
			aprobación y tenerlos en cuenta durante la ejecución del proyecto.
5	19/03/2024	Avance del proyecto.	- Se ha observado que el nivel del rio en verano no disminuyo notoriamente como en años anteriores. - Se le aclaro a los representantes de la veeduría que los perfiles viales y ejes de las vías son los establecidos en los estudios y diseños. - Los representantes de la veeduría solicitan asistir a la visita programada para el dia 5 de abril en el centro poblado. - El profesional de apoyo a la supervisión realizo entrega de la reprogramación del proyecto entregada por el contratista de obra en medio magnético de acuerdo al acta de reiniciación No 1, a los representantes de la veeduría.
6	21/03/2024	Revisar los ejes de las vias Ubicación de postes	- Se le aclaro a los representantes de la comunidad que los perfiles viales y ejes de las vías son los establecidos en los estudios y diseños. - Se van a dejar en operación la mayor parte de las cunetas existentes, durante la operación se requiere la limpieza periódica de todo el sistema de alcantarillado Pluvial.
7	18/04/2024	Revisar el almacenamiento y disposición final de residuos de tubería que se están generando en la obra producto de las labores de suministro e instalación y retiro de tubería existente.	- SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS, determinará un lugar dentro del campamento de obra para la disposición temporal de residuos de tubería. En el momento que se tenga un gran volumen se transportará a la ciudad de Yopal y se hará entrega a la entidad que se encarga de su recolección.
8	05/06/2024	Comité técnico del contrato 033 de 2023 pluvial de Bocas del Pauto.	- Se solicita por parte de la supervisión se haga socialización de avance con la comunidad informándole enfáticamente sobre el nivel de sus casas como van a quedar de acuerdo a la ejecución del proyecto. Se deberá invitar a la veeduría de la comunidad en donde se levantará un acta de asistencia y desarrollo de la reunión.
9	28/06/2024	Aclarar dudas e inquietudes a la comunidad del centro poblado de Bocas del Pauto, municipio de Trinidad, principalmente debido a los niveles del pavimento.	- Se informo a los asistentes los niveles del pavimento terminado y los sectores que se encuentran por debajo del nivel del pavimento, donde se plantea la posibilidad de construir sumideros con rejilla en la parte superior para evacuar la escorrentía al sumidero más cercano

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

ACTA No.	FECHA	OBJETO O TEMAS A TRATAR	CONCLUSIONES
			por medio de tubería PVC de 12" y/o utilizar la cuneta existente en la calle 3 entre carreras 6 y 5.
10	05/07/2024	Aprobación reprogramación del plan de inversión de Anticipo.	- Se autoriza por parte de la supervisión la reprogramación del plan de inversión del anticipo avalada por la interventoría y se suscribe el 05/07/2024.
11	18/07/2024	Revisar el manejo que se está dando a los materiales de construcción en el área donde se están realizando las actividades relacionadas con los sardineles.	- Synergia Construcciones e ingeniería S.A.S., se compromete a dar estricto cumplimiento a las fichas de manejo ambiental establecidas en el PAGA.
12	18/07/2024	Revisar aspectos técnicos y jurídicos propios de la ejecución del proyecto.	- Definir solo un interlocutor por parte de la veeduría para solicitar información. - Comité el 19/09/2024 a las 4:00 pm en ACUATODOS S.A. E.S.P.
13	01/08/2024	Revisar avance de obra y estado del tiempo.	- Synergia Construcciones e Ingeniería S.A.S, se compromete a continuar con las actividades para la construcción de la estructura de descarga hasta el borde de la excavación realizada cerca del río Pauto.
14	23/08/2024	Revisar el manejo que se está dando a los RCD en obra.	- Synergia Construcciones e ingeniería S.A.S., se compromete a dar estricto cumplimiento a las fichas de manejo ambiental establecidas en el PAGA.
15	02/09/2024	Realizar seguimiento de avance de obra mes de agosto, actividades ejecutadas y por ejecutar.	- Synergia Construcciones e Ingeniería S.A.S, continuara realizando el acopio de material subbase granular seleccionada o triturada, traslado de las redes eléctricas y la construcción de sumideros laterales de las vías a pavimentar.
16	13/09/2024	Reporte de avance de obra, actividades ejecutadas y por ejecutar.	- Synergia Construcciones e ingeniería S.A.S, continuará realizando el acopio de subbase granular seleccionada, traslado de redes eléctricas y la construcción de sumideros laterales de las vías a pavimentar. - UT DELTA 2023, realizará la continua supervisión a las actividades realizadas por el contratista de obra y adicional continuará el seguimiento a los niveles del río Pauto para poder iniciar con las actividades de protección del talud y terminar la construcción de la estructura de descarga.

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

ACTA No.	FECHA	OBJETO O TEMAS A TRATAR	CONCLUSIONES
17	19/09/2024	Realizar el reporte de avance de obra, actividades ejecutadas y por ejecutar.	- Synergia Construcciones e ingeniería S.A.S, empezar a hacer el acopio de cemento ART estructural requerido para la pavimentación de las vías, adicional continuar con el traslado de las redes eléctricas, construcción de sumideros y acometidas domiciliarias del acueducto y alcantarillado sanitario.
18	27/09/2024	Actualización avance de obra, actividades en ejecución y estado de llegada geotextiles.	- Synergia Construcciones e ingeniería S.A.S, se compromete a iniciar las actividades de conformación del terreno para posterior pavimentación de las vías y a realizar una socialización con la comunidad con tema específicos de las actividades que se van a empezar a realizar en cuanto a la pavimentación de las vías, las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta y el cuidado con las obras que se ejecutarán.
19	2/10/2024	Socialización actividades pavimentación vías.	- Se realiza socialización con la comunidad de acuerdo a los compromisos del acta celebrada el 27/09/2024.
20	4/10/2024	Analizar la solicitud de suspensión del proyecto realizada por el Municipio de Trinidad, Departamento de Casanare.	- Realizar la solicitud formal de la Suspensión de Obra e Interventoria No. 2 a partir del próximo 7 de octubre de 2024, por UN (1) MES, calendario.
21	8/11/2024	Realizar visita de obra y verificar las actividades ejecutadas.	- Se debe realizar limpieza y el relleno posterior de los sardineles antes de realizar el vaciado de concreto. - Se debe ir subiendo el nivel de los muros de los sumideros hasta el nivel de subbase granular para confinar el material y evitar el arrastre por la escorrentía superficial. - Se deben revisar los niveles de los accesos de discapacitados para garantizar que queden con respecto de las cotas del pavimento máximo a 1 cm para permitir el acceso de las sillas de ruedas. - Se debe disponer de un frente de obra para mover las redes de acueducto que aún están pendientes. - Se debe realizar la compactación perimetral de los pozos de inspección, sumideros y sardineles con benitin y canguro, para garantizar la adecuada densidad del material.

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

ACTA No.	FECHA	OBJETO O TEMAS A TRATAR	CONCLUSIONES
			- Al realizar el vaciado de concreto en las vias, se deben construir las tapas de los pozos de inspección de los alcantarillados sanitario y pluvial para evitar condiciones inseguras por huecos expuestos. Antes de instalar las tapas prefabricadas o fundidas insitu se debe realizar limpieza de los residuos de construcción la nivelación y cañuela de los pozos del Alcantarillado Pluvial.
22	12/11/2024	Seguimiento a la ejecución del proyecto citado por la veeduría	- Realizar visita al proyecto, fecha tentativa del 15 al 20 de enero de 2025.
23	6/12/2024	Verificar la ejecución del proyecto y avance de las actividades ejecutadas.	- Realizar el diseño del colector del colector alcantarillado sanitario en la calle 4 entre carrera 6 y la vía hacia Trinidad. - Realizar las actividades de la protección del talud del rio Pauto cuando disminuya el nivel.
24	12/12/2024	Actividades a ejecutar previo a la salida del personal del campo respecto a la señalización de las áreas intervenidas.	- Jornada de orden y aseo para dejar las áreas intervenidas aptas. - Señalización de cada área intervenida y que aun requiere de trabajo posterior para evitar incidentes con los peatones y la comunidad en general. - Almacenamiento de herramientas, maquinaria y equipo en el campamento.
25	11/03/2025	Reporte de avance de obra, actividades ejecutadas y por ejecutar, diseño ampliación red alcantarillado sanitario calle 4 entre carrera 6 y vía a Trinidad.	- Realizar la solicitud de aprobación de Análisis de Precios Unitarios no previstos, el balance económico del contrato y la solicitud de Modificación de Obra No. 1.
26	21/03/2025	Realizar el reporte de avance de obra mes de marzo, actividades ejecutadas y por ejecutar.	- Continuar con la construcción de las obras de protección y reanudar las actividades del Capítulo 4: Estructura de Descarga antes de las crecientes del rio Pauto. - Se autoriza el ajuste al diseño en la Estructura de Descarga, el incremento de la longitud de las Obras de Protección, realizar el concreto ciclópeo a partir del nivel 5 hasta el 11 en la parte posterior de los bolsacretos dimensión de 0,45m x 0,45m, a lo largo de la protección, siempre y cuando la interventoria y el contratista de Obra, verifiquen que se mantiene el equilibrio económico del contrato de obra.

INFORME DE INTERVENTORIA PARA RECIBO Y LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 de 2023.

ACTA No.	FECHA	OBJETO O TEMAS A TRATAR	CONCLUSIONES
27	08/04/2025	Realizar el reporte de avance de obra mes de marzo ejecutada y por ejecutar.	- Continuar con las obras de protección y la estructura de descarga para mitigar el impacto que se puede presentar durante las crecientes del rio y se pueda seguir con la ejecución de estos capitulos.
28	29/04/2025	Realizar el reporte de avance de obra mes de abril ejecutada y por ejecutar.	- Se autoriza el cambio de profesional vinculado a la interventoría, por lo tanto, se puede proceder con las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social.
29	14/05/2025	Avance de obra, actividades ejecutadas y por ejecutar.	- Radicar la solicitud de Modificación No. 1 para revisión y aprobación por parte de la supervisión del proyecto. - Se van a realizar las actividades de la Construcción Estructura de descarga hasta que el nivel del rio pauto permita la ejecución de las actividades
30	30/05/2025	Avance de obra, actividades ejecutadas y por ejecutar.	- Una vez baje el nivel del rio el contratista debe retomar la construcción de las obras de protección en la estructura de descarga del alcantarillado Pluvial. - Continuar la construcción de la estructura del pavimento en la Carrara 5A hacia la Calle 5.
31	06/06/2025	Analizar la posibilidad de incrementar la pavimentación en aproximadamente 40m en la carrera 5ª hacia la calle 5.	- La comunidad solicita se tenga en cuenta este tramo de via para invertir los recursos dentro del centro poblado, beneficiando al mayor número de habitantes sin afectar el objeto contractual y mejorando la calidad de vida de las personas que usan diariamente la carrera 5A. - Se va a analizar la posibilidad de incrementar en aproximadamente 40m la construcción de la estructura del pavimento en la Carrara 5A hacia la Calle 5, revisando el ancho de calzada de 7,30m se puede implementar en toda la calle o se debe realizar algún ajuste para disminuir el ancho y evitar la interferencia que pueda existir con el canal existente.
32	18/07/2025	Avance del proyecto, actividades ejecutadas y pendientes por ejecutar	- Una vez baje el nivel del rio el contratista debe retomar la construcción de las obras de protección en la estructura de descarga del alcantarillado Pluvial. - Incrementar los rendimientos de obra en la actividad del vaciado de concreto rigido para la pavimentación de las vías pendientes por ejecutar

ACTA No.	FECHA	OBJETO O TEMAS A TRATAR	CONCLUSIONES
33	24/07/2025	Analizar las opciones para mejorar el acceso al puerto del rio pauto en la calle 4	- Para mejorar el acceso al puerto se establece de común acuerdo hacer el mejoramiento con subbase granular para lo cual el contratista de obra aporte el material granular necesario para conformar la vía de acceso al puerto.
34	15/08/2025	Estado de las actividades realizadas, avance del proyecto, entrega de documentos para el recibo y liquidación del proyecto.	- El contratista de obra debe realizar entrega de todos los soportes solicitados por ACUATODOS S.A. E.S.P. para proceder con el recibo y liquidación final de las actividades ejecutadas.
35	04/02/2025	Realizar taller pedagógico de cultura vial, Realizar taller componente Ambiental, Inconvenientes o inquietudes sobre el componente social	- Se realizaron los talleres en el coliseo y en el colegio del centro poblado de bocas del pauto, se repartieron folletos a los asistentes.

ANEXO 3.5.8 Copia actas de comités Técnicos realizados durante la ejecución del proyecto

3.5. ANEXOS ADMINISTRATIVOS


ANEXO 3.5.1. COPIA NOMINAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023
ANEXO 3.5.2. COPIA PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023
ANEXO 3.5.3. SOPORTES PAGO DEL FIC
ANEXO 3.5.4. PAZ Y SALVO DE TRABAJADORES
ANEXO 3.5.5. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES EXPEDIDO POR EL REVISOR FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023. (INCLUYE TP VIGENCIA ANTECEDENTES REVISOR FISCAL)
ANEXO 3.5.6. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES EXPEDIDO POR EL CONTADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA, CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 038 DE 2023. (INCLUYE TP VIGENCIA ANTECEDENTES CONTADOR)
ANEXO 3.5.7. OFICIOS Y CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ANEXO 3.5.8. OFICIOS Y CORRESPONDENCIA ENVIADA
ANEXO 3.5.9. COPIA ACTAS DE COMITÉS TECNICOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
ANEXO 3.5.10. INFORME FINAL PARA RECIBO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 033 DE 2023, INFORME ADMINISTRATIVO


ANEXO 3.5.1.
COPIA NOMINAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.

NOMINA MENSUAL NOVIEMBRE 2023 BOCAS DEL PAUTO

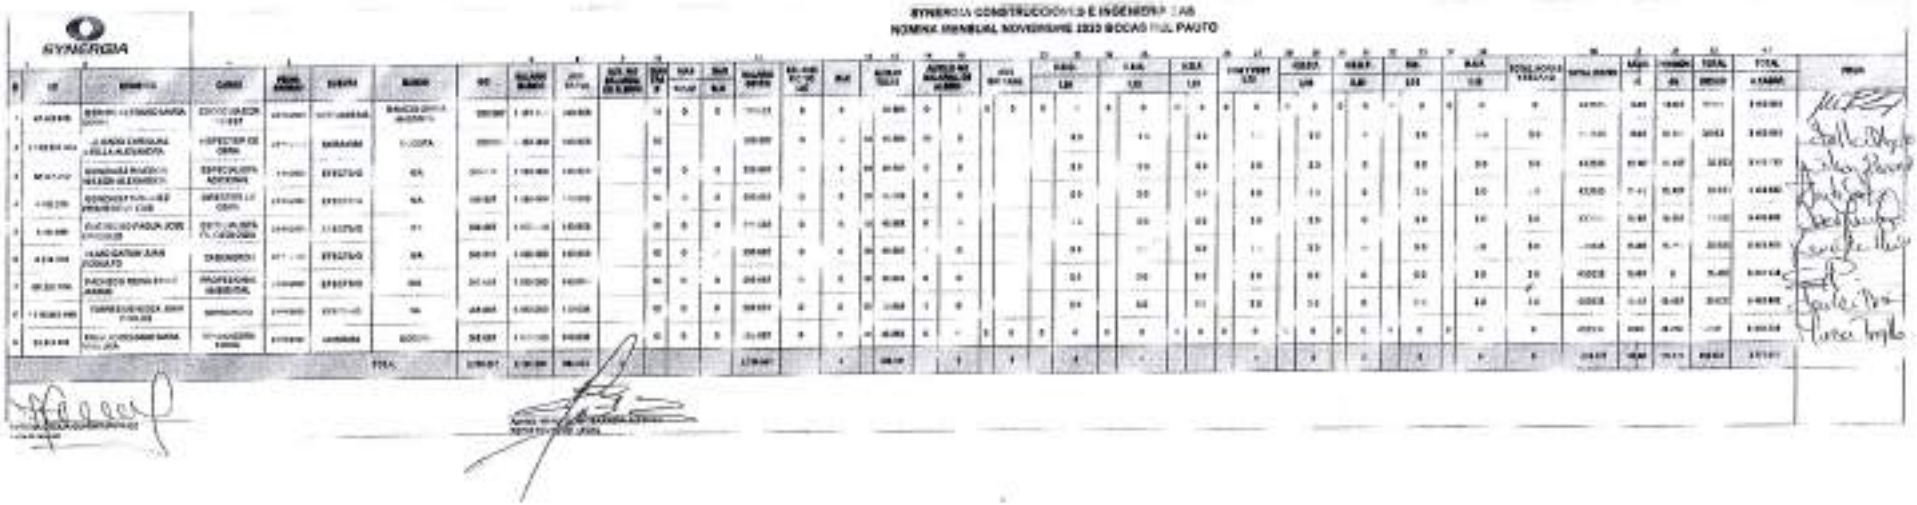


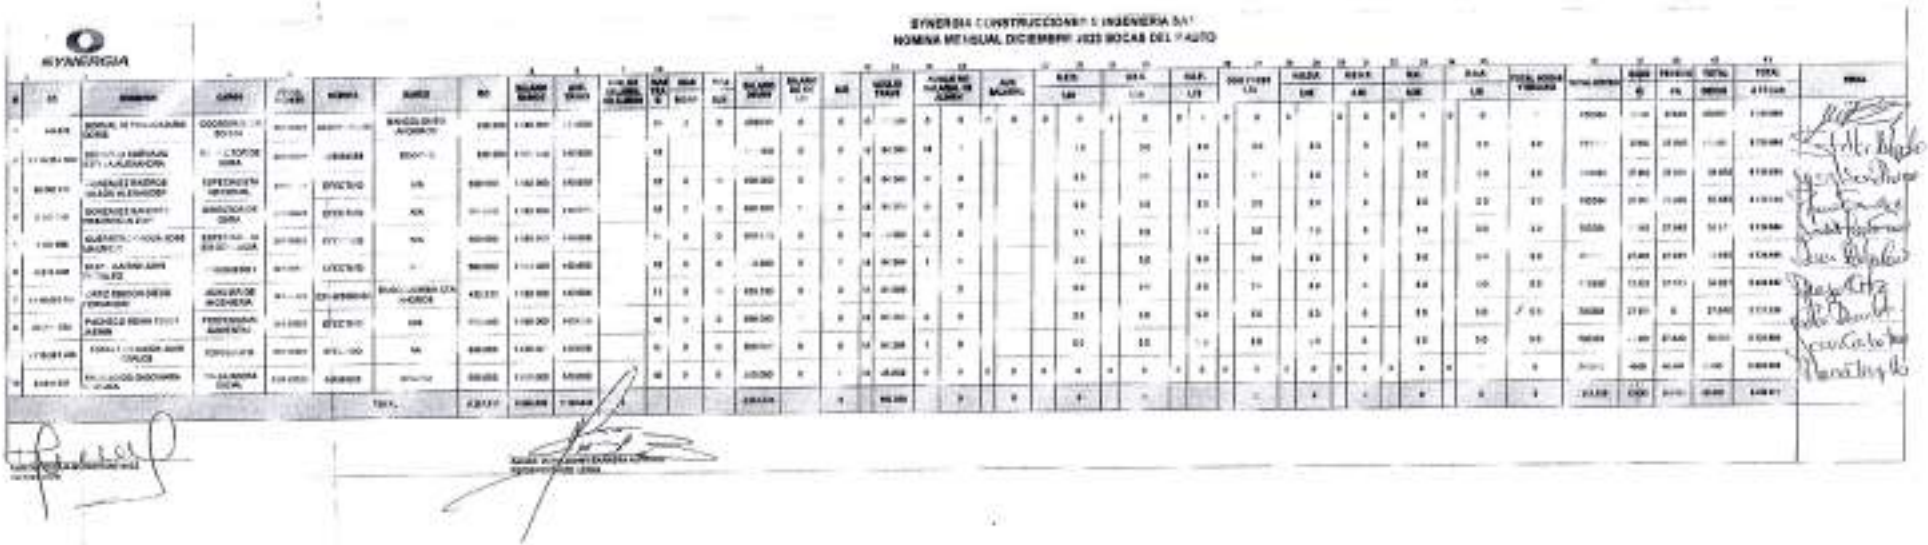
SYNERGIA
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA
NOMINA MENSUAL DICIEMBRE 2020 BOCAS DEL TORO

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NOMINA MENSUAL 1-29 DE FEBRERO DE 2024

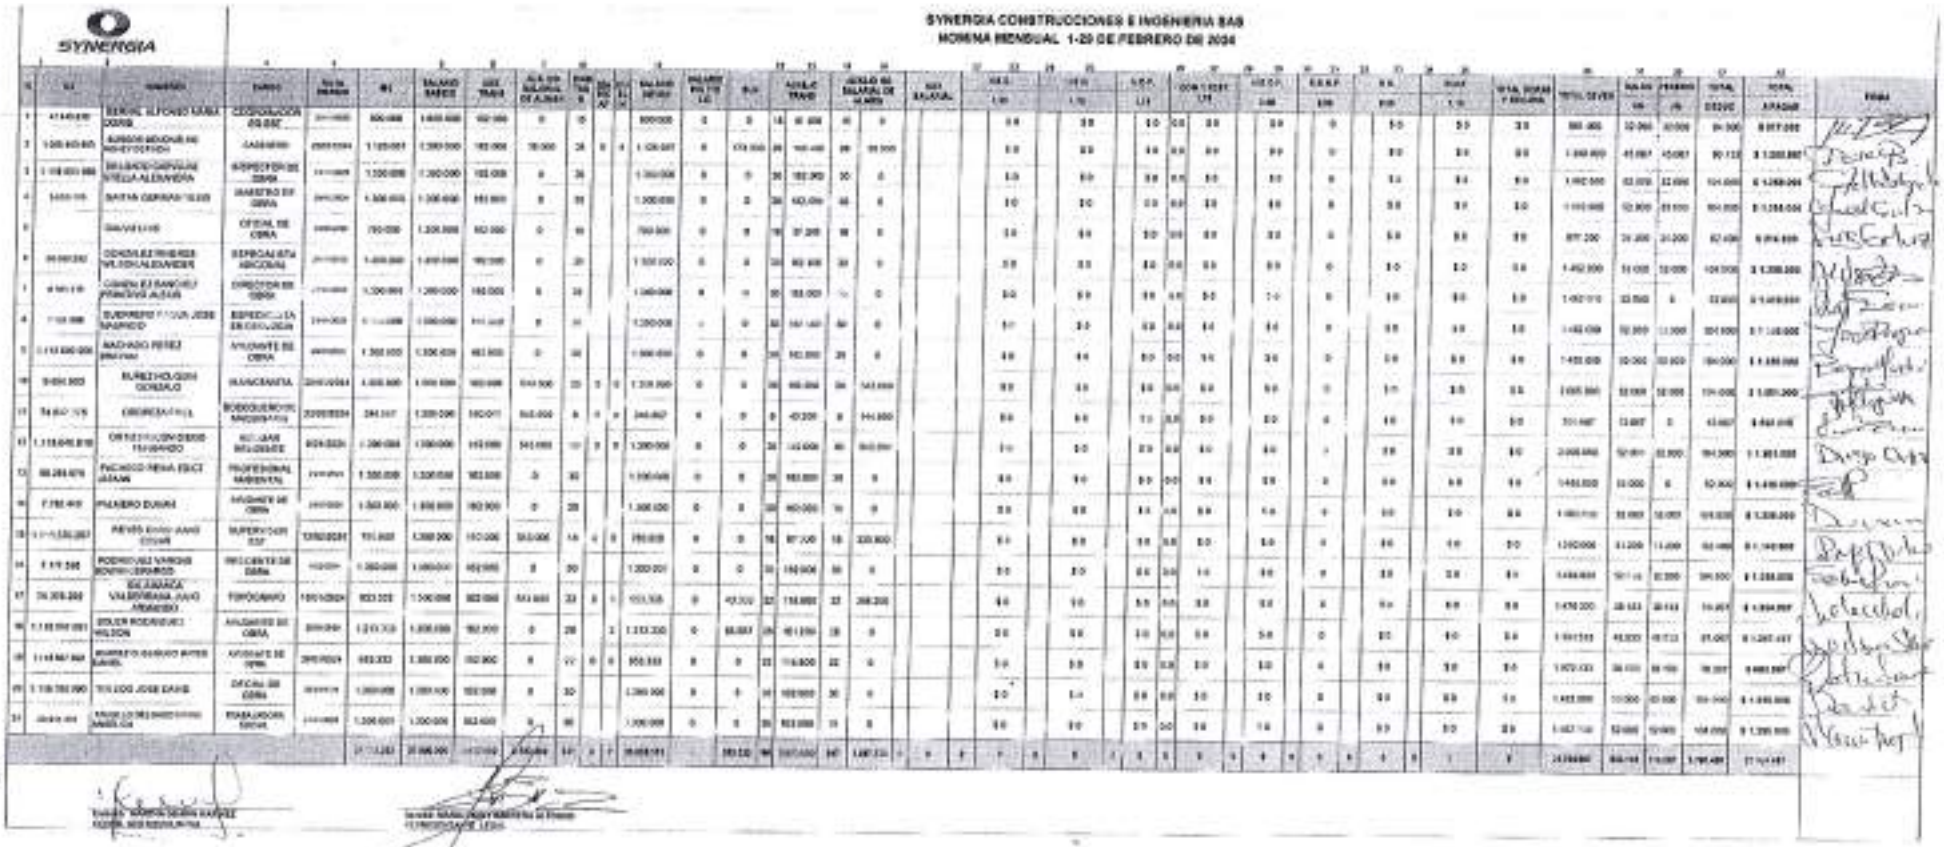

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NOMINA MENSUAL 1-30 DE MARZO DE 2024


N°	ID	NOMBRES	CARGO	FECHA INGRESO	SMV	SALARIO BASICO	AUX. TRANS	SAL. HE SALARIAL DE ALMER	DIAS TRA B	DIA FES AP	DIA FES NO	SALARIO DEVEN	SALARIO MES TOC UR	ELR	HE/RE TRANS	AUXILIO NO SALARIAL DE ALMER	AUX SALARIAL	H.E.D. 1.25	H.E.N. 1.75	H.E.F. 1.75	H.D.D.F.	H.N.D.F.	H.R.N. 2.50	H.D. 2.00	H.N. 2.50	TOTAL DEVEN Y RECARGO	TOTAL DEVEN	SALUD 4%	PENSION 4%	TOTAL DSCTOS	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1																															
2																															
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															

SANDRA MARCELA QUINTANA PEREZ
COORD. GESTION HUMANA

JUAN DAVID HENAO BARRIENTOS ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NOMINA MENSUAL 1-30 DE ABRIL DE 2024

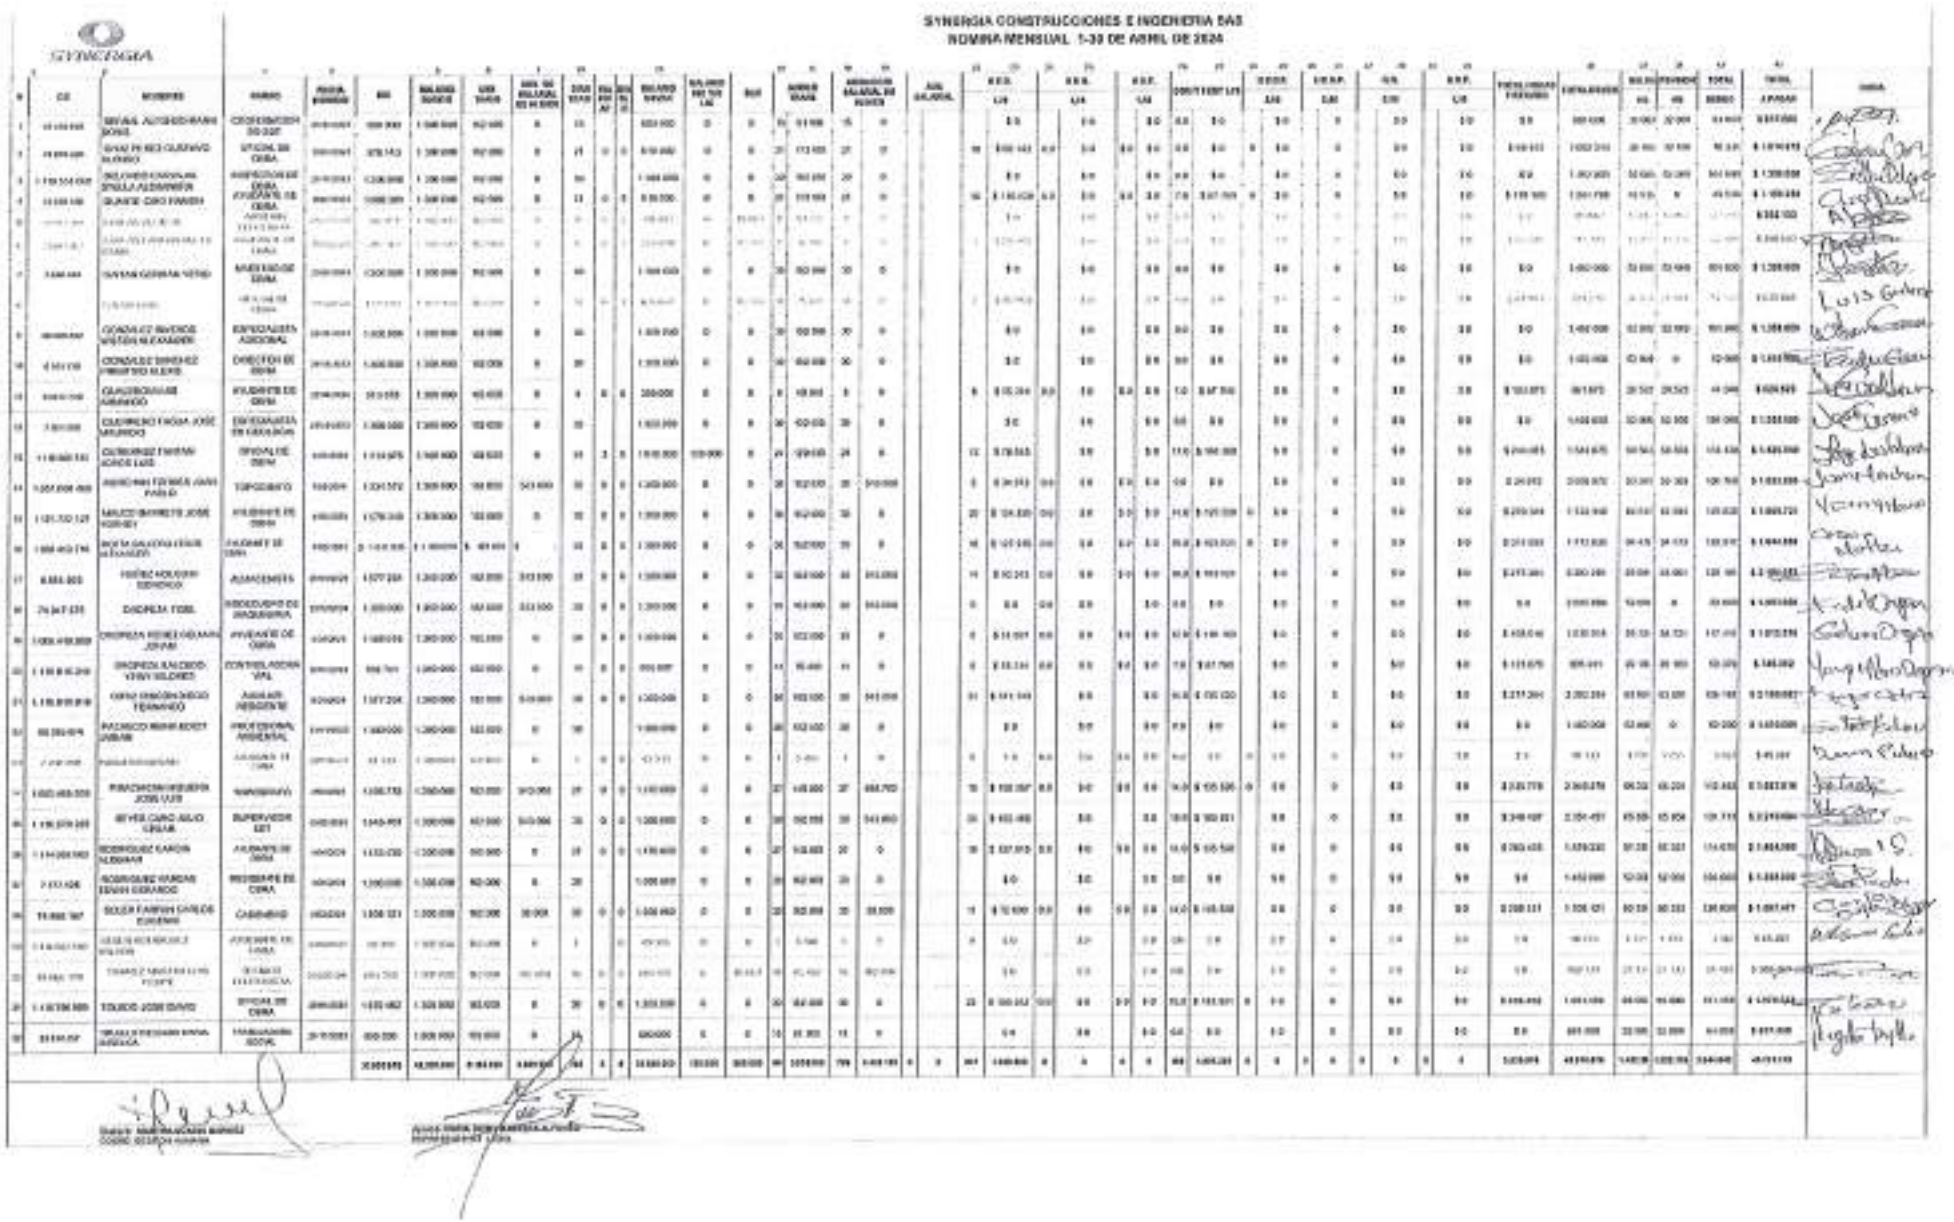

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NOMINA MENSUAL 1-31 DE MAYO DE 2024

	ID	NOMBRE	CARGO	FECHA INGRESO	SUELDO	SALARIO BASICO	AUX. TRANS	AUX.LIC SALARIAL REMUNER	DIAS TRAB	DIAS INCAP	DIAS LIC NO REMU	DIAS VAC	SALARIO DEVEN	VALOR DIA LIQ	VLR LIC	AUXILIO TRANS	DEDUCCIONES SALARIALES SALUD	DEDUCCIONES SALARIALES PENSION	DIAS INCAPACIDAD	HORAS		HORAS		H.E.D.F.		DIAS Y VALOR LTS		H.E.N.F.		H.E.D.F.		H.E.N.F.		RN		RECARGO NOCTURNO		TOTAL HORAS PERIODO	TOTAL DEDUC	BASICO	AUXILIO TRANS	TOTAL	FIRMA
																				1.29		1.75		1.25				1.80		2.50		2.15		2.65		0.35							
1	[illegible]	SERRANO, ALFONSO MAURICIO JOSE	COORDINADOR SG SST	[illegible]	$ 800.000	$ 800.000	$ 162.000	$ -	15				$ 800.000	$ -	$ -	$ -	$ 92.000	$ 96.000	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 962.000	$ 92.000	$ 92.000	$ 54.000	$ 962.000	
2	1.066.000.761	BARRIOS LINDARO JESUS MANUEL	AYUDANTE DE OBRA	14/05/2024	$ 800.421	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	15				$ 108.057	$ -	$ -	$ -	$ 97.000	$ 97.000	$ -	11	$ 176.640		$ -		$ -		$ 171.440	8	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.150.905	$ 891.421	$ 97.740	$ 71.440	$ 963.162	
3	[illegible]	[illegible]	OFICIAL DE OBRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	1.140.831.009	DELGADO CARVAJAL EMILIA ALEJANDRA	SUPERVISOR DE OBRA	01/10/2021	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	30				$ 1.300.000	$ -	$ -	$ -	$ 92.000	$ 96.000	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 1.462.000	$ 92.000	$ 92.000	$ 54.000	$ 1.554.000	
5	37.340.000	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	$ 1.000.000	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	30	0	0	0	$ 1.300.000	$ -	$ -	$ -	$ 92.000	$ 96.000	$ -	0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	$ 1.462.000	$ 92.000	$ -	$ 52.000	$ 1.514.000	
6	1.066.000.831	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	14/05/2024	$ 800.421	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	15	0	0	0	$ 108.057	$ -	$ -	$ -	$ 97.000	$ 97.000	$ -	11	$ 176.640	0,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ 171.440	8	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	$ 1.150.905	$ 891.421	$ 97.740	$ 71.440	$ 963.162	
7	72.047.200	FABIAN FARFAN, MANUEL MARIA	AYUDANTE DE OBRA	14/05/2024	$ 881.134	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	15				$ 120.000	$ -	$ -	$ -	$ 92.000	$ 96.000	$ -	5	$ 91.111		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 91.111	$ 722.111	$ 92.000	$ 37.143	$ 34.000	$ 795.000	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 1.462.000	$ 92.000	$ 92.000	$ 54.000	$ 1.608.000	
9	80.040.000	[illegible]	ESPECIALISTA ADICIONAL	[illegible]	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	30				$ 1.300.000	$ -	$ -	$ -	$ 92.000	$ 96.000	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 1.462.000	$ 92.000	$ 92.000	$ 54.000	$ 1.708.000	
10	[illegible]	[illegible]	DIRECTOR DE OBRA	[illegible]	$ 1.500.000	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	30				$ 1.300.000	$ -	$ -	$ -	$ 92.000	$ 96.000	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 1.462.000	$ 92.000	$ -	$ 52.000	$ 1.462.000	
11	1.021.142.200	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	$ 881.134	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	17	0	0	0	$ 136.667	$ -	$ -	$ -	$ 97.000	$ 97.000	$ -	14	$ 231.111		$ -		$ -		$ 171.440		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 1.170.793	$ 931.235	$ 38.294	$ 38.294	$ 1.008.824	
12	[illegible]	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	$ 1.400.000	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	30	0	0	0	$ 1.300.000	$ -	$ -	$ -	$ 92.000	$ 96.000	$ -	9	$ 149.773	0,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ 147.760		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 1.126.733	$ 1.069.152	$ 92.000	$ 57.581	$ 1.218.733	
13	1.141.000	[illegible]	ESPECIALISTA EN DISCIPLINA	[illegible]	$ 1.500.000	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	30				$ 1.300.000	$ -	$ -	$ -	$ 92.000	$ 96.000	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 1.462.000	$ 92.000	$ 92.000	$ 54.000	$ 1.708.000	
14	1.140.866.141	[illegible]	OFICIAL DE OBRA	[illegible]	$ 1.170.000	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	30	0	1	0	$ 1.300.000	$ -	$ 170.000	$ 54.000	$ 92.000	$ 96.000	$ -	8	$ 211.111		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 211.111	$ 1.170.000	$ 92.000	$ 37.143	$ 54.000	$ 1.354.000	
15	1.007.000.000	[illegible]	TOPOGRAFO	[illegible]	$ 1.500.000	$ 1.300.000	$ 162.000	$ 162.000	30	0	1	0	$ 1.300.000	$ -	$ 43.333	$ 54.000	$ 92.000	$ 96.000	$ 324.000	3	$ 130.333	0,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ 49.400		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 179.733	$ 1.297.199	$ 92.000	$ 92.000	$ 1.389.199	
16	1.007.702.107	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	$ 1.500.000	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	30	0	2	0	$ 1.211.333	$ -	$ 86.667	$ 54.000	$ 92.000	$ 96.000	$ -	14	$ 303.111	0,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ 295.400	2	$ 98.800		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 2.396.944	$ 1.601.477	$ 92.000	$ 92.000	$ 1.693.477	
17	1.035.450.718	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	30	0	0	0	$ 1.300.000	$ -	$ -	$ -	$ 92.000	$ 96.000	$ -	12	$ 270.000	0,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -	4	$ 98.800		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 2.370.176	$ 1.611.976	$ 92.000	$ 92.000	$ 1.695.976	
18	[illegible]	[illegible]	ALMACENISTA	[illegible]	$ 1.331.926	$ 1.300.000	$ 162.000	$ 162.000	30	0	0	0	$ 1.300.000	$ -	$ -	$ -	$ 92.000	$ 96.000	$ 324.000	9	$ 349.600	0,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ 148.200		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 2.331.926	$ 2.124.429	$ 92.000	$ 92.000	$ 2.216.429	
19	71.047.370	[illegible]	SOLDADOR/OFICIAL	[illegible]	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 162.000	$ 162.000	30	0	0	0	$ 1.300.000	$ -	$ -	$ -	$ 92.000	$ 96.000	$ 324.000	8	$ -	0,0	$ -		$ -	0,0	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 1.000.000	$ 92.000	$ -	$ 54.000	$ 1.146.000	
20	[illegible]	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	$ 1.200.000	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	30	2	2	0	$ 1.126.667	$ 43.333	$ 86.667	$ 54.000	$ 92.000	$ 96.000	$ -	12	$ 300.000	0,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 2.300.000	$ 1.429.333	$ 92.000	$ 92.000	$ 1.521.333	
21	1.136.515.644	[illegible]	CONTRAMAESTRA VIAL	[illegible]	$ 1.400.000	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	30	2	0	0	$ 1.213.333	$ 86.667	$ -	$ 54.000	$ 92.000	$ 96.000	$ -	9	$ 261.333	0,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ 147.760		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 2.109.094	$ 1.600.666	$ 92.000	$ 92.000	$ 1.692.666	
22	1.136.845.815	[illegible]	AUXILIAR PRESUPUESTO	[illegible]	$ 1.500.000	$ 1.300.000	$ 162.000	$ 162.000	30	0	0	0	$ 1.300.000	$ -	$ -	$ 54.000	$ 92.000	$ 96.000	$ 324.000	11	$ 478.000		$ -		$ -		$ 148.200		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 2.311.801	$ 2.228.801	$ 92.000	$ 92.000	$ 2.320.801	
23	80.200.604	[illegible]	PROFESIONAL AMBIENTAL	[illegible]	$ 1.200.000	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	30				$ 1.300.000	$ -	$ -	$ -	$ 92.000	$ 96.000	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 1.462.000	$ 92.000	$ -	$ 52.000	$ 1.514.000	
24	7.552.418	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	$ 999.999	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	15	0	0	0	$ 866.666	$ -	$ -	$ -	$ 92.000	$ 96.000	$ -	5	$ 108.000	0,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 330.000	$ 758.666	$ 77.333	$ 37.333	$ 873.333	
25	1.002.458.555	[illegible]	TOPOGRAFO	[illegible]	$ 1.331.926	$ 1.300.000	$ 162.000	$ 162.000	30	0	0	0	$ 1.211.333	$ -	$ 86.667	$ 54.000	$ 92.000	$ 96.000	$ 324.000	11	$ 319.037	0,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ 147.760	8	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 2.140.864	$ 2.000.193	$ 84.296	$ 54.296	$ 2.138.913	
26	1.136.272.257	[illegible]	SUPERVISOR SST	[illegible]	$ 1.400.000	$ 1.300.000	$ 162.000	$ 162.000	30	0	1	0	$ 1.300.000	$ -	$ 43.333	$ 54.000	$ 92.000	$ 96.000	$ 324.000	9	$ 261.333		$ -		$ -		$ 126.800		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 2.107.199	$ 2.103.800	$ 92.171	$ 38.171	$ 2.234.142	
27	1.134.076.165	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	$ 1.100.333	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	30	0	0	0	$ 1.300.000	$ -	$ -	$ -	$ 92.000	$ 96.000	$ -	3	$ 34.973	0,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ 147.760		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 2.108.333	$ 1.556.333	$ 92.000	$ 92.000	$ 1.740.333	
28	1.111.000	[illegible]	SOLDADOR DE OBRA	[illegible]	$ 1.500.000	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	30				$ 1.300.000	$ -	$ -	$ -	$ 92.000	$ 96.000	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 1.462.000	$ 92.000	$ 92.000	$ 54.000	$ 1.608.000	
29	24.000.197	[illegible]	CARPINTERO	[illegible]	$ 1.447.370	$ 1.300.000	$ 162.000	$ 32.000	30	0	0	0	$ 1.300.000	$ -	$ -	$ 54.000	$ 92.000	$ 96.000	$ 32.000	12	$ 312.000	0,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ 147.760		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 2.147.370	$ 1.667.370	$ 92.000	$ 92.000	$ 1.851.370	
30	1.140.837.000	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	$ 1.500.000	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	30	0	0	0	$ 1.300.000	$ -	$ -	$ 54.000	$ 92.000	$ 96.000	$ -	8	$ 200.000	0,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 1.500.000	$ 1.462.000	$ 92.000	$ 92.000	$ 1.554.000	
31	1.136.881.000	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	[illegible]	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	30	0	0	0	$ 1.300.000	$ -	$ -	$ 54.000	$ 92.000	$ 96.000	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 1.462.000	$ 92.000	$ 92.000	$ 54.000	$ 1.608.000	
32	1.140.784.000	[illegible]	OFICIAL DE OBRA	[illegible]	$ 1.500.000	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	30	0	0	0	$ 1.300.000	$ -	$ -	$ 54.000	$ 92.000	$ 96.000	$ -	15	$ 468.000	0,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ 118.160	8	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 2.118.160	$ 1.978.840	$ 92.000	$ 92.000	$ 2.070.840	
33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 800.000	$ 1.300.000	$ 162.000	$ -	15				$ 800.000	$ -	$ -	$ -	$ 92.000	$ 96.000	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 962.000	$ 92.000	$ 92.000	$ 54.000	$ 962.000	
					$ 48.222.151	$ 48.100.000	$ 6.048.000	$ 2.430.000	825	4	10	0	$ 39.200.667	$ 173.333	$ 346.667	$ 1.458.000	$ 3.404.000	$ 3.552.000	$ 4.860.000	258	$ 5.557.748	0	$ -	0	$ -	0	$ 2.071.000	20	$ 197.600	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	$ 59.026.515	$ 47.543.151	$ 2.760.000	$ 1.458.000	$ 51.761.151	

[illegible]
[illegible]
COORD. GESTION HUMANA

[illegible]
[illegible]
REPRESENTANTE LEGAL

[illegible]

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NOMINA MENSUAL 1-30 DE JUNIO DE 2024 BOCAS DEL PATIA



SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NOMINA MENSUAL 1-31 DE JULIO DE 2024 BOCAS DEL PAUTO

#	ID	NOMBRES	CARGO	FECHA INGRESO	SO	SALARIO BASICO	AUX. TRANS	AUX DE ALIMENTACION SALARIAL	DIAS TRAB	DIAS INCAP EPS	DIAS INCAP ARL	DIAS LICENCIA	SALARIO DEVG	SALARIO POR DIA LAB	H.E.	AUXILIO TRANS	AUXILIO NO SALARIAL DE ALIMEN	SUB SALARIAL	H.E.D. 1.25	H.E.N. 1.75	H.R.F. 1.75	DOM Y FEST 1.75	H.E.D. 2.50	H.E.N. 2.50	H.D.F. 2.00	H.N.F. 2.00	TOTAL RECAR Y RECARGO	TOTAL DEVG	BAJAS	SINDICATO	TOTAL	TOTAL APAGAR	FIRMA
1	[illegible]	BERNAL ALATORO MARIA EMMA	COORDINADOR SG-SST	[illegible]	100.000	1.600.000	162.000	0	16				833.333	0	0	16	33.600	16	0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	33.000	33.000	61.000	$ 61.000	
2	1.030.40.028	BURGOS MENDIVELSO RONET	AYUDANTE DE OBRA	14/06/2024	1.911.341	1.300.000	140.000	0	15	0	0		1.210.333	0	80.667	15	13.500	15	0			11	5.90.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5.90.000	1.450.341	33.464	33.464	101.805	$ 1.257.805	
3	1.193.914.101	CHAVEZ DUEÑAS CRISTIAN	AYUDANTE DE OBRA	31/05/2024	1.823.341	1.300.000	162.000	0	20	0	0		1.300.000	0	0	20	150.000	20	0	0		0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NOMINA MENSUAL 1-31 DE AGOSTO DE 2024 BODAS DEL PAUTO

#	CC	NOMBRE	CARGO	FECHA INGRESO	SALARIO BASICO	AUX. TRANS	AUX. NO SALARIAL DE ALIMEN	DIAS TRAB	DIAS INCAP.	DIAS LIC.	DIAS VAC.	SALARIO DEVEN	SALARIO INCTO LIC	SUB	HORAS EXTRAS		RECARGOS SALARIAL DE ALIMEN		AUX SALARIAL	H.E.D.		H.E.N.		H.D.F.		DOM Y FEST 1.75		H.E.D.F.		HDNR		R.N.		H.E.F.		TOTAL HORAS Y RECARG	TOTAL DEVEN	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUC	TOTAL A PAGAR	FIRMA
																				1.25		1.75		1.75				EDD		EDN		2.25		1.75				4%	4%		
1		BERNAL ALFONSO MARIA OSIRIS	COORDINADOR SG-SST		800.000	1.400.000	140.000	0	11			800.000	0	0	15	61.538	15	0			0,0		0,0		0,0	0,0	5,0	0	0,0		0		0,0		0,0		5,0	861.538	32.000	32.000	64.000	$ 797.538	
2		[illegible]	AYUDANTE DE OBRA		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3		CHAVEZ DUENAS CAETANO	AYUDANTE DE OBRA		1.300.000	1.300.000	140.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	180.000	20	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000	52.000	52.000	104.000	$ 1.336.000	
4		DELGADO CARVAJAL ESTELLA ALEXANDRA	INSPECTOR DE OBRA		1.400.000	1.300.000	140.000	0	30			1.300.000	0	0	30	180.000	20	0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	1.480.000	52.000	52.000	104.000	$ 1.376.000	
5		[illegible]	AYUDANTE DE OBRA		1.400.000	1.300.000	140.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	180.000	20	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000	52.000	52.000	104.000	$ 1.336.000	
6		[illegible]	MAESTRO DE OBRA		1.400.000	1.300.000	140.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	180.000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000	52.000	52.000	104.000	$ 1.336.000	
7		[illegible]	ESPECIALISTA AMBIENTAL		1.400.000	1.300.000	140.000	0	30			1.300.000	0	0	30	180.000	20	0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	1.480.000	52.000	52.000	104.000	$ 1.376.000	
8		[illegible]	DIRECCION DE OBRA		1.500.000	1.300.000	140.000	0	30			1.300.000	0	0	30	180.000	20	0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	1.480.000	52.000	0	52.000	$ 1.428.000	
9		[illegible]	AYUDANTE DE OBRA		1.400.000	1.300.000	140.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	180.000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000	52.000	52.000	104.000	$ 1.336.000	
10		[illegible]	AYUDANTE DE OBRA		1.400.000	1.300.000	140.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	180.000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000	52.000	52.000	104.000	$ 1.336.000	
11		[illegible]	ESPECIALISTA EN COSTOS OBRA		1.300.000	1.300.000	140.000	0	30			1.300.000	0	0	30	180.000	20	0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	1.440.000	52.000	52.000	104.000	$ 1.336.000	
12		LIZARAZO AGRIZNO JORGE FERNANDO	AUXILIAR DE INGENIERIA		1.400.514	1.300.000	140.000	343.000	23			1.200.001	0	0	28	168.000	20	321.000		0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	
13		PEDRO HECTOR DE JUAN PABLO	TOPOGRAFO		1.348.457	1.300.000	140.000	343.000	30	0	0	1.300.000	0	0	30	180.000	20	343.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14		VARGAS BARRETO JOSE YOHNEY	AYUDANTE DE OBRA		1.400.000	1.300.000	140.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	180.000	20	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15		MOTA CALCCO DENIS ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA		$ 1.400.000	$ 1.300.000	$ 62.000	$	30	0	0	1.300.000	0	0	30	180.000	20	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16		MORENO GARZON MAURICIO	ALBAÑILERIA		1.527.358	1.300.000	140.000	343.000	30	0	0	1.300.000	0	0	30	180.000	20	343.000		1	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	
17		[illegible]	BODEGUERO DE HIDRATANTE		1.500.000	1.400.000	140.000	343.000	30	0	0	1.300.000	0	0	30	180.000	20	343.000		0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	
18		PACHECO REINA SCOTT JAIMES	PROFESIONAL AMBIENTAL		1.300.000	1.300.000	140.000	0	30			1.300.000	0	0	30	180.000	20	0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	1.440.000	52.000	0	52.000	$ 1.388.000	
19		PEREZ GARCIA LUIS DAVID	CONTRATISTA OBRA		1.300.000	1.300.000	140.000	0	29	0	0	1.300.000	0	0	29	174.000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000	52.000	52.000	104.000	$ 1.336.000	
20		RINCON JHON ROBINSON	SUPERVISOR SST		1.816.815	1.300.000	140.000	343.000	30	0	0	1.300.000	0	0	30	180.000	20	343.000		15	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	
21		RODRIGUEZ VARGAS EDWIN GERARDO	RESIDENTE DE OBRA		1.400.000	1.300.000	140.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	180.000	20	0		0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	
22		SOLER FABIAN CARLOS ALBERTO	CADENERO		1.376.852	1.300.000	140.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	180.000	20	0		1	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	
23		SUAREZ AGUSTIN LUIS FELIPE	TEC ELECTRICISTA		1.500.000	1.300.000	140.000	343.000	30	0	0	1.300.000	0	0	30	180.000	20	0		0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	
24		SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER	OFICIAL DE OBRA		1.400.000	1.300.000	140.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	180.000	20	0		0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	
25		TAFUR GARCIA JOSE DANIEL	AYUDANTE DE OBRA		1.347.227	1.300.000	140.000	0	25	0	0	1.300.000	0	0	25	150.000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000	52.000	52.000	104.000	$ 1.336.000	
26		TOLEDO JOSE DAVID	OFICIAL DE OBRA		1.400.000	1.300.000	140.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	180.000	20	0		0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	
27		TRUJILLO GELEDONIMA ANGELICA	TRABAJADORA SOCIAL		600.000	1.400.000	140.000	0	11			800.000	0	0	15	61.538	15	0			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	861.538	32.000	32.000	64.000	$ 797.538	
					38.126.881	39.700.000	4.214.000	3.086.001	716	0	7	38.015.881	0	800.000	560	2.400.000	764	2.914.000	0	0	181	1.878.204	0	0	0	0	0	0	0	0	196	1.400.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	3.800.000	43.004.881	1.440.516	1.280.184	2.720.384	40.414.005	

Nombre: MARTHA OLIVA MARQUEZ
COORD. SISTEMA INTEGRADO

Nombre: [illegible]
REPRESENTANTE LEGAL

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NOMINA MENSUAL 1-30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 BODAS DEL PAUTO

N	CC	NOMBRES	CARGO	FECHA INGRESO	DIAS	SALARIO BASICO	AUX. TRANS	DIAS NO SALARIO DE ALMUER	DIAS TRAB	DIAS INCAP AP	DIAS INCAP EG	SALARIO DEVEN	SALARIO AUXILIO	BLA	AUXILIO TRANS	AUXILIO NO SALARIAL DE ALMUER	AUX SALARIAL	H.E.D.		H.E.N.		H.E.F.		DOM Y FEST 1/3	H.E.D.R.		H.E.N.R.		BON		H.R.F.		TOTAL BONIF Y SALARIO	TOTAL DEVEN	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUC	TOTAL A PAGAR	FIRMA
																		1,25		1,75		2,00			2,50		2,62			1,39									
1																																						
2																																						
3																																						
4																																						
5																																						
6																																						
7																																						
8																																						
9																																						
10																																						
11																																						
12																																						
13																																						
14																																						
15																																						
16																																						
17																																						
18																																						
19																																						
20																																						
21																																						
22																																						
23																																						
24																																						
25																																						
26																																						
27																																						

Angel Fontan.

Alexandra Lotta.

Adalvin Nuñez.

Yelmy Orozpeta

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NOMINA MENSUAL 1-7 DE OCTUBRE DE 2024 BOCAS DEL PAUTO


SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NOMINA MENSUAL 1-30 DE NOVIEMBRE DE 2024 BOCAS DEL PAUTO

N°	CC	NOMBRES	CARGO	FECHA INGRESO	BC	SALARIO BASICO	AUX. TRANS	AUX. NO SALARIAL EN DINERO	AUX. NO SALARIAL EN ESPECIE	DIAS LAB	DIAS INC AT	DIAS INC EG	DIAS LIC	SALARIO DEVEN	SALARIO DIAS VAC LIQ	AUX	HORAS EXTRAS		RECARGOS NOCTURNOS		AUX SALARIAL	H.E.D.		H.E.N.		H.E.F.		DOMIN FEST LIQ		H.E.D.F.		H.E.N.F.		RN		R.F.		TOTAL DEVENGADO Y/O GANADO	TOTAL DEDUC	SALUD	PENSION	FSPSA	TOTAL	FIRMA
																																							4%	4%			
1		ALVAREZ OVIEDO SERGIO	OFICIAL DE OBRA		434.445	1.300.000	162.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	33.409	0	0	11	70.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 70.156	286.000	11.247	11.247	33.708	$ 356.956	
2		VALA HERNANDEZ OVE	OFICIAL DE OBRA		1.614.809	1.300.000	162.000	0	15	0	0	0	0	1.129.667	0	0	23	143.400	28	0	0	36	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 368.400	0	14.736	14.736	44.208	$ 458.136	
3		MORALES ALFONSO MARIA DORIS	COCINERA/OR GG-037		333.333	1.400.000	162.000	0	14					350.000	0	0	14	91.000	10	0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		$ 91.000	0	0,0	0,0	0,0	$ 91.000	
4		BURGOS HERNOVELIO RONEY ESTEVEN	AYUDANTE DE OBRA		1.041.391	1.300.000	162.000	0	20	0	0	0	0	1.000.000	0	0	20	162.000	20	0	0	24	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 378.000	0	15.120	15.120	45.360	$ 483.000	
5		CELSADO CARVAJAL STELLA ALEXANDRA	INSPECTOR DE OBRA		1.300.000	1.300.000	162.000	0	30					1.300.000	0	0	30	162.000	30	0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		$ 162.000	0	0,0	0,0	0,0	$ 162.000	
6		SARAN PARDO ANGEL MARIA	AYUDANTE DE OBRA		600.778	1.300.000	162.000	0	11	0	0			433.333	0	0	13	84.500	13	0	0	13	84.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 169.000	0	6.760	6.760	20.280	$ 202.800	
7		SARAN SERRANO TITO	MAESTRO DE OBRA		1.300.000	1.300.000	162.000	0	30	0	0	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 162.000	0	0,0	0,0	0,0	$ 162.000	
8		SARAN LEON NELSON ALFREDO	OFICIAL DE OBRA		433.333	1.300.000	162.000	0	9	0	0	0	0	390.000	0	0	9	48.600	9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 48.600	0	1.944	1.944	5.832	$ 58.320	
9		SOTO NUÑEZ RAMIROS WILSON ALEXANDER	ESPECIALISTA ADICIONAL		1.300.000	1.300.000	162.000	0	30					1.300.000	0	0	30	162.000	30	0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		$ 162.000	0	0,0	0,0	0,0	$ 162.000	
10		SUAREZ SUAREZ ANGEL JULIO	AYUDANTE DE OBRA		1.300.000	1.300.000	162.000	0	30					1.300.000	0	0	30	162.000	30	0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		$ 162.000	0	0,0	0,0	0,0	$ 162.000	
11		ZAMUDIO BOLIVAR EVA	AYUDANTE DE OBRA		1.084.238	1.300.000	162.000	0	23	0	0	1.210.000	68.667	0	68	151.333	23	0	21	140.269	0	0	0	0	20	216.922	0	68.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 568.559	0	0,0	0,0	0,0	$ 568.559	
12		QUIAMBO GUERRERO	OFICIAL DE OBRA		598.522	1.300.000	162.000	0	0	0	1	130.000	0	43.333	2	10.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0	0	0,0	0,0	0,0	$ 0	
13		GUERRERO PARRA JOSE MAURICIO	ESPECIALISTA EN SOLDADURA		1.300.000	1.300.000	162.000	0	30					1.300.000	0	0	30	162.000	30	0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		$ 162.000	0	0,0	0,0	0,0	$ 162.000	
14		GUTIERREZ PARRA JORGE LUIS	OFICIAL DE OBRA		1.622.429	1.300.000	162.000	0	28	0	1	1.130.667	130.000	43.333	45	140.400	28	0					-03	202.014	0	0	0	0	28	216.667	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 418.681	1.611.000	72.457	72.457	145.014	$ 1.611.000	
15		LEMUS MUÑOZ LILIANA DEL PILAR	SUPERVISORA SST		1.135.308	1.300.000	162.000	840.000	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	840.000					0,0	32.308,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ 32.308	2.040.000	64.615	83.012	129.230	$ 2.349.000	
16		LEDESMA MURRAY JORGE FERNANDO	AUXILIAR DE INGENIERIA		1.300.308	1.300.000	162.000	840.000	30	0	0	1.300.308	0	0	30	162.000	30	840.000					0,0	38.308,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ 38.308	2.040.000	64.615	83.012	129.230	$ 2.349.000	
17		RINCONES PEREZ BRAYAN	AYUDANTE DE OBRA		1.808.921	1.300.000	162.000	0	28	0	0	1.130.667	0	0	28	140.000	28	0					10,0	300.894,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78.125,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ 379.019	2.040.000	83.110	83.110	166.220	$ 2.409.000	
18		HERNANDEZ TORRES JUAN PABLO	ESPECIALISTA		1.135.308	1.300.000	162.000	840.000	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	840.000					0,0	38.308,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ 38.308	2.040.000	64.615	83.012	129.230	$ 2.349.000	
19		MOSTACILLA OSORIO DIANA MARCELA	SUPERVISORA SST		1.164.286	$ 1.300.000	$ 162.000	0	28	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	840.000					0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	$ 0	2.000.000	80.000	0	80.000	$ 1.960.000	
20		CRISPIN PERI	ROBOSURCO DE MAQUINARIA		1.300.000	1.300.000	162.000	840.000	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	840.000					0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	$ 0	2.000.000	80.000	0	80.000	$ 1.960.000	
21		ANDRADA SUAREZ CARLOS JULIAN	AYUDANTE DE OBRA		1.418.841	1.300.000	162.000	0	23	3	0	998.667	130.000	0	33	124.259	23	0					20	441.041	0	0	0	0	16	148.370	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 589.474	1.837.841	88.554	110.307	154.429	$ 2.427.333	
22		CRISPIN YURI STEFANIA	CONTRALADORA VIAL		1.277.282	1.300.000	162.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	0	0	0			30	390.000	4	49.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 439.917	1.839.199	88.003	88.003	132.005	$ 2.359.001	
23		CRISPIN PERI BRAYAN DANIA	AYUDANTE DE OBRA		1.137.307	1.300.000	162.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	0					30	390.000	0	0	0	0	21	303.917	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 693.917	1.855.378	88.597	88.597	133.895	$ 2.342.885	
24		CRISPIN PEREZ MARIO YOEL	AYUDANTE DE OBRA		1.433.678	1.300.000	162.000	0	28	0	1	1.300.667	0	43.333	29	156.000	28	0					30	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 390.000	1.852.000	92.600	92.600	138.900	$ 2.370.000	
25		CRISPIN SALCEDO YERI MILENIS	CONTABILIZADORA VIAL		1.300.000	1.300.000	162.000		30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	0					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	$ 0	1.852.000	92.600	0	92.600	$ 1.759.400	
26		PADILLO BRAN ROCT JASHIN	PROFESIONAL AMBIENTAL		1.300.000	1.300.000	162.000	0	30			1.300.000	0	0	30	162.000	30	0					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	$ 0	1.852.000	92.600	0	92.600	$ 1.759.400	
27		PAREJA ESPINOSA JOSE RAFAEL	ALMACENISTA		1.328.286	1.300.000	162.000	840.000	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	840.000					0	38.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 38.308	2.040.000	64.615	83.012	129.230	$ 2.349.000	
28		PEREZ GARCIA LUIS ROCIO	CONTABILIZADORA VIAL		1.627.388	1.300.000	162.000	0	30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	0	0	0,00	444	3,00	3,00	390.000,00	434	#¡VALOR!	#¡VALOR!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ 390.000	$ 227.265	1.839.000	91.951	91.951	137.926	$ 1.705.700	
29		RAMIREZ FONSECA JHON CARLOS	CHOFER		313.043	1.300.000	162.000	0	8	0	0	260.000	0	0	8	39.429	8	0					13	172.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 172.500	480.000	19.200	19.200	14.400	$ 499.800	
30		RUEDA RUBEN DARIO	AYUDANTE DE OBRA		1.085.870	1.300.000	162.000		30	0	0	1.300.000	0	0	30	162.000	30	0					31	390.000	0	0	0	0	23	333.948	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 723.948	1.885.870	75.435	75.435	113.153	$ 1.885.870	
31		PEDROZA GUTIERREZ TRISTAN	AYUDANTE DE OBRA		729.282	1.300.000	162.000	0	15	0	0	650.000	0	0	15	81.000	13	0	0	0	0	0	0	84.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 84.500	814.000	32.560	32.560	48.840	$ 781.940	
32		RUEDA RUBEN DARIO	AYUDANTE DE OBRA		1.428.417	1.300.000	162.000	0	28	0	0	1.130.667	0	0	28	140.000	28	0					20	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 300.000	1.570.667	62.827	62.827	94.240	$ 1.570.667	


Edgar A.
Delta Delgado.
Angel Pardo
Juana Lemus.
Jorge Rincon
Alexander
Pedro Dorgeles
Victor Pardo
Dorregles

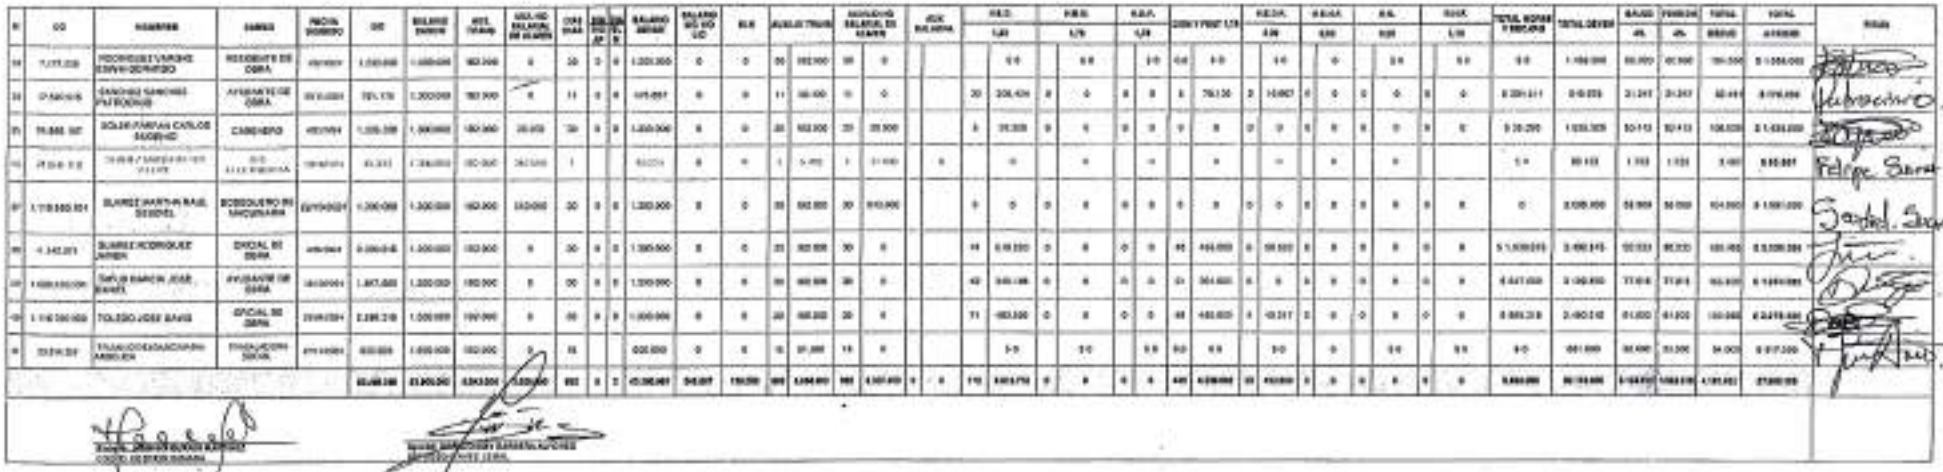


SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NOMINA MENSUAL 1-30 DE DICIEMBRE DE 2024 BOCAS DEL PAUTO

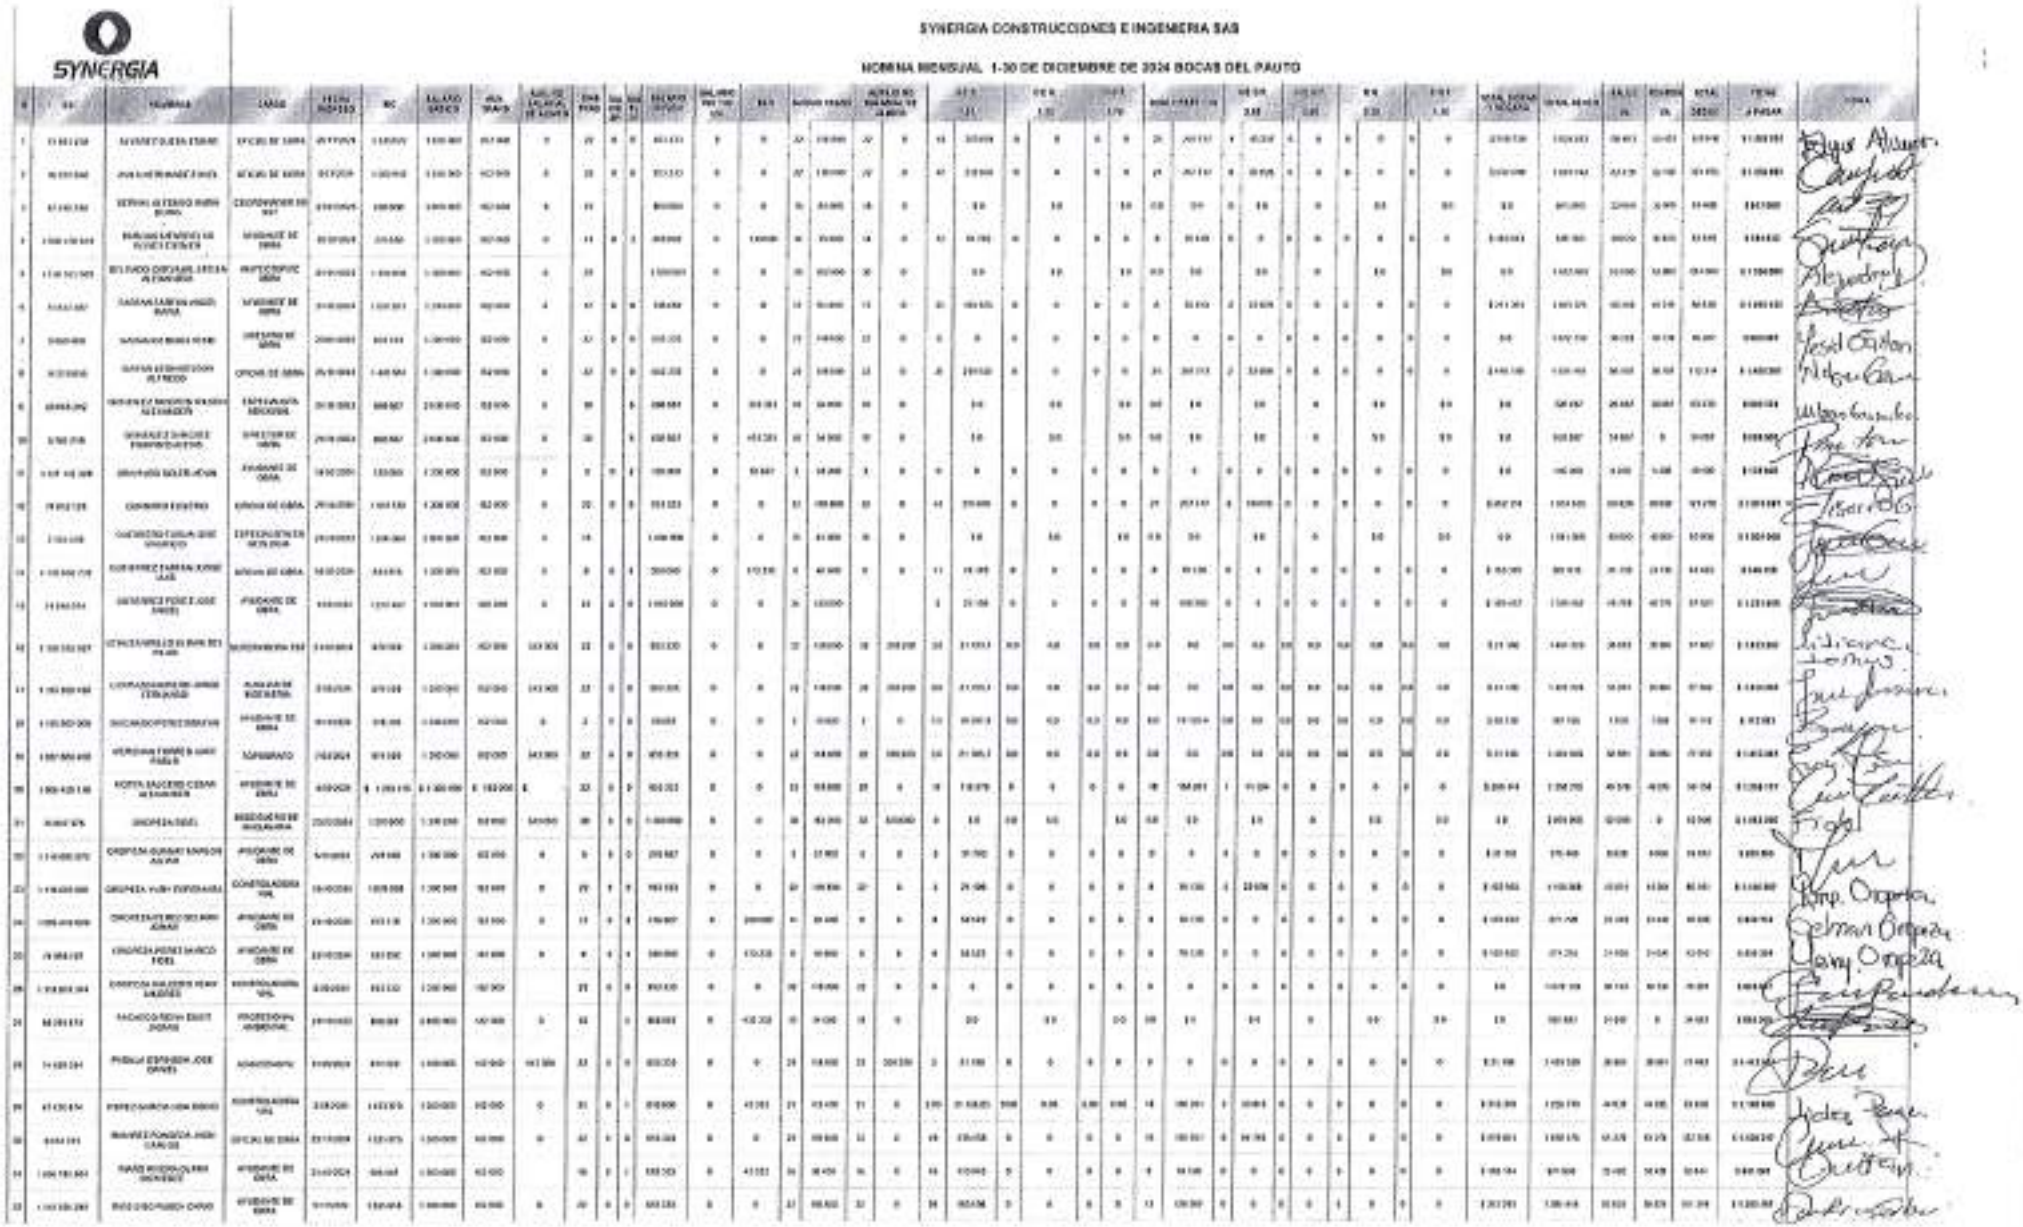

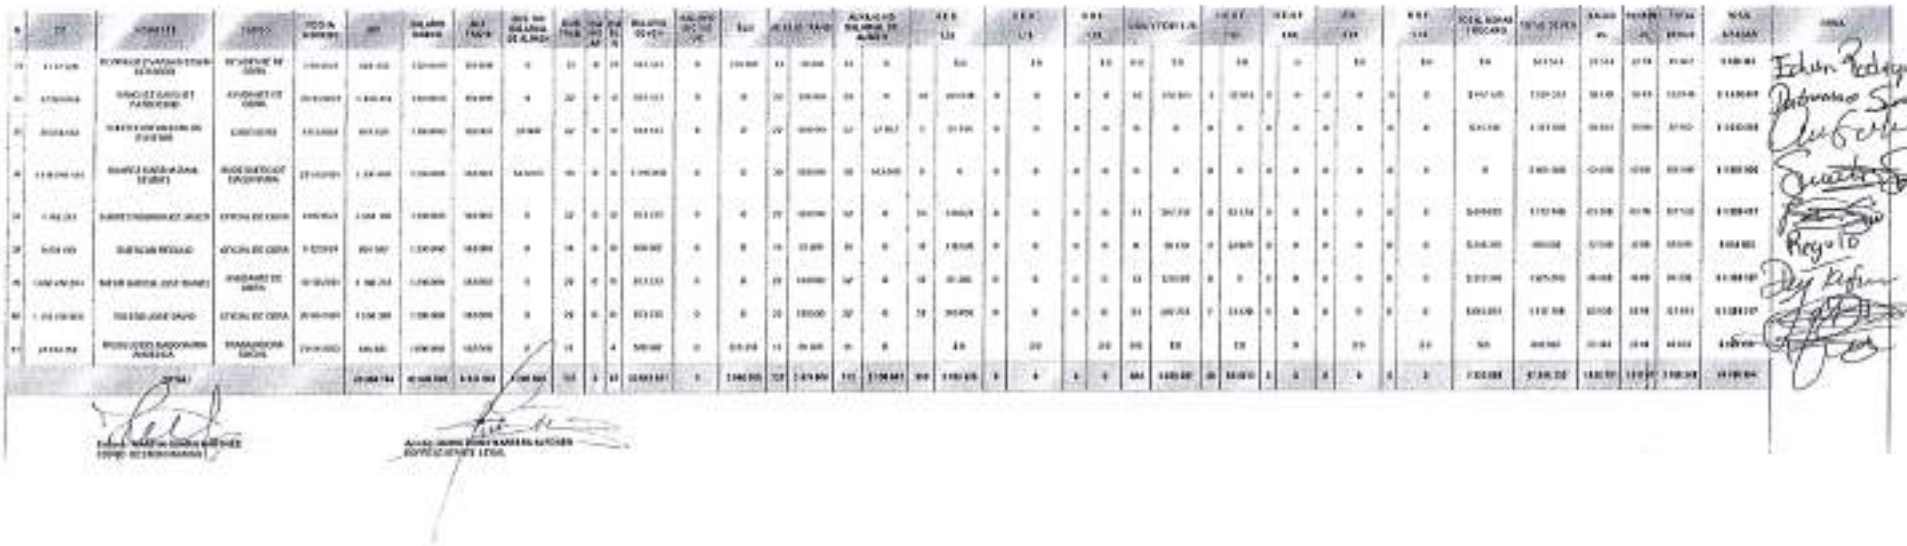

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NOMINA MENSUAL 1-30 DE MARZO 2026

N°	CC	NOMBRES	CARGO	FECHA INGRESO	DIAS	SALARIO BASICO	AUX. TRANS.	AUX. NO SALARIAL DE ALIMEN.	DIAS INCAP.	DIAS LICEN.	DIAS VACAC.	SALARIO DEVEN.	SALARIO INCAPAC. LICEN.	SOBR.	HORAS TRANS.		AUXILIO NO SALARIAL DE ALIMEN.		H.E.D. L.N.		DOM. Y FEST. (15)		TOTAL HORAS Y RECARG.	TOTAL DEVEN.	SALUD 4%	PENSION 4%	FSP 1%	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1																													
4																													
9																													
6																													
7																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													
25																													
26																													
27																													
28																													
29																													
30																													
		TOTAL																											

ALVARO MARIA DIAZ SYNERGIA ALFONSO
REPRESENTANTE LEGAL

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NOMINA MENSUAL 1-30 DE ABRIL 2025

N°	ID	NOMBRES	CARGO	FECHA INGRESO	DIAS	SALARIO BASICO	AUX. TRANS	AUX. NO SALARIAL DE ALIMEN	HORAS EXTRAS			SALARIO DEVEN	SALARIO NO INCL LIC	SUB	HORAS TRANS		AUXILIO NO SALARIAL DE HOMEN		H.E.D		H.E.N		DOM Y FEST L/TR	TOTAL BONOS Y RECARG	CONVENCIONAL	TOTAL DEVEN	DEDUC		TOTAL A PAGAR	FIRMA
									DIUR	REC	SUB N								L/R		L/R						VR	%		
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													
21																													
22																													
23																													
24																													
25																													
26																													
27																													
28																													
29																													
						41.621.040	41.293.500	5.498.400	1.661.760	704	0	28	28.636.200	44.800	1.911.000	704	6.498.400	308	2.101.221	228	1.711.600	11	110.111	84	830.400	2.824.240	1.368.818	85.333.000	1.695.224	1.423.284	2.110.000	83.545.330	

Autorizo: OSCAR LEONARDO MORENO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

Aprobó: JAIME LEONARDO BARRERA ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NOMINA MENSUAL 1-30 DE MAYO 2025

N°	CC	NOMBRE	CARGO	FECHA INGRESO	SBC	SALARIO BASICO	HOR. TRANS	AUX. NO SALARIAL DE ALIMENT	DIAS TRB	DIAS INC	DIAS VAC LR	SALARIO DEVEN	SALARIO S/S Y/O LR	ELR	HRS EXT DIURN	VALOR HRS EXT DIURN	HRS EXT NOCT	VALOR HRS EXT NOCT	RECARGO NOCT SALARIAL DE ALIMENT	H.E.D. 1.25		H.E.N. 1.75		H.R.D.F. 2.05		H.R.N.F. 2.55		TOTAL HORAS Y RECARG	LICENCIAS DN	TOTAL DEVEN	SALUD 4%	PENSION 4%	TOTAL DEDUC	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	1.108.804.662	ACEVEDO PEREZ JOSE RAFAEL	AYUDANTE DE OBRA	13/05/2025	500.000	1.423.500	200.000	0	11	0	0	520.000	0	0	10	68.000	12	0	7.5	63.825	7.5	81.262	0	0	0	0	$ 138.265	166.875	1.955.139	78.206	78.206	156.413	$ 1.798.726	
2	1.008.102.320	BUNDIO HERNANDEZ NOMEY ESTEVEN	AYUDANTE DE OBRA	01/05/2025	1.423.500	1.423.500	200.000	61.000	30	0	0	1.423.500	0	0	30	204.000	30	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.684.500	67.380	67.380	134.760	$ 1.549.740	
3	17.142.678	BEDOYA ALTAMIRANO MARIA DORIS	COORDINADOR SG-SST	19/12/1984	800.000	1.500.000	200.000	0	15	0	0	850.000	0	0	15	150.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	40.000	40.000	80.000	$ 920.000	
4	$ 1.10.101.909	BELALCAZAR CORTES ESTELA ALEXANDRA	DIRECTOR DE OBRA	01/01/2023	1.423.500	1.423.500	200.000	0	30	0	0	1.423.500	0	0	30	300.000	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.923.500	76.940	76.940	153.880	$ 1.769.620	
5	5.000.000	BATAN GERMAN YEPES	RESIDENTE DE OBRA	04/01/2023	1.423.500	1.423.500	200.000	0	30	0	0	1.423.500	0	0	30	200.000	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.823.500	72.940	72.940	145.880	$ 1.677.620	
6	11.230.000	BATAN LEON NELSON ALFREDO	OFICIAL DE OBRA	20/01/2023	1.158.500	1.423.500	200.000	61.000	30	0	0	1.423.500	0	0	30	200.000	30	61.000	1.5	11.906	0.5	5.101	0	0	0	0	$ 83.008	0	1.784.508	71.380	71.380	142.760	$ 1.641.748	
7	80.000.000	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	01/01/2023	1.600.000	2.000.000	200.000	0	30	0	0	1.666.666	0	0	30	266.666	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.133.332	85.333	85.333	170.666	$ 1.962.666	
8	5.141.218	GONZALEZ SANCHEZ ENRIQUE ALEXIS	DIRECTOR DE OBRA	21/01/2023	1.200.000	2.000.000	200.000	0	30	0	0	1.666.666	0	0	30	266.666	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.133.332	85.333	85.333	170.666	$ 1.962.666	
9	7.161.000	SUBIENDO HAIDAR JOSE MAURICIO	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	21/01/2023	1.600.000	2.000.000	200.000	0	30	0	0	1.666.666	0	0	30	266.666	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.133.332	85.333	85.333	170.666	$ 1.962.666	
10	1.118.168.027	LENGUA MURILLO LILIANA DEL PILAR	SUPERVISORA SST	9/01/2023	1.423.500	1.423.500	200.000	369.000	30	0	0	1.423.500	0	0	30	200.000	30	369.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.992.500	79.700	79.700	159.400	$ 1.833.100	
11	1.007.906.408	HERCHAN TORRES JUAN PABLO	TOPOGRAFO	9/01/2023	1.423.500	1.423.500	200.000	369.000	30	0	0	1.423.500	0	0	30	200.000	30	369.000	7.5	59.625	0	0	0	0	0	0	$ 59.625	0	2.052.125	82.085	82.085	164.170	$ 1.887.955	
12	1.005.450.118	MOSTACILLA CEDEÑO ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA	9/01/2023	1.354.151	1.423.500	200.000	0	30	0	0	1.423.500	0	0	30	200.000	30	0	16.5	131.231	0	0	0	0	0	0	$ 131.231	0	1.954.731	78.189	78.189	156.378	$ 1.798.353	
13	14.647.375	QUIDEZA FIDEL	RESIDENTE DE MAQUINARIA	1/01/2023	1.423.500	1.423.500	200.000	369.000	30	0	0	1.423.500	0	0	30	200.000	30	369.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.992.500	79.700	0	79.700	$ 1.912.800	
14	1.115.915.544	ORDOÑEZ SALCEDO YERRY ALEXIS	AUXILIAR SST	20/01/2025	1.423.500	1.423.500	200.000	0	30	0	0	1.423.500	0	0	30	200.000	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.623.500	64.940	64.940	129.880	$ 1.493.620	
15	98.389.674	PACHECO MARA EDGT JASMIR	PROFESIONAL AMBIENTAL	23/01/2023	1.500.000	2.000.000	200.000	0	15	0	0	1.500.000	0	0	15	100.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	68.000	0	68.000	$ 1.632.000	
16	14.808.286	PINZON ESPINOSA JOSE DANIEL	ALMACENISTA	13/01/2025	1.423.500	1.423.500	200.000	369.000	30	0	0	1.423.500	0	0	30	200.000	30	369.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.992.500	79.700	79.700	159.400	$ 1.833.100	
17	1.006.552.604	RAMIS RIVERA OLIVIA DOMINGO	AYUDANTE DE OBRA	14/01/2025	500.000	1.423.500	200.000	61.000	1	2	0	47.450	142.350	0	1	6.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.630.350	1.252.140	7.750	7.500	15.250	$ 1.276.890	
18	1.143.271	SUAREZ RODRIGUEZ JAVIER	OFICIAL DE OBRA	08/01/2025	1.300.331	1.423.500	200.000	0	20	0	0	1.423.500	0	0	20	200.000	20	0	21	165.488	24.5	231.021	3.5	30.818	5.486.429	0	2.903.931	76.157	76.157	152.315	$ 2.751.616	
19	1.006.450.034	TATAN GARCIA JOSE DANIEL	AYUDANTE DE OBRA	14/01/2025	284.700	1.423.500	200.000	61.000	6	0	0	284.700	0	0	6	40.000	6	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230.100	1.626.648	61.386	14.386	28.772	$ 1.484.388	
20	1.118.590.669	TOLEDO JOSE DAVID	OFICIAL DE OBRA	20/01/2025	1.126.181	1.423.500	200.000	0	20	0	0	1.423.500	0	0	20	266.666	20	0	12.5	109.297	10.5	147.609	0	0	0	0	$ 256.907	0	1.680.407	67.271	67.271	134.542	$ 1.545.865	
21	22.814.357	TRIANA DE MOLINA MARIA ANGELICA	TRABAJADORA SOCIAL	20/01/2023	666.666	1.666.666	200.000	0	15	0	0	666.666	0	0	15	100.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866.666	33.333	33.333	66.666	$ 800.000	
22	7.177.505	RODRIGUEZ VARGAS EDWIN OSWARDO	RESIDENTE DE OBRA	1/02/2024	1.423.500	1.423.500	200.000	0	30	0	0	1.423.500	0	0	30	200.000	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.623.500	64.940	64.940	129.880	$ 1.493.620	
23	1.121.340.233	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	AYUDANTE DE OBRA	7/02/2025	1.084.678	1.423.500	200.000	0	30	0	0	1.423.500	0	0	30	200.000	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.623.500	64.940	64.940	129.880	$ 1.493.620	
24	1.121.340.234	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	7/02/2025	1.084.678	1.423.500	200.000	0	30	0	0	1.423.500	0	0	30	200.000	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.623.500	64.940	64.940	129.880	$ 1.493.620	
25	1.121.722.107	MAUCO BARRETO JOSE YOHONY	AYUDANTE DE OBRA	10/05/2025	600.654	1.423.500	200.000	61.000	10	0	0	709.250	0	84.900	10	100.667	10	12.200	1.5	10.593	1	10.593	0	0	0	0	$ 33.386	0	997.254	39.890	39.890	79.781	$ 917.473	
26	14.868.167	BOLIVAR FARFAN CARLOS EUGENIO	AYUDANTE DE OBRA	10/05/2025	600.000	1.423.500	200.000	61.000	10	0	0	666.700	0	0	10	66.666	10	12.200	1.5	10.593	1	10.593	0	0	0	0	$ 33.333	0	1.000.533	40.021	40.021	80.043	$ 920.490	
27	1.118.843.484	COCINERO ROMO FRANCISCO JAVIER	INGENIERO PESCADERO	1/05/2025	1.130.000	1.423.500	200.000	500.000	21	0	0	1.130.000	0	0	21	140.000	21	242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.512.000	60.480	60.480	120.960	$ 1.391.040	
28	14.867.348	EMILIO RICO LUIS ARMANDO	ASISTENTE DE MAQUINARIA	1/05/2025	1.423.500	1.423.500	200.000	369.000	30	0	0	1.423.500	0	0	30	200.000	30	369.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.992.500	79.700	79.700	159.400	$ 1.833.100	
		TOTAL			36.500.000	44.710.000	5.600.000	2.214.000	647	2	0	33.929.000	142.350	84.900	647	4.410.000	648	4.474.000	103	1.000.234	74	803.403	3	30.818	1.858.777	4.139.166	46.607.348	1.864.467	1.864.467	3.728.934	42.878.414	

BRAYAN ARDILA ROMERO
GERENTE DE GESTION HUMANA

Ayudar agotar [illegible] ACEVEDO
agosto 05 al mayo 13 DIAS

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT: 840.004.840-8

PERIODO NOMINA: 1-30 DE JUNIO 2025

N	CC	NOMBRES	CARGO	FECHA INGRESO	DIAS	SALARIO BASICO	AUX. TRANS	AUX. NO SALARIAL DE ALIMEN	HED	HEC	HEF	SALARIO DIARIO	SALARIO INTEGRAL	DVT	ANTICIPO NOMINA	BONIFICACION NO SALARIAL DE ALIMEN		BONIFICACION S.S.		BONIFICACION S.S.		EPS 4%		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	FIRMA
1	1.065.xxx.xxx	GERARDO ALEJANDRO SERRANO FERRER	ALMACENISTA DE OBRA	14/04/2025	8	1.422.500	249.900	61.000	15	0	0	711.775	0	0	0	100.000	11	39.500	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	1.600.000	2.710.054	28.674	28.674	57.348	$ 3.609.354	
2	1.0	BEATRIZ ALEJANDRA [illegible]	COORDINADOR [illegible]	7/07/2021	8	1.500.000	200.000	0	15	0	0	800.000	0	0	0	300.000	11	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	566.666	32.000	32.000	64.000	$ 802.666	
3	1.110.551.xxx	[illegible] CARVAJAL [illegible] ALEJANDRA	INSPECTOR DE OBRA	21/01/2021	1	1.422.500	249.900	0	20	0	0	1.423.500	0	0	0	200.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0	5.691.758	0	2.405.258	56.948	56.948	113.896	$ 6.291.906	
4	3.800.xxx	[illegible] QUIROGA VERA	INVESTIGADOR DE OBRA	9/04/2025	1	1.422.500	249.900	0	20	0	0	1.423.500	0	0	0	200.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0	5.975.917	0	2.305.175	56.948	56.948	113.896	$ 6.360.796	
5	91.2[illegible]	[illegible] LEONARDO [illegible]	OFICIAL DE OBRA	20/08/2025	1	1.565.xxx	1.423.500	200.000	0	0	0	1.565.xxx	0	0	0	200.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	1.765.258	62.604	62.604	125.208	$ 1.890.466	
6	80.xxx.xxx	[illegible] RODRIGUEZ [illegible]	ESPECIALISTA MEDIOAMB.	21/01/2021	1	2.000.xxx	249.900	0	15	0	0	1.xxx.xxx	0	0	0	300.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	1.xxx.xxx	80.000	80.000	160.000	$ 1.xxx.xxx	
7	9.xx.xxx	[illegible]	DIRECTOR DE OBRA	21/01/2021	1	2.xxx.xxx	249.900	0	15	0	0	1.xxx.xxx	0	0	0	300.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	1.xxx.xxx	80.000	80.000	160.000	$ 1.xxx.xxx	
8	7.xx.xxx	[illegible]	ESPECIALISTA EN ESTADISTICA	21/01/2021	1	2.xxx.xxx	249.900	0	15	0	0	1.xxx.xxx	0	0	0	300.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	1.xxx.xxx	80.000	80.000	160.000	$ 1.xxx.xxx	
9	1.110.xxx.xxx	[illegible]	[illegible]	9/04/2025	1	1.422.500	249.900	0	20	0	0	1.423.500	0	0	0	200.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0	5.691.758	0	2.305.175	56.948	56.948	113.896	$ 6.360.796	
10	1.xxx.xxx.xxx	[illegible]	[illegible]	7/04/2025	1	1.422.500	249.900	0	20	0	0	1.423.500	0	0	0	200.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0	5.691.758	0	2.305.175	56.948	56.948	113.896	$ 6.360.796	
11	1.xxx.xxx.xxx	[illegible]	AUXILIAR DE OBRA	7/07/2025	1	1.422.500	249.900	0	20	0	0	1.423.500	0	0	0	200.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0	5.691.758	0	2.305.175	56.948	56.948	113.896	$ 6.360.796	
12	1.xxx.xxx	[illegible]	[illegible]	1/07/2025	1	1.422.500	249.900	0	20	0	0	1.423.500	0	0	0	200.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0	5.691.758	0	2.305.175	56.948	56.948	113.896	$ 6.360.796	
13	1.xxx.xxx.xxx	[illegible]	[illegible]	1/07/2025	1	1.422.500	249.900	0	20	0	0	1.423.500	0	0	0	200.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0	5.691.758	0	2.305.175	56.948	56.948	113.896	$ 6.360.796	
14	80.xxx.xxx	[illegible]	PROFESIONAL AMBIENTAL	21/01/2021	1	2.xxx.xxx	249.900	0	15	0	0	1.xxx.xxx	0	0	0	300.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	1.xxx.xxx	80.000	80.000	160.000	$ 1.xxx.xxx	
15	71.xxx.xxx	[illegible]	AUXILIAR	9/07/2025	1	1.422.500	249.900	61.000	20	0	0	1.423.500	0	0	0	200.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0	5.691.758	0	2.305.175	56.948	56.948	113.896	$ 6.360.796	
16	1.110.xxx	[illegible]	OFICIAL DE OBRA	9/04/2025	1	1.422.500	249.900	0	15	0	0	1.xxx.xxx	0	0	0	200.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	1.xxx.xxx	80.000	80.000	160.000	$ 1.xxx.xxx	
17	20.xx.xxx	[illegible]	TRABAJADORA SOCIAL	21/01/2021	1	1.xxx.xxx	249.900	0	15	0	0	1.xxx.xxx	0	0	0	300.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	1.xxx.xxx	80.000	80.000	160.000	$ 1.xxx.xxx	
18	7.xx.xxx	[illegible]	RESIDENTE DE OBRA	1/07/2025	1	1.422.500	249.900	0	20	0	0	1.423.500	0	0	0	200.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0	5.691.758	0	2.305.175	56.948	56.948	113.896	$ 6.360.796	
19	1.121.149.xxx	[illegible]	AUXILIAR DE OBRA	9/07/2025	1	1.422.500	249.900	0	20	0	0	1.423.500	0	0	0	200.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0	5.691.758	0	2.305.175	56.948	56.948	113.896	$ 6.360.796	
20	1.121.149.xxx	[illegible]	AUXILIAR DE OBRA	9/07/2025	1	1.422.500	249.900	0	20	0	0	1.423.500	0	0	0	200.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0	5.691.758	0	2.305.175	56.948	56.948	113.896	$ 6.360.796	
21	1.121.xxx.xxx	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	23/01/2025	1	1.422.500	249.900	0	20	0	0	1.423.500	0	0	0	200.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0	5.691.758	0	2.305.175	56.948	56.948	113.896	$ 6.360.796	
22	1.xxx.xxx	[illegible]	AYUDANTE DE OBRA	21/01/2025	1	1.422.500	249.900	0	20	0	0	1.423.500	0	0	0	200.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0	5.691.758	0	2.305.175	56.948	56.948	113.896	$ 6.360.796	
23	1.xxx.xxx.xxx	[illegible]	INGENIERO RESIDENTE	7/07/2025	1	1.422.500	249.900	0	20	0	0	1.423.500	0	0	0	200.000	15	0	0	0	0	0	0	0	0,0	5.691.758	0	2.305.175	56.948	56.948	113.896	$ 6.360.796	
24	1.xxx.xxx	[illegible]	[illegible]	9/07/2025	1	1.xxx.xxx	249.900	0	0	0	0	1.xxx.xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	1.xxx.xxx	80.000	80.000	160.000	$ 1.xxx.xxx	
		TOTAL																														

Elaboró: [illegible]

Aprobó: [illegible]

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT: 8[illegible]

PERIODO NOMINA: 1-15 DE JULIO DE15 PROYECTO: SOCAS DEL PACIFICO

#	ID	NOMBRE	CARGO	FECHA INGRESO	BIC	SALARIO BASICO	AUX TRANS	AUX NO SALARIAL NO SUMA	HORAS			SALARIO DEVEN	SALARIO BIC ED 197	DIAS	HORAS TRABA	ADICION NO SALARIAL DE ALIMEN	H.E.D	H.E.N	H.E.D.F	H.E.N.F	RECARGO NOCTURNO	TOTAL HORAS EXTRAS	DESCANSOS	TOTAL DEVEN	SALUD 4%	PENSION 4%	DIFA 4 SMLV	TOTAL $ PAGAR	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		TOTAL			25.208.667	23.752.000	4.200.000	5.451.300	336	0	7	53.291.600	0	312.100	600	2.203.333	800	2.212.047	640	1.111.004	4	10.040	80	682.000	0	0	1.814.387	10.500.000	43.000.341	1.116.432	854.887	3.476.720	41.822.000	

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT: 844.004.848-0

PERIODO NOMINA: 1-30 DE AGOSTO 2025 PROYECTO: BOCAS DEL PAUTO

N°	CC	NOMBRE	CARGO	FECHA INGRESO	RH	SALARIO ORDINO	AUX. TRANS	AUX NO SALARIAL DE ALIMEN	DIAS TRAB	DIAS INCAP	DIAS LIC	SALARIO DEVEN	SALARIO NO HAB LIC	AUS	AUXILIO TRANS	AUXILIO NO SALARIAL DE ALIMEN	H.E.D 125		TOTAL HORAS Y RECARG	PAGO DIA 31	LIQUIDACION	TOTAL DEVEN	SALUD 4%	PENSION 4%	TOTAL DEDUC	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	10 448 978	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS	COORDINADOR SG-SST	16/10/2024	B60 000	1 300 000	200 000	0	15	0	0	600 000	0	0	15	300 000	15	0	0	0	$ 0	$ 0	0	600 000	32 000	32 000	64 000	$ 536.000	
2	1 116 551 868	DELGADO CARVAJAL STELLA ALEJANDRA	INSPECTOR DE OBRA	23/11/2023	1 423 500	1 423 500	200 000	0	30	0	0	1 423 500	0	0	30	200 000	30	0	0	0	$ 0	$ 0	0	1 623 500	56 940	56 940	113 880	$ 1 509 620	
3	98 606 202	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER	ESPECIALISTA ADICIONAL	23/11/2023	3 000 000	3 000 000	200 000	0	15	0	0	1 500 000	0	0	15	100 000	15	0	0	0	$ 0	$ 0	0	1 600 000	60 000	60 000	120 000	$ 1 480 000	
4	5 781 218	GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEXIS	DIRECTOR DE OBRA	23/11/2023	3 500 000	3 500 000	200 000	0	15	0	0	1 300 000	0	0	15	100 000	15	0	0	0	$ 0	$ 0	0	1 400 000	52 000	0	52 000	$ 1 348 000	
5	3 181 808	GUERRERO FAGUA JOSE MAURICIO	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	23/11/2023	3 000 000	3 000 000	200 000	0	15	0	0	1 000 000	0	0	15	100 000	15	0	0	0	$ 0	$ 0	0	1 100 000	40 000	40 000	80 000	$ 1 020 000	
6	14 841 370	OROPEZA RAFEL	BODEGUERO DE MAQUINARIA	10/01/2025	758 300	1 423 500	200 000	568 000	15	0	0	758 300	0	0	15	105 667	15	383 450	0	0	$ 0	$ 0	1 758 345	2 916 579	30 366	0	30 366	$ 2 886 213	
7	88 265 814	PACHECO RIBNA IDDET JASMIN	PROFESIONAL AMBIENTAL	23/11/2023	2 000 000	2 000 000	200 000	0	15	0	0	1 000 000	0	0	15	100 000	15	0	0	0	$ 0	$ 0	0	1 100 000	40 000	0	40 000	$ 1 060 000	
8	75 000 394	PADILLA ESPINOSA JOSE DANIEL	ALMACENISTA	20/01/2025	1 031 200	1 423 500	200 000	488 300	23	0	0	1 031 200	0	0	23	153 333	23	375 816	0	0	$ 0	$ 0	1 630 850	3 432 699	43 034	43 034	87 368	$ 3 345 332	
9	23 014 367	TRUJILLO SOLGADO MARIA ANGELICA	TRABAJADORA SOCIAL	23/11/2023	800 000	1 000 000	200 000	488 300	15	0	0	800 000	0	0	15	100 000	15	345 150	0	0	$ 0	$ 0	0	1 145 150	32 000	32 000	64 000	$ 1 081 150	
10	7 137 529	RODRIGUEZ VARGAS SORIN GERARDO	RESIDENTE DE OBRA	10/09/2024	1 423 500	1 423 500	200 000	0	30	0	0	1 423 500	0	0	30	200 000	30	0	0	0	$ 0	$ 0	0	1 623 500	56 940	56 940	113 880	$ 1 509 620	
11	3 808 400	GAITAN GERMAN YESID	MAESTRO DE OBRA	29/08/2025	231 258	1 423 500	200 000	0	5	0	0	231 258	0	0	5	33 333	5	0	0	0	$ 0	$ 0	0	264 591	9 480	9 480	18 960	$ 251 631	
12	1 121 149 333	FARFAN PEREZ CARLOS ARTURO	AYUDANTE DE OBRA	29/08/2025	231 258	1 423 500	200 000	0	5	0	0	231 258	0	0	5	33 333	5	0	0	0	$ 0	$ 0	0	264 591	9 480	9 480	18960	$ 251 631	
13	1 121 140 224	FARFAN PEREZ CARLOS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	29/08/2025	231 258	1 423 500	200 000	0	5	0	0	231 258	0	0	5	33 333	5	0	0	0	$ 0	$ 0	0	264 591	9 480	9 480	18960	$ 251 631	
14	14 260 806	NELSON ALFREDO GAITAN LEON	OFICIAL DE OBRA	29/08/2025	231 258	1 423 500	200 000	61 008	5	0	0	231 258	0	0	5	33 333	5	38 167	0	0	$ 0	$ 0	0	302 758	9 480	9 480	18960	$ 283 778	
15	1 121 722 121	RINCON BARRETO JOSE YORNET	AYUDANTE DE OBRA	29/08/2025	231 258	1 423 500	200 000	61 008	5	0	0	231 258	0	0	5	33 333	5	18 167	0	0	$ 0	$ 0	0	282 758	9 480	9 480	18960	$ 283 778	
16	14 885 161	CARLOS EUSEBIO BOLIER FARFAN	AYUDANTE DE OBRA	29/08/2025	231 258	1 423 500	200 000	61 008	5	0	0	231 258	0	0	5	33 333	5	18 167	0	0	$ 0	$ 0	0	282 758	9 480	9 480	18960	$ 283 778	
17	8 671 771	OROPEZA AGUILAR JORGE ALFIO	BODEGUERO DE MAQUINARIA	15/08/2025	711 150	1 423 500	200 000	0	15	0	0	711 150	0	0	15	100 000	15	0	0	0	$ 0	$ 47 410	0	858 559	28 476	0	28 476	$ 830 083	
18	1 116 542 484	COCINERO ROSAS FRANCISCO JAVIER	BOMBERO DE OBRA	10/09/2025	828 000	1 400 000	300 000	488 000	12	0	0	599 400	0	166 600	12	80 000	10	258 000	0	0	$ 0	$ 39 960	$ 599 400	923 360	23 952	23 952	51 122	$ 1 741 297	
		TOTAL			13.261.450	39.852.300	5.600.000	4.372.700	246	0	4	11.302.250	0	166.600	248	1.840.000	245	1.211.118	0	0	$ 0	$ 0	$ 47.460	4.485.204	33.478.980	434.970	334.000	613.800	18.157.380	

Elaboró: CAROLINA PACHECO
AUXILIAR DE NOMINA

Aprobó: MARIA DORIS BARRERA ALFONSO
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 3.5.2.
COPIA PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844008440	8	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 208 COTIZANTES	YOPAL	CLL 18 N 22-47	YOPAL-CASANARE	6349852	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	94603307629	94603307629	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCO DE BOGOTA	0	$30,833,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac ivl irp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (63 Afiliados)						$61,487,897	$10,438,380			$70,829,157	$2,797,700			$69,719,494	$2,705,300			$70,829,157		$4,681,300		$0	$0		$20,282,980
Centro de Trabajo: OROCUÉ 6.06 (2 Afiliados)						$1,581,504	$254,780			$1,591,504	$63,800			$1,591,504	$63,800			$1,591,504		$105,800		$0	$0		$487,180
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$1,581,504	$254,780			$1,591,504	$63,800			$1,591,504	$63,800			$1,591,504		$105,800		$0	$0		$487,180
1	CC 9491197	CRUZ ARDINOLA MIGUEL ANGEL	E	23030 1	24	$928,000	$148,500	EPS041	24	$928,000	$37,200	CCFV9	24	$928,000	$37,200	14-23	24	$928,000	6.960%	$64,600	24	$0	$0	SI	$287,500
2	CC 1083369829	ESCALANTE ALTAMAR ALBERTO ANTONIO	E	23030 1	17	$663,504	$106,200	EPS041	17	$663,504	$26,600	CCFV9	17	$663,504	$26,600	14-23	17	$663,504	6.960%	$46,200	17	$0	$0	SI	$205,600
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (3 Afiliados)						$3,719,896	$603,200			$3,770,080	$150,800			$3,770,080	$150,800			$3,770,080		$119,800		$0	$0		$924,680
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$3,719,896	$603,200			$3,770,080	$150,800			$3,770,080	$150,800			$3,770,080		$119,800		$0	$0		$924,680
3	CC 6433168	BARRERA ALFONSO MARIA ISOBEL		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCFV9	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
4	CC 1118560520	BARRERA TARACHE MARTHA LUCERO		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCFV9	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
5	CC 1083854063	CASTRO LOPEZ CRISTHIAN CAMILO		25-14 1	30	$1,450,000	$232,000	EPSC25	30	$1,450,000	$58,000	CCFV9	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$355,500
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (58 Afiliados)						$55,119,893	$9,780,300			$64,664,063	$2,583,100			$64,397,951	$2,576,700			$64,664,063		$4,471,700		$0	$0		$19,405,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (58 Afiliados)						$55,119,893	$9,780,300			$64,664,063	$2,583,100			$64,397,951	$2,576,700			$64,664,063		$4,471,700		$0	$0		$19,405,800
6	CC 34949553	AGUDELO AGUDELO FALLANCY		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCFV9	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
7	CC 7438958	ALFONSO GONZALEZ NARDY		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCFV9	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
8	CC 1006469561	AVILA COLINA CARLOS YOMBEY		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC25	30	$1,160,000	$46,400	CCFV9	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
9	CC 1007357019	BARRERA VILLAMIL PAULA PALESTINA		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCFV9	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
10	CC 47448678	BERMAL ALFONSO NUBIA DORIS		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCFV9	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
11	CC 1007357947	BERMAL GODOY YILMER FABIAN		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCFV9	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
12	CC 34846928	BONILLA RODRIGUEZ JOSE ALIRIO	X	23030 1	30	$3,476,115	$556,200	EPSC25	30	$3,476,115	$139,100	CCFV9	30	$3,476,115	$139,100	14-23	30	$3,476,115	6.960%	$242,000	30	$0	$0	SI	$1,076,400
13	CC 1118567914	CAMARGO SANCHEZ YAMIRA JOHANA		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC25	30	$1,160,000	$46,400	CCFV9	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
14	CC 1118536153	CASILLO CUARTAS ALEXIS		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCFV9	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
15	CC 1118551069	DELGADO CARVAJAL STELLA ALEXANDRA		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCFV9	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
16	CC 1117326139	FERNANDEZ FELIPO CAMILO ANDRES	E X 3	23030 1	9	$348,000	$55,700	EPS037	9	$348,000	$14,000	CCFV9	9	$261,900	$14,500	14-23	9	$348,000	6.960%	$24,100	9	$0	$0	SI	$108,500
17	CC 9659567	FIGUEREDO AGUILERA JOSE MARIO	E X	23030 1	28	$1,088,837	$174,300	EPSC25	28	$1,088,837	$43,600	CCFV9	28	$1,088,837	$43,600	14-23	28	$1,088,837	6.960%	$75,800	28	$0	$0	SI	$337,300
18	CC 1117330234	GARCIA FUENTES SHAYAH ROBERTO		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCFV9	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
19	CC 1120865525	GARCIA ACEVEDO DIEGO ARMANDO	X	23030 1	9	$348,000	$55,700	EPS041	9	$348,000	$14,000	CCFV9	8	$0	$0	14-23	9	$348,000	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$69,700
20	CC 1120865525	GARCIA ACEVEDO DIEGO ARMANDO		23030 1	21	$812,000	$130,000	EPS041	21	$812,000	$31,300	CCFV9	21	$812,000	$31,300	14-23	21	$812,000	6.960%	$56,600	21	$0	$0	SI	$251,600
21	CC 4269849	GONZALEZ CARRARAH ELICER	X	23030 1	24	$928,000	$148,500	EPS037	24	$928,000	$37,200	CCFV9	24	$928,000	$37,200	14-23	24	$928,000	6.960%	$64,600	24	$0	$0	SI	$287,500

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 300 COTIZANTES	YOPAL	CLL 18 N 27-47	YOPAL - CASANARE	6349852	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	9460636316	9460626216	E	2024/01/11	2023/12/27	BANCO DE BOGOTA	8	$33,658,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (66 Afiliados)						$64,557,481	$10,329,196			$57,699,481	$2,308,100			$61,909,274	$2,367,408			$67,845,481		$4,191,228		$0	$0		$18,658,080
Centro de Trabajo: OROCUÉ 6.86 (3 Afiliados)						$2,165,334	$346,980			$2,165,334	$86,700			$2,231,340	$89,300			$2,165,334		$130,800		$0	$0		$673,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$2,165,334	$346,980			$2,165,334	$86,700			$2,231,340	$89,300			$2,165,334		$130,800		$0	$0		$673,300
1	CC	9655197	CRUZ MONROY MIGUEL ANGEL	23008	30	$1,160,800	$185,600	23008	30	$1,160,800	$46,400	CCFV9	30	$1,160,800	$46,400	14-23	30	$1,160,800	6.960%	$80,800	30	$0	$0	N	$359,200
2	CC	1082881829	ESCALANTE ALTAMAR ALBERTO ANTONIO	23008	24	$928,800	$148,500	DPSE41	24	$928,800	$37,200	CCFV9	24	$994,896	$39,800	14-23	24	$928,800	6.960%	$64,600	24	$0	$0	N	$290,100
3	CC	1007147536	LEGUIZAMON GIRALDO BRAYAN ESTIVEN	23008	2	$77,334	$12,400	DPSE25	2	$77,334	$3,100	CCFV9	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	6.960%	$5,400	2	$0	$0	N	$24,000
Centro de Trabajo: YOPAL (3 Afiliados)						$1,809,335	$289,480			$1,809,335	$72,400			$1,947,313	$77,900			$1,809,335		$126,000		$0	$0		$565,780
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$1,809,335	$289,480			$1,809,335	$72,400			$1,947,313	$77,900			$1,809,335		$126,000		$0	$0		$565,780
4	CC	1026542614	GUAVA MOSQUERA BEYER OBLEY	23008	13	$502,667	$80,500	DPSE25	13	$502,667	$20,200	CCFV9	13	$523,411	$21,000	14-23	13	$502,667	6.960%	$35,000	13	$0	$0	N	$156,180
5	CC	74862714	AGUILERA SALAMANCA CESAR ALEJANDRO	23008	2	$77,334	$12,400	DPSE05	2	$77,334	$3,100	CCFV9	2	$80,506	$3,200	14-23	2	$77,334	6.960%	$5,400	2	$0	$0	N	$24,100
6	CC	1116048819	ORTIZ RINCON DIEGO FERNANDO	23008	11	$425,334	$68,100	DPSE25	11	$425,334	$17,100	CCFV9	11	$440,894	$17,600	14-23	11	$425,334	6.960%	$29,600	11	$0	$0	N	$131,800
Centro de Trabajo: YOPAL 0.922 (4 Afiliados)						$3,538,080	$566,100			$3,538,080	$141,600			$4,228,917	$168,900			$3,538,080		$246,000		$0	$0		$1,095,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)						$3,538,080	$566,100			$3,538,080	$141,600			$4,228,917	$168,900			$3,538,080		$246,000		$0	$0		$1,095,200
7	CC	47435168	BARRERA ALFONSO AARSA EIDNY	23008	30	$1,160,800	$185,600	DPSE17	30	$1,160,800	$46,400	CCFV9	30	$1,160,800	$46,400	14-23	30	$1,160,800	0.522%	$6,100	30	$0	$0	N	$284,500
8	CC	1116560320	BARRERA TARACHE MARTHA LUCERO	23008	24	$928,800	$148,500	DPSE05	24	$928,800	$37,200	CCFV9	24	$1,034,644	$41,300	14-23	24	$928,800	0.522%	$5,900	24	$0	$0	N	$232,900
9	CC	1001594263	CASTRO LOPEZ CRISTHIAN CAMILO	23008	30	$1,450,800	$232,000	DPSE25	30	$1,450,800	$58,000	CCFV9	30	$2,000,833	$80,000	14-23	30	$1,450,800	0.522%	$7,600	30	$0	$0	N	$377,900
Centro de Trabajo: YOPAL 6.86 (57 Afiliados)						$57,648,816	$9,223,180			$51,186,816	$2,409,300			$54,418,116	$2,367,408			$51,186,816		$4,179,900		$0	$0		$18,813,180
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (57 Afiliados)						$57,648,816	$9,223,180			$51,186,816	$2,409,300			$54,418,116	$2,367,408			$51,186,816		$4,179,900		$0	$0		$18,813,180
10	CC	74849983	AGUDELO ADRIANO FILLARCY	23008	1	$38,667	$6,200	DPSE17	1	$38,667	$0	CCFV9	1	$38,667	$0	14-23	1	$38,667	0.800%	$0	1	$0	$0	N	$6,200
11	CC	74849983	AGUDELO ADRIANO FILLARCY	23008	23	$889,334	$142,800	DPSE17	23	$889,334	$35,600	CCFV9	23	$1,451,612	$58,100	14-23	23	$889,334	6.960%	$61,900	23	$0	$0	N	$297,900
12	CC	9430996	ALFONSO GONZALEZ MARDI	23008	24	$928,800	$148,500	DPSE05	24	$928,800	$37,200	CCFV9	24	$1,491,888	$59,700	14-23	24	$928,800	6.960%	$64,600	24	$0	$0	N	$310,000
13	CC	1006489961	AVILA COLINA CARLOS YOBBIT	23008	24	$928,800	$148,500	DPSE25	24	$928,800	$37,200	CCFV9	24	$1,015,000	$40,600	14-23	24	$928,800	6.960%	$64,600	24	$0	$0	N	$290,900
14	CC	1007383019	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA	23008	30	$1,450,800	$232,000	DPSE05	30	$1,450,800	$58,000	CCFV9	30	$1,450,800	$58,000	14-23	30	$1,450,800	6.960%	$101,000	30	$0	$0	N	$449,000
15	CC	47440818	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS	23008	30	$1,160,800	$185,600	DPSE05	30	$1,160,800	$46,400	CCFV9	30	$1,160,800	$46,400	14-23	30	$1,160,800	6.960%	$80,800	30	$0	$0	N	$359,200
16	CC	1007076947	BERNAL GODOY TOMAS FABIAN	23008	30	$1,450,800	$232,000	DPSE05	30	$1,450,800	$58,000	CCFV9	30	$1,450,800	$58,000	14-23	30	$1,450,800	6.960%	$101,000	30	$0	$0	N	$449,000
17	CC	74849919	BOHORQUEZ RODRIGUEZ JOSE ALBEIRO	23008	24	$2,221,661	$355,500	DPSE25	24	$2,221,661	$88,900	CCFV9	24	$2,346,045	$93,800	14-23	24	$2,221,661	6.960%	$154,700	24	$0	$0	N	$692,900
18	CC	1118563814	CAMARGO SANCHEZ YAMIRA JOHANA	23008	30	$1,172,339	$187,600	DPSE25	30	$1,172,339	$46,900	CCFV9	30	$1,291,561	$51,700	14-23	30	$1,172,339	6.960%	$81,600	30	$0	$0	N	$367,900
19	CC	1118538133	CASSIA CUMBE ALEXIS	23008	24	$928,800	$148,500	DPSE17	24	$928,800	$37,200	CCFV9	24	$1,491,888	$59,700	14-23	24	$928,800	6.960%	$64,600	24	$0	$0	N	$310,000
20	CC	1118551069	DELGADO CARVAJAL STELA ALEXANDRA	23008	30	$1,160,800	$185,600	DPSE17	30	$1,160,800	$46,400	CCFV9	30	$1,160,800	$46,400	14-23	30	$1,160,800	6.960%	$80,800	30	$0	$0	N	$359,200

2024/01/03 08:43 AM

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	8	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 18 # 27-47	YOPAL-CASANARE	6349851	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	9460626216	9460626216	E	2024/01/11	2023/12/27	BANCO DE BOGOTA	0	$20,668,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				63	$10,298,700	$0	$0	$10,298,700
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	5	$965,100	$0	$0	$965,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,324,100	$0	$0	$1,324,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	46	$7,378,400	$0	$0	$7,378,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$631,100	$0	$0	$631,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				66	$4,393,200	$0	$0	$4,393,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	66	$4,393,200	$0	$0	$4,393,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				66	$3,267,900	$0	$0	$3,267,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	66	$3,267,900	$0	$0	$3,267,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				66	$2,708,200	$0	$0	$2,708,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	18	$651,100	$0	$0	$651,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,900	$0	$0	$46,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$562,100	$0	$0	$562,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	$420,500	$0	$0	$420,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$981,200	$0	$0	$981,200
TOTAL				66	$20,668,000	$0	$0	$20,668,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYMBIOSIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - ADMOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 38 N 28 - 46	YOPAL -CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	9464083840	9464082040	E	2024/03/11	2024/03/08	BANCO DE BOGOTA	0	$39,169,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp vsp cor vst sln ige lma vac ivl irp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (84 Afiliados)						$169,649,319	$16,899,302			$116,333,537	$4,653,200			$114,680,900	$9,327,160			$116,333,537		$7,970,800		$346,667	$13,867		$22,680,953
Centro de Trabajo: OROCUÉ 6.06 (4 Afiliados)						$4,127,481	$660,600			$4,804,148	$184,600			$4,160,814	$182,608			$4,804,148		$317,600		$0	$0		$1,345,280
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)						$4,127,481	$660,600			$4,804,148	$184,600			$4,160,814	$182,608			$4,804,148		$317,600		$0	$0		$1,345,280
1	CC	9655189	CRUZ MIGUEL	13030 1	30	$1,300,000	$208,000	40403 1	30	$1,300,000	$52,000	CCFW 1	30	$1,300,000	$52,000	14-23 1	30	$1,300,000	6.960%	$90,480	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	1083859628	ESCALANTE ALBERTO	13030 1	30	$1,425,840	$228,100	EPS010 1	30	$1,425,840	$57,100	CCFH 1	30	$1,425,840	$57,100	14-23 1	30	$1,425,840	6.960%	$99,200	30	$0	$0	SI	$441,700
3	CC	1007747536	LIZARAZO MATIAN	13030 1	1	$43,334	$7,000	EPSC25 1	1	$43,334	$1,800	CCFH 1	0	$0	$0	14-23 1	1	$43,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$8,800
4	CC	1007747536	LIZARAZO MATIAN	13030 1	29	$1,358,307	$217,400	EPSC25 1	29	$1,358,307	$54,400	CCFH 1	29	$1,358,307	$54,400	14-23 1	29	$1,358,307	6.960%	$94,480	29	$0	$0	SI	$420,800
5	CC	23740571	MELO ALICIA	X		0	$0	$0	EPSC25 1	11	$476,667	$19,100	CCFH 1	11	$430,667	$19,100	14-23 1	11	$476,667	6.960%	$33,200	11	$0	$0	SI	$71,400
Centro de Trabajo: TRINIDAD (1 Afiliados)						$0	$0			$173,334	$7,000			$156,667	$6,200			$173,334		$12,100		$0	$0		$25,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$0	$0			$173,334	$7,000			$156,667	$6,200			$173,334		$12,100		$0	$0		$25,300
6	CC	1163094	AGUICA ALFREDO	X X		0	$0	$0	EPSC25 1	4	$173,334	$7,000	CCFH 1	4	$154,667	$6,200	14-23 1	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	SI	$25,300
Centro de Trabajo: YOPAL 8.522 (3 Afiliados)						$4,050,000	$648,000			$4,858,000	$162,000			$4,050,000	$162,000			$4,858,000		$21,200		$0	$0		$993,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$4,050,000	$648,000			$4,858,000	$162,000			$4,050,000	$162,000			$4,858,000		$21,200		$0	$0		$993,200
7	CC	9745158	BARRERA MARIA		30	$1,300,000	$208,000	EPS037 1	30	$1,300,000	$52,000	CCFH 1	30	$1,300,000	$52,000	14-23 1	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
8	CC	1115560330	BARRERA MARTHA		30	$1,300,000	$208,000	EPS005 1	30	$1,300,000	$52,000	CCFH 1	30	$1,300,000	$52,000	14-23 1	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
9	CC	1007854262	CASTRO CRISTHIAN		29-14	$1,450,000	$231,000	EPSC25 1	30	$1,450,000	$58,000	CCFH 1	30	$1,450,000	$58,000	14-23 1	30	$1,450,000	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$355,600
Centro de Trabajo: YOPAL 6.06 (76 Afiliados)						$97,767,898	$15,193,702			$107,505,845	$4,276,600			$105,735,437	$4,176,308			$107,505,845		$7,235,900		$346,667	$17,367		$31,317,280
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (76 Afiliados)						$97,767,898	$15,193,702			$107,505,845	$4,276,600			$105,735,437	$4,176,308			$107,505,845		$7,235,900		$346,667	$17,367		$31,317,280
10	CC	24849503	AGUDELO FALLARCY	X	30	$1,324,200	$211,900	EPS031 1	30	$1,324,200	$53,000	CCFH 1	30	$1,324,200	$53,000	14-23 1	30	$1,324,200	6.960%	$92,200	30	$0	$0	SI	$410,100
11	CC	9438916	ALFONSO HARBY	X	30	$1,425,840	$228,200	EPS005 1	30	$1,425,840	$57,100	CCFH 1	30	$1,425,840	$57,100	14-23 1	30	$1,425,840	6.960%	$99,200	30	$0	$0	SI	$441,700
12	CC	11282787	ARIZA BALDOMERO	X	30	$1,425,840	$228,200	EPSC34 1	30	$1,425,840	$57,100	CCFH 1	30	$1,425,840	$57,100	14-23 1	30	$1,425,840	6.960%	$99,200	30	$0	$0	SI	$441,700
13	CC	1006499561	AVILA CARLOS	X	30	$1,324,200	$211,900	EPSC25 1	30	$1,324,200	$53,000	CCFH 1	30	$1,324,200	$53,000	14-23 1	30	$1,324,200	6.960%	$92,200	30	$0	$0	SI	$410,100
14	CC	1007357019	BARRERA PAULA		30	$1,450,000	$231,800	EPS005 1	30	$1,450,000	$58,000	CCFH 1	30	$1,450,000	$58,000	14-23 1	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,800
15	CC	47440878	BERNAL MARIA	X	30	$1,600,000	$256,000	EPS005 1	30	$1,600,000	$64,000	CCFH 1	30	$1,600,000	$64,000	14-23 1	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
16	CC	1007357067	BERNAL YULVER		30	$1,450,000	$231,800	EPS005 1	30	$1,450,000	$58,000	CCFH 1	30	$1,450,000	$58,000	14-23 1	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,800
17	CC	74846028	BONORQUEZ JOSE	X	18	$2,155,670	$345,000	EPSC25 1	18	$2,155,670	$86,200	CCFH 1	18	$2,236,910	$89,500	14-23 1	18	$2,155,670	6.960%	$150,100	18	$0	$0	SI	$670,900
18	CC	1086458593	BURGOS RONEY		1	$43,334	$1,300	EPSC25 1	1	$43,334	$1,300	CCFH 1	1	$43,334	$0	14-23 1	1	$43,334	0.800%	$0	1	$0	$0	SI	$1,300
19	CC	1086458593	BURGOS RONEY		1	$43,334	$1,300	EPSC25 1	1	$43,334	$0	CCFH 1	1	$43,334	$0	14-23 1	1	$43,334	0.800%	$0	1	$0	$0	SI	$1,300
20	CC	1086458593	BURGOS RONEY		2	$86,667	$10,300	EPSC25 1	2	$86,667	$0	CCFH 1	2	$86,667	$0	14-23 1	2	$86,667	0.800%	$0	2	$0	$0	SI	$10,300
21	CC	1086458593	BURGOS RONEY		26	$1,126,667	$169,300	EPSC25 1	26	$1,126,667	$45,100	CCFH 1	26	$1,126,667	$45,100	14-23 1	26	$1,126,667	6.960%	$78,400	26	$0	$0	SI	$349,000
22	CC	1118536153	CASALLAS ALEXIS		2	$86,667	$10,300	EPS037 1	2	$86,667	$0	CCFH 1	2	$86,667	$0	14-23 1	2	$86,667	0.800%	$0	2	$0	$0	SI	$10,300
23	CC	1118536153	CASALLAS ALEXIS		4	$173,334	$20,500	EPS037 1	4	$173,334	$0	CCFH 1	4	$173,334	$0	14-23 1	4	$173,334	0.800%	$0	4	$0	$0	SI	$20,500
24	CC	1118536153	CASALLAS ALEXIS	X	24	$1,064,200	$170,300	EPS037 1	24	$1,064,200	$42,600	CCFH 1	24	$1,064,200	$42,600	14-23 1	24	$1,064,200	6.960%	$74,100	24	$0	$0	SI	$329,600

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9480008040	8	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	9480052040	9480052040	E	2024/03/11	2024/03/08	BANCO DE BOGOTA	0	$35,169,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				80	$17,672,600	$0	$0	$17,672,600
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	4	$1,126,000	$0	$0	$1,126,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,330,200	$0	$0	$2,330,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	59	$12,814,900	$0	$0	$12,814,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,401,500	$0	$0	$1,401,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				88	$7,938,700	$0	$0	$7,938,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	88	$7,938,700	$0	$0	$7,938,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				88	$4,719,600	$0	$0	$4,719,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	88	$4,719,600	$0	$0	$4,719,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				88	$4,821,000	$0	$0	$4,821,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$57,100	$0	$0	$57,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	22	$1,079,100	$0	$0	$1,079,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,100	$0	$0	$57,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$113,200	$0	$0	$113,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$31,200	$0	$0	$31,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$98,800	$0	$0	$98,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	$1,057,800	$0	$0	$1,057,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	$618,900	$0	$0	$618,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	$1,655,800	$0	$0	$1,655,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$10,500	$0	$0	$10,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,000	$0	$0	$7,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$7,000	$0	$0	$7,000
TOTAL				88	$35,169,400	$0	$0	$35,169,400

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844804643	9	YYH TRIBUAL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - APORTES DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 20 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	72561956	94547898	E	2024/04/09	2024/04/15	BANCO DE OCCIDENTE	6	$38,166,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: YOPAL (97 Afiliados)					$111,649,538	$13,171,000			$125,823,738	$5,132,000			$111,633,187	$4,623,300			$125,823,738	$8,283,100		$1,300,000	$65,000
Centro de Trabajo: OROCUÉ 8.96 (4 Afiliados)					$3,908,001	$624,980			$4,747,535	$190,100			$4,758,368	$190,400			$4,747,535	$327,500		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)					$3,908,001	$624,980			$4,747,535	$190,100			$4,758,368	$190,400			$4,747,535	$327,500		$0	$0
1	CC	9465197	CRUZ MONOGA MIGUEL ANGEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	46901	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	1082859829	ESCALANTE ALTAMAR ALBERTO ANTONIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	1007749536	LEGUIZAMON GRIMALDOS BRAYAN ESTIVEN	230301	1	$43,334	$7,000	EPSC25	1	$43,334	$1,800	CCF48	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
4	CC	1007749536	LEGUIZAMON GRIMALDOS BRAYAN ESTIVEN	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPSC25	29	$1,256,667	$50,300	CCF48	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
5	CC	23240571	ARIZA MARTINEZ ALICIA		0	$0	$0	EPSC25	19	$847,534	$34,000	CCF48	19	$820,201	$34,100	14-23	19	$847,534	$59,000	19	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 0.622 (3 Afiliados)					$4,050,000	$648,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$21,300		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)					$4,050,000	$648,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$21,300		$0	$0
6	CC	47435188	BARRERA ALFONSO ANGIE SIDNY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	1118568520	BARRERA TARACHE MARTHA LUCERO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS009	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	1083564363	CASTRO LOPEZ CRISTHIAN CAMILO	23-14	30	$1,450,000	$232,000	EPSC29	30	$1,450,000	$58,000	CCF48	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$7,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (90 Afiliados)					$105,739,527	$16,900,980			$117,026,195	$4,769,900			$114,825,219	$4,570,900			$117,026,195	$7,934,400		$1,300,000	$65,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (90 Afiliados)					$105,739,527	$16,900,980			$117,026,195	$4,769,900			$114,825,219	$4,570,900			$117,026,195	$7,934,400		$1,300,000	$65,000
9	CC	7484985	AGUDELO MORENO WILLIAM F	230301	1	$86,667	$10,100	EPS037	1	$86,667	$0	CCF48	1	$86,667	$0	14-23	1	$86,667	$0	1	$0	$0
10	CC	7484985	AGUDELO MORENO WILLIAM F	230301	28	$1,210,348	$195,100	EPS037	28	$1,126,248	$48,900	CCF48	28	$1,210,348	$48,900	14-23	28	$1,210,348	$83,800	28	$0	$0
11	CC	4244074	ALARCON ELSY NARCISES	230301	16	$693,334	$111,000	EPS040	16	$693,334	$27,800	CCF48	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
12	CC	9430998	ALFONSO GONZALEZ BARDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS009	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
13	CC	1130027307	ARIZA MURCIA MAGNOLIETTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
14	CC	1006489961	AVILA COLINA CARLOS YORBET	230301	30	$1,306,914	$209,100	EPSC29	30	$1,306,914	$52,300	CCF48	30	$1,306,914	$52,300	14-23	30	$1,306,914	$91,000	30	$0	$0
15	CC	1007381219	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA	230301	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF48	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0
16	CC	47438878	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$56,000	CCF48	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$111,400	30	$0	$0
17	CC	1007674947	BERNAL GODOY OLIVER FABIAN	230301	30	$1,450,000	$232,000	EPS002	30	$1,450,000	$58,000	CCF48	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0
18	CC	1006450593	BURGOS MENDIVELSO RONEY ESTIVEN	230301	7	$303,334	$48,600	EPSC25	7	$303,334	$12,200	CCF48	7	$303,334	$12,200	14-23	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
19	CC	1006450593	BURGOS MENDIVELSO RONEY ESTIVEN	230301	3	$130,000	$15,600	EPSC25	3	$130,000	$0	CCF48	3	$130,000	$0	14-23	3	$130,000	$0	3	$0	$0
20	CC	1118836161	CASALLI CUNICHE ELENER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
21	CC	7164914	CHAPARRO ROMANOSO WILMAR FREDY	230301	25	$1,083,334	$173,400	A46002	25	$1,083,334	$43,400	CCF48	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
22	CC	9517517	CUBIDES BOTIA JAIRO LUIS OMAR		0	$0	$0	A46002	29	$1,256,667	$50,300	CCF48	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
23	CC	9517517	CUBIDES BOTIA JAIRO LUIS OMAR		0	$0	$0	A46002	1	$43,334	$0	CCF48	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
24	CC	[illegible]	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$31,200	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
25	CC	[illegible]	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS029	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$31,200	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
26	CC	[illegible]		0	$0	$0	EPS029	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$31,200	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
27	CC	[illegible]	230301	6	$260,000	$41,600	EPS029	6	$260,000	$10,400	CCF69	6	$260,000	$6,240	14-23	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
28	CC	[illegible]	230301	28	$1,240,991	$198,558	EPS049	28	$1,240,991	$49,700	CCF69	28	$1,240,991	$29,784	14-23	28	$1,240,991	$86,400	28	$0	$0
29	CC	[illegible]	230301	1	$86,667	$13,867	EPS049	1	$86,667	$0	CCF69	1	$86,667	$0	14-23	1	$86,667	$0	1	$0	$0
30	CC	[illegible]	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$31,200	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
31	CC	[illegible]	230301	13	$563,334	$90,133	EPS037	13	$563,334	$22,533	CCF69	13	$563,334	$13,520	14-23	13	$563,334	$39,200	13	$0	$0
32	CC	[illegible]	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$31,200	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
33	CC	[illegible]	230301	6	$260,000	$41,600	EPS005	6	$260,000	$10,400	CCF69	0	$0	$0	14-23	6	$260,000	$0	0	$0	$0
34	CC	[illegible]	230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS005	24	$1,040,000	$41,600	CCF69	24	$1,040,000	$24,960	14-23	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0
35	CC	[illegible]	230301	1	$43,334	$6,933	EPS049	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
36	CC	[illegible]	230301	1	$43,334	$7,800	EPS049	1	$43,334	$1,800	CCF69	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
37	CC	[illegible]	230301	28	$1,335,026	$213,700	EPS049	28	$1,335,026	$53,500	CCF69	28	$1,335,026	$32,100	14-23	28	$1,335,026	$93,000	28	$0	$0
38	CC	[illegible]	25-14	30	$1,334,572	$213,600	EPS035	30	$1,334,572	$53,400	CCF69	30	$1,334,572	$32,040	14-23	30	$1,334,572	$92,900	30	$0	$0
39	CC	[illegible]	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS049	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0
40	CC	[illegible]		0	$0	$0	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$62,400	14-23	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
41	CC	[illegible]	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$31,200	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
42	CC	[illegible]	230301	29	$1,256,667	$201,067	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF69	29	$1,256,667	$30,160	14-23	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
43	CC	[illegible]	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF69	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
44	CC	[illegible]	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$31,200	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
45	CC	[illegible]	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$31,200	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
46	CC	[illegible]	230301	30	$1,303,457	$208,600	EPS037	30	$1,303,457	$52,200	CCF69	30	$1,303,457	$31,320	14-23	30	$1,303,457	$90,800	30	$0	$0
47	CC	[illegible]	230301	30	$1,303,457	$208,600	EPS029	30	$1,303,457	$52,200	CCF69	30	$1,303,457	$31,320	14-23	30	$1,303,457	$90,800	30	$0	$0
48	CC	[illegible]	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$31,200	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
49	CC	[illegible]	230301	30	$1,421,692	$227,500	EPS005	30	$1,421,692	$56,900	CCF69	30	$1,421,692	$34,140	14-23	30	$1,421,692	$99,000	30	$0	$0
50	CC	[illegible]	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$31,200	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
51	CC	[illegible]	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$31,200	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
52	CC	[illegible]	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$31,200	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
53	CC	[illegible]	230301	30	$1,303,457	$208,600	EPS008	30	$1,303,457	$52,200	CCF69	30	$1,303,457	$31,320	14-23	30	$1,303,457	$90,800	30	$0	$0
54	CC	[illegible]	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$31,200	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
55	CC	[illegible]	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS041	27	$1,170,000	$46,800	CCF69	27	$1,170,000	$28,080	14-23	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
56	CC	[illegible]	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$31,200	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
57	CC	[illegible]	230301	24	$1,145,897	$183,300	EPS008	24	$1,145,897	$45,900	CCF69	24	$1,145,897	$27,500	14-23	24	$1,145,897	$79,700	24	$0	$0
58	CC	[illegible]	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$46,800	CCF69	27	$1,170,000	$28,080	14-23	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
59	CC	[illegible]	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$31,200	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

2024/04/15 05:13 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
60	CC	1118547182	ACEVEDO ALEJANDRO ALEXANDER	25-14	24	$1,840,000	$176,480	EPS025	24	$1,048,800	$41,600	CCF07	24	$1,840,000	$41,600	14-23	24	$1,040,000	$12,480	24	$0	$0
61	CC	1118547182	ACEVEDO ALEJANDRO ALEXANDER	25-14	1	$43,334	$5,380	EPS025	1	$43,334	$0	CCF07	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
62	CC	1118547182	ACEVEDO ALEJANDRO ALEXANDER	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS025	1	$43,334	$0	CCF07	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
63	CC	4586674	ACEVEDO VARA HERNANDO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS025	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$15,600	30	$0	$0
64	CC	1026458778	AROTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS025	27	$1,170,000	$46,800	CCF07	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$14,040	27	$0	$0
65	CC	1064727172	BARVAEZ VERTEL DIEGO ANDRES	25-14	30	$1,437,999	$230,100	EPS025	30	$1,437,999	$57,600	CCF07	30	$1,437,999	$57,600	14-23	30	$1,437,999	$17,280	30	$0	$0
66	CC	9857771	BEÑO MOLINA JORGE	230301	30	$1,717,624	$274,800	EPS025	30	$1,717,624	$68,800	CCF07	30	$1,717,624	$68,800	14-23	30	$1,717,624	$20,640	30	$0	$0
67	CC	9654883	BÚÑEZ HOLGUIN GONZALO	230301	30	$1,483,921	$237,500	EPS025	30	$1,483,921	$59,400	CCF07	30	$1,483,921	$59,400	14-23	30	$1,483,921	$17,820	30	$0	$0
68	CC	9689584	GUESA GAMEZ FREDY	230301	30	$1,386,914	$209,280	EPS025	30	$1,336,914	$52,300	CCF07	30	$1,386,914	$52,300	14-23	30	$1,336,914	$16,080	30	$0	$0
69	CC	15676480	OLEA RUIZ VALENTINUBE JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS025	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$15,600	30	$0	$0
70	CC	74847373	OSPICIA FIDEL		0	$0	$0	AE0083	30	$1,300,000	$162,500	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$15,600	30	$1,300,000	$65,000
71	CC	1006449989	OSPICIA PEREZ GILMAR JOHAN	230301	27	$1,194,200	$191,100	EPS037	27	$1,194,200	$47,800	CCF07	27	$1,194,200	$47,800	14-23	27	$1,194,200	$14,340	27	$0	$0
72	CC	1006550697	ORTIZ TABACO ALDAIR	230301	30	$1,303,457	$208,600	EPS025	30	$1,303,457	$52,200	CCF07	30	$1,303,457	$52,200	14-23	30	$1,303,457	$15,660	30	$0	$0
73	CC	1116048819	ORTIZ RINCON DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,483,921	$237,500	EPS025	30	$1,483,921	$59,400	CCF07	30	$1,483,921	$59,400	14-23	30	$1,483,921	$17,820	30	$0	$0
74	CC	74857511	ORTIZ LUIS REY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS025	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$15,600	30	$0	$0
75	CC	88095676	PACHECO RUBIA ERICT MARIN		0	$0	$0	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF07	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	$31,200	30	$0	$0
76	CC	74860237	PADILLA WILSON	230301	28	$1,213,334	$194,100	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF07	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$14,580	28	$0	$0
77	CC	74860237	PADILLA WILSON	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF07	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
78	CC	74811942	PALACIOS JOSE VICENTE	25-14	30	$1,450,000	$232,000	EPS041	30	$1,450,000	$58,000	CCF07	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$17,400	30	$0	$0
79	CC	1116565768	PEDRAZA AYALA JAMES ALBEIS	230301	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF07	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$17,400	30	$0	$0
80	CC	7994308	PEREZ PACHON DIEGO OLMEY	230301	30	$2,860,500	$457,700	EPS005	30	$2,860,500	$114,500	CCF07	30	$2,860,500	$114,500	14-23	30	$2,860,500	$34,350	30	$0	$0
81	CC	31488635	PEREZ CARREÑO INGRI	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS025	29	$1,256,667	$50,300	CCF07	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$15,090	29	$0	$0
82	CC	31488635	PEREZ CARREÑO INGRI	230301	1	$43,334	$7,000	EPS025	1	$43,334	$1,800	CCF07	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
83	CC	9656210	PINEDA SERRANO CARLOS JULIO	230301	1	$43,334	$5,200	EPS005	1	$43,334	$0	CCF07	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
84	CC	9656210	PINEDA SERRANO CARLOS JULIO	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF07	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$15,090	29	$0	$0
85	CC	1118560819	PINTUQUE BELLO GEANNY ADRIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$15,600	30	$0	$0
86	CC	4345516	QUINTERO QUINTERO FRANCISCO ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS034	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$15,600	30	$0	$0
87	CC	1118542849	RAMOS RODRIGUEZ GLADYS DAFORA	230301	10	$403,334	$69,400	EPS037	10	$403,334	$17,400	CCF07	10	$354,306	$22,200	14-23	10	$403,334	$18,200	10	$0	$0
88	CC	1118575462	RUBIO CAÑAMARES IVAN FABIAN	230301	12	$520,000	$80,200	EPS037	11	$520,000	$20,800	CCF07	12	$520,000	$26,000	14-23	12	$520,000	$36,200	12	$0	$0
89	CC	9658648	RESTREPO CANO JUAN ANTONIO	230301	1	$43,334	$7,200	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF07	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
90	CC	9658648	RESTREPO CANO JUAN ANTONIO	230301	29	$2,209,310	$352,900	EPS037	29	$2,209,310	$88,300	CCF07	29	$2,209,310	$88,300	14-23	29	$2,209,310	$153,500	29	$0	$0
91	CC	1118510261	REYES CARO JULIO CESAR	230301	30	$1,483,921	$237,500	EPS037	30	$1,483,921	$59,400	CCF07	30	$1,483,921	$59,400	14-23	30	$1,483,921	$103,380	30	$0	$0
92	CC	1112811761	RINCON MORA JUAN DAVID	25-14	30	$1,347,396	$215,600	EPS025	30	$1,347,396	$53,900	CCF07	30	$1,347,396	$53,900	14-23	30	$1,347,396	$93,800	30	$0	$0
93	CC	1117331600	RODRIGUEZ MONTAÑEZ CRISTIAN DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
94	CC	7177516	RODRIGUEZ VARGAS EDWIN GERARDO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
95	CC	43436618	RODRIGUEZ GUTIERREZ MADELEINE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
96	CC	1117331479	ROMERO CARRANZA EDWIN JACOB	130301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$31,000	14-13	30	$1,300,000	$98,500	30	$0	$0
97	CC	1118530376	ROJAS FERNANDEZ OSCAR IVAN	130301	13	$563,334	$90,308	AN4003	13	$563,334	$22,680	CCF65	13	$561,154	$21,838	14-13	13	$563,334	$29,309	13	$0	$0
98	CC	1053585548	ISACHIQUE ISACHIQUE WILLIAM RICARDO	130301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$31,000	14-13	30	$1,300,000	$98,500	30	$0	$0
99	CC	1115852538	SOGAMOSO RIOS RAMON ANTONIO	130301	30	$1,300,000	$208,000	EPS029	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$31,000	14-13	30	$1,300,000	$98,500	30	$0	$0
100	CC	74861167	SOLER FARFAN CARLOS EUDENIO	130301	27	$1,261,968	$203,000	EPS037	27	$1,261,968	$50,580	CCF65	27	$1,261,968	$30,300	14-13	27	$1,261,968	$87,800	27	$0	$0
101	CC	1118538068	SOLORZANO ARTAHONA ADRIAN DAVID	130301	1	$40,334	$1,308	EPS029	1	$40,334	$0	CCF65	1	$43,334	$0	14-13	1	$40,334	$0	1	$0	$0
102	CC	1118538068	SOLORZANO ARTAHONA ADRIAN DAVID	130301	1	$40,334	$1,308	EPS029	1	$40,334	$0	CCF65	1	$43,334	$0	14-13	1	$40,334	$0	1	$0	$0
103	CC	1118538068	SOLORZANO ARTAHONA ADRIAN DAVID	130301	1	$40,334	$7,000	EPS029	1	$40,334	$1,800	CCF65	0	$0	$0	14-13	1	$40,334	$0	0	$0	$0
104	CC	1118538068	SOLORZANO ARTAHONA ADRIAN DAVID	130301	27	$1,170,000	$187,200	EPS029	27	$1,170,000	$46,800	CCF65	27	$1,170,000	$46,800	14-13	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
105	CC	74860119	SUAREZ MARTHA LUIS FELIPE	130301	8	$260,000	$41,600	EPS037	8	$260,000	$10,400	CCF65	8	$260,000	$10,400	14-13	8	$260,000	$18,100	8	$0	$0
106	CC	1117324335	TABACO PEREZ EFRENCY	130301	30	$1,327,657	$212,580	EPS037	30	$1,327,657	$53,200	CCF65	30	$1,475,713	$59,100	14-13	30	$1,327,657	$92,500	30	$0	$0
107	CC	1118569918	TARACHE IBICA ELVER ANDRES	130301	14	$606,667	$97,180	EPS037	14	$606,667	$24,300	CCF65	8	$0	$0	14-13	14	$606,667	$0	8	$0	$0
108	CC	1118569918	TARACHE IBICA ELVER ANDRES	130301	16	$727,906	$116,580	EPS037	16	$727,906	$29,200	CCF65	16	$727,906	$29,200	14-13	16	$727,906	$50,700	16	$0	$0
109	CC	1123780980	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	130301	30	$1,483,921	$237,580	EPS037	30	$1,483,921	$59,400	CCF65	30	$1,483,921	$59,400	14-13	30	$1,483,921	$103,300	30	$0	$0
110	CC	4083091	TORRES VARGAS ENRIQUE		0	$0	$0	EPS029	17	$736,667	$29,500	CCF65	17	$736,667	$29,500	14-13	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0
111	CC	1118541446	TORRES MENDOZA JUAN CARLOS	130301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF65	30	$1,300,000	$31,000	14-13	30	$1,300,000	$98,500	30	$0	$0
112	CC	23914317	TRUJILLO DELGADO MARIA ANGELICA	130301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF65	30	$1,600,000	$64,000	14-13	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
113	CC	13465950	VARGAS ARBELA DIDIER		0	$0	$0	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF65	30	$1,450,000	$58,000	14-13	30	$1,450,000	$101,800	30	$0	$0
114	CC	1116549786	VARGAS AGUDELO JOSE ANTONIO	130301	30	$1,368,275	$219,800	EPS041	30	$1,368,275	$54,800	CCF65	30	$1,368,275	$54,800	14-13	30	$1,368,275	$139,200	30	$0	$0
115	CC	1116562073	VARGAS PENAGOS WILMER FERNANDO	130301	30	$1,303,457	$208,600	EPS029	30	$1,303,457	$52,200	CCF65	30	$1,303,457	$52,200	14-13	30	$1,303,457	$98,800	30	$0	$0
116	CC	1116617888	VASQUEZ TABACO ISMAEL	15-14	27	$1,170,000	$187,200	EPS029	27	$1,170,000	$46,800	CCF65	27	$1,170,000	$46,800	14-13	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SINERGIA BOCAS DEL PAUTO (3 Afiliados)						$4,524,363	$723,900			$4,514,363	$181,200			$4,636,307	$185,700			$4,524,363	$315,000		$0	$0
Centro de Trabajo: BOCAS DEL PAUTO (3 Afiliados)						$4,524,363	$723,900			$4,514,363	$181,200			$4,636,307	$185,700			$4,524,363	$315,000		$0	$0
Ciudad: TRINIDAD Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$4,524,363	$723,900			$4,514,363	$181,200			$4,636,307	$185,700			$4,524,363	$315,000		$0	$0
117	CC	1116662808	MACHADO PEREZ BRAYAN	13001	28	$1,508,121	$241,300	EPS037	28	$1,508,121	$60,400	CCF65	30	$1,630,065	$64,980	14-13	30	$1,508,121	$105,000	28	$0	$0
118	CC	7160649	PALMERO PEREZ DURAN	13001	28	$1,508,121	$241,300	EPS037	28	$1,508,121	$60,400	CCF65	30	$1,508,121	$60,400	14-13	30	$1,508,121	$105,000	28	$0	$0
119	CC	1116667911	SOLER RODRIGUEZ WILSON ALEXIS	13001	28	$1,508,121	$241,300	EPS037	28	$1,508,121	$60,400	CCF65	30	$1,508,121	$60,400	14-13	30	$1,508,121	$105,000	28	$0	$0
Total			**Afiliados(100)**			$118,219,891	$18,896,900			$130,348,093	$5,303,200			$128,269,894	$5,109,000			$130,348,093	$8,598,100		$1,300,000	$65,000

2024/04/15 05:13 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844804840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	6 - MENOS DE 300 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 38 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	71561964	1465478980	E	2024/04/09	2024/04/15	BANCO DE OCCIDENTE	6	$38,166,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				92	$18,896,900	$96,500	$0	$18,993,400
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	4	$1,083,500	$5,600	$0	$1,089,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$2,529,200	$12,900	$0	$2,542,100
PORVENIR	23I001	800,224,808	8	70	$14,152,700	$72,200	$0	$14,224,900
PROTECCION	23I001	800,229,739	0	6	$1,131,500	$5,800	$0	$1,137,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				100	$8,598,100	$43,900	$0	$8,642,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	100	$8,598,100	$43,900	$0	$8,642,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				100	$5,109,000	$26,100	$0	$5,135,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	100	$5,109,000	$26,100	$0	$5,135,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				100	$5,303,200	$27,600	$0	$5,330,800
CAPITAL SALUD	EPSC14	900,298,372	9	1	$52,000	$300	$0	$52,300
CAPRESOCA	EPSC15	891,856,000	7	25	$1,193,900	$6,100	$0	$1,200,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$98,100	$500	$0	$98,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$27,800	$200	$0	$28,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC14	900,226,715	3	2	$104,200	$600	$0	$104,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$300	$0	$52,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$52,000	$300	$0	$52,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	4	$278,800	$1,500	$0	$280,300
NUEVA E.P.S.	EPS017	900,156,264	2	25	$1,223,200	$6,300	$0	$1,229,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	$688,600	$3,600	$0	$692,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	$1,532,600	$7,900	$0	$1,540,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$200	$0	$39,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$39,000	$200	$0	$39,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$200	$0	$26,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$26,000	$200	$0	$26,200
TOTAL				100	$37,972,200	$194,500	$0	$38,166,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844604648	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	29015797	94869679 10	E	2024/05/13	2024/05/10	BANCO DE OCCIDENTE	1	$41,022,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingreso	retiro	tsue	tae	tde	vsp	vst	sln	ige	irl	vac	avp	cte	11	hge	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (111 Afiliados)																				$150,832,833	$20,933,280			$161,440,241	$9,737,800			$148,916,900	$1,619,000			$168,781,241		$1,121,180		$0	$0		$41,782,710
Centro de Trabajo: ORDCUÉ 6.05 (3 Afiliados)																				$1,980,000	$634,080			$3,930,000	$156,800			$1,980,000	$156,000			$3,980,000		$121,500		$0	$0		$1,207,500
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																				$1,980,000	$634,080			$3,930,000	$156,800			$1,980,000	$156,000			$3,980,000		$121,500		$0	$0		$1,207,500
1	CC	1405197	CRUZ MENDOZA MIGUEL ANGEL															23008	30	$1,320,000	$208,800		30	$1,320,000	$52,800		30	$1,320,000	$52,800	14-23	30	$1,320,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
2	CC	1083519829	ESCALANTE ALTAMAR ALBERTO ANTONIO															23008	30	$1,320,000	$208,800		30	$1,320,000	$52,800		30	$1,320,000	$52,800	14-23	30	$1,320,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
3	CC	1007147136	LIQUIDADOR GRANADOS BRAYAN ESTEVE															23008	30	$1,320,000	$208,800		30	$1,320,000	$52,800		30	$1,320,000	$52,800	14-23	30	$1,320,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (3 Afiliados)																				$4,090,000	$648,080			$4,830,000	$192,800			$4,090,000	$192,800			$4,830,000		$21,180		$0	$0		$993,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																				$4,090,000	$648,080			$4,830,000	$192,800			$4,090,000	$192,800			$4,830,000		$21,180		$0	$0		$993,200
4	CC	47436168	BARBOSA ALFONSO MARIA DIOSEY															23008	30	$1,320,000	$208,800		30	$1,320,000	$52,800		30	$1,320,000	$52,800	14-23	30	$1,320,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
5	CC	1118568328	BARRERA TARACHE MARTIN LUCERO															23008	30	$1,320,000	$208,800		30	$1,320,000	$52,800		30	$1,320,000	$52,800	14-23	30	$1,320,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
6	CC	1082154262	CASTRO LOPEZ CRISTHIAN CAMILO															23-10	30	$1,450,000	$233,800		30	$1,450,000	$58,000		30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$100,900	30	$0	$0	N	$450,700
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (105 Afiliados)																				$121,982,853	$19,651,380			$135,516,241	$5,401,900			$132,966,900	$1,301,400			$136,816,241		$9,228,480		$0	$0		$34,589,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (105 Afiliados)																				$121,982,853	$19,651,380			$135,516,241	$5,401,900			$132,966,900	$1,301,400			$136,816,241		$9,228,480		$0	$0		$34,589,800
7	CC	74849585	AGUDELO MORENO FALLANCY														X	23008	30	$1,306,914	$209,200		30	$1,306,914	$52,300		30	$1,306,914	$52,300	14-23	30	$1,306,914	6.960%	$91,000	30	$0	$0	N	$404,900
8	CC	47440746	ALARCON ELSY MERCEDES															23008	1	$43,334	$7,800	23C14	1	$43,334	$1,800		0	$0	$0	14-23	1	$43,334	0.000%	$0	0	$0	$0	N	$9,800
9	CC	47440746	ALARCON ELSY MERCEDES															23008	2	$86,667	$15,600	23C14	2	$86,667	$3,500		0	$0	$0	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	N	$19,400
10	CC	47440746	ALARCON ELSY MERCEDES															23008	2	$86,667	$15,600	23C14	2	$86,667	$3,500		2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	N	$22,900
11	CC	47440746	ALARCON ELSY MERCEDES															23008	25	$1,083,334	$195,000	23C14	25	$1,083,334	$43,400		25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,083,334	6.960%	$75,500	25	$0	$0	N	$356,700
12	CC	9430998	ALFONSO GONZALEZ HARDY															23008	1	$43,334	$7,800	23C14	1	$43,334	$1,800		1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	N	$11,400
13	CC	9430998	ALFONSO GONZALEZ HARDY															23008	29	$1,254,324	$225,800	23C14	29	$1,254,324	$50,200		29	$1,254,324	$50,200	14-23	29	$1,254,324	6.960%	$87,300	29	$0	$0	N	$413,500
14	CC	11303787	ARIZA MARCIA JACINTO															23008	30	$1,376,057	$230,200	23C14	30	$1,376,057	$55,100		30	$1,376,057	$55,100	14-23	30	$1,376,057	6.960%	$95,800	30	$0	$0	N	$436,200
15	CC	1006089161	AVILA COLINA CARLOS YORDEY															23008	30	$1,306,914	$209,200	23C14	30	$1,306,914	$52,300		30	$1,306,914	$52,300	14-23	30	$1,306,914	6.960%	$91,000	30	$0	$0	N	$404,800
16	CC	4191971	AVILA MARTAS OLIVERIO		X	X												23008	6	$325,000	$52,000		0	$0	$0		6	$325,000	$13,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	6	$0	$0	No	$155,500
17	CC	1007583039	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA															23008	30	$1,450,000	$233,800	23C14	30	$1,450,000	$58,000		30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	N	$449,800
18	CC	47440818	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS															23008	30	$1,480,000	$294,800	23C14	30	$1,480,000	$64,000		30	$1,480,000	$64,000	14-23	30	$1,480,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	N	$495,400
19	CC	1007763067	BERNAL GIDDER OLVER FABIAN															23008	30	$1,450,000	$233,800	23C14	30	$1,450,000	$58,000		30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	N	$449,800
20	CC	1006089231	CASTILLO ACOSTA JENIFER ALEJANDRA		X												X	23008	29	$1,315,429	$210,300	23C14	29	$1,315,429	$52,700		29	$1,315,429	$52,700	14-23	29	$1,315,429	6.960%	$91,600	29	$0	$0	N	$407,300
21	CC	1118836193	CASTRO CORRONE ALEXIS														X	23008	30	$1,313,829	$210,300	23C14	30	$1,313,829	$52,600		30	$1,313,829	$52,600	14-23	30	$1,313,829	6.960%	$91,500	30	$0	$0	N	$407,000
22	CC	1111123043	CHILA SERRERA ERNESTO ANTONIO	X														23008	20	$866,667	$138,700	23C14	20	$866,667	$34,700		20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	6.960%	$60,400	20	$0	$0	N	$268,500
23	CC	7364574	CHAPARRO SEGAMOSO HELMAN FREDY															23008	30	$1,320,000	$208,800	24H01	30	$1,320,000	$52,800		30	$1,320,000	$52,800	14-23	30	$1,320,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 45	YOPAL-CASANARE	6327178	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	98815797	9466467918	E	2024/05/10	2024/05/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$41,822,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				105	$20,937,300	$0	$0	$20,937,300
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	5	$1,137,700	$0	$0	$1,137,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$2,774,400	$0	$0	$2,774,400
PORVENIR	230D01	800,224,808	8	78	$15,330,200	$0	$0	$15,330,200
PROTECCION	230D01	800,229,739	0	9	$1,695,000	$0	$0	$1,695,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				113	$9,527,300	$0	$0	$9,527,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	113	$9,527,300	$0	$0	$9,527,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				113	$5,631,900	$0	$0	$5,631,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	113	$5,631,900	$0	$0	$5,631,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				112	$5,725,500	$0	$0	$5,725,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$55,100	$0	$0	$55,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	29	$1,385,500	$0	$0	$1,385,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$105,500	$0	$0	$105,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$158,500	$0	$0	$158,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$24,300	$0	$0	$24,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$56,300	$0	$0	$56,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	4	$205,100	$0	$0	$205,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	$1,212,900	$0	$0	$1,212,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	17	$907,300	$0	$0	$907,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	$1,563,000	$0	$0	$1,563,000
TOTAL				113	$41,822,000	$0	$0	$41,822,000

2024/05/14 09:04 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 844004840	0	SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 38 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	49429993	94685741S9	E	2024/06/13	2024/06/17	BANCO DE OCCIDENTE		$44,985,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: YOPAL (328 Afiliados)					$141,829,153	$22,456,300				$150,011,396	$4,163,000			$142,383,031	$5,042,500			$155,011,396	$10,118,400		$0	$0
Centro de Trabajo: OROCUÉ 6.06 (1 Afiliados)					$1,213,334	$194,200				$1,213,334	$48,600			$1,213,334	$48,600			$1,213,334	$84,000		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,213,334	$194,200				$1,213,334	$48,600			$1,213,334	$48,600			$1,213,334	$84,000		$0	$0
1	CC	74871286	YARSAID JOSE LIZCANO	13030I	28	$1,213,334	$194,200	DP5037	28	$1,213,334	$48,600	CCFM	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$84,000	28	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000				$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000				$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
2	CC	47456168	BARRERA ALFONSO MARIA DIGNIT	13030I	30	$1,300,000	$208,000	DP5037	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
3	CC	1118868358	BARRERA TAMACHE MARTHA LUCERO	13030I	30	$1,300,000	$208,000	DP5037	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$4,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (117 Afiliados)					$138,015,919	$22,046,100				$151,197,762	$6,009,400			$138,269,697	$5,489,900			$151,197,762	$10,018,300		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (117 Afiliados)					$138,015,919	$22,046,100				$151,197,762	$6,009,400			$138,269,697	$5,489,900			$151,197,762	$10,018,300		$0	$0
4	CC	1055273105	AGUIRA GOMEZ CINDY PATRICIA	13030I	29	$1,344,479	$215,200	DP5037	29	$1,344,479	$53,800	CCFM	29	$1,296,667	$50,300	14-23	29	$1,344,479	$93,600	29	$0	$0
5	CC	24864583	AGUDELO MORENO FALLARCY	13030I	30	$1,317,286	$210,800	DP5037	30	$1,317,286	$52,700	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,317,286	$91,700	30	$0	$0
6	CC	47460746	ALARCON ELSY MERCEDES	13030I	29	$1,296,347	$203,700	DP5037	29	$1,296,347	$50,700	CCFM	29	$1,296,667	$50,300	14-23	29	$1,296,347	$88,200	29	$0	$0
7	CC	47460746	ALARCON ELSY MERCEDES	13030I	1	$43,334	$7,000	DP5037	1	$43,334	$1,600	CCFM	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
8	CC	9438998	ALFONSO GONZALEZ HARDY	13030I	30	$1,313,829	$210,300	DP5037	30	$1,313,829	$52,600	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,313,829	$91,500	30	$0	$0
9	CC	11203787	AREA MURCIA DAGOBERTO	13030I	30	$1,320,740	$211,400	DP5037	30	$1,320,740	$52,900	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,320,740	$92,000	30	$0	$0
10	CC	1006485561	AVILA COLINA CARLOS YOHNEY	13030I	30	$1,324,572	$211,900	DP5037	30	$1,324,572	$53,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,324,572	$92,300	30	$0	$0
11	CC	1007387019	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA	13030I	28	$1,400,000	$224,000	DP5037	28	$1,400,000	$56,000	CCFM	28	$1,400,000	$56,000	14-23	28	$1,400,000	$101,000	28	$0	$0
12	CC	47440838	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS	13030I	30	$1,600,000	$256,000	DP5037	30	$1,600,000	$64,000	CCFM	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$115,400	30	$0	$0
13	CC	1007767067	BERNAL GOODY YILVER FABIAN	13030I	30	$1,450,000	$232,000	DP5037	30	$1,450,000	$58,000	CCFM	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0
14	CC	1006485593	BURGOS MENDIVELSO JENNY ESTHER	13030I	17	$493,611	$143,000	DP5037	17	$993,602	$39,800	CCFM	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$993,611	$62,300	17	$0	$0
15	CC	1006485251	CASTILLO ACOSTA JENIFER ALEJANDRA	13030I	5	$233,910	$37,300	DP5037	5	$233,910	$9,400	CCFM	5	$295,342	$11,800	14-23	5	$233,910	$16,300	5	$0	$0
16	CC	1007864262	CASTRO LOPEZ CRISTHIAN CAMILO	13-14	30	$1,450,000	$232,000	DP5037	30	$1,450,000	$58,000	CCFM	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0
17	CC	1118536153	CASTRO ZUNIGA ALEXIS	13030I	16	$403,334	$69,400	DP5037	16	$403,334	$17,400	CCFM	0	$0	$0	14-23	16	$403,334	$0	0	$0	$0
18	CC	1118536153	CASTRO ZUNIGA ALEXIS	13030I	28	$880,496	$140,900	DP5037	28	$880,496	$35,300	CCFM	28	$866,667	$34,700	14-23	28	$880,496	$61,300	28	$0	$0
19	CC	1118528943	CHILA TORRADO ERNESTO ANTONIO	13030I	30	$1,300,000	$208,000	DP5037	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,900	30	$0	$0
20	CC	7364974	CHUPARRO SEGUNDO HELMER FREDY	13030I	30	$1,300,000	$208,000	DP5037	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,900	30	$0	$0
21	CC	74759900	CISNEROS ALEJANDRO CIRO EVELIO	13030I	9	$390,000	$62,400	DP5037	9	$390,000	$15,600	CCFM	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
22	CC	74849338	CRUZ PEREZ GUSTAVO ALONSO	13030I	29	$903,139	$143,900	DP5037	29	$993,139	$38,300	CCFM	28	$840,695	$37,700	14-23	29	$955,139	$66,500	29	$0	$0
23	CC	74849338	CRUZ PEREZ GUSTAVO ALONSO	13030I	1	$86,667	$10,900	DP5037	1	$86,667	$0	CCFM	1	$86,667	$0	14-23	1	$86,667	$0	1	$0	$0
24	CC	9411977	CRUZ MORERA RAFAEL ANGEL	13030I	30	$1,300,000	$208,000	DP5037	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,900	30	$0	$0

2024/06/17 04:18 PM

324

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
29	CC	9657917	CUBIDES SOTTA JAIRO LUIS OMAR		0	$0	$0	ARI	30	$1,300,000	$52,000	CCF	30	$1,300,000	$52,000	14-1	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
35	CC	1118859669	DELGADO CARRAJAL STELLA ALEJANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS	30	$1,300,000	$52,000	CCF	30	$1,300,000	$52,000	14-1	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
37	CC	17546330	DUARTE CRUZ RAMON		0	$0	$0	EPS	30	$1,300,000	$52,000	CCF	30	$1,300,000	$52,000	14-1	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
38	CC	1064456633	DUQUE NAVAS JHONNATAN	230301	17	$883,632	$140,800	EPS	17	$883,632	$35,800	CCF	17	$736,667	$29,500	14-1	17	$883,632	$61,200	17	$0	$0
39	CC	1118531008	DUQUE ACEVEDO NELSON ALEJANDRO	230301	28	$1,375,563	$234,160	EPS	28	$1,375,562	$54,900	CCF	28	$1,211,334	$48,400	14-1	28	$1,375,563	$85,800	28	$0	$0
38	CC	1118531008	DUQUE ACEVEDO NELSON ALEJANDRO	230301	2	$86,667	$13,900	EPS	2	$86,667	$3,500	CCF	0	$0	$0	14-1	2	$86,667	$0	0	$0	$0
31	CC	9651046	DURAN JOSE DEL CARMEN		0	$0	$0	EPS	30	$1,300,000	$52,000	CCF	30	$1,300,000	$52,000	14-1	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
32	CC	1082851829	ESCALANTE ALTAMAR ALBERTO ANTONIO	230301	30	$1,386,914	$189,200	EPS	30	$1,386,914	$52,900	CCF	30	$1,300,000	$52,000	14-1	30	$1,306,914	$91,000	30	$0	$0
33	CC	1118559874	ESTUPIÑAN CUELLAR RUBEN DARIO	230301	30	$1,300,000	$189,800	EPS	30	$1,300,000	$52,000	CCF	30	$130,000	$5,200	14-1	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
34	CC	24847387	FARYAN FARYAN ANGEL MARIA	230301	15	$681,114	$189,800	EPS	19	$681,114	$27,300	CCF	19	$681,114	$27,300	14-1	15	$681,114	$47,400	19	$0	$0
35	CC	1057572709	FONSECA MOLINA MARTHA LILIANA	230301	16	$727,906	$116,300	EPS	16	$727,906	$29,100	CCF	16	$919,362	$36,800	14-1	16	$727,906	$50,500	16	$0	$0
36	CC	9868488	GAITAN LEON GERMAN YESID	23-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS	30	$1,300,000	$52,000	CCF	30	$1,300,000	$52,000	14-1	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
37	CC	9659199	GALAN CAMARGO BORIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS	30	$1,300,000	$52,000	CCF	30	$1,300,000	$52,000	14-1	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
38	CC	1117326334	GARCIA FUENTES BRAYAN RODRIGO	230301	30	$1,318,743	$211,000	EPS	30	$1,318,743	$52,900	CCF	30	$1,300,000	$52,000	14-1	30	$1,318,743	$92,000	30	$0	$0
39	CC	1120880525	GARCIA ACEVEDO DIEGO ARMANDO	230301	27	$1,218,400	$195,000	EPS	27	$1,218,400	$48,800	CCF	27	$1,170,000	$46,800	14-1	27	$1,218,400	$84,900	27	$0	$0
40	CC	1120880525	GARCIA ACEVEDO DIEGO ARMANDO	230301	2	$86,667	$13,900	EPS	2	$86,667	$3,500	CCF	2	$86,667	$3,500	14-1	2	$86,667	$0	2	$0	$0
41	CC	1120880525	GARCIA ACEVEDO DIEGO ARMANDO	230301	1	$43,334	$6,900	EPS	1	$43,334	$1,700	CCF	1	$43,334	$1,700	14-1	1	$43,334	$0	1	$0	$0
42	CC	1117031194	GARCIA CARDENO KEVIN	230301	10	$433,334	$69,400	EPS	10	$433,334	$17,400	CCF	10	$433,334	$17,400	14-1	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
43	CC	1029643234	GOMEZ CATAÑO JHOJAN DAVID	23-14	25	$1,478,833	$236,700	EPS	25	$1,478,833	$59,200	CCF	25	$1,083,334	$43,400	14-1	25	$1,478,833	$103,000	25	$0	$0
44	CC	1029643234	GOMEZ CATAÑO JHOJAN DAVID	23-14	5	$296,667	$34,700	EPS	5	$296,667	$8,700	CCF	0	$0	$0	14-1	5	$296,667	$0	0	$0	$0
45	CC	4384848	GONZALEZ CARRASCO EULICER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS	30	$1,300,000	$52,000	CCF	0	$0	$0	14-1	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0
46	CC	9761218	GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEXIS		0	$0	$0	EPS	30	$2,600,000	$104,000	CCF	30	$2,600,000	$104,000	14-1	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
47	CC	8406392	GONZALEZ RIVEROS NELSON ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS	30	$1,300,000	$52,000	CCF	30	$1,300,000	$52,000	14-1	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
48	CC	1127162088	GRANADO SILER KEVIN	230301	17	$987,450	$145,200	EPS	17	$987,450	$36,300	CCF	17	$736,667	$29,500	14-1	17	$987,450	$63,200	17	$0	$0
49	CC	24847788	GUILLERON LUIS ARMANDO	230301	30	$1,426,332	$228,200	EPS	30	$1,426,332	$57,100	CCF	30	$1,300,000	$52,000	14-1	30	$1,426,332	$99,200	30	$0	$0
50	CC	8152873	GUMIN MARTINEZ MARTHA CECILIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS	30	$1,300,000	$52,000	CCF	30	$1,300,000	$52,000	14-1	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
51	CC	1002645537	GUATIBONZA TORRES PABLO ALBERTO	230301	25	$1,803,334	$173,400	EPS	25	$1,083,334	$43,400	CCF	15	$1,083,334	$41,400	14-1	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
52	CC	1002645537	GUATIBONZA TORRES PABLO ALBERTO	230301	9	$216,667	$34,700	EPS	1	$216,667	$8,700	CCF	0	$0	$0	14-1	9	$216,667	$0	0	$0	$0
53	CC	1087825647	GUIANBO RODRIGUEZ DIANA LISVEH	23-14	30	$1,360,154	$217,700	EPS	30	$1,360,154	$54,500	CCF	30	$1,300,000	$52,000	14-1	30	$1,360,154	$94,700	30	$0	$0
54	CC	1161696	GUERRERO FAGUA JOSE MAURICIO	23-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS	30	$1,300,000	$52,000	CCF	30	$1,300,000	$52,000	14-1	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
55	CC	14778219	GUINA MALDONADO DENIS	230301	29	$1,263,581	$202,200	EPS	29	$1,263,581	$50,600	CCF	29	$1,256,667	$50,300	14-1	29	$1,263,581	$88,000	29	$0	$0
56	CC	14778219	GUINA MALDONADO DENIS	230301	1	$43,334	$6,900	EPS	1	$43,334	$1,700	CCF	1	$43,334	$1,700	14-1	1	$43,334	$0	1	$0	$0
57	CC	14862619	GUINA MALDONADO LUIS FERNANDO	230301	29	$1,125,810	$210,300	EPS	29	$1,125,810	$53,900	CCF	29	$1,256,667	$50,300	14-1	29	$1,125,810	$82,300	29	$0	$0
58	CC	14862619	GUINA MALDONADO LUIS FERNANDO	230301	1	$43,334	$6,900	EPS	1	$43,334	$1,700	CCF	1	$43,334	$1,700	14-1	1	$43,334	$0	1	$0	$0
59	CC	1116666733	GUTIERREZ PARFAN JORGE LUIS	230301	26	$1,170,514	$185,600	EPS	26	$1,170,514	$47,200	CCF	26	$1,126,667	$45,100	14-1	26	$1,170,514	$82,400	26	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
60	CC	1116666713	GUTIERREZ FARFAN JORGE LUIS	230301	2	$86,667	$10,500	EPS041	2	$86,667	$0	CCF0	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	$0	2	$0	$0
61	CC	1116666713	GUTIERREZ FARFAN JORGE LUIS	230301	2	$86,667	$10,500	EPS041	2	$86,667	$0	CCF0	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	$0	2	$0	$0
62	CC	1117325867	GUTIERREZ GAITAN JOSE ANGIZAR	230301	30	$1,306,914	$159,200	EPS041	30	$1,306,914	$52,308	CCF0	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,306,914	$91,800	30	$0	$0
63	CC	74848974	GUTIERREZ PEREZ JOSE ANGEL	230301	25	$1,090,248	$179,500	EPS005	25	$1,090,248	$43,708	CCF0	25	$1,083,334	$41,400	14-23	25	$1,090,248	$76,900	25	$0	$0
64	CC	74848974	GUTIERREZ PEREZ JOSE ANGEL	230301	5	$216,667	$14,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF0	0	$0	$0	14-23	5	$216,667	$0	0	$0	$0
65	CC	1116530703	HERRERA CARDONAS CARLOS ANDRES	230301	30	$1,306,914	$159,200	EPS037	30	$1,306,914	$52,308	CCF0	30	$1,306,914	$52,300	14-23	30	$1,306,914	$91,800	30	$0	$0
66	CC	4214408	HUMO CAITAN JUAN RODOLFO	230301	30	$1,313,829	$210,300	EPS037	30	$1,313,829	$52,608	CCF0	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,313,829	$91,900	30	$0	$0
67	CC	74718305	JIMENEZ HERNANDEZ OSCAR FIDNEY	230301	7	$303,334	$48,600	EPS005	7	$303,334	$12,108	CCF0	7	$301,251	$12,100	14-23	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
68	CC	1007747536	LEQUERBAKOH GRANADOS BRAYAN ESTIVEN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS025	30	$1,300,000	$52,008	CCF0	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,900	30	$0	$0
69	CC	74815356	LEQUERBAKOH PINTO JOSE LANDER	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF0	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$84,800	28	$0	$0
70	CC	74815356	LEQUERBAKOH PINTO JOSE LANDER	230301	2	$86,667	$10,500	EPS037	2	$86,667	$0	CCF0	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	$0	2	$0	$0
71	CC	1057602717	LEMUS MELO LUIS FERNANDO	230301	29	$1,373,953	$220,000	EPS008	29	$1,373,953	$54,008	CCF0	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,373,953	$88,700	29	$0	$0
72	CC	1057602717	LEMUS MELO LUIS FERNANDO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS008	1	$43,334	$1,800	CCF0	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
73	CC	1096191	LEMUS PATARROYO RAFAEL ALBERTO	29-14	30	$1,303,457	$208,600	EPS005	30	$1,303,457	$52,108	CCF0	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,303,457	$90,800	30	$0	$0
74	CC	1117315912	LOZANO CATANY WILMER	230301	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,408	CCF0	10	$433,334	$17,400	14-23	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
75	CC	37177448	MARTINEZ MARQUEZ	230301	16	$737,906	$116,500	EPS005	16	$737,906	$29,508	CCF0	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$737,906	$50,700	16	$0	$0
76	CC	1123732127	MARCO BARRETO JOSE YORNEY	230301	28	$1,300,278	$240,100	EPS041	28	$1,300,278	$60,108	CCF0	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,300,278	$104,500	28	$0	$0
77	CC	1123732127	MARCO BARRETO JOSE YORNEY	230301	2	$86,667	$10,500	EPS041	2	$86,667	$0	CCF0	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	$0	2	$0	$0
78	CC	1118561713	MENDIVELSO GUTIERREZ BAYRA MARLEY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,008	CCF0	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,900	30	$0	$0
79	CC	1074812418	MENDOZA JABANILLO SAMIR DAVID	230301	29	$1,359,514	$249,600	EPS037	29	$1,259,514	$62,408	CCF0	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,359,514	$108,600	29	$0	$0
80	CC	1057606408	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	230301	29	$1,325,810	$212,200	EPS008	29	$1,325,810	$53,108	CCF0	29	$1,325,810	$53,100	14-23	29	$1,325,810	$92,300	29	$0	$0
81	CC	1057606408	MERCHAN TORRES JUAN PABLO	230301	1	$43,334	$5,300	EPS008	1	$43,334	$0	CCF0	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
82	CC	1118925643	MILLAN GUANARO WILSON ANDRES	230301	30	$1,355,314	$216,900	EPS037	30	$1,355,314	$54,308	CCF0	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,355,314	$94,400	30	$0	$0
83	CC	74846468	MONTAÑEZ MENDOZA ORLANDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,008	CCF0	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,900	30	$0	$0
84	CC	1118547152	MORENO MALDONADO ALEXANDER	29-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS025	30	$1,300,000	$52,008	CCF0	0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0
85	CC	4186474	MORENO UMBA HERNANDO	29-14	30	$1,331,114	$213,000	EPS025	30	$1,331,114	$53,308	CCF0	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,331,114	$92,700	30	$0	$0
86	CC	1806458718	MOTTA SALCEDO CESAR ALEXANDER	230301	30	$1,379,515	$220,800	EPS025	30	$1,379,515	$55,208	CCF0	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,379,515	$96,100	30	$0	$0
87	CC	1066727172	NARANJO VERTEL DIEGO ANDRES	29-14	30	$1,627,847	$260,400	EPS025	30	$1,627,847	$65,100	CCF0	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,627,847	$113,300	30	$0	$0
88	CC	7657771	NIÑO MOLINA JORGE	230301	30	$1,407,172	$225,200	EPS025	30	$1,407,172	$56,300	CCF0	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,407,172	$98,000	30	$0	$0
89	CC	1654803	NUÑEZ HOLGUIN GONZALO	230301	30	$1,331,629	$213,100	EPS005	30	$1,331,629	$53,208	CCF0	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,331,629	$92,700	30	$0	$0
90	CC	4609644	OJEDA GAMEZ FREDY	230301	30	$1,331,114	$213,000	EPS037	30	$1,331,114	$53,300	CCF0	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,331,114	$92,700	30	$0	$0
91	CC	15676480	OLEA RUIZ VALBUENA JOSE	230301	30	$1,334,572	$213,400	EPS025	30	$1,334,572	$53,400	CCF0	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,334,572	$92,900	30	$0	$0
92	CC	74867373	ORDPEDA PEREZ		0	$0	$0	AM000	30	$1,300,000	$52,000	CCF0	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
93	CC	1006449969	ORDPEDA PEREZ GILMAR JOHAN	230301	26	$1,259,639	$195,600	EPS037	26	$1,259,639	$48,400	CCF0	26	$1,259,639	$48,400	14-23	26	$1,259,639	$84,100	26	$0	$0
94	CC	1006449969	ORDPEDA PEREZ GILMAR JOHAN	230301	2	$86,667	$10,500	EPS037	2	$86,667	$0	CCF0	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	$0	2	$0	$0
95	CC	1006449969	ORDPEDA PEREZ GILMAR JOHAN	230301	2	$86,667	$15,900	EPS037	2	$86,667	$1,900	CCF0	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
96	CC	1116615344	ORDPECIA SALCEDO YEIMY ALEXIS	230301	28	$1,219,123	$219,360	EPSC25	28	$1,219,123	$52,800	CCF69	28	$1,213,334	$48,640	14-23	28	$1,219,123	$91,900	28	$0	$0
97	CC	1116615344	ORDPECIA SALCEDO YEIMY ALEXIS	230301	3	$86,667	$13,980	EPSC25	3	$86,667	$3,580	CCF69	0	$0	$0	14-23	3	$86,667	$0	0	$0	$0
98	CC	1026557907	ORTIZ TABACO ALEXIS	230301	30	$1,389,886	$222,480	EPSC25	30	$1,389,886	$55,680	CCF69	30	$1,388,000	$52,000	14-23	30	$1,389,886	$96,600	30	$0	$0
99	CC	1116840819	ORTIZ RINCON DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,317,881	$142,560	EPSC25	30	$1,317,881	$68,800	CCF69	30	$1,388,000	$52,000	14-23	30	$1,317,881	$105,700	30	$0	$0
100	CC	24867911	ORTIZ LUIS REY	230301	29	$1,291,239	$206,600	EPSC25	29	$1,291,239	$53,760	CCF69	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,291,239	$99,900	29	$0	$0
101	CC	24867911	ORTIZ LUIS REY	230301	1	$43,334	$6,380	EPSC25	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
102	CC	48295674	PACHECO REINA EDICY JASMIN		0	$0	$0	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	$169,000	30	$0	$0
103	CC	1118809337	PACHECO DIAZ JOSE MANUEL	25-14	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$24,200	CCF69	14	$606,667	$24,200	14-23	14	$606,667	$42,100	14	$0	$0
104	CC	1118809337	PACHECO DIAZ JOSE MANUEL	25-14	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$27,600	CCF69	0	$0	$0	14-23	16	$693,334	$0	0	$0	$0
105	CC	24868237	PADILLA WILSON	230201	28	$1,213,148	$145,300	EPS037	28	$1,213,148	$48,900	CCF69	28	$1,213,334	$48,640	14-23	28	$1,220,148	$85,000	28	$0	$0
106	CC	24868237	PADILLA WILSON	230201	1	$86,667	$13,980	EPS037	1	$86,667	$3,500	CCF69	0	$0	$0	14-23	1	$86,667	$0	0	$0	$0
107	CC	24819940	PALACIOS JOSE VICENTE	25-14	30	$1,400,000	$210,000	EPS041	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$100,000	30	$0	$0
108	CC	1116545768	PEDRAZA AYALA JAMES ALCIDES	230301	30	$1,400,000	$232,800	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$100,000	30	$0	$0
109	CC	79941008	PEREZ PACHON DIEGO DANEY	231801	30	$2,868,500	$457,700	EPS005	30	$2,860,500	$114,500	CCF69	30	$2,868,500	$114,500	14-23	30	$2,860,500	$199,100	30	$0	$0
110	CC	33488635	PEREZ CABRERO MARIU	230301	19	$403,334	$69,480	EPS038	10	$403,334	$17,400	CCF69	10	$403,334	$17,400	14-23	10	$403,334	$10,300	10	$0	$0
111	CC	33488635	PEREZ CABRERO MARIU	230301	30	$866,667	$138,700	EPS025	20	$866,667	$34,700	CCF69	0	$0	$0	14-23	20	$866,667	$0	0	$0	$0
112	CC	9656233	PINZON SERRANO CARLOS JULIO	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF69	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$87,900	29	$0	$0
113	CC	9656233	PINZON SERRANO CARLOS JULIO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,600	CCF69	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
114	CC	1018406814	PIRABAN PIRABAN JOSE DE JESUS	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,640	CCF69	28	$1,213,334	$48,640	14-23	28	$1,213,334	$84,900	28	$0	$0
115	CC	1018406814	PIRABAN PIRABAN JOSE DE JESUS	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$0	CCF69	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	$0	2	$0	$0
116	CC	1022459513	PIRACICAN HIGUERA JOSE LUIS	230301	28	$1,207,152	$217,200	EPS017	28	$1,207,152	$54,560	CCF69	28	$1,213,334	$48,640	14-23	28	$1,207,152	$84,900	28	$0	$0
117	CC	1022459513	PIRACICAN HIGUERA JOSE LUIS	230301	2	$86,667	$13,980	EPS017	2	$86,667	$0	CCF69	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	$0	2	$0	$0
118	CC	1118568919	PIRATTIQUE RICO CESAR ADRIAN	230301	8	$316,667	$34,780	EPS005	8	$216,667	$8,700	CCF69	8	$422,500	$16,900	14-23	8	$216,667	$15,100	8	$0	$0
119	CC	4249556	QUINTERO QUINTERO FRANCISCO ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,300	30	$0	$0
120	CC	1118579962	REINA CAÑIZARES IVAN FABIAN	230301	22	$953,334	$152,600	EPS041	22	$953,334	$38,100	CCF69	22	$953,334	$38,100	14-23	22	$953,334	$66,400	22	$0	$0
121	CC	1118579962	REINA CAÑIZARES IVAN FABIAN	230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF69	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
122	CC	1118579962	REINA CAÑIZARES IVAN FABIAN	230301	3	$130,000	$20,800	EPS041	3	$130,000	$5,200	CCF69	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	$0	0	$0	$0
123	CC	1118579962	REINA CAÑIZARES IVAN FABIAN	230301	4	$173,334	$27,800	EPS041	4	$173,334	$7,000	CCF69	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$0	4	$0	$0
124	CC	79696648	RESTREPO CANO ELBIN ANTONIO	230301	30	$2,005,259	$320,900	EPS037	30	$2,001,299	$80,100	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$2,005,259	$139,600	30	$0	$0
125	CC	1118578367	REYES CANO JULIO CESAR	230301	29	$1,454,436	$232,800	EPS005	29	$1,454,436	$58,100	CCF69	29	$1,454,436	$58,100	14-23	29	$1,454,436	$101,200	29	$0	$0
126	CC	1118578367	REYES CANO JULIO CESAR	230301	1	$43,334	$6,380	EPS005	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
127	CC	1122922793	RINCON MORA JUAN DAVID	25-14	30	$1,333,740	$213,400	EPS025	30	$1,300,740	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,333,740	$92,800	30	$0	$0
128	CC	86069780	RINCON RAMIREZ TIRSO MISAEL	230301	9	$390,000	$62,400	CCFC55	9	$390,000	$15,600	CCF69	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
129	CC	24869726	RIOS CHARRIS CARLOS HUMBERTO	230301	19	$474,630	$76,800	EPS037	10	$474,630	$19,000	CCF69	10	$403,334	$17,400	14-23	10	$474,630	$33,100	10	$0	$0
130	CC	4158771	RIVAL LOPEZ RAUL ANTONIO	230301	1	$43,334	$6,380	EPS037	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
131	CC	4158771	RIVAL LOPEZ RAUL ANTONIO	230301	2	$86,667	$13,980	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF69	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
132	CC	1117326608	RODRIGUEZ MONTAÑEZ CINTHIA DAYANA	230301	30	$1,341,486	$214,700	EPS041	30	$1,341,486	$53,700	CCF69	30	$1,341,486	$53,700	14-23	30	$1,341,486	$93,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
132	CC	7177528	RODRIGUEZ VARGAS EDWIN GERARDO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$98,580	30	$0	$0
134	CC	1114059563	RODRIGUEZ GARCIA JOSE ALEXANDR	230201	30	$1,402,333	$224,400	EPS037	30	$1,402,333	$56,100	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,402,333	$97,780	30	$0	$0
135	CC	4743438	RODRIGUEZ GUTIERREZ MADELEINE	230201	30	$1,313,829	$210,100	EPS005	30	$1,313,829	$52,600	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,313,829	$91,580	30	$0	$0
136	CC	1002678097	ROJAS OLIVOS NELI JOHAN	230201	30	$866,667	$138,700	EPS037	20	$866,667	$34,700	CCF04	30	$899,038	$36,000	14-23	30	$866,667	$60,480	20	$0	$0
137	CC	1117126179	ROMERO CARRIMAL ESAU HACOB	230201	30	$1,386,914	$209,100	EPS041	30	$1,908,914	$52,300	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,386,914	$97,080	30	$0	$0
138	CC	9456888	SALCEDO CERON JOSE MARIA	230201	30	$1,934,733	$309,600	EPS037	30	$1,934,733	$77,400	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,934,735	$134,760	30	$0	$0
139	CC	1093189348	VACHEQUE VACHEQUE WILLIAN RICARDO	230201	30	$1,380,000	$208,900	EPS041	30	$1,908,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$98,580	30	$0	$0
140	CC	1114852928	VERGARA BOLIVAR RAMON ANTONIO	230201	30	$1,386,914	$209,100	EPS025	30	$1,908,914	$52,300	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,386,914	$97,080	30	$0	$0
141	CC	1080661567	SOLER FARFAN CARLOS EUGENIO	230201	30	$1,447,275	$231,640	EPS037	30	$1,447,275	$57,900	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,447,275	$101,860	30	$0	$0
142	CC	1118538260	SOLORZANO ANTONIA ADRIAN DAVID	230201	30	$1,401,640	$224,100	EPS025	30	$1,401,640	$56,100	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,401,640	$97,680	30	$0	$0
143	CC	1118569918	TARACHE ISEA ELVER ANDRES	230201	30	$1,438,286	$230,100	EPS037	30	$1,438,286	$57,600	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,438,286	$100,280	30	$0	$0
144	CC	1126780980	TOLEDO PEREZ JOSE DAVID	230201	30	$1,516,419	$242,700	EPS037	30	$1,516,438	$60,700	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,516,438	$105,660	30	$0	$0
145	CC	4081092	TORRES VARGAS ENRIQUE		0	$0	$0	EPS025	30	$1,331,114	$53,300	CCF04	30	$1,331,114	$53,300	14-23	30	$1,331,114	$92,780	30	$0	$0
146	CC	1118941486	TORRES MENDOZA JUAN CARLOS	230201	30	$1,380,000	$208,900	EPS005	30	$1,908,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,580	30	$0	$0
147	CC	1091435?7	TRUJILLO BALGADO MARIA ANGELICA	230201	30	$1,600,000	$336,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF04	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$111,480	30	$0	$0
148	CC	1048A960	VARGAS ARBOLA EDDINO		0	$0	$0	EPS005	28	$1,354,063	$54,300	CCF04	28	$1,353,334	$54,200	14-23	28	$1,354,063	$94,388	28	$0	$0
149	CC	1048A960	VARGAS ARBOLA EDDINO		0	$0	$0	EPS005	1	$96,667	$3,900	CCF04	0	$0	$0	14-23	1	$96,667	$0	0	$0	$0
150	CC	1116545786	VARGAS AGUDELO JOSE ANTONIO	230201	30	$1,386,252	$210,500	EPS041	30	$1,386,252	$55,500	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,386,252	$110,580	30	$0	$0
151	CC	1118963871	VARGAS PERALDO WILMER FERNANDO	230201	30	$1,341,486	$214,700	EPS025	30	$1,341,486	$53,700	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,341,486	$93,480	30	$0	$0
152	CC	1117330279	VARGAS RAMIE YASMIN FERNANDA	230201	25	$1,110,991	$177,800	EPS025	25	$1,110,991	$44,500	CCF04	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,110,991	$77,400	25	$0	$0
153	CC	1118571883	VASQUEZ TABACO DANIEL	25-14	28	$1,247,906	$199,700	EPS025	28	$1,247,906	$50,000	CCF04	28	$1,253,334	$50,200	14-23	28	$1,247,906	$86,968	28	$0	$0
154	CC	1118571883	VASQUEZ TABACO DANIEL	25-14	1	$86,667	$13,900	EPS025	1	$86,667	$3,500	CCF04	0	$0	$0	14-23	1	$86,667	$0	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SYNERGIA BOCAS DEL PAUTO (3 Afiliados)						**$861,363**	**$137,900**			**$861,363**	**$34,600**			**$828,751**	**$33,200**			**$861,363**	**$60,100**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: BOCAS DEL PAUTO (3 Afiliados)						**$861,363**	**$137,900**			**$861,363**	**$34,600**			**$828,751**	**$33,200**			**$861,363**	**$60,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: TRINIDAD Depto: CASANARE (3 Afiliados)						**$861,363**	**$137,900**			**$861,363**	**$34,600**			**$828,751**	**$33,200**			**$861,363**	**$60,100**		**$0**	**$0**
133	CC	7760449	PALACIO PEREZ ELMAN	230201	15	$688,029	$110,100	EPS037	15	$688,029	$27,600	CCF04	15	$688,800	$26,800	14-23	15	$688,029	$47,900	15	$0	$0
156	CC	1116667591	SOLER RODRIGUEZ WILSON ALEXIS	230201	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF04	2	$92,884	$1,700	14-23	2	$86,667	$6,108	2	$0	$0
157	CC	1116667593	SUAREZ CUBILLOS MATEO DANIEL	230201	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF04	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	$6,108	2	$0	$0
Total			**Afiliados(123)**			**$142,690,414**	**$23,794,300**			**$155,672,459**	**$6,196,600**			**$142,911,782**	**$5,675,700**			**$155,672,459**	**$10,176,580**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844003892	8	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - APORTES DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 H 28 - 45	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	49425595	940824159	E	2024/06/13	2024/06/17	BANCO DE OCCIDENTE		$44,985,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				115	$22,794,200	$0	$22,866,300
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	4	$1,089,100	$0	$1,092,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$2,892,200	$0	$2,901,400
PORVENIR	23I301	800,224,808	8	88	$17,145,700	$0	$17,199,800
PROTECCION	23I201	800,229,739	0	10	$1,667,200	$0	$1,672,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				123	$10,176,500	$0	$10,208,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	123	$10,176,500	$0	$10,208,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				123	$5,675,700	$0	$5,693,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	123	$5,675,700	$0	$5,693,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				123	$6,196,600	$0	$6,216,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$15,600	$0	$15,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,900	$0	$53,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	31	$1,553,400	$0	$1,558,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$105,900	$0	$106,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$157,600	$0	$158,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$54,300	$0	$54,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$52,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	3	$156,000	$0	$156,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	34	$1,564,200	$0	$1,569,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	18	$917,900	$0	$920,800
SANITAS	EPS025	800,251,440	6	28	$1,566,800	$0	$1,571,800
TOTAL				123	$44,843,000	$0	$44,985,000

2024/06/17 04:18 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844804840	9	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 33 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327170	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-07	68375655	94698719[illegible]	E	2024/07/15	2024/07/15	BANCO DE OCCIDENTE	5	$53,061,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																											PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Dias	Lma	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Irl	Vac	Avp	Vct	Dot	Rei	Rep	Rep	Rep	Rep	Rep	Rep	Rep	Rep	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (139 Afiliados)																															$161,841,233	$24,463,700			$170,132,833	$7,651,400			$174,766,233	$5,918,800			$170,132,833		$11,749,100				$53,781,800
Centro de Trabajo: ORDCUÉ 6.56 (4 Afiliados)																															$3,239,101	$524,600			$3,239,101	$131,200			$3,239,101	$131,200			$3,239,101		$238,300				$1,015,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)																															$3,239,101	$524,600			$3,239,101	$131,200			$3,239,101	$131,200			$3,239,101		$238,300				$1,015,300
1	CC	9410764	FUENTES CACERES RONALDO	X										X																23058	28	$921,591	$147,600	604003	30	$921,981	$36,900	CCF49	28	$921,981	$16,900	14-23	28	$921,981	0.9405	$64,200	28	$0	$0	SI	$265,100
2	CC	1116531283	VILLAN CARABAN WILSON ANDREY	X										X																23058	7	$319,928	$51,200	EPS034	7	$319,928	$12,800	CCF49	7	$319,928	$12,800	14-23	7	$319,928	0.9405	$22,100	7	$0	$0	SI	$99,100
3	CC	74846304	ROMERO BARRIOS JOSE NACOR	X										X																23058	13	$736,192	$117,800	EPS026	13	$736,192	$29,500	CCF49	13	$736,192	$29,500	14-23	13	$736,192	0.9405	$51,100	13	$0	$0	SI	$228,100
4	CC	24611266	VARGAS JOSE LEIDIN	X										X																23058	30	$1,380,800	$308,000	EPS037	30	$1,380,000	$52,800	CCF49	30	$1,380,000	$52,000	14-23	30	$1,380,000	0.9405	$80,500	30	$0	$0	SI	$482,300
Centro de Trabajo: YOPAL 0.322 (2 Afiliados)																															$2,600,000	$416,000			$2,600,800	$104,000			$2,600,800	$104,000			$2,600,000		$133,600				$837,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																															$2,600,000	$416,000			$2,600,800	$104,000			$2,600,800	$104,000			$2,600,000		$133,600				$837,600
5	CC	4743618	BARRERA ALFONSO MARIA DIDAY																											23058	30	$1,380,000	$308,000	EPS037	30	$1,380,000	$52,800	CCF49	30	$1,380,000	$52,000	14-23	30	$1,380,000	0.5215	$6,800	30	$0	$0	SI	$218,800
6	CC	1118860320	BARRERA TARACHE MARTHA LUCERO																											23058	30	$1,380,800	$308,000	EPS005	30	$1,380,000	$52,800	CCF49	30	$1,380,000	$52,000	14-23	30	$1,380,000	0.5215	$6,800	30	$0	$0	SI	$218,800
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (133 Afiliados)																															$159,963,133	$23,523,100			$172,253,952	$6,818,200			$168,988,672	$6,683,800			$172,253,952		$11,181,200				$50,132,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (133 Afiliados)																															$159,963,133	$23,523,100			$172,253,952	$6,818,200			$168,988,672	$6,683,800			$172,253,952		$11,181,200				$50,132,300
7	CC	1015171183	ACUÑA GOMEZ CINDY PATRICIA											X																23058	30	$1,821,339	$291,900	EPS017	30	$1,821,339	$72,900	CCF49	30	$1,821,339	$72,000	14-23	30	$1,821,339	0.9405	$126,800	30	$0	$0	SI	$564,100
8	CC	74846511	AGUDELO MORENO WILLIARCY											X																23058	30	$1,468,818	$234,900	EPS017	30	$1,468,818	$58,800	CCF49	30	$1,468,818	$58,000	14-23	30	$1,468,818	0.9405	$102,200	30	$0	$0	SI	$454,300
9	CC	74859381	AGUIRRE DIAZ JAVIER ANTONIO	X										X																23-14	19	$930,306	$148,900	EPS001	19	$930,306	$37,300	CCF49	19	$930,306	$37,300	14-23	19	$930,306	0.9405	$64,800	19	$0	$0	SI	$288,300
10	CC	47440746	ALARCON OLAY REBECEDIS											X																23058	30	$1,306,914	$209,200	EPS034	30	$1,306,914	$52,300	CCF49	30	$1,306,914	$52,300	14-23	30	$1,306,914	0.9405	$91,000	30	$0	$0	SI	$404,800
11	CC	9410598	ALFONSO GONZALEZ HAROY											X																23058	30	$1,407,171	$225,200	EPS001	30	$1,407,171	$56,300	CCF49	30	$1,407,171	$56,300	14-23	30	$1,407,171	0.9405	$98,000	30	$0	$0	SI	$435,800
12	CC	9103787	ARIZA MURCIA BALDOMERO													X														23058	14	$606,667	$97,100	EPS034	14	$606,667	$24,300	CCF49	14	$606,667	$24,000	14-23	14	$606,667	0.5215	$3,100	14	$0	$0	SI	$149,700
13	CC	9103787	ARIZA MURCIA BALDOMERO											X																23058	16	$708,248	$113,300	EPS034	16	$708,248	$28,300	CCF49	16	$708,248	$28,000	14-23	16	$708,248	0.9405	$48,400	16	$0	$0	SI	$217,100
14	CC	1006489561	AVILA COLINA CARLOS YORLEY											X																23058	30	$1,338,246	$214,900	EPS026	30	$1,338,246	$53,500	CCF49	30	$1,338,246	$53,000	14-23	30	$1,338,246	0.9405	$106,600	30	$0	$0	SI	$474,100
15	CC	9449917	BARBOSA BARRETO JORGE ENRIQUE	X																										23058	4	$173,334	$27,800	EPS041	4	$173,334	$7,000	CCF49	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	0.9405	$12,100	4	$0	$0	SI	$53,900
16	CC	1007587019	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA																											23058	30	$1,458,000	$233,000	EPS005	30	$1,458,000	$58,000	CCF49	30	$1,458,000	$58,000	14-23	30	$1,458,000	0.9405	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
17	CC	47440836	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS																											23058	30	$1,408,000	$226,000	EPS005	30	$1,408,800	$56,000	CCF49	30	$1,408,800	$56,000	14-23	30	$1,408,800	0.9405	$111,400	30	$0	$0	SI	$435,400
18	CC	1007570067	BERNAL GODOY YILVER FABIAN																											23058	30	$1,458,000	$233,000	EPS002	30	$1,458,800	$58,000	CCF49	30	$1,458,800	$58,000	14-23	30	$1,458,000	0.9405	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
19	CC	74848938	BOHORQUEZ RODRIGUEZ JOSE ALIRIO	X																										23058	17	$736,667	$117,900	EPS026	17	$736,667	$29,500	CCF49	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	0.9405	$51,100	17	$0	$0	SI	$228,100
20	CC	1006458193	BURGOS MEMBRILLO RONEY ESTIVEN												X															23058	1	$40,334	$5,300	EPS026	1	$40,334	$0	CCF49	1	$40,334	$0	14-23	1	$40,334	0.0005	$0	1	$0	$0	SI	$5,300
21	CC	1006458193	BURGOS MEMBRILLO RONEY ESTIVEN												X															23058	1	$40,334	$5,300	EPS026	1	$40,334	$0	CCF49	1	$40,334	$0	14-23	1	$40,334	0.0005	$0	1	$0	$0	SI	$5,300
22	CC	1006458193	BURGOS MEMBRILLO RONEY ESTIVEN											X																23058	28	$1,258,377	$201,600	EPS026	28	$1,258,377	$50,400	CCF49	28	$1,258,377	$50,400	14-23	28	$1,258,377	0.9405	$97,600	28	$0	$0	SI	$389,800
23	CC	1118513829	CACHAY CACHAY FREDY	X										X																23058	19	$854,448	$136,800	EPS026	19	$854,448	$34,200	CCF49	19	$854,448	$34,200	14-23	19	$854,448	0.9405	$69,300	19	$0	$0	SI	$264,700

2024/07/15 03:11 PM

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8460048	3	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - ANIOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 38 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	08371630	94698207169	E	2024/07/10	2024/07/15	BANCO DE OCCIDENTE	5	$53,061,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				133	$26,853,800	$101,000	$0	$26,954,800
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	4	$1,139,200	$4,300	$0	$1,143,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$3,671,200	$13,800	$0	$3,685,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	100	$20,064,500	$75,400	$0	$20,139,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,978,900	$7,500	$0	$1,986,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				141	$11,882,600	$44,700	$0	$11,927,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	141	$11,882,600	$44,700	$0	$11,927,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				141	$6,995,700	$26,300	$0	$7,022,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	141	$6,995,700	$26,300	$0	$7,022,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				141	$7,130,100	$27,400	$0	$7,157,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$7,000	$100	$0	$7,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,400	$200	$0	$52,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	37	$1,833,900	$6,900	$0	$1,840,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$67,300	$300	$0	$67,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$162,300	$700	$0	$163,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$38,700	$200	$0	$38,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$88,900	$400	$0	$89,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	3	$119,600	$500	$0	$120,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	39	$1,981,200	$7,500	$0	$1,988,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	23	$1,040,100	$4,000	$0	$1,044,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	$1,738,700	$6,600	$0	$1,745,300
TOTAL				141	$52,862,200	$199,400	$0	$53,061,600

2024/07/15 03:11 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 840038040	3	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	9471208643	9471208643	E	2024/08/12	2024/08/14	BANCO DE BOGOTA	1	$57,630,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ingreso	ret	sln	vac	vsp	irp	vst	cor	ige	lma	lnr	sus	avp	evt	vi	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (136 Afiliados)																							$193,788,681	$19,379,808			$192,947,369	$7,658,436			$193,487,623	$7,518,000			$193,947,369		$12,796,603							$47,354,776
Centro de Trabajo: OROCUÉ 6.96 (3 Afiliados)																							$6,878,087	$1,091,808			$6,878,087	$273,500			$6,917,729	$275,190			$6,878,087		$405,909				$0	$0		$2,133,508
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																							$6,878,087	$1,091,808			$6,878,087	$273,500			$6,917,729	$275,190			$6,878,087		$405,909				$0	$0		$2,133,508
1	CC	9430096	FUENTES CACERES ROALDO											X							23830 1	1	$43,334	$5,200	84089	1	$43,334	$0	CCFV9	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	0.009%	$0	1	$0	$0	N	$5,200
2	CC	9430096	FUENTES CACERES ROALDO											X							23830 1	29	$1,994,211	$304,780	84089	29	$1,994,211	$76,180	CCFV9	29	$1,994,211	$76,180	14-23	29	$1,994,211	6.960%	$102,600	29	$0	$0	N	$389,780
3	CC	1116539383	MOLINA CARMONA WILSON ANDREY		X									X						X	23830 1	15	$684,573	$109,680	EPSC25	15	$684,573	$27,480	CCFV9	15	$724,294	$29,000	14-23	15	$684,573	6.960%	$47,700	15	$0	$0	N	$213,780
4	CC	1116554258	RINCON JOHN ROBINSON		X									X							23800 1	22	$1,118,509	$179,080	EPS005	22	$1,118,509	$44,800	CCFV9	22	$1,118,509	$44,800	14-23	22	$1,118,509	6.960%	$77,900	22	$0	$0	N	$346,580
5	CC	24844304	ROMERO BAREÑO JOSE NICOR											X							23830 1	30	$1,827,381	$292,480	EPS005	30	$1,827,381	$73,100	CCFV9	30	$1,827,381	$73,100	14-23	30	$1,827,381	6.960%	$127,200	30	$0	$0	N	$565,880
6	CC	24811206	VARGAS JOSE EDWIN																		23830 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCFV9	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,800	$104,000			$2,600,800	$104,000			$2,600,800		$133,600				$0	$0		$637,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,800	$104,000			$2,600,800	$104,000			$2,600,800		$133,600				$0	$0		$637,600
7	CC	47454168	BARRERA ALFONSO MARIA JENNY																		23830 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCFV9	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	N	$318,800
8	CC	1116560328	BARRERA TARACHE MARTIN LUCERO																		23830 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCFV9	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	N	$318,800
Centro de Trabajo: YOPAL 0.00 (129 Afiliados)																							$174,310,474	$27,804,208			$184,469,262	$7,291,400			$180,969,894	$7,150,900			$184,469,262		$12,127,180				$0	$0		$54,523,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (129 Afiliados)																							$174,310,474	$27,804,208			$184,469,262	$7,291,400			$180,969,894	$7,150,900			$184,469,262		$12,127,180				$0	$0		$54,523,600
9	CC	1055233185	AGUIRA GOMEZ CINDY PATRICIA											X							23830 1	30	$1,901,381	$304,300	EPS037	30	$1,901,381	$76,100	CCFV9	30	$1,901,381	$76,100	14-23	30	$1,901,381	6.960%	$132,400	30	$0	$0	N	$588,900
10	CC	24849563	AGUDELO MORENO PALLARCY											X							23830 1	30	$1,665,491	$266,500	EPS037	30	$1,665,491	$66,700	CCFV9	30	$1,665,491	$66,700	14-23	30	$1,665,491	6.960%	$116,000	30	$0	$0	N	$515,900
11	CC	24859382	AGUIRRE DIAZ JAVIER ANTONIO																		15-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCFV9	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
12	CC	47460746	ALARCON ELSY MERCEDES																		23830 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCFV9	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
13	CC	9430098	ALFONSO GONZALEZ HANDY																	X	23600 1	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCFV9	3	$130,000	$5,200	14-23	3	$130,000	0.000%	$0	3	$0	$0	N	$31,200
14	CC	9430098	ALFONSO GONZALEZ HANDY											X							23600 1	27	$1,432,103	$229,100	EPS005	27	$1,432,103	$57,300	CCFV9	27	$1,432,103	$57,300	14-23	27	$1,432,100	6.960%	$99,700	27	$0	$0	N	$443,300
15	CC	1120787	ARIZA MURCIA DAGOBERTO																		23830 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCFV9	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
16	CC	1024589761	ARIZA COLINA CARLOS YOBNEY											X							23830 1	30	$1,565,737	$250,600	EPSC25	30	$1,565,737	$62,700	CCFV9	30	$1,565,737	$62,700	14-23	30	$1,565,737	6.960%	$109,000	30	$0	$0	N	$485,000
17	CC	9430997	BARRERA BARRETO JORGE ENRIQUE		X															X	23600 1	3	$130,000	$19,600	EPS041	3	$130,000	$5,200	CCFV9	3	$127,222	$5,000	14-23	3	$130,000	6.960%	$9,100	3	$0	$0	N	$40,600
18	CC	1007387078	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA																		23830 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCFV9	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	N	$449,000
19	CC	47460878	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS																		23830 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCFV9	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	N	$495,400
20	CC	1007367067	BERNAL GODOY YILVER FABIAN																		23830 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCFV9	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	N	$449,000
21	CC	24844518	BONILLA RODRIGUEZ JOSE ALBEIRO																		23830 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCFV9	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
22	CC	1006490953	BURGOS MENDIVELSO ROBERT ESTEBAN																	X	23830 1	2	$86,667	$13,900	EPSC25	2	$86,667	$0	CCFV9	2	$84,667	$0	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	N	$26,500
23	CC	1006490953	BURGOS MENDIVELSO ROBERT ESTEBAN											X							23830 1	28	$1,211,342	$209,900	EPSC25	28	$1,211,342	$50,500	CCFV9	28	$1,211,342	$50,500	14-23	28	$1,211,342	6.960%	$91,100	28	$0	$0	N	$406,200

| | | |

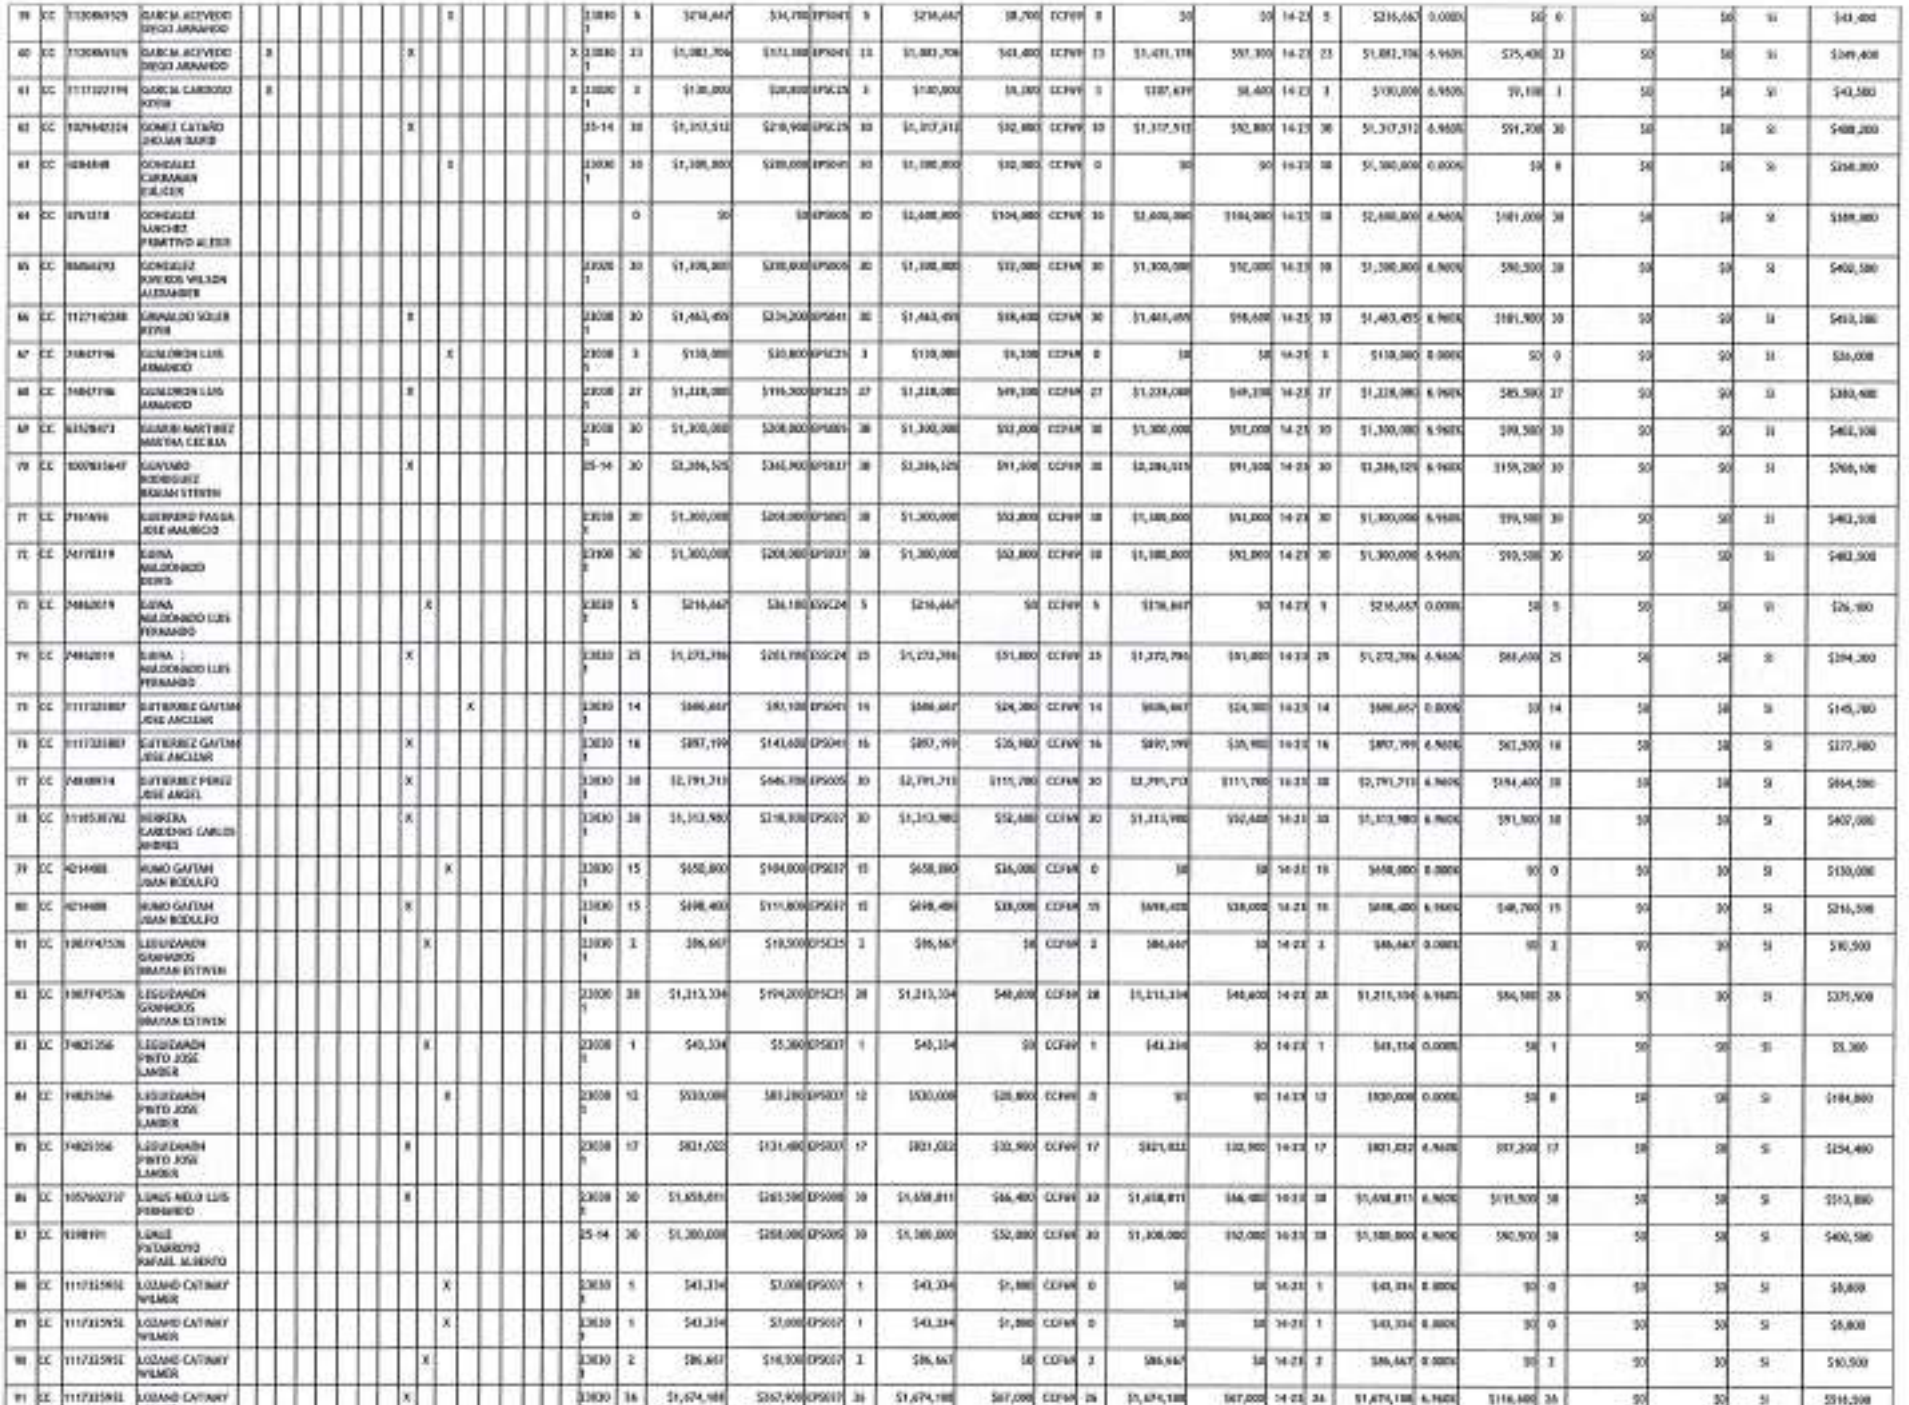

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 840068840	8	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 H 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	94712068 42	94712068 42	E	2024/08/12	2024/08/14	BANCO DE BOGOTA	2	$97,630,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				131	$29,451,000	$44,000	$0	$29,495,000
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	5	$1,345,300	$2,100	$0	$1,347,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	$4,533,100	$6,800	$0	$4,539,900
PORVENIR	23I301	800,224,808	8	97	$21,975,000	$32,700	$0	$22,007,700
PROTECCION	23I201	800,229,739	0	8	$1,597,600	$2,400	$0	$1,600,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				137	$12,824,000	$19,100	$0	$12,843,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	137	$12,824,000	$19,100	$0	$12,843,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				137	$7,567,500	$11,300	$0	$7,578,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	137	$7,567,500	$11,300	$0	$7,578,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				137	$7,701,900	$11,900	$0	$7,713,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,000	$100	$0	$52,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	37	$1,831,200	$2,800	$0	$1,834,000
COMFENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$66,400	$100	$0	$66,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$155,000	$300	$0	$155,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$22,600	$100	$0	$22,700
FOSYGA	WI4001	901,037,916	1	2	$128,200	$200	$0	$128,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	WI4002	901,037,916	1	2	$104,000	$200	$0	$104,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	36	$2,153,100	$3,300	$0	$2,156,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	22	$1,265,800	$1,900	$0	$1,267,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	32	$1,923,600	$2,900	$0	$1,926,500
TOTAL				137	$57,544,400	$86,300	$0	$97,630,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 846804840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 H 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6337178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	9472158889	9472158889	E	2024/09/10	2024/09/16	BANCO DE BOGOTA	6	$51,229,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL										Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (130 Afiliados)																												$160,439,097	$20,372,900			$175,907,867	$6,934,100			$178,324,547	$7,017,100			$171,907,867		$11,679,700		$0	$0		$52,003,800
Centro de Trabajo: OROCUÉ 6.96 (4 Afiliados)																												$4,443,080	$304,300			$5,863,191	$227,800			$6,191,687	$141,000			$5,863,191		$396,300		$0	$0		$1,069,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)																												$4,443,080	$304,300			$5,863,191	$227,800			$6,191,687	$141,000			$5,863,191		$396,300		$0	$0		$1,069,300
1	CC	9430766	PUENTES CACERES RONALDO																								8		$0	$0	6984001	30	$1,408,109	$66,900	CCF69	30	$1,408,109	$66,900	14-23	30	$1,408,109	6.960%	$98,000	30	$0	$0	SI	$232,700
2	CC	1118516258	JUNCOS JHON ROBINSON																								8	23108	30	$1,846,848	$251,300	EPS009	30	$1,846,848	$73,900	CCF69	30	$1,846,848	$73,900	14-23	30	$1,846,848	6.960%	$128,600	30	$0	$0	N	$571,900
3	CC	74864394	ROMERO BARRIO JOSE NACOR																								8	23008	3	$86,667	$10,300	EPS005	3	$86,667	$0	CCF69	3	$86,667	$0	14-23	3	$86,667	0.000%	$0	3	$0	$0	N	$10,300
4	CC	74864394	ROMERO BARRIO JOSE NACOR		X																						8	23008	28	$1,383,899	$231,300	EPS005	28	$1,382,899	$55,400	CCF69	28	$1,511,593	$60,500	14-23	28	$1,382,899	6.960%	$96,200	28	$0	$0	N	$433,900
5	CC	74811286	VARGAS JOSE LUDEN																								8	23008	1	$43,334	$5,300	EPS037	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	N	$5,300
6	CC	74871286	VARGAS JOSE LUDEN																								8	23008	1	$43,334	$5,300	EPS037	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	N	$5,300
7	CC	74871286	VARGAS JOSE LUDEN		X																						8	23008	24	$1,040,000	$144,400	EPS037	24	$1,040,000	$41,600	CCF69	24	$1,243,212	$49,700	14-23	24	$1,040,000	6.960%	$72,400	24	$0	$0	N	$330,100
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (2 Afiliados)																												$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																												$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
8	CC	47430168	BARRERA ALFONSO MARIA DIGNY																									23008	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	N	$318,800
9	CC	1118550328	BARRERA TARACHE MARTHA LUCERO																									23008	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	N	$318,800
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (130 Afiliados)																												$158,166,415	$25,252,600			$167,444,676	$6,642,300			$168,130,794	$6,472,300			$167,044,676		$11,233,900		$0	$0		$49,193,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (130 Afiliados)																												$158,166,415	$25,252,600			$167,444,676	$6,642,300			$168,130,794	$6,472,300			$167,044,676		$11,233,900		$0	$0		$49,193,300
10	CC	1090171189	ACUÑA GOMEZ CINDY PATRICIA		X																						8	23008	1	$43,334	$5,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF69	1	$181,814	$8,300	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	N	$20,200
11	CC	74869383	AGUDELO MORENO FALLARCY																								8	23008	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF69	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	N	$156,000
12	CC	74869383	AGUDELO MORENO FALLARCY																								8	23008	15	$708,522	$113,300	EPS037	15	$708,522	$28,300	CCF69	15	$708,522	$28,300	14-23	15	$708,522	6.960%	$49,200	15	$0	$0	N	$218,900
13	CC	74891382	AGUIRRE DIAZ JAVIER ANTONIO																								8	29-14	30	$1,310,598	$209,700	EPS005	30	$1,310,598	$52,300	CCF69	30	$1,310,598	$52,500	14-23	30	$1,310,598	6.960%	$91,200	30	$0	$0	N	$406,800
14	CC	61940746	ALARCON ELSY MERCEDES																								X	23008	8	$346,667	$55,300	EPS034	8	$346,667	$13,900	CCF69	8	$0	$0	14-23	8	$346,667	0.000%	$0	8	$0	$0	N	$69,400
15	CC	61940746	ALARCON ELSY MERCEDES		X																						8	23008	22	$967,464	$154,800	EPS034	22	$967,464	$38,700	CCF69	22	$1,367,186	$58,700	14-23	22	$967,464	6.960%	$67,400	22	$0	$0	N	$317,600
16	CC	9438198	ALFONSO GONZALEZ HARDY																								8	23108	30	$1,427,174	$228,400	EPS001	30	$1,427,174	$57,100	CCF69	30	$1,427,174	$57,100	14-23	30	$1,427,174	6.960%	$99,400	30	$0	$0	N	$442,000
17	CC	11283787	AREA MURCIA DAGOBERTO																								8	23008	30	$1,402,446	$224,400	EPS034	30	$1,402,446	$56,100	CCF69	30	$1,402,446	$56,100	14-23	30	$1,402,446	6.960%	$97,700	30	$0	$0	N	$434,300
18	CC	1006489361	AVILA COLINA CARLOS YORDEY																								8	23108	30	$1,469,565	$235,200	EPS023	30	$1,469,565	$58,800	CCF69	30	$1,469,565	$58,800	14-23	30	$1,469,565	6.960%	$102,300	30	$0	$0	N	$455,100
19	CC	1081387019	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA																									23008	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	N	$449,000
20	CC	6744087B	BERNAL ALFONSO MARIA JORIS																									23008	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	N	$495,400
21	CC	1083767067	BERNAL GODOY YILVER FABIAN																									23008	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	N	$449,000
22	CC	74845955	BONILLA RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ALIRIO																									23008	30	$1,300,000	$208,000	EPS025	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	N	$402,500
23	CC	1084458193	BURGOS JHONOVEL SO RONEY ESTIVEN																								8	23008	2	$86,667	$10,300	EPS025	2	$86,667	$0	CCF69	2	$56,567	$0	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	N	$10,300

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844804840	8	SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 33 # 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6317178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	9405142295	9405142295	E	2024/10/09	2024/10/09	BANCO DE BOGOTA	0	$49,049,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: YOPAL (129 Afiliados)					$136,136,755	$14,917,300			$140,442,378	$6,554,200			$138,808,777	$5,408,900			$140,442,378	$10,965,833		$0	$0
Centro de Trabajo: GRODUÉ 6.98 (3 Afiliados)					$4,117,139	$457,300			$4,117,139	$163,100			$4,117,139	$163,100			$4,117,139	$283,700		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)					$4,117,139	$457,300			$4,117,139	$163,100			$4,117,139	$163,100			$4,117,139	$283,700		$0	$0
1	CC	9438766	FUENTES BONILLO	23030	1	$43,334	$5,300	ARB001	1	$43,334	$0	CCF01	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
2	CC	9438766	FUENTES BONILLO	23030	29	$1,277,862	$284,300	ARB001	29	$1,277,862	$55,200	CCF01	29	$1,277,862	$55,200	14-23	29	$1,277,862	$89,000	29	$0	$0
3	CC	9006489348	HERNANDEZ JOSE	23030	28	$1,234,538	$267,600	EPS005	28	$1,234,538	$48,400	CCF01	28	$1,234,538	$48,400	14-23	28	$1,234,538	$86,000	28	$0	$0
4	CC	1118534338	RINCON JHON	23030	30	$1,561,413	$249,900	EPS005	30	$1,561,413	$62,500	CCF01	30	$1,561,413	$62,500	14-23	30	$1,561,413	$108,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 8.522 (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,000		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,000		$0	$0
5	CC	47436168	BARRERA MARIA	23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,500	30	$0	$0
6	CC	1118168328	BARRERA MARTHA	23-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (124 Afiliados)					$149,418,916	$23,848,800			$150,735,439	$6,287,100			$159,883,638	$6,342,400			$158,725,439	$10,667,900		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (124 Afiliados)					$149,418,916	$23,848,800			$150,735,439	$6,287,100			$159,883,638	$6,342,400			$158,725,439	$10,667,900		$0	$0
7	CC	24849583	AGUDELO FALLARET	23030	22	$993,334	$159,600	EPS037	22	$993,334	$38,100	CCF01	22	$993,334	$38,100	14-23	22	$993,334	$0	22	$0	$0
8	CC	24849583	AGUDELO FALLARET	23030	8	$361,732	$56,600	EPS037	8	$361,732	$14,100	CCF01	8	$361,732	$14,100	14-23	8	$361,732	$24,700	8	$0	$0
9	CC	3489982	AGUDELO JAVIER	23-14	30	$1,342,391	$214,800	EPS005	30	$1,342,391	$52,700	CCF01	30	$1,342,391	$52,700	14-23	30	$1,342,391	$83,900	30	$0	$0
10	CC	9420958	ALTENSO RABOT	23030	30	$1,338,260	$212,600	EPS005	30	$1,338,260	$52,100	CCF01	30	$1,338,260	$52,100	14-23	30	$1,338,260	$82,500	30	$0	$0
11	CC	11002787	ARIZA DAGOBERTO	23030	30	$1,430,109	$227,100	EPS034	30	$1,430,109	$56,900	CCF01	30	$1,430,109	$56,900	14-23	30	$1,430,109	$89,900	30	$0	$0
12	CC	1086489561	AVILA EMILIO	23030	1	$86,667	$10,600	EPS025	1	$86,667	$0	CCF01	1	$86,667	$0	14-23	1	$86,667	$0	1	$0	$0
13	CC	1086489561	AVILA CARLOS	23030	28	$1,248,660	$199,800	EPS025	28	$1,248,660	$48,000	CCF01	28	$1,248,660	$48,000	14-23	28	$1,248,660	$87,600	28	$0	$0
14	CC	1087183019	BARRERA PAULA	23030	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$56,000	CCF01	30	$1,450,000	$56,000	14-23	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0
15	CC	7486949	BAYONA BENY	23030	14	$620,797	$99,400	EPS005	14	$620,797	$24,900	CCF01	14	$620,797	$24,900	14-23	14	$620,797	$43,300	14	$0	$0
16	CC	47440878	BERNAL MARIA	23030	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF01	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
17	CC	1087707867	BERNAL OLIVER	23030	28	$1,450,000	$232,000	EPS005	28	$1,450,000	$58,000	CCF01	28	$1,450,000	$58,000	14-23	28	$1,450,000	$101,000	28	$0	$0
18	CC	3484938	BONORQUEZ JOSE	23030	8	$346,667	$55,500	EPS025	8	$346,667	$13,900	CCF01	8	$369,119	$20,100	14-23	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
19	CC	1118560461	CARDENAS JAIRO	23030	4	$173,334	$27,800	EPS005	4	$173,334	$7,000	CCF01	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
20	CC	1084499924	CASTILLO JHAN	23030	28	$1,363,587	$218,300	EPS005	28	$1,363,587	$54,600	CCF01	28	$1,363,587	$54,600	14-23	28	$1,363,587	$95,800	28	$0	$0
21	CC	74052542	CASTILLO JOSE	23030	28	$1,300,000	$208,000	EPS025	28	$1,300,000	$52,000	CCF01	28	$1,300,000	$52,000	14-23	28	$1,300,000	$90,500	28	$0	$0
22	CC	1118571749	CASTILLO YHAN	23030	7	$303,334	$36,300	EPS037	7	$303,334	$0	CCF01	7	$303,334	$0	14-23	7	$303,334	$0	7	$0	$0
23	CC	1118571749	CASTILLO YHAN	23030	15	$664,130	$106,300	EPS037	15	$664,130	$26,600	CCF01	15	$738,118	$29,600	14-23	15	$664,130	$46,300	15	$0	$0
24	CC	1007814262	CASTRO CRISTHIAN	23-14	28	$1,478,261	$236,600	EPS025	28	$1,478,261	$58,100	CCF01	28	$1,478,261	$58,100	14-23	28	$1,478,261	$103,000	28	$0	$0
25	CC	1118536153	CASILLO ALEXIS	23030	30	$1,342,391	$214,800	EPS037	30	$1,342,391	$52,700	CCF01	30	$1,342,391	$52,700	14-23	30	$1,342,391	$83,900	30	$0	$0
26	CC	1075641899	CASILLO YOJAN	23-14	28	$1,363,587	$218,200	EPS025	28	$1,363,587	$54,600	CCF01	28	$1,363,587	$54,600	14-23	28	$1,363,587	$95,800	28	$0	$0
27	CC	1117312843	CHALA ERNESTO	23030	30	$1,328,261	$212,600	EPS041	30	$1,328,261	$52,100	CCF01	30	$1,328,261	$52,100	14-23	30	$1,328,261	$82,500	30	$0	$0
28	CC	1075641722	CHAVEZ CRISTIAN	23030	1	$86,667	$10,600	EPS041	1	$86,667	$0	CCF01	1	$86,667	$0	14-23	1	$86,667	$0	1	$0	$0
29	CC	1075641722	CHAVEZ CRISTIAN	23030	28	$1,263,791	$202,100	EPS041	28	$1,263,791	$50,600	CCF01	28	$1,263,791	$50,600	14-23	28	$1,263,791	$87,600	28	$0	$0
30	CC	74778901	CISNEROS CIRO	23030	2	$86,667	$10,300	EPS037	2	$86,667	$0	CCF01	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	$0	2	$0	$0
31	CC	74778901	CISNEROS CIRO	23030	28	$1,234,538	$197,600	EPS037	28	$1,234,538	$48,400	CCF01	28	$1,234,538	$48,400	14-23	28	$1,234,538	$86,000	28	$0	$0
32	CC	1007540868	COTE CRISTIAN	23-14	30	$1,328,261	$212,600	EPS005	30	$1,328,261	$52,100	CCF01	30	$1,328,261	$52,100	14-23	30	$1,328,261	$82,500	30	$0	$0
33	CC	9415197	CRUZ MIGUEL	23030	30	$1,300,000	$208,000	AHO001	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$80,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
34	CC 1198559064	DALGARO STELLA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
35	CC 1136518058	DUQUE NELSON	230301	5	$216,667	$34,700	EPSC15	5	$216,667	$8,700	CCF01	5	$870,699	$34,700	14-13	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
36	CC 1082859819	ESCALANTE ALBEIRO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS040	1	$43,334	$1,800	CCF01	0	$0	$0	14-13	1	$43,334	$0	0	$0	$0
37	CC 1082859819	ESCALANTE ALBEIRO	230301	29	$1,302,591	$208,500	EPS040	29	$1,302,591	$52,200	CCF01	29	$1,302,591	$52,200	14-13	29	$1,302,591	$90,500	29	$0	$0
38	CC 1118555788	ESTUPIÑAN ANGY	230301	2	$86,667	$13,900	EPSC15	2	$86,667	$3,500	CCF01	0	$0	$0	14-13	2	$86,667	$0	0	$0	$0
39	CC 1118555788	ESTUPIÑAN ANGY	230301	28	$1,234,530	$197,600	EPSC15	28	$1,234,530	$49,400	CCF01	28	$1,234,530	$49,400	14-13	28	$1,234,530	$86,800	28	$0	$0
40	CC 1118555814	ESTUPIÑAN RUBEN	230301	6	$260,000	$36,200	EPS037	6	$260,000	$0	CCF01	6	$26,000	$0	14-13	6	$260,000	$0	6	$0	$0
41	CC 1118555814	ESTUPIÑAN RUBEN	230301	24	$1,014,130	$168,780	EPS037	24	$1,014,130	$40,200	CCF01	14	$1,014,130	$40,200	14-13	24	$1,014,130	$73,400	24	$0	$0
42	CC 24847387	FARFAN ANGEL	230301	16	$753,388	$118,680	EPSC25	16	$753,388	$30,100	CCF01	16	$993,865	$38,900	14-13	16	$753,388	$52,500	16	$0	$0
43	CC 1802370483	FONSECA CARLO	230301	1	$43,334	$7,000	EPSC25	1	$43,334	$1,800	CCF01	0	$0	$0	14-13	1	$43,334	$0	0	$0	$0
44	CC 1802370483	FONSECA CARLO	230301	29	$1,284,927	$205,600	EPSC25	29	$1,284,927	$51,400	CCF01	29	$1,284,927	$51,400	14-13	29	$1,284,927	$89,500	29	$0	$0
45	CC 1026433896	FONTECHA JANETH	25-14	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF01	15	$798,066	$32,000	14-13	15	$650,000	$45,200	15	$0	$0
46	CC 5860485	GAITAN GERMAN	25-14	28	$1,300,000	$208,000	EPS002	28	$1,300,000	$52,000	CCF01	28	$1,300,000	$52,000	14-13	28	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
47	CC 7631199	GALAN BOLIVAR	230301	28	$1,613,696	$258,200	EPS037	28	$1,613,696	$64,600	CCF01	30	$1,613,696	$64,600	14-13	28	$1,613,696	$112,400	30	$0	$0
48	CC 1111206634	GARCIA BRAYAN	230301	15	$664,130	$106,300	EPS005	15	$664,130	$26,600	CCF01	15	$1,119,130	$44,800	14-13	15	$664,130	$46,300	15	$0	$0
49	CC 1002233912	GOMEZ DARLY	230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF01	7	$303,334	$12,200	14-13	7	$303,334	$21,100	7	$0	$0
50	CC 1029643224	GOMEZ JHOJAN	25-14	5	$216,667	$34,700	EPSC25	5	$216,667	$8,700	CCF01	0	$0	$0	14-13	5	$216,667	$0	0	$0	$0
51	CC 1029643224	GOMEZ JHOJAN	25-14	25	$1,319,312	$211,100	EPSC15	25	$1,319,312	$52,800	CCF01	29	$1,319,312	$52,800	14-13	25	$1,319,312	$91,900	25	$0	$0
52	CC 4184648	GONZALEZ EULICER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
53	CC 4761218	GONZALEZ HIMETIVO		0	$0	$0	EPS009	30	$2,600,000	$104,000	CCF01	30	$2,600,000	$104,000	14-13	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
54	CC 8696282	GONZALEZ WILSON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS009	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
55	CC 1127142388	GRANADO KEVIN	230301	30	$1,356,522	$217,100	EPS041	30	$1,356,522	$54,300	CCF01	30	$1,356,522	$54,300	14-13	30	$1,356,522	$94,500	30	$0	$0
56	CC 24847746	GUALDRON LUIS	230301	3	$130,000	$20,800	EPSC25	3	$130,000	$5,200	CCF01	3	$130,000	$5,200	14-13	3	$130,000	$0	3	$0	$0
57	CC 24847746	GUALDRON LUIS	230301	13	$570,399	$91,300	EPSC25	13	$570,399	$22,900	CCF01	13	$826,788	$33,100	14-13	13	$570,399	$39,700	13	$0	$0
58	CC 63528473	GUARIN MARTHA	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF01	0	$0	$0	14-13	1	$43,334	$0	0	$0	$0
59	CC 63528473	GUARIN MARTHA	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF01	29	$1,256,667	$50,300	14-13	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
60	CC 1007815647	GUEVARA BRAYAN	25-14	30	$1,495,217	$239,100	EPS037	30	$1,495,217	$59,800	CCF01	30	$1,495,217	$59,800	14-13	30	$1,495,217	$102,700	30	$0	$0
61	CC 7161896	GUERRERO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-13	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
62	CC 24778319	GUINA DEIVIS	230301	30	$1,328,261	$212,500	EPS037	30	$1,328,261	$53,200	CCF01	30	$1,328,261	$53,200	14-13	30	$1,328,261	$92,500	30	$0	$0
63	CC 24862819	GUINA LUIS	230301	28	$1,518,315	$240,000	EPSC24	28	$1,518,315	$60,800	CCF01	30	$1,518,315	$60,800	14-13	30	$1,518,315	$105,700	30	$0	$0
64	CC 1117525887	GUTIERREZ JOSE	230301	1	$43,334	$1,300	EPS041	1	$43,334	$0	CCF01	1	$43,334	$0	14-13	1	$43,334	$0	1	$0	$0
65	CC 1117525887	GUTIERREZ JOSE	230301	29	$1,277,862	$204,500	EPS005	29	$1,277,862	$51,200	CCF01	29	$1,277,862	$51,200	14-13	29	$1,277,862	$89,000	29	$0	$0
66	CC 7686974	GUTIERREZ JOSE	230301	30	$1,598,152	$255,800	EPS005	30	$1,598,152	$64,000	CCF01	30	$1,598,152	$64,000	14-13	30	$1,598,152	$111,300	30	$0	$0
67	CC 1118536782	HERRERA CARLOS	230301	30	$1,328,261	$212,500	EPS037	30	$1,328,261	$53,200	CCF01	30	$1,328,261	$53,200	14-13	30	$1,328,261	$92,500	30	$0	$0
68	CC 4614488	HUMO JUAN	230301	30	$1,328,261	$212,500	EPS037	30	$1,328,261	$53,200	CCF01	30	$1,328,261	$53,200	14-13	30	$1,328,261	$92,500	30	$0	$0
69	CC 1007147558	LIZARAZO BRAYAN	230301	30	$1,598,707	$255,800	EPSC25	30	$1,690,707	$67,700	CCF01	30	$1,690,707	$67,700	14-13	30	$1,690,707	$117,700	30	$0	$0
70	CC 7683096	LIZARAZO JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	0	$0	$0	14-13	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0
71	CC 1057602737	LOAIS LUIS	230301	30	$1,627,130	$260,400	EPS005	30	$1,627,130	$65,100	CCF01	30	$1,627,130	$65,100	14-13	30	$1,627,130	$113,300	30	$0	$0
72	CC 5098191	LOAIZA RAFAEL	25-14	30	$1,328,261	$212,500	EPS005	30	$1,328,261	$53,200	CCF01	30	$1,328,261	$53,200	14-13	30	$1,328,261	$92,500	30	$0	$0
73	CC 1119868868	LOZANO JORGE	230301	30	$1,557,880	$249,200	EPSC25	30	$1,557,880	$62,400	CCF01	30	$1,557,880	$62,400	14-13	30	$1,557,880	$108,500	30	$0	$0
74	CC 1127722137	MACO JOSE	230301	4	$173,334	$28,000	EPS041	4	$173,334	$0	CCF01	4	$173,334	$0	14-13	4	$173,334	$0	4	$0	$0
75	CC 1127722137	MACO JOSE	230301	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$0	CCF01	2	$86,667	$0	14-13	2	$86,667	$0	2	$0	$0
76	CC 1127722137	MACO JOSE	230301	24	$1,188,570	$190,200	EPS041	24	$1,188,570	$47,600	CCF01	24	$1,551,287	$61,900	14-13	24	$1,188,570	$82,800	24	$0	$0
77	CC 1118561713	MENDIVELSO DAYNA	230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF01	1	$669,064	$26,400	14-13	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
78	CC 1017656406	MERCHAN JUAN	230301	30	$1,349,457	$216,000	EPS002	30	$1,349,457	$54,000	CCF01	30	$1,349,457	$54,000	14-13	30	$1,349,457	$94,000	30	$0	$0
79	CC 1118560350	MUAREZ FERNANDO	230301	12	$537,065	$84,400	EPS037	12	$537,065	$21,500	CCF01	12	$537,759	$22,400	14-13	12	$537,065	$36,300	12	$0	$0
80	CC 1118560350	MUAREZ FERNANDO	230301	1	$43,334	$1,300	EPS037	1	$43,334	$0	CCF01	1	$43,334	$0	14-13	1	$43,334	$0	1	$0	$0
81	CC 1118029845	MILLAN WILSON	230301	28	$1,395,380	$223,300	EPS037	28	$1,395,380	$55,900	CCF01	28	$1,395,380	$55,900	14-13	28	$1,395,380	$97,200	28	$0	$0
82	CC 47407363	MOLINA EDILIA	230301	30	$1,328,261	$212,500	EPS037	30	$1,328,261	$53,200	CCF01	30	$1,328,261	$53,200	14-13	30	$1,328,261	$92,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
83	CC 24866468	MONTAÑEZ ORLANDO	230201	30	$1,342,391	$214,800	EPS041	30	$1,342,391	$53,700	CCF41	30	$1,342,391	$53,700	14-23	30	$1,342,391	$93,500	30	$0	$0
84	CC 1006790059	MORA CRISTIAN	230301	30	$1,335,326	$213,700	EPS037	30	$1,335,326	$53,500	CCF41	30	$1,335,326	$53,500	14-23	30	$1,335,326	$93,000	30	$0	$0
85	CC 4158419	MORENO HERNANDO	25-14	30	$1,328,261	$212,480	EPSC25	30	$1,328,261	$53,200	CCF41	30	$1,328,261	$53,200	14-23	30	$1,328,261	$92,500	30	$0	$0
86	CC 1006490758	MOTTA CESAR	230301	30	$1,466,033	$234,580	EPSC25	30	$1,466,033	$58,700	CCF41	30	$1,466,033	$58,700	14-23	30	$1,466,033	$102,100	30	$0	$0
87	CC 1064271971	NARVAEZ DIEGO	25-14	30	$1,384,783	$221,580	EPSC25	30	$1,384,783	$55,400	CCF41	30	$1,384,783	$55,400	14-23	30	$1,384,783	$96,400	30	$0	$0
88	CC 7657731	NIÑO JORGE	230301	30	$1,483,446	$237,400	EPSC25	30	$1,483,446	$59,300	CCF41	30	$1,483,446	$59,300	14-23	30	$1,483,446	$103,300	30	$0	$0
89	CC 1127381779	NIÑO OBULANER	25-14	30	$1,328,261	$212,500	EPS041	30	$1,328,261	$53,200	CCF41	30	$1,328,261	$53,200	14-23	30	$1,328,261	$92,500	30	$0	$0
90	CC 7469638	NIÑO RODRIGO	230301	30	$1,328,261	$212,600	EPS037	30	$1,328,261	$53,200	CCF41	30	$1,328,261	$53,200	14-23	30	$1,328,261	$92,500	30	$0	$0
91	CC 7654803	NUÑEZ GONZALO	230301	15	$664,130	$106,300	EPS005	15	$664,130	$26,600	CCF41	15	$1,093,391	$43,800	14-23	15	$664,130	$46,300	15	$0	$0
92	CC 7659564	OJEDA FREDY	230301	30	$1,328,261	$212,500	EPS037	30	$1,328,261	$53,200	CCF41	30	$1,328,261	$53,200	14-23	30	$1,328,261	$92,500	30	$0	$0
93	CC 15670400	OLEA WALDETRUDIS	230301	30	$1,328,261	$212,500	EPSC25	30	$1,328,261	$53,200	CCF41	30	$1,328,261	$53,200	14-23	30	$1,328,261	$92,500	30	$0	$0
94	CC 19861379	ORDOÑEZ PEDRO		0	$0	$0	AM080	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
95	CC 1116515344	ORDOÑEZ YENNY	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPSC25	25	$1,083,334	$43,400	CCF41	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
96	CC 1006557607	ORTIZ ALDAIR	230301	30	$1,438,000	$230,000	EPSC25	30	$1,438,000	$57,500	CCF41	30	$1,438,000	$57,500	14-23	30	$1,438,000	$99,600	30	$0	$0
97	CC 19817511	ORTIZ LUIS	230301	30	$1,521,848	$243,500	EPSC25	30	$1,521,848	$60,900	CCF41	30	$1,521,848	$60,900	14-23	30	$1,521,848	$105,000	30	$0	$0
98	CC 88285674	PACHECO EDICT		0	$0	$0	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF41	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	$180,000	30	$0	$0
99	CC 1116809331	PACHECO JOSE	25-14	9	$216,667	$34,700	EPS037	9	$216,667	$8,700	CCF41	9	$0	$0	14-23	9	$216,667	$0	9	$0	$0
100	CC 1116809331	PACHECO JOSE	25-14	25	$1,111,595	$177,900	EPS037	25	$1,111,595	$44,500	CCF41	25	$1,111,595	$44,500	14-23	25	$1,111,595	$77,400	25	$0	$0
101	CC 34858284	PADILLA JOSE	230301	20	$914,718	$146,400	EPS037	20	$914,718	$36,600	CCF41	20	$914,718	$36,600	14-23	20	$914,718	$63,300	20	$0	$0
102	CC 34866237	PADILLA WILSON	230201	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF41	10	$433,334	$17,400	14-23	10	$433,334	$0	10	$0	$0
103	CC 34866237	PADILLA WILSON	230201	1	$86,667	$13,900	EPS037	1	$86,667	$3,500	CCF41	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
104	CC 34866237	PADILLA WILSON	230201	19	$787,065	$126,000	EPS037	19	$787,065	$31,500	CCF41	19	$787,065	$31,500	14-23	19	$787,065	$54,600	19	$0	$0
105	CC 34811942	PALACIOS JOSE	25-14	30	$1,490,000	$238,400	EPS041	30	$1,490,000	$59,600	CCF41	30	$1,490,000	$59,600	14-23	30	$1,490,000	$101,800	30	$0	$0
106	CC 1116567309	PARDO CESAR	230201	1	$86,667	$13,900	EPS041	1	$86,667	$0	CCF41	1	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	$0	1	$0	$0
107	CC 1116567309	PARDO CESAR	230201	28	$1,213,334	$194,200	EPS041	28	$1,213,334	$48,600	CCF41	28	$1,224,530	$49,000	14-23	28	$1,213,334	$84,500	28	$0	$0
108	CC 1116545768	PERNIATA JAMES	230301	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF41	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0
109	CC 2994008	PEREZ DIEGO	230301	30	$2,860,500	$457,700	EPS005	30	$2,860,500	$114,500	CCF41	30	$2,860,500	$114,500	14-23	30	$2,860,500	$199,500	30	$0	$0
110	CC 1116510758	PEREZ JUAN	230301	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF41	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$45,500	15	$0	$0
111	CC 47426874	PEREZ LIDA	230301	30	$1,540,217	$246,500	EPS041	30	$1,540,217	$61,700	CCF41	30	$1,540,217	$61,700	14-23	30	$1,540,217	$107,500	30	$0	$0
112	CC 9431532	PEREZ PABLO	230301	6	$260,000	$41,600	EPS005	6	$260,000	$10,400	CCF41	6	$260,000	$10,400	14-23	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
113	CC 7654233	PINZON CARLOS	230301	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF41	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
114	CC 7654233	PINZON CARLOS	230301	28	$1,262,791	$202,100	EPS005	28	$1,262,791	$50,600	CCF41	28	$1,262,791	$50,600	14-23	28	$1,262,791	$87,900	28	$0	$0
115	CC 1081459533	PRINCHEAN JOSE	230301	30	$1,328,261	$212,600	EPS037	30	$1,328,261	$53,200	CCF41	30	$1,328,261	$53,200	14-23	30	$1,328,261	$92,500	30	$0	$0
116	CC 1084839127	QUIMBAYO KAROL	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF41	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
117	CC 1084839127	QUIMBAYO KAROL	230301	27	$1,191,196	$190,600	EPS037	27	$1,191,196	$47,700	CCF41	27	$1,191,196	$47,700	14-23	27	$1,191,196	$83,000	27	$0	$0
118	CC 4545586	QUINTERO FRANCISCO	230301	30	$1,328,261	$212,600	ESSC24	30	$1,328,261	$53,200	CCF41	30	$1,328,261	$53,200	14-23	30	$1,328,261	$92,500	30	$0	$0
119	CC 9865846	RESTREPO ELIAN	230301	30	$1,855,326	$296,900	EPS037	30	$1,855,326	$74,300	CCF41	30	$1,855,326	$74,300	14-23	30	$1,855,326	$129,200	30	$0	$0
120	CC 1037548307	RINCON ANDRES	230301	22	$1,089,856	$160,600	EPSC25	22	$1,089,856	$40,400	CCF41	22	$1,094,717	$43,800	14-23	22	$1,089,856	$76,200	22	$0	$0
121	CC 1123922193	RINCON JUAN	25-14	30	$1,395,380	$223,300	EPSC25	30	$1,395,380	$55,900	CCF41	30	$1,395,380	$55,900	14-23	30	$1,395,380	$97,100	30	$0	$0
122	CC 34849726	RIOS CARLOS	230301	3	$100,000	$16,000	EPS037	3	$100,000	$0	CCF41	3	$100,000	$0	14-23	3	$100,000	$0	3	$0	$0
123	CC 34849726	RIOS CARLOS	230301	27	$1,198,261	$191,800	EPS037	27	$1,198,261	$48,000	CCF41	27	$1,198,261	$48,000	14-23	27	$1,198,261	$83,400	27	$0	$0
124	CC 9658642	RIVEROS LUIS	230301	30	$1,363,587	$218,200	EPS005	30	$1,363,587	$54,600	CCF41	30	$1,365,587	$54,600	14-23	30	$1,363,587	$95,000	30	$0	$0
125	CC 4158771	ROA RAUL	230301	30	$1,328,261	$212,600	EPS037	30	$1,328,261	$53,200	CCF41	30	$1,328,261	$53,200	14-23	30	$1,328,261	$92,500	30	$0	$0
126	CC 1117325603	RODRIGUEZ CRISTIAN	230301	30	$1,342,391	$214,800	EPS041	30	$1,342,391	$53,700	CCF41	30	$1,342,391	$53,700	14-23	30	$1,342,391	$93,500	30	$0	$0
127	CC 7177516	RODRIGUEZ ERWIN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
128	CC 1123940636	RODRIGUEZ JUAN	25-14	30	$1,363,587	$218,200	EPSC25	30	$1,363,587	$54,600	CCF41	30	$1,363,587	$54,600	14-23	30	$1,363,587	$95,000	30	$0	$0
129	CC 47436638	RODRIGUEZ MADELEINE	230301	1	$43,334	$1,300	EPS005	1	$43,334	$0	CCF41	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
130	CC 47436638	RODRIGUEZ MADELEINE	230301	29	$1,284,928	$205,600	EPS005	29	$1,284,928	$51,400	CCF41	29	$1,284,928	$51,400	14-23	29	$1,284,928	$89,500	29	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
131	CC	1087495073	ROJAS MOISES	230301	30	$1,318,261	$212,800	EPS015	30	$1,318,261	$53,200	CCF01	30	$1,318,261	$33,250	14-23	30	$1,318,261	$91,500	30	$0	$0
132	CC	1956156	RUIZ JAIER	230301	4	$173,334	$27,800	EPS017	4	$173,334	$7,000	CCF01	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
133	CC	1118019639	SALAMANCA JULIAN	23-14	1	$86,667	$13,900	EPS005	1	$86,667	$3,500	CCF01	0	$0	$0	14-23	1	$86,667	$0	0	$0	$0
134	CC	1118019639	SALAMANCA JULIAN	25-14	28	$1,126,269	$212,800	EPS005	28	$1,126,269	$53,500	CCF01	28	$1,126,269	$33,250	14-23	28	$1,126,269	$83,100	28	$0	$0
135	CC	9656888	SALCEDO JOSE	230301	30	$1,516,315	$242,700	EPS012	30	$1,516,315	$68,250	CCF01	30	$1,516,315	$60,750	14-23	30	$1,516,315	$105,600	30	$0	$0
136	CC	1756004S	SANCHEZ PATROCINIO	230301	30	$1,342,391	$214,800	EPS005	30	$1,342,391	$60,750	CCF01	30	$1,342,391	$30,750	14-23	30	$1,342,391	$93,900	30	$0	$0
137	CC	1057565548	SACHOQUE VILLAM	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$32,500	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
138	CC	1115812538	SOGAMOSO RAMON	230301	22	$974,538	$156,000	EPS025	22	$974,538	$39,000	CCF01	22	$1,442,309	$37,700	14-23	22	$974,538	$67,900	22	$0	$0
139	CC	1118014991	SOLANO WILSON	230301	20	$944,384	$151,200	EPS041	20	$944,384	$37,800	CCF01	20	$944,384	$37,800	14-23	20	$944,384	$65,800	20	$0	$0
140	CC	74866167	SOLER CARLOS	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$0	CCF01	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	$0	2	$0	$0
141	CC	74866167	SOLER CARLOS	230301	28	$1,262,791	$202,100	EPS037	28	$1,262,791	$50,400	CCF01	28	$1,262,791	$50,400	14-23	28	$1,262,791	$87,500	28	$0	$0
142	PT	1142271	SUAREZ JAIRER	23-14	30	$1,430,707	$229,000	EPS041	30	$1,608,707	$57,300	CCF01	30	$1,608,707	$57,300	14-23	30	$1,430,707	$99,600	30	$0	$0
143	CC	74866119	SUAREZ LUIS	230301	15	$664,130	$106,300	EPS037	15	$664,130	$26,600	CCF01	15	$748,991	$30,000	14-23	15	$664,130	$46,300	15	$0	$0
144	CC	74868946	TAY BALTAZAR	230301	27	$1,205,326	$192,900	EPS005	27	$1,205,326	$48,300	CCF01	27	$1,205,326	$48,300	14-23	27	$1,205,326	$83,900	27	$0	$0
145	CC	74868946	TAY BALTAZAR	230301	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF01	0	$130,000	$5,200	14-23	3	$130,000	$0	3	$0	$0
146	CC	1116749983	TOLEDO JOSE	230301	30	$1,487,228	$238,000	EPS037	30	$1,487,228	$59,500	CCF01	30	$1,487,228	$59,500	14-23	30	$1,487,228	$103,600	30	$0	$0
147	CC	4067892	TORRES ENRIQUE		0	$0	$0	EPS025	30	$1,318,261	$52,700	CCF01	30	$1,318,261	$52,700	14-23	30	$1,318,261	$92,300	30	$0	$0
148	CC	1118545446	TORRES JUAN	230301	30	$1,380,000	$208,000	EPS005	30	$1,600,000	$52,000	CCF01	30	$1,600,000	$52,000	14-23	30	$1,380,000	$96,500	30	$0	$0
149	CC	23914157	TRUJILLO Aurea	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF01	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
150	CC	1121914277	UTIMA JESUS	23-14	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF01	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
151	CC	1121914277	UTIMA JESUS	25-14	29	$1,284,928	$205,600	EPS037	29	$1,284,928	$51,400	CCF01	29	$1,284,928	$51,400	14-23	29	$1,284,928	$89,500	29	$0	$0
152	CC	13486168	VARGAS DIONO		0	$0	$0	EPS005	1	$48,334	$0	CCF01	1	$48,334	$0	14-23	1	$48,334	$0	1	$0	$0
153	CC	13486168	VARGAS DIONO		0	$0	$0	EPS005	29	$1,429,928	$57,200	CCF01	29	$1,429,928	$57,200	14-23	29	$1,429,928	$99,600	29	$0	$0
154	CC	1116545786	VARGAS JOSE	230301	30	$1,771,250	$283,400	EPS044	30	$1,771,250	$70,900	CCF01	30	$1,771,250	$70,900	14-23	30	$1,771,250	$123,300	30	$0	$0
155	CC	1118962872	VARGAS WILMER	230301	28	$1,328,261	$212,600	EPS025	30	$1,318,261	$53,200	CCF01	30	$1,318,261	$53,200	14-23	30	$1,328,261	$92,500	30	$0	$0
156	CC	1116577885	VASQUEZ ISMAEL	23-14	30	$1,399,300	$223,100	EPS029	30	$1,399,300	$55,900	CCF01	30	$1,399,300	$55,900	14-23	30	$1,399,300	$97,300	30	$0	$0
157	CC	1149198	VILLAMIZAR OMAR	230301	30	$1,310,596	$209,700	EPS003	30	$1,310,596	$52,500	CCF01	30	$1,310,596	$52,500	14-23	30	$1,310,596	$91,100	30	$0	$0
158	CC	1806730294	WILCHES MARY	23-14	30	$1,328,261	$212,600	EPS041	30	$1,318,261	$53,200	CCF01	30	$1,318,261	$53,200	14-23	30	$1,328,261	$92,300	30	$0	$0
159	CC	9650229	ZAMUDIO MARTIN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS009	30	$1,300,000	$52,000	CCF01	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(129)**			**$156,136,055**	**$24,921,300**			**$165,443,578**	**$6,554,200**			**$166,600,777**	**$6,609,500**			**$165,443,578**	**$10,966,893**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9005[illegible]	0	SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	8 - APORTANTE DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 H 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	947514295	947514295	E	2024/10/09	2024/10/09	BANCO DE BOGOTA	0	$49,049,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				124	$24,921,300	$0	$0	$24,921,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,343,100	$0	$0	$1,343,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	$5,150,900	$0	$0	$5,150,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	86	$16,654,300	$0	$0	$16,654,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,773,000	$0	$0	$1,773,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				129	$10,964,800	$0	$0	$10,964,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	129	$10,964,800	$0	$0	$10,964,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				129	$6,609,500	$0	$0	$6,609,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	129	$6,609,500	$0	$0	$6,609,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				129	$6,554,200	$0	$0	$6,554,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$56,900	$0	$0	$56,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	29	$1,432,700	$0	$0	$1,432,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$65,100	$0	$0	$65,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$114,000	$0	$0	$114,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$53,200	$0	$0	$53,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$103,200	$0	$0	$103,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	36	$1,724,900	$0	$0	$1,724,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	19	$964,800	$0	$0	$964,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	37	$1,987,400	$0	$0	$1,987,400
TOTAL				129	$49,049,800	$0	$0	$49,049,800

2024/10/10 02:54 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 H 28 - 48	YOPAL-CASANARE	6327178	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	9477173437	9477173437	E	2024/11/13	2024/11/13	BANCO DE BOGOTA	0	$90,335,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	inc	eds	avp	vct	vlr	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (134 Afiliados)																							$162,193,200	$23,990,300			$172,398,500	$6,031,900			$174,871,900	$6,713,800			$172,054,100		$11,199,800			$0	$0		$90,935,100
Centro de Trabajo: OROCUÉ 6.96 (3 Afiliados)																							$3,253,769	$130,900			$3,253,769	$130,900			$3,824,600	$140,900			$3,253,769		$226,500			$0	$0		$1,018,700
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																							$3,253,769	$130,900			$3,253,769	$130,900			$3,824,600	$140,900			$3,253,769		$226,500			$0	$0		$1,018,700
1	CC	9438716	FUENTES CACERES RONALDO							X											23030 1	30	$1,351,569	$216,300	6-8081	30	$1,351,569	$54,100	CCF69	30	$1,351,569	$54,100	14-23	30	$1,351,569	6.960%	$94,200	30	$0	$0	N	$419,100
2	CE	1006499348	HERNANDEZ ROMERO JOSE IVAN		X					X										X	23030 1	20	$901,046	$144,100	EPS005	20	$901,046	$36,000	CCF69	20	$974,530	$39,000	14-23	20	$901,046	6.960%	$62,800	20	$0	$0	N	$279,900
3	CC	1118534218	RINCON JHON ROBINSON		X					X										X	21030 1	20	$1,013,917	$162,100	EPS005	20	$1,013,917	$40,600	CCF69	20	$1,197,084	$47,900	14-23	20	$1,013,917	6.960%	$70,500	20	$0	$0	N	$321,100
Centro de Trabajo: YOPAL 0.532 (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600			$0	$0		$637,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600			$0	$0		$637,600
4	CC	4240618	BARRERA ALFONSO MARIA EVONY																		23030 5	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.532%	$6,900	30	$0	$0	N	$318,900
5	CC	1118560330	BARRERA TARACHE MARTHA LUCERO																		23-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.532%	$6,900	30	$0	$0	N	$318,900
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (129 Afiliados)																							$157,344,431	$25,003,680			$166,708,331	$6,386,800			$168,748,356	$6,468,300			$166,708,331		$10,959,700			$0	$0		$48,868,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (129 Afiliados)																							$157,344,431	$25,003,680			$166,708,331	$6,386,800			$168,748,356	$6,468,300			$166,708,331		$10,959,700			$0	$0		$48,868,800
6	CC	1006491587	ACEVEDO MATEUS BRANDON ESTIVEN	X								X									23030 1	9	$418,261	$67,800	EPS037	9	$418,261	$16,800	CCF69	9	$418,261	$16,800	14-23	9	$418,261	6.960%	$29,200	9	$0	$0	N	$129,800
7	CC	1118559153	AGUDELO MORENO YULIANEY									X									23030 1	30	$1,352,969	$216,500	EPS037	30	$1,352,969	$54,100	CCF69	30	$1,352,969	$54,100	14-23	30	$1,352,969	6.960%	$94,200	30	$0	$0	N	$419,100
8	CC	1118559302	AGUIRRE DIAZ JAVIER ANTONIO									X									23-14	30	$1,321,196	$211,400	EPS005	30	$1,321,196	$52,900	CCF69	30	$1,321,196	$52,900	14-23	30	$1,321,196	6.960%	$92,000	30	$0	$0	N	$409,200
9	CC	9438998	ALFONSO GONZALEZ HANDY								X										23030 1	1	$86,667	$10,500	EPS005	1	$86,667	$0	CCF69	1	$86,667	$0	14-23	1	$86,667	0.000%	$0	1	$0	$0	N	$10,500
10	CC	9438998	ALFONSO GONZALEZ HANDY							X											23030 1	28	$1,266,323	$203,700	EPS005	28	$1,266,323	$50,700	CCF69	28	$1,266,323	$50,700	14-23	28	$1,266,323	6.960%	$88,200	28	$0	$0	N	$392,300
11	CC	11201707	AREVA MURCIA EUCLIDES							X											23030 1	30	$1,550,109	$248,100	EPS034	30	$1,550,109	$62,100	CCF69	30	$1,550,109	$62,100	14-23	30	$1,550,109	6.960%	$107,900	30	$0	$0	N	$480,200
12	CC	1006499361	AVILA COLINA CARLOS YOBERY		X					X										X	23030 1	15	$864,130	$138,300	EPS025	15	$864,130	$34,600	CCF69	15	$1,169,880	$46,800	14-23	15	$864,130	6.960%	$46,500	15	$0	$0	N	$226,000
13	CC	1067187019	BARRERA VILLARA PAULA VALENTINA																		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$100,900	30	$0	$0	N	$448,900
14	CC	1486945	BAYONA ARGUELLO IRVIN GONZALO							X											23030 1	30	$1,395,380	$223,300	EPS005	30	$1,395,380	$55,900	CCF69	30	$1,395,380	$55,900	14-23	30	$1,395,380	6.960%	$97,200	30	$0	$0	N	$432,300
15	CC	4240618	BERNAL ALFONSO MARIA DEBIS																		23030 5	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	N	$495,400
16	CC	1007476847	BERNAL EUDOY YILNER OSMAR																		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	N	$449,000
17	CC	1006517434	BURGOS CRUZ LIDDY TATIANA	X								X									23030 1	30	$1,352,969	$216,500	EPS034	30	$1,352,969	$54,100	CCF69	30	$1,352,969	$54,100	14-23	30	$1,352,969	6.960%	$94,200	30	$0	$0	N	$419,100
18	CC	1006450593	BURGOS MENDIVELSO RONEY ESTIVEN	X								X									23030 1	15	$873,261	$139,800	EPS034	15	$873,261	$35,000	CCF69	15	$873,261	$35,000	14-23	15	$873,261	6.960%	$60,800	15	$0	$0	N	$270,600
19	CE	1118560461	CARDENAS SOCHA JAIRO ALBERTO										X								23030 1	1	$86,667	$10,500	EPS005	1	$86,667	$0	CCF69	1	$86,667	$0	14-23	1	$86,667	0.000%	$0	1	$0	$0	N	$10,500
20	CE	1118560461	CARDENAS SOCHA JAIRO ALBERTO		X					X										X	23030 1	22	$969,127	$157,200	EPS005	22	$969,127	$38,800	CCF69	22	$1,002,871	$41,300	14-23	22	$969,127	6.960%	$68,600	22	$0	$0	N	$307,100
21	CC	1016254333	CASTAÑEDA VARGAS JEAN CARLOS	X						X											23-14	30	$1,468,660	$235,000	EPS037	30	$1,468,660	$58,800	CCF69	30	$1,468,660	$58,800	14-23	30	$1,468,660	6.960%	$102,200	30	$0	$0	N	$454,800
22	CC	1006499334	CASTILLO JIMENEZ JHAFF GONZALO							X											23030 1	30	$1,349,924	$215,400	EPS005	30	$1,349,924	$53,900	CCF69	30	$1,349,924	$53,900	14-23	30	$1,349,924	6.960%	$93,900	30	$0	$0	N	$416,900
23	CC	74152542	CASTILLO BLANCO JOSE ARMANDO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS034	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,400	30	$0	$0	N	$402,400

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004640	8	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 25 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	9478640233	9478640233	E	2024/12/10	2024/12/10	BANCO DE BOGOTA	0	$58,212,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (142 Afiliados)							$186,296,241	$19,203,900			$191,791,288	$7,728,100			$198,140,721	$7,828,400			$191,791,288		$12,962,100		$0	$0		$58,212,100
Centro de Trabajo: ORDOSÉ 0.88 (1 Afiliados)							$1,475,925	$234,600			$1,475,925	$57,400			$1,475,925	$57,400			$1,475,925		$99,800		$0	$0		$449,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)							$1,475,925	$234,600			$1,475,925	$57,400			$1,475,925	$57,400			$1,475,925		$99,800		$0	$0		$449,200
1	CC	9630766	FUENTES CACERES RONALDO	X	23030 1	1	$43,334	$5,300	EPS001	1	$43,334	$0	CCF66	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	0.8000	$0	1	$0	$0	SI	$5,300
2	CC	9630766	FUENTES CACERES RONALDO	X	23030 1	29	$1,402,591	$229,300	EPS001	29	$1,402,591	$57,400	CCF66	29	$1,402,591	$57,400	14-23	29	$1,402,591	6.9600	$99,800	29	$0	$0	SI	$443,900
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (2 Afiliados)							$2,608,801	$412,700			$2,608,801	$100,600			$2,688,001	$180,600			$2,608,801		$113,200		$0	$0		$837,100
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)							$2,608,801	$412,700			$2,608,801	$100,600			$2,688,001	$180,600			$2,608,801		$113,200		$0	$0		$837,100
3	CC	47436168	BARRERA ALFONSO MARIA IRENE		23006 1	30	$1,300,028	$288,300	EPS031	30	$1,300,086	$52,000	CCF69	30	$1,300,086	$52,000	14-23	30	$1,300,086	0.5229	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
4	CC	1118550333	BARRERA TARACHE MARTHA LUCERO	X	25-14	2	$86,667	$10,500	EPS001	2	$86,667	$0	CCF69	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	0.0000	$0	2	$0	$0	SI	$10,500
5	CC	1118550333	BARRERA TARACHE MARTHA LUCERO		25-14	28	$1,213,334	$194,100	EPS001	28	$1,213,334	$48,600	CCF69	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	0.5229	$6,400	28	$0	$0	SI	$293,600
Centro de Trabajo: YOPAL 6.95 (139 Afiliados)							$183,223,319	$19,034,200			$189,719,362	$7,568,100			$194,868,809	$7,662,400			$189,719,362		$12,849,100		$0	$0		$57,135,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (139 Afiliados)							$183,223,319	$19,034,200			$189,719,362	$7,568,100			$194,868,809	$7,662,400			$189,719,362		$12,849,100		$0	$0		$57,135,800
6	CC	1006491567	ACEVEDO ANTELIS BRANDON ESTIVEN	X	23030 1	30	$1,168,834	$217,300	EPS032	30	$1,168,834	$54,100	CCF69	30	$1,260,094	$54,500	14-23	30	$1,260,834	6.9600	$84,700	30	$0	$0	SI	$401,400
7	CC	74849563	AGUDELO MORENO FALLARCY	X	23030 1	5	$216,667	$35,900	EPS012	5	$216,667	$0	CCF69	5	$216,667	$0	14-23	5	$216,667	0.0000	$0	5	$0	$0	SI	$35,900
8	CC	74849563	AGUDELO MORENO FALLARCY	X	23030 1	25	$1,252,199	$200,400	EPS012	25	$1,252,199	$50,100	CCF69	25	$1,252,199	$50,100	14-23	25	$1,252,199	6.9600	$87,200	25	$0	$0	SI	$387,800
9	CC	74899582	AGUIRRE DIAZ JAVIER ANTONIO	X	25-14	30	$1,367,120	$218,800	EPS005	30	$1,367,120	$54,700	CCF69	30	$1,367,120	$54,700	14-23	30	$1,367,120	6.9600	$95,100	30	$0	$0	SI	$423,400
10	CC	9620998	ALFONSO GONZALEZ HARBY	X	23030 1	30	$1,281,848	$205,100	EPS005	30	$1,281,848	$51,300	CCF69	30	$1,281,848	$51,300	14-23	30	$1,281,848	6.9600	$324,100	30	$0	$0	SI	$1011,800
11	CC	74812238	ALVAREZ GUEVA EDGAR	X	23030 1	6	$334,100	$53,500	EPS025	6	$334,100	$13,400	CCF69	6	$334,100	$13,400	14-23	6	$334,100	6.9600	$23,300	6	$0	$0	SI	$103,600
12	CC	1116662409	ANTIPARA JORDAN RODRIGO	X	23030 1	6	$288,267	$46,100	EPS041	6	$288,267	$11,600	CCF69	6	$338,191	$11,600	14-23	6	$288,267	6.9600	$20,100	6	$0	$0	SI	$89,100
13	CC	11102197	ARIZA AGUILA EMIGDIO	X	23030 1	30	$1,630,601	$261,000	EPS034	30	$1,630,602	$65,300	CCF69	30	$1,630,602	$65,300	14-23	30	$1,630,602	6.9600	$113,500	30	$0	$0	SI	$505,100
14	CC	9619666	AVILA HERNANDEZ ONEL	X	23030 1	26	$1,934,938	$309,600	EPS001	26	$1,934,938	$77,400	CCF69	26	$1,934,938	$77,400	14-23	26	$1,934,938	6.9600	$134,700	26	$0	$0	SI	$599,100
15	CC	1007381979	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA	X	23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.9600	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
16	CC	74869545	BATERA MENDIVELSO DENIS OSWALDO	X	23030 1	30	$1,367,120	$218,800	EPS005	30	$1,367,120	$54,700	CCF69	30	$1,367,120	$54,700	14-23	30	$1,367,120	6.9600	$95,100	30	$0	$0	SI	$423,400
17	CC	40440879	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS	X	23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.9600	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
18	CC	1007576067	BERNAL GODOY YELVER FABIAN	X	23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.9600	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
19	CC	1006157424	BURGOS CRUZ LEIDY TATIANA	X	23030 1	1	$43,334	$6,100	EPS025	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	0.8000	$0	1	$0	$0	SI	$6,100
20	CC	1006157424	BURGOS CRUZ LEIDY TATIANA	X X	23030 1	29	$1,300,254	$213,100	EPS025	29	$1,300,254	$52,000	CCF69	29	$1,456,782	$97,100	14-23	29	$1,300,254	6.9600	$91,900	29	$0	$0	SI	$412,200
21	CC	1006458093	BURGOS MENDIVELSO ROBEY ESTIVEN	X	23030 1	30	$1,667,391	$266,800	EPS025	30	$1,667,391	$66,700	CCF69	30	$1,667,391	$66,700	14-23	30	$1,667,391	6.9600	$116,100	30	$0	$0	SI	$516,300
22	CC	1118658258	CANDELAS CAMACHO KAROL FABIAN	X	23030 1	16	$693,334	$111,000	EPS040	16	$693,334	$27,800	CCF69	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$693,334	6.9600	$48,300	16	$0	$0	SI	$214,900
23	CC	1026254333	CASTAÑEDA VARGAS JUAN CARLOS	X	25-14	6	$260,000	$41,200	EPS037	6	$260,000	$0	CCF69	6	$260,000	$0	14-23	6	$260,000	0.0000	$0	6	$0	$0	SI	$41,200

| | | |

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en linea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004940	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	0 - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 33 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	94784403	94784403	E	2024/12/10	2024/12/10	BANCO DE BOGOTA	0	$58,212,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				137	$29,703,500	$0	$0	$29,703,500
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	7	$1,381,000	$0	$0	$1,381,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	$5,695,700	$0	$0	$5,695,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	95	$20,449,100	$0	$0	$20,449,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$2,177,700	$0	$0	$2,177,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				142	$12,962,100	$0	$0	$12,962,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	142	$12,962,100	$0	$0	$12,962,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				142	$7,820,400	$0	$0	$7,820,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	142	$7,820,400	$0	$0	$7,820,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				142	$7,726,100	$0	$0	$7,726,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$65,300	$0	$0	$65,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	31	$1,598,400	$0	$0	$1,598,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$102,400	$0	$0	$102,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$49,100	$0	$0	$49,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$109,400	$0	$0	$109,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	38	$2,059,400	$0	$0	$2,059,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	23	$1,349,400	$0	$0	$1,349,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$53,500	$0	$0	$53,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	42	$2,287,200	$0	$0	$2,287,200
TOTAL				142	$58,212,100	$0	$0	$58,212,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 840068840	8	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - ADMOS DE 200 COTIDIANTES	YOPAL	CLL 30 H 26 - 40	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	9479659485	9479659485	E	2025/01/13	2025/01/13	BANCO DE BOGOTA	1	$43,144,780

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (19 Afiliados)							$21,691,399	$3,251,400			$26,304,919	$1,041,160			$30,151,153	$1,331,080			$26,281,919		$1,644,400		$0	$0		$7,269,040
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (2 Afiliados)							$2,233,334	$360,600			$2,193,334	$90,160			$2,881,473	$115,480			$2,233,334		$11,800		$0	$0		$578,080
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)							$2,233,334	$360,600			$2,193,334	$90,160			$2,881,473	$115,480			$2,233,334		$11,800		$0	$0		$578,080
1	CC	40416118	BARRERA ALFONSO MARIA EDAY		23030 1	30	$1,100,000	$189,000	EPS037	30	$1,100,000	$52,800	CCF04	30	$1,100,000	$52,800	14-23	30	$1,100,000	0.5229	$6,000	30	$0	$0	SI	$308,800
2	CC	1116960330	BARRERA TAIMOHE MARTHA LUCERO	X	25-14	22	$953,334	$152,680	EPS005	22	$953,334	$38,200	CCF07	22	$1,081,473	$63,480	14-23	22	$953,334	0.5229	$5,080	22	$0	$0	SI	$259,200
Centro de Trabajo: YOPAL 0.96 (17 Afiliados)							$19,748,265	$2,996,800			$23,948,265	$956,980			$27,268,680	$1,087,600			$23,948,265		$1,632,600		$0	$0		$6,691,980
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (17 Afiliados)							$19,748,265	$2,996,800			$23,948,265	$956,980			$27,268,680	$1,087,600			$23,948,265		$1,632,600		$0	$0		$6,691,980
3	CC	1007187078	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF09	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
4	CC	6746078	BERNAL ALFONSO MARIA JESUS		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF09	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
5	CC	1007157067	BERNAL GODOY YULVER FABIAN		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF09	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
6	CC	1007054362	CASTRO LOPEZ CRISTHIAN CAMILO	8	25-14	30	$1,478,261	$236,600	EPSE25	30	$1,478,261	$59,100	CCF09	30	$2,100,400	$84,400	14-23	30	$1,478,261	6.960%	$102,900	30	$0	$0	SI	$481,500
7	CC	5401197	CRUZ MENDOZA MIGUEL ANGEL		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	MEN001	30	$1,300,000	$52,000	CCF09	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	1049603197	DAZA MONICA ELIZABETH	8	23030 2	2	$86,667	$10,500	EPS005	2	$86,667	$0	CCF09	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	0.800%	$0	2	$0	$0	SI	$10,500
9	CC	1049603197	DAZA MONICA ELIZABETH	8	23030 1	28	$866,667	$138,700	EPS005	28	$866,667	$34,700	CCF09	28	$943,500	$37,700	14-23	28	$866,667	6.960%	$60,400	28	$0	$0	SI	$271,500
10	CC	675/218	GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEXIS			0	$0	$0	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF09	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	SI	$389,000
11	CC	86066312	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF09	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
12	CC	63528673	GUARIN MARTINEZ MARTHA CECILIA	X	25-14	22	$953,334	$152,600	EPS009	22	$953,334	$38,200	CCF09	22	$1,585,179	$63,500	14-23	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	SI	$320,700
13	CC	7161694	GUERRERO PARRA JOSE MAURICIO		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF09	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
14	CC	88235674	PACHECO PEDRA EDICT JASAIH			0	$0	$0	EPS004	30	$2,600,000	$104,000	CCF09	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	SI	$389,000
15	CC	1116541768	PEDRAZA AYALA JAMES ALEXIS		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF09	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
16	CC	1116574938	PEREZ AGUILAR JUAN ESTEBAN	X	23030 1	22	$953,334	$152,600	EPS005	22	$955,334	$38,200	CCF09	22	$1,128,473	$45,180	14-23	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	SI	$300,400
17	CC	1116571123	ROJAS MESA JHALEIN ROCIO	8	23030 1	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF09	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	0.800%	$0	3	$0	$0	SI	$26,000
18	CC	1116571123	ROJAS MESA JHALEIN ROCIO	X	23030 1	19	$823,334	$131,800	EPS005	19	$823,334	$33,000	CCF09	19	$809,167	$36,000	14-23	19	$823,334	6.960%	$57,400	19	$0	$0	SI	$258,200
19	CC	1053580548	SANCHEQUE SANCHEQUE WILLIAM RICARDO	8	23030 1	7	$303,334	$48,600	EPS015	7	$303,334	$12,200	CCF09	7	$1,356,188	$63,300	14-23	7	$303,334	6.960%	$21,200	7	$0	$0	SI	$144,300
20	CC	1118541446	TORRES MENDOZA JUAN CARLOS	8	23030 1	7	$303,334	$48,600	EPS009	7	$303,334	$12,200	CCF09	7	$911,806	$36,500	14-23	7	$303,334	6.960%	$21,200	7	$0	$0	SI	$118,500
21	CC	23914359	TRUJILLO DELGADO MARIA ANGELICA		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF09	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SYNERGIA BOCAS DEL PAUTO (35 Afiliados)							$31,339,733	$5,779,100			$37,329,733	$1,447,320			$44,418,151	$1,713,920			$37,329,733		$2,317,120		$0	$0		$11,257,380

Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: NOCAS DEL PAUTO (35 Afiliados) | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

EMPLEADO				NOVEDADES																								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ingreso	Retiro	Sus	Inc	Lic	Vac	Rep	Vsp	Trab	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Epp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SYNERGIA OROCUE (25 Afiliados)																						$20,905,728	$3,345,916			$21,201,529	$849,400			$33,359,300	$1,215,660			$21,201,529		$1,588,900			$0	$0		$6,799,880
Centro de Trabajo: SYNERGIA OROCUE (25 Afiliados)																						$20,905,728	$3,345,916			$21,201,529	$849,400			$33,359,300	$1,215,660			$21,201,529		$1,588,900			$0	$0		$6,799,880
Ciudad: OROCUE Depto: CASANARE (25 Afiliados)																						$20,905,728	$3,345,916			$21,201,529	$849,400			$33,359,300	$1,215,660			$21,201,529		$1,588,900			$0	$0		$6,799,880
131	CC	74845585	AGUDELO MORENO PAILLARCY	X									X							X	23030 1	5	$295,797	$47,400	EPS037	5	$295,797	$11,900	CCF69	5	$592,603	$35,600	14-23	5	$295,797	6.960%	$20,600	5	$0	$0	N	$116,300
132	CC	9430998	ALFONSO GONZALEZ HARRY	X									X							X	23030 1	24	$1,140,326	$182,500	EPS037	24	$1,140,326	$45,700	CCF69	24	$1,758,668	$70,800	14-23	24	$1,140,326	6.960%	$79,400	24	$0	$0	N	$378,400
133	CC	1118536153	CARILLO CUBILLOS ALEXIS	X									X							X	23030 1	24	$1,061,196	$169,800	EPS037	24	$1,061,196	$42,700	CCF69	24	$1,636,113	$67,600	14-23	24	$1,061,196	6.960%	$73,900	24	$0	$0	N	$353,000
134	CC	1117523043	CHILA SERRATO ERNESTO ANTONIO	X									X							X	23030 1	5	$216,667	$34,700	EPS041	5	$216,667	$8,700	CCF69	5	$648,973	$25,700	14-23	5	$216,667	6.960%	$15,100	5	$0	$0	N	$84,200
135	CC	7473961	CISNEROS AVILDONDO CIRO EMILIO	X									X							X	23030 1	24	$1,219,457	$195,200	EPS037	24	$1,219,457	$48,800	CCF69	24	$1,598,624	$64,000	14-23	24	$1,219,457	6.960%	$84,900	24	$0	$0	N	$393,900
136	CC	1002270481	FONSECA GOMEZ CAMILO ANDRES	X																X	23030 1	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF69	5	$568,995	$20,800	14-23	5	$216,667	6.960%	$15,100	5	$0	$0	N	$79,300
137	CC	9430766	FUENTES CACERES RONALDO	X									X							X	23030 1	5	$295,797	$47,400	EPS037	5	$295,797	$11,900	CCF69	5	$688,398	$34,400	14-23	5	$295,797	6.960%	$20,600	5	$0	$0	N	$104,300
138	CC	1006816647	GUSTAVO RODRIGUEZ RAIDAN STEVEN	X									X							X	25-14	5	$295,797	$47,400	EPS037	5	$295,797	$11,900	CCF69	5	$891,600	$35,700	14-23	5	$295,797	6.960%	$20,600	5	$0	$0	N	$115,600
139	CC	1117321807	GUTIERREZ SANTOS JOSE ANDRES	X									X							X	23030 1	19	$837,464	$133,900	EPS041	19	$837,464	$33,500	CCF69	19	$1,456,270	$58,300	14-23	19	$837,464	6.960%	$58,300	19	$0	$0	N	$284,100
140	CC	74825356	LIQUEZAMON PINTO JOSE LANDER											X							23030 1	38	$1,380,000	$368,000	EPS057	30	$1,380,000	$52,800	CCF69	8	$0	$0	14-23	38	$1,380,000	0.000%	$0	8	$0	$0	N	$420,800
141	CC	74846468	MONTAÑEZ PINZON ORLANDO	X									X							X	23030 1	24	$1,140,326	$182,500	EPS041	24	$1,140,326	$45,700	CCF69	24	$1,770,469	$70,900	14-23	24	$1,140,326	6.960%	$79,400	24	$0	$0	N	$378,000
142	CC	4186879	MORENO LINDA HERNANDO	X																X	25-14	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF69	5	$856,111	$32,700	14-23	5	$216,667	6.960%	$15,100	5	$0	$0	N	$91,200
143	CC	1127193779	NIÑO ESTRADA EDILMER	X									X							X	25-14	24	$1,140,326	$182,500	EPS041	24	$1,140,326	$45,700	CCF69	24	$1,441,469	$57,900	14-23	24	$1,140,326	6.960%	$79,400	24	$0	$0	N	$365,000
144	CC	74849386	NIÑO RIVAS RODRIGO	X									X							X	23030 1	24	$1,219,457	$195,200	EPS037	24	$1,219,457	$48,800	CCF69	24	$1,544,457	$61,800	14-23	24	$1,219,457	6.960%	$84,900	24	$0	$0	N	$390,700
145	CC	4189144	OJEDA GAMEZ FREDY	X									X							X	23030 1	24	$1,140,326	$182,500	EPS037	24	$1,140,326	$45,700	CCF69	24	$1,774,874	$71,000	14-23	24	$1,140,326	6.960%	$79,400	24	$0	$0	N	$378,600
146	CC	19631400	OLEA RUIZ WALDIMIRO JOSE	X									X							X	23030 1	22	$1,053,660	$168,600	EPS037	22	$1,053,660	$42,200	CCF69	22	$1,681,799	$67,400	14-23	22	$1,053,660	6.960%	$73,400	22	$0	$0	N	$351,600
147	CC	74811941	PALACIOS JOSE VICENTE																		25-14	30	$1,450,000	$232,000	EPS041	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	N	$449,000
148	CC	9434133	PINZON SERRANO CARLOS JULIO	X									X							X	23030 1	24	$1,140,326	$182,500	EPS037	24	$1,140,326	$45,700	CCF69	24	$1,770,469	$70,900	14-23	24	$1,140,326	6.960%	$79,400	24	$0	$0	N	$378,000
149	CC	9869848	RESTREPO CANO ELKIN ANTONIO										X								23030 1	30	$1,737,826	$278,000	EPS037	30	$1,737,826	$70,400	CCF69	30	$1,737,826	$70,400	14-23	30	$1,737,826	6.960%	$122,400	30	$0	$0	N	$540,800
150	CC	74849736	RUIZ ZAMBRANO CARLOS HUMBERTO	X									X							X	23030 1	24	$1,140,326	$182,500	EPS037	24	$1,140,326	$45,700	CCF69	24	$1,531,398	$60,900	14-23	24	$1,140,326	6.960%	$79,400	24	$0	$0	N	$368,500
151	CC	1117323600	RODRIGUEZ MONTAÑEZ CRISTIAN DARIO	X																X	23030 1	5	$216,667	$34,700	EPS041	5	$216,667	$8,700	CCF69	5	$816,339	$32,600	14-23	5	$216,667	6.960%	$15,100	5	$0	$0	N	$91,100
152	CC	1007495875	ROJAS CEDEÑO ROBER ALEJANDRO	X																X	23030 1	5	$216,667	$34,700	EPS035	5	$216,667	$8,700	CCF69	5	$990,000	$39,600	14-23	5	$216,667	6.960%	$15,100	5	$0	$0	N	$99,100
153	CC	1118536619	SALAMANCA DAVILA JULIAN CAMILO	X									X							X	25-14	24	$1,140,326	$182,500	EPS035	24	$1,140,326	$45,700	CCF69	24	$1,409,314	$56,400	14-23	24	$1,140,326	6.960%	$79,400	24	$0	$0	N	$364,000
154	CC	4267992	TORRES VARGAS ENRIQUE	X									X							X		0	$0	$0	EPS035	5	$295,797	$11,900	CCF69	5	$368,892	$38,800	14-23	5	$295,797	6.960%	$20,600	5	$0	$0	N	$60,300
155	CC	1006728219	WILCHES CHITIVA JAIDY YANETH	X									X							X	25-14	22	$1,053,660	$168,600	EPS041	22	$1,053,660	$42,200	CCF69	22	$1,395,106	$55,800	14-23	22	$1,053,660	6.960%	$73,400	22	$0	$0	N	$340,000
Total		**Afiliados(138)**																				$135,401,996	$21,272,900			$141,182,323	$5,578,600			$176,415,400	$6,384,900			$141,182,323		$9,308,700			$0	$0		$43,144,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844804643	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327378	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	94769 9485	94769 9485	E	2025/01/13	2025/01/01	BANCO DE BOGOTA	0	$43,144,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				125	$21,272,900	$0	$0	$21,272,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,648,600	$0	$0	$1,648,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	$3,725,400	$0	$0	$3,725,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	87	$14,707,600	$0	$0	$14,707,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,191,300	$0	$0	$1,191,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				130	$9,308,700	$0	$0	$9,308,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	130	$9,308,700	$0	$0	$9,308,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				130	$6,984,500	$0	$0	$6,984,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	130	$6,984,500	$0	$0	$6,984,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				130	$5,578,600	$0	$0	$5,578,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$46,800	$0	$0	$46,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	30	$1,196,300	$0	$0	$1,196,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$39,000	$0	$0	$39,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$33,000	$0	$0	$33,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$63,900	$0	$0	$63,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	32	$1,344,800	$0	$0	$1,344,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	22	$805,100	$0	$0	$805,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$39,000	$0	$0	$39,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	39	$1,958,700	$0	$0	$1,958,700
TOTAL				130	$43,144,700	$0	$0	$43,144,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9400048	8	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 H 28 - 48	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	9484538511	9484538511	E	2025/04/09	2025/04/15	BANCO DE BOGOTA	6	$45,326,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (13 Afiliados)							$17,422,261	$2,819,900			$21,922,161	$918,200			$17,922,261	$411,200			$21,922,161		$1,186,400		$0	$0		$5,315,800
Centro de Trabajo: YOPAL (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$0		$0	$0		$341,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$0		$0	$0		$341,800
1	CC	24815356	LOQUIDAMON PINTO JOSE LANDER	3	23058 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF99	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.0000	$0	30	$0	$0	SI	$341,800
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (2 Afiliados)							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$170,800		$0	$0		$683,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$170,800		$0	$0		$683,600
2	CC	4749158	BARRERA ALFONSO MARIA DIONY		23058 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF99	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.5226	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	1118560033	BARRERA TARACHE MARTHA LUCERO		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF99	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.5226	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (10 Afiliados)							$13,151,761	$2,136,400			$16,551,761	$742,200			$16,551,761	$742,200			$16,551,761		$1,291,600		$0	$0		$4,912,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (10 Afiliados)							$13,151,761	$2,136,400			$16,551,761	$742,200			$16,551,761	$742,200			$16,551,761		$1,291,600		$0	$0		$4,912,400
4	CC	1002387819	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA		23058 1	30	$1,450,000	$231,900	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF99	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.9600	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,900
5	CC	4748978	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS		23058 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF99	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.9600	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
6	CC	1007167662	BERNAL GODOY YILVER FABIAN		23058 1	30	$1,450,000	$231,900	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF99	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.9600	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,900
7	CC	1007854562	CASTRO LOPEZ CRISTHIAN CAMILO	S	25-14	30	$1,838,261	$293,900	EPS235	30	$1,838,261	$73,500	CCF99	30	$1,838,261	$73,500	14-23	30	$1,838,261	6.9600	$127,900	30	$0	$0	SI	$566,900
8	CC	4761218	GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEXIS			0	$0	$0	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF99	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	6.9600	$181,000	30	$0	$0	SI	$389,900
9	CC	80856292	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER		23058 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF99	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.9600	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
10	CC	7161696	GUERRERO PAGUA JOSE MAURICIO		23058 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF99	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.9600	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
11	CC	80285674	PACHECO BERNAL ERICT JESAIN			0	$0	$0	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF99	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	6.9600	$181,000	30	$0	$0	SI	$389,900
12	CC	1116045798	PEDRAZA AYALA JAMES ALDRIS		23058 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF99	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.9600	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
13	CC	33914057	TRUJILLO DELGADO MARIA ANGELICA		23058 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF99	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.9600	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SYNERGIA BOCAS DEL PAUTO (26 Afiliados)							$15,895,895	$2,468,100			$27,279,194	$1,423,100			$17,696,362	$1,439,900			$27,279,194		$2,467,900		$0	$0		$10,596,600
Centro de Trabajo: BOCAS DEL PAUTO (26 Afiliados)							$15,895,895	$2,468,100			$27,279,194	$1,423,100			$17,696,362	$1,439,900			$27,279,194		$2,467,900		$0	$0		$10,596,600
Ciudad: TRINIDAD Depto: CASANARE (26 Afiliados)							$15,895,895	$2,468,100			$27,279,194	$1,423,100			$17,696,362	$1,439,900			$27,279,194		$2,467,900		$0	$0		$10,596,600
14	CC	1116801462	ACEVEDO PEREZ JOSE DANIEL	X	23058 1	30	$2,183,999	$349,500	EPS037	30	$1,353,999	$87,400	CCF99	30	$2,183,999	$87,400	14-23	30	$2,183,999	6.9600	$152,100	30	$0	$0	SI	$676,400
15	CC	1006410991	BURGOS MENDIVELSO RONEY ESTIVEN		23058 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS235	30	$1,423,500	$57,000	CCF99	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.9600	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
16	CC	1118511869	DELGADO CARVAJAL STELLA ALEJANDRA		23058 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF99	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.9600	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
17	CC	74867357	FARFAN FARFAN ANGEL MARIA	X	23058 1	3	$142,350	$11,100	EPS235	3	$142,350	$0	CCF99	3	$142,350	$0	14-23	3	$142,350	0.0000	$0	3	$0	$0	SI	$11,100

2025/04/15 06:12 PM

| | | |

Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: SYNERGIA TILODRAN (54 Afiliados) | | |

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 38 # 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327175	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	948438511	948438511	E	2025/04/09	2025/04/15	BANCO DE BOGOTA	6	$45,326,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				99	$23,039,200	$89,400	$0	$23,128,600
COLFONDOS	230001	800,227,940	6	5	$1,258,200	$4,900	$0	$1,263,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$3,802,300	$14,800	$0	$3,817,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	73	$16,645,600	$64,500	$0	$16,710,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,333,100	$5,200	$0	$1,338,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				103	$10,067,000	$39,000	$0	$10,106,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	103	$10,067,000	$39,000	$0	$10,106,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				103	$6,024,500	$23,400	$0	$6,047,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	103	$6,024,500	$23,400	$0	$6,047,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				103	$6,020,400	$23,900	$0	$6,044,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	23	$1,117,300	$4,400	$0	$1,121,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$64,700	$300	$0	$65,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$314,900	$1,300	$0	$316,200
FOSYGA	WIN001	901,037,916	1	1	$57,000	$300	$0	$57,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	WIN002	901,037,916	1	1	$57,000	$300	$0	$57,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	30	$1,765,300	$6,900	$0	$1,772,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	$533,600	$2,100	$0	$535,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$78,200	$400	$0	$78,600
SANITAS	EPS035	800,251,440	6	32	$2,032,400	$7,900	$0	$2,040,300
TOTAL				103	$45,151,100	$175,700	$0	$45,326,800

2025/04/15 06:12 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844804840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 33 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6317178	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	9485894775	9485894775	E	2025/05/12	2025/05/13	BANCO DE BOGOTA	1	$41,420,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Lcge Lde Lae Lds Lsp Lsn Lsp Vsp Vst Vsn Vdt Tde Tae Tsn Ige Irl Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (12 Afiliados)						$16,109,712	$2,173,300			$21,339,712	$849,600			$20,276,812	$765,600			$21,328,712		$1,597,900		$0	$0		$5,383,700
Centro de Trabajo: YOPAL (1 Afiliados)						$1,413,500	$128,160			$1,423,500	$48,400			$189,800	$8			$1,423,500		$0		$0	$0		$269,768
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,413,500	$128,160			$1,423,500	$48,400			$189,800	$8			$1,423,500		$0		$0	$0		$269,768
1	CC	24825356	LIZCANO PINTO JOSE AMBER	23030 1	16	$758,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$38,400	CCF69	0	$0	$0	14-23	16	$759,200	0.0035	$0	8	$0	$0	SI	$151,900
1	CC	24825356	LIZCANO PINTO JOSE AMBER	23030 7	4	$189,800	$22,800	EPS037	4	$189,800	$0	CCF69	4	$189,800	$0	14-23	4	$189,800	0.0035	$0	4	$0	$0	SI	$22,800
1	CC	24825356	LIZCANO PINTO JOSE AMBER	23030 2	16	$474,500	$76,000	EPS037	16	$474,500	$19,200	CCF69	0	$0	$0	14-23	16	$474,500	0.0035	$0	8	$0	$0	SI	$95,000
Centro de Trabajo: YOPAL 8/522 (1 Afiliados)						$1,423,500	$223,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$223,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
4	CC	45406168	BARRERA ALFONSO MARIA EDONY	23030 0	30	$1,423,500	$223,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.5225	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (10 Afiliados)						$13,282,712	$2,123,900			$18,462,712	$738,600			$18,462,712	$738,600			$18,462,712		$1,385,400		$0	$0		$4,884,700
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (10 Afiliados)						$13,282,712	$2,123,900			$18,462,712	$738,600			$18,462,712	$738,600			$18,462,712		$1,385,400		$0	$0		$4,884,700
5	CC	1007357019	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA	23030 1	30	$1,450,000	$231,000	EPS085	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
6	CC	47468878	RIBERAL ALFONSO MARIA DEIBIS	23030 1	30	$1,600,000	$255,000	EPS085	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
7	CC	1007357047	RIBERAL GODOY YEIMER FABIAN	23030 1	30	$1,450,000	$231,000	EPS085	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
8	CC	1007854262	CASTRO LOPEZ CRISTHIAN CAMILO	25-14	30	$1,739,212	$276,300	EPSC25	30	$1,739,212	$69,600	CCF69	30	$1,739,212	$69,600	14-23	30	$1,739,212	6.960%	$121,100	30	$0	$0	SI	$558,100
9	CC	1076318	GONZALEZ MACHUCA FIDENCIO ALEXIS		0	$0	$0	EPS085	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	SI	$389,000
10	CC	84864252	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER	23030 1	30	$2,800,000	$530,900	EPS085	30	$2,800,000	$80,000	CCF69	30	$2,800,000	$80,000	14-23	30	$2,800,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
11	CC	7163656	GUERRERO PAGUA JOSE MAURICIO	23030 1	30	$2,800,000	$530,900	EPS085	30	$2,800,000	$80,000	CCF69	30	$2,800,000	$80,000	14-23	30	$2,800,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
12	CC	1083874	PACHECO BERNI EDICT JAIMIN		0	$0	$0	EPS085	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	SI	$389,000
13	CC	1116045768	PEDRAZA AYALA JAMES ALEXIS	23030 1	30	$1,423,500	$231,800	EPS084	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$448,900
14	CC	23914397	TRUJILLO DELGADO MARIA ANGELICA	23030 1	30	$1,600,000	$256,800	EPS085	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Lcge Lde Lae Lds Lsp Lsn Lsp Vsp Vst Vsn Vdt Tde Tae Tsn Ige Irl Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SYNERGIA BOCAS DEL PAUTO (21 Afiliados)						$19,938,141	$4,715,000			$31,221,641	$1,119,300			$31,496,547	$1,100,000			$31,221,641		$2,091,100		$0	$0		$8,308,900

Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: BOCAS DEL PAUTO (21 Afiliados) | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| SUCURSAL: SYNERGIA TILODIRAN (61 Afiliados) | | |

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844003843	3	SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 38 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327378	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	9485594775	9485594775	E	2025/05/12	2025/05/13	BANCO DE BOGOTA	1	$41,420,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				90	$21,278,000	$14,200	$0	$21,292,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,461,500	$1,000	$0	$1,462,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$3,855,500	$2,600	$0	$3,858,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	63	$14,819,100	$9,800	$0	$14,828,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,141,900	$800	$0	$1,142,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				94	$9,169,100	$6,100	$0	$9,175,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	94	$9,169,100	$6,100	$0	$9,175,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				94	$5,385,800	$3,600	$0	$5,389,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	94	$5,385,800	$3,600	$0	$5,389,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				94	$5,559,600	$4,200	$0	$5,563,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	20	$1,083,600	$800	$0	$1,084,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$22,800	$100	$0	$22,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$234,000	$200	$0	$234,200
FOSYGA	AMN001	901,037,916	1	1	$57,000	$100	$0	$57,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	AMN002	901,037,916	1	1	$57,000	$100	$0	$57,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	$1,728,900	$1,200	$0	$1,730,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$451,100	$100	$0	$451,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$56,100	$100	$0	$56,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	31	$1,869,100	$1,300	$0	$1,870,400
TOTAL				94	$41,392,500	$28,100	$0	$41,420,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844834848	1	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 H 28 - 48	YOPAL-CASANARE	6327178	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	94873749	94873749	E	2025/06/11	2025/06/10	BANCO DE BOGOTA	1	$48,739,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (12 Afiliados)						$16,917,511	$2,465,100			$17,217,511	$868,900			$16,794,611	$791,900			$17,217,511		$1,204,300		$0	$0		$5,490,200
Centro de Trabajo: YOPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$127,080			$1,423,500	$57,000			$0	$0			$1,423,500		$0		$0	$0		$184,080
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$127,080			$1,423,500	$57,000			$0	$0			$1,423,500		$0		$0	$0		$184,080
1	CC	74815356	LEGUIZAMON PINTO JOSE LANDER	23030 1	30	$1,423,500	$127,080	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	COFM	0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.009%	$0	0	$0	$0	N	$184,080
Centro de Trabajo: YOPAL 0.622 (1 Afiliados)						$1,423,500	$127,080			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,580
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$127,080			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,580
2	CC	47435469	BARRERA ALFONSO MARIA DIORY	23030 1	30	$1,423,500	$127,080	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	COFM	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	N	$349,580
Centro de Trabajo: YOPAL 6.95 (10 Afiliados)						$13,570,511	$2,107,480			$18,370,511	$734,900			$16,370,511	$734,900			$16,370,511		$1,279,800		$0	$0		$4,856,280
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (10 Afiliados)						$13,570,511	$2,107,480			$18,370,511	$734,900			$16,370,511	$734,900			$16,370,511		$1,279,800		$0	$0		$4,856,280
3	CC	1007387079	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA	23030 1	30	$1,400,000	$232,800	EPS009	30	$1,400,000	$68,000	COFM	30	$1,400,000	$68,000	14-23	30	$1,400,000	6.960%	$100,000	30	$0	$0	SI	$468,800
4	CC	1014408818	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS	23030 1	30	$1,400,000	$256,800	EPS009	30	$1,600,000	$64,000	COFM	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
5	CC	1007763067	BERNAL GODOY SILVER FABIAN	23030 1	30	$1,400,000	$232,800	EPS009	30	$1,400,000	$68,000	COFM	30	$1,400,000	$68,000	14-23	30	$1,400,000	6.960%	$100,000	30	$0	$0	SI	$468,800
6	CC	1003954263	CUERVO LOPEZ CRISTHIAN CAMILO	2514	30	$1,647,011	$263,600	EPS025	30	$1,647,011	$65,900	COFM	30	$1,647,011	$65,900	14-23	30	$1,647,011	6.960%	$114,700	30	$0	$0	SI	$510,100
7	CC	974[illegible]	GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEXIS		0	$0	$0	EPS009	30	$2,600,000	$104,000	COFM	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	6.960%	$180,000	30	$0	$0	SI	$388,000
8	CC	8686292	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS009	30	$2,000,000	$80,000	COFM	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
9	CC	7161686	GUERRERO FAGUA JOSE MAURICIO	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS009	30	$2,000,000	$80,000	COFM	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
10	CC	4630674	PACHECO REINA EDGY JAIMIN		0	$0	$0	EPS009	30	$2,600,000	$104,000	COFM	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	SI	$389,000
11	CC	1116045768	PEDRAZA AYALA JAMES ALEXIS	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	COFM	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
12	CC	23914317	TRUJILLO DELGADO MARIA ANGELICA	23030 1	30	$1,400,000	$256,800	EPS009	30	$1,600,000	$64,000	COFM	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SYNERGIA BOCAS DEL PAUTO (22 Afiliados)						$17,801,511	$4,330,500			$18,505,511	$1,137,900			$20,520,151	$1,154,230			$20,505,511		$1,969,400		$0	$0		$8,592,030

| | | |

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004848	8	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 38 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327170	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	548737469	548737469	E	2025/06/11	2025/06/12	BANCO DE BOGOTA	1	$40,739,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				85	$20,674,400	$13,500	$0	$20,687,900
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	7	$1,668,300	$1,100	$0	$1,669,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$3,453,700	$2,300	$0	$3,456,000
PORVENIR	230D01	800,224,808	8	59	$14,507,800	$9,400	$0	$14,517,200
PROTECCION	230D01	800,229,739	0	4	$1,044,600	$700	$0	$1,045,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				89	$9,178,800	$6,000	$0	$9,184,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	89	$9,178,800	$6,000	$0	$9,184,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				89	$5,369,400	$3,500	$0	$5,372,900
CONFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	89	$5,369,400	$3,500	$0	$5,372,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				89	$5,489,500	$4,000	$0	$5,493,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	17	$968,100	$700	$0	$968,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$239,000	$200	$0	$239,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$57,000	$100	$0	$57,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$57,000	$100	$0	$57,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	28	$1,706,600	$1,100	$0	$1,707,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$479,000	$400	$0	$479,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$100	$0	$57,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	$1,925,000	$1,300	$0	$1,927,100
TOTAL				89	$40,712,100	$27,000	$0	$40,739,100

2025/06/12 09:47 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004640	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327138	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	948679560	948679560	E	2025/07/09	2025/07/10	BANCO DE BOGOTA	1	$59,281,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (12 Afiliados)						$13,816,886	$1,548,133			$11,121,886	$401,330			$11,100,886	$845,320			$11,121,886		$1,110,330					$3,901,370
Centro de Trabajo: YOPAL (1 Afiliados)						$1,413,900	$217,800			$1,421,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$63,000					$403,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,413,900	$213,800			$1,421,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$63,000					$403,800
1	CC	74825755	LIZCANO PINTO JOSE LANDER	13030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,421,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-13	30	$1,421,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	$0	$403,800
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,421,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,421,500		$7,500		$0	$0		$349,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,421,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,421,500		$7,500		$0	$0		$349,800
2	CC	47436168	BARRERA ALFONSO MARIA DIONY	23030 0	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,421,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-13	30	$1,421,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	$0	$349,800
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (10 Afiliados)						$13,079,886	$2,093,900			$10,279,886	$731,300			$10,279,886	$731,300			$10,279,886		$1,171,780		$0	$0		$4,828,280
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (10 Afiliados)						$13,079,886	$2,093,900			$10,279,886	$731,300			$10,279,886	$731,300			$10,279,886		$1,171,780		$0	$0		$4,828,280
3	CC	1007357819	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA	23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-13	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	$0	$449,000
4	CC	47440578	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS	23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-13	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	$0	$495,400
5	CC	1007162667	BERNAL GODOY YELVER FABIAN	23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-13	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	$0	$449,000
6	CC	1003554262	CASTRO LOPEZ CRISTHIAN CAMILO	23-14	30	$1,356,386	$249,000	EPS025	30	$1,356,386	$62,300	CCF69	30	$1,356,386	$62,300	14-13	30	$1,356,386	6.960%	$104,400	30	$0	$0	$0	$482,300
7	CC	6761118	GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEXIS		0	$0	$0	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$104,000	14-13	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	$0	$389,000
8	CC	84864253	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER	23030 1	30	$2,600,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-13	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	$0	$619,200
9	CC	7161594	GUERRERO PARRA JOSE MAURICIO	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-13	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	$0	$619,200
10	CC	84355674	PACHECO REINA ERICT JASMIN		0	$0	$0	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$104,000	14-13	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	$0	$389,000
11	CC	1116545768	PERALTA AYALA JAMES ALEXIS	23030 1	30	$1,413,500	$227,800	EPS005	30	$1,421,500	$57,000	CCF69	30	$1,413,500	$57,000	14-13	30	$1,421,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	$0	$440,900
12	CC	23914317	TRUJILLO DELGADO MARIA ANGELICA	23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-13	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	$0	$495,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SYNERGIA BOCAS DEL PAUTO (18 Afiliados)						$12,659,867	$3,599,080			$14,113,367	$303,130			$15,305,548	$180,780			$14,113,367		$1,199,080		$0	$0		$17,113,440

aportes en línea

Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: BOCAS DEL PAUTO (18 Afiliados) | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844804648	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 33 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	549002149	549002149	E	2025/08/12	2025/08/12	BANCO DE BOGOTA	0	$37,646,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (12 Afiliados)							$19,907,821	$2,388,900			$23,541,221	$871,900			$19,118,321	$764,900			$20,541,821		$1,334,400		$0	$0		$5,377,100
Centro de Trabajo: YOPAL (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$0	$0			$1,423,500		$0		$0	$0		$284,800
Ciudad: YOPAL Dpto: CASANARE (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$0	$0			$1,423,500		$0		$0	$0		$284,800
1	CC	74825316	LIQUIDAMON PINTO JOSE LANDER	X	23008 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.0035	$0	0	$0	$0	N	$284,800
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: YOPAL Dpto: CASANARE (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
2	CC	4169148	BARRERA ALFONSO MARIA DIONY		23008 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.5225	$7,500	30	$0	$0	N	$349,300
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (10 Afiliados)							$13,094,821	$2,095,300			$17,694,821	$707,900			$17,694,821	$707,900			$17,694,821		$1,231,900		$0	$0		$4,743,000
Ciudad: YOPAL Dpto: CASANARE (10 Afiliados)							$13,094,821	$2,095,300			$17,694,821	$707,900			$17,694,821	$707,900			$17,694,821		$1,231,900		$0	$0		$4,743,000
3	CC	1082180169	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA		23008 1	30	$1,400,000	$133,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	N	$449,000
4	CC	4144078	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS		23008 1	30	$1,400,000	$159,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	N	$495,000
5	CC	1081767067	BERNAL GODOY YILVER FABIAN		23008 1	30	$1,400,000	$133,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	N	$449,000
6	CC	1083854262	CASTRO LOPEZ CRISTHIAN CAMILO	X	23-14	30	$1,571,321	$251,500	EPS029	30	$1,571,321	$62,900	CCF69	30	$1,571,321	$62,900	14-23	30	$1,571,321	6.960%	$109,400	30	$0	$0	N	$486,700
7	CC	6761218	GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEXIS			0	$0	$0	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	N	$389,000
8	CC	86046202	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,300	30	$0	$0	N	$619,300
9	CC	7161696	GUERRERO PAPIA JOSE MAURICIO		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,300	30	$0	$0	N	$619,300
10	CC	46195074	PACHECO REINA EDICT JASMIN	X		0	$0	$0	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,300	30	$0	$0	N	$299,300
11	CC	1116545769	PERRATA AYALA JAIRES ALEXIS		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	N	$440,900
12	CC	23014357	TRIVIÑO DELGADO MARIA ANGELICA		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	N	$495,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SYNERGIA BOCAS DEL PAUTO (15 Afiliados)							$18,634,581	$3,284,900			$22,818,081	$868,400			$24,167,281	$974,900			$23,638,081		$1,510,700		$0	$0		$6,637,900

2025/08/12 02:24 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: BOCAS DEL PAUTO (15 Afiliados) | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844804840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327139	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	940019439	940019439	E	2025/08/12	2025/08/12	BANCO DE BOGOTA	0	$37,696,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				79	$19,083,000	$0	$0	$19,083,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,656,500	$0	$0	$1,656,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$3,566,800	$0	$0	$3,566,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	53	$12,813,400	$0	$0	$12,813,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,046,300	$0	$0	$1,046,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				83	$8,460,400	$0	$0	$8,460,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	83	$8,460,400	$0	$0	$8,460,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				83	$5,107,100	$0	$0	$5,107,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,391	8	83	$5,107,100	$0	$0	$5,107,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				83	$5,045,900	$0	$0	$5,045,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	15	$826,000	$0	$0	$826,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$197,200	$0	$0	$197,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$37,000	$0	$0	$37,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$37,000	$0	$0	$37,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	24	$1,516,000	$0	$0	$1,516,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$400,100	$0	$0	$400,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$58,100	$0	$0	$58,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	$1,934,500	$0	$0	$1,934,500
TOTAL				83	$37,696,400	$0	$0	$37,696,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 38 H 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6317178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	94916419014	94916419016	E	2025/09/09	2025/09/12	BANCO DE BOGOTA	3	$34,391,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (12 Afiliados)						$10,686,977	$1,234,130			$12,436,577	$897,708			$14,011,477	$760,708			$18,436,577		$1,331,180		$0	$0		$4,319,618
Centro de Trabajo: YOPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$127,800			$1,423,500	$97,800			$0	$0			$1,423,500		$0		$0	$0		$284,808
Ciudad: YOPAL, Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$127,800			$1,423,500	$97,800			$0	$0			$1,423,500		$0		$0	$0		$284,808
1	CC	74825396	LOZADA DIAZ PINTO JOSE LANDER	13001	30	$1,423,500	$127,800	EPS017	30	$1,423,500	$97,800	CCFM	0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.0035	$0	0	$0	$0	SI	$284,808
Centro de Trabajo: YOPAL 0.523 (1 Afiliados)						$1,423,500	$127,800			$1,423,500	$97,800			$1,423,500	$97,800			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,908
Ciudad: YOPAL, Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,423,500	$127,800			$1,423,500	$97,800			$1,423,500	$97,800			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,908
2	CC	1094161168	BARRERA ALFONSO MARIA DIONY	13001	30	$1,423,500	$127,800	EPS017	30	$1,423,500	$97,800	CCFM	30	$1,423,500	$97,800	14-23	30	$1,423,500	8.523%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,908
Centro de Trabajo: YOPAL 6.56 (10 Afiliados)						$12,989,977	$2,078,930			$17,589,577	$703,708			$17,589,977	$703,708			$17,589,577		$1,324,680		$0	$0		$4,710,908
Ciudad: YOPAL, Depto: CASANARE (10 Afiliados)						$12,989,977	$2,078,930			$17,589,577	$703,708			$17,589,977	$703,708			$17,589,577		$1,324,680		$0	$0		$4,710,908
3	CC	1087180919	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA	13001	30	$1,450,000	$231,800	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCFM	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,800
4	CC	1094440870	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS	13001	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCFM	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
5	CC	1087157067	BERNAL GODOY YILVER FABIAN	13001	30	$1,450,000	$231,800	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCFM	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,800
6	CC	1087854362	CASTRO LOPEZ CRISTHIAN CAMILO	23-14	30	$1,466,477	$234,700	EPSC35	30	$1,466,477	$58,700	CCFM	30	$1,466,477	$58,700	14-23	30	$1,466,477	6.960%	$102,100	30	$0	$0	SI	$454,200
7	CC	6761118	GONDALEZ SANDOVAL PRIMITIVO ALEXIS		0	$0	$0	EPS005	30	$1,600,000	$104,000	CCFM	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$319,400
8	CC	86861293	GONDALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER	13001	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCFM	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
9	CC	7161696	GUERRERO PAGUA JOSE MAURICIO	13001	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCFM	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
10	CC	84081634	PACHECO RUBIA ERICT JASMIN		0	$0	$0	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCFM	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$299,200
11	CC	1116548768	PEDRAZA AYALA JAMES ALDEY	13001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCFM	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
12	CC	23914357	TRUJILLO DELGADO MARIA ANGELICA	13001	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCFM	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SYNERGIA BOCAS DEL PAUTO (12 Afiliados)						$1,190,577	$981,497			$7,601,618	$299,308			$8,101,068	$141,908			$7,601,618		$120,080		$0	$0		$1,543,618

2025/09/12 02:27 PM

Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: BOCAS DEL PAUTO (13 Afiliados) | | |

Planilla Resumen

| | | |
