CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - ENTREGABLES

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
1	REMODELACIÓN Y ADECUACIONES EN LA SEDE EXISTENTE DEL EDIFICIO ANTIGUO TELECOM EN VALLEDUPAR; CESAR - ETAPA I	**150 días**	**sáb 1/08/26**	**mié 23/12/26**			**$ 4.119.168.977,95**
2							
3	**INICIO**	**0 días**	**sáb 1/08/26**	**sáb 1/08/26**			**$ 0,00**
4	IINICIO	0 días	sáb 1/08/26	sáb 1/08/26		8	$ 0,00
5							
6	**A.- SEDE EDIFICIO ANTIGUO TELECOM**	**150 días**	**sáb 1/08/26**	**mié 23/12/26**			**$ 3.547.339.864,42**
7							
8	1.- OBRAS PRELIMINARES	30 días	sáb 1/08/26	dom 30/08/26	4	CC+15 días;42CC;47CC	$ 170.844.617,45
9							
10	2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS	15 días	sáb 15/08/26	dom 30/08/26	8CC+15 días	12CC	$ 13.129.827,75
11							
12	3.- CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS	30 días	sáb 15/08/26	dom 13/09/26	10CC	14CC+15 días	$ 193.640.656,30
13							
14	4- MAMPOSTERÍA Y ACABADOS MUROS	30 días	dom 30/08/26	dom 27/09/26	12CC+15 días	16CC+15 días	$ 140.216.415,20
15							
16	5.- PISOS INTERIORES, PISOS EXTERIORES Y ACABADOS	30 días	dom 13/09/26	lun 12/10/26	14CC+15 días	18CC	$ 325.753.174,34
17							
18	6.- INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	30 días	dom 13/09/26	lun 12/10/26	16CC	20CC	$ 46.884.267,30
19							
20	7.- INSTALACIONES HIDRAULICAS	30 días	dom 13/09/26	lun 12/10/26	18CC	22CC+15 días	$ 46.443.602,40
21							
22	8.- CUARTO DE BOMBAS, EQUIPOS SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	15 días	dom 27/09/26	lun 12/10/26	20CC+15 días	24	$ 11.301.616,30
23							
24	9.- CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	30 días	lun 12/10/26	mar 10/11/26	22	26CC+15 días;30CC	$ 377.864.963,84
25							
26	10.- CUBIERTA, CIELO RASO Y ACABADOS CUBIERTAS	15 días	lun 26/10/26	mar 10/11/26	24CC+15 días	28CC	$ 95.324.368,88
27							
28	11.- APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y GRIFERÍA	15 días	lun 26/10/26	mar 10/11/26	26CC		$ 52.999.399,70
29							
30	12.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN	60 días	lun 12/10/26	mié 9/12/26	24CC	32CC+15 días;38CC;34	$ 663.502.813,40
31							
32	13.- INSTALACIONES VOZ Y DATOS, SISTEMA DE SEGURIDAD Y CCTV	60 días	lun 26/10/26	mié 23/12/26	30CC+15 días		$ 480.716.254,20
33							
34	14.- OBRAS EXTERIORES	15 días	mié 9/12/26	mié 23/12/26	30	36CC	$ 12.602.557,50
35							
36	15.- LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	15 días	mié 9/12/26	mié 23/12/26	34CC		$ 8.210.827,17
37							
38	16.- SISTEMA CONTRAINCENDIOS: EXTINCIÓN Y DE DETECCION	30 días	lun 12/10/26	mar 10/11/26	30CC	40	$ 222.167.829,00
39							
40	17.- SUMINISTRO DE EQUIPOS	45 días	mar 10/11/26	mié 23/12/26	38		$ 650.990.923,70
41							
42	18.- PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y DE TRÁNSITO	150 días	sáb 1/08/26	mié 23/12/26	8CC	50	$ 34.745.750,00
43							
44							
45	**C.- SUMINISTRO DE EQUIPOS Y LICENCIAS**	**30 días**	**sáb 1/08/26**	**dom 30/08/26**			**$ 571.829.113,53**
46							
47	2.- ESTUDIOS, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN - TELECOM	30 días	sáb 1/08/26	dom 30/08/26	8CC		$ 571.829.113,53
48							
49	**FINAL**	**0 días**	**mié 23/12/26**	**mié 23/12/26**			**$ 0,00**
50	FINAL	0 días	mié 23/12/26	mié 23/12/26	42		$ 0,00

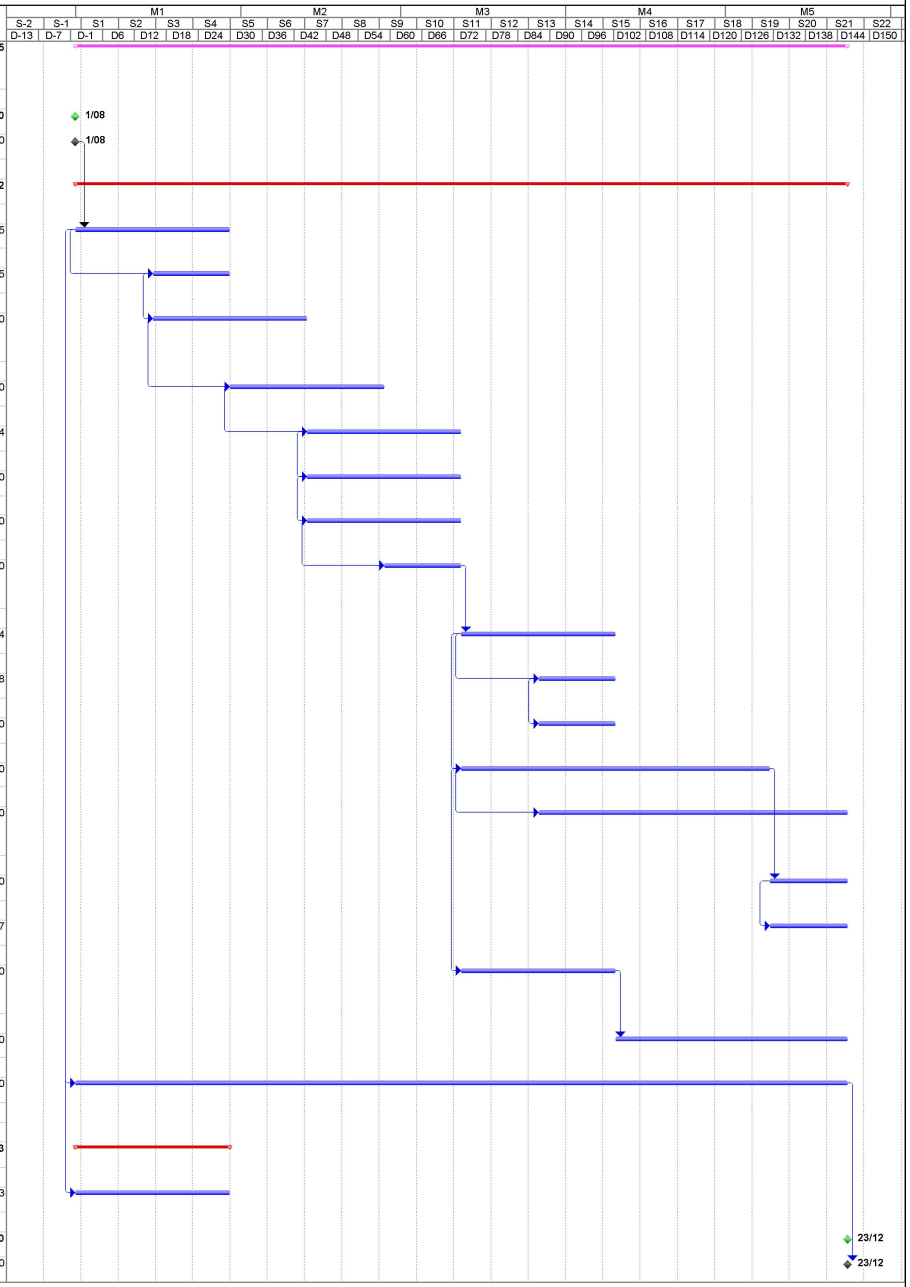

Tarea | DURACIONxBLOQUE | CAPITULOS | Tareas externas | Fecha límite
División | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo

REMODELACIÓN Y ADECUACIONES EN LA SEDE EXISTENTE DEL EDIFICIO ANTIGUO TELECOM EN VALLEDUPAR; CESAR - ETAPA I
