

Id	Modo de tarea	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo con AIU o IVA	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1			**CRONOGRAMA CUBIERTA**			**$ 183.975.316,36**	**37 días**	**6/04/26**	**25/05/26**		
2			Inicio de obra			$ 0,00	0 días	6/04/26	6/04/26		5
3			**OBRAS GENERALE**			$ 14.545.317,80	37 días	6/04/26	**25/05/26**		
4		**1,**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			$ 132.229,53	5 días	6/04/26	**10/04/26**		
5		1,5	Demolición afinado de pisos e=+-5cm. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	19,80	$ 132.229,53	5 días	6/04/26	10/04/26	2	11
6		**12,**	**CUBIERTAS**			$ 8.079.591,10	5 días	17/04/26	**23/04/26**		
7		12,5	Impermeabiliza membrana líquida de poliuretano, de aplicación en frío (Suministro y aplicación)	M2	19,80	$ 8.079.591,10	5 días	17/04/26	23/04/26	11	12CC+1 día
8		**22,**	**ASEO Y VARIOS**			**$ 6.333.497,17**	**5 días**	**19/05/26**	**25/05/26**		

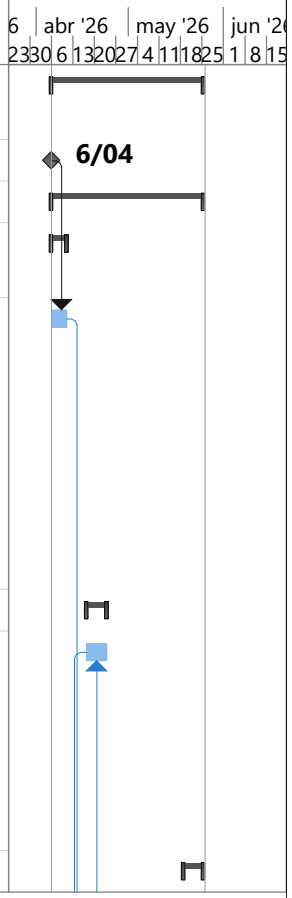

Proyecto: PROGRAMACIÓN
Fecha: 20/03/26


Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		

Id	Modo de tarea	item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo con AIU o IVA	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
9		22,1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	1.443,61	$ 6.333.497,17	5 días	19/05/26	25/05/26	12	13
10		**NP**	**NO PREVISTOS**			**$ 169.429.998,56**	**27 días**	**11/04/26**	**16/05/26**		
11		NP-8	Nivelación en mortero epóxico para mejorar pendientados, hasta 1 cm de espesor.	M2	19,80	$ 5.659.553,19	5 días	11/04/26	17/04/26	5	7
12		NP-1	Impermeabilizante acrílico AQUAZERO 8 años en tono rojo colonial. (Incluye suministro e instalación)	M2	1.443,61	$ 163.770.445,37	21 días	20/04/26	16/05/26	7CC+1 día	9
13			Fin de obra			$ 0,00	0 días	25/05/26	25/05/26	9	

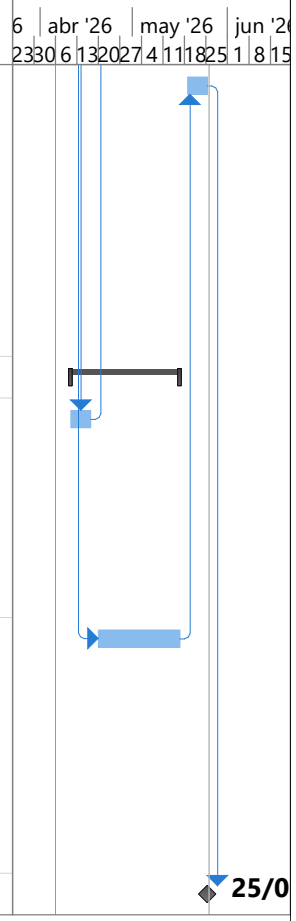


Proyecto: PROGRAMACIÓN
Fecha: 20/03/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual	
Tarea inactiva	solo el comienzo		
Hito inactivo	solo fin		



Proyecto: PROGRAMACIÓN
Fecha: 20/03/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



5/05

Proyecto: PROGRAMACIÓN
Fecha: 20/03/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			
