	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	1/20/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	10/03/2026				
INFORME No.	2	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	01/02/2026	Y EL	28/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO FORMUALAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HIDIRICO DE A CORRIENTE PRINCIAPL DEL RIO OPÓN Y SUS PRINCIPALES TRIBUTARIOS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS.				
ESTADO	EN EJECUCIÓN		PLAZO INICIAL CONTRATO	12 meses	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA		VALOR INICIAL CONTRATO	$ 265.881.681,84	
PROCESO No.:	CM2-029-2025		FECHA DE INICIO:	12/31/2025	
CONTRATO No.:	Contrato de Interventoría No. 01509-2025		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12/30/2026	
CONTRATISTA:	HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO		LOCALIZACIÓN	Santander	
NIT CONTRATISTA:	7.160.171		SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ	
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE		APOYO SUPERVISIÓN	RODOLFO SANCHEZ RUIZ / JHORMAN RAFAEL RAMIREZ PINTO	

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	12/31/2025	12/31/2025	12/30/2026	12 meses				
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)				12 meses				
% AVANCE FISICO				10.20%				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTÍAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	BY-100060808	27/01/2026		CUMPLIMIENTO	12/31/2025	10/07/2027	$ 53.176.336,37
				PAGO DE SALARIOS	12/31/2025	10/01/2030	$ 53.176.336,37
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS			
				CALIDAD DEL SERVICIO	12/31/2025	10/01/2028	$ 53.176.336,37
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL	BY-100010241	27/01/2026		PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	31/12/2025	10/01/2027	$ 284.700.000,00

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	1/20/2026

2. EJECUCION PRESUPUESTAL

ANTICIPO < SI aplica>	$ 0.00
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0.00
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 0.00
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 265.881.681,84
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 265.881.681,84
VALOR ADICION(ES):	$ 0.00
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 265.881.681,84
VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR POR PAGAR:	$ 265.881.681,84
% POR PAGAR	100.00%
% AVANCE FINANCIERO	0.00%


ADICIONES

CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR
TOTAL DE ADICIONES			$ -

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
TOTAL		$ -

3. CURVA "S"

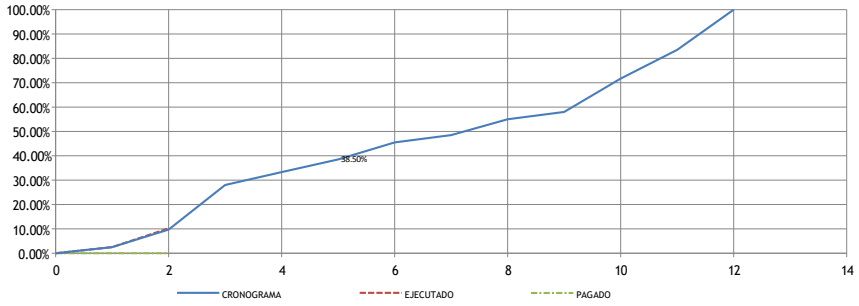

MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0.00%	0.00%	0.00%
1	2.50%	2.50%	0.00%
2	9.70%	10.20%	0.00%
3	28.00%		
4	33.30%		
5	38.50%		
6	45.50%		
7	48.50%		
8	55.00%		
9	58.00%		
10	71.70%		
11	83.50%		
12	100.00%		

PROGRAMADO	9.70%	
EJECUTADO	10.20%	
ATRASOS	0.50%	
DESEMPEÑO		1.05
% PAGADO A LA FECHA	0.00%	
Pendiente por Ejecutar total	$ 265.881.681,8435	
% POR CANCELAR A LA FECHA	100.00%	
Indice de avance financiero		0.00

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervisión

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	1/20/2026

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	1/20/2026

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS, REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

En el marco del seguimiento realizado, se informa que la consultoría ha cumplido con actividades clave orientadas al fortalecimiento del proyecto, entre las cuales se destacan:

Revisión y aprobación del Plan Operativo, asegurando la coherencia metodológica y la viabilidad de las actividades programadas.

Localización del cuerpo de agua objeto de estudio, estableciendo la base geográfica para el desarrollo técnico

Identificación de actores relevantes, con el fin de garantizar la participación institucional y comunitaria en el proceso.

Recopilación de información proveniente de instrumentos existentes, que aporta antecedentes técnicos y normativos al análisis.

Levantamiento de información de las redes hidrometeorológicas, hidrobiológicas y de calidad hídrica existentes, consolidando datos fundamentales para la caracterización del recurso.

Revisión detallada de las redes hidrobiológicas y de calidad del agua, con el propósito de validar la pertinencia y confiabilidad de los registros disponibles

Identificación preliminar de usuarios del recurso hídrico y clasificación de los usos actuales, insumo esencial para la gestión integral del recurso.

Revisión de información asociada a conflictos por uso del recurso hídrico, lo cual permitirá anticipar riesgos y proponer medidas de manejo.

La interventoría reconoce el avance logrado en la recopilación y sistematización de información, así como la articulación con actores estratégicos. Se continuará con el seguimiento permanente para verificar la calidad técnica de los productos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, garantizando que los resultados respondan a los objetivos del proyecto.

SE REALIZA MEMORANDO EN REMISIÓN DE LA SOLICITUD A GIT COMUNICADA POR LA INTERVENTORIA PARA LA CREACIÓN DEL APLICATIVO (SURVEY 123) EN LAS ACTIVIDADES DE CENSO DE USUARIOS

SE ENVIA MEMORANDO A LAS SUBDIRECCIONES EN SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA, PARA LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES

SE DA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 01512-2025

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>



Segundo Comité Técnico



Actas aclaratorios



Aprobación de Plan Operativo




Localizacion del cuerpo de agua



Identificacion de actores



Información de las Redes Hidrometeorológicas




Información de las Redes Hidrobiológicas y de Calidad del Agua




Notificación Preliminar de Usuarios del Recurso Hídrico y Clasificación de los Usos Actu



Reunión Supervisión CAS



Reunión Supervisión CAS



Oficios CAS

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

Nombre:

SUPERVISOR / INTERVENTOR
EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	JHORMAN RAFAEL RAMIREZ PINTO	Contratista SPL	
REVISO:	RODOLFO SANCHEZ RUIZ	Funcionario Esp. SPL	
V.B:			
