INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA EN LA EJECUCIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No MS-SAMC-007-2025

1. DATOS GENERALES

Tabla 1. Datos generales tipo de informe y supervisor

TIPO DE INFORME	**PERIÓDICO**	X	**FINAL**	
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE**	22 - 08 - 2025	**HASTA**	15- 10 - 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	**ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ**			
DEPENDENCIA:	**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS**			
CARGO:	**SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS**			

2. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO SUPERVISADO

Una vez la administración municipal de Sáchica inició el contrato No. MS-SAMC-007-2025 y completó el proceso de evaluación, se adjudicó el contrato de mínima cuantía al proponente HECTOR JULIO CORREA PORRAS continuación, se presentan datos relevantes del contrato adjudicado:

Tabla 2. Información del contrato de obra

CONTRATO No:	**MS-SAMC-007-2025**
FECHA FIRMA DE CONTRATO:	16 DE JULIO DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SACHCA
CONTRATISTA	HECTOR JULIO CORREA PORRAS NIT: 9.532.244-6
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR JULIO CORREA PORRAS C.C 9.532.244 DE SOGAMOSO
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES, MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRAMA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE SACHICA.
PLAZO INICIAL TOTAL:	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
PRORROGA 001	UN (1) MES
PLAZO TOTAL	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($199.700.000) M/CTE
VALOR ADICIONAL	TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS ($31.717.000) M/CTE
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS ($231.417.000) M/CTE
FECHA DE INICIO:	16 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO	15 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA PRESENTE ACTA	15 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR	**ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ** SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

3. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. MS-SAMC-007-2025 los cuales hacen parte integral del presente contrato. El 100% de las actividades aquí contempladas cuentan con la supervisión correspondiente, garantizando que éstas cumplan con las especificaciones y estándares establecidos.

Tabla 3. Cuadro de ítems y cantidades del presupuesto contractual ejecutadas ACTA PARCIAL 001.

ITEM	DESCRIPCION.	UNID	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL - INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN SEDE CENTRO	Unid	1	$ 31.800.500	$ 31.800.500
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL PRIMERA INFANCIA - CENTRO DESARROLLO INFANTIL HUELLITAS DEL SABER	Unid	1	$ 22.720.500	$ 22.720.500

3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL MODULAR -PARQUE PRINCIPAL	Unid	1	$ 31.800.500	$ 31.800.500
4	MANTENIMIENTO GENERAL DE PARQUE INFANTIL - PARQUE CENTRAL	Glob	1	$ 15.835.500	$ 15.835.500
5	SUMINISTRO E INSTALCION DE GRAMA SINTETICA - PARQUE CENTRAL	Glob	1	$ 6.646.250	$ 6.646.250
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL MODULAR - INSTITUCIÓN EDUCATIVA TINTAL	Unid	1	$ 22.720.500	$ 22.720.500
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARQUE INFANTIL - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESPINAL	Unid	1	$ 31.800.500	$ 31.800.500
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA, PAISAJISMO Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PARQUE EXISTENTE - INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARRAYAN ALTO	Glob	1	$ 13.655.250	$ 13.655.250
				TOTAL	**$ 176.979.500**

Tabla 4. Cuadro de ítems y cantidades del presupuesto contractual – ACTIVIDADES ACTA DE RECIBO FINAL

ITEM	SITIO DE EJECUCION	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANT	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
01	"INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE QUEBRADA ARRIBA"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARQUE INFANTIL-INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUEBRADA ARRIBA"	UND	1	22.720.500	22.720.500
02	"INSTITUCION EDUCATIVA VEREDA TINTAL, SEDE SAN LORENZO "	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA TIPO PAISAJISMO PARA EL PARQUE EXISTENTE EN INSTITUCION EDUCATIVA VEREDA TITAL, SEDE SAN LORENZO	M2	45	$ 161.000	$ 7.245.000
03	"INSTITUCION EDUCATIVA QUEBRADA ARRIBA"	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA TIPO PAISAJISMO PARA EL PARQUE EXISTENTE EN INSTITUCION EDUCATIVA QUEBRADA ARRIBA"	M2	40	$ 161.000	$ 6.440.000
04	"INSTITUCION EDUCATIVA ESPINAL"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA TIPO PAISAJISMO PARA EL PARQUE EXISTENTE EN INSTITUCION EDUCATIVA ESPINAL	M2	56	$ 161.000	$ 9.016.000
05	"INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE CENTRO "	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA TIPO PAISAJISMO PARA EL PARQUE EXISTENTE EN INSTITUCION	M2	56	$ 161.000	$ 9.016.000

		EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE CENTRO "				
					TOTAL	$ 54.437.500

3.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

La ejecución del contrato se realizará en el Municipio de Sáchica – Boyacá, el proyecto se ejecutará en las siguientes coordenadas:

UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO
"INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN QUEBRADA ARRIBA"	
"INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN SEDE ESPINAL"	

"INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN SEDE CENTRO "	
"INSTITUCION EDUCATIVA SAN LORENZO VEREDA TINTAL "	

7.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO


Tabla 4. Descripción registro fotográfico

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES, MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRAMA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE SACHICA.
1. "SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARQUE INFANTIL-INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUEBRADA ARRIBA"
DESCRIPCION: PARQUE INFANTIL PRIMERA INFANCIA-*AREA DE PARQUE:* 7m. largo x 5m. ancho x 3.m. alto. ***COMPONENTES:*** ✓ Dos (2) plataformas metalicas ✓ Un (1) techos castillo ✓ Una (1) escaleras paso seguro, con barandas de proteccion ✓ Un rodadero cuchara de 2.40 m. ✓ Un tunel plastico rotomoldeado

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES, MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRAMA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE SACHICA.

- ✓ un deslizadero olas 2.40 m.
- ✓ un juego de triqui
- ✓ un muro de escalar con manijas
- ✓ un cerramiento lado columpio



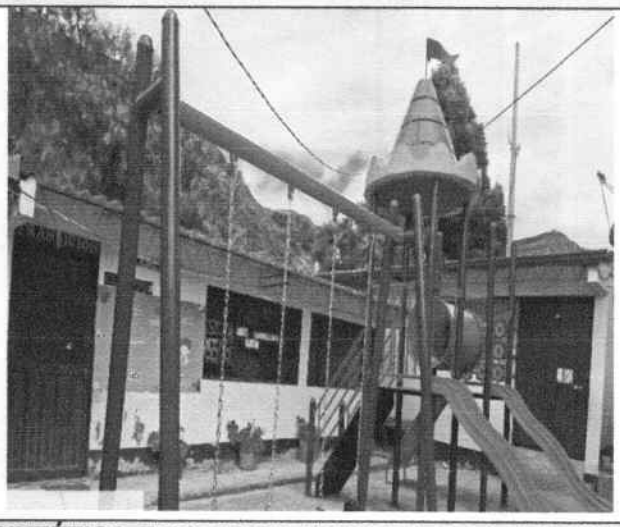

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA TIPO PAISAJISMO PARA EL PARQUE EXISTENTE EN INSTITUCION EDUCATIVA VEREDA TITAL, SEDE SAN LORENZO

✓ Preparacion del terreno



Revision y mantenimiento

✓ Capa de base



Colocacion de grama sintetica

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES, MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRAMA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE SACHICA.





2. "SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA TIPO PAISAJISMO PARA EL PARQUE EXISTENTE EN INSTITUCION EDUCATIVA QUEBRADA ARRIBA"





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA TIPO PAISAJISMO PARA EL PARQUE EXISTENTE EN INSTITUCION EDUCATIVA ESPINAL

LIMPIEZA DEL TERRENO: Retira piedras, raíces, basura y cualquier material orgánico. Si hay pasto natural, se debe remover completamente (puede usarse una pala o maquinaria).	**BASE DE SOPORTE:** Se añade una capa de arena fina o polvo de piedra **(2–3 cm)** y vuelve a compactar.


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES, MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRAMA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE SACHICA.





INSTALACIÓN DE LA MALLA ANTIHIERBA: Se extiende una malla geotextil sobre toda la superficie.

COLOCACIÓN DEL PASTO SINTÉTICO

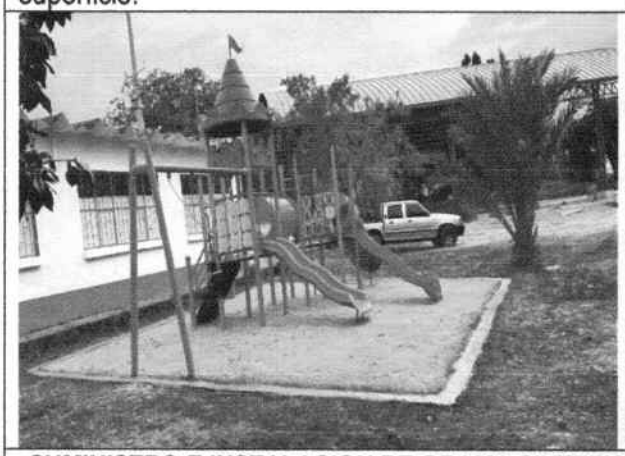




SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA TIPO PAISAJISMO PARA EL PARQUE EXISTENTE EN INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION CENTRO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES, MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRAMA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE SACHICA.







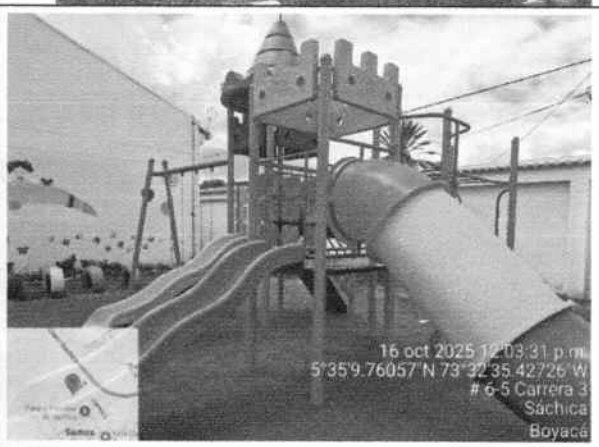

4. COMPONENTE FINANCIERO

4.1 FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

FUENTE CONTRACTUAL INICIAL

RUBRO	FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.005.12	1.3.3.3.17	PROYECTO INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL / R.B. IMPUESTO DE TRANSPORTE POR	$ 199.700.000

		OLEODUCTOS Y GASODUCTOS / VIVIENDA, CIUDADYT	
ADICIONAL Y PRORROGA No 001 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
2.3.2.02.02.005.06	1.2.3.1.16	PROYECTO INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL / R.B. IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS / VIVIENDA, CIUDADYT	$ 31.717.000

4.2 BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$** 199.700.000
VALOR ADICIONAL:	$ 31.717.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 231.417.000**
ANTICIPO DEL 0 %:	-
PARCIAL No.1:	$ 176.979.500
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO:	-
VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL:	**$** 54.437.500

VALOR TOTAL PARA CANCELAR PRESENTE ACTA: **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 54.437.500).**

5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El municipio recibió a satisfacción el objeto contractual en lo correspondiente al 88.62 % de ejecución del contrato de suministro No **MS-SAMC-007-2025**

6. PROCEDE PAGO

Una vez revisados los términos del contrato y verificado que todas las condiciones han sido cumplidas adecuadamente por **HECTOR JULIO CORREA PORRAS**, procede realizar el pago correspondiente conforme a lo acordado.

Tabla 5. Aprobación pagos.

SI	NO
X	

7. GARANTÍAS CONTRACTUALES

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

Que, en ese orden de ideas, el contratista **HECTOR JULIO CORREA PORRAS** identificado con cedula de ciudadanía No. C.C. 9.532.244 de Sogamoso - Boyacá a través del portal transaccional SECOP II público la Póliza de Seguros del Estado No. 51-46-101022434 de fecha de expedición 14 de julio de 2025, proferido por Seguros del Estado, cuyos amparos, vigencias y cuantías, se relacionan a continuación:

1. *Tabla Relación de Garantías*

AMPARO	No POLIZA	VALOR	CUANTIA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	51-46-101022434	$ 46.283.400	20%	00:00 Horas del 14/07/2025 HASTA 24:00 Horas del 14/02/2026	SEGUROS DEL ESTADO
PRESTACIONES SOCIALES	51-46-101022434	$ 46.283.400	20%	00:00 Horas del 14/07/2025 HASTA 24:00 Horas del 14/10/2028	SEGUROS DEL ESTADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	51-46-101022434	$ 69.425.100	30%	00:00 Horas del 14/07/2025 HASTA 24:00	SEGUROS DEL ESTADO

8. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES

Se realizó el suministro e instalación de parques infantiles en las instituciones educativas Nueva Generación, sedes Arrayán Alto, Espinal, Quebrada Arriba y Tintal. De igual manera, en el área urbana se efectuó la instalación de parques infantiles en la Institución Educativa Nueva Generación, sede Centro, en el Parque Infantil de Primera Infancia – Centro de Desarrollo Infantil "Huellitas del Saber", y en el Parque Principal del municipio de Sáchica, Boyacá.

Así mismo, se llevó a cabo la instalación de grama en cuatro instituciones educativas priorizadas: Escuela El Espinal, Tintal, Quebrada Arriba y Sede Centro.

ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
