CONTRATO [ ] CONVENIO [X]

Proyecto (S): Aunar esfuerzos para la reproducción inducida de postlarvas y alevinos de peces nativos, con el objeto de repoblar el medio natural y fomentar la piscicultura comunitaria en el departamento de Córdoba.

LOCALIZACIÓN: El proyecto se desarrollará en las estaciones piscícolas de la CVS, ubicadas en los municipios de Lorica y Ayapel en el departamento de Córdoba. Las actividades de repoblamiento se desarrollarán en 8 áreas naturales del departamento de Córdoba.

Vereda: _____

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: Mayo 2026

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONVENIO N°:	**006 – 2026**
TIPO DE CONVENIO:	**Convenio de Asociación**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO:	26/01/2026
CONVENIANTE:	FUNDACIÓN OMACHA
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO TRUJILLO GONZALEZ
OBJETO:	Aunar esfuerzos para la reproducción inducida de postlarvas y alevinos de peces nativos, con el objeto de repoblar el medio natural y fomentar la piscicultura comunitaria en el departamento de Córdoba.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$1.072.239.443
ANTICIPO (40%):	Si_X_ No___ Valor: $386.006.199
PLAZO INICIAL:	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO:	Enero 28 de 2026
FECHA DE TERMINACION:	28 de Agosto de 2026

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	NA	NA
	Reinicio No. 1	**NA**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**NA**		
PRÓRROGAS:	**NA**		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	**NA**		
VALOR DE ADICIÓN	**NA**		
APORTE CVS DE LA ADICIÓN	**NA**		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	juridico@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**25-44-101210756**			**ANEXO No 0**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	Si	(26/01/2026)	(05/03/2027)	$107.223.944,30
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Si	(26/01/2026)	(05/03/2027)	$386.006.199,20
Calidad del servicio	Si	(26/01/2026)	(05/03/2027)	$107.223.944,30
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Si	(26/01/2026)	(05/09/2029)	$53.611.972,15
POLIZA RCE No	**25-40-101056068**			
Pago de responsabilidad civil extracontractual	Si	(26/01/2026)	(05/09/2026)	$350.181.000,00

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO: NA

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
Catorce millones (14.000.000) de alevinos de las especies bocachico y cachama	A la fecha, se han llevado a cabo 13 jornadas de inducción de bocachico (*Prochilodus magdalenae*). El cronograma de reproducción asistida avanza de acuerdo con los parámetros establecidos, manteniendo los muestreos semanales de reproductores para evaluar su estado de maduracion y programar las inducciones hormonales pertinentes. De forma complementaria, persisten las actividades rutinarias de organización y limpieza en las diferentes áreas de producción. Se adelantaron actividades de mejoras y adecuaciones en el sistema de capatación flotante de agua sobre el rio (barcaza).	20%
Áreas naturales repobladas con alevinos de peces nativos en el departamento de Córdoba.	Se encuentran en evaluación ocho (8) áreas naturales propuestas para las actividades de repoblamiento. La selección definitiva de estos puntos se formalizará mediante un acta de comité técnico, una vez se valide el cumplimiento de todos los criterios técnicos requeridos. Teniendo en cuenta la planificación del cronograma de entregas estructurado junto a la empresa URRÁ S.A. E.S.P., se definió la fecha de inicio para el suministro de los alevinos destinados al repoblamiento en el área natural seleccionada, dando continuidad a los procesos y asegurando el cumplimiento de los objetivos propuestos.	12%
Talleres o asesorías técnicas a comunidades de la cuenca del Sinú y del San Jorge, para promover el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos.	A la fecha se reportan 6 actividades técnicas realizadas con comunidades, con la participación de 46 asistentes: - 19 marzo 2026, Ayapel: ASOPESPAL resguardo Las Catas. - 24 abril 2026, Buenavista: AGROPESCAS. - 8 mayo 2026, Buenavista: ASOGENOVA. - 8 mayo 2026, Buenavista: ASOPROAGROVIES. - 15 mayo 2026, Ayapel Asociación ASOPESPAL Corregimiento Palotal. - 22 mayo 2026, Monteria: Asociación ASOCALPAL Corregimiento Las Palomas. Se avanza en la programación para dar continuidad y finalizar los formativos en las comunidades.	90%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
Entrega de 2.000.000 alevinos de peces (Bocachico y Cachama) a comunidades de campesinos de la cuenca del Sinú y del San Jorge, como fortalecimiento a las actividades económicas y productivas del Departamento.	Con el inicio de las actividades de inducción de especies, se espera dar inicio a la programación de entregas de alevinos a las comunidades. Se mantienen activas las jornadas de acompañamiento y orientación a las comunidades para asegurar el correcto diligenciamiento de los formatos de solicitud, facilitando así el acceso a los futuros suministros.	8%
Apoyo académico a 50 estudiantes de programas a fines a la piscicultura.	A la fecha se reporta el apoyo académico de 96 estudiantes, asi: - 38 estudiantes programa de acuicultura de VI semestre, Universidad de Cordoba. - 25 estudiantes programa de MVZ, VI semestre, Universidad de Cordoba. - 33 estudiantes programa de acuicultura de VI semestre, Universidad de Cordoba. Desarrollando temas relacionados a la piscicultura como la observación y medición de parámetros técnicos de diseño de terraplenes, volúmenes de agua, manejo de fuentes de agua, taludes, toma de fuentes de aguas para la produccion piscícola, conocer los sistemas de estanques sin y con geomembrana. Además de produccion piscicola, manejo de cultivos, sanidad de peces y calidad del agua.	100%

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO: **$1.072.239.443**
VALOR ANTICIPO: **$386.006.199**
% AVANCE FINANCIERO: **40%**


ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	03/03/2026	$386.006.199				$386.006.199		$386.006.199
ACTA 01	01/06/2026	$289.504.649					$289.504.649	$289.504.649
ACTA FINAL								

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
• Solicitud y organización de documentos para inicio de contratación del recurso humano. • Programación y realización de exámenes médicos ocupacionales. • Consolidación de información para gestión de prendas de identificación institucional y EPP. • Instalación de señalizaciones • Inicio de actividades por parte del personal humano • Entrega EPP y prendas de identificación • Socializacion Plan sanitario y de bioseguridad • Demarcacion de áreas para precaución • Capacitación de la ARL	• Expedición de certificados y trámite de documentos. • Protección y promoción de SST del recurso humano. • Solicitud de prendas de identificación. • Ubicación y distribucion en las áreas y elementos. • Firma de contratos y afiliación de ARL • Uso de elementos de EPP y porte de prendas en el desarrollo de las actividades diarias. • Revisión de procesos, temas de salud y seguridad en el trabajo. • Instalación de cinta de advertencia • Programación y temáticas: o 21 abril 2026, Primeros Auxilios. o 7 mayo 2026, Riesgo mecánico. o 26 mayo 2026, Prevención y control del fuego.	Soportes de evidencia de las activiades (formatos y/o registros fotográficos)


VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO: N/A


REGISTRO FOTOGRAFICO

- **Optimización y adecuaciones de áreas y equipos**




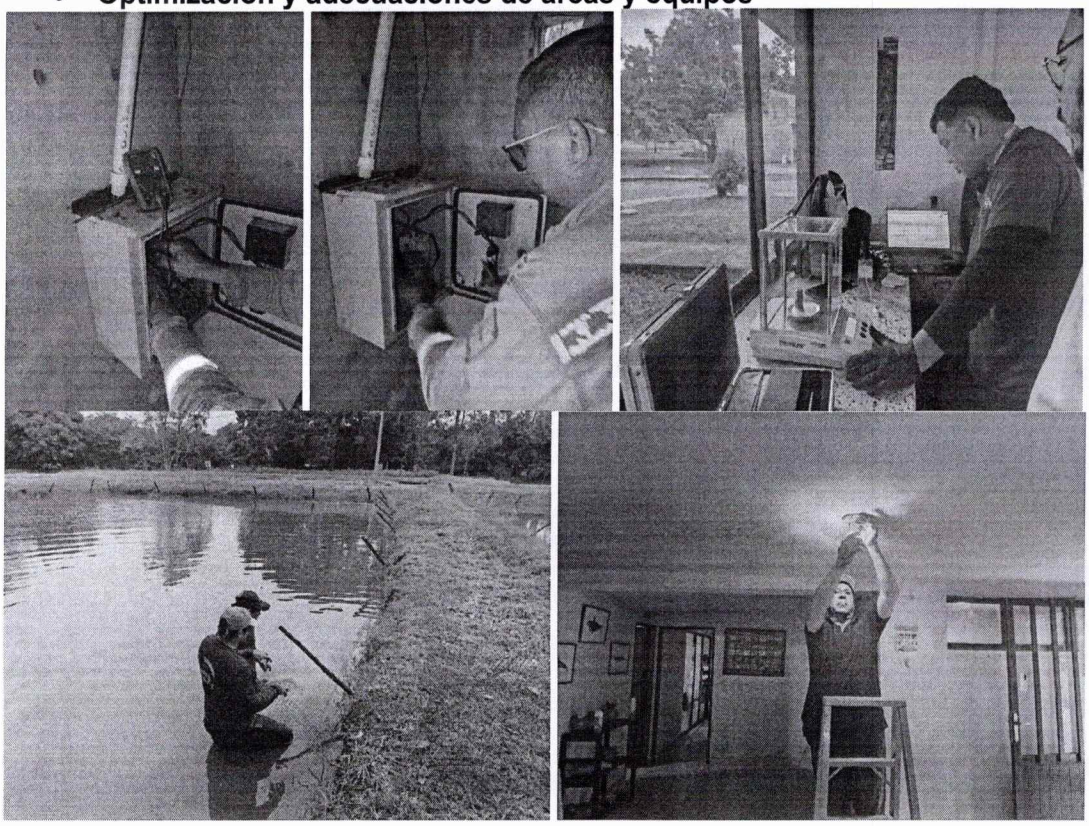


- **Pesca de reproductores y muestreo alevinos**

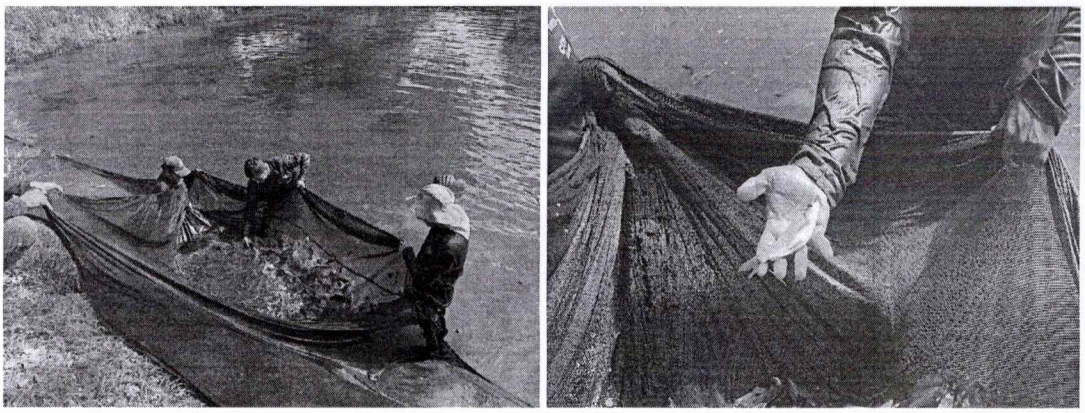



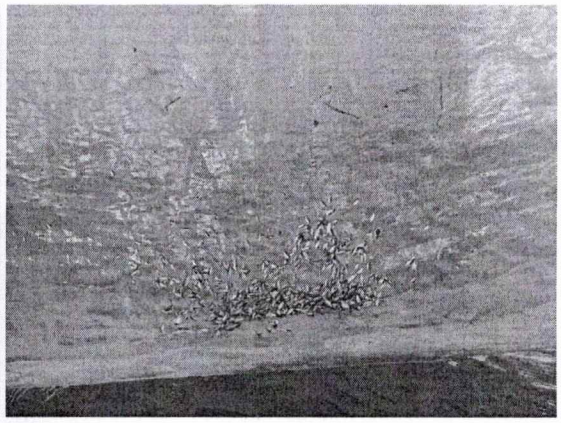
- **Asesorías o talleres técnicos a comunidades**

- **Apoyo académico a estudiantes de programas a fines a la piscicultura**

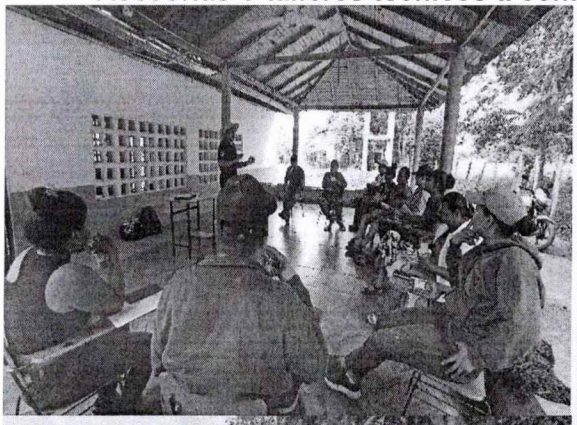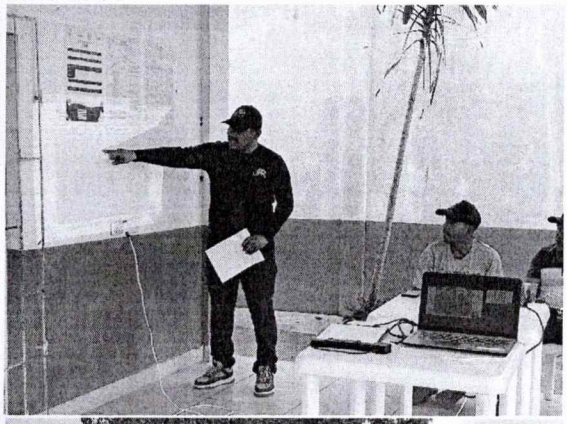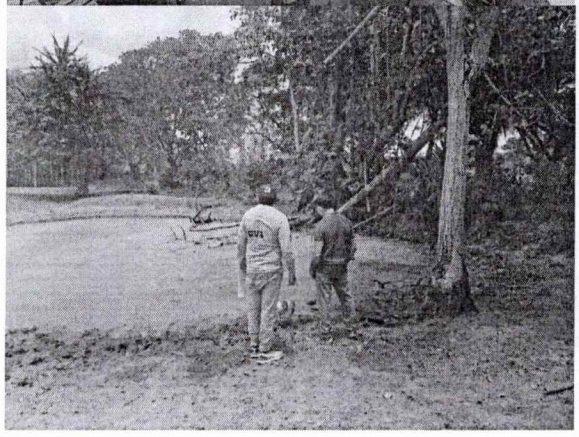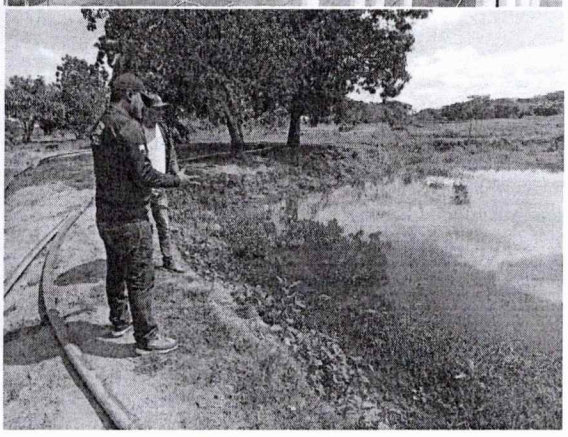


- **Capacitación ARL**

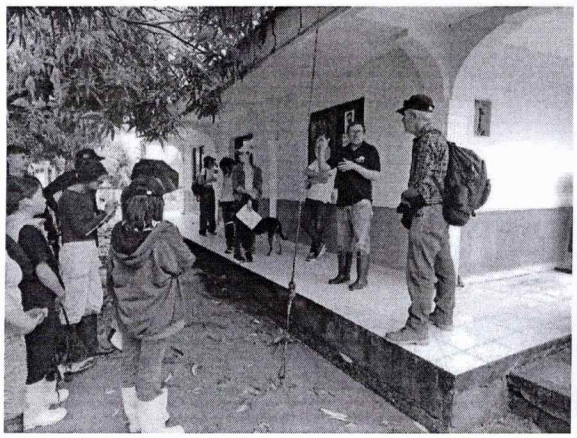CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

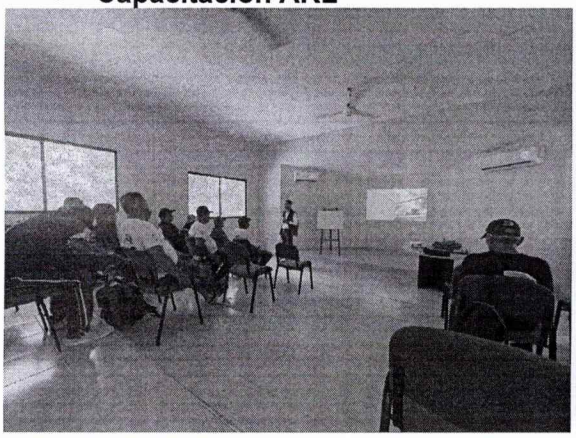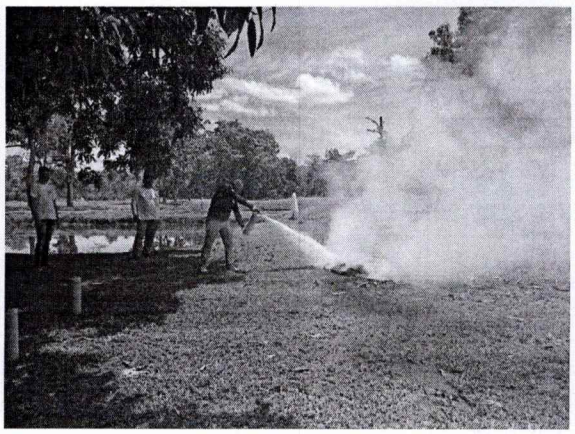La continuidad y rigurosidad en las labores de adecuación y optimización de la infraestructura y las áreas en general garantizan un entorno controlado y altamente eficiente para la obtención de postlarvas y alevinos, para asegurar cumpliento de objetivos. Tal como se había reportado en el periodo anterior las actividades de la limpieza del filtro y el material filtrante, en este reporte se destacan trabajos de optimización y mejoras en el sistema de capatación flotante de agua sobre el rio (barcaza).

Con el inicio de las inducciones hormonales, el proyecto entra en la fase preparatoria para el despliegue de las actividades de repoblamiento y fortalecimiento comunitario. Se avanza en la concertación y consolidación de las fechas para asegurar el desarrollo de los cronogramas establecidos.

Asi mismo, en lo relacionado con el tema comunitario y académico se registraron avances significativos en las actividades orientadas a promover el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos en las comunidades con la realización de 6 talleres o asesorías. Adicional con el apoyo académico brindado a 96 estudiantes de la Universidad de Cordoba del programa de acuicultura y de medicina veterinaria y zootecnia, fortaleciendo el vínculo interinstitucional con la academia.

Tal como se hace conocer al representante del conveniante y/o contratista e interventoría, quienes se dan por informado por la firma de este documento.

Para constancia se firma al primer (01) día del mes de junio del año 2026 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ
Supervisor CVS

DALILA CAICEDO HERRERA
Supervisora Fundación Omacha

Junio 01 de 2026
