FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO.

DESARROLLO ECONOMICO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 16/03/2026

MAICAO – GUAJIRA

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

PROPONENTE: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
RESPONSABLE: EDWIN YESID SOLANO GARCIA
CARGO: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
CORREO: desarrolloeconomico@maicao-laguajira.gov.co

II. SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	**FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO.**
FECHA DE PRESENTACIÓN:	19/01/2023
VALOR DEL PROYECTO:	VALOR TOTAL EN LETRAS. **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS** M/C ($376.001.771)
FUENTES DE FINANCIACIÓN:	Fuente 1: Valor $376.001.771
OBJETIVO:	Aumentar la capacidad productiva de los campesinos en el municipio de Maicao
FASE DEL PROYECTO:	Fase 3: Factibilidad
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 Meses
Número de beneficiarios:	3.500 personas
SENTENCIA T-302:	N/A

III. CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA

- **PLAN DE DESARROLLO NACIONAL:** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
  - **Sector:** Agricultura y desarrollo Rural
  - **Programa:** 1702 Inclusión productiva de pequeños productores rurales.

- **PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA:** 2024 – 2027 "Cumpliendo La Palabra"
  - **Sector:** Agricultura y desarrollo Rural

- **Programa:** 1702 Inclusión productiva de pequeños productores rurales.

➢ **Plan de desarrollo municipal:**
Es tiempo de Avanzar 2024-2027

- **Línea estratégica:**
  LINEA 2. ORDEN PRODUCTIVO Y AMBIENTAL

- **Programa presupuestal:**
  Inclusión productiva de pequeños productores rurales

- **Meta de Producto:**

  - 3. Beneficiar a 20 mujeres rurales con apoyo financiero para proyectos productivos.

  - 4. Beneficiar a 5 grupos de jóvenes rurales con apoyo financiero para proyectos productivos.

  - 9. Entregar una maquinaria para la producción agropecuaria de Maicao.

  - 10. Implementar una estrategia para el fomento de la asociatividad productiva.

  - 11. Beneficiar a 100 unidad productivas con servicios de acompañamiento productivo y empresarial.

  Producto:

  - Proyectos productivos cofinanciados
  - Mujeres beneficiadas
  - Grupos de jóvenes beneficiados
  - Maquinaria y equipos entregados
  - Estrategias implementadas
  - Unidades productivas beneficiadas.

  Indicador de Producto:
  170200700 – 170200703 – 170200705 - 170201401 - 170201701 – 170202100

IV. MARCO LEGAL

Constitución Política de Colombia (Art. 64 y 65): Es la base fundamental. Establece que es deber del Estado promover el acceso de los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra, servicios de educación, salud, crédito y comercialización. El Art. 65 dicta que la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado.

Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo): Obliga a que todo proyecto municipal esté articulado con el Plan de Desarrollo Municipal de Maicao 2024-2027. Sin esta alineación, no se pueden asignar recursos públicos.

Ley 731 de 2002 (Ley de la Mujer Rural): Mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales y establece prioridades en el acceso a recursos y proyectos productivos.

Ley 1622 de 2013 (Estatuto de Ciudadanía Juvenil): Promueve la vinculación de la juventud en los procesos de desarrollo económico y social del país.

Ley 1876 de 2017 (Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria - SNIA): Esta ley regula la Extensión Agropecuaria, definiéndola como un servicio público que busca la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de capacidades.

Ley 101 de 1993 (Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero): Regula la inversión en el sector agropecuario, incluyendo la adquisición de maquinaria y el apoyo a unidades productivas.

Ley 454 de 1998: Marco conceptual que regula la economía solidaria. Es el sustento para implementar estrategias que fomenten que los pequeños productores se unan legalmente para mejorar su competitividad.

Ley 2223 del 30 de junio de 2022 por la cual se institucionaliza la celebración del día del campesino y se dictan otras disposiciones.

Artículo primero. Institucionalizar la celebración del "Día del Campesino" en todo el territorio colombiano como reconocimiento y fomento de la identidad, las expresiones culturales campesinas, y exaltación de los

méritos de las campesinas y los campesinos, por su laboriosidad y valioso aporte a la producción y abastecimiento de alimentos, en la que se soporta el derecho a la alimentación de todos los colombianos, así como por su contribución al desarrollo económico nacional.

La celebración dispuesta por la presente ley será el escenario en el que, además dela agenda especial para la visibilizarían de este sector social y económico productivo, el gobierno nacional, los departamentos y municipios presenten las políticas, planes, programas y proyectos públicos en beneficio de las campesinas y los campesinos, Los órganos de gobierno aquí mencionados expedirán los actos administrativos requeridos.

Los alcaldes invitarán a los representantes de las asociaciones campesinas del municipio a participar en la conformación de la agenda de esta celebración, de acuerdo con las tradiciones y vocación local.

V. ANTECEDENTES

En el Municipio de Maicao se tienen registros del año 2000 y 2008. Sin embargo, desde entonces no se ha dinamizado más el día del campesino en el Municipio y no se conserva registro oficial.

VI. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y LA PROBLEMÁTICA ACTUAL

La principal problemática que influye en la ejecución de proyectos productivos rurales en Maicao, y gran parte de La Guajira, es la convergencia de la crisis hídrica y la baja capacidad productiva agropecuaria en la zona rural. La escasez de agua potable y para riego, sumada a los efectos del cambio climático y la infraestructura hidráulica deteriorada o inexistente, limita severamente las posibilidades de desarrollar y sostener alternativas agrícolas o pecuarias autosuficientes.

Esto, a su vez, genera una grave crisis alimentaria y una alta dependencia al asistencialismo por parte de las comunidades, que luchan por conseguir los alimentos básicos, lo que dificulta enfocar los esfuerzos en la sostenibilidad y el fortalecimiento productivo a largo plazo.

La situación actual en el municipio de Maicao, marcada por una deficiente capacidad productiva agrícola que se refleja en una producción que solo alcanza el 25% de su potencial en 2025, se caracteriza por una

inseguridad alimentaria crónica y un estancamiento económico en las áreas rurales.

La realidad es que tres cuartas partes del potencial productivo agrícola están desaprovechadas (75% de déficit). Esta baja capacidad productiva significa que la mayoría de los campesinos y comunidades rurales, muchas de ellas indígenas Wayuu, no logran generar la autosuficiencia alimentaria mínima necesaria. Depende fuertemente de la compra de alimentos externos o de programas de ayuda social y asistencialismo de las entidades territoriales para subsistir. Esta situación mantiene a una gran parte de la población rural en un estado de vulnerabilidad y pobreza multidimensional , ya que la actividad que debería ser su principal fuente de ingreso y sustento es ineficiente y de bajo rendimiento

Por otra parte, la invisibilidad social y económica de la labor del campesino, el desconocimiento a menudo, de su contribución a la seguridad alimentaria local y regional no se valora adecuadamente en términos de políticas públicas, inversión y reconocimiento social. Los campesinos del Municipio de Maicao no son agasajados desde hace dieciocho años, restándole importancia a su labor y al reconocimiento que merecen por labrar y producir la tierra para sustentar la canasta de los habitantes de nuestra región, es vital entender que a la fecha no se les ha hecho visibles tanto a ellos como a todos los componentes que lo rodean, ya que no reciben el apoyo institucional en este sentido, relegándolos a un segundo plano dentro del ámbito sociocultural del municipio.

Problema central:
Deficiente capacidad productiva de los campesinos en el municipio de Maicao

Causas directas:

- Baja adopción y disponibilidad de tecnología agropecuaria para los campesinos en el municipio

Causas indirectas

- Escasa inversión pública y privada en infraestructura y programas de capacitación en el sector.

- Escaso apoyo financiero a proyectos productivos de la zona rural
- Insuficiente apoyo financiero a mujeres rurales para proyectos productivos
- Escasa inversión pública y privada en infraestructura y programas de capacitación en el sector
- Escasa maquinaria para la producción agropecuaria de Maicao
- Insuficiente apoyo a unidades productivas del municipio con servicios de acompañamiento productivo y empresarial

Efectos directos

- Bajo rendimiento del sector agropecuario en el municipio.

Efectos indirectos

Aumento de la pobreza y la desigualdad

Magnitud actual del problema

En el año 2025 el potencial de producción agrícola del municipio de Maicao, fue del: 25%

Fuente: Estadísticas aportadas por la Umata - Secretaría de Desarrollo Económico Municipal

Imagen No. 2. Representación gráfica de la problemática (Árbol de problemas)



VII. OBJETIVOS

Objetivo General

Aumentar la capacidad productiva de los campesinos en el municipio de Maicao.

Indicador: Potencial de producción agrícola aumentado en el municipio: 5%

Objetivos específicos

- Incrementar la adopción y disponibilidad de tecnología agropecuaria para los campesinos en el municipio.


Fines directos

- Incremento del rendimiento del sector agropecuario en el municipio.

Fines indirectos

- Reducción de la pobreza y la desigualdad.

Imagen No. 3. Representación gráfica de los objetivos (Árbol de objetivos)

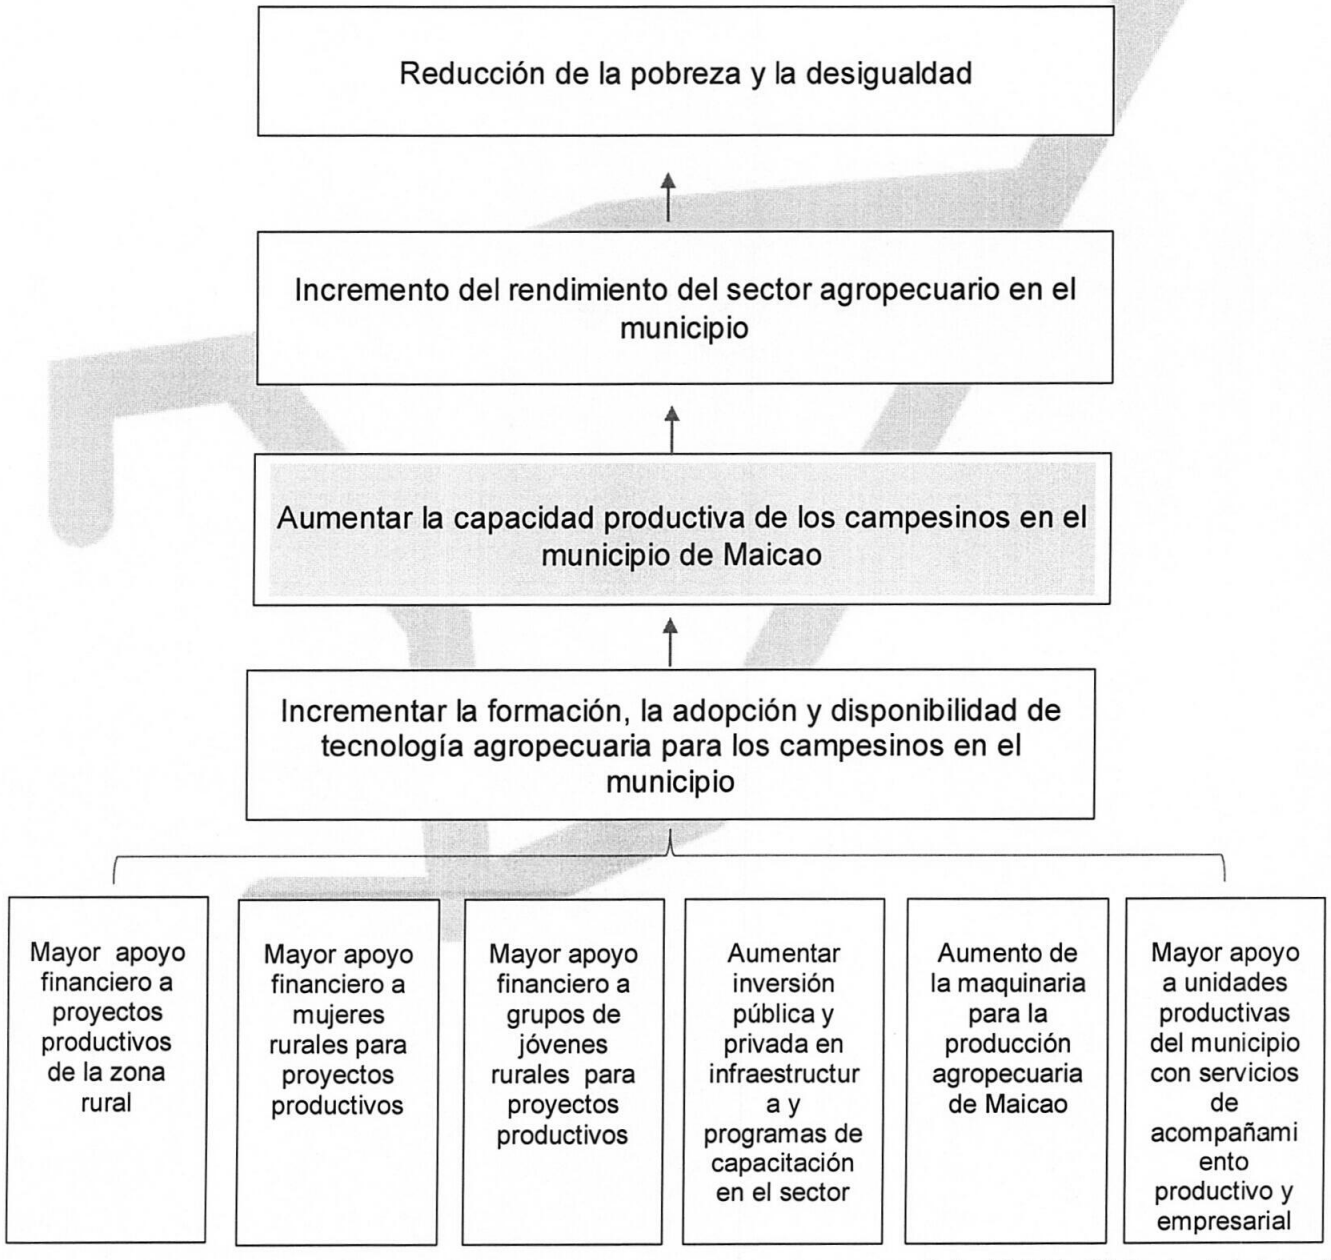

VIII. JUSTIFICACIÓN

La implementación de este proyecto se justifica en la necesidad imperativa de cerrar las brechas de desigualdad económica en las zonas rurales de Maicao, donde la falta de acceso a capital y asistencia técnica limita el potencial productivo de grupos vulnerables. Al priorizar a los campesinos entre ellos mujeres y jóvenes rurales , la iniciativa no solo cumple con los mandatos legales de inclusión y equidad de género, sino que ataca directamente el ciclo de pobreza mediante la capitalización de unidades productivas y la entrega de maquinaria. Esta inversión estatal actúa como un motor de reactivación económica, transformando la agricultura de subsistencia en modelos de negocio más competitivos y sostenibles que garantizan la seguridad alimentaria de la región.

Por otro lado, el fortalecimiento de la asociatividad y el acompañamiento empresarial responde a los desafíos actuales de los mercados agropecuarios, donde los pequeños productores suelen quedar aislados.

Al implementar una estrategia de fomento asociativo y brindar servicios de extensión agropecuaria a unidades productivas, se busca generar economías de escala que faciliten la comercialización y reduzcan los costos de producción. Este enfoque integral asegura que el apoyo financiero no sea un esfuerzo aislado, sino parte de un ecosistema de crecimiento robusto que promueve el arraigo al territorio y formaliza el tejido productivo rural del municipio El aumento del reconocimiento social hacia los campesinos de Maicao no es solo un acto de justicia, sino una inversión estratégica en el futuro del municipio y la región. Su labor, a menudo invisible y poco valorada, constituye el cimiento de la seguridad alimentaria, la preservación cultural y la sostenibilidad ambiental en La Guajira.

Los campesinos son los productores primarios de los alimentos que consumen los habitantes de Maicao y contribuyen significativamente al abastecimiento de la región. Su conocimiento ancestral sobre la tierra, las semillas y las prácticas agrícolas sostenibles es crucial para mantener la diversidad de cultivos y asegurar el acceso a alimentos frescos y nutritivos. Ignorar su labor pone en riesgo la autonomía alimentaria y la salud pública.

Las prácticas agrícolas tradicionales de los campesinos de Maicao están intrínsecamente ligadas a la cultura local y al conocimiento ancestral

transmitido de generación en generación. Además, su manejo de la tierra a menudo favorece la conservación de la biodiversidad local, protegiendo ecosistemas frágiles y especies nativas. Su invisibilidad social conlleva el riesgo de perder este valioso patrimonio y conocimiento.

Aunque a menudo operan en márgenes económicos estrechos, los campesinos dinamizan la economía local a través de la producción, el intercambio y, cada vez más, mediante iniciativas de agroturismo y mercados campesinos. Reconocer su valor puede impulsar políticas que fortalezcan sus emprendimientos y generen un desarrollo económico más inclusivo y sostenible para Maicao.

Sus prácticas agrícolas, adaptadas a las condiciones locales, pueden ofrecer soluciones valiosas para enfrentar los desafíos del cambio climático, como la escasez de agua y la degradación del suelo. Valorar su conocimiento y promover prácticas agroecológicas puede fortalecer la capacidad de adaptación de la región.

Un campesinado reconocido es un campesinado más involucrado en el desarrollo local, cuando los campesinos se sienten valorados y escuchados, es más probable que participen activamente en la toma de decisiones y en la implementación de políticas que afectan sus vidas y el futuro de Maicao. Su experiencia y conocimiento son fundamentales para diseñar estrategias de desarrollo rural efectivas y sostenibles.

IX. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

a. Identificación

ACTOR	EXPECTATIVA	POSICIÓN	TIPO DE CONTRIBUCIÓN
ALCALDIA DE MAICAO	Mejorar los indicadores de desarrollo rural, reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria, cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo	Cooperante	Financiera, legal y técnica

	Municipal y asegurar la paz social en las zonas rurales..		
ENTIDADES QUE APOYAN EL SECTOR AGROPECUARIO (Aliados Estratégicos)	Cumplir con sus objetivos misionales de desarrollo rural, asistencia técnica, transferencia de tecnología, financiación o articulación comercial (ADR , SENA , ICA , UPRA , Cooperativas, Gremios)	Cooperante	Técnica
COMUNIDAD DE CAMPESINOS DEL MUNICIPIODE MAICAO	Aumentar su capacidad productiva , mejorar sus ingresos económicos , alcanzar la seguridad alimentaria familiar y mejorar su calidad de vida.	Beneficiario	Servir de veedor para que se ejecuten las acciones de manera adecuada

b. Análisis de participantes

El proyecto de Fortalecimiento a Iniciativas Productivas Rurales en Maicao está directamente influenciado por tres grupos clave: la Alcaldía de Maicao , quien actúa como el principal facilitador y garantía político-financiero , siendo fundamental su compromiso para la asignación de recursos y la articulación territorial. La Comunidad de Campesinos , con una influencia crítica, es el corazón del proyecto, pues son los ejecutores directores de las iniciativas; su apropiación, participación y compromiso diario con las nuevas técnicas y tecnologías definirán si el proyecto alcanza la autosuficiencia y la sostenibilidad. Finalmente, las Entidades que apoyan el Sector

Agropecuario (como la ADR o el SENA), con alta influencia, son los aliados estratégicos que aportan el capital técnico, la asistencia especializada y el conocimiento para la transferencia tecnológica y la conexión con los mercados, siendo indispensables para superar la actual deficiencia productiva. El éxito del proyecto depende de la coordinación efectiva de estos tres actores: la gestión pública, el compromiso comunitario y el soporte técnico-institucional.

X. DATOS DE LA POBLACIÓN

Se toma como referencia toda la población general del Municipio de Maicao ya que se favorecería tanto directa como indirectamente durante la ejecución del proyecto.

Tabla no. 1: Identificación de la población afectada

Población Maicao rural			
RANGOS DE EDAD	**HOMBRES**	**MUJERES**	**POBLACION TOTAL**
0 a 14 años	13.187	12.186	25.373
15 a 19 años	3.721	3.722	7.443
20 a 59 años	15.820	17.609	33.429
Mayor de 60 años	2.093	2.797	4.890
Total población rural por genero	**34.821**	**36.314**	**71.135**

Fuente: Censo DANE 2018, proyección 2024 Post Covid

Tabla no. 2: Identificación de la población objetivo

La población directamente afectada por la necesidad identificada en el presente proyecto se encuentra conformada por la totalidad de productores rurales que se encuentran registrados oficialmente en la zona rural del Municipio de Maicao.

De los cuales se tomará un numero de 3.500 campesinos como población objetivo para adelantar este proyecto.

Población Rural Objetivo

RANGOS DE EDAD	HOMBRES	MUJERES	POBLACIÓN TOTAL
0 a 14 años	586	548	1.135
15 a 19 años	169	166	334
20 a 59 años	836	929	1.764
Mayor de 60 años	118	148	266
Total población rural objetivo por genero	**1.709**	**1.791**	**3.500**

Fuente: Secretaria de Desarrollo económico de Maicao 2024 – basado en datos de la oficina Umata Municipal.

XI. LOCALIZACIÓN

Departamento de La Guajira – Municipio de Maicao

XII. ALTENATIVA DE SOLUCIÓN PROPUESTA

Nombre de la alternativa: Fortalecer las iniciativas productivas rurales para aumentar la producción agrícola en el municipio.

Descripción de necesidades

Bien o servicio: Servicio de fortalecimiento de iniciativas productivas.

Medido a través de: Número

Descripción: Este servicio incluye las siguientes actividades: Brindar apoyo financiero a proyectos productivos de la zona rural, Beneficiar a mujeres rurales con apoyo financiero para proyectos productivos, Beneficiar a grupos de jóvenes rurales con apoyo financiero para proyectos productivos, Entregar una maquinaria para la producción agropecuaria de Maicao Implementar una estrategia para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria.

Descripción de la oferta: Iniciativas productivas fortalecidas.

Descripción de la demanda: Iniciativas productivas que requieren fortalecimiento

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2025	0	1	- 1
2026	1	1	0

XIII. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA

Para el desarrollo de la alternativa se realizarán las siguientes actividades:

Brindar apoyo financiero a proyectos productivos de la zona rural, en la cual se pretende beneficiar a dos proyectos productivos a través de la selección de las iniciativas presentadas. Para la segunda actividad se busca beneficiar a mujeres rurales con apoyo financiero para proyectos productivos en un número de 25 mujeres que serán seleccionadas por el equipo ejecutor del proyecto, La tercera actividad pretende beneficiar a grupos de jóvenes rurales con apoyo financiero para proyectos productivos, estos jóvenes serán seleccionados de las comunidades victimas del conflicto armado que se encuentran habitando en el municipio, así mismo se buscará realizar la entrega de una maquinaria a una comunidad agrícola con el fin de brindarles herramientas para aumentar la producción agropecuaria de Maicao, finalmente se pretende implementar una estrategia para el fomento de la asociatividad productiva en los campesinos del municipio que ayude a mejorar el proceso organizativo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

Cada actividad se estará desarrollando de la siguiente manera:

Actividad No. 1. Brindar apoyo financiero a proyectos productivos de la zona rural:

En esta actividad se busca beneficiar al menos a 2 proyectos productivos de la zona rural. Para lo cual se pretende realizar una fase inicial de selección de beneficiarios donde se seleccionen al menos 50 personas a las cuales se les brindarán 2 jornadas de capacitaciones y asesoría sobre el manejo de proyectos agropecuarios. Estas capacitaciones tendrán una duración de 4 horas cada una por un lapso de dos días.

De igual manera se estarán seleccionando como mínimo dos proyectos productivos agropecuarios para realizarle una dotación en especie como apoyo logístico que les permita fortalecer sus iniciativas productivas en el sector rural. Esto se realizará a

través de la entrega de la adquisición y entrega de kits de productividad (En especie) para fortalecimiento de los proyectos productivos focalizados de acuerdo a su nivel económico e idea de proyecto productivo sea para iniciar o fortalecer la misma por un valor de hasta Cuatro Millones Quinientos Ochenta y Tres Mil Novecientos veinticuatro Pesos ($4.583.924,oo).

Parágrafo 1: Determinación del valor del cupo de dotación: Esta alternativa replica parcialmente la estrategia implementada por MINCIT, FIDUCOLDEX e INNPULSA Colombia, a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (SBDC) para "acompañar procesos de emprendimiento de población en situación de vulnerabilidad y/o víctimas del desplazamiento, que incluyen la identificación y mitigación de riesgos de fracaso en la puesta en marcha unidades de negocio de estas poblaciones". Bajo esta metodología la identificación de las necesidades específicas de mejora se hace durante la fase de inversión del proyecto y no en las fases de identificación y preparación como comúnmente se estila, asignando hasta Ocho Millones de Pesos ($8.000.000) por empresa beneficiaria.

Bajo este modelo no predictivo de mejoras también se ejecuta el proyecto tipo DNP Váuchers de Innovación, en el marco del cual se identifican, priorizan y realizan las inversiones requeridas por las empresas beneficiarias respetando un cupo de cuarenta millones de pesos ($40.000.000) en promedio por cada una.

Finalmente se realizará la administración del proyecto donde se contratará personal idóneo para darle cumplimiento a las actividades programadas y la adquisición de elementos que sirvan para el fortalecimiento de la imagen institucional tales como gorras, suéteres, pendones etc.

El desarrollo total de la actividad será de 8 días, desde el momento que se inicie el proceso de selección de las personas beneficiarias del proyecto hasta la entrega de los kits a los proyectos seleccionados

Actividad No. 2. Beneficiar a mujeres rurales con apoyo financiero para proyectos productivos:

En esta actividad se busca beneficiar al menos a 20 proyectos productivos liderados por mujeres de la zona rural. Para lo cual se pretende realizar una fase inicial de selección de beneficiarios donde se seleccionen al menos 50 personas a las cuales se les brindarán 2 jornadas de capacitaciones y asesoría sobre el manejo de

proyectos agropecuarios. Estas capacitaciones tendrán una duración de 4 horas cada una por un lapso de dos días.

De igual manera se estarán seleccionando veinte proyectos productivos agropecuarios de mujeres para realizarle una dotación en especie como apoyo logístico que les permita fortalecer sus iniciativas productivas en el sector rural. Esto se realizará a través de la entrega de la adquisición y entrega de kits de productividad (En especie) para fortalecimiento de los proyectos productivos focalizados de acuerdo a su nivel económico e idea de proyecto productivo sea para iniciar o fortalecer la misma por un valor de hasta Dos Millones Ciento cuatro Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos. ($2.104.838.oo).

Finalmente se realizará la administración del proyecto donde se contratará personal idóneo para darle cumplimiento a las actividades programadas y la adquisición de elementos que sirvan para el fortalecimiento de la imagen institucional tales como gorras, suéteres, pendones etc.

El desarrollo total de la actividad será de 8 días, desde el momento que se inicie el proceso de selección de las personas beneficiarias del proyecto hasta la entrega de los kits a los proyectos seleccionados.

Actividad No. 3. Beneficiar a grupos de jóvenes rurales con apoyo financiero para proyectos productivos:

En esta actividad se busca beneficiar al menos a 5 proyectos productivos liderados por grupos de jóvenes de la zona rural. Para lo cual se pretende realizar una fase inicial de selección de beneficiarios donde se seleccionen al menos 50 personas a las cuales se les brindarán 2 jornadas de capacitaciones y asesoría sobre el manejo de proyectos productivos agropecuarios. Estas capacitaciones tendrán una duración de 4 horas cada una por un lapso de dos días.

De igual manera se estarán seleccionando cinco proyectos productivos agropecuarios liderados por grupos de jóvenes para realizarle una dotación en especie como apoyo logístico que les permita fortalecer sus iniciativas productivas en el sector rural. Esto se realizará a través de la entrega de la adquisición y entrega de kits de productividad (En especie) para fortalecimiento de los proyectos productivos focalizados de acuerdo a su nivel económico e idea de proyecto productivo sea para iniciar o fortalecer la

misma por un valor de hasta Cuatro millones cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos treinta y ocho pesos. ($4.497.838.oo).

Finalmente se realizará la administración del proyecto donde se contratará personal idóneo para darle cumplimiento a las actividades programadas y la adquisición de elementos que sirvan para el fortalecimiento de la imagen institucional tales como gorras, suéteres, pendones etc.

El desarrollo total de la actividad será de 8 días, desde el momento que se inicie el proceso de selección de las personas beneficiarias del proyecto hasta la entrega de los kits a los proyectos seleccionados.

Actividad No. 4. Capacitación en manejo de maquinarias agrícolas y Adquisición de Maquinarias agrícolas

Este ítem aunque se divide en las actividades 4 y 5 del proyecto, se convierten en un solo propósito que es la adquisición de una maquinaria y la capacitación en el manejo de la misma para apoyar a las comunidades agrícolas en sus procesos productivos.

En esta actividad se pretende adquirir un Dron totalmente dotado para desarrollar jornadas de fumigación a cultivos de los campesinos del municipio de Maicao, con una capacidad de 30 a 50 litros dependiendo de las condiciones del mercado y sistemas de navegación GPS/RTK para precisión. De igual manera se contratará un técnico especializado en el manejo de este tipo de equipos para realizar la capacitación a funcionarios de la administración municipal pertenecientes a la Umata y a miembros de la comunidad campesina los cuales se encargarán del uso y manejo del mismo.

Fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria que comprende el desarrollo de las actividades No. 6,7 y 8.

Con la implementación de estas actividades se busca resaltar a los campesinos y campesinas por su labor y contribución económica a la sociedad, fortalecer lazos entre la institucionalidad y el campesinado y recuperar la confianza en las corporaciones públicas. Con la participación activa de los diferentes actores y la selección de canales de comunicación efectivos que permitan lograr un impacto significativo y sostenible en la valoración del importante rol del campesinado en el municipio de Maicao.

Actividad No. 6. Realizar la fase promocional del proyecto:

En esta actividad se estarán realizando procesos publicitarios promoviendo la realización del evento durante seis días, en los cuales se invitará a los campesinos de toda la región para que se acerquen y participen de este evento.

Actividad No. 7. Realizar actos de integración a los campesinos del municipio de Maicao:

En este componente se estarán realizando una serie de charlas que serán ejecutadas por profesionales del ICA, EL SENA, Corpoguajira, Uniguajira y Agrosavia, los cuales buscarán a través de estas transmitir a los campesinos el conocimiento y la oferta de servicios que tienen estas entidades para apoyar el campesinado de la región, también se desarrollarán dentro de la jornada participaciones culturales y musicales en tarima para ambientar la celebración del día del campesino, finalmente se harán reconocimientos a algunos de los campesinos asistentes y a las asociaciones de las cuales ellos hacen parte.

Actividad No. 8. Realizar la dirección técnica y administrativa del proyecto:

En esta actividad se realizará la administración del proyecto donde se contratará personal idóneo para darle cumplimiento a las actividades programadas y la adquisición de elementos que sirvan para el fortalecimiento de la imagen institucional tales como gorras, suéteres, etc.

Actividad No. 9. Actividad 9: Realizar la selección de las unidades productivas beneficiarias:

En esta actividad se busca beneficiar al menos a 100 unidades productivas de la zona rural. Para lo cual se pretende realizar una fase inicial de selección de beneficiarios donde se seleccionen al menos 100 unidades productivas por parte del personal contratado para este proceso y posteriormente identificar a las personas representantes de las unidades productivas.

Actividad 10: Beneficiar a unidades productivas del municipio con servicios de acompañamiento productivo y empresarial.

A las cuales se les brindarán 2 jornadas de capacitaciones y asesoría sobre el manejo de proyectos agropecuarios. Estas capacitaciones tendrán una duración de 4 horas cada una por un lapso de dos días. De igual manera se estarán realizando entregas en las jornadas de capacitación de Material de formación (cartillas ilustradas tamaño media carta en papel bond, contiene 10 hojas con la información resumida de los diferentes temas que se desarrollarán en las capacitaciones con portada y contraportada impresas en propalcote 240 gr a full color. Una por cada tema de capacitación. Esto con el objetivo que los propietarios de las unidades productivas conserven información que les ayude a fortalecer sus procesos productivos.

De manera paralela durante el proceso de capacitación y los tres días siguientes a las mismas se estarán realizando visitas presenciales a las unidades productivas por el equipo de profesionales contratados y personal de apoyo, con el objeto de realizar inspecciones a las unidades productivas y realizar recomendaciones a los propietarios en busca de la optimización de sus procesos productivos.

Actividad 11: Realizar la dirección técnica y administrativa del proyecto.

Finalmente se realizará la administración del proyecto donde se contratará personal idóneo para darle cumplimiento a las actividades programadas y la adquisición de elementos que sirvan para el fortalecimiento de la imagen institucional tales como gorras, suéteres, pendones etc.

El desarrollo total de la actividades 9,10 y 11, será de 10 días, desde el momento que se inicie el proceso de selección de las personas beneficiarias del proyecto que consta de 5 días, el proceso de capacitación 2 días y 3 días para las visitas a las unidades productivas seleccionadas.

XIV. ANÁLISIS DE RIESGOS

NIVEL DE CLASIFICACIÓN	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EFECTOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Objetivo general	Administrativos	Dificultad administrativa para aumentar la capacidad productiva agropecuaria en el municipio de Maicao	Probable	Mayor	Reducción en la producción agropecuaria del municipio	Cumplir con la gestión administrativa de acuerdo a lo programado
Objetivo específico	Financieros	No se asignen los recursos para la ejecución del proyecto	Probable	Moderado	Reducción de la producción agrícola del municipio	Asignar las partidas presupuestales que garanticen la ejecución del proyecto
Actividad 1	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos	Agudización de la ola invernal en el territorio municipal	Moderado	Mayor	Dificultades para la movilidad a los sectores rurales	Tener plan de contingencia climática
Actividad 2	Operacional	Barreras de acceso a la autonomía financiera	probable	Moderado	Baja ejecución de los recursos asignados al proyecto	Implementar acciones y talleres de empoderamiento financiero con enfoque de género.

NIVEL DE CLASIFICACIÓN	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EFECTOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Actividad 3	Operacionales	Deserción o migración de los jóvenes hacia zonas urbanas antes de la consolidación del proyecto.	Probable	Mayor	Abandono de las unidades productivas y pérdida de la inversión pública	Vincular el apoyo a redes de asociatividad juvenil
Actividad 4	Operacionales	Baja transferencia de conocimiento por enseñanza inadecuada	Probable	Mayor	Deterioro prematuro de los equipos, accidentes laborales o subutilización de la maquinaria	Realizar capacitaciones prácticas (aprender-haciendo) y entregar manuales
Actividad 5	Administrativos	Dificultades en la gestión de proveedores y contratistas	Probable	Moderado	Retrasos en entregas de la maquinaria	Verificar antecedentes de cumplimiento y establecer cláusulas contractuales claras
Actividad 6	Operacionales	Incumplimiento de proveedores en la entrega de insumos o servicios para los eventos.	Probable	Moderado	Retrasos en el cronograma y descontento de la comunidad campesina.	Verificar antecedentes de cumplimiento y establecer cláusulas contractuales claras
Actividad 7	Operacionales	Alteraciones del orden público o problemas de seguridad que impiden la movilidad de los campesinos.	Probable	Moderado	Retrasos en el cronograma y descontento de la comunidad campesina.	Cancelación de eventos y riesgos para la integridad física de los asistentes.

NIVEL DE CLASIFICACIÓN	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EFECTOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Actividad 8	Administrativo	Rotación de personal o debilidad en el control de la ejecución presupuestal.	Probable	Moderado	Desviación de objetivos	Implementación de una planificación y seguimiento en tiempo real de las actividades.
Actividad 9	Administrativo	Percepción de falta de transparencia en la elección de los beneficiarios.	Probable	Moderado	Quejas ante entes de control, conflictos comunitarios y pérdida de legitimidad del proyecto.	Publicación de criterios de selección claros, conformación de un comité evaluador plural y veeduría ciudadana.
Actividad 10	Operacionales	Inasistencia de los beneficiarios a las sesiones de acompañamiento por cruce con sus trabajos agrícolas..	Probable	Moderado	Bajo impacto en el fortalecimiento a los campesinos	Ajustar el cronograma de visitas al calendario estacional agrícola y realizar el acompañamiento directamente en las fincas.
Actividad 11	Administrativos	Dificultades en la gestión de proveedores y contratistas	Probable	Moderado	Retrasos en entregas e implementación	Verificar antecedentes de cumplimiento y establecer cláusulas contractuales claras

XV. RESÚMEN DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	DURACIÓN
Aumentar la capacidad productiva de los campesinos en el municipio de Maicao	Incrementar la adopción y disponibilidad de tecnología agropecuaria para los campesinos en el municipio.	**Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos** - 2. Brindar anualmente apoyo financiero a 2 proyectos productivos de la zona rural - 170200700	Brindar apoyo financiero a proyectos productivos de la zona rural	Cumplimiento de actividades	100%	8 días
		Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos - 3. Beneficiar a 20 mujeres rurales con apoyo financiero para proyectos productivos - 170200703	Beneficiar a mujeres rurales con apoyo financiero para proyectos productivos	Cumplimiento de actividades	100%	8 días
		Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos 4. Beneficiar a 5 grupos de jóvenes rurales con apoyo financiero para proyectos productivos. – 170200705	Beneficiar a grupos de jóvenes rurales con apoyo financiero para proyectos productivos	Cumplimiento de actividades	100%	8 días
		Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos - 9. Entregar una maquinaria para la producción agropecuaria de Maicao - 170201401	Realizar la fase de capacitación y manejo de la maquinaria o equipo a dotar	Eventos realizados	1	2 días
			Adquirir y entregar una maquinaria para la producción agropecuaria de Maicao	Cumplimiento de actividades	100%	1 días
		Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria	Realizar la fase de alistamiento de celebraciones a los campesinos	Cumplimiento de actividades de alistamiento del evento	100%	6 días

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	DURACIÓN
		10. Implementar una estrategia para el fomento de la asociatividad productiva. - 170201701	Realizar actos de integración a los campesinos del municipio de Maicao	Eventos realizados	1	1 días
			Realizar la dirección técnica y administrativa del proyecto	Cumplimiento de actividades de administración del proyecto	100%	7 días
		Servicio de acompañamiento productivo y empresarial. 11. Beneficiar a 100 unidad productivas con servicios de acompañamiento productivo y empresarial – 170202100	Realizar la selección de las unidades productivas beneficiarias	Unidades productiva seleccionadas	100%	5 días
			Beneficiar a unidades productivas del municipio con servicios de acompañamiento productivo y empresarial	Cumplimiento de actividades de alistamiento del evento	100%	5 días
			Realizar la dirección técnica y administrativa del proyecto	Cumplimiento de actividades de administración del proyecto	100%	10 días

XVI. ANÁLISIS DE IMPACTOS

Explique los impactos positivos que el proyecto surtirá de acuerdo con las siguientes categorías:

1- Impacto económico: dinamización de la economía informal transitoria.

2- Impacto social: Generación de espacios de diálogos y construcción de acercamientos entre el campesinado y la institucionalidad.

3- Institucional: Fortalecimiento de las capacidades institucionales, mejora de la gobernanza local, desarrollo de las políticas públicas, mayor participación de la sociedad civil.

4- Político: Sector agropecuario empoderado con las políticas públicas.

XVII. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

- Desarrollar un plan de seguimiento y evaluación a largo plazo para asegurar que los logros perduren a lo largo del tiempo.
