	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/26

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	18/05/26				
INFORME No.	4	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	1/03/26	Y EL	31/03/26
OBJETO DEL CONTRATO	FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO (PORH) DE LA CORRIENTE PRINCIPAL DEL RÍO SOGAMOSO Y SUS PRINCIPALES TRIBUTARIOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS).				
ESTADO	EN EJECUCIÓN		PLAZO INICIAL CONTRATO	12 meses	
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA		VALOR INICIAL CONTRATO	$	2.712.674.896,00
PROCESO No.:	CM2-019-2025		FECHA DE INICIO:	31/12/25	
CONTRATO No.:	Contrato de consultoría No. 01511-2025		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/12/26	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PORH SOGAMOSO		LOCALIZACIÓN	Santander	
NIT CONTRATISTA:	902.020.735-2		SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	HERNANDO LEGUIZAMON	
LINK DE PROCESO	https://acortar.link/1U99m4		APOYO SUPERVISIÓN	CHRISTIAN BONILLA	

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	31/12/25	31/12/25	30/12/26	12				


2. EJECUCION PRESUPUESTAL

		ADICIONES			
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00				
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 0,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 2.712.674.896,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 2.712.674.896,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 2.712.674.896,00				
VALOR PAGADO:	$ 0,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 2.712.674.896,00				
% POR PAGAR	100,00%				
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
TOTAL		$ -

3. CURVA "S"

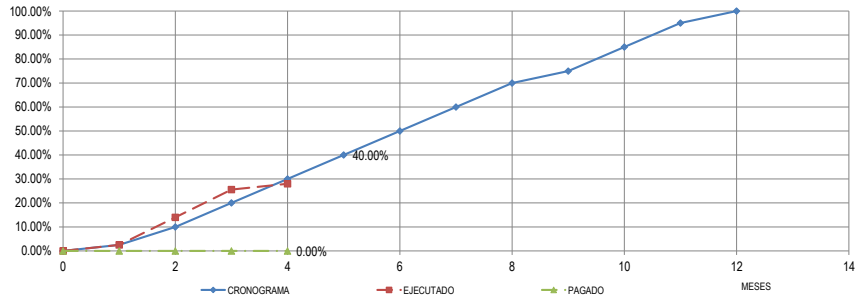

MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	2,50%	2,50%	0,00%
2	10,00%	14,00%	0,00%
3	20,00%	25,60%	0,00%
4	30,00%	28,00%	0,00%
5	40,00%		
6	50,00%		
7	60,00%		
8	70,00%		
9	75,00%		
10	85,00%		
11	95,00%		
12	100,00%		

PROGRAMADO	30,00%	
EJECUTADO	28,00%	
ATRASOS	-2,00%	
DESEMPEÑO		0,93
% PAGADO A LA FECHA	0,00%	
Pendiente por Ejecutar total	$	2.712.674.896,00
% POR CANCELAR A LA FECHA	100,00%	
Índice de avance financiero		0,00

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

En el marco del seguimiento realizado, se informa que la consultoría ha cumplido con actividades clave orientadas al fortalecimiento del proyecto, entre las cuales se destacan:

Diseño e implementación del proceso de participación

Definición de los tramos o sectores de análisis

Censo de usuarios y consolidación de información

Diseño y ejecución del plan de monitoreo

Identificación de zonas de recarga del acuífero o interacciones con las aguas superficiales


5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>




DISEÑO DE PROCESOS DE PARTICIPACION



TRAMOS DE ANALISIS



CENSO DE USUARIOS



DISEÑO PLAN DE MONITOREO



EJECUCION DE MONITOREO



MATERIALIZACION MOJONES



ESPACIOS DE SOCIALIZACION

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: **HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO**

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	Christian David Bonilla Beltrán	Director Interventoria	Christian Bonilla

REVISO:	Hernando Leguizamon Galindo	R/L Interventoria	
V.B:			

