	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	Febrero 18 de 2026				
INFORME No.	2	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	18/01/2026	Y EL	17/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO FORMULACION DEL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA POMCA DEL RIO FONCE CÓDIGO SZH 2402 EN JURISDICCION DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA y SANTANDER				

ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	CINCO (05) meses
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 594.050.760,00
PROCESO No.:	CM2-026-2025	FECHA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE 2025
CONTRATO No.:	01493-2025	FECHA DE TERMINACION INICIAL	17 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS	LOCALIZACIÓN	POMCA- DEL RIO FONCE (CÓDIGO SZH 2402) EN JURISDICCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ y SANTANDER
NIT CONTRATISTA:	900.305.400 - 8	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ - Subdirectora de planeación y ordenamiento ambiental
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9211515&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	APOYO SUPERVISIÓN	INGENIERO RODOLFO SANCHEZ

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Inicio Contrato	18/12/2025	18/12/2025	17/05/2026	5M-150 D	0	17/05/2026	No	NA
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)				5	150			
% AVANCE FISICO				3%				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTÍAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	11-44-101272742	15/12/2025	2	CUMPLIMIENTO	12/12/2025	11/05/2026	$ 118.810.152,00
				PAGO DE SALARIOS	12/12/2025	12/05/2026	$ 118.810.152,00
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS	NA	NA	
				CALIDAD DEL SERVICIO	12/12/2025	12/05/2026	$ 118.810.152,00
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS	NA	NA	NA
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	NA	NA	NA
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NA	NA	NA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL	11-40-101086864	15/12/2025	2	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			$ 284.700.000,00

2. EJECUCION PRESUPUESTAL


ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	**ADICIONES**			
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00	CONCEPTO		FECHA	VALOR
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 594.050.760,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 594.050.760,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICIÓN(ES)	$ 594.050.760,00				
VALOR PAGADO:	$ 0,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 594.050.760,00				
% POR PAGAR	100,00%				
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	**TOTAL DE ADICIONES**			$ -

2,1. SITUACION FINANCIERA

CONTRATO DE <Interventoria , Obra,Consultoría, Convenio, Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Estudios, Diseño y Obra, otro>

CONCEPTO	FECHA	VALOR
TOTAL		$ -

3. CURVA "S"

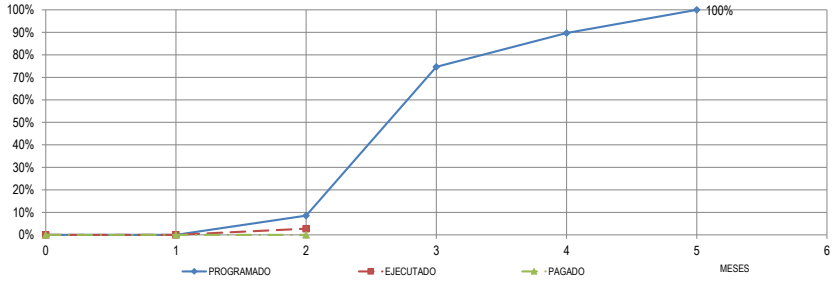

MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	PAGADO
0	0%	0%	0%
1	0%	0%	0%
2	9%	3%	0%
3	75%		
4	90%		
5	100%		

PROGRAMADO	9%	
EJECUTADO	3%	
ATRASOS	-6%	
DESEMPEÑO		0,32
% PAGADO	0%	
Pendiente por cancelar	$	16.336.396
Pendiente por can	$	577.714.364
Índice de avance financiero		0,00

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

OBSERVACIONES

Si Observaciones

ACTIVIDADES REALIZADAS

Revision de los documentos 1.1.1. Plan de trabajo - 1.1.4 Proceso de conformación del consejo de cuenca - 1.1.5. Recopilacion y análisis secundaria - 1.1.7 Plan operativo detallado - Se enxa PDT con fujlo fisoc y financiero con corte a la semana 9

REPORGRAMACION DEL CRONOGRAMA

No se ha presentado la solicitud por parte del consultor

RECOMENDACIONES

Continuar con las actividades establecidas en el PDT

RIESGOS Y ALERTAS

No se registran

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

https://drive.google.com/drive/folders/1s5TXVbCVF_D_VEkXRSo5HHrdNl7lv6bT?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/folders/1QGKvjHs_fnVCJfEE1Pa-wlg8cCQMhlX-?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/folders/1QGKvjHs_fnVCJfEE1Pa-wlg8cCQMhlX-?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/folders/1xlEz6lyMso-y7RxVJcsYSejkGBviqm9h?usp=drive_link
1. Actas de seguimiento al proyecto con grabaciones	2. Seguimiento Observaciones de interventoria	3. Correspondencia del proyecto	4. Seguimiento semanal Plan de trabajo -PDT versión No1
https://drive.google.com/drive/folders/1VZPvOtfckxE8jpFPXXDBxidS1LTBTWYf?usp=drive_link	https://drive.google.com/drive/folders/1SrAXNypvwws-36YJzYdbkcLBt_2z4KON?usp=sharing		
5. Informe de avance entragado por el consultor al mes 2	6 Estado Actual del Proyecto	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

Nombre: **SUPERVISOR / INTERVENTOR**
EDNA ROCIO CASTELLANOS
SUBDIRECTORA DE PLANEACION CAS
CAS

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	Jefferson Prada	Apoyo a la Subdireccion de Planeacion CAS	
REVISO:	Rodolfo Sanchez	Apoyo a la supervision del contrato 1493-25	
V.B:			
