PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 043-2026

Las partes acuerdan las siguientes cláusulas que hacen parte del contrato establecido electrónicamente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop/

CONTRATANTE:	**RED SALUD CASANARE E.S.E.** **NIT.** 844.004.197-2
CONTRATISTA:	**SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA CONSTRUCCION MANTENIMIENTO YSUMINISTROS SAS** **NIT. No.** 901.075.624-6
OBJETO:	**LOTE 04. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓNPRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SAN NICOLAS, SAN JOSE, CHIRE, PUERTOCOLOMBIA, LA CHAPA, CORRALITO Y LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL,DEPARTAMENTO DE CASANARE**
VALOR:	**CIENTO VEINTITRES MILLONES VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS($123.025.158,00) Moneda Legal Colombiana**
FORMA DE PAGO:	EL VALOR DEL CONTRATO SERÁ PAGADO POR RED SALUD CASANARE E.S.E. DE LA SIGUIENTE FORMA: A) HASTA UN NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO MEDIANTE PAGO DE ACTAS PARCIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE INTERVENTORÍA Y CONSTANCIA DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – PENSIÓN – ARL Y PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR). B) UN DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO, COMO PAGO FINAL, PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA, ENTREGA FINAL DE LA OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y LA SUPERVISIÓN DEL RESPECTIVO CONVENIO Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – PENSIÓN – ARL Y PARAFISCALES (SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR). PARAGRAFO PRIMERO: LAS FACTURAS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES PARA PAGO DEBEN SER EXPEDIDAS DIRECTAMENTE POR LOS CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO Y NO POR CADA UNO O ALGUNO DE SUS INTEGRANTES. PARAGRAFO SEGUNDO: PARA EL TRÁMITE DE PAGOS PARCIALES Y FINALES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE DE MANERA INDEPENDIENTE PARA CADA PAPS O CAPS (SEGÚN APLIQUE), CUMPLIENDO LOS SIGUIENTES REQUISITOS: I)TODA SOLICITUD DE PAGO DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE ACTAS PARCIALES O FINALES QUE DISCRIMINEN DE FORMA CLARA Y DETALLADA LOS CAPÍTULOS E ÍTEMS CORRESPONDIENTES EXCLUSIVAMENTE A LAS CANTIDADES CONTRATADAS Y EFECTIVAMENTE EJECUTADAS EN CADA PUESTO DE SALUD. EN DICHAS ACTAS SE DEBERÁ REFLEJAR, CAPÍTULO POR CAPÍTULO, EL AVANCE LOGRADO RESPECTO AL TOTAL CONTRATADO, ESPECIFICANDO VALORES, CANTIDADES EJECUTADAS Y SALDOS PENDIENTES, SIN ALTERAR NI MODIFICAR LA ESTRUCTURA ESTABLECIDA EN LA OFERTA ECONÓMICA NI EN EL PRESUPUESTO APROBADO DEL RESPECTIVO PROYECTO; II) QUEDA PROHIBIDO CONSOLIDAR, MEZCLAR O TRANSFERIR CANTIDADES EJECUTADAS ENTRE LOS DIFERENTES

	PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD. CADA ACTA Y LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES (TABLAS, SÁBANAS DE CANTIDADES, INFORMES FOTOGRÁFICOS, DIARIOS DE OBRA, CERTIFICACIONES DE MATERIALES Y DEMÁS EVIDENCIA TÉCNICA Y/O LEGAL DE EJECUCIÓN) DEBERÁN SER ELABORADOS Y PRESENTADOS DE FORMA SEPARADA E IDENTIFICABLE POR CADA PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD. NO SE ACEPTARÁN SOPORTES GENÉRICOS, GLOBALES O QUE CONTENGAN INFORMACIÓN CRUZADA ENTRE DIFERENTES PROYECTOS, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA; III). CADA DOCUMENTO SOPORTE DEBE ESTAR PERFECTAMENTE IDENTIFICADO CON EL NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PUESTO DE SALUD RESPECTIVO, Y CONTENER LOS DATOS ESENCIALES DEL PROYECTO APROBADO, ASEGURANDO LA TRAZABILIDAD Y CORRESPONDENCIA EXACTA CON LO PACTADO CONTRACTUALMENTE. LAS CANTIDADES RECLAMADAS PARA PAGO DEBEN CORRESPONDER EXACTAMENTE A LO EJECUTADO, Y ESTAR SOPORTADAS EN LAS RESPECTIVAS MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS, BITÁCORAS, FOTOGRAFÍAS GEORREFERENCIADAS Y CUALQUIER OTRA EVIDENCIA REQUERIDA, TODO ELLO DISCRIMINADO POR CAPÍTULO E ÍTEM PARA EL RESPECTIVO PUESTO DE SALUD; IV). LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO SERÁ LA ENCARGADA DE VERIFICAR, REVISAR Y APROBAR CADA UNO DE LOS SOPORTES PRESENTADOS PARA CADA PAGO. SÓLO SERÁN OBJETO DE RECONOCIMIENTO AQUELLOS AVANCES Y CANTIDADES EJECUTADAS QUE HAYAN SIDO APROBADOS Y CERTIFICADOS INDIVIDUALMENTE PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD CORRESPONDIENTE. EL CONTRATISTA DEBERÁ ATENDER OPORTUNAMENTE CUALQUIER REQUERIMIENTO, OBSERVACIÓN O SUBSANACIÓN QUE LA INTERVENTORÍA ESTIME NECESARIA PARA GARANTIZAR LA VALIDEZ E INTEGRIDAD DE LOS SOPORTES DE PAGO; V). EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS, LA FALTA DE DISCRIMINACIÓN, LA MEZCLA DE CANTIDADES O LA AUSENCIA DE CLARIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS AVANCES POR PUESTO DE SALUD ORIGINARÁ LA DEVOLUCIÓN INMEDIATA DEL ACTA PARCIAL O FINAL. PARÁGRAFO TERCERO: EN LO RELACIONADO CON LA FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS, INSUMOS Y ELEMENTOS TÉCNICOS ASOCIADOS AL COMPONENTE ELÉCTRICO, ASÍ COMO A CUALQUIER OTRO SUMINISTRO O INSTALACIÓN TÉCNICA QUE REQUIERA PARA SU LEGALIZACIÓN LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN RETIE, SE ESTIPULA EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO QUE NO HABRÁ LUGAR A PAGO ALGUNO SOBRE DICHOS CONCEPTOS MIENTRAS NO SE ACREDITE ANTE LA INTERVENTORÍA Y LA ENTIDAD LA CERTIFICACIÓN RESPECTIVA, EXPEDIDA VÁLIDAMENTE CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. QUE SOLO UNA VEZ ESTE EN PODER DE LA ENTIDAD LA CERTIFICACIÓN RETIE Y ESTA SEA EVALUADA FAVORABLEMENTE, SE AUTORIZARÁ Y PROCEDERÁ EL PAGO ÍNTEGRO DE LOS VALORES RELACIONADOS CON EL COMPONENTE ELÉCTRICO O TÉCNICO, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES AVALADAS POR LA INTERVENTORÍA PARA SU PAGO, GARANTIZANDO ASÍ LA ENTREGA DE INSTALACIONES PLENAMENTE SEGURAS,

PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 043-2026

	FUNCIONALES Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES EXIGIDOS POR EL MARCO REGULATORIO COLOMBIANO APLICABLE A LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
PLAZO EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÒN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE EJECUCIÓN.
FECHA DE FIRMA	ENERO VEINTITRES (23) DE 2026
FECHA DE ACTA DE INICIO	FEBRERO VENTICUATRO (24) DE 2026
FECHA INICIALDE TERMINACIÓN	JUNIO VENTICUATRO (24) DE 2026
PRORROGA No 01	TREINTA (30) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO PRINCIPAL
FECHA DE TERMINACIÓN ESTIMADA	JULIO (24) DE 2026

Entre los suscritos a saber por una parte LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS, mayor de edad, identificada con la cédula ciudadanía número 52.897.176 expedida en Bogotá, en la condición Gerente de RED SALUD CASANARE E.S.E Identificada con el Número de Identificación Tributaria -NIT No. 844.004.197-2, nombrada mediante Decreto 0089 del 01 de abril de 2024 emanado de la Gobernación de Casanare y Acta de posesión No. 0050 de fecha 01 de abril de 2024, autorizada para ordenar el gasto según lo establecido en el Acuerdo 001 del 07 de septiembre de 2004 y Acuerdo 006 del 2021 adoptado mediante la Resolución N.º 0588 del 14 de julio del 2022, quien para efectos del presente contrato se denominará RED SALUD CASANARE E.S.E y por la SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS SAS., Identificada con Número de Identificación Tributaria No NIT. 901.075.624-6, Representada Legalmente por BELQUIS BRICEIDA SEPULVEDA MANCIPE, mayor de edad, Identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No 1.116.857.876 expedida en Tame, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar PRORROGA No 01 al CONTRATO DE INTERVENTORIA No SECOP II RSC-CP-005-2025 y NUMERO INTERNO 043-2026, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1) Que CONSORCIO COSALUD., Identificada bajo el Número de Identificación Tributaria No 902.023.154-7, Representada Legalmente por ALFREDO LEIVA JIMÉNEZ, Identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No 1.018.441.104 expedida en Bogotá, a través de oficio con fecha del 05 de junio de 2026, dirigido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA donde solicita la viabilidad y aceptación PRORROGA No 01. al CONTRATO DE OBRA No SECOP II RSC-CP-007-2026 y numero interno 559-2026 en los siguientes términos:

   "(...) En calidad de contratista del Contrato de Obra No. SECOP II RSC-CP-007-2025 y número interno 559-2026, cuyo objeto corresponde a la "Adecuación menor de los Puestos de Atención Primaria en Salud (PAPS) de las veredas San Nicolás, San José, Chire, Puerto Colombia, La Chapa, Corralito y Las Tapias del municipio de Hato Corozal, departamento de Casanare", nos permitimos presentar formalmente solicitud de Prórroga No. 01 por el término de un (01) mes al plazo contractual inicialmente establecido.

PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 043-2026

La presente solicitud se fundamenta en circunstancias externas, imprevisibles y no imputables al contratista, relacionadas principalmente con las condiciones climáticas adversas que se han presentado de manera recurrente durante gran parte del periodo de ejecución contractual.

Durante los meses de marzo, abril, mayo y los primeros días de junio de 2026 se han registrado precipitaciones constantes y de alta intensidad en la zona de influencia del proyecto, situación que ha afectado significativamente el normal desarrollo de las actividades constructivas programadas.

Entre las principales afectaciones identificadas se encuentran:
• Imposibilidad de ejecutar de manera continua actividades relacionadas con instalación y mantenimiento de cubiertas, acabados, pintura y demás labores expuestas a condiciones atmosféricas favorables.

• Dificultades para el transporte y suministro oportuno de materiales hacia los diferentes puestos de salud objeto de intervención, ocasionadas por el deterioro de las vías de acceso rurales.

• Afectaciones logísticas derivadas de las condiciones de movilidad y acceso a las veredas beneficiarias del proyecto.

Es importante señalar que, pese a las dificultades descritas, el CONSORCIO COSALUD ha dispuesto los recursos técnicos, administrativos, financieros y operativos necesarios para mantener la ejecución del proyecto dentro de las posibilidades existentes, implementando estrategias de reprogramación y optimización de actividades con el fin de minimizar los impactos ocasionados por las condiciones climáticas.

Como resultado de los esfuerzos realizados, a la fecha el contrato presenta un avance físico acumulado aproximado del setenta y cinco por ciento (75%), evidenciando el compromiso del contratista con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la culminación satisfactoria del proyecto.

No obstante, considerando que aún se encuentran pendientes actividades cuya correcta ejecución depende de condiciones climáticas adecuadas, se hace necesario ampliar el plazo contractual en un (01) mes adicional, con el fin de garantizar la terminación integral de las obras, el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas y la adecuada entrega de los puestos de salud objeto de mejoramiento.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos a la interventoría emitir concepto favorable y adelantar el trámite correspondiente ante la entidad contratante para la aprobación de la Prórroga No. 01 por el término de un (01) mes, contados a partir del vencimiento del plazo contractual vigente, fijando como nueva fecha de terminación el día 24 de julio de 2026.

La presente solicitud no implica modificación del objeto contractual ni reconocimiento de mayores cantidades o valores adicionales derivados de la ampliación solicitada, limitándose exclusivamente a

la extensión del plazo de ejecución requerido para culminar satisfactoriamente las actividades contratadas. (...)".

2) Que, SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A.S., Identificada con Número de Identificación Tributaria No NIT. 901.075.624-6, Representada Legalmente por BELQUIS BRICEIDA SEPULVEDA MANCIPE, mayor de edad, Identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No 1.116.857.876 expedida en Tame, en comunicación dirigida al CONTRATISTA, donde ACEPTA las condiciones para suscribir PRORROGA No 01. AL CONTRATO DE OBRA No. SECOP II RSC-CP-007-2026 Y NUMERO INTERNO 039-2026. en los siguientes términos:

"(...) En ejercicio de las funciones de interventoría del Contrato de Obra No. SECOP II RSC-CP-007-2025 y número interno 559-2026, cuyo objeto corresponde a la "Adecuación menor de los Puestos de Atención Primaria en Salud (PAPS) de las veredas San Nicolás, San José, Chire, Puerto Colombia, La Chapa, Corralito y Las Tapias del municipio de Hato Corozal, departamento de Casanare", nos permitimos informar que fue recibido y evaluado el Informe de Solicitud de Prórroga No. 01 presentado por el contratista CONSORCIO COSALUD.

Una vez revisados los argumentos técnicos, administrativos y documentales aportados por el contratista y durante el acompañamiento de la ejecución de los mejoramientos, esta interventoría evidenció que se han presentado condiciones climáticas adversas y recurrentes, consistentes en precipitaciones continuas que han afectado el normal desarrollo de actividades constructivas asociadas principalmente a trabajos de instalación de cubierta, acabados, pintura, instalaciones y demás actividades dependientes de condiciones climáticas favorables.

De igual manera, se verificó que dichas circunstancias han generado restricciones operativas, disminución en los rendimientos de obra, dificultades de acceso y movilización de materiales, así como limitaciones para garantizar condiciones seguras de trabajo para el personal operativo, situación debidamente soportada mediante los reportes climatológicos anexos a la solicitud.

Es importante señalar que, a la fecha, el proyecto presenta un avance físico acumulado aproximado del setenta y cinco por ciento (75%), evidenciando que el contratista ha mantenido la ejecución de las actividades programadas dentro de las posibilidades operativas existentes y que las circunstancias que motivan la solicitud obedecen a factores externos y no imputables al contratista.

Por lo anterior, esta interventoría considera técnica, administrativa y contractualmente ***procedente la aprobación de la Prórroga No. 01 por el término de un (01) mes****, contado a partir del vencimiento del plazo contractual inicialmente establecido para el día 24 de junio de 2026, fijando como nueva fecha de terminación el día 24 de julio de 2026, sin que ello implique modificación del objeto contractual ni mayores precios de obra derivadas de la presente solicitud. (...)"*

3) Que, SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS S.A.S., Identificada con Número de Identificación Tributaria No NIT. 901.075.624-6,

PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 043-2026

Representada Legalmente por BELQUIS BRICEIDA SEPULVEDA MANCIPE, mayor de edad, Identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No 1.116.857.876 expedida en Tame, a través de oficio con fecha del 09 de junio de 2026, dirigido a la OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, MERCADEO Y SISTEMAS, donde solicita la viabilidad y aceptación de PRORROGA No. 01 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SECOP II RSC-CP-005-2026 Y NUMERO INTERNO 043-2026, en los siguientes términos:

"(...) Es importante señalar que, a la fecha, el proyecto presenta un avance físico acumulado aproximado del setenta y cinco por ciento (75%), evidenciando que el contratista ha mantenido la ejecución de las actividades programadas dentro de las posibilidades operativas existentes y que las circunstancias que motivan la solicitud obedecen a factores externos y no imputables al contratista.

Por lo anterior, esta interventoría considera técnica, administrativa y contractualmente procedente la aprobación de la Prórroga No. 01 por el término de un (01) mes, contado a partir del vencimiento del plazo contractual inicialmente establecido para el día 24 de junio de 2026, fijando como nueva fecha de terminación el día 24 de julio de 2026, sin que ello implique modificación del objeto contractual ni mayores precios de obra derivadas de la presente solicitud.

Así mismo, considerando que el Contrato de Interventoría No. SECOP II RSC-CP-005-2025 y número interno 043-2026 se encuentra directamente ligado a la ejecución, seguimiento, control y cierre del contrato de obra antes referido, y que las actividades de interventoría deben mantenerse durante toda la ejecución contractual hasta la liquidación y cierre de los procesos administrativos correspondientes, respetuosamente solicitamos se adelante el trámite de prórroga por el término de un (01) mes al contrato de interventoría, en igualdad de condiciones temporales respecto de la ampliación solicitada para el contrato de obra.

Lo anterior con el fin de garantizar la continuidad de las labores de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental requeridas para la correcta culminación del proyecto y el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.

(...)"

4) Que la SUPERVISIÓN a cargo de la OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, MERCADEO Y SISTEMAS, mediante oficio de fecha diecinueve (19) de junio de 2026, dirigido a EL CONTRATISTA DE OBRA, donde ACEPTA las condiciones para suscribir PRORROGA No 01 al CONTRATO DE OBRA No SECOP II RSC-CP-005-2026 y número interno 043-2026, en los siguientes términos:

"(...) Cordial saludo.

Comedidamente, me permito informar que una vez revisada su solicitud de aprobación de prorroga N°01 por termino de treinta (30) días calendario, el cual fue radicado a RED SALUD CASANARE E.S.E, el día 09 de junio del 2026, la supervisión y el apoyo a la supervisión técnica del contrato de interventoría, verifico el contenido y la justificación presentado por la interventoría como soporte técnico avalando y aprobando la solicitud de prorroga N°1 al plazo establecido por termino de treinta (30) días calendario, adicional al contrato de INTERVENTORIA SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 043-2026.

En razón a lo anterior se considera viable teniendo en cuenta que la jefe de la Oficina Asesora de planeación, Mercadeo y Sistemas debe cumplir con diferentes funciones esenciales de

supervisión y se requiere continuar con el seguimiento y control a la ejecución del contrato de interventoría, SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 043-2026, quien a su vez realiza el seguimiento y control al contrato de OBRA SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 559-2026. (...)"

5) Que la SUPERVISIÓN a cargo de la OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, MERCADEO Y SISTEMAS, mediante memorando de fecha diecinueve (19) de junio de 2026, ante el JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE CONTROL DISCIPLINARIO, con visto bueno de la Gerencia de RED SALUD CASANARE E.S.E., donde solicita realizar PRORROGA No 01 al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SECOP II RSC-CP-005- 2026 Y NUMERO INTERNO 043-2026 bajo el siguiente sustento:

"(...) En mi calidad de supervisor del contrato de interventoría asunto de la referencia, me permito aceptar y dar viabilidad para suscribir la Prórroga No.1 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones con el fin de ajustar la CLÁUSULA OCTAVA – PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. Justificación técnica y jurídica

La presente solicitud de Prórroga No. 01 por un término de un (01) mes se fundamenta en situaciones de carácter climático presentadas durante la ejecución de la obra, las cuales han afectado de manera directa el normal desarrollo de las actividades programadas.
Es importante señalar que las labores de instalación, adecuación y trabajo en cubierta representan actividades de alto riesgo, razón por la cual no es seguro ejecutar dichas actividades en condiciones de lluvia, superficies húmedas, debido a las implicaciones que ello representa para la integridad y seguridad del personal operativo, así como para la calidad de las actividades ejecutadas y la protección de los equipos.
En este contexto, la necesidad de solicitud de tiempo no implica un cambio de objeto ni una contradicción con la planeación inicial, sino un desarrollo natural de la finalidad del contrato: realizar la adecuación de los puestos de atención primaria del municipio de Hato corozal, con el fin de mantener la continuidad mejorar la prestación de servicios de la entidad Red Salud Casanare E.S.E, el deterioro. las actividades como desmonte de cubiertas, pintura de estructura metálica y montaje de cubierta nueva, generan afectación en la continuidad de actividades sucesivas propias de la adecuación menor, tales como, acabados de muros, esta cadena de eventos ha sido motivada y justificada por el contratista en los anexos correspondientes a la presente Solicitud.
En este contexto, la necesidad de solicitud de tiempo no implica un cambio de objeto ni una contradicción con la planeación inicial, sino un desarrollo natural de la finalidad del contrato: realizar la adecuación menor de los puestos de atención de Hato Corozal, con el finde de mantener la continuidad y mejorar la prestación de servicios de la entidad Red Salud Casanare E.S.E. en el territorio. Las actividades como desmontes de cubiertas, pintura de estructura metálica y montaje de cubierta nueva, generan afectación en la continuidad de actividades sucesivas propias de la adecuación menor, tales como, acabados de muros, esta cadena de eventos ha sido motivada y justificada por el contratista en los anexos correspondientes a la presente solicitud.

PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 043-2026

Por lo anterior, es necesario la ampliación del plazo contractual por el término un (01) mes, al contrato de obra, con el firme propósito de realizar la ejecución de actividades de adecuación menor de los puestos de atención de Hato Corozal, bajo el contrato de INTERVENTORIA No. SECOP II RSC-CP-005-2025.

Esta prórroga se presenta como una medida razonable y proporcionada que la complementa frente a una circunstancia técnica sobreviniente, evitando entregas formales que no permitan la puesta en operación de la sede, así como futuros procesos contrataciones fragmentadas o mayores costos para la entidad. (...)"

1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

Modificar la Cláusula Octava del Contrato de OBRA No. SECOP II RSC-CP-005-2026 y NUMERO INTERNO 043-2026., el cual quedará así:

CLÁUSULA OCTAVA - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual El CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfacción de RED SALUD CASANARE E.S.E, el servicio objeto del presente contrato, será de CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÒN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE EJECUCIÓN. Que para efectos del presente memorando de solicitud se PRORROGA en un término de treinta (30) días calendario más el plazo pactado en el contrato No. SECOP II RSC-CP-005-2026 y numero interno 043-2026, contado a partir del vencimiento del plazo contractual vigente. Las cláusulas del contrato que no hubieren sido expresamente modificadas por la presente prórroga se mantendrán incólumes. Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, es decir, que el cumplimiento de las obligaciones se va sucediendo de manera escalonada en el tiempo, se verificará su cumplimiento total hasta el vencimiento del término previsto para su ejecución. Pero el cumplimiento parcial de las obligaciones se verificará de acuerdo con los informes periódicos de cumplimiento presentados al Supervisor del contrato. La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, EL CONTRATISTA debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.

a. Que las actuaciones se amparan en lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, que en materia contractual se regirá por el Derecho Privado, bajo este concepto RED SALUD CASANARE E.S.E., expidió el Acuerdo No 015 del 30 de septiembre de 2024 "Por medio del cual se modifica y actualiza el Estatuto de Contratación de la Empresa Social de RED SALUD CASANARE E.S.E.",

b. Que de conformidad con el Acuerdo No 015 del 30 de septiembre de 2024 "Por medio del cual se modifica y actualiza el Estatuto de Contratación de la Empresa Social de RED SALUD CASANARE E.S.E.", artículo 65 establece que las partes de común acuerdo podrán suscribir acta modificatoria, previo requerimiento del supervisor del contrato, expresando con claridad las razones que originaron tal modificación. y lo reglamentado en la Resolución 692 de 2021 "Por la cual se expide el Manual de Contratación de la entidad conforme al Estatuto de Contratación expedido por la Junta Directiva mediante el Acuerdo No 007 de 2021". Artículo 51. MODIFICACIÓN A LOS CONTRATOS ESTATALES U OTROSÍ "La modificación contractual o los cambios estipulados inicialmente en el

clausulado del contrato o bien sea porque RED SALUD CASANARE E.S.E., lo considere pertinente o a solicitud del contratista (...)"

c. Que, en la Resolución 692 de 2021 "Por la cual se expide el Manual de Contratación de la entidad conforme al Estatuto de Contratación expedido por la Junta Directiva mediante el Acuerdo No 007 de 2021". en su Artículo 52.2 AMPLIACION DEL PLAZO O PRORROGA, hace referencia a una extensión o ampliación en el tiempo que inicialmente se había acordado para la ejecución del contrato, y finalmente el Artículo 52.2.1. Numeral 1 dispone: "La manifestación escrita del contratista en la que conste su solicitud justificada de prórroga. No obstante, lo anterior Red Salud Casanare E.S.E., podrá tener la iniciativa de prorrogar el contrato la cual debe ser plasmada en el formato de solicitud de modificación de contrato justificando la necesidad"

d. Que una vez analizada la solicitud se considera pertinente la PRORROGA No 01. al CONTRATO DE INTERVENTORIA No SECOP II RSC-CP-005-2026 y numero interno 043-2026. En consecuencia, se procede a realizar el mencionado PRORROGA No. 01 en los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA — PRORROGA No. 01: El tiempo que se procede a prorrogar mediante el presente acuerdo será de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución inicial del contrato principal.

CLÁUSULA SEGUNDA — VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad persiste.

CLAUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: Para la validez y perfeccionamiento del presente contrato se requiere: 1. Firma de las partes. 2. Ampliación, presentación y aprobación de las garantías exigidas en el contrato.

CLAUSULA CUARTA — GARANTÍAS. El contratista se obliga a ampliar las vigencias de la póliza de cumplimiento constituida para amparar los riesgos en las mismas coberturas que al respecto consagro la garantía única

CLAUSULA QUINTA. — SUSCRIPCIÓN: Las actuaciones de los Usuarios en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop/ comprometen a la Entidad Compradora y al Proveedor. La autenticación en el SECOP II con el nombre de Usuario y la contraseña es una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que lo reglamentan, conforme se establece en los términos y condiciones de uso del SECOP II dispuesto en la dirección electrónica https://www.colombiacompra.gov.co/secop/terminos-y-condiciones

CLÁUSULA SEXTA— ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO Con la aceptación de las partes en el portal transaccional del SECOP II, dispuesto en la dirección electrónica https://www.colombiacompra.gov.co/secop/ las partes declaran conocer y aceptar todas las condiciones del contrato electrónico y las cláusulas adicionales pactadas en este anexo al contrato electrónico.

PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 043-2026

FIRMADO A TRAVÉS DE SECOP II.

SOLICITUD DE PRORROGA

No.1

CONTRATO DE INTERVENTORIA

SICOMS
Avanzamos con la Transformación

Yopal – Casanare, 09 de junio de 2026. OF-CI-023

RedSalud
Comunicaciones Recibidas
Número: R-2026-9722
Fecha: 18/jun/2026 08:32 AM
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas
Serie: Contratos de Consultoría e interventoría
Anexos: SI 1CP
No. Folios:
"Las solicitudes que lleguen después del horario establecido se tramitarán al día siguiente hábil." (Art 62 Ley 4 1913)(Art. 70 Cod. Civil)(Art 54 Proc. Adm.)
sgpd

Señores
RED SALUD CASANARE E.S.E.
Calle 9 No. 24-75

Doctora
ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Jefe oficina asesora de planeación, mercadeo y sistemas
Supervisora

Señores
MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
ING. GUSTAVO ADOLFO SUAREZ
Profesional de Apoyo a la Supervisión
Correo electrónico: apoyosupervisionzona4@gmail.com

Asunto: Concepto favorable y solicitud de aprobación de Prórroga No. 01 Contrato de Obra No. SECOP II RSC-CP-007-2025 y número interno 559-2026 – Solicitud de prórroga Contrato de Interventoría No. SECOP II RSC-CP-005-2025 y número interno 043-2026

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de interventoría del Contrato de Obra No. SECOP II RSC-CP-007-2025 y número interno 559-2026, cuyo objeto corresponde a la "Adecuación menor de los Puestos de Atención Primaria en Salud (PAPS) de las veredas San Nicolás, San José, Chire, Puerto Colombia, La Chapa, Corralito y Las Tapias del municipio de Hato Corozal, departamento de Casanare", nos permitimos informar que fue recibido y evaluado el Informe de Solicitud de Prórroga No. 01 presentado por el contratista CONSORCIO COSALUD.

Una vez revisados los argumentos técnicos, administrativos y documentales aportados por el contratista y durante el acompañamiento de la ejecución de los mejoramientos, esta interventoría evidenció que se han presentado condiciones climáticas adversas y recurrentes, consistentes en precipitaciones continuas que han afectado el normal desarrollo de actividades constructivas asociadas principalmente a trabajos de instalación de cubierta, acabados, pintura, instalaciones y demás actividades dependientes de condiciones climáticas favorables.

De igual manera, se verificó que dichas circunstancias han generado restricciones operativas, disminución en los rendimientos de obra, dificultades de acceso y movilización de materiales, así como limitaciones para garantizar condiciones seguras de trabajo para el personal operativo, situación debidamente soportada mediante los reportes climatológicos anexos a la solicitud.

Es importante señalar que, a la fecha, el proyecto presenta un avance físico acumulado aproximado del setenta y cinco por ciento (75%), evidenciando que el contratista ha mantenido la ejecución de las actividades programadas dentro de las posibilidades operativas existentes y que las circunstancias que motivan la solicitud obedecen a factores externos y no imputables al contratista.

Por lo anterior, esta interventoría considera técnica, administrativa y contractualmente **PROCEDENTE LA APROBACIÓN** de la Prórroga No. 01 por el término de un (01) mes, contado a partir del vencimiento del plazo contractual inicialmente establecido para el día 24 de junio de 2026, fijando como nueva fecha de terminación el día 24 de julio de 2026, sin que ello implique modificación del objeto contractual ni mayores precios de obra derivadas de la presente solicitud.

Así mismo, considerando que el Contrato de Interventoría No. SECOP II RSC-CP-005-2025 y número interno 043-2026 se encuentra directamente ligado a la ejecución, seguimiento, control y cierre del contrato de obra antes referido, y que las actividades de interventoría deben mantenerse durante toda la ejecución contractual hasta la liquidación y cierre de los procesos administrativos correspondientes, respetuosamente solicitamos se adelante el trámite de prórroga por el término de un (01) mes al contrato de interventoría, en igualdad de condiciones temporales respecto de la ampliación solicitada para el contrato de obra.

Lo anterior con el fin de garantizar la continuidad de las labores de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental requeridas para la correcta culminación del proyecto y el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.

Anexos:

- Informe de Solicitud de Prórroga No. 01 presentado por el Consorcio Cosalud.
- Reportes climatológicos IDEAM correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2026.
- Nueva programación de obra, ajustada al mes adicional de ejecución.

Atentamente,

HENRY ALBERTO CAICEDO ALCÁNTARA
Director de Interventoría – Lote 04
SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO S.A.S.
NIT. 901.075.624-6

INFORME SOLICITUD DE PRÓRROGA N° 01 CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO COSALUD
NIT. 902.023.154-7

Yopal – Casanare, 05 de junio de 2026.

Señores
SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO S.A.S. – SICOMS S.A.S.
Ing. HENRY ALBERTO CAICEDO ALCÁNTARA
Director de Interventoría – Lote 04
Correo electrónico: interpapscorozal@gmail.com

Asunto: Solicitud de Prórroga No. 01 al Contrato de Obra No. SECOP II RSC-CP-007-2025 y número interno 559-2026

Cordial saludo:

En calidad de contratista del Contrato de Obra No. SECOP II RSC-CP-007-2025 y número interno 559-2026, cuyo objeto corresponde a la "Adecuación menor de los Puestos de Atención Primaria en Salud (PAPS) de las veredas San Nicolás, San José, Chire, Puerto Colombia, La Chapa, Corralito y Las Tapias del municipio de Hato Corozal, departamento de Casanare", nos permitimos presentar formalmente solicitud de Prórroga No. 01 por el término de un (01) mes al plazo contractual inicialmente establecido.

La presente solicitud se fundamenta en circunstancias externas, imprevisibles y no imputables al contratista, relacionadas principalmente con las condiciones climáticas adversas que se han presentado de manera recurrente durante gran parte del periodo de ejecución contractual.

Durante los meses de marzo, abril, mayo y los primeros días de junio de 2026 se han registrado precipitaciones constantes y de alta intensidad en la zona de influencia del proyecto, situación que ha afectado significativamente el normal desarrollo de las actividades constructivas programadas.

Entre las principales afectaciones identificadas se encuentran:
• Imposibilidad de ejecutar de manera continua actividades relacionadas con instalación y mantenimiento de cubiertas, acabados, pintura y demás labores expuestas a condiciones atmosféricas favorables.

• Dificultades para el transporte y suministro oportuno de materiales hacia los diferentes puestos de salud objeto de intervención, ocasionadas por el deterioro de las vías de acceso rurales.

• Afectaciones logísticas derivadas de las condiciones de movilidad y acceso a las veredas beneficiarias del proyecto.

Es importante señalar que, pese a las dificultades descritas, el CONSORCIO COSALUD ha dispuesto los recursos técnicos, administrativos, financieros y operativos necesarios para mantener la ejecución del proyecto dentro de las posibilidades existentes, implementando estrategias de reprogramación y optimización de actividades con el fin de minimizar los impactos ocasionados por las condiciones climáticas.

Como resultado de los esfuerzos realizados, a la fecha el contrato presenta un avance físico acumulado aproximado del setenta y cinco por ciento (75%), evidenciando el compromiso del contratista con el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la culminación satisfactoria del proyecto.

No obstante, considerando que aún se encuentran pendientes actividades cuya correcta ejecución depende de condiciones climáticas adecuadas, se hace necesario ampliar el plazo contractual en un (01) mes adicional, con el fin de garantizar la terminación integral de las obras, el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas y la adecuada entrega de los puestos de salud objeto de mejoramiento.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos a la interventoría emitir concepto favorable y adelantar el trámite correspondiente ante la entidad contratante para la aprobación de la Prórroga No. 01 por el término de un (01) mes, contados a partir del vencimiento del plazo contractual vigente, fijando como nueva fecha de terminación el día 24 de julio de 2026.

La presente solicitud no implica modificación del objeto contractual ni reconocimiento de mayores cantidades o valores adicionales derivados de la ampliación solicitada, limitándose exclusivamente a la extensión del plazo de ejecución requerido para culminar satisfactoriamente las actividades contratadas.

Anexos:

Informe Técnico de Solicitud de Prórroga No. 01.
Reportes climatológicos y registros pluviométricos correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2026.
Registro fotográfico de afectaciones ocasionadas por condiciones climáticas.
Programación de obra ajustada al plazo solicitado.

Atentamente,

ALFREDO LEIVA JIMÉNEZ
Representante legal Consorcio Cosalud
NIT. No. 902.023.154-7

INFORME DE SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 01

CONTRATO DE OBRA No.
SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 559-2026

OBJETO CONTRATO DE OBRA.
OBJETO: "LOTE 04. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SAN NICOLAS, SAN JOSE, CHIRE, PUERTO COLOMBIA, LA CHAPA, CORRALITO Y LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONTRATISTA.
CONSORCIO COSALUD
NIT. No. 902.023.154-7

FECHA.

05 de junio de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 3
2.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN PUESTOS DE SALUD OBJETO DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA 4
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
4.1 CONTRATO DE OBRA 5
4.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA 5
5. MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA 6
6. TIEMPO SOLICITADO 7
7. COMPROMISOS 7
8. CONCLUSIONES 7

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Solicitud de Prórroga corresponde al seguimiento técnico, administrativo y contractual del Contrato de Obra No. SECOP II RSC-CP-007-2025 y Número Interno 559-2026, cuyo objeto corresponde a: "LOTE 07. ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD – SÁCAMA". Este informe se elabora con el propósito de sustentar técnicamente la necesidad de ampliar el plazo de ejecución del contrato inicialmente establecido.

Durante el desarrollo del contrato se han ejecutado actividades contempladas dentro del alcance del proyecto, obteniendo avances significativos en las áreas disponibles para intervención y manteniendo continuidad en la ejecución de las actividades programadas conforme al cronograma establecido. No obstante, durante el proceso de ejecución se han presentado condiciones climáticas adversas y persistentes que han afectado de manera consecutiva el normal desarrollo de las actividades constructivas, limitando el rendimiento operativo y el cumplimiento de los tiempos programados.

Particularmente, las constantes precipitaciones y las variaciones climáticas registradas durante el periodo de ejecución han generado dificultades en la realización de actividades de obra, afectando procesos constructivos, el traslado de materiales, las condiciones de seguridad y el acceso oportuno a las áreas de intervención, situación que ha impactado el avance integral del proyecto.

Debido a lo anterior, y con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, la culminación integral de las actividades programadas y la entrega adecuada de la infraestructura intervenida, se presenta la presente solicitud de prórroga por el término de un (01) mes, permitiendo disponer del tiempo necesario para finalizar satisfactoriamente las actividades pendientes y asegurar la correcta ejecución del proyecto.

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Durante la ejecución del contrato de Obra No. SECOP II RSC-CP-007-2025 y Número Interno 559-2026, cuyo objeto corresponde a: "LOTE 04. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SAN NICOLAS, SAN JOSE, CHIRE, PUERTO COLOMBIA, LA CHAPA, CORRALITO Y LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", se han adelantado las actividades contempladas dentro del alcance del proyecto, manteniendo continuidad en los frentes habilitados para intervención y desarrollando labores orientadas al mejoramiento de la infraestructura existente de los diferentes puestos de salud.

A la fecha del presente informe, el proyecto registra un avance físico ejecutado acumulado del 75%, desde la fecha 24 de febrero de 2026 hasta la fecha del 05 de junio del 2026, evidenciando progreso en la ejecución de las actividades programadas y el cumplimiento de los compromisos establecidos dentro del cronograma de obra. Este avance corresponde al desarrollo de actividades relacionadas con desmontes, adecuaciones preliminares, instalación y adecuación de cubierta, estructura metálica, instalación de tanque elevado, cerramientos, pozos sépticos,

instalaciones eléctricas, adecuaciones complementarias y demás actividades contempladas dentro del alcance contractual.

No obstante, pese al avance alcanzado y al cumplimiento de las actividades ejecutadas en las áreas actualmente intervenidas, durante el periodo de ejecución se presentaron condiciones climáticas adversas y recurrentes que afectaron el normal desarrollo de las actividades constructivas, generando limitaciones operativas y disminución en los rendimientos de obra, situación que impactó el avance continuo de las actividades programadas y el cumplimiento del cronograma inicialmente establecido.

Por lo anterior, y con el propósito de garantizar la terminación integral del proyecto, el cumplimiento del objeto contractual y la adecuada entrega de la infraestructura intervenida, se presenta la presente solicitud de ampliación del plazo contractual por el término requerido para culminar satisfactoriamente las actividades pendientes y asegurar la correcta ejecución de las obras contempladas dentro del contrato.

3. LOCALIZACIÓN PUESTOS DE SALUD OBJETO DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA

El proyecto de adecuación de los puestos de salud priorizados y que hacen parte del municipio de Hato Corozal se encuentran ubicados en zona rural dispersa del municipio.

El área de intervención corresponde a un equipamiento institucional de carácter rural destinado a la prestación de servicios básicos de salud a la población de las veredas La Chapa, Chire, San José, San Nicolas, Las tapias, Corralito y Puerto Colombia y veredas aledañas a estas.



Ubicación Puestos de Salud en proceso de intervención municipio de Hato Corozal

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

4.1 CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NO.	SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 559-2026
OBJETO:	OBJETO CONTRATO DE OBRA OBJETO: "LOTE 04. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SAN NICOLAS, SAN JOSE, CHIRE, PUERTO COLOMBIA, LA CHAPA, CORRALITO Y LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".
CONTRATISTA:	CONSORCIO COSALUD
NIT:	NIT. NO. 902.023.154-7
REPRESENTANTE LEGAL:	ALFREDO LEIVA JIMENEZ
C.C:	1.018.441.104
DIRECCIÓN:	CALLE 17ª No 31B - 35
EMAIL:	CONSORCIOSALUDCASANAREHC@GMAIL.COM
TELÉFONO:	3213700353
VALOR:	MIL OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($1.809.354.335,00)
PLAZO:	CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÒN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE EJECUCIÓN.
ACTA DE INICIO:	24 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 DE JUNIO DE 2026
ESTADO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN

4.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 043-2026
OBJETO:	**LOTE 04.** INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SAN NICOLAS, SAN JOSE, CHIRE, PUERTO COLOMBIA, LA CHAPA, CORRALITO Y LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA:	SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO SAS
NIT:	NIT. NO. 901.075.624-6
REPRESENTANTE LEGAL:	BELQUIS BRICEIDA SEPULVEDA MANCIPE
C.C:	1.116.857.876 EXP. TAME, ARAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 18 # 12 - 57
EMAIL:	INTERPAPSCOROZAL@GMAIL.COM
TELÉFONO:	3124974582

VALOR:	CIENTO VEINTITRES MILLONES VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($123.025.158,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
PLAZO:	CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÒN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE EJECUCIÓN.
ACTA DE INICIO:	24 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE JUNIO DE 2026
ESTADO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN

5. MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA

La presente solicitud de **Prórroga No. 01 por un término de un (01) mes** se fundamenta en situaciones de carácter climático presentadas durante la ejecución de la obra, las cuales han afectado de manera directa el normal desarrollo de las actividades programadas.

Durante el periodo comprendido entre el 06 de marzo del 2026 hasta la fecha presente 05 de junio de 2026 **(se anexa reporte del IDEAM),** se han presentado constantes lluvias y condiciones climáticas adversas que han impedido la continuidad normal de los trabajos, especialmente en las actividades relacionadas con la cubierta de la obra, acabados de pintura, de estuco, entre otros.

Es importante señalar que las labores de instalación, adecuación y trabajo en cubierta representan actividades de alto riesgo, razón por la cual no es seguro ejecutar dichas actividades en condiciones de lluvia, humedad o superficies mojadas, debido a las implicaciones que ello representa para la integridad y seguridad del personal operativo, así como para la calidad de las actividades ejecutadas y la protección de los equipos.

En atención a las normas de seguridad y salud en el trabajo, y con el propósito de prevenir accidentes laborales y garantizar la correcta ejecución técnica del contrato, fue necesario suspender parcialmente algunas actividades mientras las condiciones climáticas permitían su desarrollo seguro. Entre las actividades afectadas se encuentran el desmonte de cubierta, pintura en estructura, instalación de cubierta nueva, entre otros. Esta situación generó retrasos en dichas labores y de manera consecuente, impactó el avance de otras actividades dependientes, tales como estuco, acabados de pintura, instalación de cielo raso, redes eléctricas, entre otras.

Por lo anterior, los retrasos presentados obedecen a circunstancias externas y ajenas a la voluntad del contratista, las cuales afectan directamente el cumplimiento del cronograma inicialmente establecido.

En consecuencia, y con el fin de garantizar la terminación adecuada de las actividades contractuales, se solicita respetuosamente la aprobación de la **Prórroga No. 01 por un (01) mes** contado a partir de la fecha de terminación inicialmente pactada (24 de junio del 2026), sin que ello implique modificación del objeto contractual ni mayores alcances al contrato suscrito.

Esta prórroga se presenta como una medida razonable y proporcionada que la complementa frente a una circunstancia técnica sobreviniente, evitando entregas formales que no permitan la puesta en operación plena de la sede, así como futuros reprocesos, contrataciones fragmentadas o mayores costos para la Entidad.

La presente solicitud no modifica el alcance ni las condiciones del contrato, y tiene como finalidad permitir la terminación integral del proyecto conforme a lo establecido contractualmente.

6. TIEMPO SOLICITADO

Con fundamento en las condiciones descritas anteriormente, se solicita aprobar una **prórroga por el término de un (01) mes.**

CONCEPTO	FECHA
Terminación contractual actual	24 de junio de 2026
Tiempo solicitado	Un (01) mes
Nueva fecha de terminación	24 de julio de 2026

7. COMPROMISOS

Con el fin de garantizar la continuidad del proyecto, optimizar el tiempo adicional solicitado y asegurar la culminación satisfactoria de las actividades pendientes dentro del alcance contractual, se establecen los siguientes compromisos:

- Continuar con la ejecución de las actividades programadas dentro de las áreas actualmente habilitadas, manteniendo el ritmo de trabajo y garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos establecidos.
- Presentar y ajustar el cronograma de obra conforme al plazo adicional solicitado, incluyendo la programación de las actividades pendientes una vez se habilite el segundo bloque de intervención.
- Disponer del personal técnico, operativo y de los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento del nuevo plazo aprobado.
- Mantener actualizado el seguimiento físico y documental del proyecto mediante informes periódicos de avance.
- Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, condiciones de seguridad y calidad durante la etapa restante de ejecución.

8. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos durante el periodo evaluado reflejan un avance físico de obra, en el cual se ha mantenido la ejecución de las actividades conforme a las condiciones en obra, permitiendo avances importantes en el mejoramiento de la infraestructura de los diferentes puestos de salud que hacen parte del lote 04 en las veredas La Chapa, San José, Chire, Las Tapias, San Nicolas, Puerto Colombia y Corralito.

No obstante, durante el periodo de ejecución se presentaron condiciones climáticas adversas y recurrentes que afectaron el normal desarrollo de las actividades constructivas en las veredas La Chapa, Chire, Las Tapias, Puerto Colombia, San José, San Nicolas y Corralito, generando disminución en los rendimientos de obra, restricciones operativas y dificultades para la ejecución continua de algunas actividades programadas, situación que impactó el cumplimiento del cronograma inicialmente establecido.

Las constantes precipitaciones y variaciones climáticas registradas ocasionaron afectaciones en las condiciones de acceso, movilización de materiales, seguridad en obra y desarrollo de procesos constructivos, limitando consecutivamente el avance normal de las actividades pendientes para la culminación integral del proyecto.

En consecuencia, desde el punto de vista técnico y administrativo, se considera procedente y necesaria la aprobación de una prórroga por el término de un (01) mes, permitiendo disponer del tiempo requerido para culminar las actividades restantes y garantizar el cumplimiento total del objeto contractual.

Finalmente, la ampliación solicitada no representa modificación del alcance del contrato ni variación de las condiciones técnicas inicialmente establecidas, sino una medida orientada a asegurar la correcta terminación del proyecto, la funcionalidad de la infraestructura intervenida y la entrega satisfactoria de los puestos de salud del municipio de Hato Corozal.

Revisó:


ALFREDO LEIVA JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COSALUD

Aprobó:


BELQUIS BRICEIDA SEPULVEDA MANCIPE
R/L SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO SAS
INTERVENTORIA


Anexos: Reportes de lluvias estación Paz de Ariporo IDEAM - Marzo
Reportes de lluvias estación Paz de Ariporo IDEAM – Abril
Reportes de lluvias estación Paz de Ariporo IDEAM – Mayo
Reportes de lluvias estación Paz de Ariporo IDEAM – Junio

REGISTRO FOTOGRÁFICO INVIERNO

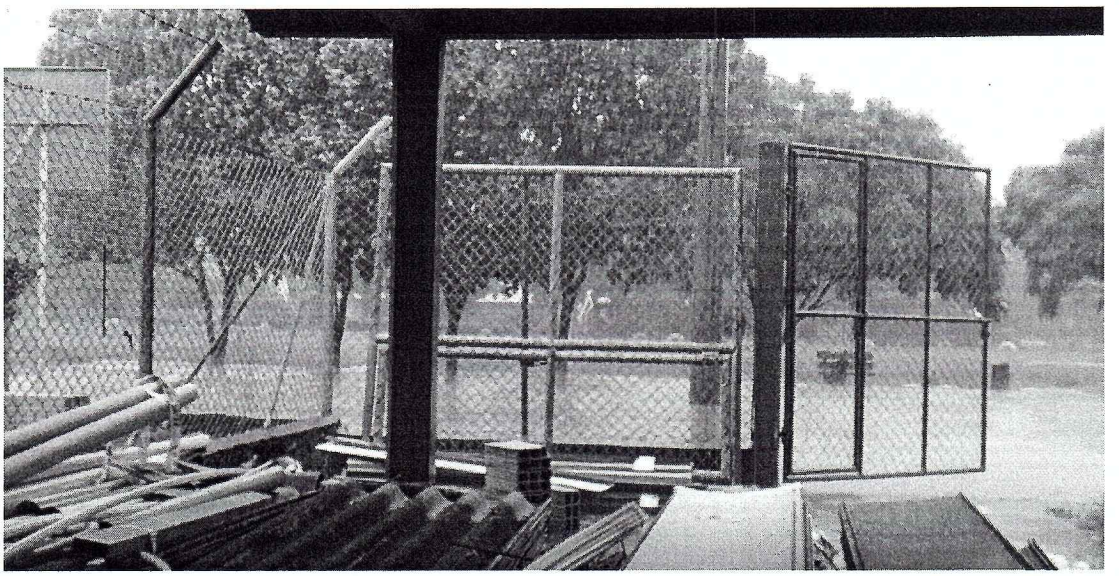



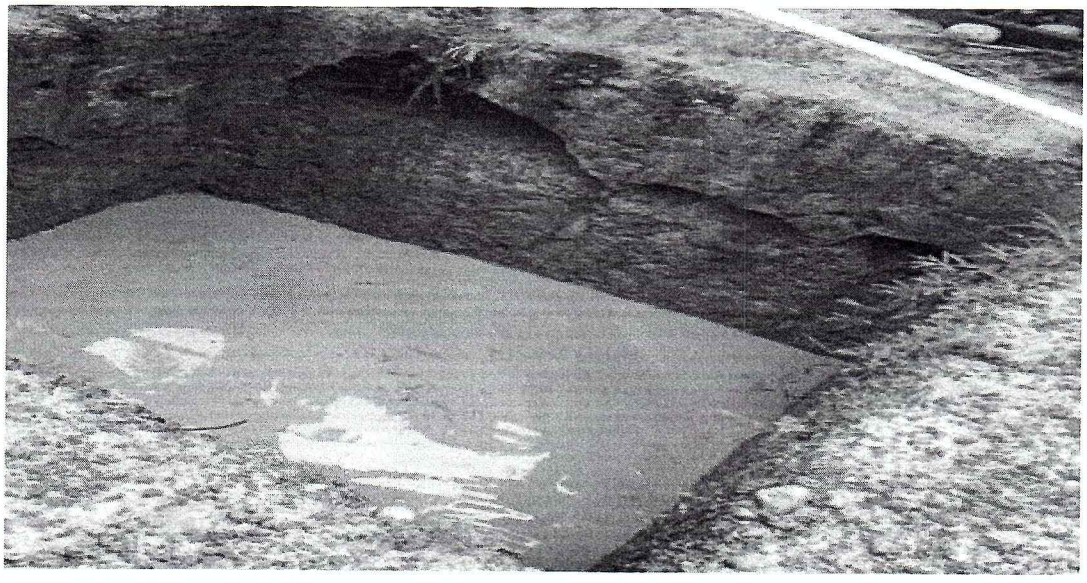

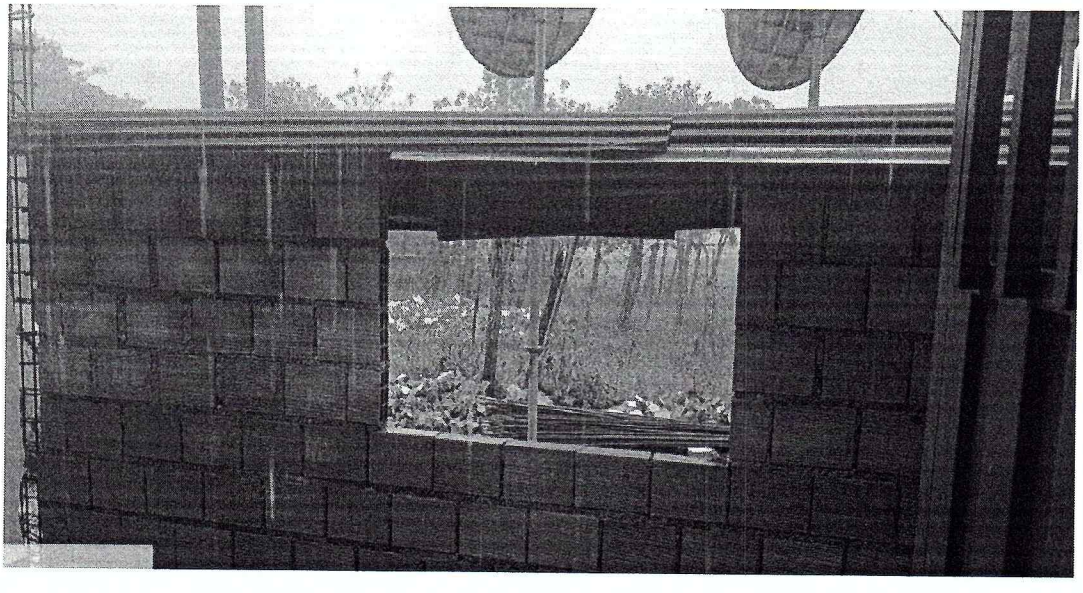

Adecuación Menor de los Puestos de Atención Primaria en Salud (PAPS) Veredas: San Nicolás, San José, Chire, Puerto Colombia, La Chapa, Corralito y Las Tapias Municipio de Hato Corozal – Departamento de Casanare

REPORTE DEL CLIMA IDEAM MESES **MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO** DE 2026

IDEAM

REPORTE ESTACIÓN CLIMATOLOGICA PAZ DE ARIPORO MES MARZO 2026

CODIGO ESTACIÓN	NOMBRE ESTACIÓN	VARIABLE	PARÁMETRO	FECHA	UNIDAD	VALOR	NIVEL APROBACIÓN	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	6-mar-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	7-mar-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	10-mar-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	11-mar-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	12-mar-26	mm	2	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	13-mar-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	16-mar-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	17-mar-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	18-mar-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	19-mar-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	20-mar-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	22-mar-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	23-mar-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	24-mar-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	25-mar-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	26-mar-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	27-mar-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	28-mar-26	mm	7.6	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	29-mar-26	mm	32.8	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	30-mar-26	mm	10	PRELIMINAR	LLUVIA

IDEAM

REPORTE ESTACIÓN CLIMATOLOGICA PAZ DE ARIPORO MES ABRIL 2026


CODIGO ESTACIÓN	NOMBRE ESTACIÓN	VARIABLE	PARÁMETRO	FECHA	UNIDAD	VALOR	NIVEL APROBACIÓN	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	3-abr-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	4-abr-26	mm	3	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	5-abr-26	mm	16	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	6-abr-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	7-abr-26	mm	12	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	8-abr-26	mm	2	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	9-abr-26	mm	14.8	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	10-abr-26	mm	4.2	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	13-abr-26	mm	22	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	14-abr-26	mm	19.5	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	15-abr-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	16-abr-26	mm	8.3	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	17-abr-26	mm	12	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	19-abr-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	20-abr-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	21-abr-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	23-abr-26	mm	31.5	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	24-abr-26	mm	2	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	25-abr-26	mm	19	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	26-abr-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	27-abr-26	mm	2	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	28-abr-26	mm	9.5	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	29-abr-26	mm	6.5	PRELIMINAR	LLUVIA

IDEAM		REPORTE ESTACIÓN CLIMATOLOGICA PAZ DE ARIPORO MES MAYO 2026						
CODIGO ESTACIÓN	NOMBRE ESTACIÓN	VARIABLE	PARÁMETRO	FECHA	UNIDAD	VALOR	NIVEL APROBACIÓN	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	1-may-26	mm	63	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	2-may-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	3-may-26	mm	0.5	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	4-may-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	5-may-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	6-may-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	7-may-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	8-may-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	9-may-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	10-may-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	11-may-26	mm	6	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	12-may-26	mm	97	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	13-may-26	mm	67.7	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	15-may-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	18-may-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	19-may-26	mm	14.7	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	21-may-26	mm	39.5	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	22-may-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	23-may-26	mm	2	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	26-may-26	mm	26.7	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	27-may-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	28-may-26	mm	6.8	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	29-may-26	mm	4.1	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	30-may-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	31-may-26	mm	0	PRELIMINAR	

IDEAM		REPORTE ESTACIÓN CLIMATOLOGICA PAZ DE ARIPORO MES JUNIO 2026						
CODIGO ESTACIÓN	NOMBRE ESTACIÓN	VARIABLE	PARÁMETRO	FECHA	UNIDAD	VALOR	NIVEL APROBACIÓN	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	1-jun-26	mm	22.5	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	2-jun-26	mm	1.5	PRELIMINAR	LLUVIA
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	3-jun-26	mm	0	PRELIMINAR	
36015010	PAZ DE ARIPORO [36015010]	PRECIPITACIÓN	DÍA PLUVIOMÉTRICO (CONVENCIONAL)	4-jun-26	mm	14	PRELIMINAR	LLUVIA

Adecuación Menor de los Puestos de Atención Primaria en Salud (PAPS) Veredas: San Nicolás, San José, Chire, Puerto Colombia, La Chapa, Corralito y Las Tapias Municipio de Hato Corozal – Departamento de Casanare

REPROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE CAJA VEREDA CHIRE

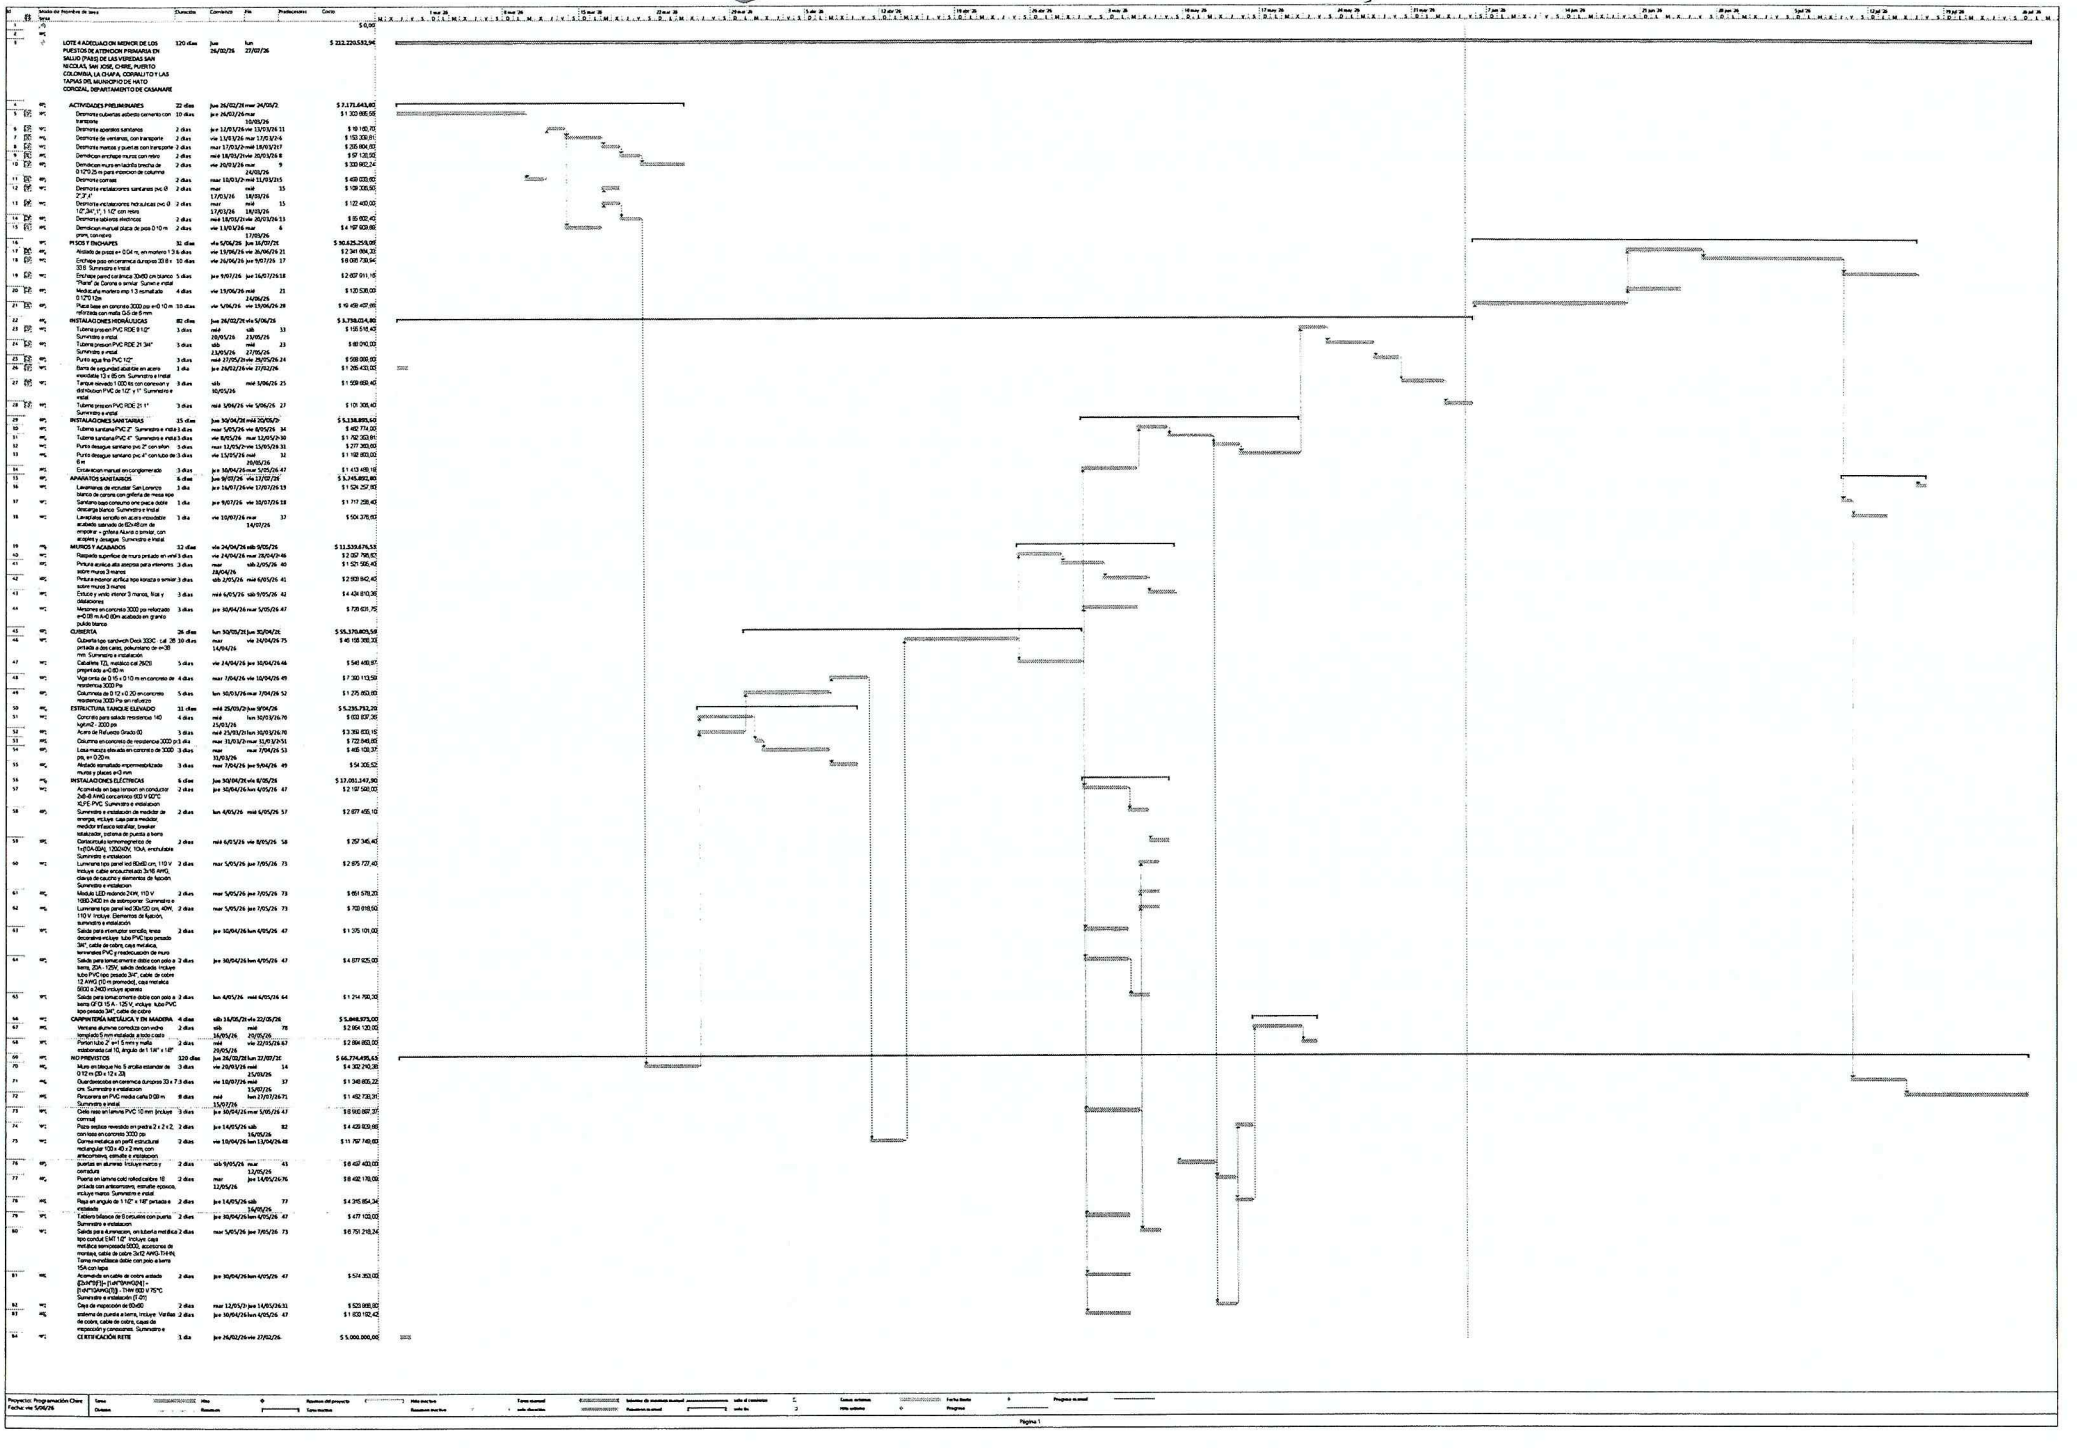


EDT	Modo de Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1						$ 0,00
2						
3	LOTE 4 ADECUACION MEJMOR DE LOS PUESTOS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (PAS) DE LAS VEREDAS SAN NICOLAS, SAN JOSE, CHIRE, PUERTO COLOMBIA, LA CHAPA, CORRALITO Y LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	120 días	lun 26/02/26	lun 27/07/26		$ 233.220.532,94
4	ACTIVIDADES PRELIMINARES	22 días	lun 26/02/26	mar 24/03/2		$ 7.171.643,80
5	Demonte tuberias aislando cemento con transporte	10 días	jue 26/02/26	mar 10/03/26		$ 1.322.885,58
6	Desmonte aparatos sanitarios	2 días	jue 12/03/26	vie 13/03/26	21	$ 161.170,70
7	Desmonte de ventanas, con transporte	2 días	vie 13/03/26	mar 17/03/26	6	$ 153.330,81
8	Desmonte muebles y puertas con transporte	2 días	mar 17/03/26	mié 18/03/26	7	$ 205.804,00
9	Demolicion enchape muros con retiro	2 días	mié 18/03/26	vie 20/03/26	8	$ 97.120,00
10	Demolicion muro en ladrillo bracha de 0.12*0.25 m para instancion de columna	2 días	vie 20/03/26	mar 24/03/26	9	$ 330.982,24
11	Desmonte cornisas	2 días	mar 10/03/26	mié 11/03/26	15	$ 459.033,60
12	Desmonte instalaciones sanitarias (vc, d, 2",3",4"	2 días	mar 17/03/26	mié 18/03/26	15	$ 109.306,50
13	Desmonte instalaciones hidraulicas (vc, d 1/2",3/4",1, 1 1/2" con retiro	3 días	mar 17/03/26	mié 18/03/26	15	$ 122.400,00
14	Desmonte salideas electricas	2 días	mié 18/03/26	vie 20/03/26	13	$ 85.602,40
15	Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, convenio	2 días	vie 13/03/26	mié 18/03/26	6	$ 4.197.609,60
16	PISOS Y ENCHAPES	32 días	vie 6/06/26	jue 16/07/26		$ 90.625.259,09
17	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3 h.de	3 días	vie 13/06/26	vie 26/06/26	21	$ 2.341.994,20
18	Enchape piso en ceramica dunapiso 33.8 x 33.8. Suministro e instal	10 días	vie 26/06/26	jue 9/07/26	17	$ 8.081.739,64
19	Enchape pared ceramica 30x60 cm blanco "Hand de Domino e semejr. Suministro e instal	5 días	jue 9/07/26	jue 16/07/26	18	$ 2.657.911,16
20	Alistado de muros e=e 1.3 m mortero 1:3 m.h.alt.ab 0.12*0.12m	4 días	vie 19/06/26	mié 24/06/26	21	$ 1.121.530,00
21	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 5 mm	10 días	vie 5/06/26	vie 19/06/26	28	$ 10.459.457,69
22	INSTALACIONES HIDRAULICAS	82 días	jue 26/02/26	vie 5/06/26		$ 8.798.034,80
23	Tuberia presion PVC RDE 9 1/2" Suministro e instal	3 días	mié 28/05/26	sáb 23/05/26	33	$ 155.510,40
24	Tuberia presion PVC RDE 21 3/4" Suministro e instal	3 días	sáb 23/05/26	mié 27/05/26	23	$ 681.040,00
25	Punto agua fria PVC 1/2"	3 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26	24	$ 558.000,00
26	Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 12 x 85 cm. Suministro e instal	1 día	jue 26/02/26	vie 27/02/26		$ 1.265.430,00
27	Tanque elevado 1.000 lts con cerreseun y distribucion PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal	3 días	sáb 30/05/26	mié 3/06/26	25	$ 1.559.650,40
28	Tuberia presion PVC RDE 21 1" Suministro e instal	3 días	mié 3/06/26	vie 5/06/26	27	$ 101.308,40
29	INSTALACIONES SANITARIAS	35 días	jue 30/04/26	mié 20/05/26		$ 5.138.899,60
30	Tuberia sanitaria PVC 2" Suministro e instal	3 días	mar 5/05/26	vie 8/05/26	34	$ 462.774,00
31	Tuberia sanitaria PVC 4" Suministro e instal	3 días	vie 8/05/26	mar 12/05/26	30	$ 1.767.350,80
32	Punto desague sanitario pvc 2" con sifon	3 días	mar 12/05/26	vie 15/05/26	31	$ 277.300,00
33	Punto desague sanitario pvc 4" con tubo de 0 m	3 días	vie 15/05/26	mié 20/05/26	32	$ 1.162.800,00
34	Entramicon manual en conglomerado	3 días	jue 30/04/26	mar 5/05/26	47	$ 1.413.489,16
35	ARMARIOS SANITARIOS	5 días	jue 9/07/26	vie 17/07/26		$ 5.745.892,80
36	Lavamanos de encastar San Lorenzo blanco de corona con griferia de mesa spe	1 día	jue 16/07/26	vie 17/07/26	19	$ 1.124.257,80
37	Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco Suministro e instal	1 día	jue 9/07/26	vie 10/07/26	18	$ 1.717.258,40
38	Lavaplatos sencillo en acero inoxidable acabado satinado de 60x40 cm de empotrar + griferia Alvora o similar, con aireador y desagüe. Suministro e instal	1 día	vie 10/07/26	mar 14/07/26	37	$ 904.376,60
39	MUROS Y ACABADOS	32 días	vie 24/04/26	sáb 5/06/26		$ 12.339.676,53
40	Raspado superficie de muro pintado en vinil	3 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26	46	$ 2.067.798,82
41	Pintura aplica alta alturas para elementos sobre muros 3 metros	3 días	mar 28/04/26	sáb 2/05/26	40	$ 1.521.566,40
42	Pintura interior acrilica tipo koraza o semiar sobre muros 3 metros	3 días	sáb 2/05/26	mié 6/05/26	41	$ 2.933.842,40
43	Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	3 días	mié 6/05/26	sáb 9/05/26	42	$ 1.424.810,38
44	Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m acabado en granito pulido blanco	3 días	jue 30/04/26	mar 5/05/26	47	$ 726.631,75
45	CUBIERTA	26 días	lun 30/03/26	jue 30/04/26		$ 55.370.803,58
46	Cubierta tipo sandwich Deck 3030C cal. 28 pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación	30 días	mar 14/04/26	vie 24/04/26	75	$ 45.158.388,30
47	Caballete TZL metalico cal 26(28) prepintado a=0.60 m	5 días	vie 24/04/26	jue 30/04/26	46	$ 540.480,97
48	Viga corta de 0.15 x 0.10 m en concreto de resistencia 3000 Psi	4 días	mar 7/04/26	vie 10/04/26	49	$ 7.300.113,59
49	Columnetas de 0.12 x 0.20 en concreto resistencia 3000 Psi sin refuerzo	5 días	lun 30/03/26	mar 7/04/26	52	$ 1.275.800,00
50	ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO	31 días	mié 25/03/26	jue 9/04/26		$ 5.235.752,20
51	Concreto para soleda resistencia 140 kg/cm2 - 3000 psi	4 días	mié 25/03/26	lun 30/03/26	70	$ 603.837,38
52	Acero de Refuerzo Grado 60	3 días	mié 25/03/26	lun 30/03/26	70	$ 3.393.633,15
53	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	5 días	mar 31/03/26	mar 7/04/26	51	$ 732.948,00
54	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.20 m	3 días	mar 31/03/26	mar 7/04/26	53	$ 405.103,37
55	Alistado semiliado impermeabilizado muros y placas e=0.1mm	3 días	mar 7/04/26	jue 9/04/26	49	$ 54.305,52
56	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6 días	jue 30/04/26	vie 8/05/26		$ 17.081.347,90
57	Acometida en baja tensión en conductor 2x8-8 AWG concentrico #22 V 60°C XLPE PVC. Suministro e instalacion	2 días	jue 30/04/26	lun 4/05/26	47	$ 2.187.560,00
58	Suministro e instalación de medidor de energia, incluye: Caja para medidor, medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	2 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26	57	$ 2.677.455,10
59	Gabinete para termomagnetico de 1+2DA-02A), 120/240V, 10kA, empotrable Suministro e instalacion	2 días	mié 6/05/26	vie 8/05/26	58	$ 257.345,40
60	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V incluye cable encauchetado 3x16 AWG, clavijas de caucho y elementos de fijación Suministro e instalacion	2 días	mar 5/05/26	jue 7/05/26	75	$ 2.675.727,40
61	Modulo LED modelo 24W, 110 V 1900-2400 lm de sobreponer Suministro e	2 días	mar 5/05/26	jue 7/05/26	73	$ 651.570,20
62	Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 40W, 110 V Incluye Elementos de fijación, suministro e instalación	2 días	mar 5/05/26	jue 7/05/26	73	$ 702.018,60
63	Salida para interruptor sencillo, tipo decorativo incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica, terminales PVC y redimensionamiento de muro	2 días	jue 30/04/26	lun 4/05/26	47	$ 1.375.101,00
64	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada incluye tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5600 o 2400 incluye aparato	2 días	jue 30/04/26	lun 4/05/26	47	$ 4.077.625,00
65	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	2 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26	64	$ 1.214.700,30
66	CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA	4 días	sáb 16/05/26	vie 22/05/26		$ 5.848.973,00
67	Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 6 mm instalada a todo costo	2 días	sáb 16/05/26	mié 20/05/26	78	$ 2.064.120,00
68	Portan lúa 2" en1 5 mm y malla mosquitera cal 18, angulo de 1 1/4" x 1/8"	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26	67	$ 2.864.853,00
69	NO PREVISTOS	120 días	jue 26/02/26	lun 27/07/26		$ 66.774.495,65
70	Muro en bloque No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (30 x 12 x 23)	3 días	vie 26/06/26	mié 1/07/26	14	$ 4.302.240,30
71	Guardaescobas en ceramica dunapiso 33 x 7.5 cm. Suministro e instalacion	3 días	vie 10/07/26	mié 15/07/26	37	$ 1.340.605,22
72	Pinceleria en PVC media caña 0.03 m Suministro e instal	8 días	mié 15/07/26	lun 27/07/26	71	$ 1.452.730,31
73	Cielo raso en lamina PVC 10 mm incluye cornisa	3 días	jue 30/04/26	mar 5/05/26	47	$ 8.960.887,37
74	Pisos estilos revestido en piedra 2 x 2 x 2, con raso en concreto 3000 psi	2 días	jue 14/05/26	sáb 16/05/26	82	$ 4.429.809,68
75	Correa metalica en perfil estructural rectangular 100 x 40 x 2 mm, con anteconvexo, estrutte e instalacion	2 días	vie 29/05/26	lun 1/06/26	48	$ 11.797.740,60
76	puertas en aluminio incluye marco y cornisa ura	2 días	sáb 9/05/26	mar 12/05/26	45	$ 8.457.403,00
77	Pisaria en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anteconvexo, estrutte rgosos, incluye marco. Suministro e instal	2 días	mar 12/05/26	jue 14/05/26	76	$ 8.402.178,00
78	Reja en angulo de 1 1/2" x 1/8" pintada e instalada	2 días	jue 14/05/26	sáb 16/05/26	77	$ 4.376.854,34
79	Tablero bifasico de 8 circuitos con puerta Suministro e instalacion	2 días	jue 30/04/26	lun 4/05/26	47	$ 477.102,00
80	Salida para luminarias, en tubería metálica tipo conduit EMT 1/2" incluye: caja metálica rectangular 5X10, accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG-THHN, Tema monofilares doble con polo a tierra 15A con tapa	2 días	mar 5/05/26	jue 7/05/26	73	$ 6.751.218,34
81	Acometida en cable de cobre aislado (2x(4*(8*[)-(1x(4*(8HHG)24] + (1x(4*(HHG)[)) - THW 600 V 75°C Suministro e instalación (T-07)	2 días	jue 30/04/26	lun 4/05/26	47	$ 574.353,00
82	Caja de inspeccion de 60x60	2 días	mar 12/05/26	jue 14/05/26	81	$ 620.988,80
83	sistema de puesta a tierra, incluye: Varillas de cobre, cable de cobre, cajas de inspección y conexiones. Suministro e	2 días	jue 30/04/26	lun 4/05/26	47	$ 1.820.182,40
84	CERTIFICACIÓN RETIE	1 día	jue 26/02/26	vie 27/02/26		$ 5.000.000,00

Proyecto: Programación Chire
Fecha: vie 5/06/26

Página 1

LOTE 4 ADECUACION MEJOR DE LOS PUESTOS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (PAES) DE LAS VEREDAS SAN NICOLAS, SAN JOSE, CHITE, PUERTO GOMEZ, LA CHAPA, CORRALITO Y LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE MATO CORROSAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	26/02/2026	5/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	26/03/2026	2/04/2026	9/04/2026	16/04/2026	23/04/2026	30/04/2026	7/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	4/06/2026	11/06/2026	18/06/2026	25/06/2026	2/07/2026	9/07/2026	16/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	TOTAL
ACTIVIDADES PRELIMINARES																								
Demarcación preliminar, retiro escombros con transporte	$ 325.221,89	$ 796.752,41	$ 178.671,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.300.885,56
Retiro de aparatos sanitarios	$ -	$ -	$ 19.160,70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.160,70
Desmonte de ventanas, con transporte	$ -	$ -	$ 57.582,43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 154.339,81
Demolición muros y pisos con transporte	$ -	$ -	$ -	$ 295.804,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 295.804,60
Demolición enchape muros en vidrio	$ -	$ -	$ -	$ 57.128,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57.128,50
Demolición muro en bahareque brocha de 0.12*0.25 m para inserción de columna	$ -	$ -	$ -	$ 144.804,73	$ 186.177,51	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 330.982,24
Desarme cubiertas	$ -	$ -	$ 499.033,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 499.033,60
Desarme y traslado tuberías sanitarias para Ø 2", 3", 4"	$ -	$ -	$ 109.136,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 109.136,50
Desmonte tuberías para redes hidráulicas para Ø 1/2", 3/4", 1", 1 1/2" con retiro	$ -	$ -	$ 122.460,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 122.460,00
Desmonte tableros eléctricos	$ -	$ -	$ 85.682,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 85.682,40
Demolición manual placa de piso 0.15 m para, con retiro	$ -	$ -	$ 1.574.136,21	$ 2.623.693,68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.197.909,89
PISOS Y ZOCALOS
Alizado de pisos e= 0.04 m, mezcla 1:3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Enchape piso en cerámica dorados 31.6 x 31.6. Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 245.923,27	$ 2.097.748,96	$ -	$ -	$ -	$ 2.343.664,23
Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Pisos" de Corona o similar. Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 457.255,50	$ 3.048.369,97	$ 2.591.114,47	$ -	$ 6.096.739,94
Muro divisorio interno bloq 1/2 arcilla de 0.12*0.3 2m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 977.966,69	$ 1.629.944,48	$ -	$ 2.607.911,17
Muro divisorio interno bloq 1/2 arcilla de 0.12*0.3 2m. Pega bloc en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla 0.5 de 6 mm	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.833,75	$ 101.702,25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.536,00
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.216.156,48	$ 9.729.201,83	$ 8.523.952,35	$ -	$ -	$ -	$ 19.458.407,66
Tubería presión PVC RDE 9 1/2", Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 155.516,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 155.516,40
Tubería pvs desc PVC RDC 21 3/4", Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.001,25	$ 77.008,75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 88.010,00
Llaves agua fría PVC 1/2"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 568.089,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 568.089,60
Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 33 x 82 cm. Suministro e instal.	$ 1.265.453,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.265.453,00
Tanque elevado 2.000 lts con consolas y distribución PVC de 1/2" a 2". Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 354.943,21	$ 1.799.716,17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.559.659,40
Tubería presión PVC RDE 21 3", Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 101.306,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 101.306,40
INSTALACIONES SANITARIAS
Tubería sanitaria PVC 2", Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Tubería sanitaria PVC 4", Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 462.774,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 462.774,00
Punto desagüe sanitario por 2" con sifón	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 746.814,09	$ 1.043.539,71	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.790.353,81
Punto desagüe sanitario por 4" con sifón de 8 m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 277.383,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 277.383,60
Ventilación sanitaria por 2" con tubo de 8 m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 546.742,61	$ 646.150,38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.192.893,01
Ventilación sanitaria por 4" con bajante sólo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
APARATOS SANITARIOS																								
Lavamanos de lavacaras San Lorenzo blanco de carrera con gallería de mesa tipo pozo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Lavaplatos sencillo en acero inoxidable calibre 20 de 62x48 cm de empotrar 1 gallón y drenaje a derecha, con sifones y desagüe. Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MUEBLES Y ACABADOS
Mesón en lámina de acero inoxidable calibre 20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Mesón en acero inoxidable con bordes y debajo tubos inferior 3 niveles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Mesón en concreto 3000 psi reforzado, e=0.10 m. A=0.60m acabado en granito pulido blanco	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARPINTERIA
Cubierta tipo sandwich Grob 35JC +cal. 26 pintado a dos caras, pendientes de e=20 mm. Suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.078.183,17	$ 23.078.183,17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.156.366,34
Cubierta TEJ sandwich cal 26/28 prepintado acabado en teja color de 0.15 a 0.20 m en concreto de referencia 3000 Psi	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 123.405,72	$ 425.064,15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 548.469,87
Columnas de 0.12 x 0.25 en concreto referencia 3000 Psi de refuerzo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.390.113,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.390.113,99
ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 956.890,55	$ 318.963,45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.275.854,00
Concreto para relleno radicante 140 kg/cm2 - 2000 psi	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 455.570,60	$ 178.866,78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 634.437,38
Muros de Retenes y Losas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.219.568,44	$ 139.964,71	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.359.533,15
Columnas en concreto de referencia 3000 psi	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 722.866,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 722.866,80
Viga tensión elevado en concreto de 3000 psi, e= 0.25 m.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 271.113,80	$ 193.795,57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 465.109,37
Alizado revestido impermeable alo muros y placas e=3 cm	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 54.305,52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 54.305,52
INSTALACIONES ELECTRICAS
Acometida en bajo tensión en conductor 2x8 +8 AWG cero halógeno 600 V XFC XLPE-PVC. Suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.236.148,88	$ 961.449,13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.197.598,01
Tacómetros e instalación de medidor de energía, incluye: cajas para medidor, medidor trifásico tetrafilar, tornillo tipo medidor, sistema de puesta a tierra	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.877.455,10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.877.455,10
Cortacircuito termomagnético de 2x100A-60A), 220/240V, 10kA, enchufable. Suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 257.345,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 257.345,40
Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V, incluye: cable encauchetado 3x18 AWG, diseño de cuerpo y elementos de fijación. Suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.875.727,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.875.727,40
Ventilador de techo de 3 velocidades 220 V, 3 aspas de 132 cm de diámetro, 60 W. Suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 651.578,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 651.578,20
Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 40W, 110 V, incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 703.618,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 703.618,50
Salida para interruptor sencilla, tipo decorativo incluye tubo PVC tipo pesado, 3/4", cable de cobre, caja metálica, terminales PVC y construcción de muro.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 771.494,31	$ 603.606,69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.375.101,00
Cable para tomacorriente doble con polo a tierra, 15A, 125V, cable dedicado, incluye: tubo PVC tipo pesado, 3/4", cable de cobre 3 AWG (12 m promedio), caja metálica 5868 o 2 400 incluye aislado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.741.852,81	$ 2.134.992,19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.877.925,00
Cable para tomacorriente doble con polo a tierra, GFCI 15A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.214.799,90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.214.799,90
CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA
Ventana aluminio con vidrio corredizo semiabatible 2 pies incluido 4 lados para mosquitero	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 553.897,50	$ 2.400.222,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.954.120,00
Puerta tubo 2" en 2 pies y medio + Balcones de 10 Angulo de 1 1/4" x 1/8".	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.894.853,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.894.853,00
NO PREVISTOS
Muro en bloque No. 5 arcilla estándar de 0.12 m (30 x 12 x 20)	$ -	$ -	$ -	$ 1.754.811,36	$ 1.047.899,82	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.302.711,18
Guardaescoba en cerámica dorados 33 x 7 cm. Suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 393.481,52	$ 955.403,70	$ -	$ -	$ 1.348.885,22
Mesones en PVC media caña 0.09 m. Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 522.677,81	$ 907.961,44	$ 22.699,04	$ 1.452.738,31
Cielo raso en baldoc PVC 10 mm (incluye cenefas)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.367.836,51	$ 5.613.060,86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.980.897,37
Punto regleta reversible en platina 2 x 2.2, con toma en concreto 3000 psi	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.429.929,86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.429.929,86
Correa metálica en perfil comercial rectangular 100 x 40 x 2 mm, con antioxidante, esmalte e instalación, incluye: pernos en extremos. Incluye: corte y soldadura	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.161.515,45	$ 6.636.234,15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.797.749,60
Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte sintetico, incluye: marco. Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 812.175,00	$ 5.685.225,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.497.400,00
Reja en angulo de 1 1/2" x 1/8" pintada e instalada	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.492.178,09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.492.178,09
Tablero bifásico de 8 circuitos con puerta. Suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.115.854,34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.115.854,34
Salida para iluminación, en tubería metálica tipo sandwich EMT 1/2", incluye: caja octagonal galvanizada, accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG, THHW. Toma monofásico doble con polo a tierra 15A, con tapa.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 208.868,75	$ 268.731,25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 477.600,00
Acometida en cable de cobre aislado, 2[1x#1/0 AWG (fase) THW(LSZH) + 1x#1/0 AWG(N) - THW 600 V 75°C. Suministro e instalación (ITC 10)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.751.218,24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.751.218,24
Caja de inspección de diodo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 323.073,36	$ 251.279,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 574.352,80
Sistema de puesta a tierra, incluye: Varilla de cobre, cable de cobre, caja de inspección y conectores. Suministro e instalación.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 523.868,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 523.868,80
CERTIFICACIÓN RITE	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000,00
AMARRE DE PARAGUAS	$ 6.590.854,89	$ 796.752,41	$ 2.328.784,70	$ 4.780.479,15	$ 6.908.795,57	$ 2.260.102,42	$ 13.118.693,58	$ 29.714.417,32	$ 23.971.262,62	$ 31.894.600,96	$ 36.378.627,22	$ 25.878.615,54	$ 6.157.743,53	$ 965.041,58	$ 2.617.173,05	$ 9.729.203,83	$ 8.775.832,47	$ 2.656.698,71	$ 3.048.369,97	$ 8.121.579,61	$ 4.664.710,95	$ 907.961,44	$ 22.699,04	$ 212.220.532,99
PROGRAMADO SEMANAL	3,11%	0,38%	1,10%	2,25%	3,26%	1,07%	6,18%	14,00%	11,30%	15,03%	17,14%	12,19%	2,90%	0,45%	1,23%	4,58%	4,14%	1,25%	1,44%	3,83%	2,20%	0,43%	0,01%	100,00%
PROGRAMADO ACUMULADO	3%	3%	5%	7%	10%	11%	17%	31%	43%	59%	76%	88%	91%	92%	93%	98%	102%	103%	105%	109%	111%	111%	111%	

REPROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE CAJA VEREDA CORRALITO

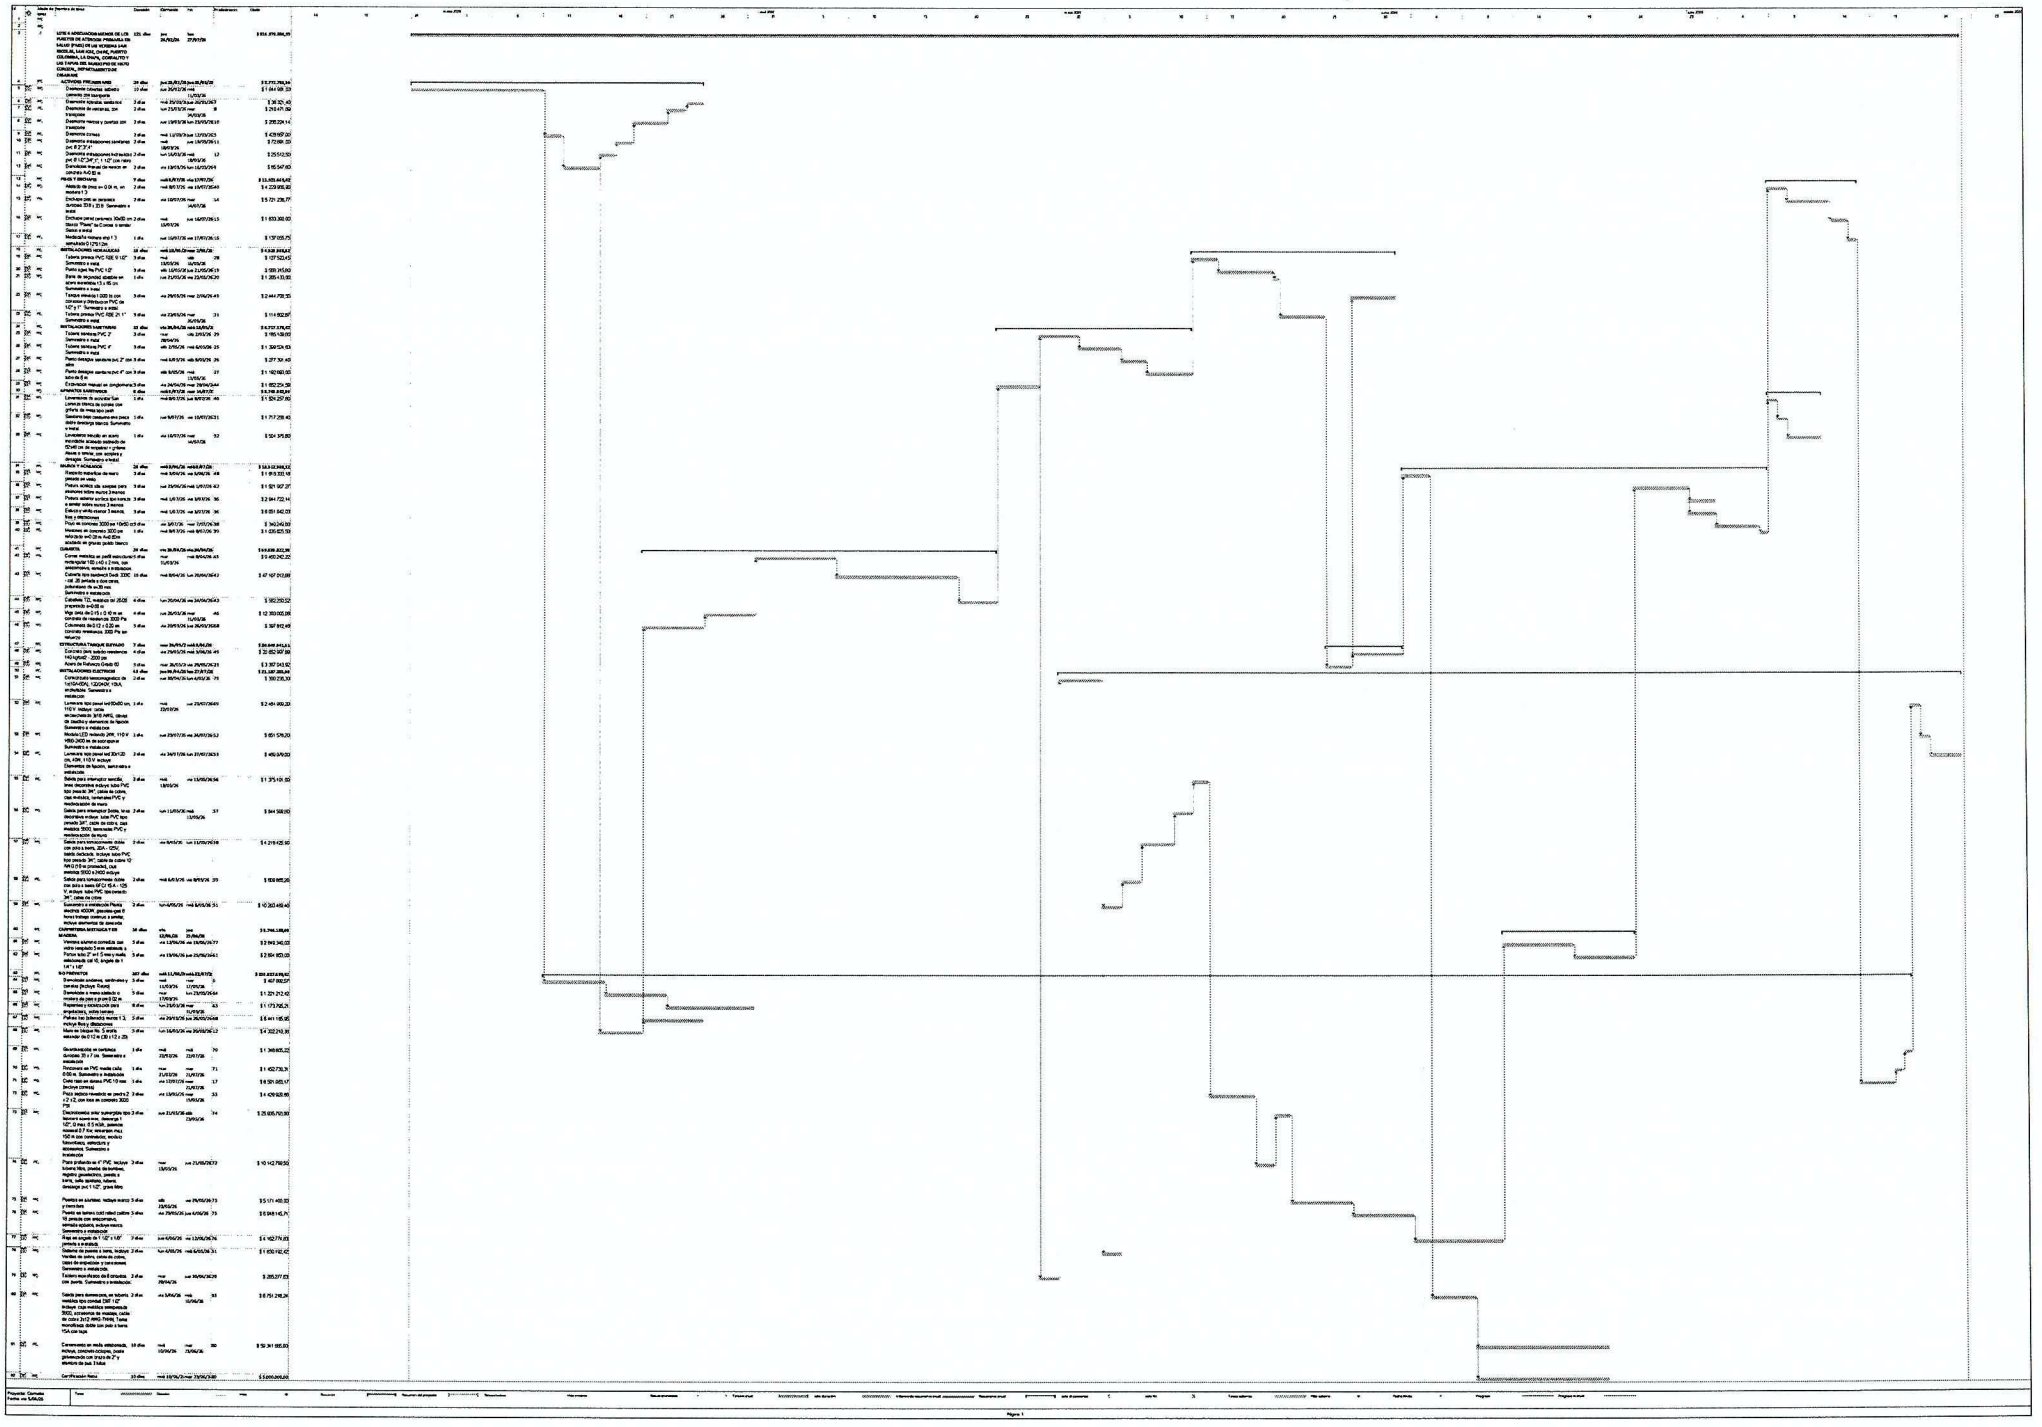


LOTE 6 ADECUACION MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (PAMS) DE LAS VEREDAS SAN NICOLAS, SAN JOSE, CHARE, PUERTO COLOMBIA, LA CHAPIL, CORRALITO Y LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE PUNTO CORDICAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29	Semana 30	
ACTIVIDES PRELIMINARES																								
Desmonte cobertura asbesto cemento con transporte	$ 411.240,26	$ 822.480,52	$ 411.240,26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.644.961,04
Desmonte aparatos sanitarios	$ -	$ -	$ -	$ 58.321,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58.321,40
Desmonte de ventanas, con transporte	$ -	$ -	$ -	$ 210.471,69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 210.471,69
Desmonte marcos y puertas con transporte	$ -	$ -	$ -	$ 33.278,02	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 266.224,14
Desmonte cercas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 232.946,12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 232.946,12
Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2", 3", 4"	$ -	$ -	$ -	$ 428.857,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 428.857,00
Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4", 1", 1 1/4" con retiro	$ -	$ -	$ -	$ 72.891,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 72.891,00
Demolición manual de muros en concreto 0=0.60 m	$ -	$ -	$ -	$ 25.512,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.512,50
PISOS Y ENCHAPES	$ -	$ -	$ -	$ 85.547,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 85.547,80
Alistado de piso e=0.04 m, en mortero 1:3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.229.986,90	$ -	$ -	$ -	$ 4.229.986,90
Enchape piso en ceramica durapiso 33.5 x 33.5. Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.503.041,09	$ 3.218.195,68	$ -	$ -	$ 5.721.236,77
Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Piano" de Corona o similar. Suma e instal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.833.390,00	$ -	$ -	$ 1.833.390,00
Medallon mortero imp 1:3 acrellado 0.12*0.12m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 157.055,75	$ -	$ -	$ 157.055,75
INSTALACIONES HIDRAULICAS																								
Tuberia presion PVC RDE 9 1/2", Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 127.523,45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 127.523,45
Punto agua fria PVC 1/2"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 71.019,48	$ 497.276,53	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 568.315,81
Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 45 cm. Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.265.433,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.265.433,00
Tanque elevado 1.000 lts con columnas y distribucion PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.222.354,25	$ 1.222.354,25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.444.708,50
Tuberia presion PVC RDE 21 1", Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.526,32	$ 62.075,55	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 114.602,87
INSTALACIONES SANITARIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Tuberia ventila PVC 2". Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 185.109,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 185.109,60
Tuberia sanitaria PVC 4", Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58.813,51	$ 1.341.211,30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.399.524,81
Punto desague sanitario pvc 2" con sifon	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 277.391,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 277.391,40
Punto desague sanitario pvc 4" con tubo de 6 m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 99.407,75	$ 1.093.483,25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.192.891,00
Excavacion manual en conglomerado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 623.345,47	$ 1.038.909,12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.662.254,59
APARATOS SANEAMIENTO																								
Lavamanos de incrusta i San Lorenzo blanco de cromo con grifería de mesa tipo josh	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.324.257,80	$ -	$ -	$ -	$ 1.324.257,80
Sanitario tasa cosmos one pieza doble descarga blanco. Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.717.258,40	$ -	$ -	$ -	$ 1.717.258,40
Lavaplatos sencillo en acero inoxidable acabado satinado de 42x61 cm de empotrar + grifería Akaia o similar; con acoples y desagüe. Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 441.329,53	$ 63.047,08	$ -	$ -	$ 504.376,61
MUROS Y ACABADOS																								
Revoque superficie de muro pintado en vinilo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.618.533,18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.618.533,18
Pintura acrilica alta apegue para interiores sobre muros 3 manos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 887.814,24	$ 634.153,03	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.521.967,27
Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.944.722,14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.944.722,14
Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y distinciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.051.642,01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.051.642,01
Pega en concreto 3000 psi 10x60 cm	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 85.062,25	$ 255.186,75	$ -	$ -	$ -	$ 340.249,00
Mesones en concreto 3000 psi reforzado anti.08 m Anti.60m acabado en granito pulido blanco	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.035.625,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.035.625,50
CUBIERTA																								
Correa metalica en perfil estructural rectangular 100 x 40 x 2 mm, con sistema mixto, cameto e instalacion.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.311.084,78	$ 6.149.157,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.460.242,22
Cubierta tipo sandwich Deck 333C-cal.26 plancha e dos caras, aislamiento de 40lb/ mm. Suministro e instalación.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.543.266,15	$ 28.853.045,27	$ 4.710.701,27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 47.107.012,69
Cobertela TZL metalico cal 25/28 prepintado e=0.50 m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 562.250,52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 562.250,52
Viga cinta de 0.35 x 0.35 m en concreto de resistencia 3000 Psi	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.767.033,63	$ 6.535.971,45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.303.005,08
Columnetas de 0.12 x 0.20 en concreto resistencia 3000 Psi sin refuerzo	$ -	$ -	$ -	$ 59.671,87	$ 338.140,61	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 397.812,48
ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO																								
Concreto para soleta resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.744.874,13	$ 12.908.123,56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.652.997,69
Acero de Refuerzo Grado 60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.387.043,92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.387.043,92
INSTALACIONES ELECTRICAS																								
Centrodmido termomagnetico de 3x(104-60A), 120/240V, 10mA, enchufable. Suministro e instalacion	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 168.882,92	$ 131.353,38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.236,30
Luminario tipo panel led 60x60 cm, 220 V. incluye: cable asecnelstado 3x16 AWG, clavija de conchay elementos de fijación. Suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.464.909,20	$ -	$ -	$ 2.464.909,20
Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2600 lm de sobreponer, Suministro e instalacion	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 651.578,20	$ -	$ -	$ 651.578,20
Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 40W, 120 V. incluye: elementos de fijación, suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 205.222,06	$ 263.856,94	$ 469.079,00
Salida para interruptor sencillo, lines decorative incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica, terminales PVC y canalización de muro.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.375.101,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.375.101,00
Salida para interruptor Doble, lines decorativas incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica 5800, terminales PVC y canalización de muro.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 644.599,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 644.599,80
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (de re proveedor), caja metalica 5800 o 2400 incluye acpesto	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.636.516,19	$ 1.581.909,71	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.218.425,90
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 809.866,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 809.866,20
Suministro e instalación: Planta electrica 400kW, gasolina-gas 8 horas trabajo continuo o similar, incluye elementos de conexión.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.203.489,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.203.489,40
CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA																								
Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo costo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 356.167,50	$ 2.493.172,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.849.340,00
Porton tubo 1" en 1.5 mm y malla eslabonada cal 10, ángulo de 1 1/4" x 1/8".	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 361.856,63	$ 2.532.996,38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.894.853,01
NO PREVISTOS																								
Demolición andenes, cachuelas y cunetas (incluye: Retiro)	$ -	$ -	$ -	$ 360.827,11	$ 136.865,46	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 497.692,57
Demolición a mano alistado o marteto de piso e pared 0.02 m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.160.151,80	$ 61.060,62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.221.212,42
Demolición y localización para lavaplatos, sobre terreno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 862.003,80	$ 311.789,35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.173.793,21
Pañete liso (alistado) interior 1:4, incluye filos y distinciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 966.174,88	$ 5.474.991,06	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.441.165,95
Muro en bloque No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (10 x 12 x 20)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.102.210,58	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.102.210,58
Electrocanales en cerrenco drenajes 21 x 7 cm. Suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.348.805,22	$ -	$ 1.348.805,22
Sifonicaros en PVC metia calle 0.09 m. Suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.452.738,31	$ -	$ 1.452.738,31
Caja rara en ladrillo PVC 10 mts (incluye cemento)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.517.180,27	$ 1.673.882,90	$ -	$ -	$ -	$ 9.591.063,17
Poso septico revestido en piedra 2.2 x 2 x 2 con losa en concreto 3000 Psi	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.045.576,78	$ 1.384.353,08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.429.929,86
Electrobomba solar sumergible tipo helice semi hor, descarga 1 1/2", Q max 4.5 m3/h, potencia nominal 0.7 Kw, tensiones max 250 ni con controlador, modulo fotovoltaico, estructura y accesorios. Suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.935.799,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.935.799,00
Pozo profundo de 4" PVC. Incluye tuberia filtro, prueba de bombeo, registro geoelectrico, martillo a boca, sello sanitario, tuberia descarga pvc 1 1/2", grava filtro	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.142.799,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.142.799,50
Puertas en aluminio. Incluye marcoy cerradura	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 587.855,00	$ 4.783.545,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.171.400,00
Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, marcos en ángulo. Incluye marco. Suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.084.443,71	$ 4.863.702,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.948.145,71
Teja en zinc tipo 1 1/2" x 1/8" pintada e instalada	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.561.040,56	$ 2.601.734,27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.162.774,83
Sistema de pozos a tierra, incluye: Varillas de cobre, cable de cobre, caja de inspección y concadanos. Suministro e instalación. Tablero monofasico de 6 circuitos con puerta. Suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.830.192,42	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.830.192,42
Salida para luminarias, en tubo conduit metalico tipo conduit EMT 1/2". incluye: caja metalica octogonal de 5800, conectores de tornillo, cable de cobre 3x12 AWG-THHN. Tiene suministro desde con polo a tierra 15A con tapa	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.109.755,70	$ 4.641.462,54	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.751.218,24
Cerramiento en malla eslabonada, incluye, concreto ciclopeo, poste galvanizado con brazo de 2" y alambre de pua 5 hilos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.311.360,81	$ 29.678.842,58	$ 8.159.681,69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 59.341.685,09
Certificación leeds	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.812.500,00	$ 2.500.000,00	$ 687.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000,00
AVANCE FINANCIERO	$ 411.240,26	$ 822.480,52	$ 1.270.431,96	$ 6.972.464,23	$ 12.785.307,89	$ 10.158.845,58	$ 19.692.423,59	$ 28.853.045,27	$ 5.896.257,26	$ 1.736.492,80	$ 17.329.418,04	$ 7.939.235,47	$ 39.666.018,23	$ 19.284.337,56	$ 24.283.309,23	$ 30.923.225,12	$ 35.025.871,63	$ 12.767.792,31	$ 9.715.579,45	$ 11.706.585,97	$ 12.768.868,78	$ 7.197.155,89	$ 263.856,94	$ 316.570.587,00
PROGRAMADO SEMANAL	0,13%	0,26%	0,40%	2,20%	4,03%	3,20%	6,21%	9,10%	1,86%	0,55%	5,47%	2,50%	12,51%	6,08%	7,66%	9,76%	11,05%	3,87%	3,07%	3,69%	4,03%	2,27%	0,08%	
PROGRAMADO ACUMULADO SEMANAL	0,13%	0,39%	0,79%	2,99%	7,01%	10,21%	16,44%	25,54%	27,40%	27,95%	33,41%	35,92%	48,44%	54,52%	62,18%	71,94%	82,99%	86,86%	89,92%	93,62%	97,65%	99,92%	100,00%	

REPROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE CAJA VEREDA LA CHAPA


LOTE 4: ADECUACIÓN MEJORES DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SAN NICOLÁS, SAN JOSÉ, CHIVÉ, PUERTO COLOMBIA, LA CHAPA, CORRALITO Y LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	26/02/2020	5/03/2020	12/03/2020	19/03/2020	26/03/2020	2/04/2020	9/04/2020	16/04/2020	23/04/2020	30/04/2020	7/05/2020	14/05/2020	21/05/2020	28/05/2020	4/06/2020	11/06/2020	18/06/2020	25/06/2020	2/07/2020	9/07/2020	16/07/2020	23/07/2020	30/07/2020	TOTAL
ACTIVIDADES PRELIMINARES																								
Descapote, nivelación y retiro, con transporte	$ 156.798,52	$ 874.156,57	$ 196.239,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.227.194,28
Demolición manual placa de piso 0,10 m prom, con retiro	-	-	$ 1.058.090,40	$ 1.763.484,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 2.821.574,41
Desmonte aparatos sanitarios	-	-	-	-	-	-	$ 76.642,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 76.642,80
Desmonte de ventanas, con transporte	-	-	-	-	-	$ 157.988,51	$ 22.569,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 180.558,30
Desmonte puertas y marcos con transporte	-	-	-	-	-	$ 272.140,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 272.140,23
Demolición enchape muros con retiro	-	-	-	-	$ 178.883,62	$ 11.925,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 190.809,19
Desmonte de cielo raso con retiro	-	-	-	-	$ 1.104.825,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.104.825,15
Demolición muro en ladrillo tolete de 0,12*0,16 m para instalación de columnas	-	-	-	$ 171.335,26	$ 158.573,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 329.909,16
Desmonte cornisas	-	-	$ 520.866,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 520.866,32
Desmonte instalaciones sanitarias por 8", 2", 3", 4"	-	-	-	$ 585.128,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 585.128,00
Desmonte instalaciones hidráulicas pvc/1/2", 3/4", 1", 1 1/2" con retiro	-	-	-	$ 40.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 40.820,00
Desmonte tablero eléctrico	-	-	-	$ 85.602,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 85.602,40
Demolición baño-muro, con retiro	-	-	$ 1.024.174,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.024.174,13
PISOS Y ENCHAPES																								
Afinado de pisos e=0,04 m, en mortero 1:4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 854.325,79	$ 1.586.605,04	-	-	-	-	$ 2.440.930,83
Enchape piso en cerámica durostato 33,8 x 33,8. Suministro e instal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 2.028.526,50	$ 3.767.263,50	-	-	-	$ 5.795.790,00
Enchape pared cerámica 20x60 con listelo "Pisos" de Corona o similar. Suministro e instal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.271.327,01	$ 939.678,49	-	-	$ 2.211.005,50
Placa base en concreto 3000 psi e=0,10 m reforzado con malla Q.3 de 6 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 6.678.641,24	$ 2.533.277,71	-	-	-	-	-	$ 9.211.918,95
Mediacaña en mortero 1:3 acabado en pintura epóxica 0,1*0,1 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 70.266,87	$ 51.936,38	-	$ 122.203,25
INSTALACIONES HIDRÁULICAS																								
Tubería presión PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 109.869,46	$ 21.973,89	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 131.843,35
Tubería presión PVC RDE 21 3/4". Suministro e instal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 114.413,00	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 114.413,00
Punto agua fría PVC 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 497.276,33	$ 71.039,48	-	-	-	-	-	-	-	$ 568.315,81
Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 1 1/2" x 80 cm. Suministro e instal.	$ 1.265.433,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.265.433,00
Tanque elevado 1.000 lts con accesorios y distribución PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.616.644,90	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.616.644,90
Tubería presión PVC RDE 21 1". Suministro e instal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 68.592,88	$ 58.040,13	-	-	-	-	-	-	$ 126.633,01
INSTALACIONES SANITARIAS																								
Tubería sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 283.854,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 283.854,72
Tubería sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 224.039,14	$ 1.568.273,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.792.313,12
Punto desagüe sanitario pvc 2" con sifón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 219.595,35	$ 57.788,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 277.383,60
Punto desagüe sanitario pvc 4" con tubo de 4 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.192.865,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.192.865,70
Excavación manual en conglomerado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 117.955,40	$ 1.297.509,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.415.464,78
APARATOS SANITARIOS																								
Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de sobreponer con grifería de mesa tipo push	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.333.725,58	$ 190.532,23	$ 1.524.257,81
Sanitario bajo consumo una pieza doble descarga blanco. Suministro e instal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.717.258,40	-	$ 1.717.258,40
MUROS Y ACABADOS																								
Pañete impermeabilizado muros 1:3 espesor 2 cm, filos y dilataciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 5.567.826,00	-	-	-	-	-	$ 5.567.826,00
Resane superficie de muro pintado en vinilo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 2.057.796,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 2.057.796,62
Pintura acrílica alta resistencia para fachadas sobre muros 3 manos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 443.915,89	$ 1.078.069,31	-	-	$ 1.521.985,20
Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 2.809.825,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 2.809.825,20
Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.106.202,59	$ 3.318.607,77	-	-	-	$ 4.424.810,36
Poyo en concreto 3000 psi 10x60 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 189.098,75	-	-	-	-	$ 189.098,75
Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0,08 m A=0,60 m acabado en granito pulido blanco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 441.351,90	$ 315.251,35	-	-	-	-	$ 756.603,25
CUBIERTA																								
Cubierta tipo sandwich Deck 33,51 cm, 38,20 mm e (techo), poliuretano de e=30 mm. Suministro e instalación	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 11.606.812,54	$ 27.310.147,15	$ 15.703.334,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 54.620.294,30
Cerchas 12, metálica cal 16/20 perfilado e=0,60 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 385.169,17	$ 207.398,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 592.567,95
Viga cinta de 0,15 x 0,10 m en concreto de resistencia 3000 Psi	-	-	-	-	-	-	-	$ 3.957.586,95	$ 3.957.586,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 7.915.173,90
Columnetas de 0,12 x 0,20 m en concreto resistencia 3000 Psi, sin refuerzo	-	-	-	-	-	-	$ 827.801,29	$ 240.329,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.068.130,70
ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO																								
Concreto para solado resistencia 1 kg/cm2 - 2000 psi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 479.251,47	$ 7.188.772,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 7.668.023,58
Acero de Refuerzo Grado 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.176.295,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.176.295,41
Zapata en concreto impermeabilizado para cimentación resistencia de 3000 psi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 677.449,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 677.449,50
Columnas en concreto de resistencia 3000 psi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 781.225,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 781.225,77
Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e=0,20 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 63.487,58	$ 445.013,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 508.500,63
Afinado enmallado impermeabilizado muros y placa e=3 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 42.991,87	$ 11.313,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 54.305,52
INSTALACIONES ELÉCTRICAS																								
Acometida en baja tensión en conductor 2x6+8 AWG en cable 600 V 90°C XLPE PVC. Suministro e instalación	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 2.001.238,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 2.001.238,20
Suministro e instalación de medidor de energía, incluye: caja para medidor, medidor trifásico bifilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 2.877.455,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 2.877.455,10
Cortacircuito termomagnético de 1X15A-20A, 120/240V, 10kA, enchufable. Suministro e instalación	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 257.343,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 257.343,40
Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V, incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 2.310.852,38	$ 154.056,83	-	$ 2.464.909,21
Módulo LED redondo 24W, 120 V 100-240V de sobreponer. Suministro e instalación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 651.578,20	-	$ 651.578,20
Módulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar, incluye cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 101.184,20	-	$ 101.184,20
Luminaria tipo panel led 30x30 cm, 40W, 110 V incluye elementos de fijación. Suministro e instalación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 205.222,06	$ 263.856,94	$ 469.079,00
Salida para interruptor sencillo, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metálica, terminales PVC y mano de obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.375.101,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.375.101,00
Salida para interruptor Doble, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metálica 5800, terminales PVC y mano de obra de mano.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.074.133,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.074.133,00
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metálica 5800 o 2400 incluye aparato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 2.743.832,81	$ 2.134.092,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 4.877.925,00
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.214.799,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.214.799,30
Acometida en cable de cobre aislado (2x6"AWG + (1x8"AWG(N)) + (1x8"10AWG(T)) - THW 600 V 75°C. Suministro e instalación (TED-1)	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 20.259,53	$ 803.892,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 824.152,41
CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo costo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.016.650,00	$ 430.950,00	-	-	-	-	$ 1.447.600,00
NO PREVISTOS																								
Demolición andenes, sardineles y cunetas (incluye retiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 497.692,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 497.692,57
Demolición a mano afinado o mortero de piso e prom 0,02 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.182.609,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.182.609,12
Muro en bloque No. 5 arcilla estándar de 0,12 m (30 x 12 x 20)	-	-	-	-	-	-	-	$ 4.302.210,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 4.302.210,38
Guardaescoba en cerámica durostato 33 x 7 cm. Suministro e instalación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.348.805,22	-	-	-	$ 1.348.805,22
Rinconera en PVC media caña 0,09 m. Suministro e instal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 635.573,01	$ 817.165,30	-	-	$ 1.452.738,31
Cielo raso en lámina PVC 10 mm (incluye cornisa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 8.517.509,54	-	-	$ 8.517.509,54
Poza séptica revestida en piedra 2 x 2 x 2, con losa en concreto 3000 psi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 3.322.447,40	$ 1.107.482,47	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 4.429.929,87
Canal metálica en perfil estructural rectangular 100 x 40 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 11.797.749,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 11.797.749,60
Puertas en aluminio. Incluye marco y cerradura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 5.171.400,00	-	-	-	-	$ 5.171.400,00
Puerta en lámina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte epóxico, incluye marco. Suministro e instal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 6.948.145,71	-	-	-	-	$ 6.948.145,71
Reja en ángulo de 1 1/2" x 1/8" pintada e instalada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.888.803,53	$ 3.148.005,88	-	-	-	$ 5.036.809,41
Tablero bifásico de 6 circuitos con puerta. Suministro e instalación	-	-	-	-	-	-	-	$ 285.277,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 285.277,63
Salida para iluminación, en tubería metálica tipo conduit EMT 1/2", incluye: caja metálica octagonal 5800, accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG-THHN, Toma monofásica doble con polo a tierra 15A con tapa.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 3.797.560,26	$ 2.953.657,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 6.751.218,24
Acometida en cable de cobre aislado (2x6"AWG + (1x8"AWG(N)) + (1x8"10AWG(T)) - THW 600 V 75°C. Suministro e instalación (T-01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 574.353,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 574.353,00
Caja de inspección de 60x60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 523.868,80	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 523.868,80
Sistema de puesta a tierra, incluye: Varillas de cobre, cable de cobre, cajas de inspección y conexiones. Suministro e instalación.	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.830.192,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 1.830.192,42
Certificación Retie	$ 5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 5.000.000,00
AVANCE $	$ 6.422.231,52	$ 874.156,57	$ 2.799.370,04	$ 2.646.969,67	$ 1.442.282,67	$ 442.054,31	$ 927.013,88	$ 8.785.404,37	$ 34.348.638,74	$ 35.944.585,40	$ 29.456.886,85	$ 10.275.816,90	$ 2.276.674,25	$ 6.374.596,13	$ 2.260.014,40	$ 1.756.277,28	$ 6.736.681,97	$ 12.418.491,40	$ 19.664.053,47	$ 16.748.818,40	$ 13.738.638,88	$ 4.214.941,65	$ 464.986,17	$ 221.588.896,88
PROGRAMADO SEMANAL	2,90%	0,39%	1,26%	1,17%	0,65%	0,20%	0,42%	3,96%	15,50%	16,22%	13,29%	4,84%	1,03%	2,88%	1,02%	0,79%	3,04%	5,60%	8,87%	7,56%	6,20%	1,90%	0,21%	
PROGRAMADO ACUMULADO	2,90%	3,29%	4,65%	5,82%	6,47%	6,67%	7,09%	11,05%	26,55%	42,77%	56,06%	60,91%	61,93%	64,81%	65,83%	66,62%	69,66%	75,27%	84,14%	91,70%	97,89%	99,79%	100,00%	

REPROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE CAJA VEREDA LAS TAPIAS

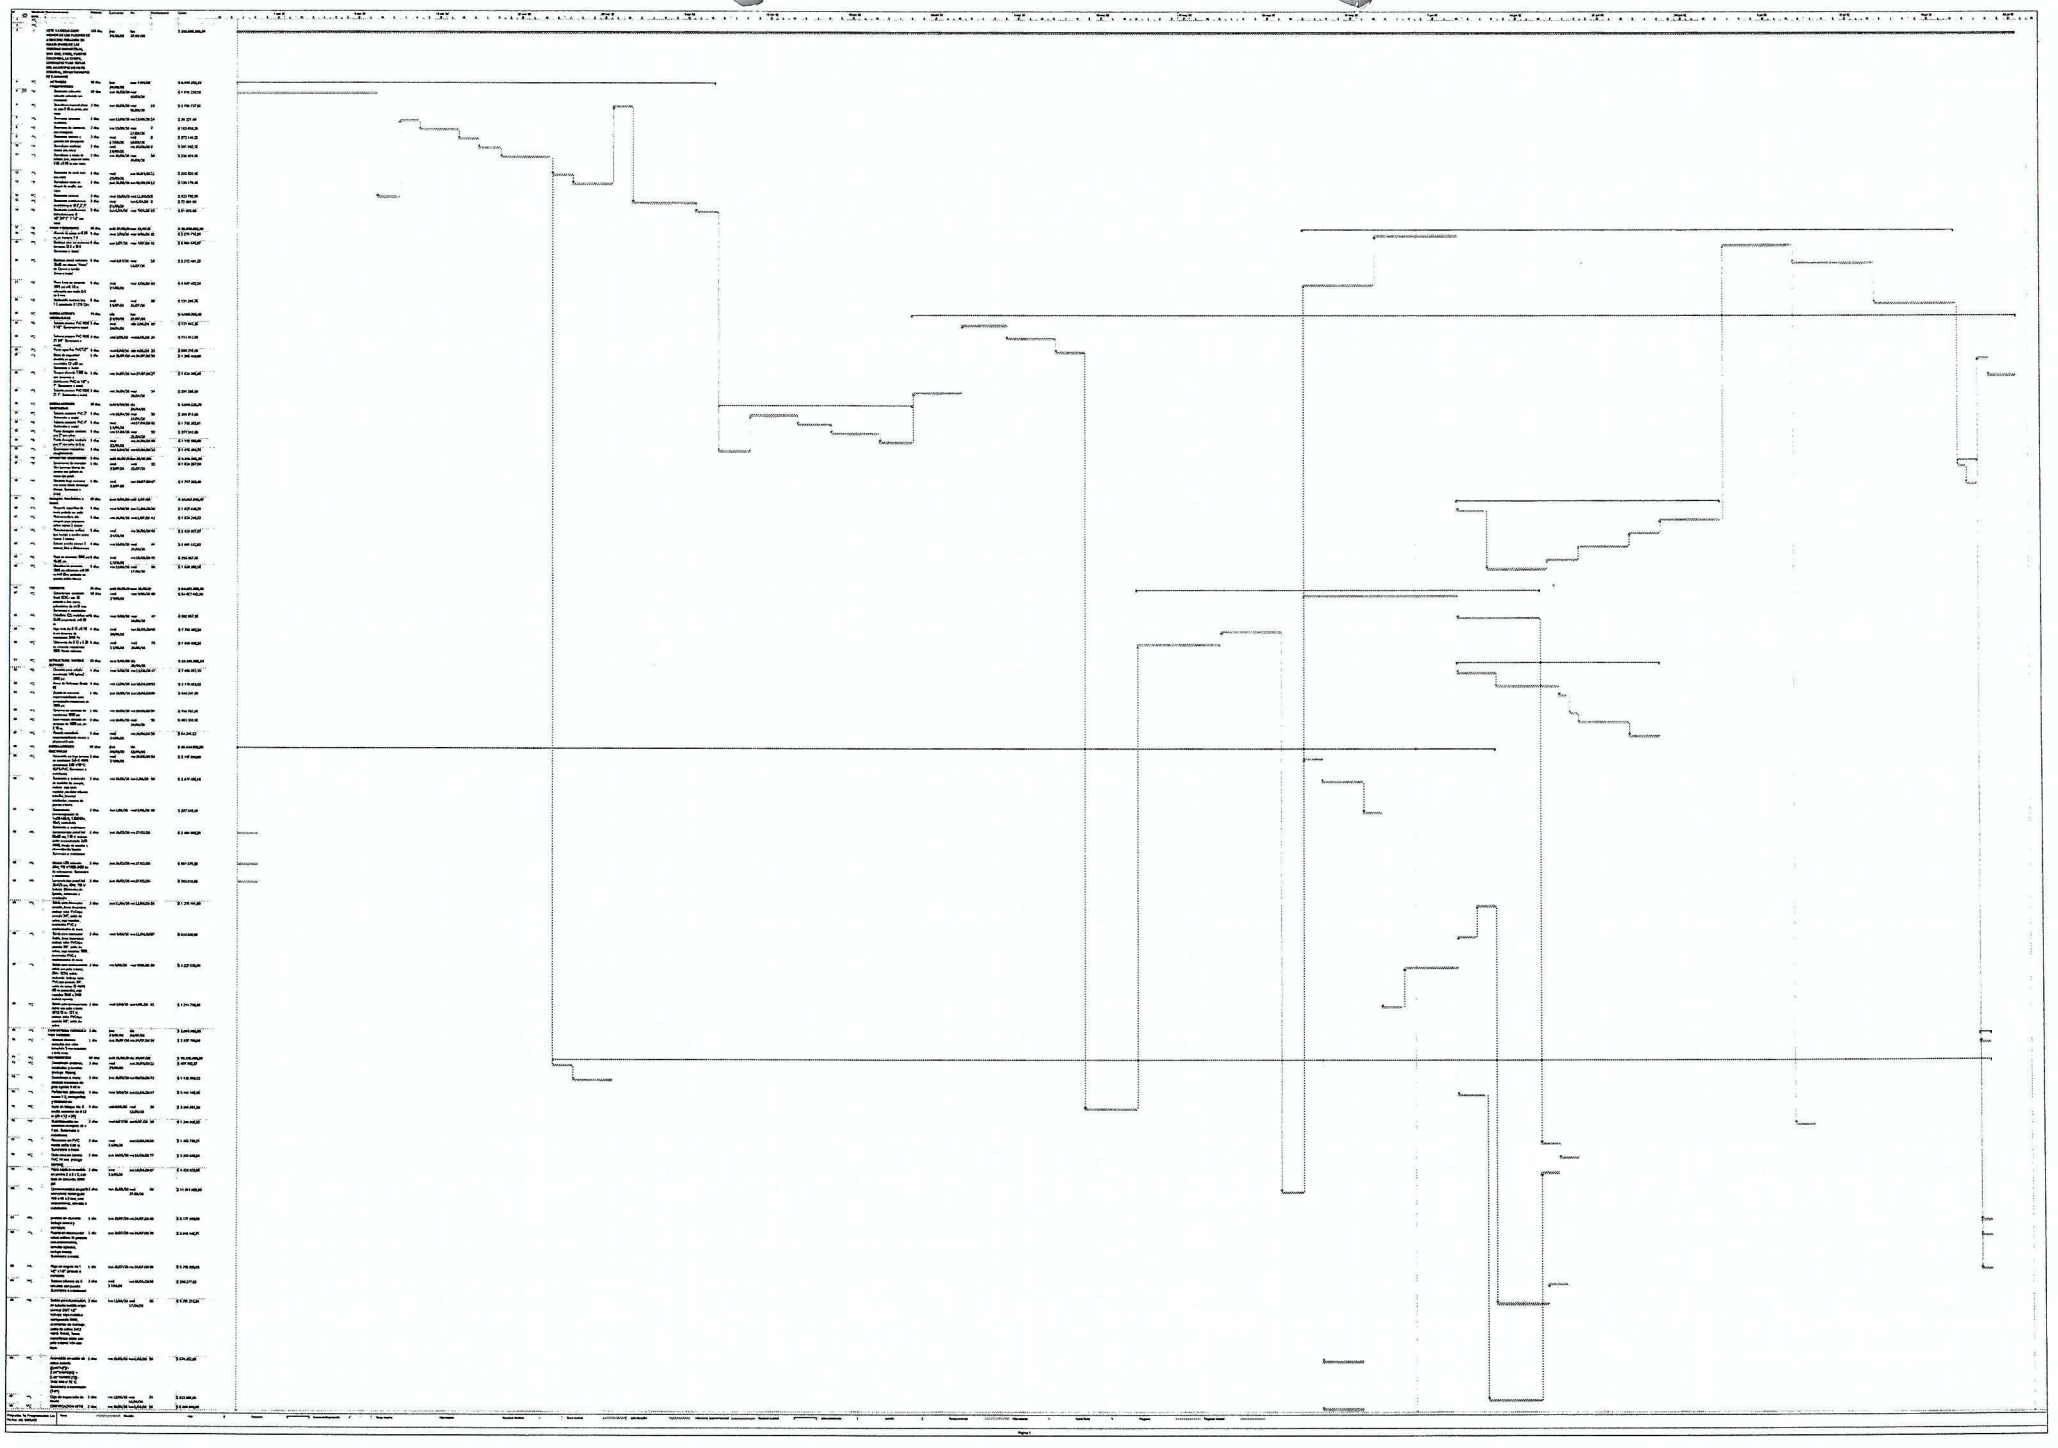

LOTE 4 ADECUACION MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (PAMS) DE LAS VEREDAS SAN NICOLAS, SAN JOSE, CHIRI, PUERTO COLOMBIA, LA CHAPA, CONNATO Y LAS PAPAS DEL MUNICIPIO DE RIO NEGRO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	30/03/2026	1/04/2026	22/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	2/05/2026	8/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	4/06/2026	11/06/2026	18/06/2026	25/06/2026	2/07/2026	9/07/2026	16/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	TOTAL
ACTIVIDES PRELIMINARES																				
Demolición de fibrocemento incluido retiro con transporte	$ 404.556,05	$ 991.162,32	$ 232.505,83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.628.224,20
Demolición manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.758.737,93	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.758.737,93
Demolición aparatos sanitarios	$ -	$ -	$ 38.321,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38.321,40
Desmonte de estructura, con transporte	$ -	$ -	$ 57.603,49	$ 96.005,81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 153.609,30
Desmonte marcos y puertas con transporte	$ -	$ -	$ -	$ 272.140,23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 272.140,23
Demolición enchape pisos con retiro	$ -	$ -	$ -	$ 201.892,12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 201.892,12
Demolición e muro de tabique piso, espesor entre 0,06 y 0,08 m con retiro	$ -	$ -	$ -	$ 103.656,45	$ 133.272,58	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 236.929,03
Demolición de cielo raso con retiro	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 193.520,45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 193.520,45
Demolición muro en bloque de arcilla, con retiro	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 138.246,81	$ 7.885,65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 146.132,46
Retiro de cubierta	$ -	$ -	$ -	$ 623.792,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 623.792,00
Demolición instalaciones sanitarias pvc ø 2",3",4"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63.779,53	$ 9.111,38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 72.890,91
Demolición instalaciones hidráulicas pvc ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.025,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.025,00
PISOS Y ENCHAPES																				
Afinado de pisos e= 0,04 m, en mortero 1:4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.104.186,21	$ 170.609,69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.274.795,90
Enchape pisos en ceramica dorapiso 25,8 x 25,8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Zoclaneado e bond.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Enchape pared cerámica 20x60 cm blanco "Pura" de Corona o similar. Junta e bond	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.714.680,77	$ 497.810,55	$ 2.212.491,32
Placa base en concreto 3000 psi e=0,10 m reforzada con malla Q.5 de 6 cm	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.053.181,64	$ 2.594.220,70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.647.402,34
Sindicalcrete curato e imp 1 a curadores 0 32"0.32m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 93.957,23	$ 27.285,52	$ 121.240,75
INSTALACIONES HIDRAULICAS																				
Tubería presion PVC RDE 9 1/2", Semiabierta e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 131.841,35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 131.841,35
Tubería presion PVC RDE 21 3/4", Semiabierta e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.767,21	$ 109.645,79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 114.413,00
Punto agua fria PVC 1/2"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 568.115,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 568.115,80
Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm. Semiabierta e instal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.265.433,00	$ -	$ 1.265.433,00
Tanque elevado 1.000 lt con accesorios y distribucion PVC de 1/2" y 1". Semiabierta e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.430.017,21	$ 204.288,18	$ 1.634.305,41
Tubería presion PVC RDE 13 1", Semiabierta e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 109.220,96	$ 182.034,94	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 291.255,90
INSTALACIONES SANITARIAS																				
Tubería sanitaria PVC 2", Semiabierta e instal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 89.981,83	$ 218.532,17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 308.514,00
Tubería sanitaria PVC 4", Semiabierta e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.792.153,81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.792.153,81
Punto desagüe sanitario pvc 2" con codo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 82.463,20	$ 184.912,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 277.383,60
Punto desagüe sanitario pvc 4" con tubo de 6 m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.192.966,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.192.966,40
Sistema manual en amplamundo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.415.464,78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.415.464,78
APARATOS SANITARIOS																				
Lavamanos de incrusta. San Lorenzo blanco de corona con grifería de mesa tipo push	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.324.257,80	$ -	$ 1.324.257,80
Sanitario bajo consumo una pieza doble descarga blanco. Semiabierto e instal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.717.258,40	$ -	$ 1.717.258,40
Ducha. Semiabierto e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Tanque superficie de cerro plastic en viniltex	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.627.036,74	$ -	$ 1.627.036,74
Mesón acrílico alto pequeño para lavatorio sobe e muros 3 mesón	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Mesón acrílico alto pequeño para lavatorio sobe e muros 3 mesón	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 181.574,81	$ 1.144.724,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.326.299,33
Mesón acrílico alto pequeño para lavatorio sobe e muros 3 mesón	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.828.557,37	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.828.557,37
Espejo y visilla interior 3 cuerpos, filos y distracciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.290.758,76	$ 4.790.883,27	$ 6.081.642,03
Pegar en concreto 3000 psi filodil con	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 193.957,85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 193.957,85
Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0,09 m A=0,60m acabado en granito pulido blanco	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 883.106,33	$ 747.243,82	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.630.350,15
CUBIERTA																				
Cubierta tipo sandwich Dock 833C - cal. 26 plastada a dos caras, poliuretano de e= 38 mm. Semiabierta e instalación.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.119.465,17	$ 33.459.064,19	$ 2.048.514,15	$ -	$ -	$ -	$ 54.627.043,51
Caballete 12L metálico cal 26/28 pr apretado a=0.40 m Viga cinta de 0.15 x 0.30 m en concreto de resistencia 3000 psi	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 548.375,35	$ 44.442,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 592.767,95
Cubierta de 0.12 x 0.20 en concreto resistencia 3000 Psi abrefrutero	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.550.868,45	$ 1.213.123,79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.763.992,24
ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 701.128,54	$ 317.676,70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.019.005,24
Concreto para vaciado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.086.663,19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.086.663,19
Acero de Refuerzo Grado 60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 662.094,46	$ 2.515.958,96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.178.053,42
Zapata en concreto impermeabilizado para cimentación resistencia de 3000 psi	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 644.241,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 644.241,00
Columna en concreto de resistencia 3000 psi	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 748.763,96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 748.763,96
Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.10 m. Mediada contratista impermeabilizada muros y placas e=0 cm	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.699,61	$ 382.658,54	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 483.358,15
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 54.305,52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 54.305,52
INSTALACIONES ELECTRICAS																				
Acometida en baja tensión en conductor 2x8+8 AWG, concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.197.598,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.197.598,00
Suministro e instalación de medidor de energía, incluye: caja para medidor, medidor trifásico bimetálico, breaker termomagnetico, terminal de puesta a tierra	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.158.091,33	$ 719.163,78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.877.455,11
Canalización termomagnetico de 3x100A-60kA, 220/240V, 10kA, conductor, terminales y accesorios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 257.345,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 257.345,40
Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V, incluye: cable antiacarcomado 3x3d AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalación	$ 2.464.909,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.464.909,20
Modulo LED redondo 24W, 110 V 3696-2400 lm de aplicacion. Suministro e instalacion	$ 651.578,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 651.578,20
Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 40W, 110 V. incluye: elementos de fijación, suministro e instalación	$ 703.618,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 703.618,50
Salida para interruptor sencillo, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metálica, terminales PVC y readecuación de muro.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.375.101,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.375.101,00
Salida para interruptor Doble, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metalica 1900, terminales PVC y readecuación de muro.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 644.599,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 644.599,80
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (30 m promedio), caja metalica 1900 y 2400 incluye aparato	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.434.872,13	$ 792.662,81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.227.535,00
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.214.799,10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.214.799,10
CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA																				
Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 3 mm suministro y instalado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.937.700,00	$ -	$ 1.937.700,00
APOYOS																				
PREVENTIVOS																				
Demoliciones anclajes, señaletica y cerveza (Incluye: Retiro)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 497.692,57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 497.692,57
Demolición a mano alzada o mortero de piso e pisos 0.07 m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.108.696,05	$ 73.913,07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.182.609,12
Pintura (Lijamiento) muros 1:1, incluye filos y distracciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.441.165,95	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.441.165,95
Muro en bloque No. 5 sencillo estandar de 0.12 m (10 x 12 x 24)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 332.213,45	$ 3.654.347,94	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.986.561,39
Guardaescoba en ceramica dorapiso 33 x 7 cm. Semiabierto e instalados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.348.805,22	$ -	$ 1.348.805,22
Rejillaria en PVC medio cada 0.05 m. Semiabierto e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.452.738,31	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.452.738,31
Cielo raso en baldes PVC 30 mm (entre cortes)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.363.048,94	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.363.048,94
Muro aparejo reventido en piedra 2 x 2 x 2, con boza en concreto 3000 psi	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.429.929,86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.429.929,86
Cerco metálico en perfil estructural rectangular 150 x 60 x 2 mm, con antivandalico, bisagra e instalación.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.516.850,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.516.850,80
Puertas en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, cerradura sencilla, bisagra metal. Semiabierto e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.171.400,00	$ -	$ 5.171.400,00
Reja en angulo de 1 1/2" x 1/8" pintada e instalada	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.948.145,71	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.948.145,71
Cubierta fibrolit de 6.0 metros con puente. Semiabierto e instalacion	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.752.826,43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.752.826,43
Salida para iluminacion, en tubería metálica tipo conduit EMT 3/4", incluye: caja metálica octogonal 1900, accesorios de sujecion, cable de cobre 3x12 AWG THHN, Toma monofónica doble con polo a tierra 15A con tapa.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.109.755,78	$ 4.641.462,54	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.751.218,24
Acometida en cable de cobre desnudo (2x8^AWG+ 1x8^AWG)NU + (1x8^14AWG(TW)) - THW 600 V 75°C. Semiabierto e instalados (7 #8)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 430.764,75	$ 143.588,25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 574.353,00
Caja de inspección de 60cm	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 425.643,40	$ 98.235,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 523.868,80
CERRAJERIA METAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.750.000,00	$ 1.250.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000,00
AVANCE FINANCIERO	$ 4.224.661,95	$ 991.162,32	$ 942.222,72	$ 671.054,61	$ 2.251.466,46	$ 2.904.116,28	$ 1.565.564,99	$ 2.303.147,18	$ 1.487.051,96	$ 138.665,50	$ 1.010.175,04	$ 4.155.674,48	$ 8.888.545,33	$ 46.439.075,48	$ 45.177.449,22	$ 24.815.078,17	$ 25.726.747,24	$ 8.417.979,53	$ 4.276.796,23	$ 5.626.990,13	$ 591.807,78	$ 27.774.128,05	$ 204.288,18	$ 218.644.180,29
AVANCE SEMANAL	1,93%	0,45%	0,43%	0,31%	1,03%	1,33%	0,72%	1,05%	0,68%	0,06%	0,46%	1,90%	4,07%	21,24%	20,66%	11,35%	11,76%	3,85%	1,96%	2,57%	0,27%	12,70%	0,09%	
AVANCE ACUMULADO	1,93%	2,39%	2,82%	3,13%	4,16%	5,49%	6,15%	7,19%	7,87%	7,94%	8,40%	10,29%	14,36%	35,60%	56,26%	67,61%	79,37%	83,21%	85,18%	87,75%	88,02%	100,72%	100,81%	

REPROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE CAJA VEREDA PUERTO COLOMBIA

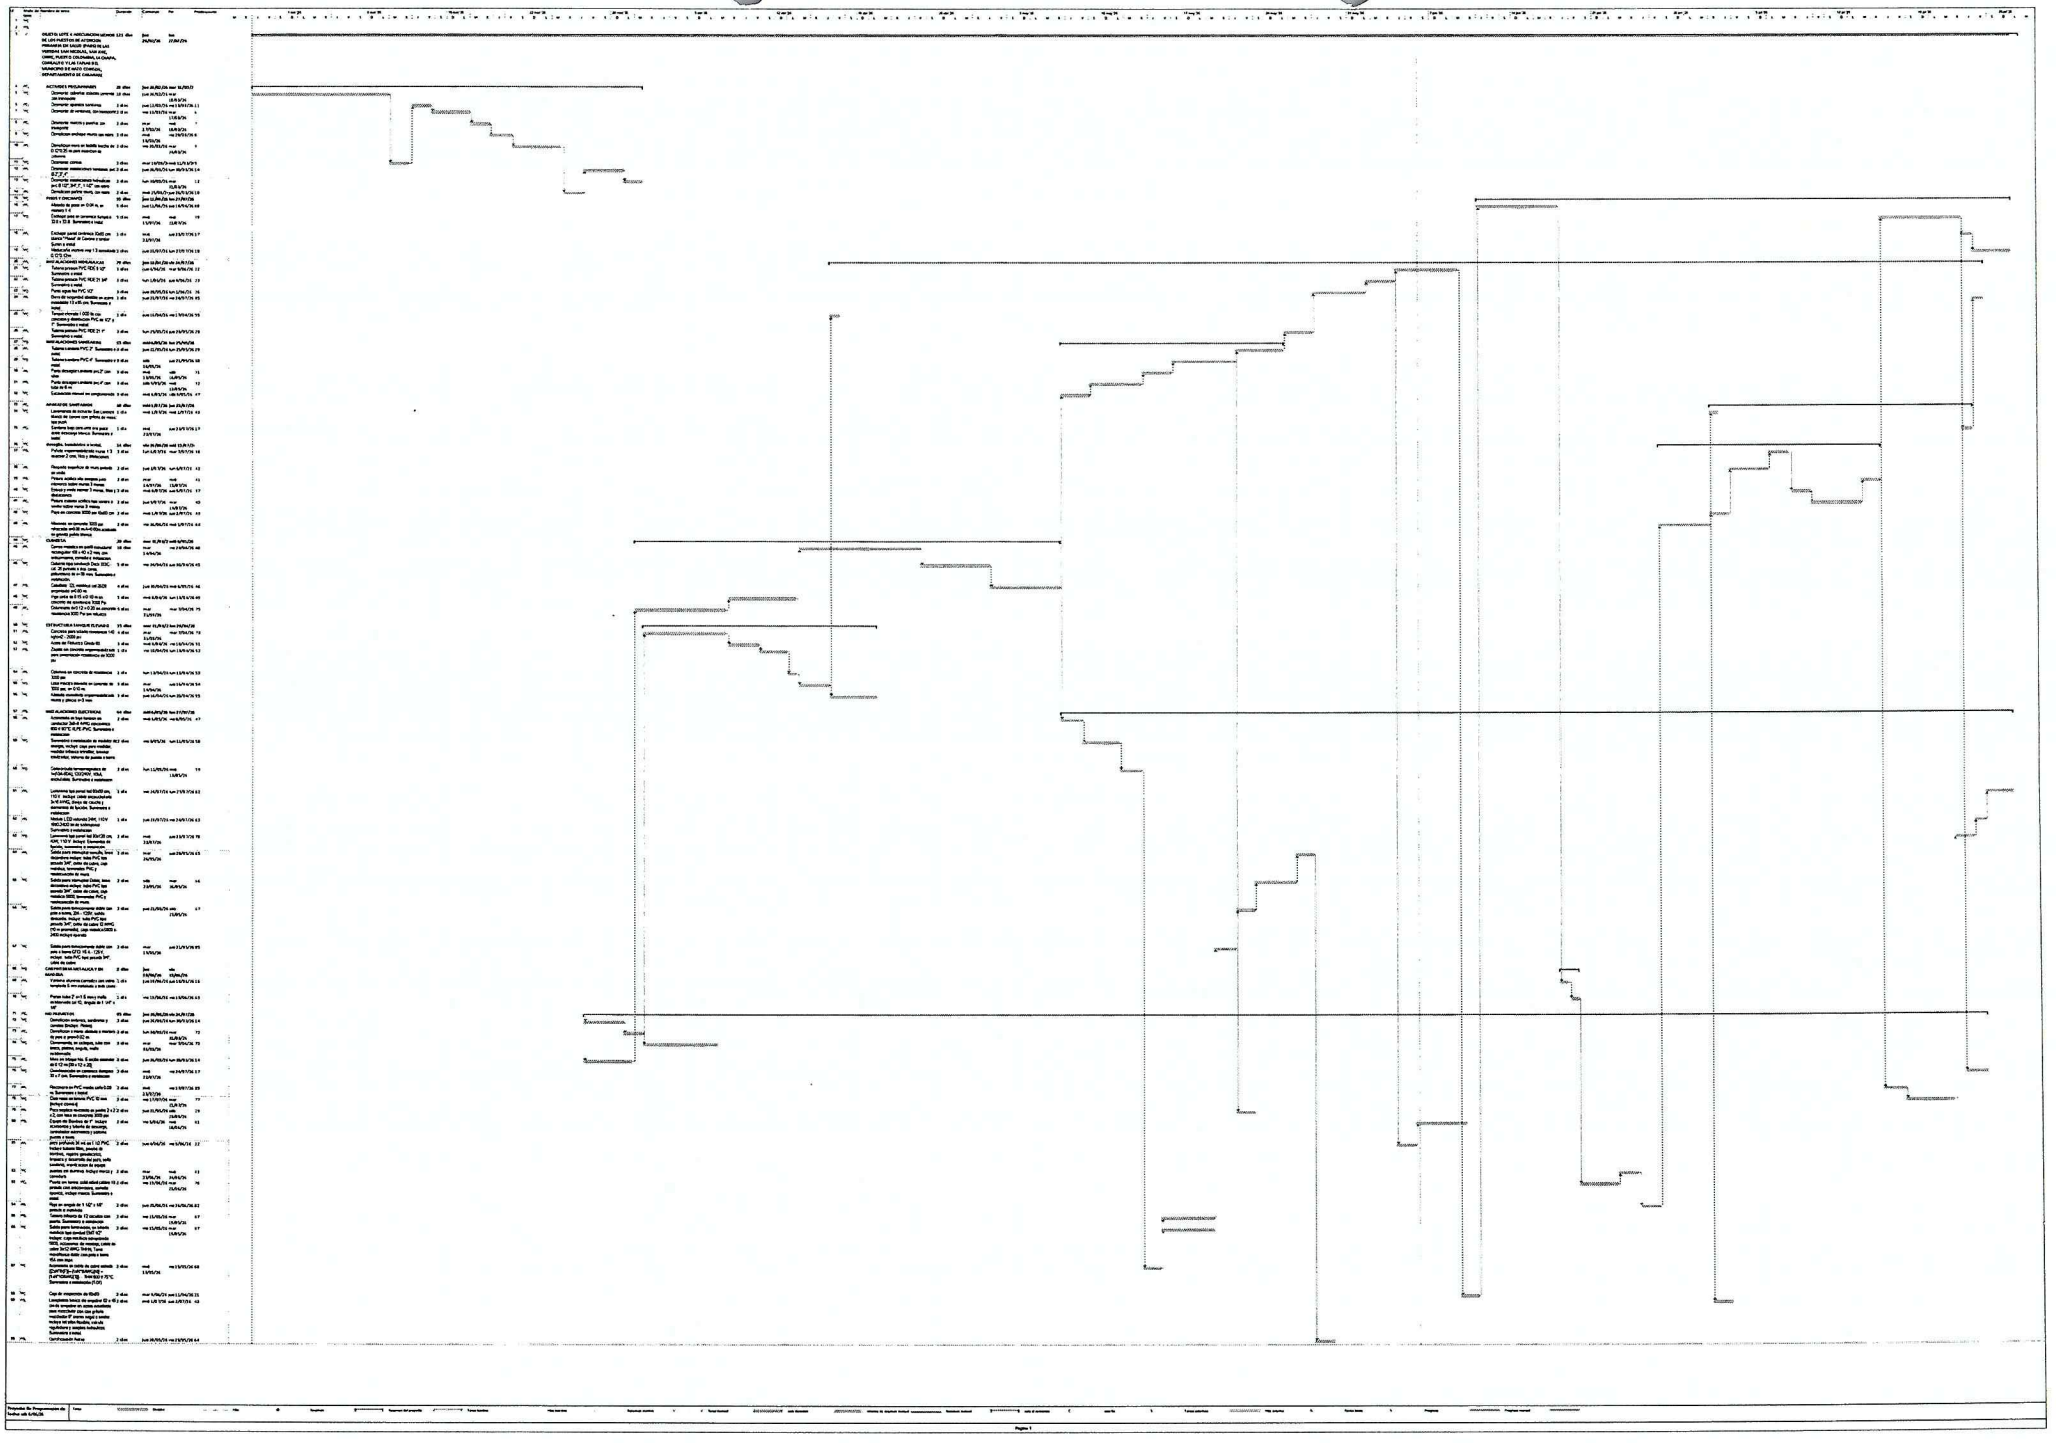

OBJETO: LOTE 4 ADECUACION MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (PARS) DE LAS VEREDAS SAN NICOLAS, SAN JOSE, CHIRE, PUERTO COLOMBIA, LA CHAPA, CORRALITO Y LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	26/02/2026	5/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	26/03/2026	2/04/2026	9/04/2026	16/04/2026	23/04/2026	30/04/2026	7/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	28/05/2026	4/06/2026	11/06/2026	18/06/2026	25/06/2026	2/07/2026	9/07/2026	16/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	TOTAL
ACTIVIDADES PRELIMINARES																								
Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	$ 401.425,39	$ 983.482,39	$ 220.781,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.605.689,54
Desmonte aparatos sanitarios	$ -	$ -	$ 57.482,10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57.482,10
Desmonte de ventanas, con transporte	$ -	$ -	$ 44.314,26	$ 73.857,11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.171,37
Desmonte marcos y puertas con transporte	$ -	$ -	$ -	$ 187.081,45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 187.081,45
Demolición enchape muros con retiro	$ -	$ -	$ -	$ 187.838,51	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 187.838,51
Demolición muro en ladrillo tolete de 0,12*0,25 m para inserción de columnas	$ -	$ -	$ -	$ 127.903,23	$ 164.447,01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 292.350,24
Desmonte cercas	$ -	$ -	$ 561.412,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 561.412,80
Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 102.502,97	$ 6.833,53	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 109.336,50
Desmonte instalaciones hidráulicas pvc Ø 1/2", 3/4", 1", 1 1/2" con retiro	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.922,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.922,50
Demolición enchape muro, con retiro	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.062.740,25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.062.740,25
PISOS Y ENCHAPES																								
Afinado de pisos e=0,04 m, en mortero 1:4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.192.135,20	$ 2.164.312,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.356.448,00
Enchape piso en cerámica duropiso 33,8 x 33,8. Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.213.004,13	$ 3.891.350,88	$ -	$ 9.104.355,01
Enchape pared cerámica 30x60 en blanco "Plata" de Corona o similar. Suminis y instal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.151.798,40	$ -	$ 2.151.798,40
Mediacaña mortero 1:4 con radio 0,12*0,12m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.002,42	$ 7.866,83	$ 125.869,25
INSTALACIONES HIDRAULICAS																								
Tubería presión PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 113.387,38	$ 16.199,63	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 129.587,01
Tubería presión PVC RDE 21 3/4". Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 88.010,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 88.010,00
Punto agua fría PVC 1/2"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 473.596,50	$ 94.719,30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 568.315,80
Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm. Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.265.433,00	$ -	$ 1.265.433,00
Tanque elevado 1.000 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.875.174,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.875.174,60
Tubería presión PVC RDE 21 1". Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 126.633,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 126.633,00
INSTALACIONES SANITARIAS																								
Tubería sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 366.362,75	$ 96.411,25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 462.774,00
Tubería sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 224.044,23	$ 1.568.309,58	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.792.353,81
Punto desagüe sanitario pvc 2" con sifón	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 277.391,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 277.391,40
Punto desagüe sanitario pvc 4" con tubo de 6 m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 99.407,75	$ 1.093.485,25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.192.893,00
Excavación manual en conglomerado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.796.379,48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.796.379,48
APARATOS SANITARIOS																								
Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con grifería de mesa tipo push	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.524.257,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.524.257,80
Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.717.258,40	$ -	$ 1.717.258,40
Ducha. Suministro e instal.																								
Pañete impermeabilizado muros 1:3 espesor 2 cms, filos y dilataciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.081.168,60	$ -	$ -	$ -	$ 6.081.168,60
Raspado superficie de muro pintado en vinilo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.814.014,75	$ 259.144,96	$ -	$ -	$ -	$ 2.073.159,71
Pintura acrílica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.981.056,46	$ -	$ -	$ 2.981.056,46
Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.424.810,36	$ -	$ -	$ -	$ 4.424.810,36
Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.635.337,25	$ 175.689,15	$ -	$ -	$ 2.811.026,40
Poyo en concreto 3000 psi 10x60 cm	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 225.836,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 225.836,00
Mesones en concreto 3000 psi reforzado e=0,08 m. Acabado en granito pulido blanco	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 310.030,50	$ 516.717,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 826.748,00
CUBIERTA																								
Correas metálicas en perfil estructural rectangular 100 x 40 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.779.319,00	$ 5.779.319,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.558.638,00
Cubierta tipo sandwich cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de e=50 mm. Suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.042.176,47	$ 44.923.052,28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57.965.228,75
Caballete EL metálico cal 26/28 prepintado a=0,60 m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 190.689,74	$ 487.318,24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 678.007,98
Viga aérea de 0,15 x 0,25 m en concreto de resistencia 3000 Psi	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.736.911,00	$ 1.955.877,39	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.692.788,39
Columneta de 0,12 x 0,20 en concreto resistencia 3000 Psi	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 710.180,90	$ 581.057,10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.291.238,00
ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO																								
Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.867.235,92	$ 7.543.589,04	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.410.824,96
Acero de Refuerzo Grado 60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.198.710,11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.198.710,11
Zapata en concreto impermeabilizado para cimentación resistencia de 3000 psi	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 700.498,09	$ 100.071,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800.569,25
Columna en concreto de resistencia 3000 psi	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 682.778,93	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 682.778,93
Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e=0,12 m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 605.570,42	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 605.570,42
Afinado cemento impermeabilizado muros y pisos e=3 mm	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36.203,68	$ 18.101,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 54.305,52
INSTALACIONES ELECTRICAS																								
Acometida en baja tensión en conductor 2x6+8 AWG concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.232.568,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.232.568,00
Suministro e instalación de medidor de energía, incluye caja para medidor, medidor bifásico trifilar, breaker totalizador, sistema de puesta a tierra	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.798.409,44	$ 1.079.045,66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.877.455,10
Contactor electromagnético de 1xQDA-60A, 120/240V, 10kA, enchufable. Suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 257.345,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 257.345,40
Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.156.795,55	$ 308.113,65	$ 2.464.909,20
Módulo LED redondo 24W, 110 V 1800-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 744.660,80	$ -	$ 744.660,80
Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de fijación, suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.407.237,00	$ -	$ 1.407.237,00
Salida para interruptor sencillo, línea decorativa incluye tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metálica, terminales PVC y readecuación de muro	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.571.544,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.571.544,00
Salida para interruptor Doble, línea decorativa incluye tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre, caja metálica 5800, terminales PVC y readecuación de muro	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 161.149,95	$ 698.316,45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 859.466,40
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125V, salida dedicada, incluye tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metálica 5800 o 2400 incluye aparato	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.203.120,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.203.120,00
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye tubo PVC tipo pesado 3/4", cable de cobre	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.214.799,30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.214.799,30
CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA																								$ -
Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo costo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.988.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.988.400,00
Portón tubo 2" e=1.5 mm y malla eslabonada cal 10, ángulo de 1 1/4" x 1/8"	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.894.853,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.894.853,00
NO PREVISTOS																								
Demolición andenes, sardineles y cunetas (incluye retiro)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 598.501,37	$ 39.900,09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 638.401,46
Demolición a mano afinado o mortero de piso a=0,05 m	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.817.827,49	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.817.827,49
Cerramiento, en divisiones, tubo con brazo, platina, ángulo, malla eslabonada	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.556.250,00	$ 23.968.750,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57.525.000,00
Muro en bloque No. 5 arcilla estandar de 0,12 m (30 x 12 x 20)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.740.067,81	$ 1.644.040,69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.384.108,50
Guardaescoba en cerámica duropiso 33 x 7 cm. Suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.611.732,57	$ -	$ 1.611.732,57
Rinconera en PVC media caña 0,08 m. Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.736.340,61	$ -	$ -	$ 1.736.340,61
Cielo raso en lámina PVC 10 mm (incluye perfilería)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.207.964,28	$ 6.695.954,07	$ -	$ 11.903.918,35
Pozo séptico revestido en piedra 2 x 2 x 2, con losa en concreto 3000 psi	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.429.929,86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.429.929,86
Equipo de Bombeo de 1", incluye accesorios y tubería de descarga, controlador automático y sistema puesta a tierra	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.360.913,53	$ 2.994.009,77	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.354.923,30
Pozo profundo 36 ml en 1 1/2 PVC. Incluye tubería filtro, prueba de bombeo, registro geoeléctrico, limpieza y desarrollo del pozo, sello sanitario, instalación de equipo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.427.063,90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.472.063,90
Puertas en aluminio, incluye marco y cerradura	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.657.650,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.657.650,00
Puerta en lámina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.310.017,19	$ 5.082.037,83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.392.055,02
Reja en ángulo de 1 1/2" x 1/8" pintada e instalada	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.826.897,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.826.897,16
Tablero trifásico de 12 circuitos con puerta. Suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 324.580,51	$ 147.536,59	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 472.117,10
Salida para iluminación, en tubería metálica tipo conduit EMT 1/2", incluye caja metálica semipesada 5800, accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG THHN, Toma monofásica doble con polo a tierra 15A con tapa	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.221.645,36	$ 2.373.475,16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.595.120,52
Acometida en cable de cobre aislado. Suministro e instalación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 574.353,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 574.353,00
Caja de inspección de 60x60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 521.868,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 521.868,80
Lavaplatos ... de empotrar en acero inoxidable para mezclador con grifería mezclador cromo o similar. Incluye sifón flexible, válvula reguladora y acoples hidráulicos. Suministro e instal.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 586.519,70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 586.519,70
Certificación Retie	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000,00
AVANCE FINANCIERO	$ 401.425,39	$ 983.482,39	$ 883.990,92	$ 776.680,30	$ 4.646.250,41	$ 43.688.191,12	$ 42.729.515,34	$ 11.034.095,18	$ 18.839.567,31	$ 45.113.742,02	$ 6.414.082,92	$ 9.051.890,81	$ 15.464.683,19	$ 7.966.501,20	$ 13.079.104,11	$ 5.926.213,40	$ 11.357.582,99	$ 18.878.615,40	$ 4.667.345,75	$ 13.400.461,17	$ 15.316.054,63	$ 21.740.223,09	$ 313.980,48	$ 312.716.614,61
AVANCE SEMANAL	0,13%	0,31%	0,28%	0,25%	1,49%	13,97%	13,66%	3,53%	6,02%	14,43%	2,05%	2,89%	4,95%	2,55%	4,18%	1,90%	3,63%	6,04%	1,49%	4,29%	4,90%	6,95%	0,10%	
AVANCE ACUMULADO	0,13%	0,44%	0,71%	0,97%	2,47%	16,44%	30,10%	33,63%	39,65%	54,08%	56,13%	59,02%	63,97%	66,52%	70,70%	72,60%	76,23%	82,27%	83,76%	88,04%	92,95%	99,90%	100,00%	

REPROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE CAJA VEREDA SAN JOSÉ

NO. CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) AULAS DE CLASE Y BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN DIEGO
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) AULAS DE CLASE Y BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN DIEGO UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE LAS ATENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CHAPIL PUENTES Y VÍAS
INTERVENTORÍA:	SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA CONSTRUCCION MANTENIMIENTO
PLAZO PRINCIPAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA INICIO/ORDEN:	24 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO:	24 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN OBRA:	24 DE JUNIO DE 2026

ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE OBRA	GLB	1,00		
1.2	DEMOLICIONES				
1.2.1	DEMOLICIONES				
1.2.1	PRE ALISTAMIENTO DE OBRA	GLB	1,00		
1.3	DESMONTE Y RETIROS				
1.3	Desmonte cubierta asbesto cemento con manipuesto	M2	141,07	14.184,00	2.001.044,88
1.2	Demolición manual placa de piso 0,10 m e=m, con retiro	M2	93,89	33.335,00	3.764.525,57
1.3	Desmonte aparatos sanitarios	UND	3,00	14.716,00	44.217,00
1.4	Desmonte de ventanas, con manipuesto	M2	9,00	10.345,00	93.105,00
1.5	Desmonte marcos y puertas con manipuesto	M2	15,57	14.253,00	252.347,00
1.6	Demolición enchape muros con retiro	M2	10,35	8.788,00	90.966,00
1.7	Demolición muro en bahído bruta de 0,12*0,25 m- sin revestir ni alturas	M	54,00	13.366,00	733.963,20
1.8	Desmonte aparatos	M	113,00	5.868,00	675.375,00
1.9	Desmonte instalaciones sanitarias pvc ø 2",3",4"	M	26,00	5.407,00	175.182,00
1.10	Desmonte instalaciones hidráulicas pvc ø 1/2",3/4",1",1 1/2" con retiro	M	34,00	5.875,00	133.450,00
1.11	Desmonte tablería eléctrica	UND	1,00	69.849,00	69.849,00
2	OBRAS ARQUITECTURA				
2.1	Aislado de pisos pr 0,04 m, en mortero 1:3	M2	36,73	28.926,00	1.111.994,00
2.2	Batidera granz de mármol 30*30 / 33x33 cm blanco mixyd sanitarios, bullas y brillo a mano obra	M2	11,84	146.233,00	1.731.141,00
2.3	Enchape piso en cerámica duratex 33,8 x 33,8, Suministro e instal	M2	84,32	78.744,00	6.472.876,00
2.4	Enchape pared cerámico 20x60 cm blanco "Home" de Grama ó similar, Suministro e instal	M2	34,74	68.187,00	2.368.172,00
2.5	Sardinel 12 x 10 cm fundido en concreto 3000 psi	M	0,00	49.471,00	0,00
2.6	Placa base en concreto 3000 psi e=0,12 m reforzado con malla Q-5 de 5 mm	M2	110,73	111.438,00	12.334.361,00
2.7	Mesesuelta mortero proporción 1:3 espesor 0,12*0,12m	M	0,00	36.662,00	0,00
3	RED HIDRAULICA				
3.1	Tubería presión PVC RDE 9 1/2", Suministro e instal.	M	36,75	6.646,00	237.389,00
3.2	Tubería presión PVC RDE 21 3/4", Suministro e instal.	M	43,66	6.770,00	295.608,00
3.3	Punto agua fría PVC 1/2"	UND	11,00	72.803,00	801.163,00
3.4	Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 1.5 x 91 cm. Suministro e instal.	UND	0,00	486.705,00	0,00
3.5	Espejo recto en vidrio 5 mm. Suministro e instal.	M2	1,50	156.644,00	234.966,00
3.6	Tanque elevado 1.000 lts con accesorio y distribución PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	UND	1,00	1.186.775,00	1.186.775,00
3.7	Tubería presión PVC RDE 21 1". Suministro e instal.	M	12,50	6.141,00	121.763,50
4	RED SANITARIA				
4.1	Tubería sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	M	14,57	23.753,00	345.775,00
4.2	Tubería sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	M	22,52	44.044,50	991.983,00
4.3	Punto desagüe sanitario en 2" con sifón	UND	7,00	71.124,00	497.868,00
4.4	Punto desagüe sanitario en 4" con tubo de 6 m	UND	3,00	109.870,00	91.741,50
4.5	Excavación manual en conglomerado	M3	27,18	66.686,00	1.895.304,52
4.6	Sistema séptico Grupo 3000 12 pinches/tanque septico, Tanque ensamblado y Tuberia de ginesis	UND	0,00	5.348.800,00	0,00
5	APTOS				
5.1	Suministro de inodoro Sanunisex blanco de cerera con griferia de mesa tipo push	UND	0,00	586.250,00	0,00
5.2	Suministro lavo lavamanos ovo para adulto (incorpo blanch). Suministro e instal.	UND	0,00	660.684,00	0,00
5.3	Lavadero tanque en acero inoxidable sobre cabinet de MDP/MR con dos orificios y griferia mural o similar, con sifon y accesorios. Suministro e instala.	UND	1,00	387.962,00	387.962,00
6	CUBIERTA Y ENCHAPES				
6.1	Cubierta y vivela retorno 3 metros, tiras y dobleces	M2	184,47	41.397,00	8.028.956,10
6.2	Retiro(s) subsiftros de muro pintado en vivela	M2	0,00	9.072,00	0,00
6.3	Pintura corrosa alta esmaque para retiro(s) sobre muro 3 manos	M2	99,66	15.804,00	1.364.656,00
6.4	Pintura exterior corrosa tipo tumaca o similar sobre muro 3 manos	M2	115,57	25.722,00	2.972.511,00
6.5	Pilastras en concreto 3000 psi reforzada e=0,25 m h=0,60m anclada en ganchos puesta (dens)	M	0,00	231.716,00	0,00
7	CUBIERTA				
7.1	Cercha metálica en perfil estructural PHR-C 120 x 60 x 2 mm, con arriostramos, anclaje a mampostería.	M	156,18	53.944,00	10.884.751,92
7.2	Pintura esmalte 0,13*0,1 m tornillo HF 1/4" con 3 anclajes de 5/8" empotrado.	UND	28,00	47.670,00	1.334.760,00
7.3	Cubierta teja sandwich Dexa 3330, ref. 26 pintada a dos caras, con espesor de e=30 mm. Suministro e instalación.	M2	168,15	325.527,00	54.400.254,00
7.4	Cumbrera TZL metálica ref. 26/28 pintada e=0,40 m	M	14,84	42.972,00	637.668,48
7.5	Gotero tipo drywall plano con tornillo punta fina autorroscante de 1/2" x 12,7 mm o similar, pintado con 3 manos vinilo superlavable color a la elegido	M2	0,00	151.936,00	0,00
7.6	Canal en lamina galvanizada cal. 18 desarrollo 0.60 m anclada con cinta perno y tornillo. Suministro e instal.	M	0,00	141.177,00	0,00
7.7	Bajante A.LL. PVC 4"	M	0,00	54.446,00	0,00
7.8	Viga corre en 0,25 x 0,45 m en concreto de resistencia 3000 Psi	M	46,45	53.804,00	1.866.754,00
7.9	Columnetas de 0,23 x 0,23 en concreto resistencia 3000 Psi en estribado	M	88,39	43.584,00	3.854.361,60
8	INSTALACIONES ELECTRICAS				
8.1	Acometida para salida monofásica 140 kg/cm2- 3000 psi	M3	0,24	562.436,00	303.514,44
8.2	Varra de Refuerzo Grado 60	KG	2.592,18	7.213,00	18.611.187,73
8.3	Cajetin para salida unpormontada para conmutación luminaria de 3000 psi	M3	2,25	936.667,00	1.822.713,00
8.4	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	M3	0,00	1.054.848,00	0,00
8.5	Losa maciza aligerada en concreto de 3000 psi e= 0.30 m.	M2	0,00	179.119,00	0,00
8.6	Acometa conductor unpormontada muro y placa e=1 mm	M2	0,00	31.313,00	0,00
9	INSTALACIONES SANITARIAS				
9.1	Acometida en baja tensión en conductor 2x8+8 AWG encerrado PVC 1 60 °C SUPE PVC. Suministro e instalación	M	18,00	69.966,00	1.451.497,00
9.2	Suministro e instalación de medidor de energía, incluye tipo sin medidor, medidor trifásico bidireccional, tornillo Tablemeter, sistema de sujeción y base	UND	0,00	2.213.437,00	0,00
9.3	Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 225 A, thdi de 150A, tres (3) kA, con tablero para totalizador, barra, interruptor automático de montaje.	UND	0,00	943.875,00	0,00
9.4	Interruptor Termomagnético Regulable 35a a 50A, 25mA Totalizador. Suministro e instalación	UND	1,00	343.975,00	343.975,00
9.5	Contactores termomagnéticos de 1x10A-60A, 1,25/140V, 10kA, monofásico. Suministro e instalación	UND	9,00	33.945,00	284.937,00
9.6	Salida para iluminación en techo, incluye tubería EMT 3/4", caja de pvc octa 1"dela 4" 12, alambrado, thdi 10 watt	UND	38,00	208.133,00	7.851.814,00
9.7	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V, incluye cable antiturnillos 3x18 AWG, clavija de acuerdo a elementos de fijación. Suministro e instalación	UND	25,00	198.007,00	5.940.174,75
9.8	Modulo LED rectangle 24W, 110 V 1900-2400 lm de suministro. Suministro e instalación	UND	6,00	71.602,00	429.612,00
9.9	Modulo LED rectangle 18W, 110 V de alimentación incluye cable antiturnillos 3x18 AWG, clavija de acuerdo a elementos de fijación. Suministro e instalación	UND	0,00	77.934,00	0,00
9.10	Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 40W, 110 V, incluye. Elementos de fijación. Suministro e instalación	UND	0,00	180.418,00	0,00
9.11	Salida para interruptor sencillo, tres elementos incluye, tubo PVC tipo pesado 3/4", caja de octa, caja metálica, terminales PVC y rosca	UND	7,00	151.110,00	1.057.770,00
9.12	Salida para interruptor doble (sencillo+sencillo), tres elementos incluye, tubo PVC tipo pesado 3/4", caja de octa, caja metálica 7600, terminales PVC y rosca	UND	0,00	170.738,00	0,00
9.13	Salida para interruptor triple, tres elementos incluye, tubo PVC tipo pesado 3/4", caja de octa, caja metálica 7600, terminales PVC y rosca	UND	7,00	165.292,00	1.156.974,00
9.14	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A - 125v, salida individual, incluye tubo PVC tipo pesado 3/4", caja de octa 12 AWG (2) in polarizado, thdi metálica 7600 y 2400 watts	UND	18,00	248.811,00	4.742.909,00

NO. CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL ESE
OBJETO DEL CONTRATO	LOTE 04: MEJORAMIENTO MEJORAR DE LOS PUESTOS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SAN NICOLAS, SAN JOSE, CHIRE, PUESTO COLOMBIA, LA CHAPA, CORRALITO Y LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE PATO CORRALES, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA	CONSORCIO COSALUD
INTERVENTORIA	SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORIA CONSTRUCCION MANTENIMIENTO
PLAZO PRINCIPAL	CUATRO (4) MESES
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 DE ENERO DE 2024
FECHAS DE INICIO	24 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN OBRA	24 DE JUNIO DE 2024

ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL
9.13	Suministro e instalación de tubería de agua fría de 1/2" (13 mm) incluye: tubo PVC tipo presión 3/4", codos de cobre	UND	3,00	111.497,00	334.491,00
9.14	Suministro e instalación de calentador TANK "EFTI" (LUX CARIBE) + (LUX LOWATTS) - THN 600 X 75°C. Suministro e instalación TODO	UI	4,00	93.116,00	406.644,00
10	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL				
10.1	Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm incluido a este ítem	M2	6,71	290.000,00	2.578.703,70
10.2	Puerta en aluminio con vidrio incoloro 4 mm. Suministro e instal.	M2	3,00	405.718,00	3,00
10.3	Rejilla tubo 2" en 1.5 mm y malla soldadora del 15, incluye en 1 1/4" x 1/8"	M2	5,00	371.435,00	5,00
11	CERRAMIENTO				
11.1	Cerramiento, en concreto, rejilla, columnetas, muro a la vista, tubo con tapa, pedral, angulo, malla soldadores y 3 hilos	M2	0,00	987.956,00	0,00
12	ELECTRICOS				
12.1	Demolicion muro de bahareque incluye retiro 0,2 h por retiro	M²	104,42	7.051,20	743.615,10
12.2	Retiro de escombros con material todo combustible	m3	39,60	31.758,00	910.117,20
12.3	Ramps sanitarios 4x4,5m,L=2,50m de 3000 Psi	und	1,00	1.033.434,00	1.033.434,00
12.4	Bordillo 25 x 10 cm fundido en concreto 3000 psi	M	10,61	63.729,00	1.225.325,00
12.5	Puerta sanitaria en aluminio corrediza 53 x 7 cm suministro e instalacion	m	14,28	18.640,00	1.549.974,00
12.6	Juego de barras de seguridad en L 2'9" x 39" pare	und	3,00	771.564,00	2.314.692,00
12.7	Caja de inspeccion 0.60 x 0.60 m	und	3,00	573.995,00	1.147.990,00
12.8	Muro en bloque No. 5 arcilla rectificado de 0,12m (12x12x29	m2	98,60	68.164,00	6.754.182,40
12.9	Puntos tipo ubicados muro 1.4., incluye flex y ahí termin (+/-) 3mm	m2	229,17	29.530,00	6.770.113,00
12.10	Viga sarre de 0,12 x 0,20 en concreto resistencia 3000 Psi un incluye	m	18,54	61.823,00	2.383.044,42
12.11	Viga de amarre para entrelazado en concreto de 3000 PSI	M3	0,45	950.833,00	555.104,00
12.12	Cielo raso en lamina PVC 10 mm incluye cornisa	m2	98,62	113.190,00	11.160.397,80
12.13	Enchaez de pas en ordenes entrelazando 45 x 45	m2	3,93	79.348,95	299.93,2,00
12.14	Pendones en PVC medio: ocho 0.66 m Suministro e inst.	m	18,84	11.871,11	1.256.715,00
12.15	Puerta metalica en angel incluye cerradura en angel de tres especiales mala entrada, incluye UPA flexible, desagüe, retiros regulados y anexo	Und	1,00	982.448,10	1.982.264,00
12.16	Ventana aluminio dos cuerpo incluye, grilles, cuarto, vidrio regulados y cerpos metales. Suministro e instal	Und	3,00	373.111,25	1.119.334,00
12.17	Mezcla en concreto 3000 psi reforzado en 0,07 m h=0,60m anclado en concreto tierra bolsaria "Para"	m	2,10	111.902,00	454.997,00
12.18	Puerta en Lamina Cal Rolet Deslizante con entortamiento, incluye desmontajes mano, suministro e instalación.	M2	15,60	742.373,24	11.160.34,3,00
12.19	Puerta en marco metalico ml, 1.8 y mas puerta entramadas en triplex, pintada e instalada	M2	4,40	437.756,77	2.717.64,3,00
12.20	Puerta en triplex liso entramada con marco acero cold rolled soldado (3 puertas con entablerados) e instalada en sanitaria. Suministro e instal	M2	4,80	500.771,88	2.446.61,5,00
12.21	Piso tipo terrazeo en norte sustrato de 6 mm, instalado.	M2	6,73	245.738,54	2.395.95,7,00
12.22	Cerradura sobre marco madera/metalicas. Suministro e instal.	und	6,00	93.795,20	404.71,1,00
12.23	Cerradura de doble seguridad de resalto sobre y cerros con niveles arrojado. Suministro e instal.	Und	7,00	181.972,00	1.341.004,72
12.24	Desmonte tuberias metalicas con empleme y cerros	m²	30,29	9.544,03	289.32,1,00
12.25	Demolicion manual de muro en concreto h=0,60 m	m	3,87	79.424,00	99.81,7,00
12.26	Piso tipico rematado en pedra 2 x 2 x 2, con tela en concreto 3000 ps	Und	1,00	3.457.618,05	3.457.618,00
12.27	Tuberia sanitaria PVC 3". Suministro e instal.	m	19,23	38.191,86	734.449,00
12.28	Luminaria led aplique 18W, LED 4, Suministro e instalacion	Und	7,00	43.143,99	302.004,00
12.29	Lamp para luminaria de emergencia 2,4 W	Und	4,00	139.894,00	559.576,00
12.30	Suministro e instalación de medidor de energía, incluye: tipo tank monobloc, medidor monofásico, trifásico trifásico, sistema de bucle 2 hilos	Und	1,00	1.771.827,12	1.771.827,00
12.31	Tablero monofásico en pared de 12 circuitos. Suministro e instalacion	Und	1,00	287.182,16	287.182,00
12.32	Resanado y retiro de sustratos muro portado	m2	276,40	8.455,61	2.347.271,00
13	OBRAS PRELIMINARES				
13.1	PROCESO DE LICITACION DEL CONTRATO	GLB	1,00	1,00	
	SUBTOTAL				$40.349.999,00
	ADMINISTRACION 23%	GLB	0,23		$8.406.32 1,00
	IMPREVISTOS 2%	GLB	0,02		$ 806.866,00
	UTILIDAD 5%	GLB	0,05		$2.362.344,00
	RETENCION RETE	GLB			$ 200.000,00
	COSTO TOTAL PROPUESTA				$52.325.530,00

FIC ALFREDO LOPEZ CARDENAS
Consorcio COSALUD

Héctor Alberto Gamboa Rodríguez
Director Interventoría Line 4

REPROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE CAJA VEREDA SAN NICOLAS

QUINCENA 1	QUINCENA 2	QUINCENA 3	QUINCENA 4	QUINCENA 5	QUINCENA 6	QUINCENA 7	QUINCENA 8	QUINCENA 9	QUINCENA 10	QUINCENA 11
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RESPUESTA SOLICITUD PRORROGA No.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

RedSalud Casanare E.S.E. Salud y vida para el llano NIT.844.004197-2	GESTION DOCUMENTAL	PA-3-GD-FO-09 20-04-2026 V.01
	OFICIO	

Yopal, 18 de junio de 2026.

Señor:
HENRY ALBERTO CAICEDO ALCÁNTARA
SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO S.A.S
NIT. 901.075.624-6
gerencia@sicoms.co / interpapscorozal@gmail.com

Referencia: contrato de Interventoría No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y No INTERNO 043-2026, cuyo objeto es: LOTE 04. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SAN NICOLAS, SAN JOSE, CHIRE, PUERTO COLOMBIA, LA CHAPA, CORRALITO Y LAS TAPIAS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Asunto: Respuesta a la solicitud de prorroga No.1 para el contrato de referencia.

Cordial saludo,

Comedidamente, me permito informar que una vez verificada su solicitud de aprobación de prorroga No.1 por termino de un (01) mes, el cual fue radicado a Red salud Casanare, el día 09 de junio de 2026, la supervisión y el apoyo a la supervisión técnica del contrato de interventoría, verifico el contenido y la justificación presentado por la interventoría como soporte técnico avalando y aprobando la solicitud de prorroga No. 1 al plazo establecido por termino de un (01) mes adicional al contrato de interventoría No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y No INTERNO 043-2026.

En razón a lo anterior se considera viable teniendo en cuenta que la jefe de la oficina Asesora de planeación y mercadeo y sistemas debe cumplir con diferentes funciones esenciales de supervisión y requiere continuar con el seguimiento y control a la ejecución del contrato de interventoría, No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y No INTERNO 043-2026, quien a su vez realiza el seguimiento y control al contrato de obra No. SECOP II RSC-CP-007-2025 Y No INTERNO 559-2026

Atentamente.

ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Supervisor
Jefe Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas

LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS
Gerente
Red Salud Casanare E.S.E.

Proyecto: **GUSTAVO ADOLFO SUAREZ**
Profesional de Apoyo Red Salud Casanare

SOLICITUD ELABORACIÓN PRORROGA SUPERVISION - JURÍDICA

Yopal, 19 de junio de 2026.

PARA: OFICINA ASESORIA JURIDICA
Dra. Maryuri Lizeth Ávila Sanabria
Jefe Oficina Jurídica
Correo: juridica@redsaludcasanare.gov.co
Yopal

DE: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Supervisor
Jefe De La Oficina Asesora De Planeación, Mercadeo y Sistemas
Correo: planeacion@redsaludcasanare.gov.co

Asunto: Solicitud elaboración de prorroga en tiempo No. 01 para el contrato de INTERVENTORIA No. SECOP II RSC-CP-005-2025 y No INTERNO 043-2026.

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor del contrato de interventoría asunto de la referencia, me permito aceptar y dar viabilidad para suscribir la prórroga No.1 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones con el fin de ajustar la **CLÁUSULA OCTAVA – PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

1. Justificación técnica y jurídica

El contrato de interventoría se concibió para hacer acompañamiento al contrato de obra No. SECOP II RSC-CP-007-2025 y número interno 559-2026, como apoyo técnico ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico para la adecuación menor de los puestos de salud del municipio de Hato Corozal, Red salud Casanare E.S.E. Razón por la cual, en el ejercicio de las funciones adelantadas el contratista de interventoría solicito la presente supervisión que tuviera en consideración la solicitud de prorroga OF-CI-023 suscrita el día 05 de junio, argumentando las dificultades logísticas en el contrato de obra en la adecuación menor en el centro de salud, debido a que las constantes precipitaciones, sumado a actividades de alto riesgo, como desmontes de cubiertas, pintura de elementos estructurales, instalación de cubiertas nuevas, han impedido la continuidad de la obra.

Comedidamente, me permito informar que una vez verificada su solicitud de aprobación de prorroga No.1 por termino de un (01) mes, el cual fue radicado a Red salud Casanare, el día 09 de junio de 2026, la supervisión y el apoyo a la supervisión técnica del contrato de interventoría, verifico el contenido y la justificación presentado por la interventoría como soporte técnico

avalando y aprobando la solicitud de prorroga No. 1 al plazo establecido por termino de un (01) mes adicional al contrato de interventoría No. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y No INTERNO 043-2026.

En este contexto, la necesidad de solicitud de tiempo no implica un cambio de objeto ni una contradicción con la planeación inicial, sino un desarrollo natural de la finalidad del contrato: realizar la adecuación de los puestos de atención primaria del municipio de Hato corozal, con el fin de mantener la continuidad mejorar la prestación de servicios de la entidad Red Salud Casanare E.S.E, el deterioro. las actividades como desmonte de cubiertas, pintura de estructura metálica y montaje de cubierta nueva, generan afectación en la continuidad de actividades sucesivas propias de la adecuación menor, tales como, acabados de muros, esta cadena de eventos ha sido motivada y justificada por el contratista en los anexos correspondientes a la presente Solicitud.

Por lo anterior, es necesario la ampliación del plazo contractual por el termino de un (01) mes, al contrato de interventoría, con el firme propósito de mantener el seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y jurídico para la adecuación menor los puestos de atención primaria del municipio de Hato corozal, al contrato de obra No. SECOP II RSC-CP-007-2025 y número interno 559-2026. Es imperativa la coordinación con el contratista, y que este adelante las actividades necesarias para la terminación del objeto contractual.

Esta prórroga se presenta como una medida razonable y proporcionada que la complementa frente a una circunstancia técnica sobreviniente, evitando entregas formales que no permitan la puesta en operación de la sede, así como futuros procesos contrataciones fragmentadas o mayores costos para la entidad.

2. SOPORTES ADJUNTOS

Para sustentar esta solicitud, anexo los siguientes documentos

1. copia de la solicitud de la interventoría
2. copia solicitud técnica enviada por el contratista

Atentamente.

ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Supervisor delegado
Jefe Oficina Asesora de Planeación,
Mercadeo y Sistemas

LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS
Gerente
Red Salud Casanare E.S.E.

Proyecto: **GUSTAVO ADOLFO SUAREZ**
Profesional de Apoyo Red Salud Casanare
