OBJETO: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE

INFORME DE SUPERVISION
PARCIAL No. 1 CONTRATO 272 DE 2026

LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATO DE CONSULTORÍA 292 DE 2026

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

TAURAMENA 2024-2027

FECHA: 03 DE JULIO DE 2026

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No.	272 DEL 26 DE MARZO DE 2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SERVICIOS
OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
R/LEGAL	ALIX XIMENA BUITRAGO MORENO
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL
VALOR CONTRATO	$ 2,278,312,952
FECHA INICIACIÓN	11 DE MAYO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN	10 DE MAYO DE 2027
PERIODO DE EJECUCIÓN	11 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
% AVANCE FINANCIERO	10.09%
% AVANCE FISICO	5.50%
FECHA PRESENTE INFORME	03 DE JULIO DE 2026

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto Municipal 029 del 2004 y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la cláusula séptima (7) del Contrato en mención; me permito rendir el presente informe sobre el cumplimiento del mismo, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
1.SUPERVISIÓN TÉCNICA	El componente técnico del Contrato de servicios No. 272 de 2026 se desarrolló en un 5.50%, lo cual se puede evidenciar en el Informe Parcial No. 1 y soportes de evidencias presentadas por el contratista y revisado y aprobado por Interventoría. Se realizó seguimiento y verificación a las obligaciones de la interventoría en las actividades técnicas de verificación del contrato No. 272 de 2026. (Implementar jornadas lúdico-pedagógicas a las Instituciones Educativas a través de los PRAES, Insumos y materiales entregados a las instituciones educativas como fortalecimiento a los PRAES, Desarrollar acciones de sensibilización educativa ambiental a las comunidades rurales a través de PROCEDAS, Construcción y caracterización de la línea base biofísica y socioeconómica actual de las areas ambientalmente estratégicas para la conservación del recurso hídrico en el municipio. Monitoreo y seguimiento de áreas de conservación en predios del municipio en ecosistemas estratégicos), de acuerdo a lo soportado en el Informe parcial No. 1, acorde a las obligaciones del contrato.

2. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA	El componente administrativo del Contrato de servicios No. 272 de 2026 se desarrolló en un 5.50%, lo cual se puede evidenciar en el Informe Parcial No. 1 y soportes de evidencias presentadas por el contratista y revisado y aprobado por Interventoría. Se adjuntaron contratos del personal adscrito y planillas de afiliación a seguridad social. Se realizó el reporte mensual a Gesproy, quedando registrado que las actividades programadas en tiempo y recursos se llevaron a cabo sin novedad, así se veló por la correcta ejecución de los recursos de SGR.
3. SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	El componente financiero del Contrato de servicios No. 272 de 2026 se desarrolló en un 5.50%, lo cual se puede evidenciar en el Informe Parcial No. 1 y soportes de evidencias presentadas por el contratista y revisado y aprobado por Interventoría. El Contratista AGRÍCOLA SANTANA SAS BIC renunció al anticipo; sin embargo se verificó el respectivo ingreso a almacén y otros gastos realizados y reportados en el respectivo informe. Con el presente informe de supervisión para el Acta Parcial N° 1 del contrato 272 de 2026 y la respectiva aprobación de la interventoría se da visto bueno para un cobro neto del 10.09% correspondiente a $229.910.238.
4. SUPERVISION LEGAL	El componente legal del Contrato de servicios No. 272 de 2026 se desarrolló en un 5.50%, lo cual se puede evidenciar en el Informe Parcial No. 1 y soportes de evidencias presentadas por el contratista y revisado y aprobado por Interventoría. Se realizaron actas de comité y mesas de trabajo respecto a seguimiento y ejecución del Contrato 272 de 2023. El contrato se ejecuto sin novedades jurídicas, el plazo y valor inicial se mantiene de acuerdo a las obligaciones contractuales iniciales.
5. SUPERVISION AMBIENTAL	El componente ambiental del Contrato de servicios No. 272 de 2026 se desarrolló en un 5.50%, lo cual se puede evidenciar en el Informe Parcial No. 1 y soportes de evidencias presentadas por el contratista y revisado y aprobado por Interventoría. No se necesitó la expedición de algún tipo de permiso y/o licencia ambiental para las actividades ejecutadas. Se verificó que las mismas no tuvieran efectos ambientales negativos, más bien, con las mismas se contribuyó a la preservación de los recursos naturales.
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS	**N/A**

2. GARANTÍAS

El contratista presentó las siguientes:	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Cumplimiento	X			06/05/2026
Responsabilidad civil extracontractual	X			06/05/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X			06/05/2026

PÓLIZA Nº	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
177625	CESCE COLOMBIA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS	CUMPLIMIENTO	$ 227,831,295.20	26 DE MARZO DE 2026	06 DE AGOSTO DE 2027	NA
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 113,915,647.60	26 DE MARZO DE 2026	06 DE ABRIL DE 2030	NA
18693		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 350,181,000.00	26 DE MARZO DE 2026	06 DE ABRIL DE 2027	NA

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
		ANTICIPADO		
Valor contratado	2,278,312,952			
Valor Anticipo o Pago Anticipado (XXX %)		$ -		$ -
Valor Adicional No. XXX				
Valor presente Acta			$ 229,910,238	$ 229,910,238
Saldo por ejecutar			$ 2,048,402,714	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**2,278,312,952**		**2,278,312,952**	**229,910,238**

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

La ejecución del contrato de servicios se encuentra en un avance del 10.09% financieramente y en un 5.50% de avance físico, durante el desarrollo del mismo no se presentaron inconvenientes que conlleven a la materialización del alguno de los riesgos establecidos en el proceso de contratación.

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
ACTA DE INICIO	11/05/2026
ACTA PARCIAL No. 1	06/07/2026

Como constancia de la ejecución, el contratista de la interventoría según Contrato No. 292 de 2026, hace entrega de: Informe Parcial No. 1 del contrato de sevicios No. 272 de 2026, con sus respectivos soportes como (informe técnico, seguridad social, registros de asistencia, actas de visita, registros fotográficos, entre otros) en físico y digital; con el respectivo informe de interventoría que respalda el avance físico - financiero de ejecución, los cuales se remiten a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que reposen en el expediente del contrato.

6. ANEXOS

1. Descripción de obligaciones contractuales
2 Registro Fotográfico
3 Cuadro comparativo de cantidades
4 Gráfico de ejecución por actividades
5 Programa de seguimiento y control
6 Informe Parcial No. 1 del contrato de sevicios No. 272 de 2026, con el respectivo informe de interventoría

JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
Cargo: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - SUPERVISOR

LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL
Cargo: Apoyo a la supervisón del contrato de interventoría No. 292 de 2026

ANEXO 1
INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1	***DISMINUIR EL IMPACTO ANTROPICO SOBRE LAS AREAS DE PROTECCION DEL MUNICIPIO***

Se evidencia el cumplimiento de lo programado y ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales según lo plasmado en el Informa Parcial No. 1 del Contrato de servicios No. 272 de 2026, de acuerdo a los soportes de evidencias presentadas por el contratista y revisado y aprobado por Interventoría.

2	***AUMENTAR LA INTERACCION INSTITUCIONAL EN LA PROTECCION DE LAS AREAS AMBIENTALES ESTRATEGICAS LOCALES***

Se evidencia el cumplimiento de lo programado y ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales según lo plasmado en el Informa Parcial No. 1 del Contrato de servicios No. 272 de 2026, de acuerdo a los soportes de evidencias presentadas por el contratista y revisado y aprobado por Interventoría.

JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
Cargo: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - SUPERVISOR

LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL
Cargo: Apoyo a la supervisón del contrato de interventoría No. 292 de 2026

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO


INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL


INFORME FOTOGRAFICO

DISMINUIR EL IMPACTO ANTROPICO SOBRE LAS AREAS DE PROTECCION DEL MUNICIPIO



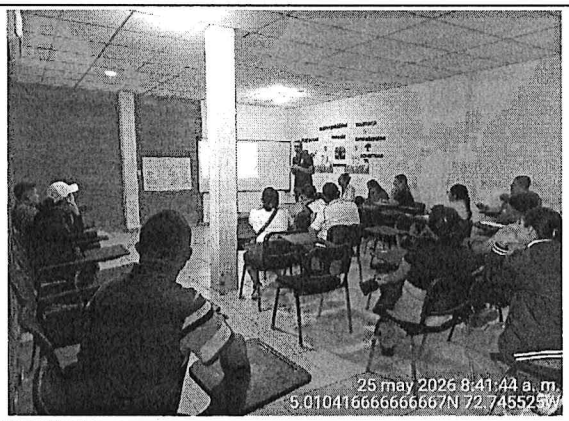

AUMENTAR LA INTERACCION INSTITUCIONAL EN LA PROTECCION DE LAS AREAS AMBIENTALES ESTRATEGICAS LOCALES

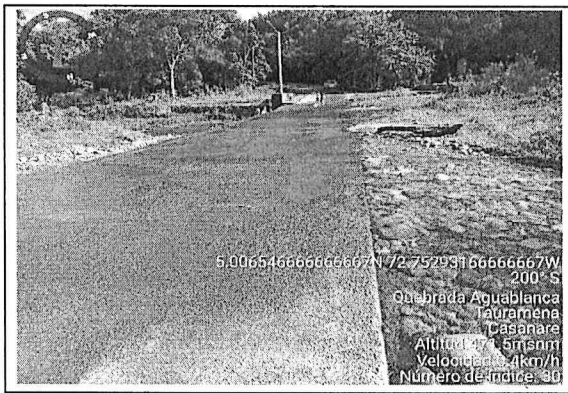



JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
Cargo: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - SUPERVISOR

LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL
Cargo: Apoyo a la supervisón del contrato de interventoría No. 292 de 2026

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACION, REHABILITACION, EDUCACION, EXTENSION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1
COMPONENTE 1. DISMINUIR EL IMPACTO ANTROPICO SOBRE LAS AREAS DE PROTECCION DEL MUNICIPIO					**100%**	**8%**			**$1,246,093,090.00**	**$105,141,880.56**
1.1 IMPLEMENTACIÓN DE JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS SOBRE MARCO NORMATIVO Y TECNICO DE LOS ECOSISTEMAS LOCALES										
1.1.1 Implementar jornadas lúdico-pedagógicas a las Instituciones Educativas a través de los PRAES										
1.1.1.1	Asistencia técnica para el fortalecimiento de los PRAES a traves de jornadas de sensibilización en las instituciones educativas oficiales (Según APU 1.1.1.1)	Und.	30	2	100%	6.7%	93%	$891,667	$26,750,010	1,783,334.00
1.1.1.2	Complemento nutricional (Refrigerios) - Un Jugo Natural maracuyá o mora o lulo o guayaba en Agua, servido en vaso plástico de varios usos (reutilizable) con capacidad mínima 230 c.c. - Producto pasteleria (Empanada, elaborada con haría de trigo, rellena de arroz con pollo desmechado, peso por unidad 115 gr mínimo. empacado en bolsa ziploc, con su respectiva servilleta.) o entrepan de pollo o res minimo 100gr de proteina, vegetales . Incluye empaques desechables y transporte de los alimentos al sitio del evento. (A demanda, de acuerdo con la actividad).	Und.	750	50	100%	6.7%	93%	$9,000	$6,750,000	450,000.00

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1
1.1.1.3	Kit de logística N°1 para jornadas lúdico-pedagógicas para las Instituciones Educativas (Según APU 1.1.1.3)	Und.	30	20	100%	66.7%	33%	$524,550	$15,736,500	7,351,918.20
1.1.1.4	Servicio de Transporte de personal en vehiculo tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Igual a 2021 o superior (Decreto No 0056 de 2024).	Día	30	2	100%	6.7%	93%	$365,750	$10,972,500	731,500.00
Insumos y materiales entregados a las instituciones educativas como fortalecimiento a los PRAES										
1.1.1.5	Contenedor plástico: Punto Ecológico capacidad mínima volumetrica 50 litros. Tres (3) recipientes. Estructura metálica. Largo mínimo 85 cm, Alto mínimo 90, ancho mínimo 30 cm.	Und	10	10	100%	100%	0%	$ 640,000	$6,400,000	6,400,000.00
1.1.1.6	Tanque para almacenamiento de agua, con tapa. Capacidad 2.000 litros. Fabricado en polietileno negro con aditivo U.V. que bloquea el paso de los rayos solares, evitando la formación de algas y bacterias en el agua. Fabricado en polietileno. Color negro. Alto mínimo 180 cm, diámetro mínimo 145 cm. Accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC	Und	5	5	100%	100.0%	0%	$ 1,600,000	$8,000,000	8,000,000.00

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACION, REHABILITACION, EDUCACION, EXTENSION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1
1.1.1.7	Batea plástica capacidad 100 litros (Recipiente plastico en forma de boveda-media caneca). Capacidad 100 litros	Und	5	5	100%	100.0%	0%	$ 72,000	$360,000	360,000.00
1.1.1.8	Bolsas de colores: 80 cm x 110 cm. Polietileno de baja densidad, material reciclado.	Und	250	250	100%	100.0%	0%	$ 1,800	$450,000	450,000.00
1.1.1.9	Guantes en latex: Caja de guantes en latex, 100 unidades por recipiente.	Und	3	3	100%	100.0%	0%	$ 30,000	$90,000	90,000.00
1.1.1.10	Tapabocas: Recipiente de 50 unidades. Elaborado en tela no tejida de uso quirurgico 100% polipropileno. Con elástico.	Und	4	4	100%	100.0%	0%	$ 28,950	$115,800	115,800.00
1.1.1.11	Material Vegetal Ornamental: Altura Minima 35 cm. libres de plagas y enfermedades, con buen estado de vigor,nutricional y fitosanitario. Especies a entregar Ixoras, Durantas, Crotos , Palmas Bismarckia, Palmas Abanico, Palmas de Moriche, Palmas Manila, Palma Areca, Bucare, Bougainvillea, Ocobos, Flor Amarillos, Casco de Vaca, Swinglia (Limoncillo), Heliconias,Anturios, Bromelias, Palma de Cera, Clavellino, Filodendros	Und	3500	0	100%	0.0%	100%	$ 11,000	$38,500,000	0.00
1.1.1.12	Abono orgánico: Compost. Con registro ICA.	Kg	5000	0	100%	0.0%	100%	$ 915	$4,575,000	0.00

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACION, REHABILITACION, EDUCACION, EXTENSION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1
1.1.1.13	Lombriz Roja californiana, corresponde a la especie y genero Eisenia foetida: Anélido de 6 a 8 cm de largo,3 a 5 mm de diámetro	Kg	150	0	100%	0.0%	100%	$ 25,000	$3,750,000	0.00
1.1.1.14	Cartillas para Colorear Aves: incluye 16 especies representativas e ilustradas a todo color como referencia para colorear los bosquejos en blanco y negro de las mismas aves que encuentran en su interior. Tamaño 12 x 22 cm.	Und	100	0	100%	0.0%	100%	$ 45,000	$4,500,000	0.00
1.1.1.15	Servicio de Transporte de Carga para insumos y materiales entregados a las Instituciones Educativas del municipio mediante Un vehículo tipo camión con capacidad de tres toneladas o más para transporte de carga a todo costo, incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Modelo lugal a 2021 o	Und	5	0	100%	0.0%	100%	$ 522,450	$2,612,250	0.00
1.1.2 Desarrollar acciones de sensibilización educativa ambiental a las comunidades rurales a través de PROCEDAS										

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACION, REHABILITACION, EDUCACION, EXTENSION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1
1.1.2.1	Asistencia técnica Ambiental para el fortalecimiento de los PROCEDAS a traves de jornadas de sensibilización a las comunidades Rurales (Según APU 1.1.2.1)	Und	8	0	100%	0.0%	100%	$ 1,671,875	$13,375,000	0.00
1.1.2.2	Complemento nutricional (Refrigerios) - Un Jugo Natural maracuyá o mora o lulo o guayaba en Agua, servido en vaso plástico de varios usos (reutilizable) con capacidad mínima 230 c.c. - Producto pasteleria (Empanada, elaborada con haría de trigo, rellena de arroz con pollo desmechado, peso por unidad 115 gr mínimo. empacado en bolsa ziploc, con su respectiva servilleta.) o entrepan de pollo o res minimo 100gr de proteina, vegetales . Incluye empaques desechables y transporte de los alimentos al sitio del evento. (A demanda, de acuerdo con la actividad).	Und	160	0	100%	0.0%	100%	$ 9,000	$1,440,000	0.00
1.1.2.3	Kit de logistica N°2 para jornadas lúdico-pedagogicas con comunidades rurales (Segun APU 1.1.2.3)	Und	8	4	100%	50.0%	50%	$ 802,250	$6,418,000	790,828.36
1.1.2.4	Servicio de Transporte de personal en vehiculo tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Igual a 2021 o superior (Decreto No 0056 de 2024).	Dia	8	0	100%	0.0%	100%	$ 365,750	$2,926,000	0.00

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACION, REHABILITACION, EDUCACION, EXTENSION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1
1.1.2.5 Asistencia técnica agropecuaria para la implementación de los Laboratorios pedagógicos Agroambientales										
1.1.2.5.1	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA:Un profesional (1). Título universitario en Ingenieria Agroforestal, título de especialización. Experiencia profesional de cuatro (4) años, de los cuales se debe acreditar como mínimo tres (3) años de experiencia relacionada.	Mes	6	0	100%	0%	100%	$ 6,375,000	$38,250,000	0.00
1.1.2.5.2	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA:Un profesional (1). Título universitario en Medicina Veterinaria y Zootecnia.	Mes	6	0	100%	0.0%	100%	$ 4,100,000	$24,600,000	0.00
1.1.2.5.3	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA-:Un profesional (1). Título universitario en Ingenieria Agroindustrial.Experiencia profesional de dos (2) años de los cuales debe acreditar como mínimo un (1) año de experiencia relacionada.	Mes	6	0	100%	0.0%	100%	$ 5,250,000	$31,500,000	0.00
1.1.2.5.4	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA - :Un profesional (1). Título universitario en Administración industriales. Experiencia profesional de un año (1) años de los cuales debe acreditar como mínimo seis (6) meses de experiencia relacionada.	Mes	6	0	100%	0.0%	100%	$ 4,500,000	$27,000,000	0.00

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACION, REHABILITACION, EDUCACION, EXTENSION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1
1.1.2.5.5	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA- DOS (2) TECNOLOGOS O TECNICOS: Título de formación técnica ciencias agropecuarias o ambientales o afines.	Mes	6	0	100%	0.0%	100%	$ 5,750,000	$34,500,000	0.00
1.1.2.5.6	Record registro visitas asistencia técnica agropecuaria (talonario para 50 visitas en papel químico original,, tamaño carta, dos copias).	Unidad	10	0	100%	0.0%	100%	$ 50,000	$500,000	0.00
1.1.2.5.7	Servicio de Transporte de personal en vehiculo tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Igual a 2021 o superior (Decreto No 0056 de 2024).	Dia	260	0	100%	0.0%	100%	$ 365,750	$95,095,000	0.00
Kit de Insumos y materiales para la implementación de los Laboratorios pedagógicos Agroambientales										
1.1.2.5.8	Cal agrícola para enmienda de suelos.	Kg	4,000	4000	100%	100%	0%	$ 780	$3,120,000	3,120,000.00
1.1.2.5.9	Cascarilla de arroz (Paca prensada), peso aproximado 20 kilogramo.	Und	40	40	100%	100.0%	0%	$ 29,000	$1,160,000	1,160,000.00
1.1.2.5.10	Abono orgánico: Compost, o gallinaza tratada. Bulto 50 Kg. Composición Nitrogeno Total (N) = Mínimo 2%- Fostoro total (p2o5) = Mínimo 1,5%- Calcio (Cao)= Mínimo 3%. pH = Mínimo 7 Registro ICA	Kg	8000	8000	100%	100.0%	0%	$ 915	$7,320,000	7,320,000.00

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACION, REHABILITACION, EDUCACION, EXTENSION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1
1.1.2.5.11	Batea plástica capacidad 100 litros (Recipiente plastico en forma de bóveda-media caneca).	Und	80	80	100%	100.0%	0%	$ 72,000	$5,760,000	5,760,000.00
1.1.2.5.12	Lombriz Roja californiana: Lombriz en sustrato.	Kg	160	0	100%	0.0%	100%	$ 25,000	$4,000,000	0.00
1.1.2.5.13	Malla plástica.Malla en polipropileno. Color negro. Rollo de 50 metros de largo por 1,8 metros de alto.	Und	40	40	100%	100.0%	0%	$ 190,000	$7,600,000	7,600,000.00
1.1.2.5.14	Posta madera inmunizado, longitud 2 m, diametro igual o mayor a 10 cm.	Und	400	0	100%	0.0%	100%	$ 49,000	$19,600,000	0.00
1.1.2.5.15	Bandeja multiplicación o germinación semilla. Capacidad Mínima 50 cavidades profundas.	Und	240	0	100%	0%	100%	$ 27,600	$6,624,000	0.00
1.1.2.5.16	Cilantro semilla de hortaliza, Sobre de 10 gr. Registro ICA.	Und	160	0	100%	0.0%	100%	$ 7,200	$1,152,000	0.00
1.1.2.5.17	Tomate. Semilla de Hortaliza, sobre de 3 gr. Registro ICA.	Und	40	0	100%	0.0%	100%	$ 7,200	$288,000	0.00
1.1.2.5.18	Lechuga. Semilla de Hortaliza, sobre de 7 gr. Registro ICA.	Und	40	0	100%	0.0%	100%	$ 7,200	$288,000	0.00
1.1.2.5.19	Cebolla Cabezona. Semilla de Hortalizas, sobre 3 gramos. Registro ICA.	Und	40	0	100%	0.0%	100%	$ 9,800	$392,000	0.00
1.1.2.5.20	Habichuela. Semilla Hortalizas, sobre 25 gramos.Registro ICA.	Und	40	0	100%	0.0%	100%	$ 9,800	$392,000	0.00

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACION, REHABILITACION, EDUCACION, EXTENSION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1
1.1.2.5.21	Pepino Cohombro. Semilla de Hortalizas, sobre 3 gramos. Registro ICA.	Und	40	0	100%	0.0%	100%	$ 9,800	$392,000	0.00
1.1.2.5.22	Manzanilla. Semilla de Hortalizas, sobre 3 gramos. Registro ICA.	Und	40	0	100%	0%	100%	$ 9,800	$392,000	0.00
1.1.2.5.23	Melaza o Miel de purga . Presentación en Sobre o galón.	Kg	200	200	100%	100.0%	0%	$ 8,000	$1,600,000	1,600,000.00
1.1.2.5.24	Roca Fosfórica. Fertilizante Simple. Formula NPK (0-26-0), con 36% de Calcio (Cao). Presentación bulto 50 kilogramos o su equivalente. Registro ICA	Kg	240	240	100%	100.0%	0%	$ 1,900	$456,000	456,000.00
1.1.2.5.25	Sulfato de Magnesio. 16 % de magnesio (Mg) y 13 % de azufre (S). Presentación bulto 25 kilogramos o su equivalente.	Kg	175	175	100%	100.0%	0%	$ 5,500	$962,500	962,500.00
1.1.2.5.26	Tubetes para forestales. Peso mínimo 31 gramos. 20 cm profundidad, ancho superior 6 cm. Profundidad inferior 1,6 cm	Und	2,400	0	100%	0.0%	100%	$ 1,700	$4,080,000	0.00
1.1.2.5.27	Bandeja porta tubetes. Peso mínimo 1.000 gramos. Altura mínima 15 cm, ancho 35 cm, largo 50 cm.Capacidad mínima 30 tubetes	Und	120	0	100%	0.0%	100%	$ 90,700	$10,884,000	0.00
1.1.2.5.28	Bolsa para vivero, hechas en Polipropileno de Baja densidad. Color negro;Dimensiones 9 x 18 cm con fuelle. Paquete por 100 unidades.	Und	40	40	100%	100.0%	0%	$ 8,500	$340,000	340,000.00

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1
1.1.2.5.29	Semillas forestales nativas. Certificadas ICA. Especies: Ocobo, Orejero u otras adaptables a la zona.	Kg	40	0	100%	0%	100%	$ 400,000	$16,000,000	0.00
1.1.2.5.30	Alambre galvanizado, liso calibre No 14. color plateado.Fabricados en acero SAE 1006. Recubrimiento de zinc liviano mínimo 55 g/m2. Resistencia a la tracción Blanda (< 52 kgf mm2). Alambre trefilado con proceso de galvanización en caliente.	Kg	120	120	100%	100.0%	0%	$ 16,500	$1,980,000	1,980,000.00
1.1.2.5.31	Caneca Plastica 200 litros. Elaborada en Polipropileno de alta duración	Und	80	80	100%	100.0%	0%	$ 250,000	$20,000,000	20,000,000.00
1.1.2.5.32	Bomba de Espalda (20 l) Bomba fumigadora manual con capacidad mínima de 20 litros con sistemas de inyección y presión hidráulica, con pistón y cámara externos, con capacidad mínima de cámara de 1 litro, y presión de trabajo mínima de 40 psi +/- 10%.	Und	40	40	100%	100.0%	0%	$ 420,000	$16,800,000	16,800,000.00
1.1.2.5.33	Teja Zinc: Ondulada 3.658 x 0.80mt : Cal 35 0.17mm	Und	160	160	100%	100.0%	0%	$ 47,000	$7,520,000	7,520,000.00

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACION, REHABILITACION, EDUCACION, EXTENSION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1
1.1.2.5.34	Polisombra: Malla Tejida en polietileno HD con estabilizador U.V, utilizada para generar sombra y protección contra rayos U.V, porcentaje de cubrimiento 90% +-5%	m2	200	200	100%	100.0%	0%	$ 20,000	$4,000,000	4,000,000.00
1.1.2.5.35	Mano de obra para jornales de instalación de Laboratorios pedagógicos Agroambientales: Mano de obra no calificada implementación Laboratorios pedagógicos Agroambientales: Limpieza terreno, trazado, ahoyado, instalación malla y elementos.	Und	320	0	100%	0.0%	100%	$ 115,000	$36,800,000	0.00
1.1.2.5.36	Servicio de Transporte de Carga para insumos y materiales a entregar mediante Un vehículo tipo camión con capacidad de tres toneladas o más para transporte de carga a todo costo, incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Modelo lugal a 2021 o superior	Dia	40	0	100%	0.0%	100%	$ 522,450	$20,898,000	0.00
1.2 DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN DE CAMBIO CLIMATICO EN LAS AREAS AMBIENTALMENTE ESTRATEGICAS										
1.2.1 DISMINUCION DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ANTROPICAS NO SOSTENIBLES SOBRE AREAS A CONSERVAR										
1.2.1.1 Asistencia técnica agropecuaria para implementación de unidades demostrativas agrosostenibles										
1.2.1.1.1	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA:Un profesional (1). Título universitario en Ingenieria Agroforestal, título de especialización. Experiencia profesional de cuatro (4) años, de los cuales se debe acreditar como mínimo tres (3) años de experiencia relacionada.	Mes	6	0	100%	0%	100%	$ 6,375,000	$38,250,000	0.00

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1
1.2.1.1.2	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA:Un profesional (1). Título universitario en Medicina Veterinaria y Zootecnia.	Mes	6	0	100%	0%	100%	$ 4,100,000	$24,600,000	0.00
1.2.1.1.3	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA-:Un profesional (1). Título universitario en Ingenieria Agroindustrial.Experiencia profesional de dos (2) años de los cuales debe acreditar como mínimo un (1) año de experiencia relacionada.	Mes	6	0	100%	0%	100%	$ 5,250,000	$31,500,000	0.00
1.2.1.1.4	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA - :Un profesional (1). Título universitario en Administración industriales. Experiencia profesional de un año (1) años de los cuales debe acreditar como mínimo seis (6) meses de experiencia relacionada.	Mes	6	0	100%	0%	100%	$ 4,500,000	$27,000,000	0.00
1.2.1.1.5	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA- DOS (2) TECNOLOGOS O TECNICOS: Título de formación técnica ciencias agropecuarias o ambientales o afines.	Mes	6	0	100%	0%	100%	$ 5,750,000	$34,500,000	0.00
1.2.1.1.6	Record registro visitas asistencia técnica agropecuaria (talonario para 50 visitas en papel químico original, tamaño carta, dos copias).	Und	9	0	100%	0%	100%	$ 50,000	$450,000	0.00
1.2.1.1.7	Servicio de Transporte de personal en vehiculo tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Igual a 2021 o superior (Decreto No 0056 de 2024).	Dia	195	0	100%	0%	100%	$ 365,750	$71,321,250	0.00

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACION, REHABILITACION, EDUCACION, EXTENSION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1
1.2.2.1 Implementar unidades demostrativas productivas sostenibles (Apicola)										
1.2.2.1.1	Colmenas estándar tipo Lanstroth. (Incluyen: Base (piquera), cámara de cría, con cuadros y cera reforzados, tapa interna y techo metálico. Elaboradas en madera encerado externamente cumpliendo normas BPM. Cuadros con alambre acerado y lamina de refuerzo metálico superior	Und	50	0	100%	100%	0%	$ 400,000	$20,000,000	0.00
1.2.2.1.2	Alzas estandar Incluye: 10 Cuadros con alambre con láminas de cera.	Und	50	0	100%	100.0%	0%	$ 190,000	$9,500,000	0.00
1.2.2.1.3	Soporte Metálico Antihormigas: Elaborado en tubo o varilla corrugada para cada colmena individual	Und	50	0	100%	100.0%	0%	$ 128,000	$6,400,000	0.00
1.2.2.1.4	Porta núcleo: De 4 marcos, empleado en el traslado y captura de enjambres con cuadros y cera.	Und	50	0	100%	100.0%	0%	$ 127,500	$6,375,000	0.00
1.2.2.1.5	Material Biológico - Núcleo de abejas: 4 marcos, uno de cría abierta, uno de cría operculada y dos cuadros de reservas de alimento, reina fecunda, no incluye el porta núcleo.	Und	50	0	100%	0.0%	100%	$ 450,000	$22,500,000	0.00
1.2.2.1.6	malla excluidora: rejilla especial colocada entre el nido y la alza y se usa para confinar a la abeja reina en el nido, evitando así que se suba a la alza y haga una cría.	Und	60	0	100%	100.0%	0%	$ 40,000	$2,400,000	0.00
1.2.2.1.7	Azúcar: Alimento para las abejas en fase inicial.	KG	250	0	100%	0.0%	100%	$ 7,200	$1,800,000	0.00

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACION, REHABILITACION, EDUCACION, EXTENSION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1
1.2.2.1.8	Overol enterizo con careta : Drill super 8 tipo americano.	Und	10	0	100%	0%	100%	$ 270,000	$2,700,000	0.00
1.2.2.1.9	Guantes: En cuero manga larga para apicultura	Und	10	0	100%	0.0%	100%	$ 62,000	$620,000	0.00
1.2.2.1.10	Ahumador mediano: en acero inoxidable con rejilla de protección	Und	10	0	100%	0.0%	100%	$ 274,000	$2,740,000	0.00
1.2.2.1.11	Palanca en acero inoxidable	Und	10	0	100%	0.0%	100%	$ 90,000	$900,000	0.00
1.2.2.1.12	Cepillo para barrer abejas, elaborado en madera y cerdas de crin.	Und	10	0	100%	0.0%	100%	$ 33,000	$330,000	0.00
1.2.2.1.13	Tenedor desoperculador	Und	10	0	100%	0.0%	100%	$ 67,000	$670,000	0.00
1.2.2.1.14	Centrifuga en acero inoxidable: De tres marcos con soporte metálico, llave de descarga de miel en plástico, canastilla en acero electro soldada, piñones de acero	Und	10	0	100%	0.0%	100%	$ 2,900,000	$29,000,000	0.00
1.2.2.1.15	Mano de obra para jornales de instalación de unidades Apicolas: Mano de obra no calificada instalación Unidad Apicola: Limpieza terreno, replanteo, limpieza terreno, instalación.	Und	60	0	100%	0%	100%	$ 115,000	$6,900,000	0.00
1.2.2.1.16	Servicio de Transporte de Carga para insumos y materiales a entregar mediante Un vehículo tipo camión con capacidad de tres toneladas o más para transporte de carga a todo costo, incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Modelo lugal a 2021 o superior	Dia	10	0	100%	100.0%	0%	$ 522,450	$5,224,500	0.00

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACION, REHABILITACION, EDUCACION, EXTENSION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1
1.2.3.1 Implementar Unidades Demostrativas Productivas Sostenibles (Estufas Ecoeficientes Moviles)										
1.2.3.1.1	Estufa tipo Palermo (4 hornillas de leña con recamara de combustión, Horno 25 ancho x 30 alto x 40 fondo (Leña), Recamaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza, Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable, Patas desmontables. Incluye dispositivo Termoeléctrico híbrido (Termo-Solar) para la generación de la energía electrica.) Incluye el transporte para la entrega de la estufa en cada predio.	Und	10	0	100%	100.0%	0%	$ 9,645,000	$96,450,000	0.00
Suministro de insumos agricolas para huerto leñero (Dendroenergético)										
1.2.3.1.2	Material Vegetal Forestal Nativo: Altura 40 - 50 cm. Incluye resiembra del 10%. Vivero certificado ICA (Plantula) (Según Patrón de costo 1.2.3.1.2)	Und	12,100	0	100%	100%	0%	$ 2,651	$32,077,100	0.00
1.2.3.1.3	Fertilizante Compuesto de Síntesis Química NPK (15-15-15) Kilos. Con registro ICA. (Según Patrón de costo 1.2.3.1.2-7)	Kg	2,000	0	100%	100.0%	0%	$ 5,523	$11,046,000	0.00
1.2.3.1.4	Fertilizante Elementos Menores. Bulto de 46 kg. Formula que contenga: N, P2O5. CaO. MgO, S, B, Cu, Fe, Mn. Mo. Zinc. Registro ICA. (Según Patrón de costo 1.2.3.1.2-7)	Kg	1,000	0	100%	100.0%	0%	$ 4,641	$4,641,000	0.00

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1
1.2.3.1.5	Corrector de pH: CALFOS (Fertilizante rico en fosforo y calcio). registro ICA. (Según Patrón de costo 1.2.3.1.2-7)	Kg	2,000	0	100%	100.0%	0%	$ 2,206	$4,412,000	0.00
1.2.3.1.6	Insecticida biológico para Control Sanitario . Biocontrolador tipo agente microbial para control de plagas. (Según Patrón de costo 1.2.3.1.2-7)	Kg	60	0	100%	0.0%	100%	$ 26,572	$1,594,320	0.00
1.2.3.1.7	Hidroretenedor de uso agrícola: Acondicionador orgánico no húmico sólido para aplicación al suelo - Hidroretenedor. (Según Patrón de costo 1.2.3.1.2-7)	Kg	67	0	100%	100.0%	0%	$ 66,430	$4,450,810	0.00
1.2.3.1.8	Abono orgánico: Compost, o gallinaza tratada. Bulto 50 Kg. Composición Nitrogeno Total (N) = Mínimo 2%- Fostoro total (p2o5) = Mínimo 1,5%- Calcio (Cao)= Mínimo 3% pH = Mínimo 7 Registro ICA	Kg	11110	0	100%	0.0%	100%	$ 915	$10,165,650	0.00
1.2.3.1.9	Fertilizante Foliar completo. Registro ICA	Litro	10	0	100%	0%	100%	$ 90,000	$900,000	0.00
1.2.3.1.10	Coadyuvante agrícola. Registro ICA	Litro	10	0	100%	0.0%	100%	$ 80,000	$800,000	0.00

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACION, REHABILITACION, EDUCACION, EXTENSION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1
1.2.3.1.11	Mano de obra para jornales de instalación de Estufas ecoeficientes y sostenimiento de huerto leñero o dendroenergetico: Mano de obra no calificada implementación (Limpieza terreno, trazado, ahoyado, siembra, labores culturales, control plagas y enfermedades.	Unidad	630	0	100%	0.0%	100%	$ 115,000	$72,450,000	0.00
1.2.3.1.12	Aislamiento o cercado del huerto leñero: Instalar aislamiento o cercado perimetral de metros líneales, incluye postas en madera inmunizado o plástico cada 3 metros, cuatro hilos de alambre de púas. (Según Patrón de costo 1.2.3.1.12)	Ml	1,800.0	0	100%	0.0%	100%	$ 27,908	$50,234,400	0.00
1.2.3.1.13	Servicio de Transporte de Carga para insumos y materiales a entregar mediante Un vehículo tipo camión con capacidad de tres toneladas o más para transporte de carga a todo costo, incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Modelo lugal a 2021 o superior	Dia	10	0	100%	0.0%	100%	$ 522,450	$5,224,500	0.00

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACION, REHABILITACION, EDUCACION, EXTENSION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1
COMPONENTE 2. AUMENTAR LA INTERACCION INSTITUCIONAL EN LA PROTECCION DE LAS AREAS AMBIENTALES ESTRATEGICAS LOCALES					**100%**	**12%**			**$1,032,219,862.00**	**$124,768,357.45**
2.1 DESARROLLO DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS										
2.1.1 Construcción y caracterización de la línea base biofisica y socioeconómica actual de las areas ambientalmente estratégicas para la conservación del recurso hídrico en el municipio. Construcción matriz de impactos										
2.1.1.1	Kit de equipo construcción línea báse biofísica de las areas ambientales (según APU 2.1.1.1)	Und	1	0	100%	0%	100%	$ 9,360,000	$9,360,000	0.00
2.1.1.2	Construcción y caracterización de la línea base biofísica y socioeconómica actual de las areas ambientalmente estratégicas para la conservación del recurso hídrico en el municipio y Construcción de la matriz de impactos: conflictos ambientales, tensionantes y Problemática presente en los predios de conservación ambiental del municipio. (SEGUN APU 2.1.1.2)	Und	1	0.166666667	100%	16.7%	83%	$ 465,375,000	$465,375,000	77,562,500.00
2.1.1.3	Servicio de Transporte de personal en vehiculo tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Igual a 2021 o superior (Decreto No 0056 de 2024).	Dia	72	0	100%	16.7%	83%	$ 365,750	$26,334,000	0.00

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACION, REHABILITACION, EDUCACION, EXTENSION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1
2.1.2 Restauración pasiva de areas de conservación										
2.1.2.2	Restauración pasiva en areas de conservación asociadas al recurso hídrico del municipio (Aislamiento). (Patrón de costo 1.2.3.1.12)	Ml	1,000	0	100%	0%	100%	$ 27,908	$27,908,000	0.00
2.2 AUMENTO DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL										
2.2.1 Monitoreo y seguimiento de áreas de conservación en predios del municipio en ecosistemas estratégicos										
2.2.2.1	Asistencia técnica Ambiental para el monitoreo de áreas y predios ambientalmente estratégicos a cargo del municipio de Tauramena (Según APU 2.2.2.1)	Und	1	0.083333333	100%	8.3%	92%	$ 465,375,000	$465,375,000	38,781,250.00
2.2.2.2	Materiales e insumos Instalación de parcelas de monitoreo (Según APU 2.2.2.2)	Und	100	100	100%	100.0%	0%	$ 49,000	$4,900,000	4,599,826.00
2.2.2.3	Análisis de muestra en laboratorio (pH, C.E., CIC, Carbón Orgánico, Mat. Orgánica, N-mineral (N-NH4+N-NO3), P, K, Ca, Mg, S, Na, Cl, Al, Relaciones Catiónicas,materia orgánica)	Und	20	0	100%	0.0%	100%	$ 250,000	$5,000,000	0.00

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACION, REHABILITACION, EDUCACION, EXTENSION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1
2.2.2.4	Servicio de Transporte de personal en vehiculo tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Igual a 2021 o superior (Decreto No 0056 de 2024).	Dia	72	6	100%	8.3%	92%	$ 365,750	$26,334,000	2,194,500.00
2.2.2.5	Kit Papelería para monitoreos y seguimiento: (Según APU 2.2.2.5)	Und	1	1	100%	100.0%	0%	$ 1,633,862	$1,633,862	1,630,281.45
								COSTO DIRECTO TOTAL	**$ 2,278,312,952**	**$ 229,910,238**
								SALDO POR EJECUTAR		**$ 2,048,402,714**

JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
Cargo: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - SUPERVISOR


LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL
Cargo: Apoyo a la supervisón del contrato de interventoría No. 292 de 2026

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
SUPERVISIÓN	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)

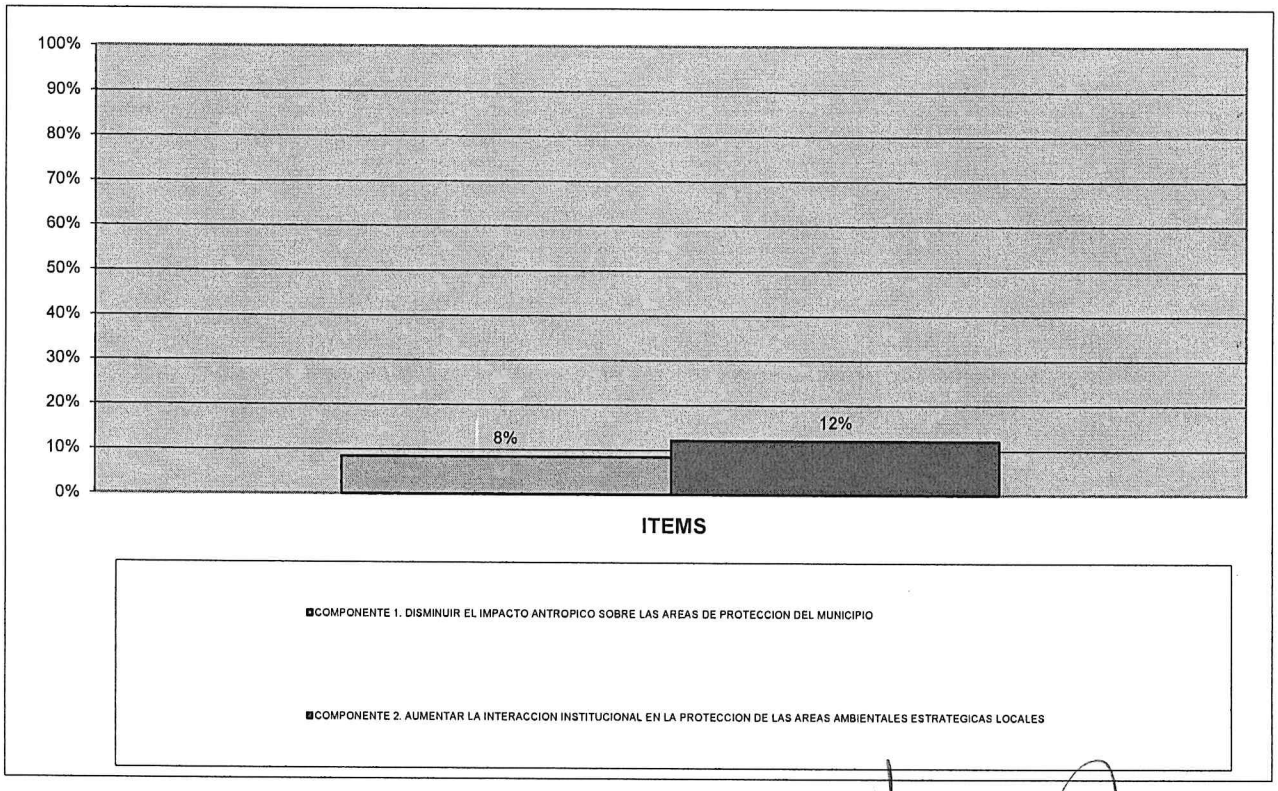

JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
Cargo: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - SUPERVISOR

LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL
Cargo: Apoyo a la supervisón del contrato de interventoría No. 292 de 2026

ANEXO 4

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, EDUCACIÓN, EXTENSIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	AGRICOLA SANTANA DE LOS LLANOS SAS BIC
INTERVENTOR	JUAN CARLOS HERRERA BARRERA - Secretario de Desarrollo Económico
INTERVENTOR	SUMMAS INGENIERIA SAS R/L JOSÉ TOBIAS PULIDO FONSECA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE SUPERVISION
MARZO	1					
	2					
	3					
	4	Revision de Documentos		Cto 272 del 26/03/2026	Seguimiento	
ABRIL	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3			Modificatorio No. 1 al Cto 272 del 2026 del 23/04/2026	Seguimiento	
	4				Seguimiento	
MAYO	1				Seguimiento	
	2			Acta de Inicio 11/05/2026	Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4			Acta de ingreso a almacén No. 1 29/05/2026	Seguimiento	
JUNIO	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4			Acta de ingreso a almacén No. 2 26/06/2026	Seguimiento	Informe Parcial No. 1 Contrato 272/2026
JULIO	1			Acta Parcial No. 1 06/07/2026	Seguimiento	Informe de Interventoría Informe de Supervisión
	2					
	3					
	4					

JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
Cargo: SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - SUPERVISOR

LUIS ALEJANDRO PORRAS SANDOVAL
Cargo: Apoyo a la supervisón del contrato de interventoría No. 292 de 2026
