
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL DATACENTER DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA GCONEXIONES, PANTALLAS, CABLEADO, MATRIZ CONTROLADORA DE VIDEO Y SOFTWARE DE GESTIÓN EN EL CENTRO DE MANDO Y CONTROL AMBIENTAL DE CORMACARENA

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
0		**MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL DATACENTER DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL MET□**	**45 días**	**mié 3/12/25**	**vie 29/05/26**	
1	**1**	**FIRMA DE CONTRATO**	**3 días**	**mié 3/12/25**	**vie 5/12/25**	
2	1.1	FIRMA DE CONTRATO	0 días	mié 3/12/25	mié 3/12/25	
3	1.2	FORMALIZACIÓN DE GARANTIAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA INICIO	3 días	mié 3/12/25	vie 5/12/25	2
4	1.3	FIRMA DE ACTA DE INICIO	0 días	vie 5/12/25	vie 5/12/25	3
5	**2**	**1. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO**	**31 días**	**sáb 6/12/25**	**sáb 16/05/26**	
6	2.1	VISITA DE INSPECCIÓN DE SITIO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (SISTEMA DE DETECCIÓN)	1 día	sáb 6/12/25	sáb 6/12/25	4
7	2.2	DEFINICIÓN Y APROBACIÓN INGENIERÍA INICIAL Y FICHAS TÉCNICAS (SISTEMA DE DETECCIÓN)	1 día	mar 9/12/25	mar 9/12/25	6
8	2.3	ÓRENES DE COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS (SISTEMA DE DETECCIÓN)	1 día	mié 10/12/25	mié 10/12/25	7
9	2.4	ADQUISICIÓN, ENTREGA, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS (SISTEMA DE DETECCIÓN)	5 días	jue 11/12/25	mar 7/04/26	8
10	2.5	MONTAJE, ENSAMBLAJE Y/O INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS (SISTEMA DE DETECCIÓN)	12 días	lun 27/04/26	sáb 9/05/26	9FC+5 días
11	2.6	CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS ACTIVOS (DETECCIÓN DE INCENDIO)	3 días	lun 11/05/26	mié 13/05/26	10
12	2.7	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA (SISTEMA DE DETECCIÓN)	3 días	jue 14/05/26	sáb 16/05/26	11
13	2.8	ENTREGA A SATISFACCIÓN (SISTEMA DE DETECCIÓN)	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	12
14	2.9	FINALIZACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0 días	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	10;9;8;13;12;11;6;7
15	**3**	**1. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO**	**38 días**	**sáb 6/12/25**	**lun 25/05/26**	
16	3.1	VISITA DE INSPECCIÓN DE SITIO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (SISTEMA DE DETECCIÓN)	1 día	sáb 6/12/25	sáb 6/12/25	4
17	3.2	DEFINICIÓN Y APROBACIÓN INGENIERÍA INICIAL Y FICHAS TÉCNICAS (SISTEMA DE DETECCIÓN)	1 día	mar 9/12/25	mar 9/12/25	16
18	3.3	ÓRENES DE COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS (SISTEMA DE DETECCIÓN)	1 día	mié 10/12/25	mié 10/12/25	17
19	3.4	ADQUISICIÓN, ENTREGA, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS (SISTEMA DE DETECCIÓN)	7 días	jue 11/12/25	mié 22/04/26	18
20	3.5	MONTAJE, ENSAMBLAJE Y/O INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS (SISTEMA DE DETECCIÓN)	8 días	lun 11/05/26	mar 19/05/26	19;10



Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
21	3.6	CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS ACTIVOS (DETECCIÓN DE INCENDIO)	2 días	mié 20/05/26	jue 21/05/26	20
22	3.7	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA (SISTEMA DE DETECCIÓN)	3 días	vie 22/05/26	lun 25/05/26	21
23	3.8	ENTREGA A SATISFACCIÓN (SISTEMA DE DETECCIÓN)	0 días	lun 25/05/26	lun 25/05/26	22
24	3.9	FINALIZACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0 días	lun 25/05/26	lun 25/05/26	16;17;18;19;20;21;22;
25	**4**	**TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO**	**4 días**	**mar 26/05/26**	**vie 29/05/26**	
26	4.1	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA E INGENIERÍA FINAL DE LAS SOLCIONES IMPLEMENTADAS	2 días	mar 26/05/26	mié 27/05/26	24;14
27	4.2	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL EN PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	2 días	mar 26/05/26	mié 27/05/26	26CC
28	4.3	ENTREGA Y APROBACIÓN DE INFORME FINAL	2 días	jue 28/05/26	vie 29/05/26	27;26
29	**5**	**CIERRE DEL PROYECTO**	**0 días**	**vie 29/05/26**	**vie 29/05/26**	**28**
30	5.1	ACTA DE FINALIZACIÓN A SATISFACCIÓN E INICIO DEL PERIODO DE LIQUIDACIÓN	0 días	vie 29/05/26	vie 29/05/26	

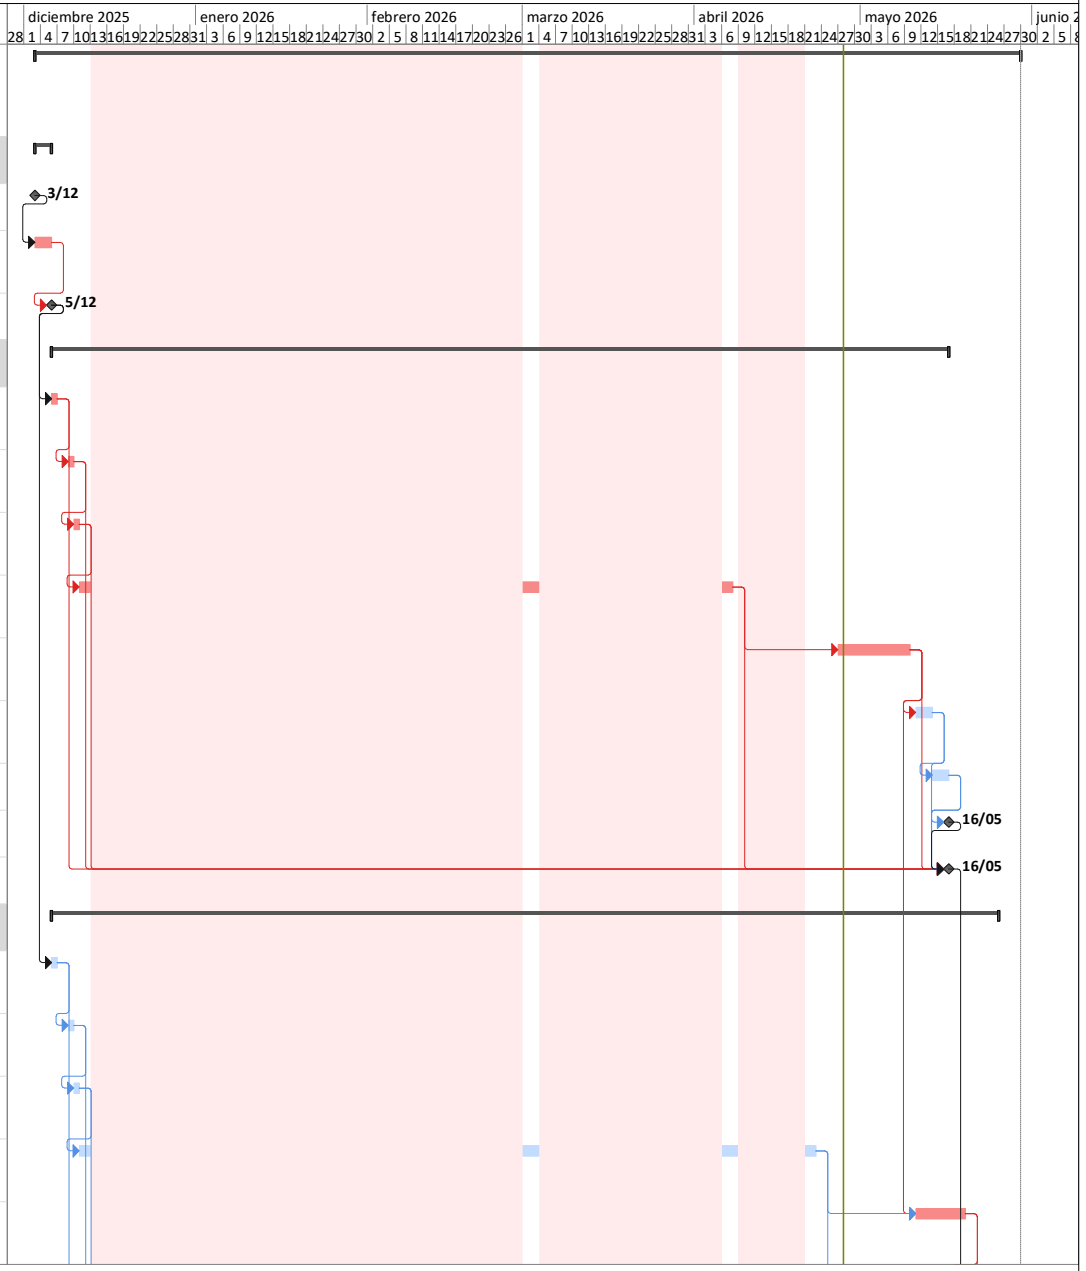

FABIAN GUZMAN SOTO
R.L. Megaproyectos de Tecnología SAS
Contratista Cto. 2433 de 2025
