
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración
1		**SASAIMA**			
2		**VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES**			
3		ENTREGA FINAL ASESOR FUENTES DE MATERIALES		mar 23/06/26	
4		REVISION CONSULTOR	mar 23/06/26	mié 24/06/26	2 días
5		ENTREGA FINAL A INTERVENTORIA		mié 24/06/26	
6		REVISIÓN FINAL DE INTERVENTORIA Y APROBACIÓN	mié 24/06/26	mar 30/06/26	5 días
7		EN CASO DE PRESENTARSE OBSERVACIONES ADICIONALES	mar 30/06/26	mié 1/07/26	2 días
8		REVISION FINAL OBSERVACIONES ADICIONALES	mié 1/07/26	vie 3/07/26	3 días
9		**VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS**			
10		ENTREGA FINAL ASESOR DE ESTRUCTURAS		sáb 20/06/26	
11		REVISION CONSULTOR	sáb 20/06/26	lun 22/06/26	**2 días**
12		ENTREGA FINAL A INTERVENTORIA		mar 23/06/26	
13		REVISIÓN FINAL DE INTERVENTORIA Y APROBACIÓN	mar 23/06/26	lun 29/06/26	**5 días**
14		EN CASO DE PRESENTARSE OBSERVACIONES ADICIONALES	lun 29/06/26	mar 30/06/26	2 días
15		REVISION FINAL OBSERVACIONES ADICIONALES	mar 30/06/26	jue 2/07/26	3 días
16		**VOLUMEN X. ESTUDIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL**			
17		ENTREGA FINAL ASESOR AMBIENTAL		mar 23/06/26	
18		REVISIÓN CONSULTOR	mar 23/06/26	mié 24/06/26	**2 días?**
19		ENTREGA FINAL A INTERVENTORIA		mié 24/06/26	
20		REVISIÓN FINAL DE INTERVENTORIA Y APROBACIÓN	mié 24/06/26	mar 30/06/26	**5 días?**
21		EN CASO DE PRESENTARSE OBSERVACIONES ADICIONALES	mar 30/06/26	mié 1/07/26	2 días?
22		REVISION FINAL OBSERVACIONES ADICIONALES	mié 1/07/26	vie 3/07/26	3 días?
23		**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES**			
24		ENTREGA FINAL ASESOR DE PRESUPUESTO		mar 23/06/26	
25		REVISION CONSULTOR	mar 23/06/26	mié 24/06/26	2 días
26		ENTREGA FINAL A INTERVENTORIA		mié 24/06/26	
27		REVISIÓN FINAL DE INTERVENTORIA Y APROBACIÓN	mié 24/06/26	mar 30/06/26	5 días
28		EN CASO DE PRESENTARSE OBSERVACIONES ADICIONALES	mar 30/06/26	jue 2/07/26	3 días
29		REVISION FINAL OBSERVACIONES ADICIONALES	jue 2/07/26	lun 6/07/26	3 días
30		**INFORME EJECUTIVO**			
31		ENTREGA FINAL DEL INFORME EJECUTIVO		mar 30/06/26	
32		REVISIÓN FINAL DE INTERVENTORIA Y APROBACIÓN	mar 30/06/26	jue 2/07/26	3 días
33		EN CASO DE PRESENTARSE OBSERVACIONES ADICIONALES	jue 2/07/26	lun 6/07/26	3 días
34		REVISION FINAL OBSERVACIONES ADICIONALES	lun 6/07/26	mié 8/07/26	3 días

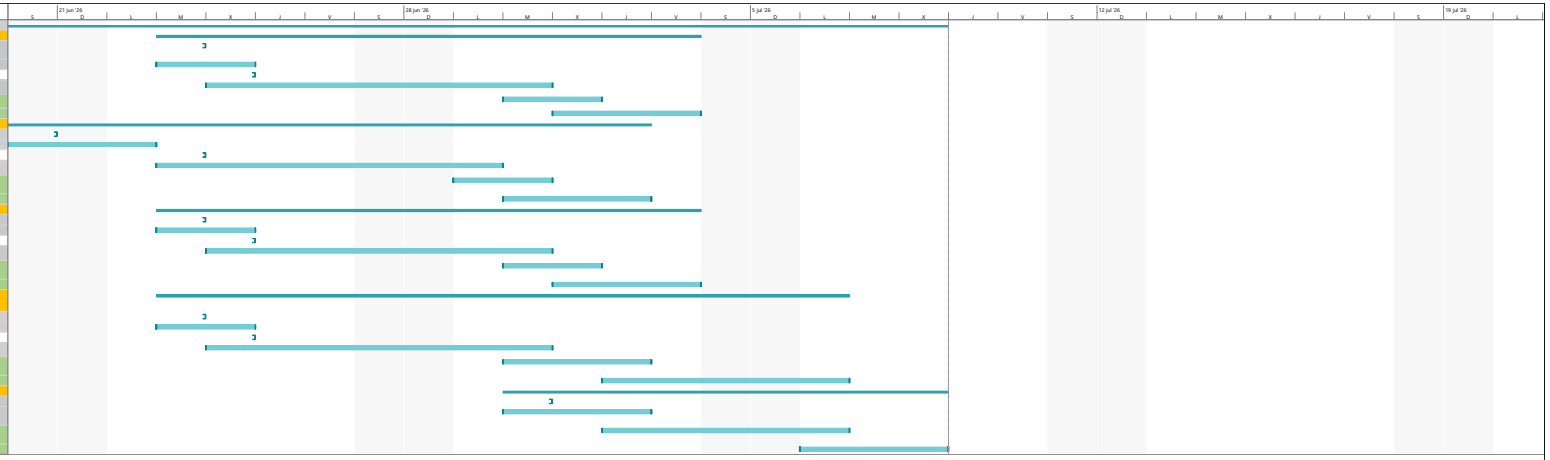

Proyecto: CRONOGRAMA ALPE
Fecha: vie 12/06/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual
