INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO**:

CONTRATO No: COM 023 DE 2020 PROCESO SECOP II MC036 DE 2020

NOMBRE CONTRATISTA: TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEAS SAS.

OBJETO: CONTRATAR A NOMBRE DE LA RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA LA FABRICACION Y SUMINISTRO INCLUYE TRASLADO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN TROPIKOR DE 36 MM, COMO ESCRITORIOS, SILLAS, MESAS DE JUNTAS, ARCHIVADORES Y MUEBLES PARA EXPEDIENTES, ENTRE OTROS, CON DESTINO A LOS JUZGADOS DE LA JURISDICCION PENAL QUE TIENEN ASIENTO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTERIA Y OTRAS DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERIA.

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN**: 15 DÍAS CALENDARIO

3. **PRÓROGAS:** SI: __X__ NO:_____

- El contratista TRANSFORMAMOS solicito una prórroga de la fecha 19 de noviembre de 2020 hasta el 08 de diciembre del 2020, debido a que las materias primas importadas necesarias para la elaboración del mobiliario son referencia especial, por tema de transporte y legalización en la importación sus proveedores han tenido dificultades para cumplir en sus entregas, ocasionando esto demora en el proceso de fabricación.

4. **ADICIONES:** SI: __X__ NO:_____
   - Se ve la necesidad de realizar la adición por valor en la suma de **($42.048.549)** al contrato COM023 DE 2020 correspondiente al proceso en SECOP II No. MC036 DE 2020, para la fabricación y suministro de mobiliario de oficinas como son (escritorios, sillas, mesas de juntas, archivadores, entre otros elementos) ya que el contrato inicial o principal las cantidades solo abarcan unas determinadas unidades, que no cubrían la totalidad de elementos requeridos y habiendo la necesidad y la disponibilidad para realizarlas, se decide adicionarlas. . El valor total ejecutado en la adición fue de **($42.048.549)**
   -

5. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 08/12/2020

6. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $87.284.204,00

7. **VALOR FINAL DEL CONTRATO**: ($129.332.753,00)

8. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO __X

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.

Así mismo se deja constancia en este informe que el contratista ha ejecutado el 100% de dicho contrato, que los elementos entregados cumplieron con las calidades exigidas. Por lo anterior, en mi calidad de supervisor anexo evidencias de lo ejecutando.

Entre los elementos que relaciono aquí son todos para la mejoría de los inmuebles de la rama judicial seccional Monteria, esto con el fin de que se pueda desempeñar jornadas laborales mucho mas cómodas para los servidores judiciales; algunos de estos elementos son (muebles para expedientes, escritorios ejecutivos, sillas interlocutoras, muebles para impresora, escritorios operativos en L, entre otros.







Report
PREMIUM





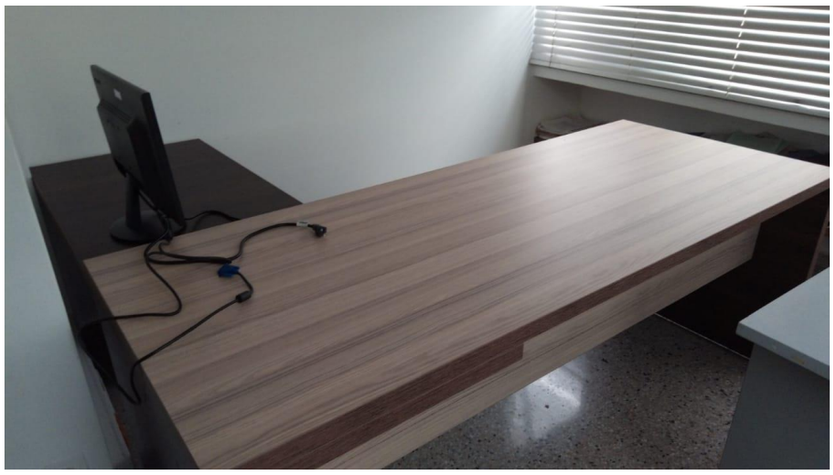



Por lo anterior se firma a los 16 días del mes de diciembre de 2020.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MAYRA GARCES GONZALEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE DE ALMACEN E INVENTARIOS

FIRMA DEL SUPERVISOR:

