
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Predecesoras	Sucesoras	Duración	Comienzo	Fin
1		**Proyecto 2025**			**99 días**	**vie 3/07/26**	**mié 18/11/26**
2		**Demolición Realizar la demolición del edificio de la Calle 85 No. 11-96**					
3		Firma Acta de Inicio		7;19;20	1 día	vie 3/07/26	vie 3/07/26
4		**PRELIMINARES**			**0 días**	**vie 3/07/26**	**vie 3/07/26**
5		Provisión para pago de tarifas, tasas y/o expensas relacionadas con licencias y permisos de demolicion y cerramiento.Corresponde a los valores destinados a cubrir los costos asociados a la tramitación y obtención de licencias y permisos requeridos para la		6	0 días	vie 3/07/26	vie 3/07/26
6		El cerramiento	5	9	3 días	vie 3/07/26	mar 7/07/26
7		Señalización	3	9	1 día	vie 3/07/26	vie 3/07/26
8		**DESMONTE**			**7 días**	**lun 6/07/26**	**mar 14/07/26**
9		Desmonte de equipos	6;7	11	7 días	vie 3/07/26	lun 13/07/26
10		**DEMOLICIÓN**			**92 días**	**lun 13/07/26**	**mié 18/11/26**
11		Demolición Piso 7	9	12	17 días	lun 13/07/26	mié 5/08/26
12		Demolición Piso 6	11	13	16 días	mié 5/08/26	jue 27/08/26
13		Demolición Piso 5	12	14	14 días	jue 27/08/26	mié 16/09/26
14		Demolición Piso 4	13	15	14 días	mié 16/09/26	mar 6/10/26
15		Demolición Piso 3	14	16	11 días	mar 6/10/26	mié 21/10/26
16		Demolición Piso 2	15	17	10 días	mié 21/10/26	mié 4/11/26
17		Demolición Piso 1	16	18	5 días	mié 4/11/26	mié 11/11/26
18		cerramiento provisional	17	21	5 días	mié 11/11/26	mié 18/11/26
19		PMA (incluye programas, señalización e implementación)	3	21	99 días	vie 3/07/26	mié 18/11/26
20		PMT (incluye programas, señalización e implementación)	3	21	99 días	vie 3/07/26	mié 18/11/26
21		FIN	18;19;20		99 días	vie 3/07/26	mié 18/11/26

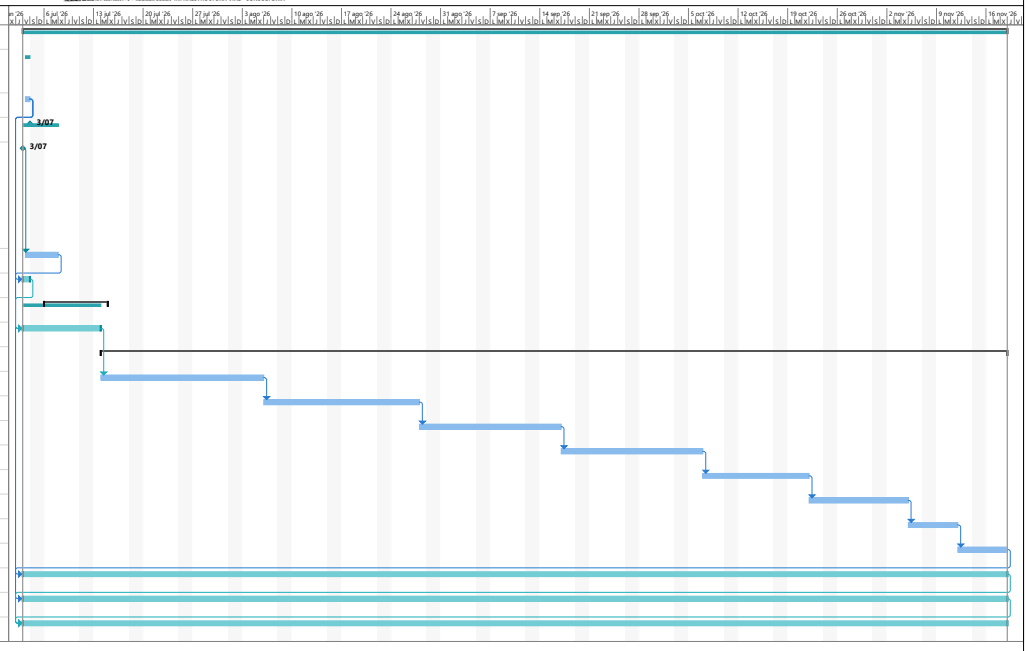

Rama Judicial – Dirección
Ciudad
Atn.: Arq.Piñeros
Supervisor contrato de ob

Referencia: Realizar la de

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | solo el comienzo | Tareas externas | Fecha límite | Progreso manual
División | Resumen | Tarea inactiva | Resumen inactivo | solo duración | Resumen manual | solo fin | Hito externo | Progreso
