COMITÉ TÉCNICO 03
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 902-2025
PROGRAMA ACTIVA TU NEGOCIO CON CUPÓN

Objeto: Contratar la prestación de servicios para la administración y asignación de los recursos destinados para procesos de sofisticación e innovación de las empresas beneficiarias de la SDDE
Inicio : 26/08/2025 Finalización : 31/12/2025


Noviembre 26 2025

Activa tu negocio con Cupón

AGENDA PROPUESTA

1. Estado fases en ejecución - Metodologías
2. Seguimiento Cronograma
3. Solicitud de prórroga
4. Presentación de las metodologías
5. Aspectos Financieros Administrativos - Adición 01
6. Estado de las Actas
7. Varios

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

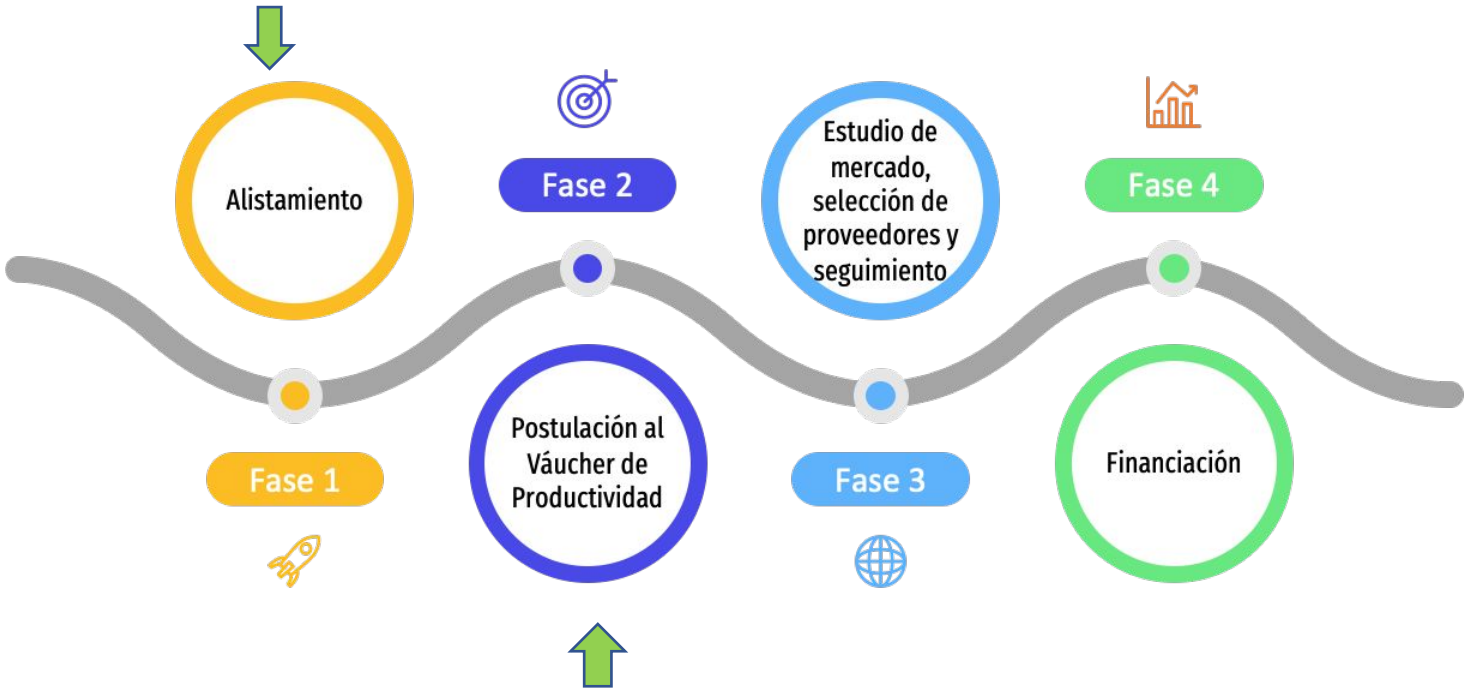

Fases en ejecución

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN



PRODUCTOS ENTREGABLES

1. Plan de Trabajo y Cronograma para la ejecución del proyecto. Cumplido
2. Diseñar la metodología general – En Ajustes Operador
3. Documento que contenga la estructura de la herramienta tecnológica Cumplido
4. Prototipo Herramienta Cumplido

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN



PRODUCTOS ENTREGABLES

5. Documento con TDR y anexos- Cumplido
6. Formulario de postulación en línea. Cumplido
7. Repositorio digital con su lista de chequeo Por entregar a SDDE
8. Documento de evaluación del Plan de Inversión de Productividad de cada una de las empresas Formato definido y se está aplicado en consultoría, hace parte de la metodología del ítem 9
9. Documento que contenga la metodología de la asistencia técnica de la evaluación de los ítems de los Planes de Inversión de Productividad. En Aprobación
10. Soporte de la asistencia técnica realizada conforme a los lineamientos establecidos por la SDDE. Formato definido hace parte de la metodología del ítem 9

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

PRODUCTOS ENTREGABLES



11. Listado de las 454 empresas beneficiarias que han aprobado el PIP, así como, la evidencia de su aprobación. Cumplido por entregar producto

12. 454 planes de inversión de productividad Cumplido por entregar producto
13. Manual de uso de la herramienta tecnológica y Manual de despliegue y configuración. En Ajustes finales

14.Código Fuente de la herramienta tecnológica y proceso de catalogación en el repositorio de la SDDE. Entregado

15. Producto 15. Puesta en producción de la herramienta sistematizada de seguimiento y control en donde se evidencie los indicadores y resultados del programa en tiempo real, el informe de pruebas realizadas. Así como, la transferencia de conocimiento de la implementación de la solución a nivel general. En ejecución se tiene previsto el cargue de la información de las empresas elegidas para despliegue de indicadores y seguimiento al proceso con las empresas - Entregado

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

BASES DE DATOS SDDE GESTIONADAS PARA POSTULACIONES

BD Inicial CuPón

Estado gestión	Número
Se envia link de inscripción	229
Postulado	131
No contactado	108
No interesado	74
Contesta tercero	19
Linea fuera de servicio	18
Llamar más tarde	16
No cumple requisitos programa	10
Linea errada	6
Total general	**611**

BD DIME Mayor 2.5

Estado gestión	Número
No cumple requisitos programa	119
Postulado	74
Se envia link de inscripción	41
No contactado	14
Linea fuera de servicio	4
No interesado	4
Linea errada	1
Total general	257

BD Obras


Estados de gestión	Número
SE ENVIA LINK DE LA PAGINA	101
POSTULADO	46
No contactado	7
REPETIDO	6
Contesta tercero	6
Linea Fuera de Servicio	5
ORGANIZANDO DOCUMENTACION	1
NO INTERESADO	1
(en blanco)	
Total general	**173**

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

BD OPERADOR Y REPOSTEO EN REDES

BD Cámara de Comercio

Estado de gestión	Número
Se envia link de inscripción	359
No contactado	353
No interesado	98
Linea fuera de servicio	45
No cumple	29
Linea errada	21
Llamar mas tarde	16
postulado	15
Contesta terceros	8
No autoriza contacto	4
Total general	**948**



Fase 2

Postulación al Váucher de Productividad

OPCIÓN #1 POST IG-FB-LINKEDIN

¿Tienes una mypime en Bogotá y buscas cofinanciación?
Si tu respuesta es sí, "Cupón" es para ti.

Desde Tecnalia Colombia, como operadores de este proyecto de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, te invitamos a conocer el nuevo programa con el cual podrás recibir hasta $10.000.000 en bienes y servicios para impulsar la productividad y la innovación de tu empresa.

👉 Postúlate en https://desarrolloeconomico.gov.co/cupon/

#AquíSíPasa — En Bogotá, mi ciudad, mi casa, apoyamos el crecimiento empresarial.



LinkedIn



https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7384671737310834688

Facebook



https://www.facebook.com/share/p/1GxUSRrEwu/

Instagram



https://www.instagram.com/p/DP4cYz
igsh=MXZ0ZnFmYzV6bXAydQ==

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

ESTADO POSTULACIÓN EMPRESAS - CIFRAS CORTE A 26 NOVIEMBRE (10:00 AM)

TOTAL POSTULACIONES	867	Han Cumplido Requisito
Elegibles	454	454
Cumplen Requsitos para seleccionados (Lista 11 Operador)	33	33
En subsanaciones	60	
Control DIME SDDE - En revisión puntaje	4	
Control DIME SDDE - Revisar con otra dirección	2	
Cumple requitos en Listas Analizadas-En revisión SDDE	8	8
En revisión Equipo postulaciones	5	
Cumple requitos No Publicado en elegibles Lista No.7	3	4
Cumple requitos Ya había sido elegida en Lista No.5 pero no se Publicó en elegibles Lista No.7	1	1
Control DIME SDDE- NO se revisan habilitantes	55	
Cumplen Requisitos - Retiradas en Revisión de Listas o Procesos validaciones internos SDDE	34	34
No cumple persona natural	158	
No Cumple habilitante 1-DIME nivel Nacimiento	11	
No Cumple habilitante 2-Antiguedad mínima 12 meses	20	
No Cumple habilitante 2-Domicilio principal NO es Bogotá	7	
No Cumple habilitante 3-Empresa tamaño Grande	3	
No Cumple habilitante 4-Esta incurso en procesos de liquidación	1	
No Cumple habilitante 5-No demostro ventas activas en los últimos 12 meses	4	
No valido por doble postulación	4	
	867	534

Empresas Potenciales a seleccionadas	
Las que cumplen Lista 11	33
En subsanaciones	60
En revisión SDDE	14
En Revision Equipo de postulaciones	5
Las no publicadas como Elegibles	3
	115

	Subsanaciones					
	RH1 DIME	RH2 RH3 CEyrL	RH4 AVAL	RH5 VENTAS	RH6 PIP	RH7 SARLAFT
Total habilitantes	33	22	14	31	14	20
Un habilitante (Están en el total)	3			7	1	1

Fase 2

Postulación a Váucher de Productividad

Activa tu negocio con Cupón

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

454 Empresas Elegidas

EVALUACIÓN DE PIP

454 PIPS Evaluados
398 PIPS Aprobados

ASISTENCIAS TÉCNICAS

Realizadas 101


En proceso acorde la Metodología de Asistencias Técnicas

Fase 2

Postulación al Váucher de Productividad

Activa tu negocio con Cupón

2- CRONOGRAMA

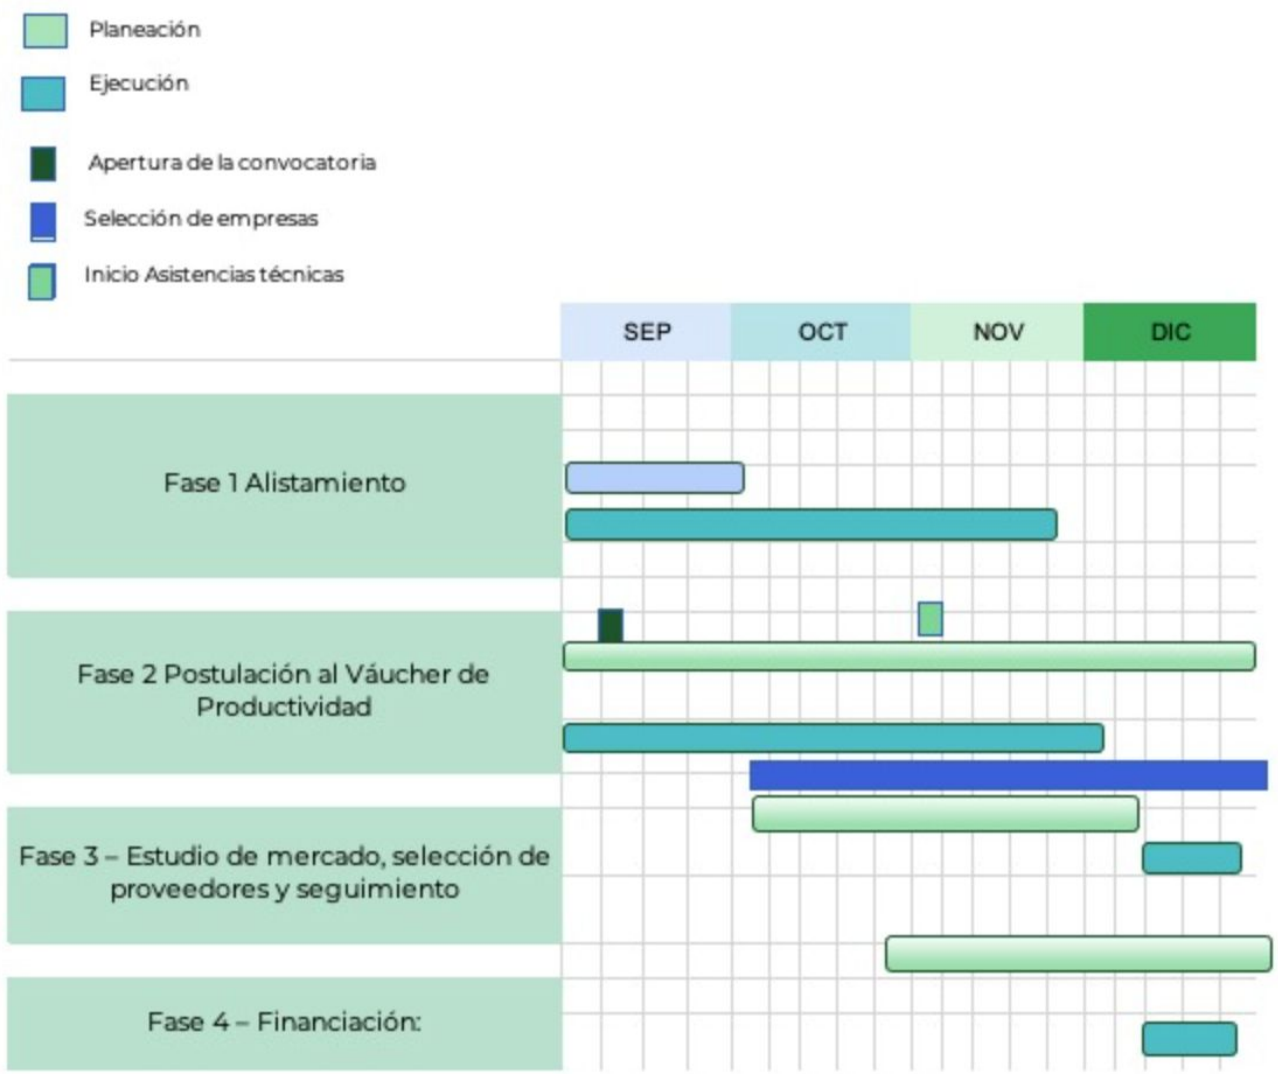

Fase 2

Postulación al Váucher de Productividad

Activa tu negocio con Cupón

3-SOLICITUD DE PRÓRROGA

Teniendo en cuenta el proceso en la selección de las empresas beneficiarias en el programa “Activa Tu Cupón” y de acuerdo a la adición en recursos realizado en el mes de noviembre aumentando las empresas beneficiarias en 108 para un total de 562, se realizó la siguiente solicitud:

- **Solicitud de Prórroga**
- **Tiempo: 4 meses**
- **Fecha de solicitud: Noviembre 12 de 2025 mediante oficio OF-902-003-2025**
- **Estado: Pendiente de respuesta.**

El comunicado enviado via correo electronico, adicional se relacionan las razones por las cuales se solicita la prórroga, con el fin dee culminar satisfactoriamente las actividades contratadas.

4-METODOLOGÍAS



5-ASPECTOS FINANCIEROS - ESTADO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS - DESEMBOLSOS

PRIMER DESEMBOLSO
OPERACIÓN BOLSA ESTRATÉGICA

- **Informe al 17-09-2025 Entregado**
- **Productos 1, 2 y 3 Cumplidos**

PRIMER PAGO: Por valor de **TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($329.586.169),**
correspondiente al 20% del valor de la operación estratégica del programa, previa presentación y recibo a satisfacción por parte del supervisor de la SDDE de los productos:

Producto 1. Documento que contenga el Plan de trabajo y Cronograma del programa que incluya las herramientas de seguimiento y control a los beneficiarios, proveedores y calidad de los bienes y servicios a entregar mediante los Váuchers de Productividad. Asimismo, el cronograma deberá ser estructurado por fases y semanas de acuerdo con la fecha de inicio y la fecha de finalización del contrato.

Producto 3. Documento que contenga la estructura de la herramienta tecnológica de seguimiento, que debe contener:

Recolección de requerimientos funcionales y no funcionales.

- Diseñar los casos de uso de la herramienta tecnológica.
- La Arquitectura de solución.
- Las integraciones (si la aplicación lo requiere).
- El plan de dimensionamiento de capacidad.
- La definición de Sprints (actividades, tiempo total, fecha de inicio y fin) para el abordaje de cada una de las actividades del producto.
- El plan de pruebas.
- El diccionario de datos de la Base de datos.
- Matriz de gestión de riesgos.
- Especificaciones técnicas necesarias para despliegue.
- Diseño detallado de la solución y demás ítems que el contratista considere necesario.

Producto 4. Un prototipo que defina las funcionalidades esenciales de la herramienta tecnológica.

Activa tu negocio con Cupón

5-ASPECTOS FINANCIEROS ESTADO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS - DESEMBOLSOS

SEGUNDO PAGO: Por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($494.379.253)
correspondiente al 30% del valor de la operación estratégica del programa, previa presentación y recibo a satisfacción por parte del supervisor de la SDDE de los productos:

Producto 2. Documento que contenga la metodología para:
● Selección de los beneficiarios (tener en cuenta los requisitos del numeral 2.4 de este documento). El contratista deberá garantizar que las empresas a beneficiar con los Váucher de Productividad cumplan con los requisitos establecidos por la SDDE.
● Selección de proveedores de servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación o de aquellos que permitan el aumento de la productividad empresarial.
● Administración, asignación, desembolso y transferencia de recursos.
● Manejo y deserción de las empresas beneficiarias de la Estrategia Bogotá Productiva Innovadora.
● Propuesta de evento de cierre del programa.
● Realizar las visitas de verificación de uso de bienes y servicios suministrados a las empresas beneficiarias, así como, el cuestionario de apoyo para estas.
Producto 5. Documento con los términos de referencia que incluya: el formulario de inscripción, la especificación de los soportes requeridos para el cumplimiento de requisitos mínimos y criterios y el formato del PIP con la propuesta de evaluación.
Producto 6. Formulario de postulación en línea.
Producto 7. Repositorio digital con su lista de chequeo de la verificación realizada por el contratista a cada una de las empresas postuladas mediante el formulario.
Producto 8. Documento de evaluación del plan de inversión de productividad de cada una de las empresas.
Producto 9. Documento que contenga la metodología de la asistencia técnica de la evaluación de los ítems de los Planes de Inversión de Productividad.
Producto 11. Listado de las 454 empresas beneficiarias que han aprobado el PIP, así como, la evidencia de su aprobación.
Producto 13. Manual de uso de la herramienta tecnológica y Manual de despliegue y configuración

Activa tu negocio con Cupón

5-ASPECTOS FINANCIEROS ESTADO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS - DESEMBOLSOS

Producto 14. Código Fuente de la herramienta tecnológica y proceso de catalogación en el repositorio de la SDDE.
Producto 15. Puesta en producción de la herramienta sistematizada de seguimiento y control en donde se evidencie los indicadores y resultados del programa en tiempo real, el informe de pruebas realizadas. Así como, la transferencia de conocimiento de la implementación de la solución a nivel general.

Nota: Las metodologías deberán ser aprobadas en comité técnico por el supervisor del contrato, conforme a los lineamientos impartidos por la SDDE al inicio de la ejecución de este.

Activa tu negocio con Cupón

6-ESTADO ACTAS

- Acta de inicio ejecución proyecto - 28-Ago-2025 – Formalizada entre las partes
- Acta comité técnico 01-Formalizada
- Acta comité técnico 02-En formalización

6-ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS - DESEMBOLSO PRESUPUESTO VOUCHERS

DESEMBOLSO RECURSOS VOUCHERS - ACTIVA TU CUPÓN

Una vez dado el cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente, se realizó el proceso para la radicación del desembolso de los recursos de los vouchers:

- **Cumplimiento de entregables contractuales**
- **Radicación de cuenta de cobro No 1 y documentos soportes requeridos**
- **Cargue de documentos en SECOP II**
- **Ingreso de los recursos a la cuenta del proyecto por valor de $4.540.000.000**

ADICIÓN DE RECURSOS PROGRAMA ACTIVA TU CUPÓN

Se realizó adición de recursos del programa de acuerdo con lo establecido en la solicitud enviada por Tecnalia, ampliando el número de empresas beneficiarias:

- **Fecha de solicitud: Septiembre 30 de 2025**
- **Empresas Beneficiarias: 562**
- **Total adicion de recursos: $1.477.314.891**
- **Estado: Aprobado**

6-ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS - ADICIÓN 01

- Estado adición al contrato 902 del 2025
-

8-VARIOS

Activa tu negocio con Cupón

Estado prospección	Postulado
Etiquetas de fila	**Cuenta de 2**
Cumple Requisitos - Elegible	83
En subsanación empresa Por ade	6
Cumple Requisitos - Pasa a Selec	6
Cumple Requisitos - Por Adenda (	6
No Cumple habilitante 2-Antigueda	5
Cumple Requisitos - Elegible Aden	5
Cumple Requisitos - Pasa a Selec	3
Cumple Requisitos - Retirada SDI	2
Cumple requisitos	2
No Cumple habilitante 3-Empresa t	2
En subsanación empresa	1
Cumple Requisitos - Elegibe - En	1
Control DIME SDDE en Análisis pu	1
Control DIME SDDE NO - Sin Revi	1
Cumple Requitos - Por adenda 02	1
Cumple Requisitos - Elegibe - En	1
Cumple requisitos - Pasa a selec	1
Cumple Requisitos - Retirada Cor	1
Cumple Requisitos - Retirada SDI	1
Cumple Requisitos - Elegibe - Es	1
Cumple Requisitos - Elegibe - Ge	1
Total general	**131**

Activa tu negocio con Cupón
