COMITÉ TÉCNICO 05
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 902-2025
PROGRAMA ACTIVA TU NEGOCIO CON CUPÓN


Objeto: Contratar la prestación de servicios para la administración y asignación de los recursos destinados para procesos de sofisticación e innovación de las empresas beneficiarias de la SDDE
Inicio : 26/08/2025 Finalización : 26/04/2026

Febrero 27 de 2026

1-AGENDA PROPUESTA

1. Estado fases
2. Evento
3. Estado obligaciones específicas
4. Aspectos Financieros Administrativos - Adición 01
5. Aspectos Financieros Administrativos - Adición 02 y Prórroga
6. Estado Actas
7. Varios

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

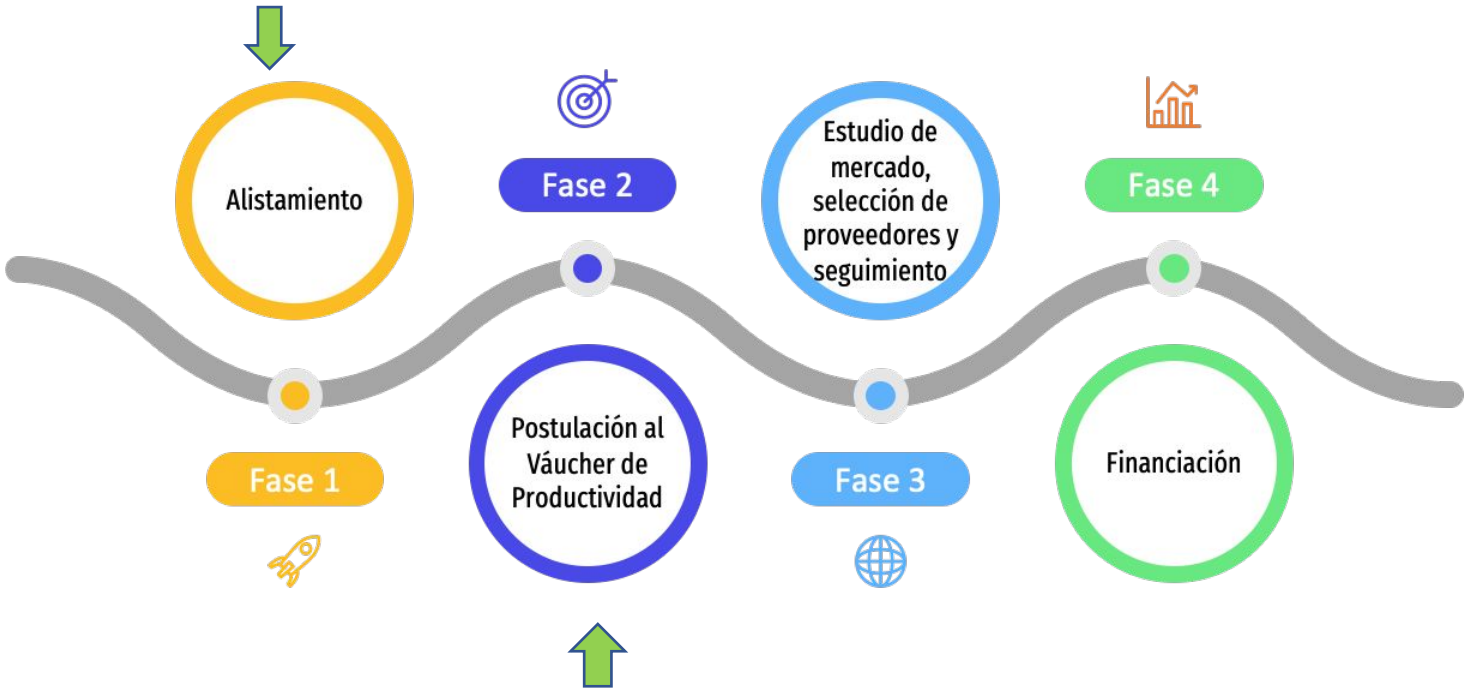

Fases en ejecución

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

EMPRESAS PROGRAMA

META	**108**	**571**	**679**
	OBRAS	**TRADICIONAL**	
Elegidas	**97**	**566**	**663**
Faltan por elegir	11	5	**16**
Cumple requisitos	3	12	
En subsanación	2	10	
Control DIME SDDE en Análisis puntaje - Sin Revisar habilitantes	0	5	

Activa tu negocio con Cupón

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN *

BASES DE DATOS SDDE GESTIONADAS PARA POSTULACIONES

BD Inicial CuPón

GESTIÓN BD PROSPECCIÓN INICIAL	
Se envia link de inscripción	240
Postulado	148
No contactado	126
No interesado	77
Linea fuera de servicio/ errada/ equ	26
No cumple requisitos programa	11
	0
Suma total	**628**

BD DIME Mayor 2.5

GESTIÓN BD DIME	
No cumple requisitos programa	118
Postulado	84
Se envia link de inscripción	33
No contactado	10
No interesado	6
Linea fuera de servicio	6
Suma total	**257**

BD Obras

GESTIÓN BD OBRAS	
DICEN QUE ESTAN POSTULADOS	6
linea errada	2
No contactado	26
No cumple requisitos	6
NO INTERESADO	20
ORGANIZANDO DOCUMENTACION	17
POSTULADO	156
Suma total	**233**

Fase 2

Postulación al Váucher de Productividad

Activa tu negocio con Cupón

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN


BD OPERADOR Y REPOSTEO EN REDES


BD Cámara de Comercio

GESTIÓN BD CAMARA DE COMERCIO	
No contactado	398
Se envia link de inscripción	294
No interesado	117
Linea errada/fuera de servicio	69
No cumple	42
postulado	23
ORGANIZANDO DOCUMENTACION	4
No autoriza contacto	4
Suma total	**951**

Fase 2

Postulación al Váucher de Productividad

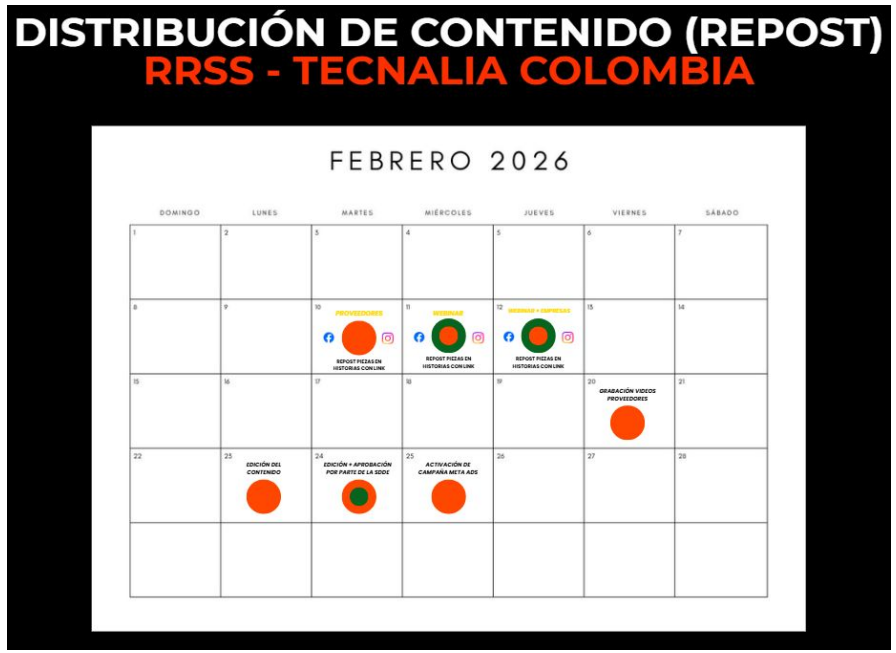











1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

663 EMPRESAS ELEGIDAS EN PROCESO CONSULTORÍA

EVALUACIÓN DE PIP

594 PIPS Evaluados
594 PIPS Enviados a empresas
540 PIPS Aprobados por empresas

ASISTENCIAS TÉCNICAS

590 Agendadas
163 Reagendadas
256 Asistencias técnicas y PIPS Aprobados por empresas

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN MEDICIÓN ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD

594 Correos enviados a empresas elegidas solicitando diligenciamiento del formato indicado por la SDDE

Activa tu negocio con Cupón

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

PROCESO PROVEEDORES

- Se cuenta con el micrositio y formulario postulación https://tecnaliacolombia.org/postulacion-de-proveedores-activa-tu-cupon/#register-form
- TRD convocatoria abierta 8 de enero
- Comunicados a proveedores del banco de oferentes SDDE- 8 de enero
- Proceso operativo ajustado (Banco de oferentes y Externos)
- Refuerzo llamadas telefónicas a proveedores 23 de enero
- Ficha Técnica-Bolsa de bienes y/o servicios demandados en constante actualización



1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

663 EMPRESAS ELEGIDAS PROCESO CONSULTORÍA

ACUERDOS DE SERVICIOS GENERADOS

390 Acuerdos generados
297 Firmados empresas
266 Firmados entre las partes

ASISTENCIAS TÉCNICAS

610 Agendadas
301 Reagendadas
390 Asistencias técnicas y PIPS Aprobados por empresas

RECOLECCIÓN INFORMACIÓN MEDICIÓN ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD

594 Correos enviados a empresas elegidas solicitando diligenciamiento del formato indicado por la SDDE

Activa tu negocio con Cupón

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

PROCESO PROVEEDORES

- Se cuenta con el micrositio y formulario postulación https://tecnaliacolombia.org/postulacion-de-proveedores-activa-tu-cupon/#register-form
- TRD convocatoria abierta 8 de enero
- Comunicados a proveedores del banco de oferentes SDDE- 8 de enero
- Proceso operativo ajustado (Banco de oferentes y Externos)
- Refuerzo llamadas telefónicas a proveedores bolsa oferentes
- Ficha Técnica-Bolsa de bienes y/o servicios demandados en constante actualización
- Correos directos a proveedores registrados 275
- Verificación y contacto proveedores de cotizaciones compartidas por empresas

Estudio de mercado, selección de proveedores y seguimiento

Fase 3

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

PROVEEDORES

CONSECUCION DE PROVEEDORES PARA BENEFEICIARIOS											
		feb-27	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	MARZO	
DIA			2	3	4	5	6	9	10	11	TOTAL
NUMERO DE EMPRESAS BENEFICIARIOS POR DIA		79	75	75	75	75	75	75	75	75	679
EQUIPO CONTACTABILIDAD SERVICIOS	SERVICIOS		40	40	40	40	40	40	40	40	
EQUIPO CONTACTABILIDAD BIENES	BIENES		20	20	20	20	20	20	20	20	
EQUIPO PRESENCIAL	BIENES		15	15	15	15	15	15	15	15	

INFORMACIÓN PROCESO PROVEEDURIA	TOTALES 02/26	TOTALES 02/27
Número de cotizaciones recibidas en total	539	551
Numero de cotizaciones - Bienes	83	83
Numero de cotizaciones - Servicios	456	468
Número de cotizaciones recibidas por parte de los proveedores del Banco de Oferentes de la SDDE.	204	205
Número de cotizaciones recibidas por parte de los proveedores externos.	335	346
Número de Empresas beneficiarias con 3 cotizaciones y Listado de las empresas (Razón social y NIT).	79	83
Número de Empresas beneficiarias con 2 cotizaciones y Listado de las empresas(Razón social y NIT).	15	15
Número de Empresas beneficiarias en proceso de formalización acuerdos de calidad y Listado de las empresas (Razón social y NIT).	77	82
Número de Empresas beneficiaria en evaluación	2	1

Estudio de mercado, selección de proveedores y seguimiento


Fase 3

1-ESTADO FASES EN EJECUCIÓN

Generación de Contenido para Campaña Meta Ads | Adquisición de Proveedores

Video corto:



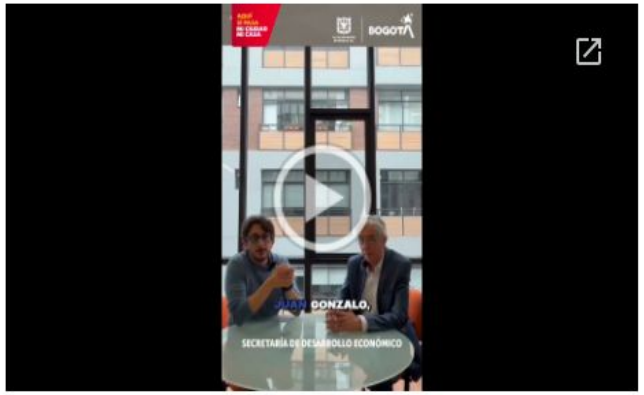

Video largo:

Información del rendimiento

Clientes potenciales (formulario)

146

27/02/26

Resultados preliminares (48h):

+140 proveedores registrados vía formulario.

- **Siguiente paso:**
  Entrega de base de datos consolidada para gestión comercial uno a uno.

- **Producción y gestión:**
  Grabación, edición y aprobación SDDE de 2 piezas en video (54s y 1:55).
- **Activación:**
  Campaña Meta Ads | 25 feb – 2 mar
- **Objetivo:**
  Captación de leads calificados (proveedores potenciales) para contacto y vinculación por parte de Tecnalia Colombia.

2-EVENTO

- **Lunes 23 de febrero:** reunión de alistamiento del *Evento Cupón* entre **SDDE** y **TECNALIA Colombia** para definir lineamientos y forma de proceder.
- Socialización del **brief** y revisión de la agenda prevista junto al alcalde.
- Se acordó como compromiso clave la **grabación de testimonios en vivo de participantes**, recogiendo sus percepciones y experiencias durante el evento (TC) + apoyo en la logística (registro y toma de asistencia).
- La **convocatoria** se desarrollará de manera conjunta, reafirmando el trabajo articulado y el compromiso de ambas entidades para el éxito del evento.

A la espera de lineamientos para avanzar, con el respaldo y apoyo permanente de Tecnalia Colombia.

Activa tu negocio con Cupón

3-ESTADO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

	Estado Feb-27-2026
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio del contrato.	Cumplida
2. Cumplir de manera integral con cada una de las fases y su desarrollo, conforme lo establecido en el pliego de condiciones y en la propuesta, documentos que hacen parte integral del contrato.	Permanente
3. Elaborar y hacer seguimiento al Plan de Trabajo y Cronograma para la ejecución del presente contrato, que deberá ser allegado a la SDDE los diez (10) días calendario después de iniciar el contrato de prestación de servicios.	Permanente
4. Hacer entrega del formato diligenciado con la información requerida del equipo de trabajo consolidado para la ejecución del contrato, con sus respectivos soportes de acuerdo con los lineamientos de la SDDE.	Solicitud cambio Coordinador Administrativo , se dió alcance complementando los documentos solicitados por la SDDE
5. Dar apertura a una convocatoria y seleccionar las 679 empresas beneficiarias que recibirán el beneficio de los Váucher de Productividad de acuerdo con los requisitos mínimos y los criterios descritos en los Términos de Referencia de la convocatoria.	Cumplida clausulado inicial 454 Empresas. de las empresas adicionadas 225 se cuenta con 117 empresas seleccionadas elegibles
6. Revisar y verificar que la documentación cargada por las empresas postulantes cumpla con los requisitos y criterios establecidos para la participación en el programa.	En proceso
7. Revisar y evaluar cada uno de los Planes de Inversión de Productividad-PIP aportados por las empresas en el marco de la convocatoria, para la implementación de los Váuchers de Productividad, de acuerdo con los lineamientos entregados por la SDDE.	En proceso
8. Brindar asistencia técnica entre 1 y 4 horas, a cada una de las empresas de acuerdo con los resultados de la evaluación de los Planes de Inversión de Productividad-PIP.	En proceso
9. Realizar la recolección de información para la medición del Índice de Productividad en la herramienta entregada por la SDDE. Esta información deberá ser recolectada al inicio y al final de la intervención.	En proceso
10. Cotizar los servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación con base en los proveedores y de acuerdo con la directriz de la SDDE, la metodología y los Planes de Inversión- PIP.	En proceso
11. Gestionar y desembolsar los recursos asociados a los Planes de Inversión de Productividad de los acuerdos de servicios firmados.	En proceso
12. Abrir una cuenta bancaria de ahorros para el manejo exclusivo de los recursos de la bolsa para la implementación de los Váucher de Productividad de acuerdo con lo descrito en los PIP.	Cumplida
13. Administrar, asignar y transferir todos los recursos de la bolsa, exclusivamente a las actividades relacionadas con la finalidad del contrato y a los proveedores servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación o de aquellos que permitan el aumento de la productividad empresarial seleccionados para la implementación de los Váucher de Productividad.	En proceso
14. Realizar el levantamiento de información SUIM (Sistema Único de Información Misional de la SDDE) de acuerdo con los lineamientos y formatos entregados por la SDDE.	No iniciada
15. Remitir un Informe que contenga el reporte de la selección del 100% de las empresas que recibirán el beneficio del Váucher de Productividad, su caracterización, el análisis de la revisión de los Planes de Inversión de Productividad aportados por las empresas en el marco de la convocatoria.	No iniciada

Activa tu negocio con Cupón

3-ESTADO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

16. Remitir mensualmente diligenciado y firmado, a más tardar el día diez (10) de cada mes, el formato de ejecución GCR-P1-F7 o la versión actualizada de la SDDE de la ejecución del contrato. En caso de ser un día no hábil, se deberá allegar a más tardar el día hábil siguiente.	Entregados Informes: -Agosto 2025 -Septiembre 2025 -Octubre 2025 -Noviembre 2025 -Diciembre 2025 -Enero 2026
17. Remitir mensualmente diligenciado y firmado, a más tardar el día siete (07) de cada mes, el formato de ejecución financiera GF-P7-F2v3 o la versión actualizada de la SDDE de los gastos realizados asociados a la bolsa de recursos del contrato. En caso de ser un día no hábil, se deberá allegar a más tardar el día hábil siguiente. Este informe debe ser entregado junto con el informe de ejecución financiera desagregada mensual	Entregado informe mes de noviembre 2025 Entregado informe mes de diciembre 2025 Entregado informe mes enero 2026
18. Reintegrar los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de ahorros donde se desembolsarán los recursos económicos de la bolsa, a más tardar el día tres (03) de cada mes, de acuerdo con lo previsto en la norma que aplica a entidades del Distrito y que conforman el Estatuto Orgánico del presupuesto Distrital. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Operativo Contable de la SDDE.	Entregados rendimietos mes de noviembre 2025
19. Realizar y presentar un informe de ejecución financiera desagregada mensual de la bolsa de recursos para la implementación de los Váucher de Productividad, con sus respectivos soportes en el cual se detallen los desembolsos realizados. Estos deberán ser entregados junto con el formato de ejecución financiera GF-P7-F2v3 o la versión actualizada de la SDDE.	No iniciada
20. Realizar un informe final técnico y administrativo en el formato que la SDDE disponga para tal fin.	No iniciada
21. Realizar un informe financiero final desagregado del contrato en el cual se detallen los desembolsos de la bolsa realizados desde el inicio hasta su terminación.	No iniciada
22. Autorizar a la SDDE el acceso, manejo y conservación de la información suministrada con la debida protección de la reserva de la información, según la normatividad aplicable al caso.	Cumplida
23. Cumplir con la política de tratamiento de datos Ley 1581 de 2012 y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen.	Cumplida
24. Ejercer el rol de secretaría técnica del contrato.	Permanente
25. Todas aquellas adicionales que sean requeridas para la correcta ejecución del Contrato	Permanente

ctiva tu negocio con Cupón

4- DESEMBOLSOS - OPERACIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMA

PRIMER PAGO DE LA ADICIÓN – OBRAS: Por valor de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($157.371.686) M/CTE, correspondiente al 40% del valor de la operación estratégica del programa para la adición de obras, previa presentación y recibo a satisfacción por parte del supervisor de la SDDE de los productos:

Producto 7. Repositorio digital con su lista de chequeo de la verificación realizada por el contratista a cada una de las empresas postuladas de obras mediante el formulario.

- Producto 12. Hasta 108 Planes de Inversión de Productividad evaluados de las empresas ubicadas en los polígonos afectados por las obras.

5- DESEMBOLSO PRESUPUESTO VOUCHERS y DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS

ADICIÓN DE RECURSOS PROGRAMA ACTIVA TU CUPÓN

Se recibieron los recursos de la adición 1 y 2 del programa de acuerdo con el cumplimiento a lo establecido para el proceso de desembolso:

- Empresas Beneficiarias según adenda 1 y 2: para un total de 679
- Recursos recibidos Adición 1: $1.083.885.676
- Recursos recibidos Adición 2: $1.173.898.058
- Estado: Recibidos por la UT

PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

- Se presentó la devolución de rendimiento con corte a 31 de diciembre de 2025 por valor de $385.902
- Se presentó el segundo informe financiero de ejecución a diciembre 31 de 2025
- Estado: aprobados sin novedad

6-ESTADO ACTAS

- Acta de inicio ejecución proyecto - 28-Ago-2025 – Formalizada entre las partes
- Acta comité técnico 01-Formalizada
- Acta comité técnico 02-Formalizada
- Acta comité técnico 03-Formalizada
- Acta comité técnico 04-Formalizada
- Acta comité técnico 05- En Formalización
- Acta comité técnico 01-Extraordinario en Formalización

7-VARIOS

- Indicador de productividad conocer quienes han diligenciado
