DATOS DEL INFORME
Fecha de presentación (30/04/2026) Período del informe: Desde (01/03/2026) Hasta (31/03/2026)
Nombre del Contratista/Asociado: Unión Temporal en Tecnalia Proyectamos
Nombre Supervisor: Diego Fernando Pardo López
DATOS DEL CONTRATO /CONVENIO
Contrato/convenio No. 902 DE 2025
Objeto: Contratar la prestación de servicios para la administración y asignación de los recursos destinados para procesos de sofisticación e innovación de las empresas beneficiarias de la SDDE
Plazo: En letras: Ocho (8) meses y cinco (5) días
Valor Contrato: letras NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($9.265.245.734)
Fecha Suscripción (26/08/2025)
Fecha Acta de inicio (26/08/2025)
Fecha de Terminación (30/04/2026)
Porcentaje de ejecución financiera: 86.26% Porcentaje de ejecución en tiempo:87.76%
MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO
Modificación No. 1 - Adición No. 1 $1.477.314.891 de pesos M/cte Fecha de Suscripción: 24 de octubre de 2025 Adición al valor: $1.477.314.891 *(*$393.429.215 recursos para la operación estratégica de la UT y $1.083.885.676 bolsa de recursos) Prórroga al Plazo: No aplica Plazo suspendido: No aplica Modificación No.2 - Prórroga No. 1 y Adición No. 2 $1.600.000.000 de pesos M/cte Fecha de Suscripción: 18 de diciembre de 2026 Adición al valor: $1.600.000.000 *(*$426.101.942 recursos para la operación estratégica de la UT y $1.173.898.058 bolsa de recursos) Prórroga al Plazo: 30 de abril de 2026 Plazo suspendido: No aplica
(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información): Anticipo $ _____ Ejecución de Anticipo $ _____ Saldo por amortizar $ _____ Rendimientos financieros generados: $_____

[1] Incluyendo el pago de este período

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes [2]
Obligación específica 1. Suscribir oportunamente el acta de inicio del contrato.	En Bogotá, el 26 de agosto de 2025, se reunieron el Supervisor del Contrato por parte de la SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO y el CONTRATISTA, con el fin de suscribir el ACTA DE INICIO tal como lo dispone el Contrato, iniciando su ejecución a partir de la fecha. Contrato de prestación de servicios 902 de 2025.	**Anexo-1**_Acta de inicio CTO 902-2025 firmada.pdf
Obligación específica 2. Cumplir de manera integral con cada una de las fases y su desarrollo, conforme lo establecido en el pliego de condiciones y en la propuesta, documentos que hacen parte integral del contrato.	**Fase 1 - Alistamiento.** Teniendo en cuenta el anexo técnico hasta la fecha se cuenta con los siguientes resultados: **Producto Entregable 1.** Elaborar un (1) Plan de Trabajo y Cronograma para la ejecución del proyecto, se realizó la entrega con el pago 01 en septiembre 19 de 2025. Adición No. 2 CPS 902-2025: Documento que contenga el Plan de trabajo y Cronograma de la adición No. 2 y prórroga No. 1 del programa, que incluya las herramientas de seguimiento y control a los beneficiarios, proveedores y calidad de los bienes y servicios a entregar mediante los Váuchers de Productividad- CupÓN. Asimismo, el cronograma deberá ser estructurado por fases y semanas de acuerdo con la fecha de inicio y la fecha de finalización del contrato. Se realizó la entrega con el informe de ejecución - GCR-P1-F7- del Pago 03 de la operación estratégica del programa, el 12 de diciembre de 2025. **Producto Entregable 2**. Metodología para la selección de los beneficiarios y proveedores de servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación o de aquellos que permitan el aumento de la productividad empresarial, así como, para la administración, asignación, desembolso y transferencia de recursos a través de los proveedores seleccionados, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDDE. Se realizó la entrega con el informe de ejecución - GCR-P1-F7- del Pago 02 de la Bolsa de Recursos del programa, el 19 de noviembre de 2025.	**Carpeta_Anexo-2_Producto entregable 7** ● Anexo 2-Producto 07 Repositorio digital y lista chequeo ● Anexo 2.1-Herramienta registro y control postulaciones Formato.xlsx ● Anexo_2.2 Lista chequeo verificación postulaciones con link a repositorio digital **Carpeta_Anexo-3_Producto entregable 8-Evaluaciones PIP** ● Anexo_3.1_Formato_ Documento evaluación PIP_V1.0 ● Anexo 3.2 Soportes PIP Evaluados_tradicionales ● Anexo 3.3 Soportes PIP Evaluados_obras

[1] Incluyendo el pago de este período

	Producto Entregable 3. Documento que contenga la estructura de la herramienta tecnológica de seguimiento. Se realizó entrega con el informe de ejecución GCR-P1-F7- del Pago 01 de la Bolsa de Recursos del programa, el 19 de septiembre de 2025. **Producto Entregable 4**. Se realizó un prototipo que define las funcionalidades esenciales de la herramienta tecnológica. Se realizó entrega con el pago 01 en septiembre 19 de 2025. **Fase 2 - Postulación al Váucher de Productividad.** Teniendo en cuenta el anexo técnico hasta la fecha se cuenta con los siguientes resultados: **Producto Entregable 5**. Documento con los términos de referencia que incluya: el formulario de inscripción, la especificación de los soportes requeridos para el cumplimiento de requisitos mínimos y criterios y el formato del PIP con la propuesta de evaluación. Se realizó la entrega con el informe de ejecución - GCR-P1-F7- del Pago 03 de la Bolsa de Recursos del programa, el 12 de diciembre de 2025. La convocatoria se encuentra abierta y los términos de referencia publicados en el sitio previsto por la SDDE. Link: https://desarrolloeconomico.gov.co/cupon/. La convocatoria ha contado hasta la fecha con cuatro (4) adendas, las cuales se encuentran publicadas en el link dispuesto por la SDDE. Con respecto a la Adición No. 2 CPS 902-2025: Documento con los términos de referencia y adendas de la convocatoria, en donde, se incluya las hasta 679 empresas a beneficiar y que además permita diferenciar las postulaciones a: -Cupón Tradicional y -Cupón por Obras el 15 de diciembre se generó adenda No. 3 donde se indica la modalidad de las empresas. Los documentos de la convocatoria se encuentran publicados en el sitio previsto por la SDDE, en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1vPlLdJ8IcKp_xQIOqDMWIFOwul4CFGUp	**Carpeta_Anexo-4_Producto_Entregable_10-Soporte AT-Avance** ● Anexo 4.1 Listado 422 AT efectivas ● Anexo 4.2 Soportes AT efectivas 2025 ● Anexo 4.3 Soportes AT efectivas enero ● Anexo 4.4 Listado 510 AT efectivas ● Anexo 4.5 Soportes AT efectiva febrero ● Anexo 4.6 Listado 535 AT efectivas ● Anexo 4.7 Soportes AT efectiva marzo ● Anexo 4.8 Listado 566 AT efectivas **Carpeta_Anexo-5_Producto_Entregable_11-Empresas aprobación PIP** y_Soporte-Avance ● Anexo 5.1_Listado de las 454 empresas que han aprobado el PIP ● Anexo 5.2_Carpeta 454 PIPS evaluados y soporte de aprobación ● Anexo 5.3_Listado de las 547 empresas que han aprobado el PIP ● Anexo 5.4 Aprobaciones Evaluaciones PIP mes-ene

[1] Incluyendo el pago de este período

	Producto Entregable 6. Formulario de postulación en línea. Se realizó la entrega con el informe de ejecución -GCR-P1-F7-del pago 02 del 19 de noviembre de 2025. **Producto Entregable 7.** Repositorio digital con su lista de chequeo de la verificación realizada por el contratista a cada una de las empresas postuladas mediante el formulario en línea. Se realizó la entrega como soporte del pago 02 del 19 de noviembre de 2025. (454 empresas). A Marzo 31 de 2026 se cuenta con 1154 Postulaciones con su correspondiente repositorio documental y registro correspondiente en la Base control Verificación y revisión documental postulaciones empresas, corresponden a 835 postulaciones de empresas Cupón tradicional, 127 empresas Cupón Obras, 188 personas naturales y 4 registros duplicados. Soportes cumplimiento. Anexo_15.1_Anexo-15_Base_control_Verificación y revisión documental postulaciones empresas. -Repositorio digital: Link información empresas: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1W5A0FLpClhwmrJ4WH_dgKEIvgHoSq0hA **Producto Entregable 7 Obras.** Repositorio digital con su lista de chequeo de la verificación realizada por el contratista a cada una de las empresas postuladas a la modalidad 2- CupÓN Obras mediante el formulario en línea. A la fecha de corte se cuenta con 127 empresas Cupón obras postuladas. Todas las empresas se cuentan en el mismo link de del repositorio **Producto Entregable 8.** Documento de evaluación del Plan de Inversión de Productividad de cada una de las empresas (571 empresas -Cupón Tradicional). Se realizó la entrega como soporte del pago 02 del 19 de noviembre de 2025. A la fecha de corte se cuenta con 687 empresas que cuentan con la evaluación de las cuales 583 corresponden a empresas Cupón tradicional y 104 Cupón obras. Ver Anexos 3, 3.1, 3.2 y 3.3 **Producto Entregable 9**. Documento con la metodología de la asistencia técnica de la evaluación de los ítems de	• Anexo 5.5_Listado de las 580 empresas que han aprobado el PIP • Anexo 5.6_ Aprobaciones Evaluaciones PIP mes-feb • Anexo 5.7_Listado de las 625 empresas que han aprobado el PIP • Anexo 5.8 Aprobaciones Evaluaciones PIP mes-mzo **Carpeta_Anexo-6_Producto entregable 12 Adición 1 - Obras** • Anexo_6-Producto _12_ Empresas con Evaluación PIP • Anexo 6.1 Formato_Documento evaluación PIP_V1.0 • Anexo 6.2 Soportes PIP Evaluados_obras **Carpeta_Anexo-7_Producto_Entregable_16-Acuerdos de servicios firmados** • Anexo_7.1 Empresas Cupón tradicional • Anexo_7.2 Empresas Cupón Obras **Carpeta__Anexo-8_Soportes Gestión Fase 2**

[1] Incluyendo el pago de este período

	los Planes de Inversión de productividad. Se realizó entrega con el pago 02 en noviembre 19 de 2025. **Producto Entregable 10.** Soporte de la asistencia técnica realizada conforme a los lineamientos establecidos por la SDDE. En el 2025 se consolidaron 422 asistencias técnicas efectivas, donde, 421 empresas de Cupón Tradicionales y 1 empresa de Cupón de obras. Ver Anexos 4.1 y 4.2. En el mes de enero de 2026 se consolidaron por parte del equipo consultor un total de 88 asistencias técnicas efectivas, dónde, 54 son de Cupón Tradicional y 34 son de Cupón Obras, en estos se puede evidenciar la aprobación de las asistencias técnicas y el PIP ajustado. Ver Anexo 4.3. En el mes de febrero de 2026 se consolidaron por parte del equipo consultor un total de 25 asistencias técnicas efectivas, dónde, 14 son de Cupón tradicional y 11 de Cupón obras. Ver Anexo 4.5. En el mes de marzo de 2026 se consolidaron por parte del equipo consultor un total de 31 asistencias técnicas efectivas, dónde, 25 son de Cupón tradicional y 6 de Cupón obras. Ver Anexo 4.7. A la fecha de corte se cuenta con un acumulado de 566 asistencias técnicas efectivas 514 son de Cupón Tradicional y 52 son de Cupón Obras. Ver Anexo 4.8 **Producto Entregable 11**. Listado de las 454 empresas beneficiarias que han aprobado el PIP, así como, la evidencia de su aprobación. Se realizó la entrega con el informe de ejecución - GCR-P1-F7- del Pago 02 de la Bolsa de Recursos del programa, el 19 de noviembre de 2025. Carpeta PIPS soporte de aprobación link: https://drive.google.com/drive/folders/1IE3dquoq1vCDf1PEnwnxNCzRLLXniFQQ?usp=drive_link Con la gestión del mes de marzo, se cuenta con 45 aprobaciones más, de las cuales 36 corresponden a empresas Cupón Tradicional y 9 a empresas Cupón Obras.	• Anexo_8.1 Postulaciones período • Anexo 8.2 Gestión citaciones Asistencias técnicas **Carpeta__Anexo-9_Soportes Gestión Fase 3** • Anexo 9.1 Documentos oficiales convocatoria • Anexo 9.2_Soporte Correos enviados banco SDDE • Anexo 9.3 Registro Proveedores Externos_Activa tu Negocio con Cupón • Anexo-9.4_Proveeduría_Cotizaciones • Anexo 9.5 Presentación a proveedores programa **Carpeta__Anexo-10_Soportes Gestión Fase 4** • Anexo-10.1_CUPONES PAGOS 310326 • Anexo 10.2 Anexo.10.2 CUPONES PAGADOS MARZO

[1] Incluyendo el pago de este período

	Ahora bien, a la fecha de corte, se cuenta con 625 empresas que han aprobado la evaluación del PIP, de las cuales corresponden 562 a empresas Cupón tradicional y 63 empresas Cupón obras. Ver Anexo 5. **Producto Entregable 12:** Hasta 679 planes de inversión de productividad**.** A la fecha se cuenta con 751 empresas con Plan de inversión de productividad, 634 corresponden a empresas Cupón tradicional y 117 de obras. Ver Anexo-16 **Producto Entregable 12-Adición-1-**Hasta 108 Planes de Inversión de Productividad evaluados de las empresas ubicados en los polígonos afectados por las obras. De las 127 empresas postuladas de obras, una vez realizado el proceso de revisión de habilitantes, 104 empresas cumplieron requisitos las cuales fueron elegidas, todas cuentan con los Planes de inversión de productividad PIP evaluados por el equipo consultor. Ver Anexos 6, 6.1 y 6.2. **Producto Entregable 13:** Manual de uso de la herramienta tecnológica y Manual de despliegue y configuración. Se realizó la entrega con el informe de ejecución - GCR-P1-F7- del Pago 02 de la Bolsa de Recursos del programa, el 19 de noviembre de 2025. **Producto Entregable 14**: Código fuente de la herramienta tecnológica y proceso de catalogación en el repositorio de la SDDE. Se realizó la entrega con el informe de ejecución - GCR-P1-F7- del Pago 02 de la Bolsa de Recursos del programa, el 19 de noviembre de 2025. **Producto Entregable 15:** Puesta en producción de la herramienta sistematizada de seguimiento y control en donde se evidencie los indicadores y resultados del programa en tiempo real, el informe de pruebas realizadas. Así como, la transferencia de conocimiento de la implementación de la solución a nivel general. Se realizó la entrega con el informe de ejecución - GCR-P1-F7- del Pago 02 de la Bolsa de Recursos del programa, el 19 de noviembre de 2025.	**Carpeta_Anexo-11_Producto_Entregable_19 - Acuerdos de calidad de servicios firmados** ● Anexo_11.1 Empresas Cupón tradicional ● Anexo_11.2 Empresas Cupón Obras **Carpeta__Anexo-12_Producto_Entregable_28_ Recolección índice productividad-Avance** ● Anexo-12.1-Base control gestión ● Anexo-12.2-Soporte correos enviados **Carpeta 13_Anexo-13_Gestión comunicaciones** ● Anexo 13.1_Informe apoyo difusión_SDDE - ENERO2026 ● Anexo 13.2_Trazabilidad derivada reunión con SDDE_Feb5 ● Anexo 13.3_Informe apoyo difusión_SDDE - FEBRERO 2026 ● Anexo 13.4_Informe apoyo difusión_SDDE - MARZO 2026 ● Anexo 13.5_Presentación proveedores webinar19032026 ● Anexo_13.6_Comunicado_activa_negocio

[1] Incluyendo el pago de este período

Producto Entregable 16: 679 acuerdos de servicios firmados entre la empresa y el contratista. A la fecha de corte, se cuenta con 518 acuerdos de servicios firmados entre las empresas y el operador, de los cuales 467 corresponden a empresas Cupón tradicional y 51 empresas Cupón obras Ver Anexos 7.1 y 7.2.

Gestión operativa de la Fase 2:

En el periodo del informe se realizaron las siguientes acciones para fortalecer la postulación de las empresas de obras:

Gestión bases de datos para postulaciones. La bases aportada por la SDDE presentan el siguiente estado a la fecha:

GESTIÓN OBRAS	
POSTULADO	158
No contactado	25
NO INTERESADO	19
ORGANIZANDO DOCUMENTACION	17
DICEN QUE ESTAN POSTULADOS	6
No cumple requisitos	6
linea errada	2
Suma total	**233**

Tabla 1. Base de datos de Obras

Esta base la actualiza la SDDE incorporando nuevos registros, desde postulaciones se cruza para identificar qué empresas corresponden a obras, la gestión se refuerza con llamadas para guía en postulaciones. Para las empresas postuladas que requieran subsanar se realiza también llamadas telefónicas para apoyo en los ajustes requeridos. El operador realiza apoyo en redes sociales mediante acciones de reposteo de publicaciones que realiza la SDDE del programa y publicación de piezas del programa en LinkedIn, Facebook e Instagram, se siguió la programación planeada. (Para empresas y proveedores).

- Anexo_13.7 Listado_empresas_elegibles comunicado enviado
- Anexo 13.8_Leads _proveedores

Carpeta-Anexo-15_Producto 7_Repositorio digital con lista chequeo empresas postuladas

- Anexo-15.1_Base control Verificación y revisión documental postulaciones empresas.xlsx

Carpeta_Anexo-16_Producto_12_Empresas con PIP

- Anexo-16.1_Empresas con Plan de inversión de productividad

Carpeta:Anexo-22_Producto_27_Levantamiento_información SUIM avance

- Anexo_22.1_SUIM_Formalización_información
- Anexo_22.2_Reporte_Beneficiarios 81 EMPRESAS
- Anexo_25.2_Reporte Unidad_Productiva 81 EMPRESAS

Carpeta Anexo-26_Producto **Entregable 22 Avance-REC**

[1] Incluyendo el pago de este período

		• Anexo 26.1 Tradicionales • Anexo 26.2 Obras

[1] Incluyendo el pago de este período



Ilustración 1. Piezas empresas

El posteo se realizó hasta el mes de febrero de 2026, para marzo se generaron acciones en redes con nuevo contenido y nuevas publicaciones. Los soportes de apoyo de comunicaciones se evidencian en el Anexo 13.

Postulaciones:

Al 31 de marzo de 2026, se recibieron 191 postulaciones, 119 corresponden a empresas Cupón tradicional, 21 personas naturales y 53 de empresas Cupón obras Ver Anexo 8.1

A la fecha de corte se cuenta con un total de 1154 postulaciones que corresponden 127 a empresas Obras, 1027 empresas tradicionales. Ver Anexo-15.1.

A marzo 31 de 2026 las empresas Cupón obras cuentan con 127 postulaciones, la siguiente tabla presenta el estado:

[1] Incluyendo el pago de este período

ESTADOS	TOTAL EMPRESAS
Control DIME SDDE NO - Sin Revisar habilitantes	1
Cumple Requisitos - _En Listas Analizadas quedó En revisión SDDE	2
Cumple Requisitos - Elegible	101
Cumple Requisitos - Elegible - Rescatada de Listas Analizadas	2
Cumple Requisitos - Elegible Adenda 02	1
Cumple Requisitos - Retirada SDDE x Emprendopolis En Listas Analizadas	3
Cumple Requisitos adenda 04 - _Seleccionada	5
En subsanación adenda 04	5
En subsanación empresa	1
No Cumple habilitante 2-Antiguedad mínima 12 meses	3
No Cumple habilitante 2-Domicilio principal NO es Bogotá	1
No Cumple habilitante 3-Empresa tamaño Grande	1
No Cumple habilitante 4-Esta incurso en procesos de liquidación	1
Total general	127

Generación listados empresas elegidas:

En el periodo reportado se han realizado la publicación de 14 listados de empresas elegidas. Las listas están publicadas en el sitio de la SDDE para el programa link: https://drive.google.com/drive/folders/1dAAk4dQGB6SFufQtFynwEEQZx8wMveAF

A la fecha de corte se cuenta con un total de 696 empresas elegidas, 592 corresponden a empresas Cupón tradicional y 104 a empresas Cupón obras.

A continuación presentación gráfica de datos de las 104 empresas elegidas obras :

[1] Incluyendo el pago de este período

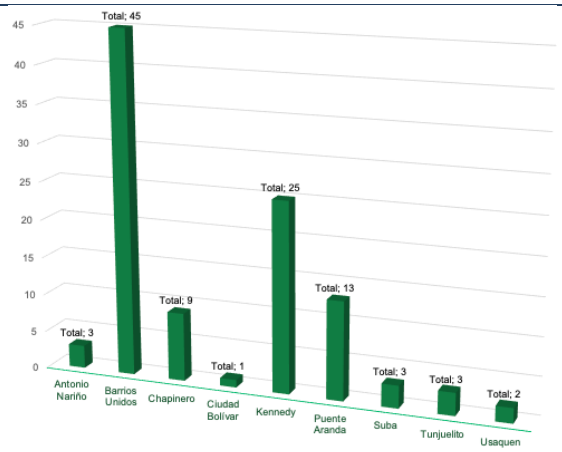


Gráfico 1. Empresas elegidas por localidad obras

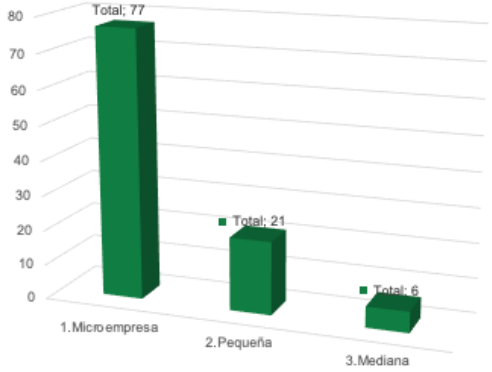


Gráfico 2. Empresas Elegidas por tamaño obras

De la pregunta del PIP - 5.5 ¿Qué bienes y servicios piensa que puede contratar para desarrollar su iniciativa de productividad o innovación en el corto plazo?, se obtienen las siguientes tipologías:

[1] Incluyendo el pago de este período

ESTADOS	TOTAL EMPRESAS
Control DIME SDDE NO - Sin Revisar habilitantes	1
Cumple Requisitos - _En Listas Analizadas quedó En revisión SDDE	2
Cumple Requisitos - Elegible	101
Cumple Requisitos - Elegible - Rescatada de Listas Analizadas	2
Cumple Requisitos - Elegible Adenda 02	1
Cumple Requisitos - Retirada SDDE x Emprendopolis En Listas Analizadas	3
Cumple Requisitos adenda 04 - _Seleccionada	5
En subsanación adenda 04	5
En subsanación empresa	1
No Cumple habilitante 2-Antiguedad mínima 12 meses	3
No Cumple habilitante 2-Domicilio principal NO es Bogotá	1
No Cumple habilitante 3-Empresa tamaño Grande	1
No Cumple habilitante 4-Esta incurso en procesos de liquidación	1
Total general	127

Tabla 1. Solicitudes tipologías rubros - obras




Gráfico 3. Nivel DIME empresas obras

El análisis de estas caracterizaciones se encuentran en el Anexo _14.1, 14,2 y 14,3.

Asistencias Técnicas:

Al 31 de marzo de 2026 se cuenta con 566 asistencias técnicas efectivas, de las cuales 514 corresponden a empresas Cupón tradicionales y 52 Cupón obras. Ver Anexo 4.

De las sesiones de asistencia técnica realizadas se evidenció que la temporada de fin de año y la del inicio impactó la realización de las sesiones y se debieron reprogramar sesiones. En el período comprendido del 19 de diciembre de 2025 a marzo 31 de 2026, se presenta el siguiente estado en cuanto a citaciones de asistencias a técnicas de empresas

[1] Incluyendo el pago de este período

Número de citaciones	Número de empresas	Total de citaciones
1 citación	310	310
2 citaciones	99	198
3 citaciones	25	75
4 citaciones	17	68
5 citaciones	6	30
6 citaciones	1	6
7 citaciones	1	7
TOTALES	**459**	**694**

De las 459 empresas corresponden 358 a empresas Cupón tradicional con 517 citaciones y 101 empresas Cupón obras con 177 citaciones. Ver Anexo .8.2

A las empresas que han formalizado los documentos de consultoría, PIP Aprobado, Asistencia técnica y PIP ajustado firmado, se genera el acuerdo de servicio.

A la fecha de corte se cuenta con 390 acuerdos de servicios firmados entre la empresa beneficiaria y el operador, de los cuales 339 corresponden a empresas Cupón tradicional y 51 corresponden a empresas Cupón obras. Ver Anexos 7.1 y 7.2.

Fase 3 – Estudio de mercado, selección de proveedores y seguimiento.

Teniendo en cuenta el anexo técnico hasta la fecha se cuenta con los siguientes resultados:

- Se realizaron los últimos ajustes del micrositio para postulación de proveedores ubicado en el link https://tecnaliacolombia.org/postulacion-de-proveedores-activa-tu-cupon/
- Se realizaron ajustes al documento de términos de referencia para la convocatoria de los proveedores especializados en innovación y productividad acorde con las observaciones de la SDDE.
- Se consolidaron los documentos oficiales de la convocatoria.


[1] Incluyendo el pago de este período

	- Se dio apertura de la convocatoria el 8 de enero de 2026. - Se realizó envío de correo a los proveedores del banco de oferentes de la SDDE informando sobre la convocatoria. - Se realizó inicio al proceso de recepción de solicitudes de proveedores externos interesados en ser proveedores del programa. - Se dio inicio al proceso de validación documental y habilitación a proveedores externos. - Se ha realizado contactabilidad a los proveedores registrados mediante llamadas y/o envió de correos. - Se simplificaron los campos solicitados en el formulario de registro y en la cotización. - Se generó adenda 01 de los términos de referencia, para facilitar el registro de los proveedores Link Micrositio proveedores programa: https://tecnaliacolombia.org/postulacion-de-proveedores-activa-tu-cupon/ Acciones de comunicación para aumentar la base de proveedores externos Se realizó apoyo en difusión al programa en el proceso de proveedores con las piezas suministradas por la SDDE.	

[1] Incluyendo el pago de este período



Se realizó Generación de Contenido para Campaña Meta Ads Adquisición de Proveedores



El operador realizó 2 videos uno en formato corto y otro en formato largo, se realizó proceso de producción y gestión se grabó y editó el contenido; por parte de la SDDE se recibió aprobación de contenidos y se activó la campaña en metadata activa desde el 25 de febrero hasta el 2 de marzo en menos de 48 se han logrado captación de lead calificados en total a la fecha 142 interesados potenciales para efectos de contactabilidad por el equipo encargado para la vinculación al proceso, se realizará verificación de la tasa de conversión. En el mes de marzo, se realizó Activación Campaña #2 Meta Ads - Proveedores, Activación Pauta Meta Ads - Proveedores, y se realizaron 2 webinars para proveedores,. Los soportes de apoyo de comunicaciones se evidencian en el Anexo 13.

[1] Incluyendo el pago de este período

-Se cuenta a la fecha de corte con 611 registros de proveedores externos que ingresan por el formulario de registro de proveedores link: https://tecnaliacolombia.org/postulacion-de-proveedores-activa-tu-cupon/#register-form

Se han recibido 1708 cotizaciones y revisadas 1494 cotizaciones que ingresan por el formulario google forms link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftc4VMBAw-coZbfK8QOI1ZuPni-y9_iZuO6b5v4SSTcL12uw/viewform?pli=1&pli=1

A continuación estado de cotizaciones recibidas:

ESTADO	No. COTIZACONES
Anuladas	62
Cambio	3
Desistimiento	3
Evaluada	796
Fuera de tiempo	244
Incompleta	48
Registrada	2
Seleccionada	318
Seleccionada/Revertida	18
TOTAL	**1494**

De las 696 empresas elegibles (592 Tradicional y 104 Obras); 602 empresas (542 Tradicional y 60 obras) se encuentran en gestión de cotizaciones, a continuación el estado por cotizaciones recibidas por Tipo Cupón:

Empresas Cupón Tradicional:

ESTADO POR FASE	TRADICIONAL	% C. TRADICIONAL
FASE 3. Empresas en gestión de cotización	542	**93%**
FASE 3. Empresas sin cotizaciones (0)	174	**30%**
FASE 3. Empresas con una (1) cotización	50	**9%**
FASE 3. Empresas con dos (2) cotizaciones	18	**3%**
FASE 3. Empresas con tres (3) cotizaciones	300	**51%**
FASE 3. Empresas en evaluación de proveedores	18	**3%**

Empresas Cupón Obras:

[1] Incluyendo el pago de este período

ESTADO POR FASE	OBRAS	% C. OBRAS
FASE 3. Empresas en gestión de cotización	60	56%
FASE 3. Empresas sin cotizaciones (0)	34	33%
FASE 3. Empresas con una (1) cotización	2	2%
FASE 3. Empresas con dos (2) cotizaciones	2	2%
FASE 3. Empresas con tres (3) cotizaciones	22	21%
FASE 3. Empresas en evaluación de proveedores	0	0%

Así mismo, 302 empresas cuentan con proveedor asignado, a continuación por Tipo Cupón y tipo solicitado por empresa en el PIP:

Empresas Cupón Tradicional:

ESTADO POR FASE	TRADICIONAL	% C. TRADICIONAL
FASE 3. Empresas con proveedor asignado*	282	48%
FASE 3. Cuántas empresas son de bienes	110	19%
FASE 3. Cuántas empresas son de servicios	172	30%

Empresas Cupón Obras:

ESTADO POR FASE	OBRAS	% C. OBRAS
FASE 3. Empresas con proveedor asignado*	22	20%
FASE 3. Cuántas empresas son de bienes	9	9%
FASE 3. Cuántas empresas son de servicios	13	13%

Ver. Anexo-9 soportes gestión fase 3

Producto Entregable 19: 679 Acuerdos de Calidad de Servicios firmados entre los proveedores de servicios de innovación o productividad, la empresa beneficiaria y el operador. A la fecha de corte, se cuenta con 184 acuerdos de calidad de servicios firmados por proveedores, empresas y el operador, de los cuales 170 corresponden a empresas Cupón tradicional y 14 a empresas Cupón obras Ver Anexos 11.1 y 11.2.

Nota: Los productos 17 y 18 se encuentran en consolidación y elaboración.

Fase 4- Financiación

Producto 20. Informes que indiquen las actividades técnicas y financieras desarrolladas, el proceso de gestión y desembolso de los recursos para cada una de las

[1] Incluyendo el pago de este período

	empresas acompañadas, que contengan el resultado de la ejecución de los Planes de Inversión, según las directrices establecidas por la SDDE. A la fecha de corte se ha realizado el pago de 81 Cupones de empresas, de los cuales 77 corresponden a empresas Cupón tradicional y 4 a empresas de obras. La información de las empresas que ya cuentan con el beneficio del Cupón y los proveedores a los cuales se han desembolsado los recursos con el cupón link: https://drive.google.com/drive/folders/1aw5GOw0VjucOnGjUNk3Sp8-MULceTXwp Ver. Anexo-10 soporte gestión fase 4 **Producto 22.** Formatos de satisfacción de bienes y servicios firmados por las empresas beneficiarias. A la fecha se cuenta con la recolección de 21 formatos de satisfacción firmados de las empresas beneficiarias, 19 corresponden a empresas cupón Tradicionales y 2 a cupón Obras. Ver Anexo. 26 **Producto_Entregable 27.** Levantamiento de información SUIM (Sistema Único de Información Misional de la SDDE) de acuerdo con los lineamientos entregados por la SDDE. A la fecha de corte se ha realizado un levantamiento de 81 Registros de unidades productivas y beneficiarios. Ver Anexo 20. **Producto_Entregable 2**8: Medición índice de productividad en la herramienta entregada por la SDDE, esta medición se debe realizar al inicio y al final de la intervención. Se realizó la gestión de envío de correo personalizado a 594 empresas elegidas hasta el mes de febrero, por medio del correo consultoria@tecnaliacolombia.org,	

[1] Incluyendo el pago de este período

	Link al instrumento de la SDDE https://survey123.arcgis.com/share/dce488e25980408ca26824c6b264c327. Ver Anexos 12.1 y 12.2 En comité técnico del programa del mes de febrero la Supervisión anunció que se cambia el instrumento de recolección, el cual en el mismo instrumento se tomará los datos de línea de entrada y de salida. En el mes de marzo se recibió el oficio 2026EE0002560 indicando el nuevo instrumento a utilizar link https://arcg.is/1Hyqmi4. Nota: hasta la fecha se encuentran en construcción los productos 23, 24, 25, 26 y 29. **Otras Gestiones de apoyo a los procesos:** **Firmas de documentos:** Para el tema de recolección de firmas en general para todos los documentos, se presenta una complejidad mayor a la estimada, llegando a impactar los tiempos de cierre de procesos, se ha evidenciado que se depende de la disponibilidad de Representantes Legales, procesos internos de las empresas y en ocasiones brechas digitales para la incorporación de las firmas digitales en los documentos. Dado lo anterior el operador ha reforzado su equipo de contactabilidad para realizar gestión de recolección de firmas de documentos mediante correos y llamadas. **Acciones de comunicación**: - **Evento de Cierre**: Desde el equipo de comunicaciones de Tecnalia Colombia se brinda apoyo en la gestión y preproducción del evento de cierre, específicamente en la creación del formulario de confirmación de asistencia y en el diseño del formato de registro de asistentes para el día del evento	

[1] Incluyendo el pago de este período

	- **Redes sociales**: Activación Campaña #2 Meta Ads - Proveedores, Activación PAUTA Meta Ads - Proveedores, Participación Apoyo Webinars con proveedores, se identificaron leads de proveedores y se cruzó con la base. - **Comunicado Oficial para Beneficiarios:** Se envió comunicado a 677 empresas elegibles - **Línea telefónica:** Se activó la Línea de atención "Activa tu Negocio con CupÓN: 333 603 1304", Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Los soportes de apoyo de comunicaciones se evidencian en el Anexo 13.	
Obligación específica 3 Elaborar y hacer seguimiento al Plan de Trabajo y Cronograma para la ejecución del presente contrato, que deberá ser allegado a la SDDE los diez (10) días calendario después de iniciar el contrato de prestación de servicios.	La entrega correspondiente se realizó a la SDDE el 11 de septiembre de 2025, la cual quedó documentada en el informe de seguimiento asociado a la obligación previa. Esta entrega fue registrada en el pago 001 de 19 septiembre de 2025. (Operación estratégica) **Con la Adición No.2 CPS 902-2025:** Se elaboró un documento que contiene el Plan de trabajo y Cronograma de la adición No. 2 y prórroga No. 1 del programa, que incluye las herramientas de seguimiento y control a los beneficiarios, proveedores y calidad de los bienes y servicios a entregar mediante los Váuchers_de_Productividad-Cupón. Asimismo, el cronograma está estructurado por fases y semanas de acuerdo con la fecha de inicio y la fecha de finalización del contrato. Se realizó la entrega como soporte del pago 03 de diciembre 12 de 2025. Así mismo se realizó el comité técnico No.7 el pasado 31 de marzo de 2026. Anexo 23.9	Anexo-23.9 Comité 07 Mzo_2025 Anexo-28-Cronograma_Programa_PrórogaAdiciones_SEG
Obligación específica 4. Hacer entrega del formato diligenciado con la información requerida del equipo de trabajo consolidado para la ejecución del contrato, con sus respectivos soportes de acuerdo con los lineamientos de la SDDE.	Se realizó entrega correspondiente del soporte a la SDDE el día 31 de octubre de 2025. Así mismo, se solicitó a la SDDE con el formato indicado, el cambio del Coordinador Técnico administrativo y financiero. Se realizó entrega correspondiente del soporte a la SDDE el día 31 de octubre de 2025. Así mismo, se solicitó a la	Carpeta_Anexo-21 Información requerida Equipo de trabajo • Anexo 21.1 Cambio Coordinador Técnico y administrativo • Anexo 21.2 Cambio Gerente del proyecto

[1] Incluyendo el pago de este período

	SDDE con el formato indicado, el cambio del Coordinador Técnico administrativo y financiero. Ver Anexo 21.1 En el mes de marzo se solicitó a la SDDE con el formato indicado, el cambio del Gerente del proyecto. Se recibe aprobación de la supervisión el 18 de marzo de 2026 mediante oficio 2026EE0003030. Ver Anexo 21.2	
Obligación específica 5. Dar apertura a una convocatoria y seleccionar las 454 empresas beneficiarias que recibirán el beneficio de los Váucher de Productividad de acuerdo con los requisitos mínimos y los criterios descritos en los Términos de Referencia de la convocatoria**.**	Se trabajó en la construcción de los Términos de Referencia y sus correspondientes anexos, se contó con la respectiva validación por parte del equipo de la SDDE. El 11 de septiembre de 2025 se publicaron en el sitio oficial. La convocatoria se encuentra abierta, así mismo, a la fecha se cuenta con la publicación de cuatro (4) adendas y los listados de empresas seleccionadas y elegibles en el marco del programa.	Link de acceso al micrositio de Activa Tu Negocio con CupÓN: https://desarrolloeconomico.gov.co/cupon/ Link de acceso a documentos de la convocatoria: https://drive.google.com/drive/folders/1vPlLdJ8IcKp_xQIOqDMWIFOwul4CFGUp Link de acceso a listados de seleccionados y elegibles: https://drive.google.com/drive/folders/1BLPuXRIhcPYrj4KoT3cBQiGwEFRCWUIQ
Obligación específica 6. Revisar y verificar que la documentación cargada por las empresas postulantes cumpla con los requisitos y criterios establecidos para la participación en el programa.	Se realizó el proceso correspondiente de registro de radicación y verificación de las 1154 empresas postuladas. A Marzo 31 de 2026 se cuenta con 1154 Postulaciones con su correspondiente repositorio documental y registro correspondiente en la Base control Verificación y revisión documental postulaciones empresas, corresponden a 835 postulaciones de empresas Cupón tradicional, 127 empresas Cupón Obras, 188 personas naturales. Repositorio digital: Link información empresas: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1W5A0FLpClhwmrJ4WH_dgKEIvgHoSq0hA	Carpeta_Anexo-15_Producto 7_Repositorio digital con lista chequeo empresas postuladas ● Anexo_15.1_Anexo-15_Base_control_Verificación y revisión documental postulaciones empresas.

[1] Incluyendo el pago de este período

Obligación específica 7. Revisar y evaluar cada uno de los Planes de Inversión de Productividad-PIP aportados por las empresas en el marco de la convocatoria, para la implementación de los Váuchers de Productividad, de acuerdo con los lineamientos entregados por la SDDE.	Teniendo en cuenta lo indicado en el anexo técnico se elaboró Producto entregable 8. Documento de evaluación del Plan de Inversión de Productividad de cada una de las empresas. Se realizó la entrega del producto con el pago 002. A la fecha de corte se cuenta con 687 empresas que cuentan con la evaluación. 583 corresponden a empresas Cupón tradicional y 104 Cupón obras.	**Carpeta_Anexo-3_Producto entregable 8-Evaluaciones PIP** ● Anexo_3.1_Formato_Documento evaluación PIP_V1.0 ● Anexo 3.2 Soportes PIP Evaluados_tradicionales ● Anexo 3.3 Soportes PIP Evaluados_obras
Obligación específica 8. Brindar asistencia técnica entre 1 y 4 horas, a cada una de las empresas de acuerdo con los resultados de la evaluación de los Planes de Inversión de Productividad-PIP.	En el 2025 se consolidaron 422 asistencias técnicas efectivas, donde, 421 empresas de Cupón Tradicionales y 1 empresa de Cupón de obras. Ver Anexos 4.1 y 4.2. En el 2025 se consolidaron 422 asistencias técnicas efectivas, donde, 421 empresas de Cupón Tradicionales y 1 empresa de Cupón de obras. Ver Anexos 4.1 y 4.2. En el mes de enero de 2026 se consolidaron por parte del equipo consultor un total de 88 asistencias técnicas efectivas, dónde, 54 son de Cupón Tradicional y 34 son de Cupón Obras, en estos se puede evidenciar la aprobación de las asistencias técnicas y el PIP ajustado. En el mes de febrero de 2026 se consolidaron por parte del equipo consultor un total de 25 asistencias técnicas efectivas, dónde, 14 son de Cupón tradicional y 11 de Cupón obras. En el mes de marzo de 2026 se consolidaron por parte del equipo consultor un total de 31 asistencias técnicas efectivas, dónde, 25 son de Cupón tradicional y 6 de Cupón obras. A la fecha de corte se cuenta con un acumulado de 566 asistencias técnicas efectivas 514 son de Cupón Tradicional y 52 son de Cupón Obras. Ver Anexo 4	**Carpeta_Anexo-4_Producto_Entregable_10-Soporte AT-Avance** ● Anexo 4.1 Listado 422 AT efectivas ● Anexo 4.2 Soportes AT efectivas 2025 ● Anexo 4.3 Soportes AT efectivas enero ● Anexo 4.4 Listado 510 AT efectivas ● Anexo 4.5 Soportes AT efectiva febrero ● Anexo 4.6 Listado 535 AT efectivas ● Anexo 4.7 Soportes AT efectiva marzo ● Anexo 4.8 Listado 566 AT efectivas
Obligación específica 9. Realizar la recolección de información para la medición del	Se han gestionado 594 solicitudes de diligenciamiento.	**Carpeta__Anexo-12_Producto Entregable_28_Recolección índice productividad-Avance**

[1] Incluyendo el pago de este período

Índice de Productividad en la herramienta entregada por la SDDE. Esta información deberá ser recolectada al inicio y al final de la intervención.	A la fecha de corte se han enviado 594 solicitudes a empresas para el diligenciamiento inicial envío de correo personalizado desde el correo consultoria@tecnaliacolombia.org, acorde a lineamientos recibidos a la fecha por la SDDE. Link instrumento de recolección: https://survey123.arcgis.com/share/dce488e25980408ca26824c6b264c327	• Anexo-12.1-Base control gestión • Anexo-12.2-Soporte correos enviados
Obligación específica 10. Cotizar los servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación con base en los proveedores y de acuerdo con la directriz de la SDDE, la metodología y los Planes de Inversión- PIP.	-Se han recibido 1494 cotizaciones que ingresan por el formulario google forms link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftc4VMBAw-coZbfK8QOI1ZuPni-y9_iZuO6b5v4SSTcL12uw/viewform?pli=1&pli=1 De las 696 empresas elegibles (592 Tradicional y 104 Obras); 602 (542 Tradicional y 60 obras) se encuentran en gestión de cotizaciones, a continuación el estado por cotizaciones recibidas por Tipo Cupón: Empresas Cupón Tradicional: ESTADO POR FASE / TRADICIONAL / % C. TRADICIONAL FASE 3. Empresas con proveedor asignado* 282 48% FASE 3. Cuántas empresas son de bienes 110 19% FASE 3. Cuántas empresas son de servicios 172 30% ESTADO POR FASE / TRADICIONAL / % C. TRADICIONAL FASE 3. Empresas en gestión de cotización 542 93% FASE 3. Empresas sin cotizaciones (0) 174 30% FASE 3. Empresas con una (1) cotización 50 9% FASE 3. Empresas con dos (2) cotizaciones 18 3% FASE 3. Empresas con tres (3) cotizaciones 300 51% FASE 3. Empresas en evaluación de proveedores 18 3% Empresas Cupón Obras: ESTADO POR FASE / OBRAS / % C. OBRAS FASE 3. Empresas con proveedor asignado* 22 20% FASE 3. Cuántas empresas son de bienes 9 9% FASE 3. Cuántas empresas son de servicios 13 13%	Anexo_9.4_Proveeduría_Cotizaciones

[1] Incluyendo el pago de este período

	<table><tr><th>ESTADO POR FASE</th><th>OBRAS</th><th>% C. OBRAS</th></tr><tr><td>FASE 3. Empresas en gestión de cotización</td><td>60</td><td>56%</td></tr><tr><td>FASE 3. Empresas sin cotizaciones (0)</td><td>34</td><td>33%</td></tr><tr><td>FASE 3. Empresas con una (1) cotización</td><td>2</td><td>2%</td></tr><tr><td>FASE 3. Empresas con dos (2) cotizaciones</td><td>2</td><td>2%</td></tr><tr><td>FASE 3. Empresas con tres (3) cotizaciones</td><td>22</td><td>21%</td></tr><tr><td>FASE 3. Empresas en evaluación de proveedores</td><td>0</td><td>0%</td></tr></table> 322 empresas cuentan con las 3 cotizaciones, de las cuales 304 cuentan con proveedor asignado, siendo 282 de cupón tradicional y 22 de cupón obras.	
Obligación específica 11. Gestionar y desembolsar los recursos asociados a los Planes de Inversión de Productividad de los acuerdos de servicios firmados.	A la fecha de corte se ha realizado el pago de 81 Cupones, de los cuales 77 corresponden a Cupón tradicional y 4 a obras. Ver Anexo 10.1 y 10.2	Carpeta_Anexo-10_Soportes Gestión Fase ● Anexo-10.1_CUPONES_PAGOS 310326 ● Anexo.10.2_CUPONES PAGADOS MARZO
Obligación específica 12. Abrir una cuenta bancaria de ahorros para el manejo exclusivo de los recursos de la bolsa para la implementación de los Váucher de Productividad de acuerdo con lo descrito en los PIP.	La UT en Tecnalia Proyectamos realizó la gestión y la apertura de las cuentas del proyecto el 19 de septiembre de 2025, en los siguientes términos: - Una para la operación estratégica del programa y - Otra exclusiva para la bolsa de recursos destinados a los Váuchers de Productividad - Cupones	Anexo-20_Soporte certificación cuenta bancaria
Obligación específica 13. Administrar, asignar y transferir todos los recursos de la bolsa, exclusivamente a las actividades relacionadas con la finalidad del contrato y a los proveedores servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación o de aquellos que permitan el aumento de la productividad empresarial seleccionados para la implementación de los Váucher de Productividad.	A la fecha se presenta un avance de lo que se han desembolsado los recursos de 81 cupones. Siendo 77 de cupón tradicional y 4 de obras. El informe financiero desagregado se empezará a presentar en el mes de abril.	Carpeta_Anexo-10_Soportes Gestión Fase ● Anexo-10.1_CUPONES_PAGOS 310326 ● Anexo.10.2_CUPONES PAGADOS MARZO

[1] Incluyendo el pago de este período

Obligación específica 14. Realizar el levantamiento de información SUIM (Sistema Único de Información Misional de la SDDE) de acuerdo con los lineamientos y formatos entregados por la SDDE.	A la fecha de corte se ha realizado el reporte de 81 Cupones de empresas, de los cuales 77 corresponden a empresas Cupón tradicional y 4 a empresas de obras.	Carpeta_Anexo22_Producto 27_Levantamiento_información SUIM ● Anexo 22.1 SUIM_Formalización información pdf ● Anexo 22.2 Reporte_Beneficiarios 81 EMPRESAS.xlsx ● Anexo 22.3 Reporte_Unidad_Productiva 81 EMPRESAS.xlsx
Obligación específica 15. Remitir un Informe que contenga el reporte de la selección del 100% de las empresas que recibirán el beneficio del Váucher de Productividad, su caracterización, el análisis de la revisión de los Planes de Inversión de Productividad aportados por las empresas en el marco de la convocatoria.	Se realiza informe con las 525 empresas seleccionadas de acuerdo con lo estipulado en los términos de referencia. Se entregó en diciembre 19 de 2025. Asimismo, se realiza informe que contiene el reporte de la selección del 17% de las empresas a beneficiar con la adición No. 2, es decir, 20 empresas que recibirán el beneficio del Váucher de Productividad (cupón), su caracterización, el análisis de la revisión de los Planes de Inversión de Productividad aportados por las empresas hasta la fecha de presentación del informe. Se entregó en diciembre 19 de 2025. Finalmente, se realiza informe con las 127 empresas postuladas de obras de las cuales han sido elegidas 104 empresas acorde con lo estipulado en los términos de referencia, correspondiente al primer desembolso de la adición 1 de obras.	Carpeta_Anexo-14_Informes selección empresas ● Anexo-14.1_Informe selección_empresas Programa_Cupón PROPU. SDDE ● Anexo-14.2_Informe_selección empresas_adición_2 ● Anexo-14.3_Informe Selección_empresas adición 1

[1] Incluyendo el pago de este período

Obligación específica 16. Remitir mensualmente diligenciado y firmado, a más tardar el día diez (10) de cada mes, el formato de ejecución GCR-P1-F7 o la versión actualizada de la SDDE de la ejecución del contrato. En caso de ser un día no hábil, se deberá allegar a más tardar el día hábil siguiente.	Se dio cumplimiento a la elaboración y envío a la SDDE de los siguientes informes: ● Informe de agosto de 2025. Fecha de entrega: 11 de septiembre de 2025 ● Informe de septiembre de 2025. Fecha de entrega: 14 de octubre de 2025 ● Informe de octubre de 2025. Fecha de entrega: 30 de noviembre de 2025 ● Informe de noviembre de 2025. Fecha de entrega: 17 de diciembre de 2025 ● Informe de diciembre de 2025. Fecha de entrega: 14 de enero de 2026 ● Informe de enero de 2026. Fecha de entrega: 11 de febrero de 2026 ● Informe de febrero de 2026. Fecha de entrega: 19 de marzo de 2026	Carpeta_Anexo-17_Entrega informes gcr-p1-f7 • Anexo-17.1-Entrega informe Agosto 2025 • Anexo-17.2-Entega informe septiembre 2025 • Anexo-17.3_Entrega informe Octubre2025 • Anexo-17.4_Entrega informe Noviembre 2025 • Anexo-17.5_Entrega informe Diciembre 2025 • Anexo-17.6_Entrega informe Enero 2026 • Anexo-17.7_Entrega informe Febrero
Obligación específica 17. Remitir mensualmente diligenciado y firmado, a más tardar el día siete (07) de cada mes, el formato de ejecución financiera GF-P7-F2v3 o la versión actualizada de la SDDE de los gastos realizados asociados a la bolsa de recursos del contrato. En caso de ser un día no hábil, se deberá allegar a más tardar el día hábil siguiente. Este informe debe ser entregado junto con el informe de ejecución financiera desagregada mensual.	Se dio cumplimiento a la elaboración y envío a la SDDE de los informes previstos Ver Anexo-13 • Informe noviembre 2025. Fecha de entrega el 9 de diciembre de 2025. • Informe de diciembre de 2025. Fecha de entrega: 8 de enero de 2026 • Informe de enero de 2026. Fecha de entrega: 9 de febrero de 2026 • Informe de febrero de 2026. Fecha de entrega: 10 de marzo de 2026	Carpeta_Anexo-18_Entrega informes GF-P7-F2v3 • Anexo-18.1_Entrega informe Noviembre 2025 • Anexo-18.2_Entrega informe Diciembre 2025 • Anexo-18.3_Entrega informe Enero 2026 • Anexo-18.4_Entrega informe Febrero 2026
Obligación específica 18. Reintegrar los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de ahorros donde se desembolsarán los recursos económicos de la bolsa, a más tardar el día tres (03) de cada mes, de acuerdo con lo previsto en la norma que aplica a entidades del Distrito y	Se dio cumplimiento al reintegro de los rendimientos financieros de los siguientes meses: - Noviembre. Se realizó el pago el 10 de diciembre de 2025 - Diciembre. Se realizó el pago el 7 de enero de 2026 - Enero Se realizó el pago el 5 de febrero de 2026 - Febrero. Se realizó el pago el 4 de marzo de 2026	Carpeta_Anexo-19_Reintegro rendimientos financieros ● Anexo_19.1_Soporte de reintegro noviembre de 2025 ● Anexo_19.2_Soporte de reintegro diciembre de 2025

[1] Incluyendo el pago de este período

que conforman el Estatuto Orgánico del presupuesto Distrital. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Operativo Contable de la SDDE.		• Anexo_19.3_Soporte de reintegro enero 2026 • Anexo_19.4_Soporte de reintegro febero 2026
Obligación específica 19. Realizar y presentar un informe de ejecución financiera desagregada mensual de la bolsa de recursos para la implementación de los Váucher de Productividad, con sus respectivos soportes en el cual se detallen los desembolsos realizados. Estos deberán ser entregados junto con el formato de ejecución financiera GF-P7-F2v3 o la versión actualizada de la SDDE.	El informe con corte a marzo 31 de 2026 se entregará en el mes de abril de 2026, el refleja los cupones pagados durante este mes.	No aplica
Obligación específica 20. Realizar un informe final técnico y administrativo en el formato que la SDDE disponga para tal fin.	Para este periodo del informe no se ha realizado actividades para esta obligación	No aplica
Obligación específica 21. Realizar un informe financiero final desagregado del contrato en el cual se detallen los desembolsos de la bolsa realizados desde el inicio hasta su terminación**.**	Para este periodo del informe no se ha realizado actividades para esta obligación	No aplica
Obligación específica 22. Autorizar a la SDDE el acceso, manejo y conservación de la información suministrada con la debida protección de la reserva de la información, según la normatividad aplicable al caso.	Se autoriza a la SDDE en el acceso, manejo y conservación de la información que se generará en el desarrollo del proyecto. Para esto, se anexa un documento de autorización a la SDDE de acceso a la información del Contrato de Prestación de Servicios No. 902-2025.	Anexo-24_Documento_Autorización. Acceso información.pdf
Obligación específica 23. Cumplir con la política de tratamiento de datos Ley 1581 de 2012 y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen.	La UT está dando cumplimiento a la política de tratamiento de datos Ley 1581 de 2012 y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen.	Anexo-25_Documento Cumplimiento Política Datos.pdf

[1] Incluyendo el pago de este período

Obligación específica 24. Ejercer el rol de secretaría técnica del contrato.	Dando cumplimiento a lo establecido La UT en Tecnalia Proyectamos, cuenta con el rol de la secretaría técnica a la fecha del presente informe se han generado las siguientes actas: - Comité de inicio de la ejecución del contrato, realizado el 28 de agosto de 2025. - Comité Técnico No. 1, realizado el 30 de septiembre de 2025. - Comité Técnico No. 2, realizado el 30 de octubre de 2025. - Comité Técnico No. 3, realizado el 29 de noviembre de 2025. - Comité Técnico No. 4, realizado el 29 de diciembre de 2025 - Comité Técnico No. 5, realizado el 30 de enero de 2026 - Comité Técnico No. 6, realizado el 27 de febrero de 2026 - Comité Técnico No. 7, realizado el 31 de marzo de 2026. Asimismo, se ha realizado un comité extraordinario el 13 de febrero de 2026	Carpeta_Anexo-23 Soportes rol secretaría Técnica, en donde se encuentran: ● Anexo 23.1 Reunión de inicio ● Anexo 23.2 Comité 01 Sep_2025 ● Anexo 23.3 Comité 02 Oct_2025 ● Anexo 23.4 Comité 03 Nov_2025 ● Anexo 23.5 Comité 04 Dic_2025 ● Anexo 23.6 Comité 05 Ene_2026 ● Anexo 23.7 Comité Extraordinario 01 ● Anexo 23.8 Comité 06 Feb_2026 ● Anexo 23.9 Comité 07 Mzo_2026
Obligación específica 25. Todas aquellas adicionales que sean requeridas para la correcta ejecución del Contrato.	No se han presentado requerimiento adicionales a la fecha del presente informe.	No aplica

Utilice las filas que sean necesarias. (2) Relacione los registros que soportan el avance de la actividad: actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, informes, etc.), indicando el número de radicación para los oficios y memorandos.

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
Producto 1. Documento que contenga el Plan de trabajo y Cronograma del programa que incluya las herramientas de seguimiento y control a los beneficiarios, proveedores y calidad de los bienes y servicios a entregar mediante los Váuchers de Productividad. Asimismo, el	Carpeta _Anexo-2_Producto entregable 1 Se realizó la entrega con el pago 01 en 19 Septiembre de 2025. (Antes de la adición 2) **Modificación No.2 CPS 902-2025 Adición No.2 -Prórroga No.1** Documento que contenga el Plan de trabajo y Cronograma de la adición No. 2 y prórroga No. 1 del programa, que incluya las herramientas de seguimiento y control a los beneficiarios,	100%

[1] Incluyendo el pago de este período

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
cronograma deberá ser estructurado por fases y semanas de acuerdo con la fecha de inicio y la fecha de finalización del contrato. **Producto 1.** Documento que contenga el Plan de trabajo y Cronograma de la adición No. 2 y prórroga No. 1 del programa, que incluya las herramientas de seguimiento y control a los beneficiarios, proveedores y calidad de los bienes y servicios a entregar mediante los Váuchers de Productividad- Cupón. Asimismo, el cronograma deberá ser estructurado por fases y semanas de acuerdo con la fecha de inicio y la fecha de finalización del contrato. Nota: Actualizado en la modificación No. 1	proveedores y calidad de los bienes y servicios a entregar mediante los Váuchers de Productividad- Cupón. Asimismo, el cronograma deberá ser estructurado por fases y semanas de acuerdo con la fecha de inicio y la fecha de finalización del contrato. Se realizó la entrega con el informe de ejecución - GCR-P1-F7- del Pago 03 de la operación estratégica del programa, el 12 de diciembre de 2025.	
Producto 2. Documento que contenga la metodología para: • Selección de los beneficiarios (tener en cuenta los requisitos del numeral 2.4 de este documento). El contratista deberá garantizar que las empresas a beneficiar con los Váucher de Productividad cumplan con los requisitos establecidos por la SDDE. • Selección de proveedores de servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación o de aquellos que permitan el aumento de la productividad empresarial. • Administración, asignación, desembolso y transferencia de recursos. • Manejo y deserción de las empresas	Carpeta _Anexo-3_Producto entregable- 12 archivos – Entregado con el Pago 002 del 19 de noviembre de 2025 De acuerdo con lo aprobado en el comité extraordinario No.1 en donde se sometió a aprobación el cambio de los requisitos habilitantes para los proveedores externos, dejando como único requisito en su registro el certificado de existencia y representación legal de la empresa, los demás requisitos inicialmente solicitados se exigieron para el proceso de pago, se generó ajuste a la metodología.	100%

[1] Incluyendo el pago de este período

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
beneficiarias de la Estrategia Bogotá Productiva Innovadora. • Propuesta de evento de cierre del programa. • Realizar las visitas de verificación de uso de bienes y servicios suministrados a las empresas beneficiarias, así como, el cuestionario de apoyo para estas.		
Producto 3. Documento que contenga la estructura de la herramienta tecnológica de seguimiento que debe contener: • Recolección de requerimientos funcionales y no funcionales. • Diseñar los casos de uso de la herramienta tecnológica. • La Arquitectura de solución • Las integraciones (si la aplicación lo requiere). • El plan de dimensionamiento de capacidad. • La definición de Sprints (actividades, tiempo total, fecha de inicio y fin) para el abordaje de cada una de las actividades del producto. • El plan de pruebas. • El diccionario de datos de la Base de datos. • Matriz de gestión de riesgos. • Especificaciones técnicas necesarias para despliegue • Diseño detallado de la solución y demás ítems que el contratista considere necesario.	Carpeta_Anexo-4_Producto entregable 3 - Entregado con el Pago 001 de 19 de septiembre de 2025- 3 archivos.	100%
Producto 4. Un prototipo que defina las funcionalidades esenciales de la herramienta tecnológica.	Carpeta_Anexo-5_Producto entregable 4 - Entregado con el Pago 001 de 19 de septiembre de 2025- 3 archivos.	100%

[1] Incluyendo el pago de este período

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
Producto 5. Documento con los términos de referencia que incluya: el formulario de inscripción, la especificación de los soportes requeridos para el cumplimiento de requisitos mínimos y criterios y el formato del PIP con la propuesta de evaluación. Producto 5. Documento con los Términos de Referencia y adendas de la convocatoria, en donde, se incluya la proyección de 679 empresas a beneficiar y que además permita diferenciar las postulaciones a Váucher de Productividad -Cupón Tradicional y Váucher de Productividad -Cupón por Obras.	Carpeta_Anexo-6_Producto entregable 5 - 9 archivos. Entregado con el Pago 002 de 19 de noviembre de 2025	100%
Producto 6. Formulario de postulación en línea	Carpeta_Anexo-7_Producto entregable 6-3 archivos. Entregado con el Pago 002 de 19 de noviembre de 2025	100%
Producto 7. Repositorio digital con su lista de chequeo de la verificación realizada por el contratista a cada una de las empresas postuladas mediante el formulario. 679 empresas.	Carpeta_Anexo-8_Producto entregable 7 - 3 archivos. Entregado con el Pago 002 de 19 de noviembre de 2025 (454 empresas). A Marzo 31 de 2026 se cuenta con 1154 Postulaciones con su correspondiente repositorio documental y registro correspondiente en la Base control Verificación y revisión documental postulaciones empresas, corresponden a 835 postulaciones de empresas Cupón tradicional, 127 empresas Cupón Obras, 188 personas naturales. Soportes cumplimiento: -Anexo_15.1_Anexo-15_Base_control_Verificación y revisión documental postulaciones empresas. **Carpeta-Anexo-15_Producto 7_Repositorio digital con lista chequeo empresas postuladas** ● Anexo-15.1_Base control Verificación y revisión documental postulaciones empresas.xlsx ● Link repositorio digital: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1W5A0FLpClhwmrJ4WH_dgKEIvgHoSq0hA	170%

[1] Incluyendo el pago de este período

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
	Producto Entregable 7. Adición 1 Obras. Repositorio digital con su lista de chequeo de la verificación realizada por el contratista a cada una de las empresas postuladas a la modalidad 2- CupÓN Obras mediante el formulario en línea. A la fecha de corte se cuenta con 127 empresas Cupón obras postuladas. **Carpeta_Anexo-2_Producto entregable 7 Adición 1 -Obras** ● Anexo 2-Producto 07 Repositorio digital y lista chequeo ● Anexo 2.1-Herramienta registro y control postulaciones Formato.xlsx ● Anexo_2.2 Lista chequeo verificación postulaciones con link a repositorio digital	
Producto 8. Documento de evaluación del plan de inversión de productividad de cada una de las empresas. 679 empresas.	Carpeta_Anexo-9_Producto entregable 8 - 3 archivos. Entregado con el Pago 002 de 19 de noviembre de 2025 (454 empresas antes de adiciones al contrato). A Marzo 31 de 2026 se cuenta con 687 PIP con su correspondiente evaluación 583 corresponden a empresas Cupón tradicional y 104 a empresas Cupón obras. **Carpeta__Anexo-3_Producto entregable 8-Tradicionales** ● Anexo 3.1 Formato_Documento evaluación PIP_V1.0 ● Anexo 3.2 Soportes PIP Evaluados_tradicionales ● Anexo 3.3 Soportes PIP Evaluados_obras	101,18%
Producto 9. Documento que contenga la metodología de la asistencia técnica de la evaluación de los ítems de los Planes de Inversión de Productividad. 679 empresas.	Carpeta_Anexo-10_Producto entregable 9 - 5 archivos. Entregado con el Pago 002	100%
Producto 10. Soporte de la asistencia técnica realizada conforme a los lineamientos establecidos por la SDDE. 679 empresas.	En el 2025 se consolidaron 422 asistencias técnicas efectivas, donde, 421 empresas de Cupón Tradicionales y 1 empresa de Cupón de obras. Ver Anexos 4.1 y 4.2. En el mes de enero de 2026 se consolidaron por parte del equipo consultor un total de 88 asistencias técnicas efectivas, dónde, 54 son de Cupón Tradicional y 34 son de Cupón Obras, en estos se	83,36%

[1] Incluyendo el pago de este período

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
	puede evidenciar la aprobación de las asistencias técnicas y el PIP ajustado. En el mes de febrero de 2026 se consolidaron por parte del equipo consultor un total de 25 asistencias técnicas efectivas, dónde, 14 son de Cupón tradicional y 11 de Cupón obras. En el mes de marzo de 2026 se consolidaron por parte del equipo consultor un total de 31 asistencias técnicas efectivas, dónde, 25 son de Cupón tradicional y 6 de Cupón obras. A la fecha de corte se cuenta con un acumulado de 566 asistencias técnicas efectivas 514 son de Cupón Tradicional y 52 son de Cupón Obras. Ver Anexo 4 **Carpeta_Anexo-4_Producto_Entregable_10-Soporte AT-Avance** • Anexo 4.1 Listado 422 AT efectivas • Anexo 4.2 Soportes AT efectivas 2025 • Anexo 4.3 Soportes AT efectivas enero • Anexo 4.4 Listado 510 AT efectivas • Anexo 4.5 Soportes AT efectiva febrero • Anexo 4.6 Listado 535 AT efectivas • Anexo 4.7 Soportes AT efectiva marzo • Anexo 4.8 Listado 566 AT efectivas	
Producto 11. Listado de las 454 empresas beneficiarias que han aprobado el PIP, así como, la evidencia de su aprobación. 679 empresas.	Carpeta_Anexo-12_Producto entregable 11-1 archivos y 1 carpeta con 454 subcarpetas. Entregado con el Pago 002 19 de noviembre de 2025 Con la gestión del mes de marzo, se cuenta con 45 aprobaciones más, de las cuales 36 corresponden a empresas Cupón Tradicional y 9 a empresas Cupón Obras. A Marzo 31 de 2026, se cuenta con 625 empresas que han aprobado la evaluación del PIP, de las cuales corresponden 562 Cupón tradicional y 63 empresas Cupón obras	92.05%

[1] Incluyendo el pago de este período

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
	Carpeta_Anexo-5_Producto_Entregable_11-Empresas aprobación PIP y_Soporte-Avance ● Anexo 5.1_Listado de las 454 empresas que han aprobado el PIP ● Anexo 5.2_Carpeta 454 PIPS evaluados y soporte de aprobación ● Anexo 5.3_Listado de las 547 empresas que han aprobado el PIP ● Anexo 5.4 Aprobaciones Evaluaciones PIP mes-ene ● Anexo 5.5_Listado de las 580 empresas que han aprobado el PIP ● Anexo 5.6_ Aprobaciones Evaluaciones PIP mes-feb ● Anexo 5.7_Listado de las 625 empresas que han aprobado el PIP ● Anexo 5.8 Aprobaciones Evaluaciones PIP mes-mzo	
Producto 12. 454 Planes de Inversión de Productividad. 679 empresas.	A la fecha se cuenta con 751 empresas con Plan de inversión de productividad, 634 corresponden a empresas Cupón tradicional y 117 de obras. **Carpeta_Anexo-16_Producto_12_Empresas con PIP** ● Anexo-16.1_Empresas con Plan de inversión de productividad	110.60%
Producto 13. Manual de uso de la herramienta tecnológica y Manual de despliegue y configuración.	Carpeta_Anexo-14_Producto entregable 13-3 archivo. Entregado con el Pago 002	100%
Producto 14. Código Fuente de la herramienta tecnológica y proceso de catalogación en el repositorio de la SDDE.	Carpeta_Anexo-15_Producto entregable 14-4 archivos y 1 carpeta. Entregado con el Pago 002	100%
Producto 15. Puesta en producción de la herramienta sistematizada de seguimiento y control en donde se evidencie los indicadores y resultados del programa en tiempo real, el informe de pruebas realizadas. Así como, la transferencia de conocimiento de la implementación de la solución a nivel general.	Carpeta_Anexo-16_Producto entregable 15-4 archivos. Entregado con el Pago 002 del 19 de noviembre de 2025	100%
Producto 16. 454 acuerdos de servicios firmados entre la empresa y el contratista.	A la fecha de corte, se cuenta con 518 acuerdos de servicios firmados entre las empresas y el operador, de los cuales 467	76.29%

[1] Incluyendo el pago de este período

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
679 empresas.	corresponden a empresas Cupón tradicional y 51 empresas Cupón obras **Carpeta_Anexo-7_Producto_Entregable_16-Acuerdos de servicios firmados** ● Anexo_7.1 Empresas Cupón tradicional ● Anexo_7.2 Empresas Cupón Obras	
Producto 17. Un formato diligenciado por cada una de las empresas que contiene el proceso de cotización y selección de los proveedores de servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación o de aquellos que permitan el aumento de la productividad empresarial, de acuerdo con: • Cotizaciones realizadas (mínimo 3 cotizaciones, si estas no se suplen con los proveedores del Banco de Oferentes, el contratista deberá cotizar con proveedores externos). • Selección de la cotización de menor valor, presentada por los proveedores de servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación o de aquellos que permitan el aumento de la productividad empresarial.	Se cuenta con base maestra de cotizaciones la cual es alimentada directamente del formulario google forms de cotizaciones, cuenta con el registro de cada cotización y la evaluación de las cotizaciones acorde a los criterios establecidos. A marzo 31 de 2026, 322 empresas cuentan con las 3 cotizaciones y con proveedor asignado, 304 de las cuales 282 corresponden a empresas Cupón tradicional y 22 Cupón Obras. Anexo 9.4 Proveeduría Cotizaciones .xlsx	47,42%
Producto 18. Informe donde se evidencie los indicadores y resultados del programa a la fecha y su desempeño.	A la fecha del presente informe no se ha presentado este producto.	0%
Producto 19. 454 acuerdos de calidad de servicios firmados por el contratista, el o los proveedores de servicios de innovación o productividad y la empresa beneficiaria. 679 empresas.	A la fecha de corte, se cuenta con 184 acuerdos de calidad de servicios firmados por proveedores, empresas y el operador, de los cuales 170 corresponden a empresas Cupón tradicional y 14 a empresas Cupón obras Ver Anexos 11.1 y 11.2. **Carpeta_Anexo-11_Producto_Entregable_19 -Acuerdos de calidad de servicios firmados** ● Anexo_11.1 Empresas Cupón tradicional ● Anexo_11.2 Empresas Cupón Obras	27,10%

[1] Incluyendo el pago de este período

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
Producto 20. Informes que indiquen las actividades técnicas y financieras desarrolladas, el proceso de gestión y desembolso de los recursos para cada una de las empresas acompañadas, que contengan el resultado de la ejecución de los Planes de Inversión, según las directrices establecidas por la SDDE hasta la fecha.	A la fecha del presente informe no se ha presentado este producto.	0%
Producto 21. Documento de avance que evidencie el seguimiento y verificación a la implementación de los PIP hasta la fecha.	A la fecha del presente informe no se ha presentado este producto.	0%
Producto 22. Formatos de satisfacción de bienes y servicios firmados por las empresas beneficiarias que se tengan hasta la fecha.	A la fecha se cuenta con 21 formatos de recibidos a satisfacción, de los cuales 19 corresponden a empresas Cupón tradicional y 2 a empresas Cupón obras. Carpeta_ Anexo-26 Producto **Entregable 22 Avance-REC** ● Anexo 26.1 Tradicionales ● Anexo 26.2 Obras	3,09%
Producto 23. Cuestionarios diligenciados en las visitas a las empresas beneficiarias que se tengan hasta la fecha.	A la fecha del presente informe no se ha presentado este producto.	0%
Producto 24. Documento que evidencie la planeación del evento de cierre en el que se detalle la metodología, el minuto a minuto, la agenda y otros aspectos relevantes para el desarrollo de este. Así mismo, se deberá contar con un espacio para que las empresas que se destacaron en el programa socialicen los resultados de la implementación de los Váuchers de Productividad.	En el producto 02 Anexo-3-Producto-02-Metodología de implementación del programa se encuentra la propuesta completa del evento de cierre.	60%
Producto 25. Listado de asistencia y memorias del evento, en donde, se pueda evidenciar los testimonios de algunas de las empresas acompañadas.	A la fecha del presente informe no se ha presentado este producto.	0%

[1] Incluyendo el pago de este período

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados	% Ejecución
Producto 26. Informe final de resultados que contenga los retos, lecciones aprendidas e indicadores de la ejecución del programa.	A la fecha del presente informe no se ha presentado este producto.	0%
Producto 27. Levantamiento de información SUIM (Sistema Único de Información Misional de la SDDE) de acuerdo con los lineamientos entregados por la SDDE.	A la fecha de corte se ha realizado un levantamiento de 81 Registros de unidades productivas y beneficiarios. Carpeta_Anexo22_Producto_27_Levantamiento_información SUIM ● Anexo 22.1 SUIM_Formalización información pdf ● Anexo 22.2 Reporte_Beneficiarios 81 EMPRESAS.xlsx ● Anexo 22.3 Reporte_Unidad_Productiva 81 EMPRESAS.xls	11,93%
Producto 28. Medición del índice de productividad en la herramienta entregada por la SDDE, esta medición se debe realizar al inicio y final de la intervención hasta la fecha.	A la fecha de corte se han enviado 594 solicitudes a empresas para el diligenciamiento inicial envío de correo personalizado desde el correo consultoria@tecnaliacolombia.org, acorde a lineamientos recibidos a la fecha por la SDDE. Link instrumento de recolección: https://survey123.arcgis.com/share/dce488e25980408ca26824c6b264c327 **Carpeta__Anexo-12_Producto_Entregable_28_Recolección índice productividad-Avance** ● Anexo-12.1-Base control gestión ● Anexo-12.2-Soporte correos enviados	43,74%
Producto 29. Carpeta digital con su lista de chequeo por cada una de las empresas que contendrá los documentos de la implementación del Váucher de Productividad.	A la fecha del presente informe no se ha presentado este producto.	0%

Utilice las filas que sean necesarias. Anexe los productos que correspondan al período.

Relacione los productos entregados, los cuales deben guardar estricta relación con lo efectivamente pactado, y para el caso de bienes debe detallar su traslado al almacén con el respectivo documento soporte.

[1] Incluyendo el pago de este período

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
Producto 1. Documento que contenga el Plan de trabajo y Cronograma del programa que incluya las herramientas de seguimiento y control a los beneficiarios, proveedores y calidad de los bienes y servicios a entregar mediante los Váuchers de Productividad. Asimismo, el cronograma deberá ser estructurado por fases y semanas de acuerdo con la fecha de inicio y la fecha de finalización del contrato.	Se realizó la entrega en el pago 001. En el marco de la adición 2 y prórroga 1, se elabora el plan de trabajo y cronograma proyectado hasta el 30 de abril de 2026, teniendo en cuenta la modalidad de cupón tradicional y de obras.	No hay actualización para el presente informe
Producto 2. Documento que contenga la metodología para: • Selección de los beneficiarios (tener en cuenta los requisitos del numeral 2.4 de este documento). El contratista deberá garantizar que las empresas a beneficiar con los Váucher de Productividad cumplan con los requisitos establecidos por la SDDE. • Selección de proveedores de servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación o de aquellos que permitan el aumento de la productividad empresarial. • Administración, asignación, desembolso y transferencia de recursos. • Manejo y deserción de las empresas beneficiarias de la Estrategia Bogotá Productiva Innovadora. • Propuesta de evento de cierre del	Para la construcción la metodología se verificó el cumplimiento de lo establecido en el anexo técnico, se realizó un trabajo interdisciplinario al interior del equipo operador, cada experto aportó elementos fundamentales para incorporar en este documento teniendo en cuenta que lo definido se debe llevar a manejo operativo de sus diferentes elementos Se realizó la entrega en el pago 002: CR-P1-F7- del Pago 02 de la Bolsa de Recursos del programa, el 19 de noviembre de 2025.En el mes de febrero se presentó ajustes a la metodología	Se realiza actualización de la Metodología se envía a la SDDE https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ga8Hudlz3B4l2TmjioOblgJhKpwcHWoM

[1] Incluyendo el pago de este período

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
programa. • Realizar las visitas de verificación de uso de bienes y servicios suministrados a las empresas beneficiarias, así como, el cuestionario de apoyo para estas.		
Producto 3. Documento que contenga la estructura de la herramienta tecnológica de seguimiento que debe contener: • Recolección de requerimientos funcionales y no funcionales. • Diseñar los casos de uso de la herramienta tecnológica. • La Arquitectura de solución • Las integraciones (si la aplicación lo requiere). • El plan de dimensionamiento de capacidad. • La definición de Sprints (actividades, tiempo total, fecha de inicio y fin) para el abordaje de cada una de las actividades del producto. • El plan de pruebas. • El diccionario de datos de la Base de datos. • Matriz de gestión de riesgos. • Especificaciones técnicas necesarias para despliegue • Diseño detallado de la solución y demás ítems que el contratista considere necesario.	Se realizó la entrega en el pago 001 en 19 Septiembre de 2025. (Antes de la adición 2) https://drive.google.com/drive/folders/1LY9aXQ3XoVA3BGMORmJhyXy87iXcHBv9?usp=drive_link	No hay actualización para el presente informe

[1] Incluyendo el pago de este período

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
Producto 4. Un prototipo que defina las funcionalidades esenciales de la herramienta tecnológica.	Se realizó la entrega en el pago 001 el 19 Septiembre de 2025. (Antes de la adición 2). https://drive.google.com/drive/folders/1LY9aXQ3XoVA3BGMORmJhyXy87iXcHBv9?usp=drive_lin	No hay actualización para el presente informe
Producto 5. Documento con los términos de referencia que incluya: el formulario de inscripción, la especificación de los soportes requeridos para el cumplimiento de requisitos mínimos y criterios y el formato del PIP con la propuesta de evaluación.	Mediante Trabajo conjunto con la SDDE y acorde a sus lineamientos se estructuró el documento y anexos, se incorporaron elementos con el fin de asegurar la correcta selección de las empresas y transparencia del proceso, los TDR fueron requisito fundamental para dar apertura a la convocatoria del programa, la cual se llevó a cabo el 11 de septiembre de 2025. Del mismo modo, se realizó la versión 2 de los términos de referencia donde se incluyen dos modalidades de cupones: tradicionales y de obras. Se realizó la entrega en el pago 002: CR-P1-F7- del Pago 02 de la Bolsa de Recursos del programa, el 19 de noviembre de 2025.https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CEXhhMmtmCrf58H-VyB-mzYmECZMF-jE	No hay actualización para el presente informe
Producto 6. Formulario de postulación en línea	Acorde a lo establecido en el Anexo técnico y alineados con los requisitos habilitantes definidos en el los términos de referencia del programa, el operador construyó micrositio y formulario de registro. La SDDE optó por utilizar micrositio en su sitio web, el link establecido https://desarrolloeconomico.gov.co/cupon/,	No hay actualización para el presente informe

[1] Incluyendo el pago de este período

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
	desde donde se ingresa al formulario de postulación en línea, link: https://tecnaliacolombia.org/postulacion-de-empresas-activa-tu-negocio-con-cupon/#register-form	
Producto 7. Repositorio digital con su lista de chequeo de la verificación realizada por el contratista a cada una de las empresas postuladas mediante el formulario.	Acorde a lo establecido en el anexo técnico se elaboró se realizó estructuración del Repositorio digital teniendo en cuenta el orden de postulación de las empresas y el orden de registro de los requisitos habilitantes definidos en los términos de referencia del programa Se realizó la entrega en el pago 002 de las 454 empresas iniciales (Antes de modificaciones al contrato CPS 902-2025). Se realizó Modificación No.1 adición No.1 al contrato de prestación de servicios 902-2025 para apoyar a 108 empresas ubicadas en las zonas de influencia por la construcción del metro de Bogotá. -A marzo 31 de 2026 se cuenta con 127 empresas de obras postuladas que cuentan con su correspondiente lista de chequeo. Se realizó Modificación No.2 adición No.2 al contrato de prestación de servicios 902-2025 para apoyar a 117 empresas más de Cupón tradicional. Total empresas programa 679. -A Marzo 31 de 2026 se cuenta con 1154 Postulaciones con su correspondiente repositorio documental y registro	**Carpeta_Anexo-2_Producto entregable 7 Adición 1 -Obras** ● Anexo 2-Producto 07 Repositorio digital y lista chequeo ● Anexo 2.1-Herramienta registro y control postulaciones Formato.xlsx ● Anexo_2.2 Lista chequeo verificación postulaciones con link a repositorio digital **Carpeta-Anexo-15_Producto 7_Repositorio digital con lista chequeo empresas postuladas** ● Anexo-15.1_Base control Verificación y revisión documental postulaciones empresas.xlsx ● Link repositorio digital: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1W5A0FLpClhwmrJ4WH_dgKEIvgHoSq0hA

[1] Incluyendo el pago de este período

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
	correspondiente en la Base control Verificación y revisión documental postulaciones empresas, corresponden a 835 postulaciones de empresas Cupón tradicional, 127 empresas Cupón Obras, 188 personas naturales. **Producto Entregable 7- Obras.** Adición 1 Obras. Repositorio digital con su lista de chequeo de la verificación realizada por el contratista a cada una de las empresas postuladas a la modalidad 2- CupÓN Obras mediante el formulario en línea. A la fecha de corte se cuenta con 127 empresas Cupón obras postuladas. Ver Anexos 2, 2.1 y 2.2.	
Producto 8. Documento de evaluación del plan de inversión de productividad de cada una de las empresas.	Documento de evaluación del Plan de Inversión de Productividad de cada una de las empresas (571 empresas. Cupón Tradicional. Se realizó la entrega como soporte del pago 02 del 19 de noviembre de 2025. A la fecha de corte se cuenta con 687 empresas que cuentan con la evaluación. 583 corresponden a empresas Cupón tradicional y 104 Cupón obras. Ver Anexos 3, 3.1, 3.2 y 3.3	**Carpeta__Anexo-3_Producto entregable 8-Tradicionales** ● Anexo_3-Producto _12_ Empresas con Evaluación PIP ● Anexo 3.1 Formato_Documento evaluación PIP_V1.0 ● Anexo 3.2 Soportes PIP Evaluados_tradicionales ● Anexo 3.3 Soportes PIP Evaluados_obras

[1] Incluyendo el pago de este período

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
Producto 9. Documento que contenga la metodología de la asistencia técnica de la evaluación de los ítems de los Planes de Inversión de Productividad.	Dentro de la metodología de la asistencia técnica se generó documento de evaluación de los Planes de Inversión de Productividad PIP,Entregado en el Pago 002 de 454 empresas Se realizó la entrega en el pago 002 A Marzo 31 de 2026 se cuenta con 686 PIP con su correspondiente evaluación 582 corresponden a empresas Cupón tradicional y 104 a empresas Cupón obras. Acorde a lo establecido en el anexo técnico se realizó construcción de la metodología de asistencia técnica con el fin asegurar dos acciones dos acciones fundamentales orientadas al fortalecimiento empresarial: 1. la formulación de planes o proyectos de inversión enfocados en el incremento de la productividad y/o la innovación, y 2. la implementación de procesos de acompañamiento o asistencia técnica. Se realizó la entrega en el pago 002 el 19 de noviembre de 2025.	No hay actualización para el presente informe
Producto 10. Soporte de la asistencia técnica realizada conforme a los lineamientos establecidos por la SDDE. 679 empresas.	En el 2025 se consolidaron 422 asistencias técnicas efectivas, donde, 421 empresas de Cupón Tradicionales y 1 empresa de Cupón de obras. Ver Anexos 4.1 y 4.2. En el mes de enero de 2026 se consolidaron por parte del equipo consultor un total de 88 asistencias técnicas efectivas, dónde, 54 son de Cupón Tradicional y 34 son de Cupón Obras, en estos se puede evidenciar la aprobación de las asistencias técnicas y el PIP ajustado.	**Carpeta_Anexo-4_Producto_Entregable_10-Soporte AT-Avance** ● Anexo 4.1 Listado 422 AT efectivas ● Anexo 4.2 Soportes AT efectivas 2025 ● Anexo 4.3 Soportes AT efectivas enero ● Anexo 4.4 Listado 510 AT efectivas

[1] Incluyendo el pago de este período

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
	En el mes de febrero de 2026 se consolidaron por parte del equipo consultor un total de 25 asistencias técnicas efectivas, dónde, 14 son de Cupón tradicional y 11 de Cupón obras. En el mes de marzo de 2026 se consolidaron por parte del equipo consultor un total de 31 asistencias técnicas efectivas, dónde, 25 son de Cupón tradicional y 6 de Cupón obras. A la fecha de corte se cuenta con un acumulado de 566 asistencias técnicas efectivas 514 son de Cupón Tradicional y 52 son de Cupón Obras. Ver Anexo 4	• Anexo 4.5 Soportes AT efectiva febrero • Anexo 4.6 Listado 535 AT efectivas • Anexo 4.7 Soportes AT efectiva marzo • Anexo 4.8 Listado 566 AT efectivas
Producto 11. Listado de las 454 empresas beneficiarias que han aprobado el PIP, así como, la evidencia de su aprobación.	Se realizó evaluación de los Planes de Inversión de Productividad PIP a un total de 454 empresas elegibles Se realizó la entrega en el pago 002 Se realizó adición No.1 al contrato de prestación de servicios 902 para apoyar a 108 empresas ubicadas en las zonas de influencia por la construcción del metro de Bogotá. A la fecha de corte, se cuenta con 622 empresas que han aprobado la evaluación del PIP, de las cuales 559 corresponden a empresas Cupón tradicional y 63 empresas Cupón obras.	https://drive.google.com/drive/folders/1cV5nkpjqwvIIiEZMNuGdU7je81c0-KPL?usp=drive_link Anexo 5.1 Empresas Cupón tradicional Anexo 5.2 Empresas Cupón Obras
Producto 12. 454 Planes de Inversión de Productividad. 679 empresas.	A la fecha se cuenta con 751 empresas con Plan de inversión de productividad, 634 corresponden a empresas Cupón tradicional y 117 de obras.	**Carpeta_Anexo-16_Producto_12_Empresas con PIP** Anexo-16.1_Empresas con Plan de inversión de productividad
Producto 13. Manual de uso de la herramienta tecnológica y Manual de despliegue y configuración.	Se estructuró documento que presenta la forma de uso de la herramienta tecnológica teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico se	No hay actualización para el presente informe

[1] Incluyendo el pago de este período

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
	integró a este documento el procedimiento de instalación de la herramienta, también se trabajó en las especificaciones para el despliegue de la misma. Se realizó la entrega en el pago 002	
Producto 14. Código Fuente de la herramienta tecnológica y proceso de catalogación en el repositorio de la SDDE.	Acorde a la estructura definida por la herramienta open source vtiger seleccionada, se descargó del servidor previsto por el operador el código fuente de la herramienta con la misma estructura establecida para ser entregado a la SDDE	No hay actualización para el presente informe
Producto 15. Puesta en producción de la herramienta sistematizada de seguimiento y control en donde se evidencie los indicadores y resultados del programa en tiempo real, el informe de pruebas realizadas. Así como, la transferencia de conocimiento de la implementación de la solución a nivel general.	Se definió servidor exclusivo para la herramienta del programa 100% online y asegurando que la herramienta de respuesta acorde a lo definido en el anexo técnico del programa, se realizaron pruebas funcionales basados en el manual de uso. Se realizó la entrega en el pago 002	No hay actualización para el presente informe
Producto 16. 454 acuerdos de servicios firmados entre la empresa y el contratista. 679 empresas.	A la fecha de corte, se cuenta con 518 acuerdos de servicios firmados entre las empresas y el operador, de los cuales 467 corresponden a empresas Cupón tradicional y 51 empresas Cupón obras. **Carpeta_Anexo-7_Producto_Entregable_16-Acuerdos de servicios firmados** ● Anexo_7.1 Empresas Cupón tradicional Anexo_7.2 Empresas Cupón Obras	
Producto 17. Un formato diligenciado por cada una de las empresas que	Se cuenta con base maestra de cotizaciones la cual es alimentada directamente del formulario	Anexo 9.4 Proveeduría Cotizaciones .xlsx

[1] Incluyendo el pago de este período

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
contiene el proceso de cotización y selección de los proveedores de servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación o de aquellos que permitan el aumento de la productividad empresarial, de acuerdo con: • Cotizaciones realizadas (mínimo 3 cotizaciones, si estas no se suplen con los proveedores del Banco de Oferentes, el contratista deberá cotizar con proveedores externos). • Selección de la cotización de menor valor, presentada por los proveedores de servicios de Ciencia, Tecnología e Innovación o de aquellos que permitan el aumento de la productividad empresarial.	google forms de cotizaciones, cuenta con el registro de cada cotización y la evaluación de las cotizaciones acorde a los criterios establecidos. A marzo 31 de 2026, 322 empresas cuentan con las 3 cotizaciones y con proveedor asignado, 304 de las cuales 282 corresponden a empresas Cupón tradicional y 22 Cupón Obras.	
Producto 19. 454 acuerdos de calidad de servicios firmados por el contratista, el o los proveedores de servicios de innovación o productividad y la empresa beneficiaria. 679 empresas.	A la fecha de corte, se cuenta con 184 acuerdos de calidad de servicios firmados por proveedores, empresas y el operador, de los cuales 170 corresponden a empresas Cupón tradicional y 14 a empresas Cupón obras Ver Anexos 11.1 y 11.2.	**Carpeta_Anexo-11_Producto_Entregable_19 - Acuerdos de calidad de servicios firmados** • Anexo_11.1 Empresas Cupón tradicional • Anexo_11.2 Empresas Cupón Obras
Producto 22. Formatos de satisfacción de bienes y servicios firmados por las empresas beneficiarias que se tengan hasta la fecha.	A la fecha se cuenta con 21 formatos de recibidos a satisfacción, de los cuales 19 corresponden a empresas Cupón tradicional y 2 a empresas Cupón obras.	Carpeta__Anexo-26_Producto **Entregable 22 Avance-REC** • Anexo 26.1 Tradicionales • Anexo 26.2 Obras
Producto 24. Documento que evidencie la planeación del evento de cierre en el que se detalle la metodología, el minuto	En el producto 02 Anexo-3-Producto-02-Metodología de implementación del programa	No hay actualización para el presente informe

[1] Incluyendo el pago de este período

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
a minuto, la agenda y otros aspectos relevantes para el desarrollo de este. Así mismo, se deberá contar con un espacio para que las empresas que se destacaron en el programa socialicen los resultados de la implementación de los Váuchers de Productividad.	se encuentra la propuesta completa del evento de cierre.	
Producto 27. Levantamiento de información SUIM (Sistema Único de Información Misional de la SDDE) de acuerdo con los lineamientos entregados por la SDDE.	A la fecha de corte se ha realizado un levantamiento de 81 Registros de unidades productivas y beneficiarios.	Carpeta_Anexo22_Producto_27_Levantamiento_información SUIM ● Anexo 22.1 SUIM_Formalización información pdf ● Anexo 22.2 Reporte_Beneficiarios 81 EMPRESAS.xlsx Anexo 22.3 Reporte_Unidad_Productiva 81 EMPRESAS.xls
Producto 28. Medición del índice de productividad en la herramienta entregada por la SDDE, esta medición se debe realizar al inicio y final de la intervención hasta la fecha.	A la fecha de corte se han enviado 594 solicitudes a empresas para el diligenciamiento inicial envío de correo personalizado desde el correo consultoria@tecnaliacolombia.org, acorde a lineamientos recibidos a la fecha por la SDDE. Link instrumento de recolección: https://survey123.arcgis.com/share/dce488e25980408ca26824c6b264c327	**Carpeta__Anexo-12_Producto_Entregable_28_Recolección índice productividad-Avance** ● Anexo-12.1-Base control gestión ● Anexo-12.2-Soporte correos enviados
(1) informe que contenga el reporte de la selección del 100% de las empresas que recibirán el beneficio del Váucher de Productividad, su caracterización, el análisis de la revisión de los Planes de Inversión de Productividad aportados por las empresas en el marco de la	Se realiza informe con las 525 empresas seleccionadas de acuerdo con lo estipulado en los términos de referencia. Se entregó en diciembre 19 de 2025. Asimismo, se realiza informe que contiene el reporte de la selección del 17% de las empresas a beneficiar con la adición No. 2, es	Carpeta_Anexo-14_Informes selección empresas ● Anexo-14.1_Informe selección_empresas Programa Cupón PROPU. SDDE ● Anexo-14.2_Informe_selección empresas_adición_2

[1] Incluyendo el pago de este período

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS		
Indique Bien o Servicio entregado acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Actividades realizadas referentes a cada producto	Documentos Soporte
convocatoria. Bolsa de recursos Váucher- Cupones. un (1) informe que contenga el reporte de la selección de hasta 108 empresas que recibirán el beneficio del Váucher de Productividad, su caracterización, el análisis de la revisión de los Planes de Inversión de Productividad aportados por las empresas en el marco de la convocatoria. un (1) informe que contenga el reporte de la selección del 17% de las empresas a beneficiar con la adición No. 2, es decir, 20 empresas que recibirán el beneficio del Váucher de Productividad (cupón), su caracterización, el análisis de la revisión de los Planes de Inversión de Productividad aportados por las empresas hasta la fecha de presentación del informe, en el marco de la convocatoria, plan operativo y cronograma para contar con la selección de las hasta 117 empresas objeto de la adición No. 2, en el marco del Contrato de Prestación de Servicio No. 902-2025.	decir, 20 empresas que recibirán el beneficio del Váucher de Productividad (cupón), su caracterización, el análisis de la revisión de los Planes de Inversión de Productividad aportados por las empresas hasta la fecha de presentación del informe. Se entregó en diciembre 19 de 2025. Finalmente, se realiza informe con las 127 empresas postuladas de obras de las cuales han sido elegidas 104 empresas acorde con lo estipulado en los términos de referencia, correspondiente al primer desembolso de la adición 1 de obras.	• Anexo-14.3_Informe_selección empresas_adición_1

Utilice las filas que sean necesarias.

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS (CONVENIOS)				
Indique el tipo de beneficiarios definidos en el estudio previo. (Anexo técnico)	Indique el número de beneficiarios definidos en el estudio previo. (anexo técnico)	Indique el número de beneficiarios favorecidos en la ejecución del convenio	Porcentaje de cumplimiento (N. de beneficiarios favorecidos/ N. de beneficiarios definidos)	Documentos Soporte

[1] Incluyendo el pago de este período

Microempresas, pequeñas y medianas empresas	Contrato inicial: 454 cupones tradicionales Adición No. 1: 108 cupones de obras Adición No. 2: 117 cupones tradicionales	Cupón tradicional: 77 Cupón obras: 4 Total: 81	11.93%	No aplica

Utilice las filas que sean necesarias, de acuerdo con los aspectos técnicos definidos en el proceso contractual.

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
ITEM	**PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO** Año – Mes	**FECHA DE PAGO** Año – Mes – Día	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV
PENSION	No aplica	No aplica	No aplica
SALUD	No aplica	No aplica	No aplica
RIESGOS PROFESIONALES	No aplica	No aplica	No aplica
APORTES PARAFISCALES Carpeta Anexo _27-Soporte parafiscales Empresas UT	2026-03	- Fundación TECNALIA Colombia 08/04/2026 - PROYECTAMOS COLOMBIA SAS 01/04//2026	No aplica

BRIGITTE ELIZABETH MAYORGA JAIMES
Representante Legal
UT EN TECNALIA PROYECTAMOS

[1] Incluyendo el pago de este período

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	**Gestión Contractual**	**Código:**	**GCR-P1-F7**	BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	**6**	
		Fecha:	**8 de Marzo 2022**	
	Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios	**Página:**	**Página 50 de 50**	
		Elaborado por:	**Claudia Martín Naizaque Contratista OAJ**	
		Revisado por:	**Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ**	
		Aprobado por:	**Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe OAJ**	

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES FRENTE AL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y/O ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO **(desde 01/03/2026 hasta 31/03/2026)**
Toda la información correspondiente a las evidencias de este informe reposa en los repositorios de UT en Tecnalia Proyectamos y de la SDDE. Asimismo, es importante señalar que actualmente se encuentra en trámite en la Oficina Jurídica una solicitud de prórroga hasta el 30 de junio de 2026.

El supervisor manifiesta que los bienes y/o servicios derivados del presente contrato/convenio en el período del presente informe:

Cumplen: **x** No Cumplen:

A cabalidad las especificaciones técnicas y los requisitos pactados para suplir la necesidad que se pretendió al emprender su contratación.

Diego Pardo L.

DIEGO FERNANDO PARDO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD
DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN
SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 902 DE 2025.
Vo. Bo

Margarita Rubio G.

MARGARITA RUTH RUBIO GONZÁLEZ
SUBDIRECCIÓN INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD–
Contratista
Vo. Bo.

BRYAN CAMILO SUEK PEÑA CARDOZO
SUBDIRECCIÓN INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD–
Profesional Universitario
Vo. Bo.

MARIBETH RIVERA MORA
SUBDIRECCIÓN INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD–
Vo. Bo

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Contratista.

[1] Incluyendo el pago de este período
