ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

FECHA:	MAYO DE 2025

1. GENERALIDADES

DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARIA TICS

MODALIDAD	CAUSAL			(X)
Licitación Pública				
Selección Abreviada	Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización	Subasta Inversa	Presencial	
			Electrónica	
		Bolsa de Productos		
		Acuerdo Marco		
	Menor Cuantía	≤ 10% Menor Cuantía (Mínima Cuantía)		
		≥ 10% Menor Cuantía		
	Prestación de servicios de salud			
	Licitación declarada desierta			
	Enajenación de bienes del estado			
	Productos de origen o destinación agropecuaria			
	Actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales			
	Contratos de entidades a cuyo cargo se encuentre la ejecución de programas de protección			
	Bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional			
Concurso de Méritos	Abierto			
	Con Precalificación	Lista Corta	PTD	
			PTS	
		Lista Multiusos		
Contratación Directa	Urgencia Manifiesta			
	Empréstitos			
	Contratos o convenios Interadministrativos			X
	La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa y en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que necesiten reserva para su adquisición			
	Desarrollo de actividades científicas y tecnológicas			
	Encargo Fiduciario de entidades territoriales en Acuerdo Ley 550			
	No pluralidad de oferentes en el mercado			

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

	Servicios profesionales de apoyo a la gestión – Trabajos artísticos.	
	Arrendamiento o adquisición de inmuebles.	

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, literal c) numeral 4. Del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, se procede a efectuar el estudio previo sobre la conveniencia y oportunidad para llevar a cabo la contratación.

I. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. (Decreto 1082 de 2015 Sección 2. Subsección 1. Planeación; artículo 2.2.1.1.2.1.1.)

1.1.NECESIDAD Y FORMA DE SATISFACERLA

La Gobernación del Departamento Norte de Santander, en observancia de los preceptos normativos establecidos en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993; parágrafo 8 artículo 2 de la Ley 1150 de 2007; y, en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, procede a efectuar el análisis o estudio previo relativo a la conveniencia y oportunidad para contratar: EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 2° establece los fines esenciales del Estado, y afirma que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes. Por su parte, el artículo 366, ibidem, señala que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado, señalando que, para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

La misma Constitución establece que son entidades territoriales los departamentos, los distritos y los municipios, entre otros, los cuales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley y les corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley y construir las obras que demandan el progreso local.

En resumen, de las antecitadas premisas constitucionales es indiscutible que, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son compromisos sociales del estado; y que, en el marco autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley y les corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley.

Asi las cosas, y tenido claro igualmente que, por interpretación de la carta, el internet es un servicio, un instrumento y recurso que está íntimamente ligado desde el punto de vista normativo a un derecho consagrado y protegido como fundamental, el derecho a la información. Por lo anterior, no se podrá analizar el servicio público de internet alejado de su contextualización con el derecho a la información y de su evolución desde el punto de vista normativo y jurisprudencial. El derecho a la comunicación, a la información y a la libre expresión proviene del planteamiento normativo consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política, en la cual establece taxativamente "Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación..."

En este escenario, se podria plantear al servicio público de internet como un servicio esencial ligado con un derecho constitucionalmente protegido que, en principio y por su características y naturaleza, seria el derecho a la información.

Todo lo desarrollado en la linera jurisprudencial y normativa en relación a la evolución del internet, partiendo de ser precursor instrumental del derecho a la libre expresión y a la comunicación hasta llegar a ser fijado como servicio público esencial y universal , ha tenido su Genesis como se viene exponiendo, en las normas y Derechos instituidos en la Constitución Política de Colombia, en primera medida, el abordaje del asunto lo contiene el artículo 2° que establece los fines esenciales del Estado, y afirma que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes.

Subsiguientemente, el artículo 16 constitucional, prevé:

> *"Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico".*

En seguida, el artículo 20, dispone:

> *"Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.*
> *Estos son libres y tienen responsabilidad social. (...)"*

Más adelante, el artículo 67 ibid., preceptúa:

> *"Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.*
>
> *La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente".*

Lo propio establece el artículo 71 al fijar:

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. (subrayado fuera del texto).

En relación a la responsabilidad que endilga la constitución a las entidades del estado de promover el acceso a las TIC, se tiene que, entre otros el artículo 209, dispone:

"Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones".

Similarmente, en relación al tema, el arriba mencionado art. 366 constitucional, dispone:

"Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación".

Con todo y lo expuesto, es menester resaltar que preponderantemente, es el texto del artículo 20 de la Carta Política, impone al estado debe garantizar a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, informar y recibir información veraz e imparcial, y fundar medios masivos de comunicación, de manera libre y con responsabilidad social, asegurándose también el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y prohibiéndose de manera expresa la censura. Es decir, la Corte Constitucional manifestó en Sentencia SU- 056 de 1995, que "el derecho a la información expresa la propensión innata del hombre hacia el conocimiento de los seres humanos con los cuales se interrelaciona y de su entorno físico, social, cultural y económico, lo cual le permite reflexionar, razonar sobre la realidad, adquirir experiencias, e incluso transmitir a terceros la información y el conocimiento recibidos" (Corte Constitucional, Sentencia SU-056, 1995)

En desarrollo de lo expuesto, la sentencia C-010 de 2000, la Corte se pronunció sobre el tema en los siguientes términos:

"La libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el ordenamiento constitucional colombiano, no sólo por cuanto juega un papel esencial en el desarrollo de la autonomía y libertad de las personas y en el desarrollo del conocimiento y la cultura sino, además, porque constituye un elemento estructural básico para la existencia de una verdadera democracia participativa. Por ello, esta Corporación ha destacado la importancia y trascendencia de esta libertad, que protege no sólo la facultad de difundir y expresar opiniones e ideas, o libertad

de expresión en sentido estricto, sino también la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, o derecho y libertad de informar y ser informado" (Corte Constitucional, Sentencia C-010, 2000).

En sentencia C-650 de 2003, la Corte consideró que:

"la libertad de expresión cumple funciones trascendentales en una democracia, pero su protección constitucional no depende sólo de ello sino también de su valor intrínseco en tanto derecho fundamental. La protección de la libertad de expresión es un fin en sí mismo como manifestación de lo que entendemos por un ser humano digno y autónomo y por una sociedad de personas igualmente libres. La libertad de expresión, verbal o no verbal, es valiosa en cuanto posibilita la proyección de cada persona como sujeto individual y permite la realización de sus planes de vida. Solo una sociedad compuesta de personas libres de expresar quienes son y quienes quieren ser, puede reclamarse como abierta, pluralista y participativa" (Corte Constitucional, Sentencia C-650, 2003).

Posteriormente en sentencia T-391 de 2007, la Corte Constitucional consideró que:

"(...) en lo que respecta al alcance del artículo 20 de la Constitución, se concluyó que los elementos normativos que lo conforman contemplan varios derechos y libertades fundamentales, las cuales deben ser interpretadas y respetadas conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan al Estado Colombiano" (Corte Constitucional, Sentencia T- 391, 2007)

Ahora bien, en sentencia T- 256 de 2013, la Corte Constitucional consideró necesario resaltar algunas características y cualidades de la libertad de información:

"Se diferencia de la libertad de expresión en sentido estricto en que ésta protege la transmisión de todo tipo de pensamientos, opiniones, ideas e informaciones personales de quien se expresa, mientras que la libertad de información protege la comunicación de versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y en general situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está ocurriendo. Es un derecho fundamental de "doble vía", que garantiza tanto el derecho a informar como el derecho a recibir información veraz e imparcial. Así mismo, la libertad de información supone la necesidad de contar con una infraestructura adecuada para difundir lo que se quiere emitir, mientras que la libre expresión es necesaria únicamente las facultades y físicas y mentales de cada persona para exteriorizar su pensamiento y opinión. Por lo demás, es también una libertad trascendental en la democracia, pues es a través de los medios de comunicación que la ciudadanía está informada sobre los sucesos que los pueden afectar en las decisiones de los representantes políticos o en sucesos del ámbito económico o social de interés general" (Corte Constitucional, Sentencia T-256, 2013)

Queda en evidencia que, a medida que más se ahonda dentro de la investigación sobre el escenario de los derechos y valores constitucionales, es posible distinguir motivos adicionales para contemplar al servicio público de internet como una herramienta fundamental para la protección del

derecho a la información per-sé; sin contemplar o analizar el contenido finalístico o teleológico del temario sustancial que conlleve cada caso a analizar

Como materialización de los pronunciamientos jurisprudenciales, el escenario nacional y mundial, con la declaratoria de la emergencia sanitaria a causa del Covid- 19, ratificó de gran importancia el servicio público de internet, su esencialidad para la población de dicho servicio en sus dos perspectivas, desde la perspectiva como componente o herramienta de protección de derecho a la información pero también desde la perspectiva de suplir o por lo menos solventar actividades de vital importancia para la subsistencia y desarrollo básico del ser humano como por ejemplo el derecho a la salud o a la educación. Es así que, en sentencia T-030 de 2020, la Corte consideró que:

> *"El servicio de internet es una de tantas herramientas con que cuentan las personas dedicadas a la docencia para asegurar el goce efectivo del derecho fundamental a la educación. Las instituciones educativas no pueden dejar de preparar a los niños y a las niñas a ser parte de una sociedad estructurada en tecnologías de la información, hace parte de su desarrollo armónico e integral. Cómo se haga y por qué medio, es una cuestión que compete a las autoridades encargadas en democracia para tomar tales decisiones. Hay muchos casos en los que, por ejemplo, los estudiantes accedan a dicha tecnología de la información desde sus casas o en lugares públicos" (Subrayado fuera de texto) (Corte Constitucional, Sentencia T-030, 2020).*

Así mismo, en la misma providencia la Corte expresó que:

> *"El internet es una de herramienta propia de esta 'sociedad de la información', en la cual se pueden consultar, por ejemplo, infinidad de fuentes bibliográficas, recursos educativos de 48 diversa índole, con múltiples propósitos y a través de variados e innovadores medios. El acceso que permite el internet y las nuevas tecnologías de la información a esos múltiples y variados recursos, ayuda a cerrar las brechas entre los estudiantes, al dar a los profesores herramientas para garantizar el desarrollo armónico e integral de sus estudiantes, sin importar que tan apartada físicamente se encuentre la institución educativa. La amplitud y calidad de recursos educativos con que se cuente, permite a los menores de edad, por ejemplo, explorar sus inquietudes escolares. Les pueden dar respuesta con información de todo tipo (audiovisual, escrita, auditiva) y nivel de complejidad (pueden consultar sitios web con información básica o buscar artículos académicos con la última investigación disponible sobre un tema)".*

El internet como condición instrumental del derecho a la libre expresión y a la comunicación

Esbozado el argumento constitucional y la evolución jurisprudencial que llevaron a postular al servicio público de internet como precursor instrumental del derecho a la libre expresión y a la comunicación y como herramienta fundamental para la protección del derecho a la información, dado que permite mejorar significativamente la calidad de vida al facilitar el acceso a la información, la educación, la atención médica, las oportunidades de trabajo, permite la comunicación y la conectividad social, además de promover la inclusión y el desarrollo económico, la funcionalidad de

hogares, el desarrollo de habilidades, facilita acceso a otros servicios al tiempo que aumenta la productividad.

En los últimos años, la conectividad a Internet ha sido fundamental en el desarrollo de la sociedad, la economía y la forma en que las personas se relacionan entre sí. Sin embargo, en el contexto rural, la brecha digital ha dejado muchas comunidades aisladas de los beneficios que ofrece la tecnología. Es fundamental que se realicen esfuerzos para la brecha digital en las áreas rurales y garantizar que todos tengan acceso equitativo a los beneficios que la conectividad a Internet puede proporcionar.

A raíz de la aparición de la pandemia, se evidenció en mayor medida la necesidad de lograr que todos los sectores de la población, sin excepción, cuenten con acceso a un Internet de alta calidad. Esta nueva situación hizo evidente lo acertado de una máxima, pregonada desde hace muchos años por reguladores y organismos internacionales, que sostiene que la evolución en la transformación de la realidad económica y social de muchas comunidades tiene una correlación directa con la presencia de infraestructura de acceso a Internet de banda ancha.

Así mismo, durante la emergencia sanitaria el Internet se constituyó en un aliado para que los procesos productivos siguieran en marcha, haciendo del trabajo virtual un predeterminado, permitiendo la permanencia de muchos puestos de trabajo, que, en la pandemia, sin el componente de virtualidad, probablemente no hubieran perdurado.

En Colombia en las zonas más apartadas del país solamente un 16% de la población tiene la posibilidad de acceder a un servicio de conectividad que le permita tener los bits de navegación suficientes como para poder atender necesidades de comunicación, educación y entretenimiento. Evidencia lo anterior que por más que el Estado se empeñe en hacer acciones que permitan mejorar las condiciones de cobertura de calidad, la verdad es que al parecer el esfuerzo en ciertas regiones o incluso grupos poblacionales, es insuficiente.

Es importante resaltar que de existir una conectividad que permitiera garantizar cobertura universal, la dinámica de la educación pública podría cambiar. El Estado además de hacer esfuerzos en instalaciones locativas e invertir solamente en obras de infraestructura física, debe pasar a invertir en infraestructura, equipos, formación y plataformas tecnológicas de conectividad, estableciendo un ecosistema asociado a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, donde logre más con menos y establezca las bases para una trasformación de la sociedad basada en el conocimiento.

Esto no implica una quimera, sino más bien de reproducir el ejemplo de aquellos que han tenido éxito como es el caso de Estonia, "el país más digital del mundo", donde sus gobernantes apostaron por las tecnologías de la información y la educación como instrumentos para incorporar su país en el contexto mundial.

Para avanzar hasta el establecimiento del internet como condición instrumental del derecho a la libre expresión y a la comunicación, en Colombia se trazó la intención legislativa de conversión y reconocimiento a partir de la emisión y sanción de la **Ley 1341 de 2009** (*Por la cual se definen*

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC; se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones). Su objeto, inicia por determinar el marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo, facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información.

Esta ley fijó en su artículo 2, como principios rectores, entre otros:

1. ***Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones****; Imponiendo, al estado y en general todos los agentes del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el deber de colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad. la educación, los contenidos y la competitividad;*

A su turno, el numeral 3, del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009 (modificado por el artículo 3 de la Ley 1978 de 2019) ratifican el deber del estado y en general de todos los agentes del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de priorizar el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la población pobre y vulnerable, en zonas rurales y apartadas del país.

Dicha Ley 1978 de 2019, (modificatoria de la Ley 1341 de 2009) vino a modernizar el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, a distribuir competencias, y al tiempo a crear un Regulador Único del sector entre otras disposiciones otras disposiciones. Su objeto, alinear los incentivos de los agentes y autoridades del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), aumentar su certidumbre jurídica, simplificar y modernizar el marco institucional del sector, **focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital** y potenciar la vinculación del sector privado en el desarrollo de los proyectos asociados, así como aumentar la eficiencia en el pago de las contraprestaciones y cargas económicas de los agentes del sector.

El mismo artículo 3 de la precitada Ley 1978 de 2019, modificó también el numeral 7 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, fijando en refrendación a los artículos 16, 20 y 67 de la Constitución Política, el deber o principio rector al estado, de propiciar a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, el libre desarrollo de la personalidad, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente, el Estado establecerá programas para que la población pobre y vulnerable incluyendo a la población de 45 años en adelante, que no tengan ingresos fijos, así como la

población rural, tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet, así como la promoción de servicios TIC comunitarios, que permitan la contribución desde la ciudadanía y las comunidades al cierre de la brecha digital, la remoción de barreras a los usos innovadores y la promoción de contenidos de interés público y de educación integral. La promoción del acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones básicas se hará con pleno respeto del libre desarrollo de las comunidades indígenas, afrocolombianas, palenqueras, raizales y Rrom.

El citado artículo 3 de la Ley 1978/2019, también adicionó los numerales 9 y 10 al artículo 2° de la Ley 1341 de 2009. Este último contiene el especial principio rector: "10. Acceso a las TIC y despliegue de infraestructura. Con el propósito de garantizar el ejercicio y goce efectivo de los derechos constitucionales a la comunicación, la vida en situaciones de emergencia, la educación, la salud, la seguridad personal y el acceso a la información, al conocimiento, la ciencia y a la cultura, así como el de contribuir a la masificación de los trámites y servicios digitales, de conformidad con la presente Ley, es deber de la Nación asegurar la prestación continua, oportuna y de calidad de los servicios públicos de comunicaciones, para lo cual velará por el despliegue de la infraestructura de redes de telecomunicaciones, de los servicios de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora, en las entidades territoriales." (subrayas fuera del texto)

A su vez el artículo 4 de la Ley 1341 de 2009 (modificado por el art. 4 de la Ley 1978/2019), dispone que, en desarrollo de los principios de intervención contenidos en la Constitución Política, el Estado intervendrá en el sector las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para lograr, entre otros, los siguientes fines: **1.** Proteger los derechos de los usuarios, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes, y a la familia velando por la calidad, eficiencia y adecuada provisión de los servicios, y la promoción de la digitalización de los trámites asociados a esta provisión. **2.** Promover el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, teniendo como fin último el servicio universal. **3.** Promover el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la prestación de servicios que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la masificación del Gobierno en Línea. **4.** Promover la oferta de mayores capacidades en la conexión, transporte y condiciones de seguridad del servicio al usuario final, incentivando acciones de prevención de fraudes en la red. **5.** Promover y garantizar la libre y leal competencia y evitar el abuso de la posición dominante y las prácticas restrictivas de la competencia. **6.** Garantizar el despliegue y el uso eficiente de la infraestructura y la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos escasos, se buscará la expansión, y cobertura para zonas de difícil acceso, en especial beneficiando a poblaciones vulnerables, (...); **8.** Promover la ampliación de la cobertura del servicio. **9.** Garantizar la interconexión y la interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones, así como el acceso a los elementos de las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones necesarios para promover la provisión y comercialización de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (...) **12.** Incentivar y promover el desarrollo de la industria de tecnologías de la información y las comunicaciones para contribuir al crecimiento económico, la competitividad, la generación de empleo y las exportaciones. **13.** Incentivar la inversión para la construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y propender por la protección del medio ambiente y la salud pública.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Seguidamente, el artículo 5 ibid., impone a las entidades del orden nacional y territorial la responsabilidad de promover, coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la población, las empresas y las entidades públicas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para tal efecto, dichas autoridades incentivarán el desarrollo de infraestructura, contenidos y aplicaciones, así como la ubicación estratégica de terminales y equipos que permitan realmente a los ciudadanos acceder a las aplicaciones tecnológicas que beneficien a los ciudadanos, en especial a los vulnerables y de zonas marginadas del país.

El parágrafo del citado artículo ordena a las entidades de orden nacional y territorial incrementar los servicios prestados a los ciudadanos a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Manifestando además que, el Gobierno reglamentará las condiciones en que se garantizará el acceso a la información en línea, de manera abierta, ininterrumpida y actualizada, para adelantar trámites frente a entidades públicas, inclusive en el desarrollo de procesos de contratación y el ejercicio del derecho al voto.

Subsiguientemente el artículo 10 ejusdem fija A partir de la vigencia de la presente Ley, que la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, es un servicio público bajo la titularidad del Estado.

Aunado a lo expuesto, el parágrafo 4 del indicado artículo (adicionado por el artículo 4 de la Ley 2108 de 2021) instituye el acceso a Internet como un servicio público esencial, señalando sumariamente que, proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la operación de este servicio público esencial, y garantizarán la continua provisión del servicio. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los deberes y obligaciones a cargo de los suscriptores y usuarios del servicio, conforme a la regulación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

El artículo 16 y los ss., de la Ley 1341 de 2009, establecen la denominación, **objetivos y funciones del Ministerio de tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC**, fijando dentro de sus objetivos: **1.** (Modificado por el Art. 13 de la Ley 1978 de 2019). Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en correspondencia con la Constitución Política y la Ley, con el fin de promover la inversión y el cierre de la brecha digital, contribuir al desarrollo económico, social y político de la Nación, y elevar el bienestar de los colombianos. **2.** Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás instancias nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político de la Nación. **3.** Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional. **4.** (Modificado por el Art. 13 de la Ley 1978 de 2019). Definir la política pública y adelantar la inspección, vigilancia y el control del sector de Tecnologías de la Información (...).

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Dentro de las funciones asignadas al MinTIC (previstas en el art. 18 ibid.) sobresalen además de las funciones que determinan la Constitución Política, y la Ley 489 de 1998, las siguientes: **1.** Diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. **2.** Definir, adoptar y promover las políticas, planes y programas tendientes a incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional, a las tecnologías de la información y las comunicaciones y a sus beneficios, para lo cual debe: **a).** Diseñar, formular y proponer políticas, planes y programas que garanticen el acceso y la implantación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de fomentar su uso como soporte del crecimiento y aumento de la competitividad del país en los distintos sectores; **b).** Formular políticas, planes y programas que garanticen a través del uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, el acceso a mercados para el sector productivo, y el acceso equitativo a oportunidades de educación, trabajo, salud, justicia, cultura y recreación, entre otras; **c).** Apoyar al Estado en el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para facilitar y optimizar la gestión de los organismos gubernamentales y la contratación administrativa transparente y eficiente, y prestar mejores servicios a los ciudadanos; **d).** Apoyar al Estado en la formulación de los lineamientos generales para la difusión de la información que generen los Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos y efectuar las recomendaciones que considere indicadas para lograr que esta sea en forma ágil y oportuna; **e).** Planear, formular, estructurar, dirigir, controlar y hacer el seguimiento a los programas y proyectos del Ministerio; **f).** Diseñar y desarrollar estrategias masivas que expliquen a los ciudadanos las utilidades y potencialidades de las TIC; **3.** (Modificado por el Art. 14 de la Ley 1978 de 2019). Promover el establecimiento de una cultura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el país, a través de programas y proyectos que favorezcan la apropiación y masificación de las tecnologías, como instrumentos que facilitan el bienestar y el desarrollo personal, social y económico. **4.** Coordinar con los actores involucrados, el avance de los ejes verticales y transversales de las TIC, y el plan nacional correspondiente, brindando apoyo y asesoría a nivel territorial. (...) **11.** (Modificado por el Art. 14 de la Ley 1978 de 2019). Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control en el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, conforme con la Ley. (...) **13.** Evaluar la penetración, uso y comportamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el entorno socioeconómico nacional, así como su incidencia en los planes y programas que implemente o apoye. **14.** Propender por la utilización de las TIC para mejorar la competitividad del país. (...) **16.** Procurar ofrecer una moderna infraestructura de conectividad y de comunicaciones, en apoyo para los centros de producción de pensamiento, así como el acompañamiento de expertos, en la utilización de las TIC, capaces de dirigir y orientar su aplicación de manera estratégica. (...) **18.** Formular y ejecutar políticas de divulgación y promoción permanente de los servicios y programas del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promoviendo el uso y beneficio social de las comunicaciones y el acceso al conocimiento, para todos los habitantes del territorio nacional. (...) **21.** Reglamentar la participación, el control social, las funciones y el financiamiento de las actividades de los vocales de control social de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones de que trata esta ley. (...)**31.** Las demás que le sean asignadas en la Ley.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Mas adelante, el artículo 34 (modificado por el artículo 21 de la Ley 1978 de 2019) fijan la creación del FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FUTIC, como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, dotado de personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, cuyo objeto principal se enfoca en financiar los planes, programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal y el servicio universal de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones garantizando el fortalecimiento de la televisión pública, la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público y cultural, y la apropiación social y productiva de las TIC, así como apoyar las actividades del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Agencia Nacional Espectro, y el mejoramiento de su capacidad administrativa, técnica y operativa para el cumplimiento de sus funciones.

Después, el artículo 35 de la Ley 1341/2009 (modificado por el artículo 22 de la Ley 1978 de 2019), establece las funciones específicas del FUTIC, sobresaliendo para efectos de la aplicabilidad al presente proceso, las siguientes: **1.** Financiar planes, programas y proyectos para promover prioritariamente el acceso universal a servicios TIC comunitarios en zonas rurales y urbanas, que priorice la población pobre y vulnerable; **2.** Financiar planes, programas y proyectos para promover el servicio universal a las Tecnologías de la información y las Comunicaciones, mediante incentivos a la oferta o a la demanda en los segmentos de población pobre y vulnerable, así como zonas rurales y zonas geográficamente aisladas. (...). **6.** Financiar y establecer planes, programas y proyectos que permitan masificar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el fortalecimiento de las habilidades digitales, con prioridad para la población pobre y vulnerable. (...) **9.** Financiar planes, programas y proyectos para promover el acceso con enfoque diferencial de los ciudadanos en situación de discapacidad a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Es así que, consecutivamente o en desarrollo de estas iniciativas, surgió el de 29 de junio de 2021, la Ley 2108 de 2021, ***"LEY DE INTERNET COMO SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL Y UNIVERSAL" O "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 1341 DE 2009 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES***". La cual tiene por objeto establecer dentro de los servicios públicos de telecomunicaciones, el acceso a Internet como uno de carácter esencial, con el fin de propender por la universalidad para garantizar y asegurar la prestación del servicio de manera eficiente, continua y permanente, permitiendo la conectividad de todos los habitantes del territorio nacional, en especial de la población que, en razón a su condición social o étnica se encuentre en situación de vulnerabilidad o en zonas rurales y apartadas. Mediante esta ley el estado colombiano apuesta a que, de la mano de los incentivos entregados a la iniciativa privada, junto con los esfuerzos adelantados desde la institucionalidad, se pueda acelerar el proceso de cobertura de Internet y con ello se cambien las dinámicas económicas y sociales de ciertos territorios, que hasta el momento se mantienen en condiciones de marginalidad.

Esta ley 2108 de 2021 agregó el numeral 11 a los principios orientadores previstos en el artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, incluyendo a la UNIVERSALIDAD como principio general rector del sector indicando que el fin último de intervención del Estado en el Sector TIC es propender por el servicio universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

A su turno, el artículo 3 de la Ley 2108, adiciona un inciso al artículo 38 de la Ley 1341 de 2009, que alude a la MASIFICACIÓN DEL USO DE LAS TIC Y CIERRE DE LA BRECHA DIGITAL, arguyendo que ello se logrará mediante la promoción del acceso universal, el servicio universal, la apropiación, capacitación y uso productivo de las TIC, de manera prioritaria para la población que, en razón a su condición social o étnica se encuentre en situación de vulnerabilidad o en zonas rurales, apartadas y de difícil acceso, buscando garantizar que se brinde un servicio de calidad y de última generación

La formulación de las anteriores normativas denota infaliblemente los esfuerzos del Estado Colombiano en optimizar de manera progresiva la garantía del derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones a los ciudadanos, especialmente de la población vulnerable. Ello, se ratifica sin lugar a dudas con la expedición de la Ley 2108 de 2021, al reconocer al internet como servicio público esencial y universal.

Con la entrada en vigencia en Colombia de la ley que declara el Internet como servicio público esencial, se está haciendo una apuesta a que, de la mano de los incentivos entregados a la iniciativa privada, junto con los esfuerzos adelantados desde el Estado, se pueda acelerar el proceso de cobertura de Internet fijo de banda ancha residencial y con ello se cambien las dinámicas económicas y sociales de ciertos territorios, que hasta el momento se mantienen en condiciones de marginalidad.

Todo lo desarrollado en la línea jurisprudencial y normativa en relación a la evolución del internet, partiendo de ser precursor instrumental del derecho a la libre expresión y a la comunicación hasta llegar a ser fijado como servicio público esencial y universal , ha tenido su Genesis como se viene exponiendo, en las normas y Derechos instituidos en la Constitución Política de Colombia, en primera medida, el abordaje del asunto lo contiene el articulo 2º que establece los fines esenciales del Estado, y afirma que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes.

Por su parte, la Ley 2294 de 2023 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 (PND) "COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA", establece cinco (5) ejes de transformación dentro de los que se encuentra la convergencia regional, como el proceso de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país. Para garantizar esta convergencia, es necesario fortalecer los vínculos intra e interregionales y aumentar la productividad, competitividad e innovación en los territorios, para lo cual se requiere transformar las instituciones y la gestión de lo público poniendo al ciudadano en el centro de su accionar y construyendo un relacionamiento estrecho, mediado por la confianza, entre las comunidades y entre estas y las instituciones, para responder de manera acertada a sus necesidades y atender debidamente sus expectativas, a partir de marcos regulatorios consistentes.

El señalado Plan de Desarrollo Nacional, en el artículo 147, señala que: *"(...) es deber de la Nación asegurar la prestación continua, oportuna y de calidad de los servicios públicos de comunicaciones, incluido el servicio público de acceso a internet declarado como servicio público esencial*", fungiendo este precepto como complemento de la carta navegación del sector, que igualmente indica que, el

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Gobierno Nacional a través del Ministerio TIC debe fomentar el acceso a internet para cambiar las vidas de los colombianos, lo anterior, dispuesto específicamente en el artículo 142 que sitúa que: "***Para efectos de promover la conectividad digital como un generador de oportunidades, riqueza, igualdad y productividad, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adelantará las siguientes medidas***: *(i). Llevar conectividad digital a zonas vulnerables y apartadas, y mejorar la cobertura y calidad de los servicios de telecomunicaciones, a través de diferentes tecnologías y compartición de infraestructura. (ii). Hacer del Internet y de las tecnologías digitales un instrumento de transformación social. ("...") (vi). Fortalecer a los pequeños prestadores de los servicios de telecomunicaciones con el fin de aportar en el cierre de la brecha digital. (...)"*

- **La brecha digital en Colombia y el Internet como derecho fundamental**

La **Brecha Digital** para el Ministerio TIC, hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas **comunidades que tienen accesibilidad a las TIC y aquellas que no**, y también hace referencia a las diferencias que hay entre grupos según su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización y **capacidad tecnológica**.

Como es sabido, el Internet ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad básica. Sin él, cada vez es más difícil gozar de derechos como la información, la libertad de expresión, la educación o el empleo. Por eso, la desigualdad en el acceso a Internet y a las tecnologías digitales no es un problema menor, menos desde que la pandemia virtualizó el mundo.

Aunque el problema de la brecha digital se hizo especialmente visible con la pandemia, lo cierto es que el acceso a Internet en Colombia nunca ha sido universal. En 2019, alrededor del 50% de los hogares más pobres tenía acceso a internet, mientras el 90% de los hogares más ricos disponían de ese servicio.

Detrás de esas cifras hay un abanico de factores como la alfabetización digital, la disponibilidad de dispositivos, la conectividad en los diferentes territorios y los precios del servicio, entre otras.

Esos factores se acrecentaron con la pandemia y pasaron a impactar la vida diaria de millones de personas. Los colombianos vieron la necesidad de trasladar a internet actividades como la compra de alimentos, la educación, la salud y el cumplimiento de obligaciones laborales.

Así, conforme se expone en el documento publicado en octubre del año 2.024, por Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC; titulado: **ÍNDICE DE BRECHA DIGITAL-RESULTADOS 2023**, desde el año 2018 se han presentado avances en el cierre de la brecha digital, para el período 2018-2023 se ha alcanzado una disminución de la brecha digital del 11%. Las dimensiones de Acceso Material, Aprovechamiento y Motivación 2023 reflejaron en 2023 una disminución en las brechas, por otra parte, la dimensión de Habilidades Digitales presentó un aumento entre el año 2022 y 2023.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Para el año 2023 el Índice de Brecha Digital para Colombia fue de 0,390 presentándose una disminución de 0,010 puntos porcentuales frente al año 2023. En relación con el aporte de las diferentes dimensiones, las Habilidades Digitales explican el 35,1% de la brecha digital a nivel Nacional, la de Acceso Material el 31,7%, la de Aprovechamiento el 29,9%; y la dimensión de Motivación el 3,3%.

Gráficos de mapa y de ranking general IBD – RESULTADOS 2023

Gráfico 2.
Mapa Brecha Digital Colombia.
Total Departamentos
2023



Fuente: MinTIC, IBD 2023


Tabla 1.
Ranking IBD Colombia
Total Departamentos
2023

Departamento	Ranking	IBD
Bogotá D.C	1	0,251
Valle del Cauca	2	0,363
Quindío	3	0,365
Santander	4	0,367
Risaralda	5	0,374
Meta	6	0,375
Atlántico	7	0,375
Antioquia	8	0,376
Cundinamarca	9	0,378
Caldas	10	0,388
Boyacá	11	0,409
Tolima	12	0,416
Norte de Santander	13	0,426
Huila	14	0,427
Casanare	15	0,435
Cesar	16	0,439
San Andrés, Providencia y Santa Catalina	17	0,445
Bolívar	18	0,450
Magdalena	19	0,460
Caquetá	20	0,467
Guaviare	21	0,479
Cauca	22	0,481
Nariño	23	0,482
Sucre	24	0,483
Arauca	25	0,494
Córdoba	26	0,497
Putumayo	27	0,498
La Guajira	28	0,523
Guainía	29	0,566
Chocó	30	0,580
Amazonas	31	0,588
Vaupés	32	0,621
Vichada	33	0,680

Fuente: MinTIC, IBD 2023

A diferencia o en comparación con los resultados publicados en el documento denominado ÍNDICE DE BRECHA DIGITAL- RESULTADOS 2022, publicado por MINTIC en diciembre del año 2023, en el cual el departamento de Norte de Santander ocupó la posición No. 12 del ranking dentro de los departamentos enlistados, con ponderación de IBD de 0.422, se denota descenso o retroceso para el mismo informe de resultados del año 2023, toda vez que como se detalla en la gráfica tomada del referido informe del MINTIC, expuesta líneas arriba, para la medición IBD de la vigencia 2023, el Departamento Norte de Santander ocupo la posición No. 13 del ranking, con ponderación de IBD de 0.427.

Gráficos de mapa y de ranking general IBD – RESULTADOS 2022

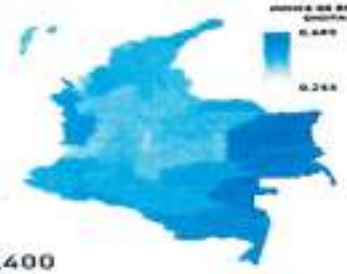


Fuente: MinTIC, IBD 2022

Departamento	Ranking	IBD
Bogotá D.C	1	0,254
Valle del Cauca	2	0,372
Quindío	3	0,379
Atlántico	4	0,386
Risaralda	5	0,388
Meta	6	0,388
Cundinamarca	7	0,389
Caldas	8	0,390
Santander	9	0,392
Antioquia	10	0,397
Tolima	11	0,416
Norte de Santander	12	0,422
Casanare	13	0,425
Boyacá	14	0,426
San Andrés, Providencia y Santa Catalina	15	0,438
Huila	16	0,441
Bolívar	17	0,455
Cesar	18	0,456
Magdalena	19	0,476
Caquetá	20	0,477
Nariño	21	0,480
Sucre	22	0,485
Cauca	23	0,500
Córdoba	24	0,505
Arauca	25	0,509
Guaviare	26	0,513
La Guajira	27	0,526
Putumayo	28	0,540
Chocó	29	0,559
Amazonas	30	0,568
Guainía	31	0,589
Vaupés	32	0,665
Vichada	33	0,683

Fuente: MinTIC, IBD 2022

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD


A nivel general el IBD – RESULTADOS, reflejó entre 2022 y 2023, se observaron disminuciones en las diversas dimensiones que componen el índice de brecha digital, excepto en la dimensión de Habilidades Digitales, que aumentó de 0,538 en 2022 a 0,540 en 2023

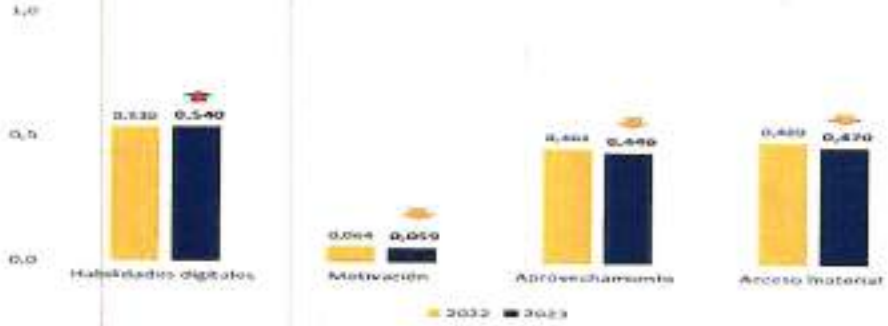

Fuente: MinTIC, IBD 2023

En 2023, el índice de brecha digital disminuyó en el 82% de los departamentos. Los Departamentos con los valores más bajos fueron Bogotá, Valle del Cauca y Quindío, **mientras que** Casanare, San Andrés y **Norte de Santander, registraron aumentos en el índice de brecha digital – IBD, entre 2022 y 2023.**

Gráfico comparativo de comportamiento del IBD entre años 2022 y 2023¶

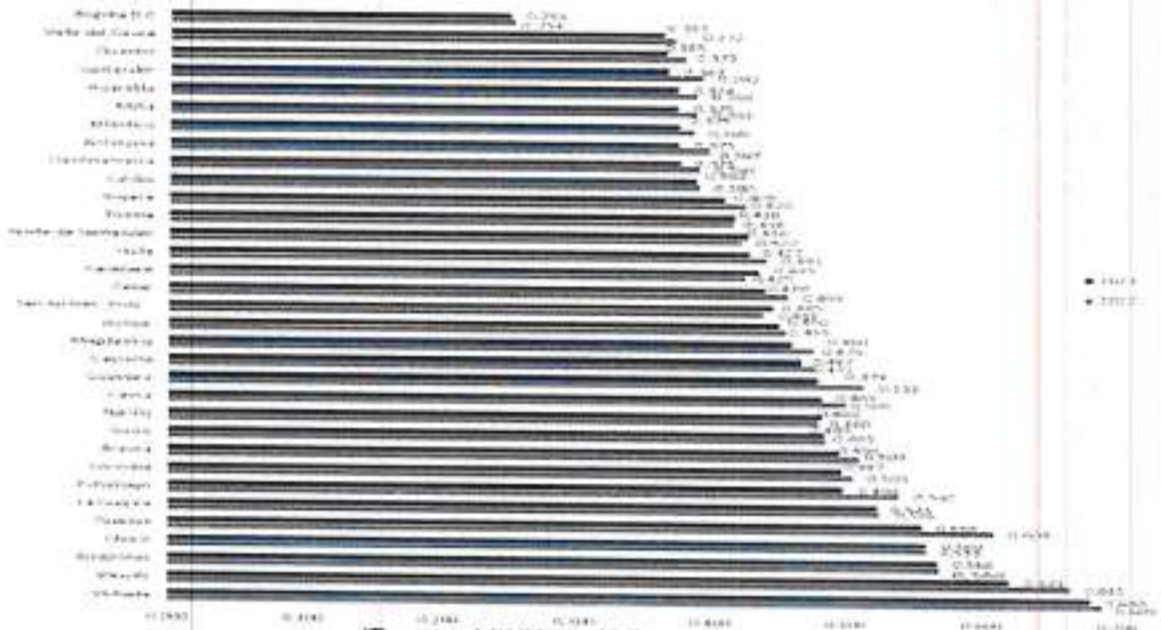

(Fuente: MINTIC – IBD- resultados 2023)¶

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

En el informe de resultados 2023, el acápite denominado: DIMENSIÓN DE ACCESO MATERIAL se encarga de evaluar la posibilidad material de acceso a las TIC, Tiene que ver con la disponibilidad de servicios e infraestructura (o canales) necesarios para la conexión, las características del acceso y la disponibilidad de los dispositivos tecnológicos (o terminales) que permiten el acceso.

Los Elementos de la dimensión:

• **Acceso a canales:** ¿Se tiene acceso a los servicios públicos o privados necesarios para utilizar una tecnología? ¿Se tiene acceso a los medios, cobertura o conexiones de red necesarios para intercambiar información entre diferentes terminales de una tecnología?

• **Acceso a terminales:** ¿Se tiene acceso al hardware necesario para utilizar una tecnología? ¿Se tiene acceso al software necesario para utilizar y/o acceder a la visualización o modificación de un contenido específico por medio de una tecnología?


• **Características de acceso a los canales/terminales:** ¿cómo se accede a los canales o terminales? ¿cuál es la calidad de los servicios de telecomunicaciones?

• **Categorización del Sitio de Acceso:** ¿puede el individuo acceder desde su hogar, lugar de estudio o trabajo?

Como se expone, esta dimensión contiene varias aristas clave: el acceso a canales, que analiza la disponibilidad de servicios para el uso de la tecnología y la cobertura de red para el intercambio de información; el acceso a terminales, relacionado con la disponibilidad de hardware y software necesarios para utilizar una tecnología; las características de acceso a los canales y terminales, que examinan cómo se accede y la calidad de los servicios de telecomunicaciones; y la categorización del sitio de acceso, que determina si el individuo puede acceder desde su hogar, lugar de estudio o trabajo

En ese sentido, la **dimensión de Acceso Material** registró la disminución más significativa en todas las regiones dentro del IBD durante 2023, como se denota en la gráfica a continuación:


Comportamiento de la dimensión de acceso material en el IBD, entre 2018 - 2023

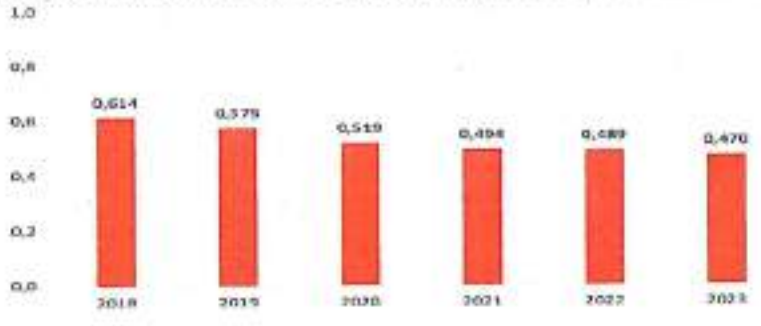

Fuente: MinTIC, IBD 2023.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

En resumen, la brecha en la dimensión de Acceso Material disminuyó en forma general a nivel país, en 0,019 puntos en comparación con 2022, alcanzando una reducción del 23,5% respecto al año 2018, manteniendo así su tendencia decreciente

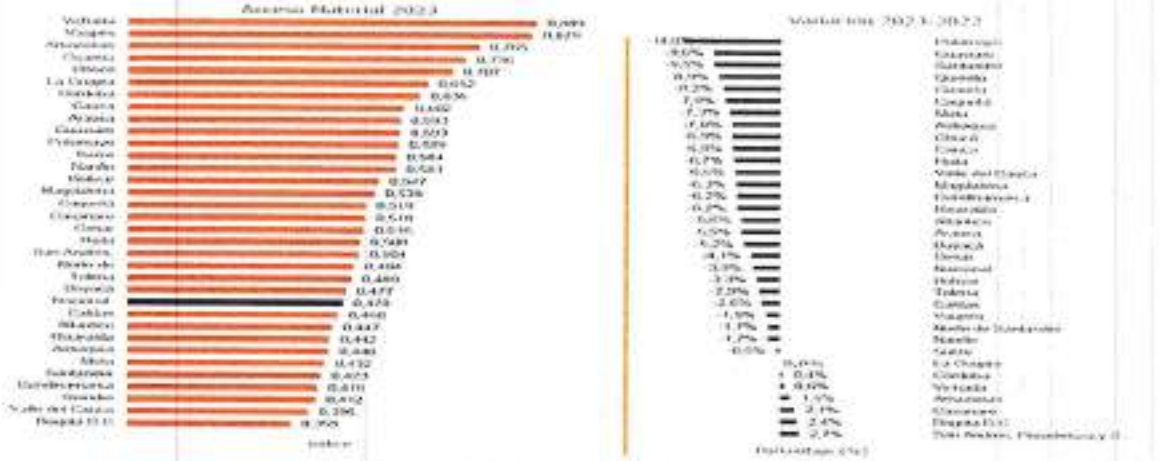


(Fuente: MINTIC - IBD- resultados 2023)

Sin embargo, en lo que respecta al cierre de la Brecha Digital, en el componente que corresponde al comportamiento y evolución de la **dimensión de acceso material**, en el Departamento Norte de Santander, si bien el indicador o IBD ha disminuido entre los años 2022 y 2023, evidenciando en el año 2022, un indicador de: 0.503, frente a un resultado de indicador en el año 2023 que refleja IBD de: 0.494, se decanta un desfavorable retroceso al comparar los informes IBD – Resultados IBD 2022, Frente al mismo informe 2023, en cuanto a la posición de Norte de Santander en el ranking de esta dimensión de acceso material, como se detalla en las siguientes graficas:

Gráfico de mapa y de ranking – DIMENSIÓN ACCESO MATERIAL - IBD – RESULTADOS 2022

Mapa Dimensión Acceso Material Colombia, Total Departamentos 2022

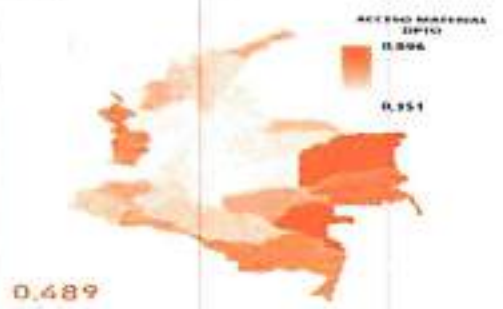

Fuente: MinTIC, IBD 2022

Ranking Departamental Dimension Acceso Material Total Departamentos 2022

Departamento	Ranking	IBD
Bogotá D.C	1	0,351
Valle del Cauca	2	0,424
Cundinamarca	3	0,444
Quindío	4	0,452
Meta	5	0,466
Santander	6	0,467
Risaralda	7	0,471
Caldas	8	0,472
Antioquia	9	0,473
Atlántico	10	0,474
San Andrés, Providencia y Santa Catalina	11	0,481
Norte de Santander	12	0,503
Boyacá	13	0,503
Tolima	14	0,503
Casanare	15	0,508
Cesar	16	0,538
Huila	17	0,544
Caquetá	18	0,563
Bolívar	19	0,566
Magdalena	20	0,575
Sucre	21	0,587
Nariño	22	0,593
Arauca	23	0,628
Córdoba	24	0,633
Cauca	25	0,647
La Guajira	26	0,652
Guaviare	27	0,656
Putumayo	28	0,685
Amazonas	29	0,754
Chocó	30	0,759
Guainía	31	0,802
Vichada	32	0,883
Vaupés	33	0,896

Fuente: MinTIC, IBD 2022

Como puede observarse, en el IBD – MINTIC – RESULTADOS 2022, Norte de Santander ocupó la posición 12 del ranking departamental en la dimensión específica de Acceso material a las TIC, retrocediendo una posición, hasta la ubicación No. 13 del mismo ranking en el IBD – MINTIC – RESULTADOS 2023, pese a haber disminuido la ponderación IBD:

Gráfico de mapa y de ranking – DIMENSION ACCESO MATERIAL - IBD – RESULTADOS 2023

Mapa Dimensión Acceso Material Colombia. Total Departamentos 2023



Fuente: MinTIC, IBD 2023

Ranking Departamental Dimensión Acceso Material Total Departamentos 2023

Departamento	Ranking	IBD
Bogotá D.C	1	0,359
Valle del Cauca	2	0,396
Quindío	3	0,412
Cundinamarca	4	0,416
Santander	5	0,423
Meta	6	0,433
Antioquia	7	0,440
Risaralda	8	0,442
Atlántico	9	0,447
Caldas	10	0,460
Boyacá	11	0,477
Tolima	12	0,489
Norte de Santander	13	0,494
San Andrés, Providencia y Santa Catalina	14	0,504
Huila	15	0,508
Cesar	16	0,516
Casanare	17	0,518
Caquetá	18	0,519
Magdalena	19	0,539
Bolívar	20	0,547
Nariño	21	0,563
Sucre	22	0,564
Putumayo	23	0,569
Guaviare	24	0,593
Arauca	25	0,593
Cauca	26	0,602
Córdoba	27	0,636
La Guajira	28	0,652
Chocó	29	0,707
Guainía	30	0,736
Amazonas	31	0,765
Vaupés	32	0,870
Vichada	33	0,889

Fuente: MinTIC, IBD 2023

Tras efectuar el análisis de resultados es posible decantar que, si bien en la medición del indicador de la **dimensión de acceso material a las TIC**, se muestra mejoría por disminución del referido índice, también es notorio que el Departamento Norte de Santander, retrocedió una posición en el ranking de esta dimensión por efecto de la mejoría y ascenso del indicador IBD de otros departamentos.


Lo expuesto conlleva a determinar en forma incuestionable que, la administración del departamento Norte de Santander debe continuar gestionando en forma progresiva los elementos que componen esta dimensión, garantizando posibilidad, disponibilidad de servicios e infraestructura (o canales) necesarios para la conexión y acceso a conectividad a internet a los estudiantes y comunidad en general.

Otro de los componentes o dimensiones objeto de estudio periódico en los análisis de IBD – Resultados anualizados que conviene abordar en el presente documento por su estrecha relación con el objeto de la contratación, corresponde a la **DIMENSIÓN DE APROVECHAMIENTO DE LAS TIC**, entendido este como el aprovechamiento de las TIC, relacionado con los hábitos de las personas en cuanto a su utilización. Se evalúan los siguientes elementos:

- la frecuencia de uso (¿con qué regularidad se utiliza la tecnología?)
- y la diversidad de propósitos (¿para qué actividades se emplea la tecnología?).

En esta dimensión el informe IBD – RESULTADOS 2023, inicia exhibiendo de manera gráfica el comportamiento o variación anualizada, partiendo desde el año 2018 hasta el año 2023, como se aprecia a continuación:

Resultados Dimensión de aprovechamiento TIC – Total Nacional 2018 - 2023

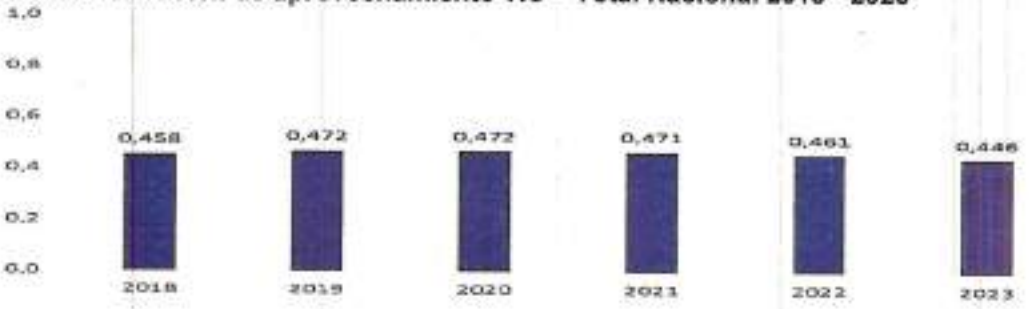

Fuente: MinTIC, IBD 2023

La dimensión de Aprovechamiento empezó a disminuir a nivel país, a partir del año 2021, después del aumento observado durante los años 2019 y 2020. Para el año 2023 llegó a 0,461 presentando una disminución de 0,010 frente al año 2021, sin embargo, este valor es superior al indicador del año 2018.

En 2023, se alcanzó un valor de 0,446, lo que representa una disminución de 0,015 puntos en comparación con 2022, siendo el valor más bajo registrado en esta dimensión desde 2018, cuando fue de 0,458, en el total nacional

Entre 2022 y 2023, la dimensión de Aprovechamiento mostró una disminución a nivel nacional, pasando de 0,461 a 0,446.

Ahora bien, con base en el informe IBD – RESULTADOS 2023, en lo que respecta al cierre de la Brecha Digital, en el componente que corresponde al comportamiento y evolución de la **dimensión de aprovechamiento,** se denotó que para el año 2022, Norte de Santander ocupó la posición No. 15 en el ranking con una puntuación de 0.504, ha descendido o retrocedido una posición en el ranking del año 2023, al ocupar el puesto No. 16, pese a obtener una mejoría en cuanto a disminución de la brecha, exhibiendo puntaje de 0.497.

Gráfico de mapa y de ranking – DIMENSIÓN APROVECHAMIENTO – IBD – RESULTADOS 2023

Mapa Dimensión Aprovechamiento. Total Departamentos 2023



Fuente: MinTIC, IBD 2023

Ranking Dimensión Aprovechamiento Total Departamentos 2023

Departamento	Ranking	2023
Bogotá D.C	1	0,503
Cundinamarca	2	0,469
Valle del Cauca	3	0,459
Meta	4	0,449
Quindío	5	0,443
Santander	6	0,434
Antioquia	7	0,433
Risaralda	8	0,430
Amazonas	9	0,427
Caldas	10	0,446
Casanare	11	0,470
San Andrés, Providencia y Santa Catalina	12	0,478
Huila	13	0,462
Tolima	14	0,455
Boyacá	15	0,453
Norte de Santander	16	0,497
Cesar	17	0,497
Guaviare	18	0,509
Bolívar	19	0,521
Magdalena	20	0,532
Arauca	21	0,534
Caquetá	22	0,537
Cauca	23	0,538
Nariño	24	0,542
Córdoba	25	0,542
Sucre	26	0,554
Putumayo	27	0,557
Guainía	28	0,574
La Guajira	29	0,580
Amazonas	30	0,600
Chocó	31	0,633
Vaupés	32	0,656
Vichada	33	0,742

Fuente: MinTIC, IBD 2023

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD


En igual manera, al descender al análisis de resultados es posible decantar que, si bien en la medición del indicador de la **dimensión de aprovechamiento TIC**, se muestra mejoría por disminución del referido índice, también es notorio que el Departamento Norte de Santander, retrocedió una posición en el ranking de esta dimensión, por efecto de la mejoría y ascenso del indicador IBD de otros departamentos

Lo esbozado conlleva a establecer en forma incuestionable que, la administración del departamento Norte de Santander debe continuar gestionando en forma progresiva los elementos que componen esta dimensión, a través de la oferta de disponibilidad de servicios e infraestructura (o canales) necesarios para la conexión y acceso a conectividad a internet a los estudiantes y comunidad en general.

En cuanto a las cifras consolidadas del **índice de brecha digital IBD del año 2024**, debe decirse que, para la fecha de elaboración del presente estudio, no ha sido publicado por el MINTIC, el correspondiente informe IBD – RESULTADOS 2024, sin embargo, en el sitio web del ministerio se obtuvo información de los resultados del Boletín trimestral TIC hasta el CUARTO (4) TRIMESTRE DE 2024, (4T-2024), que reflejo datos o información sectorial que proviene de los reportes periódicos que realizan los Proveedores de redes y Servicios de telecomunicaciones (PRST) al portal de estadísticas del sector TIC – Colombia TIC, que denotan que, el acceso a Internet en Colombia continúa en aumento.

El referido Boletín trimestral TIC hasta el CUARTO (4) TRIMESTRE DE 2024, (4T-2024) – IBD-MINTIC, refleja que, al término del cuarto trimestre de 2024, el total de accesos fijos a Internet en Colombia alcanzó los 9,09 millones, es decir, cerca de 210 mil accesos más a Internet que los registrados en el mismo trimestre del año inmediatamente anterior, cuando se alcanzó una cifra de 8,88 millones. (Gráfico 1)

Gráfico 1.
Accesos fijos a Internet (millones)

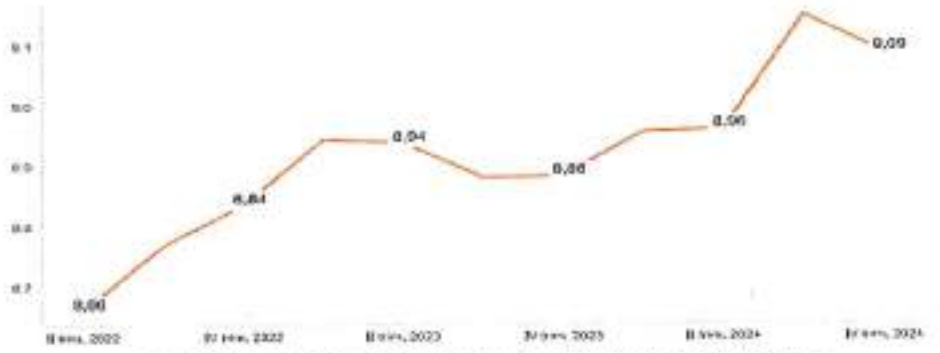


Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios a Colombia TIC.
Fecha de consulta: 3 de abril de 2025. Pr: (4T-2024); Pv: (3T-2024 a 1T-2023); Dt: (4T-2023).

Por su parte, el número aproximado de accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes en el país se situó en 17 a diciembre de 2024. (Gráfico 2).

Gráfico 2.

Accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes

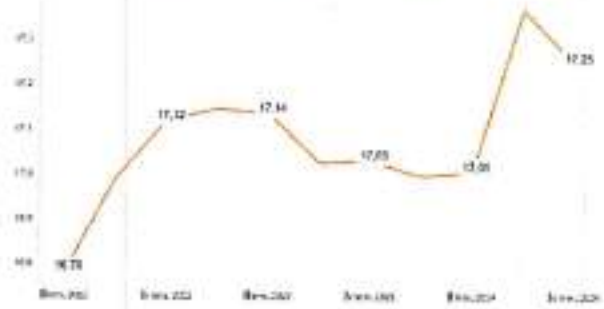


Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios a Colombia TIC y proyecciones de población del DANE con base en el Censo 2018.
Fecha de consulta: 3 de abril de 2025. Pr: (4T-2024); Pv: (3T-2024 a 1T-2023); Dt: (4T-2022).

Con una variación del -0,68 % entre el cuarto trimestre de 2024 y el trimestre inmediatamente anterior, los accesos fijos a Internet presentaron un decrecimiento en valores absolutos mayor de 44 mil accesos, por su parte la variación porcentual presentada en el 2023 para el mismo periodo de análisis fue de 0,03%. (Gráfico 3).

Gráfico 3.

Variación porcentual trimestral del número de accesos a Internet fijo

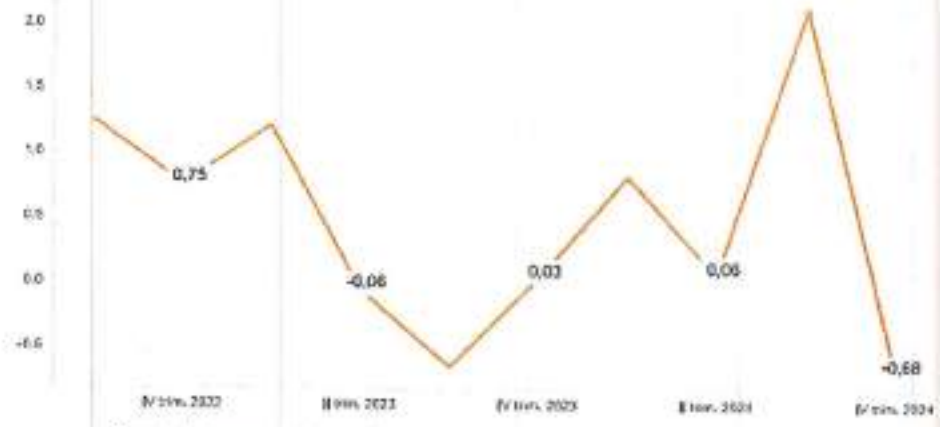


Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios a Colombia TIC.
Fecha de consulta: 3 de abril de 2025. Pr: (4T-2024); Pv: (3T-2024 a 1T-2023); Dt: (4T-2022).

Al finalizar el cuarto trimestre de 2024, la distribución de Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST), según el número de accesos fijos a Internet, muestra que tres registraron más de 1 millón de accesos, mientras que 594 proveedores tenían entre 100 y 1.000 accesos. (Gráfico 4).

Gráfico 4.

Número de proveedores según el número de accesos fijos a Internet

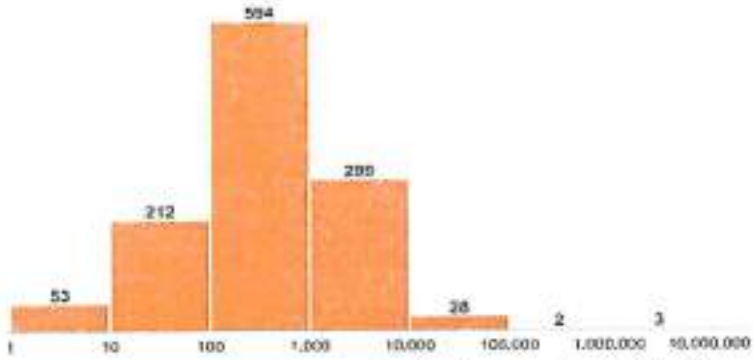


Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios a Colombia TIC.
Fecha de consulta: 3 de abril de 2025. Pr: (4T-2024); Pv: (3T-2024 a 1T-2023); Df: (4T-2022).

El citado Boletín trimestral TIC hasta el CUARTO (4) TRIMESTRE DE 2024, (4T-2024) – IBD-MINTIC, detalla la distribución de PRST, según los ingresos operacionales en pesos colombianos que se produjeron por la prestación del servicio de acceso fijo a Internet, presenta que 19 proveedores tuvieron ingresos iguales o superiores a $10.000 millones, mientras 85 tuvieron ingresos entre $1.000 millones y menos de $10.000 millones durante el cuarto trimestre de 2024. (Gráfico 5).

Gráfico 5.

Número de proveedores según ingresos operacionales (millones de pesos)

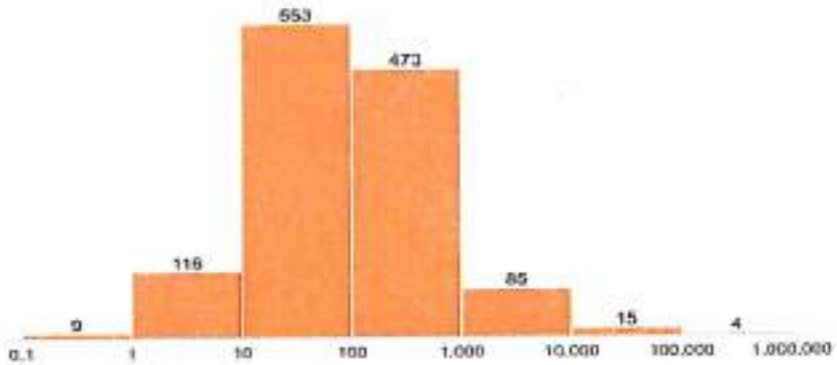


Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios a Colombia TIC.
Fecha de consulta: 3 de abril de 2025. Pr: (4T-2024); Pv: (3T-2024 a 1T-2023); Df: (4T-2022).

Según el boletín, al término del cuarto trimestre de 2024, el proveedor con mayor número de accesos fijos a Internet fue Comcel (3,27 millones), seguido por UNE EPM (1,65 millones), Movistar (1,55 Millones) y ETB (580 mil). (Gráfico 6).

Gráfico 6.

Proveedores según número de accesos fijos a Internet (millones)

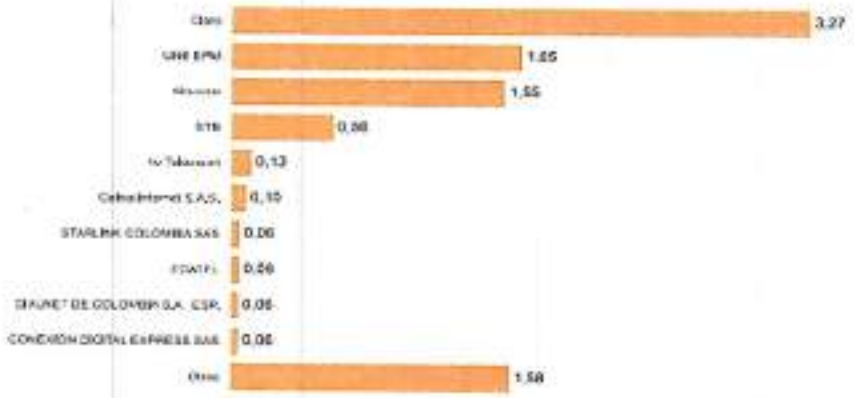


Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios a Colombia TIC.
Fecha de consulta: 3 de abril de 2025. Pr: (4T-2024); Pv: (3T-2024 a 1T-2023); Dt: (4T-2022).

EL mencionado informe o Boletín CUARTO (4) TRIMESTRE DE 2024, (4T-2024) – IBD-MINTIC, detalla que, la velocidad de descarga promedio nacional del servicio de acceso fijo a Internet fue de 227,2 Mbps para el cuarto trimestre de 2024, lo que representa un aumento mayor a 20 Mbps en el último año. (Gráfico 8).

Gráfico 8.

Velocidad de descarga promedio nacional (Mbps)

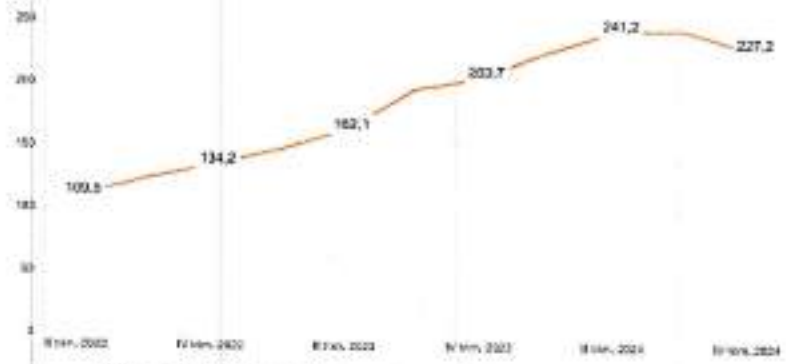


Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios a Colombia TIC.
Fecha de consulta: 3 de abril de 2025. Pr: (4T-2024); Pv: (3T-2024 a 1T-2023); Dt: (4T-2022). Cálculos MinTIC*.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La velocidad de descarga promedio nacional de Internet fijo durante el cuarto trimestre de 2024 para el segmento corporativo fue de 227,2 Mbps, **mientras la del segmento residencial se ubicó en 226,4 Mbps**. (Gráfico 9)


Gráfico 9.
Velocidad de descarga promedio por segmento (Mbps)

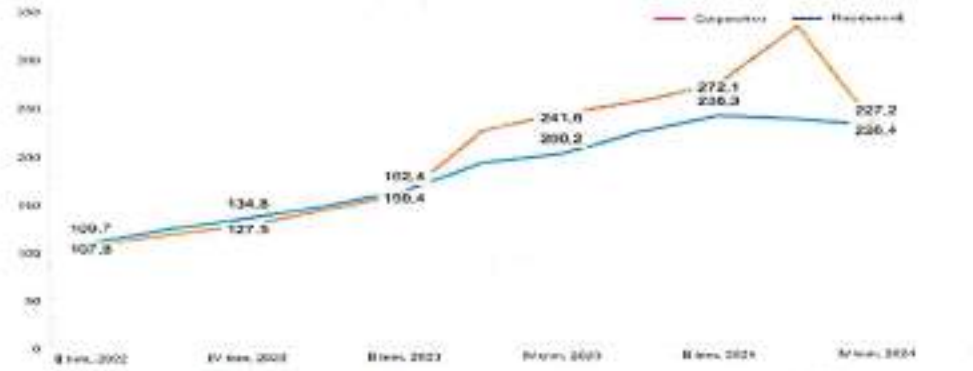

FFuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios a Colombia TIC.
Fecha de consulta: 3 de abril de 2025. Pr: (4T-2024); Pv: (3T-2024 a 1T-2023); Df: (4T-2022). Cálculos MinTIC.

Al término del cuarto trimestre de 2024, el mayor número de accesos fijos a Internet en el segmento residencial se ubicó en el bloque de velocidad de descarga comprendido entre los 256 Mbps y los 512 Mbps, al igual que en el segmento corporativo, el cual se ubicó en el bloque de velocidad de descarga comprendido entre los 256 Mbps y los 512 Mbps. (Gráfico 10).


Gráfico 10.
Accesos fijos a Internet según velocidad de descarga y segmento (millones)

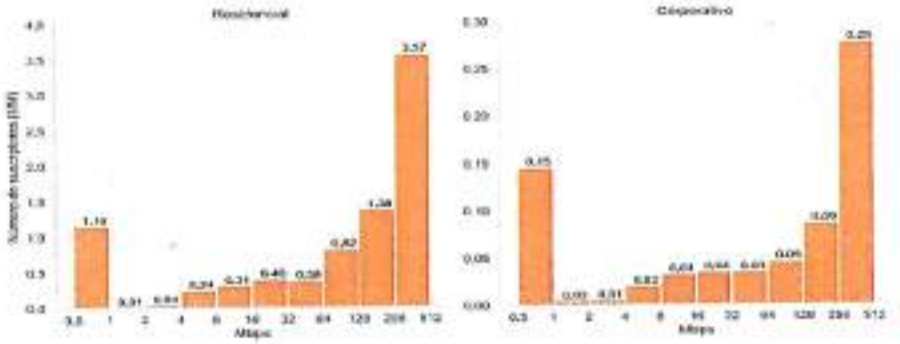

Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios a Colombia TIC.
Fecha de consulta: 3 de abril de 2025. Pr: (4T-2024); Pv: (3T-2024 a 1T-2023); Df: (4T-2022). Cálculos MinTIC.

La velocidad de descarga promedio de Internet fijo en los estratos 2, 3, 4, 5 y 6 superan la velocidad promedio de descarga nacional al finalizar el cuarto trimestre de 2024. Mientras el estrato 1 tiene una velocidad de descarga de Internet 134,4 Mbps. (Gráfico 11).


Gráfico 11.
Velocidad de descarga promedio por estrato – segmento residencial (Mbps)

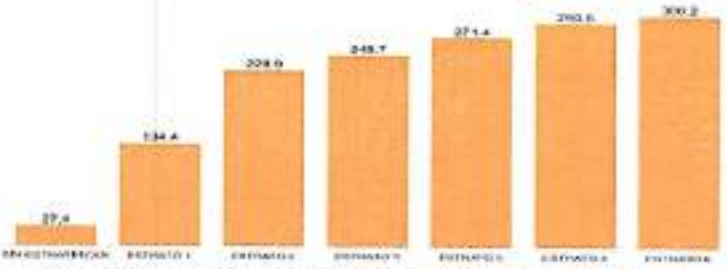

Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios a Colombia TIC.
Fecha de consulta: 3 de abril de 2025. Pr: (4T-2024); Pv: (3T-2024 a 1T-2023); Dt: (4T-2022). Cálculos MinTIC.

La velocidad de descarga por estratos socioeconómicos en los últimos trimestres ha presentado tendencia al alza. Es así, que el estrato 6 del segmento residencial tenía una velocidad de descarga promedio nacional de 279,1 Mbps al finalizar el cuarto trimestre de 2023 y pasó a 300,2 Mbps en el cuarto trimestre de 2024, convirtiéndose en el estrato socioeconómico con la mayor velocidad de conexión a Internet fijo, mientras el estrato 3 descendió, pasó de 253,7 Mbps a 248,7 Mbps para el mismo periodo de análisis. (Gráfico 12).


Gráfico 12.
Velocidad de descarga promedio por estrato (Mbps)

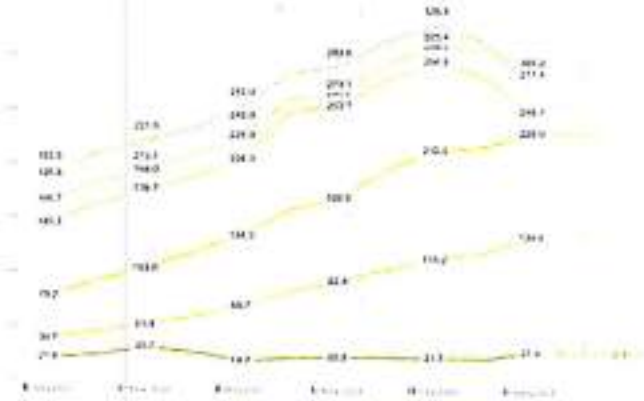

Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios a Colombia TIC.
Fecha de consulta: 3 de abril de 2025. Pr: (4T-2024); Pv: (3T-2024 a 1T-2023); Dt: (4T-2022). Cálculos MinTIC.

Al término del cuarto trimestre de 2024, las principales tecnologías de acceso fijo a Internet en cuanto a valores absolutos fueron: Fibra Óptica, con 4,5 millones de accesos; Cable, con 4,1 millones de accesos; xDSL, con cerca de 100 mil accesos y otras tecnologías, con cerca de 300 mil accesos fijos a Internet. (Gráfico 13).


Gráfico 13.
Accesos fijos a Internet por tipo de tecnología (millones)

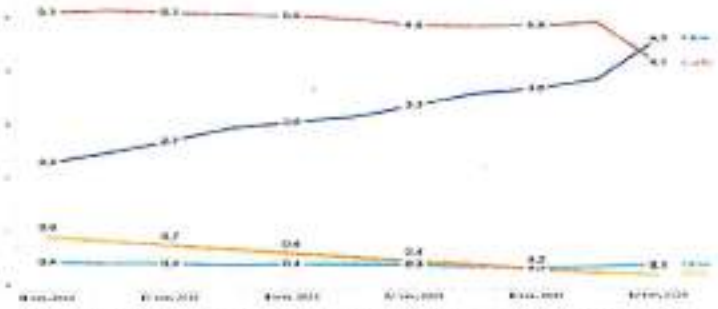

Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios a Colombia TIC.
Fecha de consulta: 3 de abril de 2025. Pr: (4T-2024); Pv: (9T-2024 a 1T-2023); Of: (4T-2022).

Al término del cuarto trimestre de 2024, Bogotá, D.C., con 29 accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes, lideró el indicador frente a los 32 departamentos de Colombia, seguida por los departamentos de Antioquia y Quindío con 23 y 22 accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes respectivamente. Departamentos como Vaupés, Vichada, Guainía y Guaviare presentaron avances importantes en este indicador en el último año. (Gráfico 16)

Gráfico 16.
Accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes por departamento

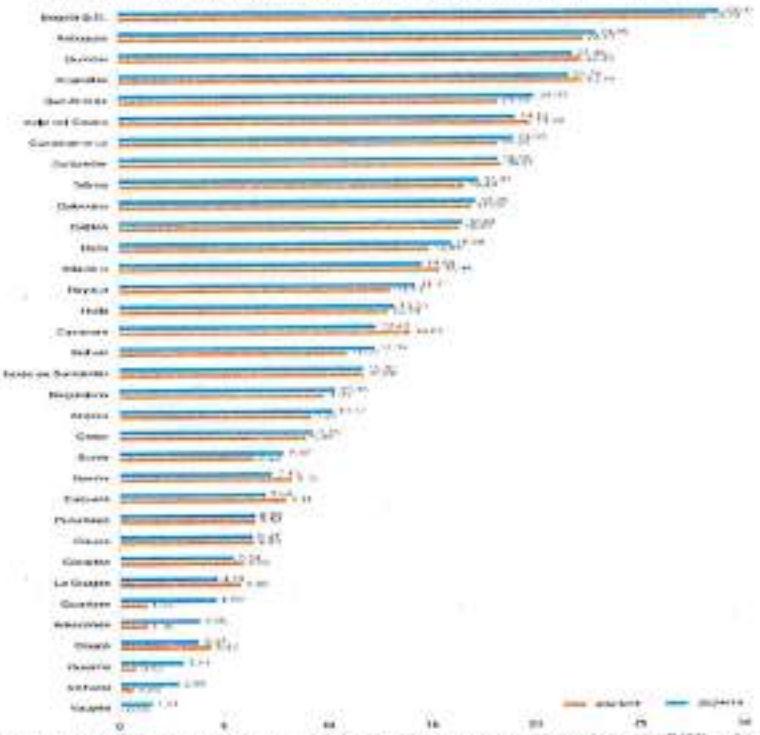

Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios a Colombia TIC y proyecciones de población del DANE con base en el Censo 2018.
Fecha de consulta: 3 de abril de 2025. Pr: (4T-2024); Pv: (3T-2024 a 1T-2023); Of: (4T-2022).

De lo detallado en el gráfico anterior (grafico 16), puede observarse que, al término del cuarto (4°) trimestre de 2024, Norte de Santander, con 11,80 accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes, ocupó la posición No. 18 del indicador, frente al indicador de 11,86 accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes que registro en el mismo periodo del año 2023, lo cual en comparación denota un leve descenso o retroceso.

➢ **Índice de Hogares con Acceso a Internet en el Departamento Norte de Santander:**

Además de lo detallado y conociendo que, en Colombia, el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) es el organismo que recopila y publica los datos sobre el índice de hogares conectados a internet, que obtiene información y datos a través de la Encuesta de Tecnologías de la Información y la Comunicación en Hogares (ENTIC Hogares) y la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), se hace preciso traer a colación los resultados del Boletín Técnico conexo a la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2024, emitido por el DANE, publicado el 25 de abril de 2025, la proporción de hogares con conexión a internet (fija o móvil) ascendió a 65,6% en 2024, lo que significa un crecimiento de 1,7 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. El incremento en el acceso a internet en 2024 se concentró principalmente en las cabeceras municipales, como se observa en la gráfica siguiente:

Hogares con acceso a internet (%)
Total nacional y área
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Área	Porcentaje					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total nacional	51,9	56,5	60,5	58,5	63,9	65,6
Cabecera	61,6	66,6	70,0	67,5	70,5	72,5
Centros poblados y rural disperso	20,7	23,9	28,8	32,2	41,4	41,9

Fuente: DANE, ECV.

El análisis del indicador por departamentos muestra que los hogares de Bogotá tienen el mayor nivel de conectividad (82,7%), seguido de los que habitan en Meta y Tolima. Por su parte, las proporciones más bajas de hogares conectados a internet (inferiores al 30,0%) se registran en Vichada, Vaupés y Chocó.

Hogares con acceso a internet (%)
Total nacional y departamentos
2024



Fuente: DANE, ECV.


ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

De la gráfica anterior deriva que, en el indicador total nacional y por departamentos, de hogares conectados a internet en la vigencia 2024, norte de Santander ostenta la posición 17, reflejando ponderación porcentual de 60.5 %

En resumen puede decirse que, pesar de los avances en materia de conectividad, los mismos han sido desiguales entre las regiones y entre grupos de ingreso, toda vez que hay 23 departamentos del pais, entre los mencionados está el Departamento de Norte de Santander, para los hogares en estratos 1 y 2 solo el 10,97% tienen acceso a fibra óptica, lo que representa aproximadamente 35.622 hogares1 , dando como resultado que el departamento se encuentran por debajo de la cantidad de accesos fijos a Internet fijo por cada 100 habitantes

El análisis del Índice Departamental de Competitividad 2024 para Norte de Santander, representado en la gráfica siguiente, subraya la necesidad urgente de inversión en infraestructura tecnológica, particularmente en conectividad.

IDC 2024 Norte de Santander.

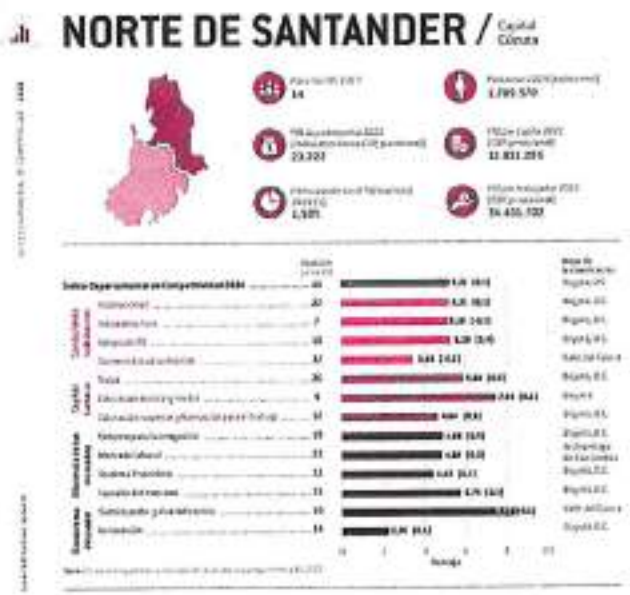

fuente:https://compite.com.co/indice-departamental-de-competitividad/

Avistados los datos indicadores, debe decirse que, en aras de atender el asunto, en el Plan de Desarrollo para el Departamento Norte de Santander 2024-2027, denominado: "NORTE, TERRITORIO DE PAZ", se dejó plasmado como antecedente del plan que, durante las vigencias

1 https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-383732_archivo_xls.xlsx

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

2019 a 2021, los indicadores mostraron un aumento relevante, aunque en 2022 se observó una disminución.

Sin embargo, se mantuvo un promedio constante de hogares conectados a Internet que tiende al incremento durante los últimos cuatro años, lo que ha mejorado la calidad de vida de muchos ciudadanos en el departamento. En 2022, el 56.1% de los hogares tenían conexión a Internet, con un 59.1% en las cabeceras y un 43.4% en centros poblados y zonas rurales dispersas, cerrando la brecha y ubicándose ligeramente por debajo de la media nacional del 59.5%.

En cuanto al índice de personas que usan internet, el Plan Departamental de Desarrollo describió que, durante las vigencias 2019 a 2022, este índice mostró un aumento significativo, reflejando una tendencia positiva en el uso de Internet por parte de los ciudadanos del departamento. En 2022, el 72.6% de las personas mayores de 5 años utilizaron Internet, con un 76.8% en las cabeceras y un 55.8% en centros poblados y zonas rurales dispersas, incidiendo en el cierre de la brecha y ubicándose ligeramente por debajo de la media nacional del 72.8%.

Plantea el PDD que, el aumento en la cobertura de formación técnica y tecnológica ha incidido positivamente en los porcentajes de hogares con Internet en el Departamento Norte de Santander, aumentando los índices educativos, el número de eventos culturales y facilitando los pagos de tributos departamentales.

Entre los impactos sociales más importantes del acceso y uso de las TIC, se encuentran una mayor oportunidad de acceder a información relevante para la búsqueda de empleo y la generación de ingresos, el intercambio de conocimientos, el desarrollo de habilidades y capacidades, y niveles más altos de integración social. De esta manera, las TIC pueden influir positivamente en la productividad y la calidad de vida de las personas.

Empero, a pesar de que el comportamiento estadístico muestra crecimiento o mejora progresiva derivada de las gestiones de la administración territorial y el apoyo del gobierno nacional en la formulación, aprobación y ejecución de programas y proyectos que han favorecido el avance hacia el cierre de la brecha digital, mediante el incremento de hogares conectados y la propensión hacia el aumento en la cantidad de personas con posibilidad de acceso a internet, se hace preciso mantener esfuerzos, articulación, sinergia y gestiones continuas entre la administración territorial y nacional con el fin de avanzar hacia mejoramiento sucesivo de los indicadores hasta la mayor disminución o cierre que fuere posible de la brecha digital

- **FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD:**

Dada la necesidad continuar desplegando esfuerzos, acciones y gestiones tendientes a lograr el incremento o favorecimiento de los indicadores de hogares conectados y personas con posibilidad de acceso a internet en aras del cierre de la brecha digital, debe decirse que la Gobernación del Departamento Norte de Santander.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Como precedente, conviene señalar que la Gobernación de Norte de Santander y el Fondo único de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – FUTIC, adscrito al MINTIC, celebraron en el año 2024, el convenio interadministrativo No. 1957-2024, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA MASIFICACIÓN DE ACCESOS E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DESTINADA A FORTALECER LA CONECTIVIDAD Y CERRAR LAS BRECHAS DIGITALES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER" para la materialización de dicho objeto, el ente territorial celebró contrato interadministrativo No. CI-STIC-03760-2024, cuyo objeto corresponde a: contrato interadministrativo para la ejecución del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD Y CIERRE DE LA BRECHA DIGITAL MEDIANTE EL SERVICIO DE BANDA ANCHA A HOGARES ESTRAO 1 Y 2, EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, VILLA DEL ROSARIO, LOS PATIOS, EL ZULIA Y SAN CAYETANO, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER". Este contrato tiene como finalidad instalar la infraestructura necesaria para favorecer con la prestación del servicio de conectividad a internet de banda ancha a un total de 12.265 hogares con estratificación socioeconómica 1 o 2, en los Municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia y San Cayetano (Norte de Santander).

En suma al expuesto proyecto en ejecución, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MinTIC, en el marco de lo señalado en el numeral 1 del artículo 142 de la Ley 2294 de 2023, Plan Nacional de Desarrollo, que establece: "*1. Llevar conectividad digital a zonas vulnerables y apartadas, y mejorar la cobertura y calidad de los servicios de telecomunicaciones, a través de diferentes tecnologías y compartición de infraestructura.*" aborda la Convergencia Regional para el fortalecimiento de los vínculos intra e interregionales para incrementar la productividad, competitividad e innovación en los territorios a través de la Estrategia Nacional Digital (END)i 2023 – 2026 de Colombia, Instrumento que contiene y coordina todas las iniciativas de política pública del Gobierno nacional relacionadas con conectividad y transformación digital para los próximos años, proporcionando la visión del país con respecto al acceso, uso y apropiación de los datos y las tecnologías digitales, centrándose en varios aspectos clave, entre ellos, la alfabetización y apropiación digital con el objetivo de democratizar el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y fomentar la sociedad del conocimiento y la tecnología.

En ese sentido, a partir del radicado No. 252061056 del 22 de abril de 2025, la Dirección de Infraestructura del FUTIC - MINTIC, elaboró los estudios y documentos previos con los cuales justificó la necesidad de suscripción de un nuevo Convenio Interadministrativo con la Gobernación de Norte de Santander, cuyo objeto correspondería a: "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JUNTAS DE INTERNET DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER", con el fin de cerrar la brecha digital, promover la masificación del acceso a Internet y fortalecer el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC.*", entre el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NORTE

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

SANTANDER, de acuerdo con los argumentos expuestos en el estudio previo, el cual hace parte integral del presente documento.

Lo anterior, considerando la actual la extensión de los efectos y Decretos que derivaron de la declaratoria del estado de conmoción interior mediante el Decreto 62 de 2025, por un término de noventa (90) días, en la región del Catatumbo y el Área Metropolitana de Cúcuta —zonas que comprenden los municipios de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, así como Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander—, se hace necesario y urgente aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la implementación y ejecución del proyecto denominado "*Implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios TIC y apropiación digital en los hogares, instituciones educativas, juntas de internet de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander*". Esta situación excepcional exige respuestas institucionales inmediatas que permitan mitigar los impactos sociales y garantizar el acceso equitativo a tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de inclusión, desarrollo y estabilización territorial.

Este proyecto de Implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios tic y apropiación digital en los hogares, comunidades de conectividad e instituciones educativas de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del departamento de Norte de Santander, se enfoca en abordar uno los desafíos más apremiantes como es el cierre de la brecha digital en las zonas rurales, al empoderar a las comunidades locales para que construyan, mantengan y gestionen sus propias redes de conectividad, garantizando además del acceso a internet en áreas rurales remotas, el desarrollo económico y social de estas regiones con el fortalecimiento de la infraestructura de conectividad comunitaria y apoyo a las instituciones educativas brindando el servicio de conectividad a internet.

Así las cosas, conforme a la solicitud y la justificación efectuada por la Dirección de Infraestructura, se encontró conveniente, justificado, necesario y oportuno celebrar el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1211-2025** entre el **FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FUTIC**, identificado con NIT 800.131.648-6 y la **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NORTE SANTANDER** para "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JUNTAS DE INTERNET DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

El proyecto o el convenio, incluye la implementación de medidas estratégicas para implementar soluciones de conectividad para hogares urbanos y rurales e Instituciones educativas a través del modelo de Juntas de Internet - Comunidades de Conectividad (JI-CDC) en el departamento, por eso se propone como primera medida la implementación de soluciones individuales de conectividad satelital para 100 Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) que permita conectar

a más de 6000 hogares del área urbana y rural, además de brindar el servicio de conectividad a 110 Instituciones educativas en los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Hacarí, La Playa, Los Patios, Ocaña, Puerto Santander, San Cayetano, San Calixto, San José de Cúcuta, Sardinata, Teorema, Tibú, Villa del Rosario con el fin de cerrar la brecha digital, promover la masificación del acceso a Internet en zonas rurales, apartadas y de difícil acceso en el territorio nacional y fortalecer el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC.

El propósito fundamental de este proyecto y convenio es facilitar el acceso universal a la información y el cierre de la brecha digital mediante la conectividad y el aprovechamiento de herramientas tecnológicas de última generación para transformar a los municipios que hacen parte de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander, en un modelo de territorio conectado con habilidades digitales para la transformación productiva

Con el desarrollo del convenio se busca aumentar el índice de penetración de internet de banda ancha fija en promedio a un 13% para los 17 municipios con la conectividad de los 6000 hogares a través de las 100 juntas de internet – comunidades de conectividad (JI-CDC), además de capacitarlas para la prestación del servicio de internet comunitario. El proyecto también fomentará la colaboración entre instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y la sociedad civil, para aprovechar sinergias y generar un mayor impacto en la comunidad. Con un enfoque integral y participativo, este proyecto busca transformar la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander en una región inclusiva y digitalmente conectada, asegurando que todos sus habitantes puedan beneficiarse plenamente de las oportunidades que ofrece la era digital.

En consecuencia, a partir de la suscripción e inicio de ejecución del antedicho convenio con FUTIC, sobre el Departamento Norte de Santander recae la obligación de Coordinar y administrar diligentemente todo el proceso de ejecución del proyecto en todas y cada una de sus etapas (CAPEX y OPEX), incluyendo celebración, ejecución y liquidación que se requiera del contrato o contratos derivados para el desarrollo del convenio. En efecto, la responsabilidad de la ejecución del proyecto, durante el plazo de ejecución del convenio, estará a cargo del ente cooperante GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER, atendiendo la ejecución de las actividades descritas en el documento de anexo técnico, plan de ejecución financiera, propuesta y demás documentos que forman parte integral del convenio

Por tales razones, conforme a la exhibida previsión de obligaciones contraídas a partir de la firma del Gobernador de Norte de Santander del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1211-2025 entre el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FUTIC, identificado con NIT 800.131.648-6 y la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NORTE SANTANDER para "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JUNTAS DE INTERNET DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE

SANTANDER, arriba citado, se impartió directriz a la Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Norte de Santander - TIC, de que en el marco de la delegación prevista en el Decreto Departamental No. 00073 de 2024, conforme a la competencia y funcionalidad sectorial, así como en observancia de los Programas, estrategias, apuestas, metas y proyectos encaminados al cumplimiento del Plan de desarrollo: "***2024 – 2027, NORTE, TERRIOTRIO DE PAZ"*** y a las actuaciones previstas en el plan de acción, se proceda a elaborar los análisis, estudios y documentos, actos y contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Departamento Norte de Santander, contenidas en el referido convenio **1211-2025;** directriz que justifica la elaboración del presente estudio previo.

Con la puesta en ejecución del proyecto, además de lograr el cumplimiento en el departamento Norte de Santander del mandato normativo que impone al Ministerio TIC – MINTIC, promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de promover la inversión y el cierre de la brecha digital, contribuir al desarrollo económico, social y político de la Nación, y elevar el bienestar de los colombianos, también se dará cumplimiento cometidos institucionales de la administración departamental de Norte de Santander, como son las estrategias encausadas a lograr la cristalización de la "***APUESTA 1: CONECTIVIDAD: CERRANDO BRECHAS DIGITALES***", de la que subyacen varias estrategias, dentro de las que sobresalen: "***A.*** *Establecer convenios, alianzas para la dotación de equipos tecnológicos con especificaciones técnicas de última generación; (…).* ***F.*** *Instalar, mejorar, ampliar la cobertura y capacidad de la infraestructura tecnológica de la conectividad a internet con las distintas tecnologías disponibles de última generación en las zonas urbanas del departamento.* ***G.*** *Utilizar las distintas tecnologías disponibles para conectar a todos los habitantes del territorio*", lo expuesto, en conexidad con la iniciativa PDD: "*INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN DE COBERTURA, FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA CONECTIVIDAD EN ESPACIOS DE ACCESO PÚBLICO Y EN LAS SEDES EDUCATIVAS EN LA ZONAS URBANAS Y RURALES DEL DEPARTAMENTO*", buscando con ello, la materialización de las METAS PDD: **119.** Sedes educativas oficiales beneficiadas con acceso a internet; y la META PDD: **122.** Conexiones a internet fijo y móvil. Todo esto, en el marco del Proyecto de inversión departamental, denominado: "**FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DIGITAL, BASADO EN EL ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**", identificado con código BPIN **2024004540048**

Para el logro del fin común del FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FUTIC y la GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER, acordado en el convenio No. **1211-2025," se hace necesario que el ente territorial** a través de la Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC, despliegue las acciones y gestiones, análisis, actos estudios y documentos necesarios para: "**CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JUNTAS DE INTERNET DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, CONFORME A LAS ESTIPULACIONES PREVISTAS EN EL DOCUMENTO: "ANEXO TÉCNICO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL**

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1211-2025, SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - FUTIC, CON EL FIN DE CERRAR LA BRECHA DIGITAL, PROMOVER LA MASIFICACIÓN DEL ACCESO A INTERNET Y FORTALECER EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC"

Esta iniciativa, como se dijo líneas arriba, se centra en la implementación de métodos estratégicos para implementar soluciones de conectividad para hogares urbanos y rurales e Instituciones educativas a través del modelo de Juntas de internet - Comunidades de Conectividad (JI-CDC) en el departamento, por eso se plantea como primera medida la implementación de soluciones individuales de conectividad satelital para 100 Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) que permita conectar a más de 6000 hogares del área urbana y rural, además de ofrecer el servicio de conectividad a 110 Instituciones educativas en los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Hacarí, La Playa, Los Patios, Ocaña, Puerto Santander, San Cayetano, San Calixto, San José de Cúcuta, Sardinata, Teorema, Tibú, Villa del Rosario con el fin de cerrar la brecha digital, suscitar la masificación del acceso a Internet en zonas rurales, apartadas y de difícil acceso en el territorio nacional y fortificar el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC.

El propósito fundamental de este proyecto es facilitar el acceso universal a la información y el cierre de la brecha digital mediante la conectividad y el aprovechamiento de herramientas tecnológicas de última generación para transformar a los municipios que hacen parte de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander en un modelo de territorio conectado con habilidades digitales para la transformación productiva.

Con el impulso del proyecto se pretende incrementar el índice de penetración de internet de banda ancha fija en promedio a un 13% para los 17 municipios con la conectividad de los 6000 hogares a través de las 100 juntas de internet – comunidades de conectividad (JI-CDC), además de capacitarlas para la prestación del servicio de internet comunitario. El proyecto también fomentará la colaboración entre instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y la sociedad civil, para aprovechar sinergias y generar un mayor impacto en la comunidad. Con un enfoque integral y participativo, este proyecto busca transformar la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander en una región inclusiva y digitalmente conectada, asegurando que todos sus habitantes puedan beneficiarse plenamente de las oportunidades que ofrece la era digital

Ahora bien, como quiera que el proyecto celebrado en la vigencia anterior (2.024), entre FUTIC y el Departamento Norte de Santander, se viene ejecutando con la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. E.S.P. - EMTEL E.S.P. con resultado optimo o eficiente, se formuló directriz superior desde el despacho del Gobernador y la Secretaría TIC, a los redactores del presente estudio técnico, de verificar la viabilidad de encomendar la ejecución de este nuevo proyecto al referido operador.

Así las cosas, es procedente descender a analizar la posibilidad de que, el proyecto pueda llevarse a cabo mediante la suscripción de un Contrato interadministrativo entre el Departamento de Norte de Santander y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. E.S.P. - EMTEL E.S.P., fundamentado

en los fines comunes legalmente establecidos para ambas partes, dado que como entidades públicas tienen funciones interrelacionadas y complementarias.

En ese sentido hay que decir que, efectuada la verificación de documentación, de constitución, existencia, representación legal y experiencia de la mencionada sociedad, se decanta que, la **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P. - EMTEL E.S.P.,** identificada con el NIT. No. 891.502.163-1, con domicilio principal en la Calle 5 No. 5-68, barrio Centro, del Municipio de Popayán, Departamento del Cauca, es una Sociedad anónima, por Acciones, constituida como Empresa de Servicios Públicos Mixta, regida por los parámetros legales consagrados en la ley 142 de 1994, opera bajo el régimen especial establecido en la Ley 1341 de 2009, es regulada y vigilada por entidades estatales como la CRC, el Ministerio de Comunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio (en lo no regulado por la Ley de servicios públicos domiciliarios – servicios de valor agregado y demás) y por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; fue creada y constituida por la Alcaldía de Popayán, mediante la escritura Pública No 1757 del 20 de octubre de 1998, de la Notaría Tercera del Círculo de Popayán, registrada en la Cámara de Comercio el 30 de octubre de 1998, con el Número 13037 del Libro IX, como persona Jurídica de naturaleza comercial y tiene como objeto social la prestación de servicios referentes de telecomunicaciones, relacionadas y/o conexas con ellas suscribiendo todo tipo de contratos, y se denomina: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P. - EMTEL E.S.P.

De la misma manera, se encuentra que LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P., tiene por objeto social; *"(...)la prestación de servicios referentes de telecomunicaciones fijas y móviles, tecnologías de la información y las actividades complementarias, relacionadas y/o conexas con ellos, para el cumplimiento del objeto social la empresa, podrá desarrollar todo tipo de contratos o asociarse o formar consorcios con otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, prestadoras o usuarias con el fin de lograr la universalidad, calidad y eficacia en la prestación de los servicios, atendiendo criterios técnicos, rigor jurídico, costos de operación, prestación de los servicios, solidaridad y redistribución de ingresos en aquellos para los que la ley lo disponga, pudiendo importar y exportar bienes, accesorios, partes, repuestos y servicios relacionados con las señaladas tecnologías de la información y las comunicaciones, así como su venta y comercialización; la explotación profesional, industrial y comercial del diseño, planeación, construcción, instalación, mantenimiento, soporte, gestión e interventoría de todo tipo de redes; prestar servicios ofimáticos, de data center, de call y contact center, asesoría y consultoría en tecnología, informática*

Esta relación contractual permitirá al departamento y a EMTEL E.S.P., entregar desde su ámbito funcional, su concurso y compromiso, comprometiéndose a realizar actividades que contribuyan directamente al cumplimiento del objetivo de transformación digital, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos a través de dos componentes esenciales: la conectividad y la digitalización.

El contrato a celebrar se respalda con los principios constitucionales y legales que rigen la actividad contractual del Estado, tales como la transparencia, la planeación y la buena fe, y también con la función administrativa definida en el artículo 209 de la Constitución Política, que incluye la moralidad, la economía y la celeridad. En resumen, este contrato Interadministrativo es un mecanismo de gestión conjunta formalizado a través de acuerdos entre el Departamento de Norte de Santander y EMTEL E.S.P., dirigido a lograr los objetivos de la administración pública bajo los principios de coordinación y cooperación, sin que esto implique una cesión de las competencias asignadas a cada entidad.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

En concordancia se proyecta suscribir un contrato Interadministrativo con EMTEL E.S.P., entidad territorial que está sujeta a las disposiciones del estatuto general de contratación, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015, y demás normas vigentes en materia de contratación estatal.

Por su parte, el Departamento Norte de Santander hace parte de la rama ejecutiva del poder público que integra la administración pública de Colombia en el correspondiente nivel territorial, su función se rige por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, según lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.

En consecuencia, la modalidad de contratación a la que puede acudirse para suplir esta necesidad obedece contratación directa, mediante formalización de un contrato Interadministrativo, dada la calidad de entidades públicas de las partes.

Consonante a lo anterior, se encuentra conveniente, justificada, necesaria y oportuna la celebración de un contrato Interadministrativo, entre el DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, y EMTEL S.A. E.S.P., para ejecutar un contrato interadministrativo tendiente a: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JUNTAS DE INTERNET DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, CONFORME A LAS ESTIPULACIONES PREVISTAS EN EL DOCUMENTO: "ANEXO TÉCNICO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1211-2025, SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - FUTIC, CON EL FIN DE CERRAR LA BRECHA DIGITAL, PROMOVER LA MASIFICACIÓN DEL ACCESO A INTERNET Y FORTALECER EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC"**, máxime si se tiene a la vista como uno de los criterios de selección que, como se exhibió líneas arriba, la citada empresa viene operando desde la vigencia anterior, la ejecución de un proyecto de similares características relacionadas a el fortalecimiento de la conectividad y cierre de la brecha digital mediante el servicio de banda ancha a hogares estratos 1 y 2, en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia y San Cayetano, en el departamento de Norte de Santander, con excelentes resultados para la administración departamental de Norte de Santander, como constan en las evidencias y actas de informe de supervisión y cumplimiento del contrato No. CI-STIC-03760-2024.

Así las cosas, se evidencia entonces que, EMTEL E.S.P., conforme la verificación hecha por parte del departamento Norte de Santander, cumple criterios de capacidad idoneidad y experiencia para la ejecución del contrato interadministrativo a suscribir, y que su misionalidad, trayectoria y logros son afines a los objetivos que se pretenden desarrollar con su celebración.

Conforme a lo anterior, se encuentra conveniente, justificada, necesaria y oportuna la celebración de un contrato Interadministrativo, entre el DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, y

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

EMTEL E.S.P., para ejecutar un contrato interadministrativo tendiente a materializar, ejecutar operativizar y cumplir las obligaciones bienes y/o servicios previstos en el documento: ANEXO TÉCNICO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, que hacen parte integral del convenio interadministrativo No. 1211-2025, suscrito entre la Gobernación de Norte de Santander y la Unidad Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – MINTIC, denominada FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - FUTIC, con el que se busca cerrar la brecha digital, promover la masificación del acceso a internet y fortalecer el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC"

En tal sentido, resta describir que, la suscripción del contrato Interadministrativo a formalizar se sujetará a los requisitos y formalidades que exige la Ley para la contratación entre entidades de derecho público, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política, los cuales se desarrollan en los artículos 6 y 95 de Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.4., en concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1, del Decreto 1082 de 2015.

2. OBJETO A CONTRATAR; FICHA TÉCNICA Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS – ALCANCE DEL OBJETO.

OBJETO A CONTRATAR.

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JUNTAS DE INTERNET DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, CONFORME A LAS ESTIPULACIONES PREVISTAS EN EL DOCUMENTO: "ANEXO TÉCNICO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1211-2025, SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - FUTIC, CON EL FIN DE CERRAR LA BRECHA DIGITAL, PROMOVER LA MASIFICACIÓN DEL ACCESO A INTERNET Y FORTALECER EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC"

Códigos UNSPSC	81111700	Sistemas de manejo de información
	81112100	Servicio de internet
	81112200	Mantenimiento y soporte de software
	81161500	Servicios de administración de acceso
	43211500	Computadores
	43221700	Equipos fijos de red y componentes

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

2.1. FICHA TÉCNICA – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La ejecución del contrato se efectuará conforme a las especificaciones técnicas que se detallan a continuación, concordantes con especificaciones técnicas del documento ANEXO TÉCNICO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", que hacen parte integral del convenio interadministrativo No. 1211-2025, suscrito entre la GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER y, el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FUTIC:

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE REDES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS JUNTAS DE INTERNET – COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD, CONECTIVIDAD A HOGARES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Objetivo Específico 1: Incrementar la penetración y cobertura de conectividad en hogares a través de la implementación de Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad (JI-CDC) en los municipios de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander.	
Producto:	Servicio de conexiones a redes de acceso
Indicador de Producto:	Conexiones a internet fijo y / o móvil
Medido a través de:	Número de conexiones a internet
Meta:	6000 hogares conectados
Indicador de Producto: Conexiones de	Comunidades de conectividad conectadas
Medido a través de:	Número de conexiones a internet
Meta:	100 Juntas de Internet - Comunidades de Conectividad (JI-CDC) conectadas

Objetivo Específico 2 Incrementar la conectividad a internet de instituciones educativas en los municipios de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander	
Producto:	Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Indicador de producto:	Soluciones de conectividad en instituciones públicas instaladas
Medido a través de:	Número de centros
Meta:	110 situaciones educativas públicas conectadas

A. ETAPA O FASE CAPEX

- DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA.

A efectos de una adecuada compresión del documento y de minimizar las diferencias conceptuales entre quienes lo consulten, se describen a continuación los principales términos empleados.

Acceso: La puesta a disposición por parte de un proveedor a otro proveedor, de recursos físicos y/o lógicos de su red para la provisión de servicios. El acceso implica el uso de las redes. (*Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.1*).

Acceso a Internet: Disponibilidad de medios físicos que incluye todas las funcionalidades y recursos de red nacionales y/o internacionales necesarios para permitir a un usuario interconectarse a la red de Internet y aprovechar sus recursos y servicios. (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 1).

Acceso a las TIC: Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de recursos, aplicaciones herramientas, programas informáticos, equipos, redes y medios; que permiten el almacenamiento, procesamiento, compilación, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes.

Access point (AP) o punto de acceso: Son dispositivos para establecer una conexión inalámbrica entre equipos y pueden formar una red inalámbrica externa (local o internet)) con la que se pueden interconectar dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbricas. Esta red inalámbrica se llama WLAN (Wireless local área network) y se usa para reducir las conexiones cableadas. Pueden agregarse más puntos a una red para generar redes de cobertura más amplia o conectar antenas más grandes que amplifiquen la señal.

Backbone: Corresponde al termino red troncal o troncal de internet, el cual se considera como una de las principales conexiones de Internet. Cada troncal está compuesta por un gran número de enrutadores interconectados, comerciales, gubernamentales, universitarios y de otra índole de gran capacidad que llevan los datos a través de países, continentes y océanos del mundo mediante cables de fibra óptica3.

Banda Ancha: Es la capacidad de transmisión cuyo ancho de banda es suficiente para permitir, de manera combinada, la provisión de voz, datos y video ya sea de manera alámbrica o inalámbrica. Las velocidades efectivas asociadas a la definición de Banda Ancha podrán ser revisadas y actualizadas cuando la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) lo considere apropiado. (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 4) indicando para los servicios ofrecidos a partir del 1 de enero de 2019, corresponde a velocidades mínimo de 25 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida.

Banda Ku: Corresponde a una banda de frecuencia para la tecnología satelital que cubre el espectro electromagnético en el rango de frecuencia de 11 a 20 GHz.

Calidad de servicio (QOS): El efecto global de la calidad de funcionamiento de un servicio que determina el grado de satisfacción del servicio por parte de un usuario. (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 6).

CAPEX: Capital Expenditures (inversiones en bienes de capitales) son inversiones de capital que crean beneficios. Corresponde al costo asociado a los servicios de adecuación e instalación de los equipos (hardware y software) concernientes a la zona Digital

Cargo de acceso y uso de las redes: Corresponde a la tarifa de los operadores, por parte de otros operadores, por concepto de la utilización de sus redes, medido en términos de unidades de tiempo o cualquier otro concepto que resulte apropiado para tal efecto. (Resolución CRT 087 de 1997, artículo 1.2)

Cargo por conexión: Valor que incluye únicamente los costos asociados a la conexión de los servicios de comunicaciones fijas y televisión por suscripción, el cual otorga al usuario el derecho a la conexión e instalación del servicio.

Si se prestan varios servicios de comunicaciones sobre una misma red de acceso, el cargo por conexión corresponde al valor de la conexión e instalación de un servicio más los costos incrementales en que se pueda incurrir por conectar los otros servicios a la red de acceso común. (Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 9, modificada por la Resolución CRC 4930 de 2016).

Caso fortuito y fuerza mayor: El artículo primero de la Ley 95 de 1890 señala que se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto á que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. De igual manera, el Código Civil en su artículo 64 establece que se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.

CCC: Centro de Contacto al Ciudadano. Es el punto integrado donde a través de diferentes canales como teléfono, correo electrónico, se brinda atención, respuestas inmediatas y se realiza seguimiento a las solicitudes a los beneficiarios de los proyectos de la Dirección de Infraestructura.

Acometida Residencial: Es la conexión eléctrica que permite llevar la energía desde la red de distribución de la empresa suministradora hasta una vivienda o edificio de viviendas, ya sea de forma aérea o subterránea, y es un elemento fundamental para dotar de electricidad a los hogares.

Conectividad: Modelo de cofinanciación en el que participen constructores, beneficiarios VIS, prestadores de servicios de Internet, y el Estado.

Enlace Satelital: Es un canal por el cual se envían y/o reciben datos, los cuales viajan a través de señales de radiofrecuencia, que se emiten desde una estación terrena principal (Tele puerto) hasta un satélite, este a su vez reenvía las señales a una estación remota ubicada en cualquier punto de la tierra. En la estación remota se convierten las señales en datos para tener acceso a: internet, telefonía, video, streaming. Esto se logra por medio de un módem satelital.

Equipo Terminal: Dispositivo que permite el acceso a una red de telecomunicaciones, que está destinado a ser conectado directamente por cualquier medio a interfaces, entendidas estas últimas como puntos de terminación de red, tanto físicos como radioeléctricos. (Resolución CRT 087 de 1997, artículo 1.2, Adicionada por la Resolución CRC 4507 de 2014).

Fibra Óptica1: La fibra óptica se compone de filamentos de vidrio, aunque algunas veces se pueden encontrar de plástico. La forma de enviar información a través de la fibra óptica es a través de haces de luz, los cuales viajan dentro de ella. En telecomunicaciones, es el medio de transmisión más utilizado gracias a la gran capacidad que tiene de enviar información, ya que a través de un hilo de fibra óptica se pueden enviar millones de bits por segundo (bps) y acceder a servicios de manera simultánea con gran velocidad y calidad

FUTIC - Fondo Único de TIC: Corresponde al Fondo único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al que se refiere la Ley 1341 de 2009.

GEO: Corresponde a la órbita terrestre ubicada a 35,786 km de altitud, donde los satélites se mueven a la misma velocidad de rotación de la Tierra, manteniéndose fijos sobre un punto del planeta. Son ideales para telecomunicaciones, radiodifusión y monitoreo meteorológico, ya que ofrecen cobertura continua en amplias regiones. Sin embargo, presentan mayor latencia en comparación con las órbitas LEO y MEO.

GPON: Son las siglas de Gigabit Passive Optical Network, la alternativa a la conmutación Ethernet en redes de campus. GPON reemplaza el diseño tradicional de Ethernet de tres niveles con una red óptica de dos niveles al eliminar los conmutadores Ethernet de acceso y distribución con dispositivos ópticos pasivos.

Hogar Conectado: Es el hogar a conectar con el proyecto

Interconexión: Es la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos de las redes de telecomunicaciones, incluidas las instalaciones esenciales, necesarias para permitir el Inter funcionamiento de redes y la interoperabilidad de plataformas, servicios y/o aplicaciones que permite que usuarios de diferentes redes se comuniquen entre sí o accedan a servicios prestados por otro proveedor. La interconexión de las redes implica el uso de estas y se constituye en un tipo especial de acceso entre proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.7).

Internet: Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación.

Interoperabilidad: Es el correcto funcionamiento de plataformas, servicios y/o aplicaciones que se prestan sobre redes interconectadas, a partir del intercambio mutuo de información y la utilización de esta. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.12).

Instalaciones: Son los elementos de la infraestructura de los operadores. (Resolución CRT 087 de 1997, artículo 1.2).

Instalaciones Esenciales: Toda instalación de una red o servicio de telecomunicaciones que sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o por un número limitado de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, y cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo económico o en lo técnico. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.6).

IP: Una dirección IP (Internet Protocol) es un identificador único asignado a cada dispositivo conectado a una red que utiliza el Protocolo de Internet para comunicarse. Puede ser de dos tipos: IPv4 (formato numérico de 32 bits) e IPv6 (formato alfanumérico de 128 bits). Se usa para identificar y localizar dispositivos en la red, permitiendo la transferencia de datos entre ellos.

Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad (JI-CDC): Para el caso del servicio de Internet comunitario fijo, se entiende como la persona jurídica de naturaleza pública o privada sin ánimo de lucro, integrada por personas naturales o jurídicas que estén unidas por lazos de vecindad y colaboración, cumpliendo con fines cívicos, cooperativos, solidarios, académicos, ecológicos, educativos, recreativos, culturales o institucionales, y que pueden pertenecer a pueblos, organizaciones, comunidades o grupos étnicos

LEO: Corresponde a la órbita terrestre baja, situada entre 160 y 2,000 km de altitud. Los satélites en LEO completan una vuelta alrededor de la Tierra en 90 a 120 minutos, lo que permite una latencia muy baja. Esto los hace ideales para servicios de internet de alta velocidad, videoconferencias, juegos en línea y trading financiero. Las constelaciones de satélites en LEO trabajan en conjunto para proporcionar cobertura global con una menor latencia que las órbitas MEO y GEO.

Medidas Regulatorias: Medidas generales o particulares, adoptadas por la CRC con el fin de solucionar problemas según sean las condiciones de competencia de los mercados de telecomunicaciones. Las medidas de carácter particular serán adoptadas por la CRC mediante resoluciones de carácter particular y concreto. (Resolución CRC 2058 de 2009, artículo 4).

MEO: Corresponde a la órbita terrestre media, ubicada entre 2,000 y 35,786 km de altitud. Los satélites en MEO tienen una velocidad y latencia intermedia entre LEO y GEO, siendo utilizados principalmente para sistemas de navegación, como GPS, y algunos servicios de telecomunicaciones. Su cobertura es mayor que la de LEO, pero con una latencia más alta.

MinTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia.

Nemotécnica: La forma a emplear en la emisión y respuesta de los comunicados generados en el proyecto, asociados a cada una de las etapas y obligaciones contractuales del mismo.

NOC: Network Operations Center por sus siglas en inglés es una ubicación centralizada donde los sistemas informáticos, de telecomunicaciones o de redes satelitales se supervisan y gestionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es la primera línea de defensa contra interrupciones y fallas de la red.

Nodo de Interconexión: Es el elemento, o conjunto de elementos, de red que permite recibir, conmutar, enrutar y enviar comunicaciones entre diferentes redes. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.13).
OLT: El terminal de línea óptica, es un dispositivo que agrega todas las señales ópticas de las ONT en un único haz de luz multiplexado cuando se convierte en una señal eléctrica, formateada según los estándares de paquetes ethernet para el reenvío de capa dos o capa tres.

ONT: El terminal de red óptica conecta los dispositivos de usuarios finales (computadoras de escritorio, teléfonos, etc.) a la red GPON. Proporciona la conversión de señal óptica a eléctrica. Los ONT también proporcionan cifrado AES mediante la clave ONT.

ODF: Distribuidores de fibra óptica también conocidos como repartidores ópticos modulares, son armarios que permiten organizar los conectores terminales de fibra, su diseño los hace ideales para combinar altas densidades de fibras facilitando la operación, seguridad y sencillez de mantenimiento. Se instalan en las centrales EL CONTRATISTA para conectar las fibras que van hacia la red GPON con el OLT

OPEX: "Operating Expense", es un coste permanente para el funcionamiento de un producto, negocio o sistema. Puede traducirse como gasto de funcionamiento, gastos operativos, o gastos operacionales Corresponde al costo asociado a los servicios de operación y mantenimiento de los equipos de hardware y software necesarios concernientes.

Oferta básica de acceso y uso de infraestructura: Es el proyecto de negocio que un proveedor de la infraestructura pone en conocimiento general y que contiene la definición de todos los elementos mínimos necesarios para el acceso y uso de su infraestructura, sometido a validación de la CRC. (Resolución CRC 4841 de 2015, artículo 3).

Petición para los usuarios del servicio de comunicaciones: Cualquier solicitud de servicios o de información asociada a la prestación de los servicios que presta el proveedor o cualquier manifestación verbal o escrita del usuario, mediante la cual se solicite ante el proveedor algún derecho derivado de la ejecución del contrato o inherente al mismo. (Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 9).

Phishing: Acto de enviar un correo electrónico a un usuario, afirmando falsamente ser una empresa legítima, en donde el usuario es dirigido a una página Web falsa, con el objeto de que el usuario entregue información privada que será utilizada para el robo de identidad y contraseñas. (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 25).

Promoción y apropiación: Corresponde al costo de las actividades en sitio para generar interacción de los ciudadanos con las Zona Digital. Adicionalmente, actividades de difusión como eventos, material POP, etc, y distintas estrategias de Promoción.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

PQR para los usuarios del servicio de comunicaciones: Petición, queja o recurso formulado por el usuario ante el proveedor de servicios de comunicaciones, que contribuye al adecuado ejercicio de sus derechos. (Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 9)

Proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST): Persona jurídica responsable de la operación de redes y/o de la provisión de servicios de telecomunicaciones a terceros. En consecuencia, todos aquellos proveedores habilitados bajo regímenes legales previos a la Ley 1341 de 2009 se consideran cobijados por la presente definición. (Resolución CRC 3501 de 2011, artículo 3, numeral 3.8).

Proveedor de bienes y servicio: Persona natural o jurídica que suministra productos, materiales, insumos o presta servicios a entidades públicas o privadas.

Proveedor en el régimen de acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones: Persona natural o jurídica que, sirviéndose de redes de telecomunicaciones, presta a terceros servicios de telecomunicaciones, provee contenidos y/o aplicaciones, o comercializa redes o servicios de telecomunicaciones. Dicho proveedor puede o no operar una red. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.15).

PMtP: Soluciones inalámbricas de redes punto multipunto que utilizan antenas omnidireccionales o sectoriales para establecer conexiones inalámbricas entre un punto central y varios puntos remotos, es decir, varios puntos remotos comparten una conexión con el punto central.

Red de acceso2: Esta red tiene un alcance de pocos kilómetros (generalmente dentro de una ciudad o municipio), y utiliza principalmente alguna de las siguientes tecnologías: ADSL, DOCSIS, WiMax, UMTS, HSPA, LTE VSAT y/o líneas dedicadas

Red de alimentación: Conjunto de equipos activos y pasivos de telecomunicaciones, cables, regletas, conectores y demás elementos que hacen parte de una derivación de la red de acceso de telecomunicaciones, de propiedad del proveedor de servicios de telecomunicaciones, que conectan la red interna de telecomunicaciones del inmueble con las centrales o nodos de comunicaciones de las redes de dicho proveedor. (Resolución CRC 3499 de 2011, artículo 3, numeral 3.2)

Red de telecomunicaciones: Conjunto de nodos y enlaces alámbricos, radioeléctricos, ópticos u otros sistemas electromagnéticos, incluidos todos sus componentes físicos y lógicos necesarios, que proveen conexiones entre dos

(2) o más puntos, fijos o móviles, terrestres o espaciales, para cursar telecomunicaciones. Para su conexión a la red, los terminales deberán ser homologados y no forman parte de la misma. (MinTIC, Resolución 202 de 2010, artículo 1).

Red de transporte3: Consiste en la infraestructura, medios de transmisión y equipos necesarios para transportar las señales de telecomunicaciones. Esta red está constituida por enlaces que unen distintas zonas de una misma ciudad, así como las diversas regiones y municipios, y utiliza principalmente tres clases de medios de transporte: fibra óptica, enlaces microondas y enlaces satelitales.

SLA: Acuerdo de nivel de servicio o "Service Level Agreement" por sus siglas en inglés Sistema básico de puesta a tierra: conjunto de elementos diseñados para proporcionar una conexión segura entre las partes metálicas de una instalación eléctrica y la tierra, con el objetivo de proteger tanto a las personas como a los equipos eléctricos de posibles fallas o descargas eléctricas. Compuesto por picas o jabalinas, conductor de puesta a tierra y sistema de conexión.

Sostenibilidad: Condición que garantiza que los objetivos e impactos positivos del proyecto de inversión perduren de forma duradera después de transferencia de los beneficios y la operatividad del servicio a la comunidad.

Tarifa social: Corresponde al pago mensual realizado por los usuarios el cual es establecido por la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad para la prestación del servicio de internet a los hogares y garantiza además de la sostenibilidad del proyecto, la asequibilidad del beneficiario en el marco de la prestación del servicio de Internet Comunitario Fijo.

Telecomunicaciones: Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos y sonidos, datos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios visuales u otros sistemas electromagnéticos. (Ley 72 de 1989, artículo 2).

TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones definidas conforme al artículo 6° de la Ley 1341 de 2009. (Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 9).

Tránsito IP/Capacidad húmeda: Conexión a las redes mundiales que no se alcancen a través de las conexiones directas establecidas. Esta conexión se realiza a través de los cables submarinos que conectan Colombia con Estados Unidos y se realizan en Miami y Ashburn.

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones. (Resolución CRT 087 de 1997, artículo 1.2).

UPS: Es un sistema de alimentación ininterrumpida (unstoppable power supply), puede proporcionar o suministrar energía eléctrica por un tiempo limitado durante un corte de energía debido a sus baterías y otros elementos encargados de almacenar energía.

Velocidad efectiva de transmisión de datos: Es la capacidad de transmisión medida en Kbps, incluyendo tanto el segmento de acceso como los canales nacionales e internacionales, y que corresponde al valor mínimo de las mediciones asociadas al parámetro establecido en el numeral 5.2.3 de la recomendación ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-10). (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 3)

Verificación remota: Se refiere al monitoreo y verificación a distancia de los parámetros técnicos objeto de estudio, con equipos y personal especializado, que permitan una atención de las solicitudes de manera precisa y de acuerdo con las necesidades requeridas, para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de cobertura, verificación del cumplimiento de condiciones calidad, prestación del servicio, ancho de banda de internet, usuarios, acceso a internet, entre otros.

Visita de campo: Se refiere a la verificación de parámetros técnicos en el sitio motivo de estudio, con equipos y personal especializado, que permitan una atención de las solicitudes de manera precisa y de acuerdo con las necesidades requeridas.

Vulnerabilidad: Cualquier debilidad que podría explotarse con el fin de violar un sistema o la información que contiene. (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 28)

WiFi (Wireless Fidelity): Es una tecnología de red inalámbrica a través de la cual los dispositivos, como computadoras (portátiles y de escritorio), dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y accesorios) y otros equipos (impresoras y videocámaras), pueden interactuar con Internet. Permite que estos dispositivos, entre tantos otros, intercambien información entre sí y establezcan, de esta manera, una red. La conectividad a Internet se logra a través de un Router inalámbrico. Cuando accede a wifi, se conecta a un router inalámbrico que permite que los dispositivos que admiten wifi interactúen con Internet

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- DESCRIPCIÓN GENERAL Y UBICACIÓN

El proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER", está orientado a proveer el despliegue, instalación y puesta en servicio de 100 Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad (JI-CDC), conectividad a internet de 6000 hogares y 110 instituciones educativas en los municipios de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Santander, quienes además cuentan con una baja penetración de acceso a internet

Figura 1 Ubicación del proyecto



De la figura 1 anterior, los municipio focalizados corresponden a los sombreados

Tabla 1 Penetración de Acceso a Internet

CÓDIGO DANE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	No. ACCESOS FIJOS A INTERNET	POBLACIÓN DANE	PENETRACIÓN Accesos / Población
54003	NORTE DE SANTANDER	ABREGO	2.230	35.936	6,2%
54206	NORTE DE SANTANDER	CONVENCIÓN	80	21.175	0,4%
54245	NORTE DE SANTANDER	EL CARMEN	343	15.080	2,3%
54250	NORTE DE SANTANDER	EL TARRA	169	23.521	0,7%
54261	NORTE DE SANTANDER	EL ZULIA	1.435	30.816	4,7%
54344	NORTE DE SANTANDER	HACARI	89	11.559	0,8%
54398	NORTE DE SANTANDER	LA PLAYA	219	8.741	2,5%
54405	NORTE DE SANTANDER	LOS PATIOS	18.868	103.733	18,2%
54498	NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	7.863	135.344	5,8%
54553	NORTE DE SANTANDER	PUERTO SANTANDER	1.149	9.913	11,6%
54670	NORTE DE SANTANDER	SAN CALIXTO	28	14.496	0,2%
54673	NORTE DE SANTANDER	SAN CAYETANO	1.267	8.102	15,6%
54001	NORTE DE SANTANDER	SAN JOSE DE CUCUTA	123.478	812.176	15,2%
54720	NORTE DE SANTANDER	SARDINATA	1.060	28.969	3,7%
54800	NORTE DE SANTANDER	TEORAMA	42	18.731	0,2%
54810	NORTE DE SANTANDER	TIBU	1.798	62.151	2,9%
54874	NORTE DE SANTANDER	VILLA DEL ROSARIO	17.730	116.221	15,3%

- ALCANCE DEL PROYECTO

EL CONTRATISTA operador deberá diseñar, implementar, entregar en servicio, prestar la asistencia en la operación y mantener una solución de red de acceso capaz de **garantizar el suministro del servicio de internet comunitario fijo a los 6000 hogares asociados de las 100 Juntas de Internet - Comunidades de Conectividad (JI-CDC)** beneficiarias con el proyecto. Así mismo deberá estructurar los planes de formación y brindar la capacitación requerida para que las Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad (JI-CDC) puedan, de manera autónoma, adelantar los procesos que les permita administrar, gestionar, operar y mantener el servicio de internet comunitario fijo.

Además, deberá diseñar, **implementar y prestar el servicio de internet en 110 instituciones educativas** priorizadas de los municipios de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander.

EL CONTRATISTA operador realizará el estudio de sitio, el diseño de la red de acceso, el suministro de los bienes e insumos para la instalación de la red y su puesta en funcionamiento para las Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad (JI- CDC) y para las instituciones educativas; así mismo garantizará la transferencia de conocimiento a los Asociados a la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC), siguiendo las siguientes etapas:

- PLANEACIÓN

En esta etapa el contratista operador a partir del proceso de sensibilización y caracterización realizado por la oficina de fomento regional de TIC de MINTIC de las 100 Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad

(JI-CDC) realizara el estudio de sitio, el diseño de la red de acceso proyectando la infraestructura necesaria para la instalación y elaborara el plan de trabajo hasta la entrega en operación de la solución de conectividad a la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad.

Para las instituciones educativas realizará el estudio de sitio y el diseño de la red de acceso que permitirá prestar el servicio de conectividad de acuerdo con los parámetros establecidos, además proyectará la infraestructura necesaria para la instalación y elaborará el plan de trabajo.

EL CONTRATISTA realizará la planeación e implementación y puesta en servicio de los nodos de servicio satelital, de forma que se configuren los puntos de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad y de la Institución Educativa.

La Junta de Internet – Comunidad de Conectividad, por medio de su(s) delegado(s) participará en la planeación facilitando al Ejecutor el acceso a la zona, brindando la información necesaria y de manera activa aprendiendo del proceso.

Durante la etapa de planeación EL CONTRATISTA deberá entregar por metas de planeación, definidas en el plan detallado de trabajo, para aprobación de la interventoría y/o supervisión los estudios de campo, el informe de ingeniería y operación, el plan de instalación y puesta en servicio y el plan de mantenimiento para cada una de las **100 Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad (JI-CDC)** y las **110 instituciones educativas**

- INSTALACIÓN

Considerando las actividades realizadas en la etapa de planeación, EL CONTRATISTA realizará el suministro e instalación y configuración de toda la infraestructura de la red de acceso, red de última milla y equipos de usuario para el acceso a internet en los hogares de los asociados de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad, así como de las instituciones educativas.

Además, se realiza la puesta a punto del nodo principal y del equipo de monitoreo de la red, y se hacen las respectivas pruebas de funcionamiento y estabilización, que incluye la conexión del servicio satelital para los nodos.

La Junta de Internet – Comunidad de Conectividad, por medio de su(s) delegado(s) participará en la instalación y configuración de la solución tecnológica de manera activa, aprendiendo y adquiriendo conocimientos por medio de la transferencia práctica de conocimiento realizada por EL CONTRATISTA.

Durante la etapa de instalación, EL CONTRATISTA deberá entregar por metas de instalación, definidas en el plan detallado de trabajo, para aprobación de la interventoría y/o supervisión, la instalación de la infraestructura física y digital de la red troncal y red de acceso implementada para cada una de las **100 Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad (JI-CDC)** y las **110 instituciones educativas.**

- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La gestión, operación y mantenimiento se enfoca a garantizar la calidad y disponibilidad de la red para la prestación eficiente y estable del servicio, la gestión de red y su monitoreo, la atención a fallos o incidentes y el mantenimiento preventivo y correctivo, como mínimo. La gestión, operación y el mantenimiento de la red de acceso es responsabilidad del EL CONTRATISTA, que se apoyará en los miembros seleccionados por la comunidad para "capacitarse haciendo".

La gestión, operación y mantenimiento de la red de acceso, incluye el soporte de nivel 1, 2 y 3, así como el suministro de repuestos, mantenimiento preventivo, correctivo y solución de incidentes. Después de los doce (12) meses de operación, la Junta de Internet realizará la operación y mantenimiento de la red de acceso, limitada al soporte de bajo nivel: niveles 1 y 2. Período en el cual, con base en la capacitación y curva de aprendizaje de los primeros doce (12) meses del proyecto, la Junta de Internet se hace cargo de la gestión de la red de acceso.

El contratista estará a cargo del servicio de soporte de nivel 3, ligado a la resolución avanzada de problemas técnicos complejos, también denominados soporte de back end, el cual se trata de un soporte de alto nivel, donde los agentes son responsables por resolver los problemas más complejos. Será responsabilidad de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad el reporte de los nuevos accesos de INTERNET fijo en el Sistema de Información Integral del Sector de TIC –Colombia TIC.

Para las instituciones educativas, una vez concluida la etapa de instalación el contratista iniciará la etapa de operación y mantenimiento para garantizar el servicio de conectividad en las sedes educativas por un periodo de dieciocho (18) meses, además deberá presentar en el Plan de Sostenibilidad el costo fijo anual del servicio con el fin de que el Cooperante (Gobernación de Norte de Santander) garantice la disponibilidad del servicio con recursos de naturaleza permanente, una vez finalizada la etapa de operación correspondiente a los primeros dieciocho (18) meses de operación

- CAPACITACIÓN

La capacitación tiene como objetivo el aprendizaje y formación de la comunidad, que busca mejorar las habilidades, conocimientos y competencias de lo(s) delegado(s) de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad, para lograr la transferencia de conocimiento y la adquisición de las competencias requeridas para desempeñar las tareas y funciones, operación y mantenimiento básico de las redes de acceso.


Durante este proceso, se espera que la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad inicie la implementación de los módulos de la facturación, los canales de comunicación con la comunidad, determinando los roles del personal que apoyará las gestiones para la prestación del Servicio de Internet Fijo Comunitario, atendiendo las novedades y PQRSD que se presenten, entre otros aspectos administrativos.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- ARQUITECTURA DE CONECTIVIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL NODO DE SERVICIOS.

Las actividades de la etapa o fase CAPEX Corresponden a los costos relacionados con la infraestructura tecnológica de red necesaria para implementar las 100 Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad (JI-CDC) e instalar el servicio de internet fijo en los 6000 hogares urbanos y rurales además de las 110 instituciones educativas de los municipios de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander. Para la solución tecnológica se plantea una red troncal a través de la configuración de múltiples accesos satelitales en órbita LEO y para los hogares además de una red de acceso de última milla a través de radioenlaces en tecnología GPON

Figura 2 Diagrama de bloques de la solución

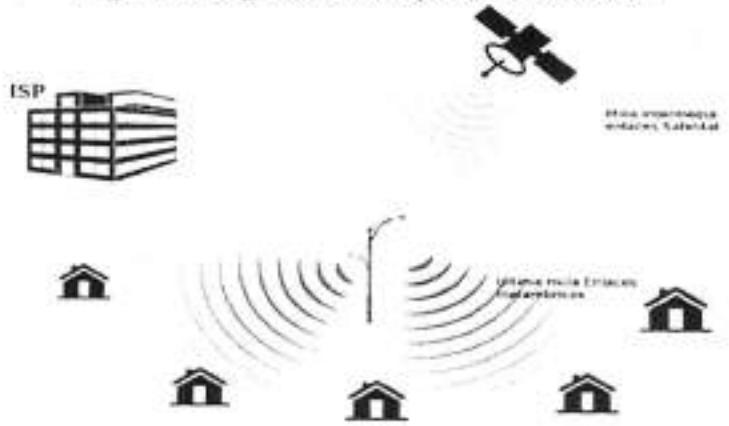

Las redes de acceso a través de radioenlaces para última milla son utilizadas como una alternativa de solución debido a las propiedades que posee la fibra óptica como medio de transmisión. Entre las principales propiedades de este medio de transmisión, se encuentra: un gran ancho de banda flexible capaz de ofrecer a los usuarios velocidades en el orden de los Mbps (Mega Bits Por Segundo).

Diez (10) días hábiles después de la firma del acta de inicio, el Cooperante deberá iniciar con la presentación del plan de ingeniería de detalle con el diseño de la arquitectura a implementar para cada junta de internet – comunidad de conectividad, en el que incluirá lo correspondiente al diagrama de la topología de red a usar, incluyendo la referencia de los equipos a instalar en la solución, este contará de manera general con la red troncal y la red de acceso para cada Junta de internet – Comunidad de conectividad beneficiada por el proyecto, posterior a cada presentación, la Interventoría contará con cinco (5) días hábiles para la emisión de las observaciones resultantes o en su defecto del respectivo concepto de aprobación.

NOTA: EL DEPARTAMENTO garantizará que EL CONTRATISTA gestione y contrate durante el periodo inicial del proyecto la infraestructura necesaria, para la implementación de las 100 juntas de internet – comunidades de conectividad (JI- CDC) que brindaran la cobertura de internet a los 6000 hogares y la conectividad de las 110 instituciones educativas. Además, se garantice que EL CONTRATISTA asuma los trámites y gestión de permisos y licencias a que haya lugar para llevar a cabo el proyecto.

- NODOS DE CONEXIÓN PARA LAS JI-CDC

El nodo de servicios de la Junta de internet – Comunidad de conectividad es el espacio físico provisto por cada Junta de Acción Comunal o entidad sin ánimo de lucro participante para EL CONTRATISTA realice las adecuaciones necesarias para brindar la capacidad troncal a internet a través del servicio satelital y realice la instalación y puesta en operación de los equipos del nodo de servicio de la red de acceso.

El espacio para el nodo será provisto por cada Junta de internet – Comunidad de conectividad, cumplirá con los requisitos técnicos, de seguridad, accesibilidad, protección contra las condiciones ambientales para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y asegurar como mínimo las siguientes características:

- **Disponibilidad de energía**
Circuito eléctrico – Toma eléctrico 110-120 VAC (Acometida residencial que garantice el punto de alimentación del servicio de energía eléctrica al interior del nodo de servicio). Deberá tener contratado el servicio de energía domiciliaria y asumir el costo que se derive del consumo, o contar con una fuente de energía propia.

- **Espacio bajo Techo**
Dimensiones: 2 metros x 2 metros (4 m²)
Propósito: Ubicación del gabinete y los equipos necesarios para la Junta de internet – Comunidad de conectividad.

- **Toma de Energía Eléctrica**
Disponibilidad de una toma de energía eléctrica en el espacio provisto
Voltaje y amperaje adecuados para alimentar los equipos de la junta (120Vac)

- **Espacio al Aire Libre para la instalación de la red de acceso de última milla PTMP - FWA**
Espacio disponible al aire libre para la ubicación de la torre
Dimensiones y características estructurales adecuadas para soportar la torre

- **Espacio en Fachada o Terraza para la instalación de las antenas satelitales**
Espacio disponible en la fachada o terraza del edificio
Propósito: Instalación de la antena satelital

El contratista realizará la adecuación del sitio provisto por la Junta de internet – Comunidad de conectividad, para el funcionamiento del nodo, adecuación que consistirá en el tendido de la red eléctrica desde el rack indoor hasta el tablero o breakers eléctricos, la instalación del sistema de tierra, la adecuación y cableado para la interconexión con la red de acceso y con la red troncal, adecuación del sitio y suministro, instalación y configuración de los siguientes elementos:

- Kits satelitales (Antena y modem) necesarias de acuerdo con la ingeniería de detalle.
- Gabinete (rack) de pared INDOOR de 14 unidades de rack, de las cuales se encuentran libres para instalación de equipo de red de acceso 4 unidades.
- UPS mínimo de 3KVA.

- Sistema básico de puesta a tierra.
- Mástil Metálico.
- Switch 8 puertos con funciones de capa 3.
- Protecciones eléctricas

EL CONTRATISTA debe realizar el diseño para la instalación de los equipos de la red de acceso, a partir de las condiciones físicas y ambientales del sitio dispuesto por la comunidad y ya adecuado por EL CONTRATISTA.


EL CONTRATISTA sobre el equipo Switch Capa 3, dispondrá de puertos Ópticos y/o Eléctricos con los cuales interconectará los equipos de la red de acceso para proporcionar acceso a los hogares de la Junta de Internet

- CARACTERISTICAS DE LAS REDES PUNTO MULTIPUNTO (FWA)

Las redes de acceso inalámbrico Punto Multipunto se componen de diferentes elementos claves que permiten la comunicación entre el punto central emisor y los múltiples puntos remotos. A continuación, se relacionan los componentes principales para una red de este tipo:

A continuación, se describe en alto nivel la arquitectura de la red Punto Multipunto:

Figura 3 Arquitectura de red activa Punto Multipunto

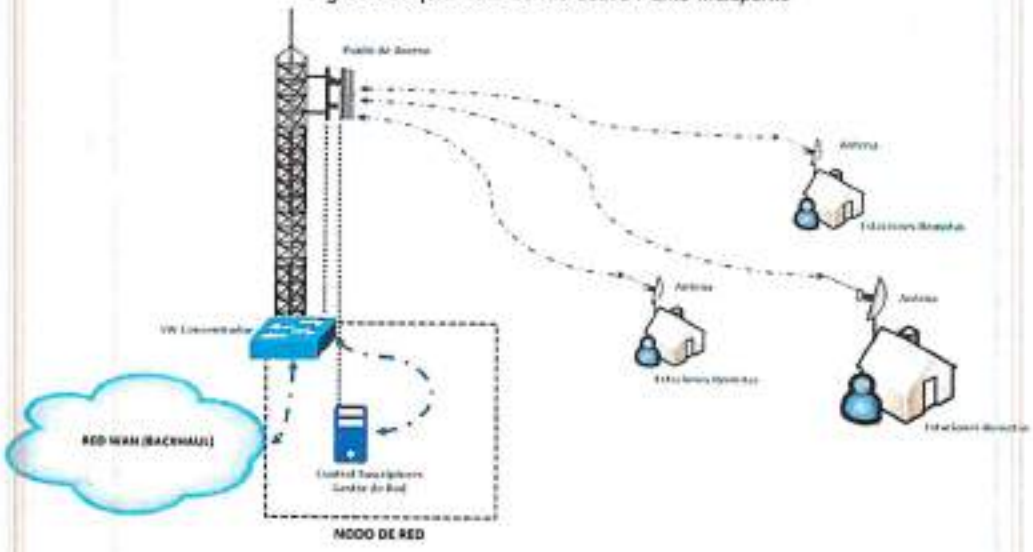

A continuación, se describe funcionalmente y de forma general, los componentes incluidos en la Arquitectura de la Red:

Punto de Acceso (AP): Este es el dispositivo central que se conecta a la red principal y transmite la señal inalámbrica a los dispositivos remotos. Actúa como el concentrador de la red.

Dispositivos Remotos (CPE): Los dispositivos de los hogares finales que se conectan al punto de acceso. Cada dispositivo remoto tiene una antena para recibir y enviar señales.

Antenas: Tanto el punto de acceso como las estaciones remotas utilizan antenas para la transmisión y recepción de señales. Las antenas pueden ser omnidireccionales (cubren un área amplia) o direccionales (enfocadas en una dirección específica) dependiendo de la topología de la red

Backhaul: La conexión que une el punto de acceso a la red principal o a Internet. Puede ser una conexión cableada (fibra óptica, Ethernet) o inalámbrica (enlaces de radio, satélite).

Controlador o Gestor de Red: Un dispositivo o software que gestiona y optimiza el rendimiento de la red, asegurando que los datos se transmitan de manera eficiente y segura.

Estos componentes trabajan juntos para proporcionar conectividad inalámbrica a múltiples hogares desde un solo punto central, haciendo eficiente el uso de recursos y facilitando la gestión de la red.

- CONEXIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

El contratista Ejecutor realizará la adecuación del sitio provisto por la Institución Educativa, para el funcionamiento del servicio de conectividad, adecuación que consistirá en el tendido de la red eléctrica desde el rack indoor hasta el tablero o breakers eléctricos, la instalación del sistema de tierra, la adecuación y cableado para la interconexión con la red de acceso y con la red troncal, adecuación del sitio y suministro, instalación y configuración de los siguientes elementos.

- Kit satelital (Antena y Modem).
- Gabinete (rack) de pared INDOOR de 10 unidades de rack, de las cuales se encuentran libres para instalación de equipo de red de acceso 4 unidades.
- UPS mínimo de 1KVA.
- Sistema básico de puesta a tierra.
- Puntos de acceso interno y externo ubicados estratégicamente para el acceso de la comunidad educativa.
- Protecciones eléctricas.

El contratista debe realizar el diseño para la instalación de los equipos de la red de acceso, a partir de las condiciones físicas y ambientales del sitio dispuestas por la institución educativa.

- CÁLCULOS Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SISTEMA

EL CONTRATISTA deberá realizar el cálculo y análisis del sistema que permita dimensionar en cada estudio de sitio e informe de ingeniería de detalle el diseño de red de acceso y red satelital necesario para cada Junta de Internet –

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Comunidad de Conectividad, que garantice la prestación del servicio de internet comunitario acorde al estándar de banda ancha TR-069 con velocidades de 25 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida, rehusó de 1:8 y una capacidad satelital con prioridad mensual de 20Gb mínimo por hogar beneficiario; así mismo EL CONTRATISTA deberá garantizar la prestación del servicio de internet en cada institución educativa con velocidades de 40 Mbps a 220 Mbps de bajada y 8 Mbps a 50 Mbps de subida con prioridad mensual de 1Tb mínimo por institución educativa, como se detalla en la tabla a continuación:

Tabla 2 Velocidad efectiva por hogar e institución educativa

Tipo de Servicio	Total	Variable: Velocidad Efectiva de Tx de datos (Descarga/Carga; Prioridad)	Medio
Hogar conectado a través de JI-CDC	6000	25 Mbps / 5 Mbps; Rehusó 1:8; Prioridad: 20Gb	Satelital
Institución Educativa	1|10	40-200 Mbps / 8-50 Mbps; Prioridad: 1Tb	

- SOLUCIÓN TECNOLÓGICA A IMPLEMENTAR

La tecnología seleccionada deberá permitir la ampliación futura de la capacidad y cobertura de la red mediante: Inclusión de nuevos puntos de acceso sin interrupción del servicio.

- Compatibilidad con futuras actualizaciones en equipos/elementos de red de acuerdo con la normatividad vigente.
- Sostenibilidad tecnológica: EL CONTRATISTA deberá garantizar que los equipos seleccionados cuenten con soporte técnico y actualizaciones de firmware durante al menos 3 años.

El contratista podrá seleccionar los equipos de comunicaciones, de datos, software y todos los elementos y accesorios para implementar, poner en funcionamiento y operar las redes de acceso, SIEMPRE Y CUANDO sean nuevos, tengan representación en Colombia, presenten garantía mínima de calidad de veinticuatro (24) meses, garanticen el cumplimiento de las características mínimas del servicio de las especificaciones técnicas y de los componentes de red, establecidas en este Anexo y cuenten con el aval de la interventoría y supervisión.

- ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL SERVICIO

Dentro de las consideraciones que se deben tener presente para la entrega del servicio se incluyen:

- **Velocidad:** El contratista deberá realizar el cálculo y análisis del sistema que permita dimensionar en cada estudio de sitio e informe de ingeniería de detalle el diseño de red de acceso y red satelital necesario para cada Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC), que garantice la prestación del servicio de internet comunitario acorde al estándar de banda ancha con velocidades de 25 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida, rehusó de 1:8, una capacidad satelital con prioridad mensual de 20Gb mínimo por hogar beneficiario y dándole cumplimiento al protocolo TR-069; así mismo EL CONTRATISTA deberá garantizar la prestación del servicio de internet en cada institución educativa con velocidades de 40 Mbps a 220 Mbps de bajada y 8 Mbps a 50 Mbps de subida con prioridad mensual de 1Tb mínimo por institución educativa.

- **Baja Latencia:** Para experimentar una buena experiencia de usuario, se debe mantener este parámetro lo más bajo posible, es decir < 100 ms, en la red de acceso.
- **Calidad de Servicio (QoS):** Se debe contar con administración de parámetros dentro de la gestión del servicio, para priorizar el tráfico de datos crítico. Esto permitirá que aplicaciones sensibles al tiempo, como la voz sobre IP (VoIP) y el video en tiempo real, tengan prioridad sobre otros tipos de tráfico que se puedan presentar.
- **Fiabilidad y Disponibilidad:** Los diferentes segmentos que conforman la red para el transporte del servicio, tales como la Agregación y Acceso, deben ser fiables con un tiempo de actividad cercano al 100%.
- **Interoperabilidad:** Los diferentes equipos y componentes de la red de acceso, deben ser interoperables con los estándares internacionales, así como los definidos por la ITU y la IEEE, para asegurar la compatibilidad y operatividad.
- **Seguridad:** Se deben considerar e implementar medidas de seguridad que permitan proteger los datos de los hogares, instituciones educativas y la infraestructura de la red contra amenazas y ataques. EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo señalado en el Capítulo II de la Ley 679 de 2001, en especial respecto de las prohibiciones y deberes frente al uso de redes globales de información en relación con menores de edad. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá impedir el acceso al tipo de páginas que se encuentren establecidas por el ente competente y sus respectivas actualizaciones.
- **Gestión y Monitoreo:** Se debe contar con un sistema para la gestión y el monitoreo de la red, permitiendo la detección y resolución rápida de problemas.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE LA RED DE ACCESO

Los equipos y antenas de la red de acceso deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas mínimas que la ANE (Agencia Nacional de Espectro) y la CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones) regulan en Colombia:

- <u>Puntos de acceso (AP)</u>

Protocolos:

- IEEE 802.11b/g/n: Operan en la banda de 2.4 GHz, ofreciendo velocidades de hasta 600 Mbps en el caso de 802.11n.
- IEEE 802.11a/n/ac: Funcionan en la banda de 5 GHz, con velocidades que pueden alcanzar hasta 1.3 Gbps en 802.11ac.
- IEEE 802.11k: Mejora la gestión de recursos de radio, permitiendo a los dispositivos identificar rápidamente los puntos de acceso disponibles para facilitar el roaming.
- IEEE 802.11v: Permite la gestión de la red inalámbrica, optimizando la transición de dispositivos entre AP y mejorando la eficiencia energética de los dispositivos conectados.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Niveles de Potencia Permitidos en Bandas No Licenciadas:

La ANE establece límites específicos de potencia para dispositivos que operan en bandas no licenciadas, con el fin de minimizar interferencias y garantizar un uso eficiente del espectro. Los niveles permitidos son:

- Banda de 2.4 GHz (2400-2483.5 MHz):
- Potencia Radiada Isotrópica Equivalente (EIRP) máxima: 30 dBm (1 W).
- Banda de 5 GHz:
- 5150-5250 MHz:EIRP máxima: 23 dBm (200 mW).
- 5250-5350 MHz: EIRP máxima: 30 dBm (1 W).
- 5470-5725 MHz: EIRP máxima: 30 dBm (1 W). También requiere DFS y TPC.
- 5725-5850 MHz: EIRP máxima: 36 dBm (4 W)

Requiere implementación de Dynamic Frequency Selection (DFS) y Transmit Power Control (TPC) para evitar interferencias con sistemas prioritarios como radares.

Es importante destacar que, en la banda de 5 GHz, la implementación de DFS y TPC es obligatoria en ciertos sub- rangos para proteger servicios existentes y minimizar interferencias. Además, el uso de antenas de alta ganancia puede requerir ajustes en la potencia de transmisión para cumplir con los límites de EIRP establecidos.

Para garantizar el cumplimiento de estas regulaciones, se recomienda consultar la normativa vigente de la ANE y, en caso de dudas, contactar directamente a la entidad para obtener información actualizada y específica sobre el uso del espectro en Colombia.

Los puntos de acceso (AP) seleccionados por EL CONTRATISTA para la red de acceso deben tener la capacidad suficiente para brindar los servicios de conectividad a internet fijo de banda ancha a cada hogar de la Junta, según lo especifica la CRC. EL CONTRATISTA debe garantizar que el diseño de la red de acceso permita un nivel de intensidad de señal y de relación señal-ruido en todos los hogares que integran la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) de acuerdo con la siguiente referencia:

Para los CPE en entornos residenciales, deberán estar dentro de los siguientes niveles de intensidad de señal:

- **Excelente:** -50 dBm o superior.
- **Buena:** Entre -50 dBm y -60 dBm.

Los valores aceptables de SNR para los CPE en hogares son:

- **Excelente:** 30 dB o superior.
- **Buena:** Entre 25 dB y 30 dB.

Consideraciones Adicionales:

- **Interferencias:** Las bandas no licenciadas, como las de 2.4 GHz y 5 GHz, son susceptibles a interferencias de otros dispositivos. Es esencial realizar un estudio de espectro en la zona de instalación para identificar posibles fuentes de interferencia y seleccionar los canales adecuados.

- **Obstáculos Físicos:** Paredes, estructuras, vegetación y otros objetos pueden atenuar la señal. La planificación de la ubicación de los AP y CPE debe considerar estos factores para optimizar la cobertura.

Tabla 3 Especificaciones de los Puntos de Acceso (AP) de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad

CATEGORÍA	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS
Compatibilidad Estándares	- IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz). IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz).
Potencia de Transmisión	- 2.4 GHz: Hasta 30 dBm (1 W). - 5 GHz: - 5150-5250 MHz: Hasta 23 dBm (200 mW). - 5250-5350 MHz y 5470-5725 MHz: Hasta 30 dBm (1 W). - 5725-5850 MHz: Hasta 36 dBm (4 W).
Antenas	- Tipo: Omnidireccionales, sectoriales o direccionales. - Ganancia ajustada al diseño, respetando límites de EIRP. - Soporte MIMO 2x2, 3x3 o 4x4.
Capacidad de Hogares	- Acorde con los requerimientos requeridos por la CRC - QoS para priorización de tráfico (voz, video). - Capacidad para soportar múltiples dispositivos simultáneamente, especialmente en entornos de alta densidad.
Seguridad	- Cifrado: WPA2 mínimo. - Protección contra ataques: Filtrado MAC
Gestión y monitoreo	- Interfaces: Web (HTTP/HTTPS), SNMP v2/v3. - Integración con controladores centralizados. - Análisis de espectro y optimización automática de canales
Rendimiento y latencia	- Velocidades: Hasta 1.2 Gbps (5 GHz, 802.11ac). - Latencia menor a 50 ms. - Capacidad para manejar tráfico de alta demanda en entornos residenciales
Resistencia y entorno	- Clasificación: IP65/IP67 para exteriores. - Protección contra sobretensiones y descargas eléctricas. - Rango de humedad hasta 95% - Resistencia a temperaturas extremas
Conectividad y energía	- Puertos: Ethernet Gigabit (RJ-45). - Soporte PoE (802.3af/at). - Opciones de backhaul: fibra óptica, microondas, enlaces inalámbricos o Satelitales
Compatibilidad normativa	- Cumplimiento ANE y CRC. - Soporte para bandas no licenciadas (2.4 GHz y 5 GHz) con DFS/TPC. - Alineación con normativas internacionales de seguridad y emisiones.
Actualización y Soporte (HW y SOFTWARE)	- Firmware actualizable a través de métodos remotos. - Garantía mínima de 2 años. - Soporte para actualizaciones de seguridad periódicas

Tabla 4 Especificaciones de los Puntos de Acceso (AP) Indoor de la Institución Educativa

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL AP INTERIOR
Tipo	- Punto de acceso inalámbrico. Conexión dual, Banda de 2,4 GHz y 5.0 GHz.
Uso	- Interior (Indoor)
Norma	- RoHS/WEE (Una de estas normas). - Cumplimiento normativo Nacional para las diferentes bandas de frecuencia. Potencia de emisión ajustable restringida a máximos legales.
Estándares	- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2./ax
Compatibilidad y certificado con WiFi 6 (802.11ax)	- SI
Puertos	- Interface WAN 10/100/1000 Base T Ethernet network interface (RJ 45).
Auto selección de canal	- SI
Balanceador de carga	- SI
Selección dinámicade frecuencias (DFS) de 802.11	- SI
Seguridad	- WPA/WPA2/WPA-Personal/Empresa, WPA2-Personal/Empresa, WPA3-Personal/Empresa
Protocolo de administración de red	- SNMP v3
Calidad del servicio	- Quality of Service (On board IDS, and secure guest hotspot Access), (WMM, WMM/APSD, 802.1p, Diffserv and TOS), (QoS/ 802.11e) - (Mínimo una).
Energía	- Los Equipos deben ser alimentados por PoE o PoE+ acorde IEEE 802.3af, IEEE 802.3at.
Administración remota	- SI, Administración desde la plataforma de Gestión de forma remota de manera visual.
Frecuencia	- Conexión dual band, Banda de 2,4 GHz y 5 GHz. - Gestión automática y en tiempo real de la radio (Potencia de transmisión - y Canal – frecuencia (DFS)) que evite las interferencias y solucione defectos de cobertura
SSID múltiples	- Al menos 8
Manuales	- Incluidos
Concurrencia	- EL CONTRATISTA deberá entregar a la Interventoria la ficha técnica del AP, que demuestre la capacidad de conectividad mínima de 128 clientes por AP.

Tabla 5. Especificaciones mínimas de los Puntos de Acceso (AP) Outdoor de la Institución Educativa

ITEM	CARACTERISTICAS ESPECIFICAS MÍNIMAS DEL AP EXTERIOR
1	- RoHS/WEE (Una de estas normas).
2	- Quality of Service (On board IDS, and secure guest hotspot Access), (WMM, WMM-UAPSD, 802.1p, Diffserv and TOS), (QoS/ 802.11e) (Mínimo una).
3	- 802.1x (capacidad de autenticación por MAC).
4	- Punto de acceso inalámbrico. Conexión dual, Banda de 2,4 GHz y 5 GHz.
5	- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
6	- Índice o grado de protección climática IP 67 según estándar IEC 60529.
7	- Protección contra Descargas Eléctricas.
8	- Interface WAN 10/100/1000 Base T Ethernet network interface (RJ 45).
9	- Cumplimiento normativo Nacional para las diferentes bandas de frecuencia. Potencia de emisión ajustable restringida a máximos legales.
10	- Estándares Inalámbricos MAC: CSMA/CA; FCC:11 canales; Banda ISM:2.4GHz; Banda de 5Ghz
11	- Selección de canal automático en todas las Bandas.
12	- Ajuste de Potencia manual y automático.
13	- Gestión automática y en tiempo real de la radio (Potencia de transmisión y Canal –frecuencia (DFS)) que evite las interferencias y solucione defectos de cobertura.
14	- El equipo de acceso inalámbrico deberá incluir mecanismos que contrarresten los efectos de interferencia para proveer un óptimo servicio en espacios públicos
15	- El equipo debe permitir la configuración y/o conexión a un portal cautivo ya sea propio del equipo o por medio de redirección a un servidor de portales cautivos
16	- Los Equipos deben ser alimentados por PoE o PoE+ acorde IEEE 802.3af, IEEE 802.3at.
17	- Balanceo y equilibrio de carga entre Puntos de Acceso.
18	- Gestión dinámica de RF canales y frecuencias por cada punto de acceso
19	- EL CONTRATISTA deberá entregar a la Interventoría la ficha técnica del AP, que demuestre la capacidad de conectividad mínima de 1.024 clientes por AP.
20	- Protocolo de Administración de red: SNMP v3

Tabla 6. Especificaciones del Terminal CPE (Customer Premises Equipment)

CATEGORÍA	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS
Compatibilidad con Estándares	- IEEE 802.11a/b/g/n/ac según la banda utilizada (2.4 GHz o 5.0 GHz).
Potencia de Transmisión	- **2.4 GHz:** Hasta 20 dBm (100 mW). - **5 GHz:** Hasta 23 dBm (200 mW) en rangos de 5150-5250 MHz.
Sensibilidad del Receptor	- Mínima de **-90 dBm** para enlaces estables a largo alcance.
Seguridad	- Soporte para WPA3 (preferido) y WPA2 como mínimo.
Gestión y Configuración	- Gestión mediante interfaces basadas en web o aplicaciones de escritorio/móviles. - Soporte para SNMP v2/v3 para monitoreo remoto.
Rendimiento	- Velocidades de hasta **600 Mbps** en 5 GHz (802.11ac) y 300 Mbps en 2.4 GHz (802.11n).
Backhaul	- Puertos Ethernet Gigabit para conexión con redes internas. Interface WAN 10/100/1000 Base T Ethernet network interface (RJ 45).
Condiciones de operación Ambiental	- Humedad 10% - 95 % - Protección IP67 para ambientes exteriores.
Energía	- Soporte para PoE (Power over Ethernet) bajo estándar IEEE 802.3af/at.
Normas Ambientales	- Cumplimiento con RoHS (Restriction of Hazardous Substances). - Compatibilidad con WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
Tipo de Antena	- Omnidireccional para entornos con cobertura general. - Direccional (panel o parabólica) para enlaces de largo alcance. - Sectorial para áreas densas. (Según diseño)
Ganancia de antena	- 2.4 GHz: Entre 8 dBi y 14 dBi - 5 GHz: Entre 14 dBi y 25 dBi para enlaces de largo alcance. (Según diseño)
Polarización	- Lineal o dual (vertical y horizontal) según la configuración de la red. - Compatible con MIMO para optimizar el rendimiento.
Beamwidth (Ángulo de Apertura)	- Omnidireccional: Cobertura de 360° - Sectorial: Apertura entre **60° y 120°. - Direccional: Haz estrecho menor a **10°** para enlaces PTP. (Según diseño)
Resistencia de la Antena	- Clasificación IP67 - Protección contra vientos de hasta 120 km/h. - Resistente a radiación UV y corrosión para exteriores
Normativa y cumplimiento	- Operación bajo los límites de potencia EIRP establecidos por la ANE y CRC - Cumple con DFS y TPC para operación en 5 GHz.

Tabla 7. Especificaciones del Router Interno Wi-Fi

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS
Puertos Ethernet	- (2) puertos Ethernet 10/100/1000 Base-T
Puerto WAN	- Un (1) puerto WAN
Conexión	- Dual band 2.4 GHz y 5 GHz
Normativa	- Cumplimiento con RoHS/WEEE y normativas nacionales
Estándares	- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Seguridad	- Soporte para WPA3, WPA2 y WPA (Personal/Empresa)
Gestión remota	- Administración desde plataforma de gestión de forma remota
Calidad de Servicio	- Soporte para QoS (Quality of Service)
Alimentación	- Soporte para PoE o PoE+ (IEEE 802.3af/at)

- BANDAS DE FRECUENCIA A UTILIZAR

El contratista operador del proyecto está en libertad de diseñar la red de acceso haciendo uso de cualquiera de las siguientes bandas no licenciadas, siempre y cuando cumpla con la totalidad de las especificaciones de este anexo y con la normativa nacional de la Agencia Nacional del Espectro, en materia de utilización de frecuencias para bandas no licenciadas.

- 2.4 GHz: Rango de 2400 a 2483.5 MHz.
- 5 GHz: Rango de 5150 a 5850 MHz (según normatividad local).

Esto incluye cada uno de los equipos y elementos necesarios para el despliegue de red inalámbrica punto multipunto (AP, Repetidores, Antenas, Terminales CPE, Router Wifi entre otros) Cada uno de los parámetros y caracteristicas necesarias para el diseño se deben tener en cuenta partiendo de las caracteristicas mínimas sin limitarse a las que haya lugar teniendo siempre presente los entes regulatorios en Colombia como la CRC y ANE.

- El diseño de la red deberá garantizar el cumplimiento de los límites de potencia establecidos por las regulaciones locales, la normatividad local y nacional para el despliegue de antenas y la normatividad nacional en materia de exposición a campos electromagnéticos y despliegue de antenas.

- CARÁCTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LA INSTALACIÓN

El contratista dentro de lo contemplado para la instalación y despliegue de la red de Acceso Inalámbrica Punto multi Punto en banda no licenciada, deberá realizar un análisis completo del área de despliegue, con miras a identificar las condiciones físicas, de infraestructura, obstrucciones, cobertura y estudio de espectro en la zona para identificar fuentes de posibles interferencias, seleccionar los canales más adecuados que garanticen el mejor desempeño y permita entregar las velocidades establecidas en cada uno de los hogares que hacen parte de la

Junta de internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC). Adicionalmente deberá gestionar antes las entidades municipales, nacionales, gubernamentales, socioambientales, regulatorio entre otros que haya lugar, para garantizar los permisos y licencias de instalación del equipamiento que hará la cobertura de red inalámbrica en la zona.

Dentro de la gestión de permisos que hará EL CONTRATISTA a nombre de la Junta de internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) se contemplan algunos como:

- Infraestructura
- Aeronáutica
- Socioambientales
- Cultura
- Transporte
- Regulatorios,
- Seguridad
- Seguridad ocupacional

La instalación de Antenas en redes inalámbricas punto-multipunto en zonas rurales o urbanas en Colombia, deben cumplir con los requisitos establecidos por la Agencia Nacional del Espectro (ANE), la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y, de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), según aplique. Además, en áreas urbanas, es obligatorio tramitar permisos de uso de suelos y licencias de construcción con las alcaldías locales, mientras que en zonas rurales se deben seguir las normativas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Todas las instalaciones deben cumplir con los estándares ambientales, de seguridad estructural y con normativas internacionales como la RoHS y la WEEE para minimizar el impacto ambiental.

La antena y su torre deben estar conectadas a un sistema de puesta a tierra cumpliendo con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y la NTC 2050, así como estándares internacionales como IEEE 80 y NFPA 780.

Torres y mástiles deben ser metálicos y conductivos para disipar corrientes de rayos eficientemente.

- CONEXIÓN A LOS HOGARES

Una vez realizada la instalación del AP se procederá con la instalación de los Terminales CPE (Customer Premises Equipment) en los hogares de los asociados a la Junta de internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC).

Completada la instalación de la red de acceso (AP + CPE), EL CONTRATISTA procederá a informar a la supervisión y/o interventoría para la realización de las pruebas de recepción de la red de acceso inalámbrico punto-multipunto, garantizando la calidad del enlace, la estabilidad de la señal y el cumplimiento de los parámetros de rendimiento establecidos.

Esta etapa asegura que el equipo final esté correctamente configurado y alineado con el Access Point (AP) para maximizar la calidad del servicio. Durante la instalación, se verificará la conectividad, se optimizará la señal y se configurará el acceso a internet según las necesidades del cliente y la configuración de equipos utilizados para la solución. Además, se documentará el proceso para asegurar el mantenimiento futuro y se ofrecerá al cliente una explicación básica sobre el uso del servicio. Con esto, el cliente podrá disfrutar de una

conexión confiable y eficiente desde el momento de la instalación. Dentro de las consideraciones mínimas que se deben tener en cuenta están:

Terminal CPE (Customer Premises Equipment)

- Ubicación del CPE en una posición elevada, como un mástil o la parte superior de una pared exterior, garantizando que la antena tenga línea de vista directa hacia el Access Point (AP) del proveedor.
- Fijar el CPE firmemente utilizando soportes metálicos o abrazaderas resistentes, asegurándose de que la instalación sea estable ante condiciones climáticas adversas.
- Orientar el CPE hacia el AP utilizando herramientas como inclinómetros o aplicaciones de alineación para maximizar la calidad de la señal (RSSI).
- Conectar el CPE al sistema eléctrico mediante un inyector PoE, asegurando que este esté protegido contra sobretensiones mediante un protector de picos.
- Proveer del cableado Ethernet necesario en el exterior e interior de manera canalizada y protegida conservando la estética del lugar.
- Configurar el CPE según las indicaciones del fabricante, ingresando las credenciales y parámetros de red (SSID, canal, potencia de transmisión) mediante la interfaz web del equipo.
- Realizar pruebas de conectividad para verificar que los niveles de señal y la latencia sean óptimos antes de proceder con las configuraciones finales.

Router WiFi

- Conectar el cable Ethernet que proviene del CPE al puerto WAN del Router WiFi y asegurar la correcta instalación.
- Ubicar el Router en un punto central dentro de la residencia para maximizar la cobertura inalámbrica, evitando colocarlo cerca de objetos metálicos o paredes gruesas que puedan bloquear la señal.
- Ingresar a la interfaz de configuración del Router utilizando un navegador web y configure los parámetros básicos: SSID, contraseña WPA3 (o WPA2 como mínimo) y canal de transmisión. Configurar Quality of Service (QoS) si es necesario para priorizar aplicaciones críticas como videollamadas o streaming.
- Activar el control parental y redes de invitados, si el cliente lo requiere, para mejorar la seguridad y gestión de hogares.
- Realizar pruebas de conectividad inalámbrica en diferentes áreas del hogar para asegurar que la cobertura sea adecuada, ajustando la posición del Router o la antena si es necesario.

- PRUEBAS DE ENTREGA DEL SERVICIO.

El contratista ejecutor deberá realizar y documentar las siguientes pruebas:

Pruebas de cobertura

- **Niveles de Señal (Calidad del Enlace) RSSI (Received Signal Strength Indicator):**
- Nivel recomendado: Mejor que -65 dBm.
- Nivel mínimo aceptable: Entre -65 dBm y -75 dBm.

Por debajo de -75 dBm: Requiere ajuste de alineación o evaluación de interferencias.

- **SNR (Signal-to-Noise Ratio):**
- Valor recomendado: Mayor a 25 dB.
- Valor mínimo aceptable: Entre 20 dB y 25 dB.

Por debajo de 20 dB: Se espera degradación en la calidad del enlace.

- **Interferencia de Canal:**

Mediante el uso de un analizador de espectro o herramienta de software se debe hacer la identificación de canales limpios.
Niveles recomendados: Ruido de fondo menor a -90 dBm.

Pruebas de Conectividad

Prueba de Ping para validación de la latencia en la red de acceso:

- Latencia hacia el AP Recomendada:
- Máxima permitida: Hasta 10 ms.
- Pérdida de paquetes:
- Recomendada: 0%.

Prueba de velocidad:

Realización y registro de pruebas de Velocidad a través de una herramienta, cuyos resultados deben estar acordes con el diseño de la red troncal realizado por EL CONTRATISTA para cada Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC). Adicionalmente, se deberá realizar pruebas de velocidad a la red de acceso, de manera independiente de la conexión a la red troncal, cuyos resultados deberán mostrar que la red de acceso permite las velocidades mínimas de 25 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida, rehusó de 1:8 y una capacidad satelital con prioridad mensual de 20Gb mínimo por hogar beneficiario.

- ACTUALIZACIONES Y LICENCIAMIENTO DE SOFWARE DE EQUIPOS.

El alcance del suministro de los equipos del proyecto deberá incluir el licenciamiento y actualizaciones de hardware y software por un período de por lo menos cinco (5) años contados a partir del inicio de la etapa de operación y mantenimiento.

- ESTUDIO DE CAMPO Y VIABILIDAD.

EL CONTRATISTA deberá realizar estudios de campo, de manera que evalúe la viabilidad de la instalación en cada una de las Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) e instituciones educativas seleccionadas. Este documento será entregado como evidencia del informe de ingeniería de detalle.

El estudio de campo contempla visitas de personal de EL CONTRATISTA a las Juntas de Internet – Comunidades de conectividad (JI-CDC) e instituciones Educativas.

Los estudios de campo deben presentarse en los plazos establecidos en el Cronograma para el presente proyecto y bajo el formato acordado entre EL CONTRATISTA y la interventoría y/o supervisión.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

El estudio de campo será presentado a la interventoría y/o supervisión quien verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente documento. EL CONTRATISTA, se hace responsable de realizar un estudio de campo para las instalaciones y así poder implementar las 100 Juntas de internet – Comunidades de conectividad (JI-CDC) hacer entrega del servicio de internet a los 6000 hogares beneficiados por el proyecto y conectar las 110 instituciones educativas. El estudio de campo contempla visitas de personal, en las que deberá realizar las actividades necesarias que permitan levantar como mínimo la siguiente información:

- Nombre del Departamento, municipio, referencia de la Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) o institución educativa con código DANE.
- Cantidad de hogares a conectar con la Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) o Matricula total de la institución educativa.
- Ubicación exacta de la Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) y de los hogares a conectar o de la institución educativa.
- Toma de coordenadas geográficas formato decimal.
- Registro fotográfico completo de la Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) y de los hogares a conectar o de la institución educativa con los espacios asociados a la intervención del proyecto.
- Diagrama de red de la Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) y de los hogares a conectar o de la institución educativa.
- Número telefónico del encargado de la Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) y de los hogares a conectar o de la institución educativa quien será el responsable del servicio.
- Evidenciar que cuenta con servicio eléctrico interconectado y no cuenta con un servicio de internet.
- Condiciones de las instalaciones (civiles, eléctricas, adecuaciones) para la instalación de los equipos, las cuales serán identificadas y registradas por EL CONTRATISTA al momento de realizar los estudios de campo de cada uno de los sitios beneficiados y deberán ser informados y acordados con los responsables de las Juntas de internet – Comunidades de conectividad (JI-CDC) y de los hogares a conectar o de la institución educativa

Para las instituciones educativas, además de lo anterior el estudio de campo debería incluir:

- Horario académico de la Sede Educativa donde se instalará el servicio.
- Verificar el cumplimiento de los siguientes criterios de elegibilidad de las instituciones educativas:

- **Ser de carácter y naturaleza oficial**. Los documentos que soportan el carácter de la Institución Educativa son las resoluciones de autorización de creación y operación de la Institución Educativa, o de fusión, en las cuales debe constar que son de carácter oficial, para ello es necesario utilizar como identificador único de la Institución Educativa o de la sede educativa el código DANE SEDE de esta. No pueden ser beneficiarias instituciones privadas, instituciones mixtas, educación contratada, juntas de acción comunal, jardines infantiles, asociaciones, escuelas comunitarias ni fundaciones. En caso de que la institución educativa no sea de carácter y naturaleza oficial, esta pasará a ser excluida del programa. Para los fines pertinentes a la actualización monetaria de su pago se deberá tener en cuenta como fecha fin la fecha de radicación del estudio de campo de la respectiva institución educativa.

- **No contar con servicio de Internet.** El cumplimiento de este criterio se realizará a través de una certificación expedida por el rector de la Institución Educativa o por la secretaría de educación de la entidad territorial a la cual se encuentra circunscrita la institución educativa.

En caso de contar con servicio de Internet, el rector o en su defecto la secretaría de educación de la entidad territorial deberá incluir en la certificación la fecha de finalización del servicio, el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que lo presta y la fuente de financiación con el fin de que el Ministerio determine la viabilidad de incluir la institución educativa en el marco del presente proyecto dentro de los siguientes dos meses a la radicación del estudio de campo.

En caso de que el Ministerio determine que no es viable incluir la institución educativa en el marco del presente proyecto, y por tanto, la excluya, para los fines pertinentes a la actualización monetaria de su pago se deberá tener en cuenta como fecha final, la fecha de radicación del estudio de campo de la respectiva institución educativa.

En ningún caso, la certificación podrá tener una fecha de expedición superior a 30 días calendario.

- **La Institución Educativa debe contar con fluido eléctrico interconectado a la red para la alimentación de todos los equipos involucrados en la prestación del servicio de internet.** El cumplimiento de este criterio se realizará a través de una certificación firmada por el rector de la institución educativa o por la secretaría de educación de la entidad territorial a la cual se encuentra circunscrita la institución educativa.

En caso de contar no contar con fluido eléctrico interconectado a la red, el rector o en su defecto la secretaría de educación de la entidad territorial deberá presentar dicha claridad con el fin de que el Ministerio determine dentro de los siguientes dos meses a la radicación del estudio de campo la viabilidad de incluir la institución educativa en el marco del presente proyecto.

En caso de que el Ministerio determine que no es viable incluir la institución educativa en el marco del presente proyecto, y por tanto, la excluya, para los fines pertinentes a la actualización monetaria de su pago se deberá tener en cuenta como fecha final, la fecha de radicación del estudio de campo de la respectiva institución educativa.

Al momento de realizar el estudio de campo EL CONTRATISTA deberá suscribir con el rector(a) responsable de la Institución Educativa o una persona autorizada por este, un acta de compromiso en la cual queden determinados los siguientes compromisos:

- Permitir la instalación de los equipos del servicio en la Institución Educativa, sin ningún costo de arrendamiento, incluyendo la realización de las obras civiles en caso de ser necesario, las cuales quedarán en el informe de la visita de campo respectiva y firmadas en el acta de compromiso con la Institución Educativa.
- Permitir el acceso de los técnicos de EL CONTRATISTA, para realizar la instalación del servicio en la Institución Educativa.
- Permitir el acceso de los técnicos de EL CONTRATISTA, en caso de ser necesario realizar un mantenimiento preventivo y/o correctivo, incluido el periodo de vacaciones.

- Permitir el acceso del personal del Ministerio o la interventoría y/o supervisión de ser necesario para realizar verificación de la instalación del servicio en la Institución Educativa y al momento de realizar las visitas de calidad.
- Garantizar que la Institución Educativa o sede Educativa beneficiada, asumirá los costos asociados a los servicios públicos que se generen por el funcionamiento del servicio.
- En caso necesario de realizar modificación a la infraestructura física de la IE, dicha modificación deberá ser aprobada por la IE.
- Garantizar la permanencia mínima de la institución educativa de acuerdo con el tiempo establecido para la obligación de hacer, objeto del presente documento técnico.

- SUSPENSIÓN O EXCLUSIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Se contempla la suspensión o exclusión de Instituciones Educativas, en las fases de planeación, instalación y puesta en servicio y en la de Operación, a solicitud de EL DEPARTAMENTO, EL CONTRATISTA y/o del MINISTERIO TIC, previa aprobación de la supervisión y/o interventoría de acuerdo con las siguientes causales:

- Ausencia de energía eléctrica interconectada a la red.
- Al momento de la instalación y puesta en servicio, la institución educativa cuente con servicio de internet, bien sea prestado por otro proyecto del Ministerio u otra entidad oficial o privada.
- Dada de baja de la Institución Educativa.
- Que el responsable de la Institución Educativa no firme el Acta de Compromiso.
- La exigencia demostrable por parte de la comunidad que se debe realizar el procedimiento de consulta previa.
- Cuando la institución Educativa NO cuente con matrícula escolar.
- Cuando el consumo de datos de la Institución Educativa esté por debajo de 1GB (tráfico total sumado de Download y Upload) al mes, durante dos (2) meses de operación continua, previo acuerdo de EL CONTRATISTA con la interventoría y/o supervisión y verificación de la situación con la institución educativa. Este numeral exceptúa los tiempos de receso, vacaciones o descanso laboral y académico de las Instituciones Educativas.
- Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentadas por EL CONTRATISTA ante la interventoría y/o supervisión, que impidan la instalación y/o aprobación y/o prestación del servicio en la Institución Educativa.
- La Institución Educativa no cumpla con alguno de los criterios establecidos.

El procedimiento detallado a seguir para la realización de exclusión o suspensión se describe a continuación:

- El contratista deberá presentar a la interventoría y/o supervisión la solicitud de exclusión o suspensión, debidamente sustentada de acuerdo con las causales enunciadas en el presente numeral, esta solicitud deberá contener toda la información que permita identificar la Institución Educativa que se va a excluir o suspender relacionando el centro poblado y la sede de la Institución Educativa. La interventoría y/o supervisión verificará que la justificación para excluir o suspender el sitio del proyecto sea válida y esté soportada.
- La interventoría y/o supervisión emitirá su concepto y recomendaciones al Ministerio con copia al Ejecutor en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la solicitud.

- Si el concepto de la interventoria y/o supervisión no es favorable por elementos formales (insuficiencia de información, etc.), EL CONTRATISTA contará con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, para presentar la información que se requiera.
- Si el concepto es favorable el contratista procederá con la exclusión o suspensión de la Institución Educativa.

La exclusión supone retirar la Institución Educativa del listado de Instituciones Educativas a beneficiar, ya sea en la fase de instalación y puesta en servicio o en la de operación. La suspensión supone no realizar la instalación y puesta en servicio o cesar la prestación del servicio dado que existen situaciones que pueden ser superadas; sin embargo, la suspensión no podrá superar 12 meses, plazo en el cual deberá procederse con la exclusión de la Institución Educativa.

- APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE CAMPO

La revisión de los estudios de campo se adelantará por parte de la interventoria y/o supervisión, en un plazo de diez
(10) días hábiles contados a partir de la presentación de cada una de las entregas de estos. La interventoría y/o supervisión podrá solicitar aclaraciones y complementaciones al estudio de campo para su aprobación de acuerdo con el cronograma definido. No se podrá iniciar la fase de instalación hasta que no esté aprobado el estudio de campo. En el evento en que la interventoría y/o supervisión solicite aclaraciones, presente comentarios o rechace estudios de campo, EL CONTRATISTA contará con un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del pronunciamiento, para presentar los respectivos estudios de campo corregidos, y la interventoría y/o supervisión, tendrá nuevamente un plazo de diez (10) días hábiles para su pronunciamiento definitivo por escrito.

- INFORME DE INGENIERÍA Y OPERACIÓN

Teniendo en cuenta la información obtenida del estudio de campo, EL CONTRATISTA deberá presentar un informe en el cual detallará y sustentará la solución técnica para la prestación del servicio de conectividad a internet para cada Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) y a cada institución educativa. En caso de que la solución a presentar en el Informe de Ingeniería y Operación varíe en relación con la solución prevista, deberá así manifestarlo con su respectiva justificación técnica y/o económica que demuestre que la solución por él considerada es la más eficiente lo que será analizado y aprobado o rechazado por el Ministerio.

El Informe de Ingeniería y Operación deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

- Presentación y justificación de la solución técnica a implementar, especificaciones de los elementos de la red de acceso, tipo de tecnología a utilizar, red de interconexión, memorias de cálculo del canal dedicado, velocidades y demás variables técnicas propias de la solución tecnológica.
- Descripción de la infraestructura de comunicaciones a instalar.
- Descripción de todos los equipos y software contemplados para la prestación del servicio de conectividad, incluyendo las certificaciones ISO 9001.
- Diagramas topológicos de la red.
- Documento de la configuración de equipos, servidores y demás equipos empleados para activar los servicios.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- Análisis de riesgos operacionales para los equipos de la red de interconexión en los sitios y para los procesos relacionados con la prestación del servicio.
- Plan de contingencia para mantener el servicio de conectividad a internet según corresponda en cada Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC), hogar e institución educativa.
- Red de acceso y la red de interconexión: La red de acceso y la red de interconexión deberán proveer el acceso a cada uno de los hogares o Instituciones Educativas y su interconexión a la red de Internet. Los elementos de la red de acceso y la red de interconexión en cada sitio deberán contar con la debida interfaz para conexión con la red LAN/WAN instaladas en cada sitio.
- Descripción del uso de infraestructura de soporte y de terceros, así como las gestiones adelantadas para este propósito y la relación de permisos y autorizaciones requeridas.
- Mapas georreferenciados en formato .kmz y .pdf, que ilustren la ubicación de Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC), hogares y las instituciones educativas y brinden información del tipo de conexión, operatividad y demás variables solicitadas por la supervisión y/o interventoria.
- Planos de equipamiento y de obra civil en formatos .dwg y .pdf.
- Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos con terceros para el uso de redes ya existentes.
- Metodología de medición de indicadores.

EL CONTRATISTA deberá garantizar:

- Es indispensable que EL CONTRATISTA cuente con un centro de operación de red en Colombia (NOC) con el fin de atender las fallas de nivel más bajo (Nivel 1 y 2).
- La red de acceso y la red de interconexión deberán incluir todo el equipo de red que permita el monitoreo remoto de velocidad y tráfico por Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) e institución educativa conectada. Para monitoreo de consumo de tráfico se deberá garantizar que este se realiza con resolución en minutos, que permitirá a la interventoría y/o supervisión, la evaluación de comportamiento de tráfico sin la necesidad de desplazamientos a cada sitio. La herramienta de medición instantánea de velocidad también deberá poderse operar remotamente, de tal forma que estas mediciones se puedan realizar el número de veces necesario para garantizar los objetivos ofrecidos de velocidad.
- Es obligación de EL CONTRATISTA asumir los costos asociados a la instalación de la infraestructura requerida para cada sitio. La ubicación y seguridad del equipamiento instalado de cada sitio será responsabilidad de EL CONTRATISTA de acuerdo con el estudio de campo del sitio que se efectúe; así como la adecuación de los sitios para la instalación de los equipos y sus elementos necesarios.
- EL CONTRATISTA debe presentar la propuesta para políticas de QoS.
- Descripción de las funcionalidades del sistema de gestión.
- Si la solución tecnológica prevé la utilización de redes de terceros se debe indicar el nombre del titular de la red.
- Presentar y detallar garantías de los componentes hardware de las soluciones de la red de acceso, red de interconexión en los sitios.
- Propuesta del protocolo de pruebas para la aceptación de la red de acceso, la red de interconexión, acceso.
- Programación de instalación de las Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) e instituciones educativas.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- APROBACIÓN DEL INFORME DE INGENIERÍA Y OPERACIÓN.

La revisión y aprobación o rechazo del Informe de Ingeniería y Operación se adelantarán por parte de la interventoría y/o supervisión, y esta tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles para su aprobación, plazo en el cual podrá solicitar ajustes o la información que considere necesaria. EL CONTRATISTA deberá realizar los ajustes correspondientes en un término de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales la interventoría y/o supervisión tendrá como máximo cinco (5) días hábiles para la revisión de los ajustes que presente EL CONTRATISTA.

Cualquier modificación al Informe de Ingeniería y Operación durante la ejecución del proyecto deberá ser aprobado por la interventoría y/o supervisión, antes de que EL CONTRATISTA instale o realice cualquier modificación en la infraestructura o equipos que se vean involucrados en la prestación del servicio de conectividad.

- CAMBIOS DE TECNOLOGÍA UNA VEZ APROBADO EL INFORME DE INGENIERÍA Y OPERACIÓN.

Como criterio general EL CONTRATISTA no podrá realizar cambios y/o variaciones de las tecnologías presentadas en su oferta y en el Informe de Ingeniería y Operación. No obstante, si por razones técnicas debidamente justificadas y avaladas por la Interventoría y/o supervisión es necesario modificar, EL CONTRATISTA podrá realizar cambios con las siguientes restricciones:

EL CONTRATISTA deberá realizar una solicitud oficial y por escrito a la interventoría y/o supervisión de dicho cambio, acompañando la solicitud de aprobación de un nuevo plan de ingeniería, operación y mantenimiento, en el cual deberá demostrar plenamente que esta modificación no degrada de ninguna manera las condiciones vigentes a la fecha para la prestación del servicio (provenientes del plan inicial, o la última modificación aprobada), y no incumple de ninguna manera la normatividad vigente. La interventoría y/o supervisión podrá rechazar esta solicitud de cambio de tecnología, si a su juicio, no se han ofrecido plenas garantías de las condiciones anteriores.

Estas modificaciones incluyen entre otros: cambio de equipos terminales de la red de acceso, cambios de redes de transporte, cambio de rutas de interconexión, cambios del tipo de solución tecnológica a implementar para el servicio de conectividad a internet. Cabe anotar que en ningún caso los cambios tecnológicos, modificaciones de la capacidad de la red que se realicen sobre las redes aprobadas ni ampliaciones de infraestructura con tecnologías aprobadas pueden desmejorar las condiciones iniciales.

En caso de que la interventoría y/o supervisión apruebe la realización de los cambios tecnológicos o de infraestructura solicitados, EL CONTRATISTA deberá implementar las acciones necesarias para que el proceso de cambio de los equipos no afecte la prestación del servicio ni el cumplimiento de los niveles de calidad exigidos. Lo anterior, debe garantizarse a través de la elaboración de planes de contingencia en los cuales se especifiquen los compromisos de EL CONTRATISTA sobre los periodos de afectación y recuperación del servicio y demás medidas que permitan ofrecer la continuidad en el servicio y la prestación de este en las condiciones exigidas en el presente Anexo.

En ningún caso, EL CONTRATISTA podrá solicitar recursos adicionales a EL DEPARTAMENTO para efectos de realizar las modificaciones al Informe de Ingeniería y Operación, ya que estos correrán por su cuenta y los efectuará bajo su propio riesgo y responsabilidad.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Así mismo, el Ministerio también podrá citar a mesas de trabajo con EL DEPARTAMENTO, EL CONTRATISTA y la interventoria y/o supervisión para analizar y determinar la necesidad de realizar actualizaciones tecnológicas que permitan la prestación del servicio en términos de calidad, capacidad y velocidad.

- PLAN DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría y/o supervisión para su aprobación en el plazo establecido en el cronograma, el Plan de Instalación y puesta en servicio de conectividad a Internet.

El Plan de instalación y puesta en servicio contendrá como mínimo:

- Una programación de ejecución mensual de la instalación que este acorde con el cronograma establecido en el presente anexo técnico.
- Cantidad de Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) e Instituciones Educativas que serán conectadas y puestas en servicio a través del cual se da cumplimiento a la programación enunciada en el literal anterior.
- Ruta crítica para la instalación y puesta en funcionamiento y acciones correctivas de mitigación.
- Todo el personal que realice las instalaciones en campo deberá contar con la certificación de trabajo en alturas donde se requiera, expedido por una entidad debidamente autorizada, cumpliendo con la normatividad vigente.
- Una programación de ejecución mensual por Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) e Institución Educativa, en la que se detallen las actividades requeridas para la instalación y puesta en servicio de la conectividad en cada Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) e Institución Educativa, incluyendo aquellas relacionadas con la logística de manejo de equipos, transporte, desplazamientos, instalaciones, configuraciones y demás que se deban adelantar desde el diseño de la solución para la Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) e Institución Educativa, hasta su puesta en funcionamiento definitiva. Lo anterior se hace necesario para que el Ministerio a través de la supervisión interventoría pueda contar con la información necesaria de planeación y programación de actividades que les permita ejercer un adecuado control y seguimiento a este proyecto.

El contratista podrá realizar cambios al Plan de Instalación, siempre y cuando la modificación sea aprobada por la interventoría y/o supervisión, para lo cual tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de su presentación.

EL CONTRATISTA deberá entregar cada treinta (30) días calendario un avance del plan de instalación y un informe con sus documentos respectivos de soporte. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA la ejecución del Plan de Instalación y puesta en servicio aprobado.

- APROBACIÓN DEL PLAN DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

La revisión y el pronunciamiento de aprobación o rechazo del Plan de Instalación y Puesta en Servicio se adelantará por la interventoría y/o supervisión quien emitirá su concepto, dentro de los diez (10) días hábiles siguiente a su presentación, o solicitará aclaración o complemento de este. En caso de que se soliciten aclaraciones o

complementos del Plan de Instalación y Puesta en Servicio, EL CONTRATISTA deberá realizarlas dentro de un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.

Una vez recibido nuevamente el Plan de Instalación y Puesta en Servicio con las aclaraciones o complementos realizados, la interventoría y/o supervisión contará con un plazo de cinco (5) días hábiles para emitir su concepto.

- PLAN DE MANTENIMIENTO

EL CONTRATISTA es responsable del mantenimiento de los equipos y dispositivos entregados por su cuenta para el desarrollo de la obligación; así las cosas, es su responsabilidad realizar mantenimientos preventivos y correctivos con el fin de garantizar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (ANS) solicitados en el presente Anexo Técnico.

El Plan de Mantenimiento debe contener, como mínimo, lo siguiente:

- Descripción del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, EL CONTRATISTA deberá detallar las actividades a realizar, teniendo presente que en las Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC), hogares e Instituciones Educativas siempre se deberá prestar el servicio de manera óptima cumpliendo los indicadores de calidad establecidos en el presente documento.
- Esquema de atención y soporte técnico, especificando niveles, tiempos de escalamiento y prioridades, recurso humano (perfiles), tecnológico (herramientas de hardware y software) y administrativo, así como el sistema de gestión de red.
- Indicar el medio de contacto a utilizar para atender PQRSD de los usuarios.
- Deberá mantenerse actualizado los aspectos de seguridad como configuraciones y filtros de navegación de acuerdo con la normatividad vigente.
- EL CONTRATISTA deberá presentar dentro del Plan de Mantenimiento Correctivo un capítulo para el manejo de contingencias asociadas a riesgos y desastre o fuerza mayor, indicando las actividades de respuesta para la recuperación del servicio.
- Información completa de las características del NOC en Colombia.
- Manual de instrucciones completo de operación del sistema de monitoreo donde se pueda conocer detalladamente el funcionamiento de dicho sistema. Adicionalmente el Ministerio o quien este designe para tal fin, podrán solicitar capacitaciones sobre el manejo del sistema de monitoreo.
- EL CONTRATISTA deberá presentar una metodología para la verificación de la política activa de seguridad física.
- Presentar el dimensionamiento del stock necesario, para atender las fallas que se pueden presentar en la ejecución del proyecto, que le permitan prestar el servicio contratado de manera óptima cumplimento los indicadores de calidad y niveles de servicio establecidos en el presente documento.
- Descripción de la estructura de mantenimiento y la metodología, demostrando que estas serán suficientes para cumplir con los indicadores de calidad y niveles de servicio.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA la ejecución del Plan de Mantenimiento aprobado. En caso de incumplimiento del indicador de disponibilidad, el Ministerio o quien este designe para tal fin podrán solicitar al Ejecutor, la modificación del Plan de Mantenimiento.

- APROBACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

EL CONTRATISTA presentará su plan de Mantenimiento para aprobación de la interventoria y/o supervisión. Cualquier modificación al Plan de Mantenimiento durante la ejecución del proyecto deberá ser informado y avalado por la interventoría y/o supervisión.

La revisión y el pronunciamiento de aprobación o rechazo del Plan de Mantenimiento se adelantará por parte de la interventoría y/o supervisión quien emitirá su concepto dentro de un plazo de diez (10) días hábiles a partir de su presentación, o solicitará la aclaración o complemento de este. En caso de que se soliciten aclaraciones o complementos del Plan Mantenimiento EL CONTRATISTA deberá realizarlas dentro de un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.

Una vez recibido nuevamente el Plan de Mantenimiento con las aclaraciones o complementos realizados, la interventoria y/o supervisión contará con un plazo de cinco (5) dias hábiles para emitir su concepto.

- NEMOTECNIA DEL PROYECTO

Cinco (5) dias hábiles después de la firma del acta de inicio, se acordará la nemotecnia a emplear en la emisión y respuesta de los comunicados generados en el proyecto, asociados a cada una de las etapas y obligaciones contractuales del mismo.

- FORMATOS DE INSTALACIÓN

Con la finalidad de contar con la evidencia correspondiente a las actividades adelantadas de manera clara y precisa, e deberán diseñar los siguientes formatos:

- **Acta de entrega de instalación del servicio**: Este documento debe ser diligenciado con el usuario responsable del servicio, deberá contar con la información asociada al hogar beneficiado y a la instalación del sitio (fecha de instalación, nombre del municipio, dirección del predio, barrio, coordenadas, estrato, nombre del usuario responsable del servicio, documento de identidad, relación de equipos instalados (nombre, serial, marca y modelo), resultado de las pruebas de Download, Upload, ping y latencia).

  Los documentos en mención deberán estar diligenciados debidamente y en su totalidad, firmados, sin tachones ni enmendaduras y con los soportes pertinentes.

- AVISOS Y MARQUILLAJE

Se debe en cada una de las juntas de internet – comunidades de conectividad (JI-CDC) de los hogares e instituciones educativas instalar un aviso de identificación, el cual debe dejarse ubicado en la entrada del predio una vez completada la instalación del servicio, y como evidencia de la actividad se deberá tomar el registro fotográfico correspondiente. Este deberá contar con el nombre del proyecto, la tecnología y la capacidad del enlace.

Una marquilla es un identificador de red, único e irrepetible con el que se le asigna un código distinto a cada tramo de cable y a cada empalme presente. En esta se relaciona la información correspondiente a su capacidad, tipo de medio, origen y destino.

Los equipos instalados en cada hogar deberán estar identificados mediante un aviso de identificación adhesivo, donde se indique que los equipos son propiedad del Cooperante y se encuentra favorecida por el proyecto y el número de contacto.

Cada equipo instalado deberá estar identificado de manera clara y duradera con:

- Nombre del proyecto y proveedor.
- Código de inventario único.
- Ubicación específica.
- Marca, Modelo y número de serie.
- Especificación técnica resumida (modelo, frecuencia, ganancia).
- Etiquetas legibles, permanentes, de material resistente y amigables con el medio ambiente con cumplimiento de normas RoHS y la WEEE.

- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO – CONECTIVIDAD A HOGARES

El Cooperante seleccionará los usuarios beneficiados para completar los 6000 hogares conectados en las 100 Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) de los 17 municipios de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta garantizando además de los criterios de selección la distribución de la cantidad de hogares beneficiarios presentados en la Table 1.

La selección de los usuarios beneficiados por el proyecto se realizará durante la etapa de caracterización del proyecto, por tanto, durante la misma este deberá reportar de manera mensual mediante el INFORME DE ESTADO DE AVANCE DE LAS INSTALACIONES, según lo definido en el presente documento técnico.

Los criterios de selección de los usuarios son los siguientes:

- El predio para beneficiar debe corresponder a una vivienda de estrato 1, 2 o a una Vivienda de Interés Prioritarios. Se deberá identificar la dirección y las coordenadas geográficas (Latitud y Longitud), las cuales deberán estandarizarse y usando como respaldo un recibo de servicio público donde se incluya de manera clara la dirección o una foto con la identificación de coordenadas y municipio que identifique el predio.
- Que el predio (Hogar beneficiario) no esté beneficiado por otro proyecto

- Que el hogar beneficiario no haya contado con un servicio de internet pago, para ello cada beneficiario firmará documento juramentado.
- Se dará prioridad a hogares cuyos integrantes formen parte de la lista integral de beneficiarios de la Agencia de Renovación del Territorio (ART).

El servicio podrá estar a nombre del propietario o arrendatario del predio, lo cual deberá ser identificado y usando copia del documento de identidad. El usuario deberá firmar un documento juramentado asociado a la manifestación de no haber contado con otro servicio de internet.

- CONEXIÓN DEL HOGAR BENEFICIARIO

El proyecto tiene como **objetivo conectar 6000 hogares de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta** del Departamento de Norte de Santander, brindando acceso a internet de alta calidad. Si durante su implementación, se ha identificado la necesidad de ajustar las áreas de cobertura basándose en estudios de factibilidad y en la cantidad de hogares que pueden ser beneficiados en las zonas rurales o urbanas seleccionadas. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se establecen los siguientes lineamientos que permiten la flexibilidad necesaria para alcanzar la meta de hogares conectados.

Para la conexión de los hogares beneficiarios se tendrá en cuenta:

- ***Factibilidad de Conexión***: La selección de las zonas rurales o urbanas inicialmente propuestas se basa en estudios de factibilidad de conexión. Estos estudios consideran factores como la infraestructura, la topografía, y la accesibilidad, entre otros.
- ***Número de Hogares Receptores***: La meta del proyecto es conectar un número específico de hogares. Si durante la implementación se evidencia que no se puede alcanzar esta meta en las zonas inicialmente seleccionadas, se debe permitir la reubicación para asegurar el éxito del proyecto previa autorización de la interventoría y aprobación de la supervisión.

- MODIFICACIÓN/SUSPENSIÓN DEL HOGAR CONECTADO

Procedimiento para Autorización de Cambios.

Informe de Factibilidad: El Cooperante debe presentar a la interventoría un informe detallado de los estudios de factibilidad que justifiquen la necesidad del cambio de zona.

Este informe debe incluir:

- Resultados de los estudios técnicos.
- Análisis de la capacidad de conexión.
- Evaluación del número de hogares beneficiados.

Solicitud de Autorización: Basado en el informe, el Cooperante deberá solicitar formalmente la autorización para cambiar la zona de implementación.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Esta solicitud debe ser dirigida a la interventoria y debe contener:

- Justificación detallada del cambio.
- Propuesta de nuevas zonas (urbanas o rurales aledañas).
- Plan de acción para alcanzar la meta de hogares conectados en las nuevas zonas.

Evaluación y Aprobación: La interventoria evaluará la solicitud y el informe de factibilidad. Durante esta evaluación, se considerarán los siguientes criterios:

- Viabilidad técnica y económica del cambio propuesto.
- Impacto en el cronograma del proyecto.
- Aseguramiento de la meta de hogares conectados.

Una vez realizada la evaluación, la interventoria emitirá un documento que apruebe o rechace la solicitud. En caso de aprobación, se incluirán recomendaciones y condiciones especificas para la implementación en las nuevas zonas.

Implementación y Seguimiento: Una vez autorizados los cambios, el Cooperante podrá proceder con la implementación en las nuevas zonas. La interventoria realizará un seguimiento continuo para asegurar que se cumplan las condiciones establecidas y que la meta de hogares conectados sea alcanzada.

- PLAN DE FORMACIÓN REDES PUNTO MULTIPUNTO

EL CONTRATISTA deberá presentar e implementar un plan de formación mixto virtual/presencial para el personal designado por la Junta de internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) de tipo técnico, teórico y práctico, tanto de los equipos como del Software de la Plataforma provista incluyendo también el Sistema de Gestión y la plataforma de Aprovisionamiento de hogares residenciales, que permita a los participantes tener sólidos conocimientos de la solución implementada, los equipos y las funciones para la óptima instalación, puesta en marcha, pruebas, operación, administración, ingeniería, planificación y mantenimiento correctivo y preventivo, que permitan, en un tiempo razonable, el autoabastecimiento de personal designado por la Junta de internet – Comunidad de Conectividad (JI- CDC).

La capacitación teórica debe realizarse de manera mixta virtual/presencial en las localidades o municipios y sus respectivas Juntas de Acción Comunal de interés definidos por el Proyecto. La capacitación práctica también deberá ser mixta, virtual/presencial y deberá realizarse durante la puesta en funcionamiento y operación (Aprovisionamiento y O&M).

Como parte inicial de la formación, EL CONTRATISTA, en la semana de planeación, anterior a la instalación del AP en el nodo de servicio, deberá impartir capacitación teórica a los miembros de la Junta de internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC), que esta seleccione, para que una vez se instale el AP en el nodo de servicio de la Junta EL CONTRATISTA proceda a impartir "capacitación haciendo" a los integrantes de la Junta, sobre los aspectos técnicos relevantes de los diferentes componentes de la red de acceso punto multipunto.

El plan de formación incluirá por lo menos el siguiente temario y deberá ser impartido de manera teórico-práctica, de tres (3) a seis a (6) personas por comunidad y con una duración mínima de 8 horas teóricas y la "***capacitación haciendo***" se impartirá durante los 6 meses de operación y mantenimiento de la red de acceso.

Tabla 8 Contenido mínimo del Plan de formación

ÁREA DE CAPACITACIÓN	CONTENIDO Y DETALLES
Generalidades de redes de telecomunicaciones	- Conceptos de redes de telecomunicaciones - Componentes de redes de datos LAN y WAN - Tecnologías para la transmisión de datos - Protocolos de comunicación - Direccionamiento IP - Mejores prácticas para la planeación e instalación de redes de telecomunicaciones - Administración de redes de telecomunicaciones - Seguridad de redes de telecomunicaciones - Capacitación en mantenimiento preventivo de redes
Fundamentos de la Red Inalámbrica Punto - Multipunto	- Explicación de la topología (AP y CPE). - Uso de bandas no licenciadas (2.4 GHz y 5 GHz). - Normatividad de la ANE para frecuencias y potencias. - Gestión de interferencias y asignación de canales.
Configuración y Operación del CPE	- Acceso a la interfaz de administración del CPE. - Configuración inicial: credenciales, SSID, canal y potencia. - Monitoreo de parámetros: RSSI, SNR y latencia. - Resolución de problemas básicos y actualización de firmware
Configuración y Mantenimiento del Access Point (AP)	- Gestión del AP desde sistemas centralizados - Configuración de QoS y manejo de hogares conectados. - Diagnóstico y ajuste de frecuencias y canales. - Monitoreo de tráfico y capacidad del AP.
Monitoreo y Herramientas de Gestión	- Uso de plataformas de gestión - Generación y análisis de reportes de rendimiento - Registro de incidencias y soluciones aplicadas.
Seguridad y Buenas Prácticas	- Implementación de WPA3 o WPA2 en redes WiFi. - Protección contra accesos no autorizados (firewalls, ACL). - Inspecciones periódicas de equipos y limpieza de antenas. - Gestión de contraseñas seguras para AP y CPE
Resolución de Incidencias	- Procedimientos básicos para atender quejas comunes. - Restauración de servicios en caso - de fallas del CPE o AP - Escalación de problemas a soporte técnico avanzado. - Protocolos de sustitución de equipos defectuosos
Capacitación para Atención al Cliente	- Técnicas de empatía y comunicación efectiva. - Explicación de problemas y soluciones en términos simples.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

	- Educación al cliente sobre gestión básica de la red WiFi. - Proporcionar información de contacto para soporte técnico
Reportes y Auditorías	- Registro de configuraciones y mantenimientos realizados. - Generación de auditorías internas para monitorear la calidad del servicio. - Asegurar el cumplimiento con normativas como el RETIE y ANE

Cada módulo incluirá actividades teóricas y prácticas, simulaciones y talleres grupales. El contenido estará diseñado para adaptarse al nivel de conocimiento previo de los participantes y las necesidades específicas del proyecto. Además, se entregarán manuales de operación y guías rápidas para uso cotidiano. Se deben incluir videos para apoyar el proceso de capacitación y que en el futuro sirvan para la capacitación otros miembros de la comunidad como multiplicadores del conocimiento.

Se espera capacitar a miembros de la comunidad, seleccionados en conjunto con la Junta de internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC). Este equipo estará compuesto por el personal que indiquen, líderes comunitarios y usuarios que demuestren compromiso con el proyecto, en cuya conformación la Junta de internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC), buscará la participación de mujeres y personas de diversos grupos étnicos para fomentar la inclusión y diversidad en el equipo. Al finalizar la formación, se establecerán roles específicos, como administrador de la red, técnico de soporte y representante de atención al usuario.

EL CONTRATISTA propondrá un formato de evaluación que permita validar el éxito de la transferencia de conocimientos en el proceso de capacitación. La Interventoría y/o supervisión propondrá el formato de evaluación a ser aplicado.

El proceso de evaluación se basará en tres pilares: evaluación formativa, sumativa y práctica. Se realizarán exámenes escritos y orales para medir el dominio teórico, así como ejercicios prácticos para validar competencias técnicas en la configuración y mantenimiento de los equipos. Además, se implementarán simulaciones para evaluar la capacidad de resolución de problemas reales. Al concluir la formación, los participantes recibirán certificaciones que validen su preparación.

Esta metodología asegura la transferencia efectiva del conocimiento y la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

NOTA: EL CONTRATISTA deberá suministrar a la Junta de internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC):

Un (1) Equipo de cómputo portátil con las siguientes características mínimas:

- Procesador: Intel Core i7 o superior, con fecha de lanzamiento sea el año 2023 o superior.
- Memoria RAM: Mínimo 16 GB.
- Almacenamiento: SSD de 512 GB.
- Sistema Operativo: Windows 10 Pro o equivalente y licencia de Office 365
- Pantalla: 14 pulgadas.
- Batería: Duración mínima de 4 horas.
- Conectividad: Bluetooth, Wifi,
- Puerto: Ethernet RJ45, USB, USB tipo C

Un (1) equipo de medición de potencia (Power meter) para pruebas en punto del usuario, con las siguientes características mínimas:

- Rango Longitud de onda estándar (nm): 800-1700 nm
- Conector: SC/APC, LC/APC o FC/APC.
- Tipo de detector: InGaAs.
- Rango de medición: -70 a +25 db.
- Incertidumbre: 5%.

- INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Aprobado el estudio de campo de cada institución educativa se dará inicio a la fase de instalación y puesta en servicio de las instituciones educativas.

EL CONTRATISTA garantizará que toda creación o innovación, que haga parte de su propuesta o se refiera a una o varias de las prestaciones en el marco del presente proyecto, no infringe derechos de propiedad intelectual de terceros. En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamación por terceras personas alegando derechos de propiedad intelectual sobre la creación o innovación involucradas en este proyecto, asistirá y asumirá la defensa en tal sentido de la Nación.

La infraestructura de telecomunicaciones y los equipos terminales que serán instalados por EL CONTRATISTA en desarrollo del proyecto, deberán cumplir con las normas técnicas establecidas en Colombia para la prestación de cada uno de los servicios exigidos.

- SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA

Seguridad Física: Toda la infraestructura e instalaciones realizadas por EL CONTRATISTA en las Instituciones Educativas deberán contar con una política activa de seguridad física (elementos hardware AP, antenas, etc.; elementos antivandálicos y antirrobo). La política deberá ser descrita en el plan de mantenimiento y actualizada con los Estudios de Campo.

Seguridad Lógica:

- Servicio de protección contra virus, malware y demás amenazas que se presentan en la prestación del servicio de conectividad en las instituciones educativas.
- Filtro de contenido prohibido y maliciosos según legislación colombiana actual.

EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo señalado en el Capítulo II de la Ley 679 de 2001, en especial respecto de las prohibiciones y deberes frente al uso de redes globales de información en relación con menores de edad. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá impedir el acceso al tipo de páginas que se encuentren establecidas por el ente competente y sus respectivas actualizaciones

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

La interventoría y/o supervisión, para la aprobación de la instalación y puesta en servicio de las instituciones educativas se realizará con un modelo de verificación remota y/o visitas de campo, el cual debe ser avalado por el Ministerio.

Para la aprobación de la instalación de las Instituciones Educativas, EL CONTRATISTA deberá coordinar y programar con la interventoría y/o supervisión el modelo de verificación de la instalación y puesta en servicio (Protocolo de pruebas), el cual debe ser avalado por el Ministerio.

La interventoría y/o supervisión dará el concepto de aprobación de las metas de instalación, si y solo si EL CONTRATISTA cumple con la totalidad de los requisitos exigidos para de las Instituciones Educativas, por tanto, no se contemplan aprobaciones parciales con pendientes por Institución Educativa, y en consecuencia EL CONTRATISTA deberá considerar el cronograma establecido en el proyecto para la aprobación de cada una de las metas. Para las metas dos (2) y tres (3) se podrá recibir mínimo con el 80% de la meta

Dentro del proceso de aprobación se realizan las siguientes actividades:

- Notificación por parte de EL CONTRATISTA a la interventoría y/o supervisión, informando la finalización de la instalación.
- Verificación por parte de la interventoría y/o supervisión de los soportes, actas de aprobación de instalación y recibo de los servicios, pruebas de conectividad y calidad del servicio que evidencien la correcta instalación.
- Verificación remota por parte de la interventoría y/o supervisión de la instalación, para esto utilizará los sistemas de gestión y de monitoreo puesto a disposición por EL CONTRATISTA.
- Programación y realización de las Visitas de Campo. EL CONTRATISTA deberá acordar con la interventoría y/o supervisión el cronograma de visitas de campo si es necesario.
- La interventoría y/o supervisión, EL CONTRATISTA y el representante de la Institución Educativa (para el caso de instituciones educativas) deberán suscribir el acta en la que conste la realización de las pruebas de recibo y pruebas de conectividad.

Adicionalmente, para que servicio se considere como instalado, en funcionamiento, operativo, y en consecuencia se realice el reconocimiento de la obligación de hacer, debe recibirse la aprobación correspondiente por parte de la interventoría y/o supervisión; además, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Tener revisado el Estudio de Campo.
- Tener aprobado el informe de ingeniería y operación.
- Tener aprobado el plan de mantenimiento.
- Tener aprobado el protocolo de pruebas.
- Prestar el servicio que permita la conectividad a Internet de las Instituciones Educativas, cumpliendo con las consideraciones señaladas en el presente documento.

El servicio en la Institución Educativa debe entrar en operación al día calendario siguiente de la aprobación por parte de la interventoría y/o supervisión; a partir de ese día se contará la etapa de operación del servicio.

NOTA 1: En caso de que la Visita de Campo para aprobación del servicio sea rechazada, es decir, que la interventoría y/o supervisión no apruebe la instalación y por lo tanto no pueda entrar en operación dicho sitio, por causas imputables a EL CONTRATISTA y que se requiera repetir la visita de campo, el costo de esta visita adicional deberá ser asumida por EL CONTRATISTA. El valor de la visita a pagar será el mismo valor de visita establecido en el contrato de la interventoría y/o supervisión. Para estos casos se realizarán los respectivos descuentos de los valores a reconocer y EL CONTRATISTA deberá pagar dicho valor en efectivo.

NOTA 2: En caso de que la Visita de Campo para la aprobación de la instalación sea fallida, es decir que por motivos ajenos a la interventoría y/o supervisión o EL CONTRATISTA, no sea posible verificar que la infraestructura instalada por EL CONTRATISTA permite la prestación de los servicios, y que ello generará una visita adicional, ésta será descontada de la bolsa de visitas establecida en el en el contrato de la interventoría y/o supervisión, y deberá ser reprogramada dentro del plazo establecido para la aprobación de la meta de instalación. En todo caso, la visita fallida deberá estar debidamente justificada.

NOTA 3: EL CONTRATISTA será responsable del correcto cumplimiento a su cargo del plan de visitas programadas

- NOTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Una vez EL CONTRATISTA haya finalizado la instalación y puesta en servicio, mediante comunicación escrita y en formato digital, cumpliendo los tiempos establecidos en el cronograma definido en el presente documento, informará a la interventoría y/o supervisión. Toda la información deberá estar disponible en el sistema de gestión documental de EL CONTRATISTA con acceso a la interventoría y/o supervisión y al Ministerio, incluyendo lo siguiente:

- Listado de las Instituciones Educativas instaladas y puestas en servicio, con la información código DANE departamento, código DANE municipio, centro poblado, coordenadas (mínimo 5 decimales) y dirección o referencias para llegar al sitio, nombre sede educativa, DANE sede educativa, datos del rector (donde aplique).
- Soporte de las pruebas de la Instalación en Institución Educativa, como mínimo deberá entregar los siguientes soportes:
- Al menos una (1) fotografía de las coordenadas geográficas de la ubicación del sitio, arrojadas por el GPS.
- Al menos dos (2) fotografías que demuestre que los equipos en sitio están instalados.
- Soportes donde se evidencie la socialización del proyecto a los Encargados de la sede y la comunidad aledaña a donde se instalará el servicio de Internet.
- Acta de instalación del sitio debidamente firmada por EL CONTRATISTA, interventoría y/o supervisión y el responsable en la entidad educativa (cuando aplique). Dentro del acta se debe establecer el cargo, número de teléfono de contacto, correo electrónico y fotocopia del documento de identificación de las personas que firman. El contenido del acta debe ser entregado por la interventoría y/o supervisión al Ejecutor.

EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría y/o supervisión el cronograma de vistas de verificación y aprobación con el fin de cumplir con la meta establecida en el cronograma.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

En la etapa de planeación del cronograma establecido en el presente documento, la interventoría y/o supervisión a diseñará los protocolos de pruebas para las verificaciones remotas y para las visitas de campo que se utilizarán para verificar la instalación de los servicios, los cuales deberán ser validados por el Ministerio y se darán a conocer al contratista, una vez sean aprobados los estudios de campo.

- VERIFICACIÓN REMOTA DE LA INSTALACIÓN

Para realizar la verificación remota, la interventoría y/o supervisión coordinará con EL CONTRATISTA, la realización de pruebas remotas desde los Sistemas de Gestión y Monitoreo puestos a disposición por EL CONTRATISTA, con el fin de verificar que los servicios se encuentran instalados, en funcionamiento y operativos. El protocolo de pruebas desarrollado por la interventoría y/o supervisión deberá contener como mínimo los ítems que se describen a continuación, con el fin de verificar que los servicios cumplen con las condiciones establecidas en el presente documento.

- Se realizarán como mínimo las siguientes pruebas:
- Información General.
- Pruebas de Conectividad.
- Acceso a páginas Web y restricción de acceso a las páginas Web de acuerdo con los filtros definidos.
- Inventario de Equipos.
- Verificación del funcionamiento y estabilidad del servicio de Internet en la Institución Educativa en el sistema de gestión. La sede de la Institución Educativa en las últimas 24 horas no debe haber registrado ninguna falla. Adicionalmente, la sede de la Institución Educativa debe haber registrado tráfico real de usuarios navegando, 24 horas para las sedes de las Instituciones Educativas con energía interconectada a la red.
- Páginas Web más visitadas en las Instituciones Educativas.
- Verificación de las alarmas generadas por fallas de conectividad a Internet.

Del resultado de las pruebas remotas se levantará un acta de verificación firmada por las personas presentes (interventoría y/o supervisión y EL CONTRATISTA), en la cual se plasmen los resultados de esta, las recomendaciones de la interventoría y/o supervisión y demás observaciones que se consideren pertinentes.

En dicha acta, deberán quedar expresados claramente los resultados de la verificación, de tal forma que se pueda evidenciar si es procedente continuar con el proceso de aprobación o si por el contrario EL CONTRATISTA debe realizar acciones de mejora.

El acta de verificación será el soporte para la realización de la visita de campo y hará parte integral del informe de aprobación de la sede de la Institución Educativa.

- VISITA DE CAMPO PARA LA APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN.

Realizada y aprobada la visita remota, EL CONTRATISTA deberá coordinar con interventoría y/o supervisión una (1) visita de verificación al sitio en la que deberán estar presentes un (1) representante de la Institución Educativa (cuando aplique), un (1) representante de EL CONTRATISTA y un (1) representante de la interventoría y/o supervisión.

En cada una de las visitas se levantará un acta de instalación, la cual deberá estar suscrita por quienes participaron en la visita y deberá plasmar los resultados de esta, las recomendaciones de interventoría y/o supervisión y demás observaciones que se consideren pertinentes. En dicha acta, deberán quedar expresados claramente los resultados de la verificación de la instalación, de tal forma que se pueda evidenciar si es procedente continuar con el proceso de aprobación, o si, por el contrario, EL CONTRATISTA debe realizar acciones de mejora. El acta de instalación hará parte integral del informe de aprobación del sitio.

El protocolo de pruebas desarrollado por la interventoría y/o supervisión deberá contener como mínimo los ítems que se describen a continuación, con el fin de verificar que los servicios cumplen con las condiciones establecidas en el presente documento:

- Verificación tecnológica de la red de acceso.
- Listado de Equipos con respectivo registro fotográfico.
- Pruebas de Conectividad y funcionalidad:

Tabla 9 Pruebas de funcionalidad

Prueba	Resultado esperado
Reconocer el SSID	Broadcast de SSID
Escoger el SSID	Conexión de red
Página web con acceso (Usuario y password)	Habilitación de servicio
Simultaneidad y velocidad	Prueba de navegación de los equipos de la sede de la Institución Educativa En el sistema de monitoreo del Ejecutor se deberá, evidenciar la navegabilidad de hasta 5 equipos de la IE, visualizando la velocidad de acceso tara descarga (download) como para carga (upload).

La interventoría y/o supervisión deberá emitir el concepto de aprobación o rechazo de la instalación de cada sitio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización de la visita de campo. En caso de que la instalación del sitio no fuera aprobada por la interventoría y/o supervisión, EL CONTRATISTA podrá subsanar las observaciones que haya realizado la interventoría y/o supervisión en un plazo máximo de diez (10) días calendario, y las mismas podrán ser verificadas remotamente, siempre y cuando, ésta sea posible.

En las situaciones en las que la interventoría y/o supervisión evidencie en la visita de campo que no había operatividad de los servicios y/o que existen riesgos eléctricos y/o de infraestructura derivados de la instalación que puedan afectar a la comunidad, la interventoría y/o interventoría y/o supervisión realizará una nueva Visita de Campo para la Aprobación del sitio.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La interventoría y/o supervisión deberá emitir el concepto de aprobación sobre la totalidad de las Instituciones Educativas que conforman las metas, el cual deberá realizarse según los plazos definidos en el cronograma establecido en el presente Anexo Técnico.

NOTA: En caso de que, por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificados por parte de la interventoría y/o supervisión no sea posible realizar la visita de campo podrá realizarse la verificación de aprobación remota. Sin embargo, al momento en que cesen los hechos generadores de la Fuerza Mayor, la interventoría y/o supervisión se encuentra en la obligación de ejecutar la visita de campo de manera presencial.

B. FASE O ETAPA OPEX

B-I. – OPEX HOGARES

Corresponde al gasto operacional, costo o recurso utilizado para mantener, operar o gestionar el servicio de conectividad prestado por las 100 Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) y EL CONTRATISTA a los 6000 hogares.

Para efectos de verificar el cumplimiento de la meta de operación que se establece en el cronograma, se considerará que el convenio cumpla con:

- Operación bajo las condiciones de calidad y niveles de servicio exigidos.
- Se apruebe por parte de la Supervisión/Interventoría la debida instalación, configuración y puesta en servicio basado en las condiciones de calidad y cumplimiento de los criterios de calidad.

EL DEPERTAMENTO, a través del interventor deberá garantizar que EL CONTRATISTA seleccionado de cumplimiento a los Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio incluidos.

A continuación, se describe el conjunto inicial de dichos indicadores con sus respectivos valores admisibles, no obstante, de mutuo acuerdo, se podrá acordar la inclusión de indicadores adicionales dentro del sistema de medición y seguimiento, en relación con la actualización, modificación o reemplazo de los indicadores aquí definidos.

- INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

Los indicadores mínimos de calidad que se deberán medir en el desarrollo del Convenio con una periodicidad mensual, salvo que se indique lo contrario, serán los siguientes:

- Disponibilidad de Canal de Conectividad a Internet.
- Velocidad efectiva de transmisión de datos y latencia del canal de conectividad a Internet.
- Tiempo de solución de Falla.

El control y seguimiento de indicadores para su cumplimiento se implementará, mediante metodología y protocolo de pruebas propuesto previa aprobación de la Supervisión/Interventoría.

Se iniciará la medición de los indicadores a partir de la puesta en servicio de conectividad en cada hogar beneficiario con la debida aprobación de la Supervisión/Interventoría.

Para la medición de indicadores, se adelantará el cálculo respectivo y se reportará mensualmente a la Supervisión/Interventoría los resultados de estos. Así mismo, deberá reportar, cada mes de forma consolidada, toda la información que fue utilizada en dicho procedimiento, con el propósito de validar el cálculo.

- DISPONIBILIDAD DE CANAL DE CONECTIVIDAD

El valor mínimo que debe arrojar el cálculo de este indicador, para que se considere como cumplido debe ser mínimo del 95%.

En caso de que se requiera realizar pruebas exhaustivas sobre el canal, se podrán realizar mediciones y utilizar la siguiente metodología:

Metodología de medición de la disponibilidad del canal:

El indicador de disponibilidad hace referencia al porcentaje de tiempo en el cual, el canal que brinda la conectividad a Internet debe estar disponible o funcionando correctamente para los hogares beneficiarios cumpliendo con la capacidad, funcionalidad y el nivel de servicio.

Para el cálculo del tiempo de indisponibilidad, no se tendrá en cuenta el tiempo de las fallas que no son imputables al Ejecutor, entre las que se encuentran:

- El tiempo en que se incurra para realizar trabajos de mantenimiento preventivo, según los procedimientos establecidos.
- En todo caso, eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito, debidamente soportados de acuerdo con lo legalmente definido.
- Las fallas que no son imputables al Ejecutor, no se tendrán en cuenta para el cálculo del indicador de disponibilidad.

El Cooperante será el responsable de soportar debidamente ante Supervisión/Interventoría estos casos, quien verificará que dichas fallas no son imputables al Ejecutor.

- INDICADOR DE DISPONIBILIDAD MENSUAL

Cálculo Del Indicador:

Los criterios para tener en cuenta en el cálculo de la disponibilidad son los siguientes:

- La disponibilidad deberá medirse para la totalidad de hogares conectados.
- Tiempo máximo de disponibilidad en horas, dependiendo la cantidad de días del mes de medición.
- Tiempo fuera de servicio o sin disponibilidad en horas para cada hogar beneficiario.
- El Indicador se calculará por cada hogar beneficiario.
- La disponibilidad será medida mensualmente.

Para medir la Disponibilidad por cada hogar beneficiario, se utilizará la siguiente fórmula:

$$DSWi = \left[1 - \frac{\sum IF}{(24 \times d)}\right]$$

Donde:
DSW i: Disponibilidad de la conectividad al hogar beneficiario.
IF (Intervalo de Falla): Tiempo en el cual el servicio no estuvo disponible, medido en horas.
d: Es el número de días calendario del mes medido.

- VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y LATENCIA

La velocidad de transmisión de datos se debe definir separadamente para la "bajada" de archivos de prueba entre un sitio remoto Web y el equipo Router instalado al hogar beneficiario.

- MUESTRA

Se tendrán en cuenta el 10% de los hogares beneficiarios aprobados con servicio de acceso a internet a cargo de EL CONTRATISTA, independiente de la tecnología utilizada para brindar la conectividad de acceso a internet.

- CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICIÓN

Las siguientes son características de las pruebas a realizar.

Se reportará el monitoreo del sistema de gestión para cada hogar beneficiario por lo menos durante 2 momentos diferentes del día. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá requerir mediciones en horarios diferentes a los propuestos en el presente acápite.

Como producto de las mediciones realizadas se debe obtener toda la información cuyos resultados se agrupan para obtener un indicador mensual con corte al último día calendario de cada mes.

- HERRAMIENTA DE MEDICIÓN

Se deberá contar con una herramienta que permita realizar la medición remota del indicador de velocidad de transmisión de datos y se deberá presentar dentro del Informe Detallado de Ingeniería y Operación, donde se incluyan la información, metodología de medición y características funcionales de la misma.

Se deberá presentar la herramienta para la validación del cumplimiento de la funcionalidad de las mediciones conforme a las recomendaciones establecidas en este documento y la veracidad los valores reportados.

- REPORTE

El reporte de Indicadores es parte integral del informe mensual de Operación. Para efectos de determinar, analizar y validar los indicadores de transmisión de datos el informe debe contener:
Una sección de resumen de los indicadores con los datos o gráficas que permitan visualizar los comparativos de acumulados (hasta un máximo de 6 meses). Se debe incluir el análisis y las observaciones del comportamiento del indicador del mes con respecto al (los) mes (es) anterior (es).
Una sección donde se indiquen los incidentes de seguridad y plan de acción de mejora.

- CÁLCULO DEL INDICADOR

El cálculo del indicador se realizará de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.2 del documento ETSI EG 202 057- 4 V1.1.1 (2008-10).
https://www.etsi.org/deliver/etsi_eg/202000_202099/20205704/01.02.01_60/eg_20205704v010201p.pdf

- CRITERIO DE CUMPLIMIENTO.

Para verificar el cumplimiento de este indicador, se utilizará la metodología establecida en el numeral 5.2 del documento ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2008-10) el Anexo G del mismo documento. https://www.etsi.org/deliver/etsi_eg/202000_202099/20205704/01.02.01_60/eg_20205704v010201p.pdf

- PERIODO DE EVALUACIÓN.

La obligación de medir y presentar informes de indicadores es de periodicidad mensual, periodo que será revisado y evaluado la supervisión/interventoria, de tal forma que se determine el cumplimiento de los niveles mínimos admisibles de calidad de servicio.

- TIEMPO DE SOLUCIÓN DE FALLAS.

Todas las fallas de operación de los beneficiarios del Proyecto deberán ser resueltas y corregidas. Las incidencias se dividirán en:

Tabla 10 Tipo de incidencias

PRIORIDAD	TIPO
Alta	Servicio no disponible (Sin servicio)
Media	Servicio defectuoso (degradado)
Baja	Se refiere a un problema imputable al Ejecutor y que no impacta el servicio de conectividad

Cualquier otro tipo de incidencia que pueda ocurrir será clasificada en función de si afecta de forma directa a la prestación del servicio y en qué grado. El Tiempo de respuesta a una falla debe ser de la siguiente manera:

Tabla 11 Tiempo de respuestas ante incidencias

TIEMPO DE RESOLUCIÓN DE FALLAS	
PRIORIDAD	TIEMPO MÁXIMO
ALTA	8 horas calendario
MEDIA	24 horas calendario
BAJA	72 horas calendario

a) Para estas fallas no se considera los defectos de operación del equipo terminal del beneficiario.
b) Todos estos parámetros de incidencias quedan anulados en eventos de fuerza mayor o caso fortuito.
c) Se deberá tener una línea de atención al cliente para atención a reporte de fallas de los usuarios.

- MEDICIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

El protocolo de pruebas, la metodología de medición, la medición de los indicadores, los períodos de medición y demás aspectos relevantes deberán ser definidos en el segundo mes de ejecución del convenio, de conformidad con parámetros aplicables a condiciones de prestación similares definidos.

EL CONTRATISTA adelantará el cálculo respectivo del informe mensual y reportará a la supervisión/interventoría, los resultados de los mismos. Así mismo, deberá reportar, toda la información que fue utilizada en dicho procedimiento, con el propósito de que se pueda validar el cálculo. Se podrán realizar otras pruebas que se consideren pertinentes en cualquier momento del convenio, para verificar que el protocolo de pruebas se ejecute de acuerdo con lo estipulado.

- PENALIZACIÓN

Los indicadores sirven de base para conocer la calidad de los servicios que se están prestando y para el cálculo del valor que será deducido de la factura mensual durante la ejecución de los servicios. En pro del buen uso de los recursos contratados, se ha establecido que los resarcimientos generados producto de las penalizaciones aplicadas por el incumplimiento de los indicadores de servicio quedarán a favor del Contratante, quien los utilizará dentro del contrato de acuerdo con las necesidades del servicio.

La Interventoría/Supervisión, mediante el usuario y clave proporcionado, tendrá acceso al software de gestión y podrá en cualquier momento realizar la verificación de los indicadores. En este caso, se le indicará a la

Interventoría/Supervisión cómo puede obtener los resultados del indicador. Los tiempos de inactividad por causas no atribuibles al Ejecutor no serán tenidos en cuenta para el cálculo mensual del indicador.

- CRITERIO DE CUMPLIMIENTO Y FACTOR DE PENALIZACIÓN.

Tabla 12 Disponibilidad de servicio

TECNOLOGÍA	NIVEL	RANGO (%)	PENALIDAD
Canales con Reuso (1:8)	96%	D>=96	0% del valor mensual del servicio
		90 ≤ D < 95	10% del valor mensual del servicio
		85 ≤ D < 90	20% del valor mensual del servicio
		80 ≤ D <85	30% del valor mensual del servicio
		70 ≤ D <80	50% del valor mensual del servicio
		50 ≤ D <70	70% del valor mensual del servicio
		D < 50,0	100% del valor mensual del servicio

Se deberá contar un sistema para la atención de los PQRs que interpongan los usuarios respecto de este indicador. La supervisión/Interventoría validará los registros y estadísticas de la atención a PQRs a través del sistema de información entregado.

- CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA deberá garantizar que la tecnología incluya la respectiva plataforma de gestión asociada a la tecnología ofertada y necesarias para llevar a cabo toda la supervisión, configuración, aprovisionamiento, seguimiento, control, O&M, tanto de la red de acceso como de la plataforma de aprovisionamiento de servicios residencial.

Este alcance incluye el suministro de todos los elementos de hardware (cuando se trate de plataformas no virtualizables), software y accesorios complementarios que componen la tecnología ofertada, la plataforma de Gestión y la plataforma de aprovisionamiento, así como licenciamientos y/o software de virtualización necesario para su funcionamiento. El licenciamiento y actualizaciones de hardware y software debe cubrir un periodo de por lo menos cinco (5) años para cada red de acceso implementada en cada una de las Juntas de Internet, contados a partir del inicio de la etapa de operación y mantenimiento.

- ARQUITECTURA DE PLATAFORMA DE APROVISIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA deberá diseñar, implementar y entregar una plataforma capaz de realizar el aprovisionamiento de los servicios residenciales de usuario final, la arquitectura de alto nivel de esta plataforma se lista a continuación:

Plataforma de aprovisionamiento
Sistema que permite la activación, configuración y gestión automatizada de servicios de INTERNET para hogares en sus hogares. Facilita el proceso de activación inicial, asignación de recursos (como ancho de banda y direcciones IP) y la configuración remota de equipos en la red del cliente, como módems y Routers.

Servicio DDNS (Dynamic Domain Name System)
Servicio que permite asignar un nombre de dominio fijo a la dirección IP dinámica de un usuario. Esto facilita el acceso remoto a dispositivos en el hogar (como cámaras de seguridad, servidores o sistemas de automatización) al permitir que el usuario acceda a su red mediante un dominio constante, sin importar los cambios de IP pública.

Servicio SNMP (Simple Network Management Protocol)
Servicio que permite la gestión y monitoreo remoto de los dispositivos de los hogares, a través de SNMP, garantiza que sea posible supervisar el estado de estos equipos, recopilar métricas de rendimiento (como el uso de ancho de banda y el estado de conexión) y detectar problemas de forma proactiva.

Servicio TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
Servicio que permite transferir archivos de configuración y firmware a los dispositivos de los hogares, de manera sencilla y sin autenticación compleja. También permite que los dispositivos de los hogares descarguen automáticamente las actualizaciones y configuraciones desde el servidor del proveedor, facilitando el aprovisionamiento inicial, las actualizaciones de software y los ajustes de configuración remotos, manteniendo los equipos al día y funcionando de manera óptima.

Servicio DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Servicio encargado de asignar direcciones IP dinámicas a los dispositivos de los hogares de forma automática. Esto permite que cada dispositivo conectado a la red del hogar obtenga una dirección IP válida y otros parámetros de red esenciales (como la puerta de enlace y los servidores DNS) sin intervención manual.

Servicio DNS Caché (Domain Name System Caché)
Servicio que almacena copias temporales de las consultas de DNS realizadas por los hogares para nombres de dominio comunes. Esto permite que las solicitudes de acceso a sitios web y servicios en línea se resuelvan más rápidamente al evitar consultas repetidas a servidores DNS externos, el DNS Cache reduce la latencia y mejora la velocidad de navegación de los hogares, además de optimizar el uso de ancho de banda en la red al minimizar el tráfico hacia los servidores DNS externos.

Portal Cautivo
Se trata de una interfaz que restringe el acceso completo a internet y redirecciona al usuario a una página específica donde se le informa sobre el estado pendiente de su cuenta. Hasta que el usuario regularice su situación, el acceso a la red se limita únicamente a este portal, impidiendo la navegación normal y restaurando el servicio completo una vez realizado el pago.

Adicionalmente el portal cautivo servirá para que la Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) publique a la comunidad noticias y avisos de interés específico para la comunidad.

EL CONTRATISTA deberá filtrar los siguientes contenidos de uso:

Tabla 13 Contenido y Filtrado

Contenido	Tipo Filtraje
Sitios de listas reportadas (Black & Gray List)	Permanente
Cualquier sitio Web	Pornografía Infantil de acuerdo con la normatividad vigente.

EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo señalado en la Ley 679 de 2001, el Decreto 1524 de 2002 y la Ley 1336 de 2009, así como aquellas normas que los modifiquen adiciona o sustituyan, en especial respecto de las prohibiciones y deberes frente al uso de redes globales de información en relación con menores de edad. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá adoptar las medidas técnicas que permitan realizar el filtrado de contenido que vulnere los derechos de los menores de edad y todo aquel contenido reportado por las autoridades judiciales o Policía Nacional, con sus respectivas actualizaciones.

EL CONTRATISTA deberá observar lo establecido en la resolución CRC 5050 de 2016, "Por la cual se compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación Comunicaciones", modificada por la resolución CRC 6890 del 2022, "Por la cual se modifican algunas disposiciones del régimen de calidad para los servicios de telecomunicaciones contenidas en los capítulos 1 y 2 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones", SECCIÓN 2. "OBLIGACIONES DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET", en especial el artículo 5.1.2.3. "GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN REDES DE TELECOMUNICACIONES", y todas las que lo modifiquen, deroguen o sustituyan.

B-II. OPEX INSTITUCIONES EDUCATIVAS

EL CONTRATISTA es el único responsable de llevar a cabo la administración, operación y mantenimiento de la conectividad a internet bajo las condiciones de calidad y niveles de servicio establecidas en el presente anexo técnico. Es obligación de EL CONTRATISTA coordinar con las autoridades respectivas el ingreso a Instituciones Educativas para realizar los mantenimientos preventivos y/o correctivos.

Se resalta que el servicio en la Institución Educativa debe entrar en operación al día hábil siguiente de la aprobación de la meta por parte de la interventoría y/o supervisión; a partir de ese día se contará la etapa de operación del servicio.

La entrega por EL CONTRATISTA de la instalación y puesta en servicio no generan derecho o expectativa alguna para el PRST, ni obligación alguna de aprobación y autorización por parte del Ministerio TIC. En caso de que sean aprobados la interventoría y/o supervisión deberá expedir documento correspondiente que apruebe la instalación y puesta en servicio de cada institución educativa.

- SERVICIO A PRESTAR EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

EL CONTRATISTA deberá proveer el servicio de Internet con tráfico nacional e internacional, de la siguiente manera:

El servicio de Internet es previsto para uso exclusivo de los miembros de la Institución Educativa a través de un portal cautivo, si es requerido por la sede educativa, se habilitará un sistema de autenticación WEP, WPA, WPA2 o WPA3, y/o se registrarán las MAC de los equipos relacionados en el AP. Sin embargo, si durante la ejecución del proyecto se requiere registrar nuevos equipos, la solución propuesta por EL CONTRATISTA deberá contemplar el registro remoto de las nuevas MAC relacionadas, correspondiente a los nuevos terminales.

El servicio deberá estar operativo las 24 horas del día, 7 días a la semana, para las Instituciones Educativas con energía interconectada a la red durante los meses de operación del proyecto. En caso de ausencia o fallo de energía de

la Instituciones Educativas, se determinará como un tiempo de paro de reloj y no se tendrá en cuenta para el cálculo de los indicadores de calidad y servicio.

El filtraje de contenidos se realizará de acuerdo con lo establecido en la ley y por orden judicial, siempre y cuando sean técnicamente viables.

Se deberá controlar el tráfico de acuerdo con las siguientes indicaciones:

Tabla 14 Control de trafico

Contenido	Tipo de control
Sitios de streaming de video y audio	Control de la calidad de reproducción con el fin de gestionar la red de manera eficiente y evitar la mala percepción del servicio.
Sitios de descargas masivas	Tasas baja transferencia.
Actualización de aplicaciones y sistemas operativos	Tasas baja transferencia.
Sitios de intercambio de información P2P	Tasas baja transferencia.
Portales .gov.co y .edu.co	Tendrán prelación en la red y sus descargas.

- VELOCIDAD EFECTIVA MÍNIMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS

La velocidad efectiva mínima de trasmisión de datos para la prestación del servicio de Internet para las Instituciones Educativas se detalla a continuación:

Tabla 15 Capacidad Efectiva del Canal de Transmisión de Datos[2]

Tipo de Servicio	Total	Variable: Velocidad Efectiva de Tx de datos (Descarga/Carga; Prioridad)	Medio
Institución Educativa	110	40-200 Mbps / 8-50 Mbps; Prioridad: 1Tb	Satelital

En el evento en que se modifique o subrogue la Resolución que establece las velocidades de transmisión de la definición de banda (actualmente Resolución No 5161 del 2017) y el incremento anual del 10% aquí establecido ya haya sido aplicado, deberán recalcularse la velocidad mínimas de bajada y subida para cada institución educativa.

Se deberá controlar el tráfico de acuerdo con las siguientes indicaciones:

Tabla 16. Condiciones especiales por tecnología

Condiciones de cumplimiento	Usuarios concurrentes	Control de sesiones
Satelital	EL CONTRATISTA deberá entregar a la Interventoría la ficha técnica que demuestre la capacidad de	Deberá controlar sesiones a los usuarios por dos (2) horas, trascurrido este tiempo se deberá finalizar la sesión al usuario, sin embargo, este se

[2] Se entiende que la velocidad efectiva de Tx de datos para este proceso es la descrita en el presente numeral y está de acuerdo con lo establecido en la Resolución No 5161 del 2017 de la CRC o en la norma que la modifique, derogue o sustituya

	conectividad mínima de 256 clientes por canal	podrá volver a conectar siempre y cuando existan recursos de red disponibles

Contenido	Tipo de control
Sitios de streaming de video y audio	Control de la calidad de reproducción con el fin de gestionar la red de manera eficiente y evitar la mala percepción del servicio
Sitios de descargas masivas	Tasas baja transferencia
Actualización de aplicaciones y sistemas operativos	Tasas baja transferencia
Sitios de intercambio de información P2P	Tasas baja transferencia
Portales .gov..co y edu.co	Tendrán prelación en la red y sus descargas

- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA deberá hacer seguimiento del uso y ocupación de la conectividad a internet de la red de acceso y de la red de interconexión en cada sitio, discriminando el tráfico de tal forma que a través de los reportes periódicos generados por su Sistema de Gestión y del monitoreo permanente que realice sobre él, se pueda garantizar las condiciones de operación definidas en el presente anexo. En especial dicha información debe permitir calcular el consumo - hora (GB) e identificar las horas pico y el comportamiento estadístico por cada sitio. Igualmente se deberá poder calcular el uso del ancho de banda en la red de acceso y red de interconexión para cada día y por sitio.
EL CONTRATISTA deberá poner a disposición de EL DEPARTAMENTO, la interventoría y/o supervisión, para ser remitidos al MINISTERIO TIC, como mínimo, los siguientes reportes o información en línea a través de un portal web único seguro (HTTPS) con autenticación el cual podrá ser consultado desde cualquier dispositivo.

- Informe del tráfico cursado por la Institución Educativa, detallándolo por hora, día, mes, año, tanto entrante como saliente, mostrando los picos máximos y mínimos tanto de entrada como de salida, tráfico promedio, y gráficos.
- Con respecto a las mediciones de tráfico real estas deberán tener una precisión de 10 minutos. Las mediciones con esta precisión deberán estar siempre disponibles durante la duración del proyecto.
- Reporte de fallas del servicio por sitio, con fecha, hora, causa de la falla, acciones tomadas para la solución, duración de la falla. Esta información debe permitir el análisis y generación de estadísticas por cada sitio; esto con la finalidad de establecer la operación de cada sitio, y ocupación del canal.
- Número de usuarios conectados (día, mes) y uso del servicio de Internet por sitio.
- Registro de conexiones por sitio por periodo de tiempo (día, semana, mes, año), horario de mayor concurrencia, días y horas de mayor consumo.
- Tiempo promedio de sesión por sitio.
- Tecnologías de terminales (Sistema operativo, Marca terminal y MAC) que accedieron a la Institución Educativa.
- Gráfico de uso de cada sitio (por hora, día y mes).
- Reporte de los sitios web de acceso más visitados. (top 10 Gráficos y texto) y agrupado por categorías.
- Informe del registro de los usuarios (Total usuarios por Institución Educativa, usuarios nuevos por mes, sesiones establecidas, etc.).
- Nivel de satisfacción de los usuarios (promedio de calificación municipal y departamental, cantidad de calificaciones recibidas).
- Reporte General consolidado de tráfico y usuarios, discriminado por cada Institución Educativa

Todos estos reportes deben tener la opción de poder ser exportados a Excel.

La información anterior deberá estar disponible online mediante el sistema de gestión, esta deberá tener una precisión de 10 minutos y podrá requerirse por parte del Ministerio o la interventoria, el detalle de estos datos en algún informe específico.

Nota: La información de estos reportes deberá estar disponible durante toda la ejecución del proyecto.

- PORTAL CAUTIVO

EL CONTRATISTA deberá implementar un Portal Cautivo, para acceso y registro de los usuarios al servicio de conectividad, el cual podrá ser un espacio web apto para acceder desde cualquier dispositivo móvil o terminal. Este sistema deberá estar habilitado durante toda la etapa de operación del proyecto. El sistema debe ser gráfico y funcionalmente atractivo para los usuarios.

EL CONTRATISTA deberá dimensionar el Portal Cautivo teniendo en cuenta las solicitudes de acceso que se pueda recibir de manera simultánea por parte de los usuarios del servicio de Internet, de tal manera que garantice la oportunidad en el acceso a los usuarios sin que se presenten retrasos para acceder al servicio de Internet. De acuerdo con las necesidades evidenciadas durante la ejecución del proyecto.

El Ministerio podrá solicitar ajustes al portal cautivo sin que esto implique un costo adicional al proyecto. Este sistema de control o portal cautivo deberá ser entregado por EL CONTRATISTA cinco (5) días hábiles antes de la entrega de la primera sede educativa conectada, para validación y aprobación por parte de la supervisión y/o interventoría durante los cinco
(5) días hábiles después de la entrega. El portal cautivo deberá controlar sesiones a los usuarios por dos (2) horas, trascurrido este tiempo se deberá finalizar la sesión al usuario, sin embargo, este se podrá volver a conectar siempre y cuando existan recursos de red disponibles.

- FUNCIONALIDADES DEL PORTAL CAUTIVO

Registro: La funcionalidad de Registro debe precisar el Municipio y la institución educativa de la cual se están conectando y será el pantallazo que visualice el usuario siempre y cuando sea un usuario nuevo.

El usuario deberá proveer los datos de caracterización que el Ministerio solicite, o quien este designe para tal fin, los cuales serán definidos en conjunto con EL CONTRATISTA durante el primer mes de ejecución del proyecto, posterior a esto el usuario deberá aceptar las condiciones de uso y políticas de privacidad, la cual deberá estar en línea a lo presentado en el artículo 7 de la Ley 1581 de 2012, que señala que la recolección y tratamiento de datos personales de menores, está prohibida, salvo aquellos datos de naturaleza pública.

El sistema debe garantizar la protección de datos personales de los usuarios que interactúen con él y para ello debe cumplir con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y aquellas normas que las deroguen, modifiquen o sustituyan y debe ser comunicado a los usuarios en las condiciones de uso.

Usuario nuevo: dispositivo que se conecta por primera vez en una zona digital, el usuario deberá registrar (Información de usuario) para navegar y el portal cautivo deberá registrar la dirección física (MAC) de dicho dispositivo.

Usuario recurrente: dispositivo cuya dirección física (MAC) ha sido registrada con anterioridad, es "reconocida" por el punto de Acceso inalámbrico WIFI e inicia una nueva sesión después de haber hecho uso del servicio en la zona digital en una ocasión anterior.

Experiencia: Una vez se haya realizado el registro del usuario, este entrará al servicio como un usuario recurrente, esto es, cuando el usuario se conecte de la misma institución educativa en la que navegó y desee seguir navegando en una nueva sesión. En este entorno, durante el uso del servicio de internet por parte del beneficiario, se debe disponer de la funcionalidad para preguntar al usuario su nivel de satisfacción de navegación, siempre que el usuario acepte hacerlo, especificando la institución educativa-municipio de la zona digital que está calificando. Esta pregunta deberá ser una encuesta con el siguiente resultado: Malo, Regular, Aceptable, Bueno y Excelente.

El número máximo de usuarios simultáneos que podrá estar conectado en cada Institución Educativa es 50.

El sistema de control y registro debe ser agradable a los usuarios, disponer de las anteriores funcionalidades y operar debidamente. Los diseños y funcionalidades de las interfaces anteriores deben ser sujetos a aprobación de la supervisión y/o interventoría. La aprobación del diseño de los pantallazos por parte de la supervisión y/o interventoría se realizará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles después de la entrega del diseño por parte de EL CONTRATISTA.

- GESTIÓN DE RED.
- GESTIÓN DE CAPACIDAD, TRÁFICOS Y CONSUMO DE DATOS

Para poner en funcionamiento la gestión del proyecto, EL CONTRATISTA debe disponer de los sistemas, equipos y mediciones remotas relacionadas con los equipos en sitio, de modo que se tenga información en tiempo real sobre los siguientes aspectos:

- Tráficos y consumo de datos por minutos, por hora por día por sitio.
- Monitoreo remoto detallado de tráfico y fallas por sitio.
- Monitoreo remoto de fallas en equipos de terminales de conectividad en cada sitio.
- El sistema de gestión y de monitoreo de EL CONTRATISTA debe estar en la capacidad de generar alarmas por condiciones de indisponibilidad permitiendo identificar, cada 24 horas, las Instituciones Educativas que no se encuentran cursando tráfico (por ausencia y/o no reporte de tráfico) en el servicio de Internet, estas alertas deben quedar registradas de forma independiente en el Sistema de Gestión de EL CONTRATISTA generando un ticket, de tal forma que puedan ser validadas por la interventoría.

Asimismo, la información provista en tiempo real debe ser útil para ajustar la red a los tráficos reales en cada sitio, haciendo eficiente el recurso de ancho de banda.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- MESA DE AYUDA


ELCONTRATISTA deberá disponer del servicio de mesa de ayuda para atención de PQRSD.

- **Mesa de ayuda o centro de soporte**: es el medio a través del cual EL CONTRATISTA del proyecto recibirá y dará trámite a todas las Peticiones Quejas, Recursos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD), así como la atención de reportes de fallas y soporte técnico sobre los equipos, el servicio de conectividad y mantenimiento correctivo, esta mesa de ayuda deberá estar ubicada en el territorio Nacional.
- **Procedimiento**: Los usuarios de las Instituciones Educativas se contactarán con el CCC del Ministerio para solicitar soporte o información. Se define CCC como el medio de atención que el Ministerio dispone para consolidar y radicar todas las Peticiones Quejas, Recursos Solicitudes y Denuncias (PQRSD) que interponen los diferentes beneficiarios y proyectos del Ministerio. El agente del CCC realizará el registro, la tipificación del caso y realizará gestión informativa, en caso de que no se resuelva el caso este será escalado a la mesa de EL CONTRATISTA y se transferirá la llamada, por tal motivo EL CONTRATISTA debe contar con una línea de atención gratuita nacional (01 8000).
- **El tiempo máximo de respuesta** establecido para contestar una llamada es de 60 segundos.

La plataforma de gestión de atención de la mesa de servicio de EL CONTRATISTA deberá poder integrarse con la plataforma que este implementada para el Centro de Contacto al Ciudadano (CCC) de tal manera que se realice un intercambio automático en tiempo real de los casos creados y las actualizaciones posteriores.

Para tal efecto se realizarán mesas de trabajo entre ambas partes con el apoyo de la interventoria y/o supervisión para determinar la mejor manera de integración y desarrollar un cronograma de actividades, para puesta en producción.

Figura 4 Esquema de atención a los usuarios

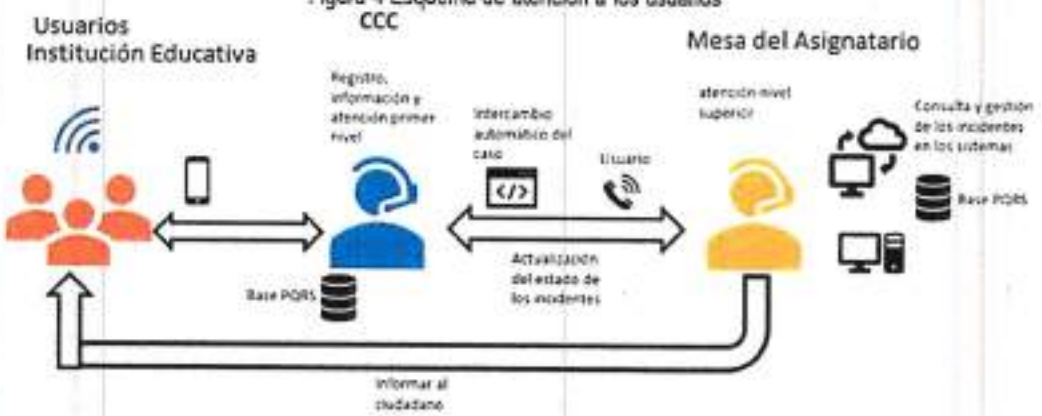

Durante el primer mes de ejecución EL DEPARTAMENTO realizará una mesa de trabajo con EL CONTRATISTA, interventoria y/o supervisión y el MINISTERIO TIC para revisar el procedimiento de atención de las PQRSD. La mesa de ayuda de EL CONTRATISTA deberá estar disponible desde el reporte de la instalación de la primera Institución Educativa.

Durante el plazo de ejecución del proyecto, el servicio de mesa de ayuda debe garantizar de manera permanente un horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., y sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
Asimismo, deberá generar reportes tales como:

- Total de tickets creados en el Centro de Soporte de EL CONTRATISTA diarios y mensuales, Total de llamadas abandonadas.
- Tiempo promedio de atención al usuario.
- Reporte detallado de cada uno de los tickets: clasificados de acuerdo con el nivel de servicio, su estado y responsable.
- Reporte de gestión de PQRSD.
- Reporte de tipificación de fallas presentadas para cada sitio, etc.

EL CONTRATISTA en cada una de las llamadas recibidas, debe registrar en una base de datos como mínimo:

- El tipo de evento reportado (incidente, solicitud)
- Número del reporte
- Datos generales de quien reporta: (nombre, teléfono contacto, dirección física, correo electrónico, fecha)
- Descripción de la falla
- Solución a la falla
- Fecha de solución de la falla
- Otra información relevante (información relevante para los procesos de mantenimiento y reparación que se requieran llevar a cabo).

Los valores máximos admisibles para los indicadores de la mesa de ayuda, que EL CONTRATISTA deberá cumplir en desarrollo del proyecto.

Tabla 17 Valores admisibles de la mesa de ayuda

Item	ANS	
1	Nivel de Servicio para la atención de la llamada	Contestar el 80% de las llamadas antes de 30 segundos.
2	Disponibilidad de la plataforma tecnológica de Centro de Contacto. RTO (Tiempo para volver a operar después de un incidente - Recover Time Objective)	D>=99% RTO incidente: 120 min Periodo de medición: mensual
3	Eficacia	# casos resueltos/# casos atendidos >= 95%

EL CONTRATISTA deberá garantizar que la mesa de ayuda genere los reportes que contengan la información necesaria para el cálculo de los indicadores anteriormente descritos, los cuales serán validados por la interventoría y/o supervisión.

Calidad en la atención al usuario EL CONTRATISTA deberá incorporar al sistema de información del proyecto, un reporte mensual del comportamiento del indicador de mesa de ayuda, para efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Con base en los resultados, la interventoría y/o supervisión requerirá al Ejecutor sobre las mejoras a implementar, y validará que en el periodo de corte inmediatamente siguiente se hayan implementado de modo satisfactorio. El incumplimiento a los umbrales que establezca la interventoría y/o supervisión en las acciones de

mejora dará lugar al procedimiento administrativo establecido en la Resolución 3617 de 2023 que deroga parcialmente la Resolución 2715 de 2020 o aquella que la derogue, subrogue o modifique

- INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

La medición oficial de los indicadores de calidad y niveles de servicio iniciará el día hábil siguiente al recibo de la comunicación de aprobación de la meta uno (1) emitida por parte de la interventoría y/o supervisión.

- EL CONTRATISTA deberá cumplir con los siguientes requerimientos, durante la ejecución del proyecto:
- El servicio deberá estar activo 7x24 para cada una de las instituciones educativas.
- Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el presente anexo para la conectividad de Internet.
- Proveer el soporte necesario, a nivel de hardware y software, para realizar las configuraciones que se requieran para el acceso a Internet.
- Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los equipos instalados de tal forma que se pueda garantizar el cumplimiento de los Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio solicitados.

A continuación, se detallan los indicadores a ser medidos en el proyecto y los cuales deberá cumplir EL CONTRATISTA:

Tabla 18 Indicadores de calidad y servicio mensuales

Indicador	Valor Objetivo
Disponibilidad de Servicio de Conectividad por Institución Educativa	Mínimo 96%
Velocidad efectiva mínima de transmisión de datos	40-200 Mbps / 8-50 Mbps; Prioridad: 1Tb
Mantenimiento preventivo	Mínimo una (1) vez por año

Para el cálculo de los anteriores indicadores, no se tendrá en cuenta el tiempo de las fallas que no son imputables al Ejecutor, entre las que se encuentran:

- Cuando por causas externas y consideradas de fuerza mayor, no se pueda acceder a la sede de la Institución Educativa para recuperar el servicio.
- En todo caso, eventos de fuerza mayor debidamente soportados de acuerdo con lo legalmente definido.
- El tiempo en que se incurra para realizar trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo, según los procedimientos establecidos.
- Tiempos de paradas de reloj[3]

[3] Parada de reloj: Situación en que por causa no imputable a EL CONTRATISTA sea necesario aplazar la fecha de atención o solución de un requerimiento. Los tiempos de parada de reloj no cuentan para el cálculo de los indicadores de calidad y servicio

- PENALIZACIÓN

Los indicadores sirven de base para conocer la calidad de los servicios que se están prestando y para el cálculo del valor que será deducido de la factura mensual durante la ejecución de los servicios. En pro del buen uso de los recursos, se ha establecido que los resarcimientos generados producto de las penalizaciones aplicadas por el incumplimiento de los indicadores de servicio quedarán a favor del Ministerio.

La Supervisión y/o interventoría, mediante el usuario y clave proporcionado, tendrá acceso al software de gestión y podrá en cualquier momento realizar la verificación de los indicadores. En este caso, se le indicará a la Supervisión y/o interventoría cómo puede obtener los resultados del indicador. Los tiempos de inactividad por causas no atribuibles al Ejecutor no serán tenidos en cuenta para el cálculo mensual del indicador.

Tabla 19 Penalización por disponibilidad de servicio

TECNOLOGÍA	NIVEL	RANGO (%)	PENALIDAD
Canales con Reuso (1:2)	96%	D>=96	0% del valor mensual del servicio
		90 ≤ D < 95	10% del valor mensual del servicio
		85 ≤ D < 90	20% del valor mensual del servicio
		80 ≤ D <85	30% del valor mensual del servicio
		70 ≤ D <80	50% del valor mensual del servicio
		50 ≤ D <70	70% del valor mensual del servicio
		D < 50,0	100% del valor mensual del servicio

- FUENTES Y VARIABLES

Sistema de Información:

- Del Sistema de Información se tomarán las fallas reportadas por los usuarios y las fallas reportadas automáticamente por el Sistema de Gestión de Red. Este sistema deberá proporcionar:
- Tipo de Falla: Corresponde a la categorización asignada en el módulo de Gestión de Eventos y PQRS, el tipo de falla debe definir claramente el evento que se está presentando en el sitio, por ejemplo, Intermitencia en el Servicio.
- Fecha y hora de Inicio de Falla: Corresponde a la Fecha y Hora en que inicio la falla, en el caso en que la falla haya iniciado el mes anterior al cálculo esta fecha corresponderá al primer segundo del mes del cálculo, por ejemplo, si queremos realizar el cálculo del indicador para octubre y la falla inicio desde septiembre este campo será 01/10/2025 00:00:01.
- Fecha y hora de Solución de Falla: Corresponde a la Fecha y Hora en la que se le dio solución a la falla, en el caso que la falla se haya solucionado posterior a la fecha final del cálculo esta fecha corresponde al último segundo del mes vigente, por ejemplo, si el cálculo del indicador es para el mes de octubre y la falla se solucionó en noviembre este campo será 30/11/2025 23:59:59.
- Tipo de Solución: Corresponde a la categorización de cierre que tenemos en el módulo de Gestión de Eventos y PQRS, esta categorización nos indica si el cierre corresponde a una acción de mantenimiento, si fue una solución remota, si fue una solución mediante soporte telefónico, etc. Por

ejemplo, si la solución se dio mediante la configuración del equipo de forma remota, el tipo de solución será "Configuración de Equipo".

- Fuente: Corresponde al mecanismo usado por el usuario para manifestar el evento o la falla, este mecanismo también puede ser automático, los valores que podemos encontrar son: Llamada telefónica, correo electrónico, centro de gestión (Automática), chatbot, visita de mantenimiento, interventoría, correo.

- Otra fuente que proveerá entradas para el sistema de información es la fuente que entrega los datos de mantenimientos preventivos programados y aprobados por la interventoría, esta información se usará para descartar fallas que se presenten durante las ventanas de mantenimiento solicitadas.

Sistema de Gestión de Red: El sistema de Gestión de Red creará un ticket en el sistema de Información cuando detecta una falla que afecte masivamente la prestación del servicio de transporte de datos en las instituciones educativas.

- PERIODO DE MEDICIÓN

La medición de este indicador se realizará mensualmente desde las 00:00:00 del primer día calendario del mes hasta las 23:59:59 del último día calendario del mismo mes y se deberá iniciar a partir del día hábil siguiente al recibo de la comunicación de aprobación de la meta uno (1) emitida por parte de la interventoría y/o supervisión.

- ENTREGABLE

El indicador de Disponibilidad Promedio de Red se entregará en un reporte de servicios con la siguiente información:

- Disponibilidad.
- Fallas reportadas durante el mes.
- Fecha y hora de falla.
- Tipo de falla.
- Duración de Falla.
- Número de Ticket (número de incidente).
- Información de mantenimientos preventivos y correctivos.
- Fecha de inicio de mantenimiento.
- Fecha de din de mantenimiento.
- Aprobador de mantenimiento.
- Identificador de las fallas que son imputables al Ejecutor y cuales no, esta información será usada para realizar seguimiento y tratar de disminuir las fallas que no son imputables.

- CÁLCULO DEL INDICADOR

- Del sistema de Información se tomarán todas las fallas relacionadas que generen indisponibilidad en el servicio de transferencia de datos en donde el periodo de cobertura de la falla afecte el periodo de cobertura del indicador.
- Se clasificarán las fallas en imputables al Ejecutor o no, las que no sean por causas imputables al Ejecutor se descartarán del cálculo.
- Se deberá determinar el tiempo de indisponibilidad, tomando en cuenta que la máxima indisponibilidad de la red en un instante de tiempo es el 100%. Por tal razón cuando dos fallas se presenten de forma simultánea solo se deberá tener en cuenta la afectación de una única falla, es decir, el tiempo total hasta el restablecimiento del servicio.
- Se determinarán los tiempos de mantenimiento preventivo y periodos de falla por causas no imputables al Ejecutor. Si se encuentran eventos de este tipo en el mismo instante de tiempo de una falla esta falla no se tendrá en cuenta como indisponibilidad.
- Se determinará el tiempo máximo de disponibilidad que deba tener la red en Operación formal para el mes de cálculo (TA).
- Se calculará el indicador de disponibilidad promedio departamental de red de acceso, con la siguiente ecuación:

$$DPDRA = (1 - \frac{\sum Fallas\ Red\ Asignatario}{TA\ Red\ Asignatario}) * 100\%$$

- INDICADOR DE DISPONIBILIDAD POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA

El indicador de disponibilidad hace referencia al porcentaje de tiempo en el cual el servicio de conectividad debe estar disponible para los usuarios en cada una de las Instituciones Educativas, cumpliendo con la capacidad, funcionalidad y el nivel de servicio.

Muestra
Se tendrán en cuentan todas las Instituciones Educativas Operativas.

Periodo de medición
La medición de este indicador se realizará mensualmente desde las 00:00:00 del primer día calendario del mes hasta las 23:59:59 del último día calendario del mes, con la información contenida en los tickets generados durante el mes para cada una de las Instituciones Educativas.

Herramienta de medición
Para la medición de este indicador se tiene como referencia la información contenida en cada ticket abierto o cerrado, por Institución Educativa Operativa, durante el período de medición.

Cálculo del indicador
Será responsabilidad de la interventoría y/o supervisión, realizar el cálculo del indicador. Para esto descargará del Sistema de Gestión de EL CONTRATISTA, el reporte de Tickets generados durante el periodo comprendido desde

las 00:00:00 del primer día del mes hasta las 23:59:59 del último día del mes. Mediante cualquier software que utilice la interventoría y/o supervisión deberá en forma automática calcular el tiempo indisponible de la siguiente manera:

- Tiempo fuera de servicio o sin disponibilidad en horas para cada Institución Educativa (Suma de cada intervalo de falla) de acuerdo con la información contenida en los tickets de cada Institución Educativa.
- El Indicador se calculará por cada Institución Educativa.
- El indicador se cumplirá de acuerdo con lo establecido en el presente anexo técnico
- La disponibilidad será medida mensualmente.

La ecuación por usar será la siguiente:

$$DIE = [1 - \frac{\sum TF]}{h \, x \, d)}$$

Donde

- DIE: Disponibilidad del Servicio en la Institución Educativa operativa.
- TF (Tiempo de Falla): Tiempo en el cual el servicio no estuvo disponible en cada Institución Educativa operativa, medido en horas de acuerdo con la información contenida en el reporte tickets cerrados en el periodo de medición y los que se encuentren en estado abierto.
- d: Es el número de días calendario del mes medido.
- h: Será igual a 24 para las Instituciones Educativas que cuentan con energía interconectada a la red.

Criterio de Cumplimiento: El valor mínimo que debe arrojar el cálculo de este indicador, por Institución Educativa, para que se considere como cumplido, debe tomarse así:

- Mínimo noventa y seis por ciento (96%).

El Indicador se considerará cumplido de acuerdo con el siguiente criterio:

El indicador será cumplido cuando por lo menos el noventa y seis por ciento (96%) redondeado al entero superior, de las Instituciones Educativas esté por encima del porcentaje mínimo admisible de disponibilidad.

Es de aclarar que las Instituciones Educativas o los dueños de los sitios donde operarán las Instituciones Educativas no tienen ninguna obligación en colaborar con EL CONTRATISTA en el diagnóstico y solución de fallas, toda vez que la solución de éstas es responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.

Para el cálculo de la disponibilidad se tendrán en cuenta: i) Todas las Instituciones Educativas Operativas; ii) Todos los equipos que afecten la conectividad y/o navegación y que sean de propiedad de EL CONTRATISTA

- VELOCIDAD EFECTIVA MÍNIMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS

De acuerdo con la recomendación establecida en el numeral 5.2.1 del documento ETSI 202 057-4 V1.2.1 (2008-073), la tasa de transmisión de datos se debe definir separadamente para la "bajada" y la "subida" de archivos de prueba entre un sitio remoto web y el equipo de borde ubicado en las Instituciones Educativas.

Muestra
EL CONTRATISTA deberá proporcionar un sistema automático, el cual permitirá programar bajo algoritmos de selección las Instituciones Educativas Operativas y se determinará de acuerdo con lo establecido en el siguiente numeral y el anexo C del documento ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07). En este orden de ideas, se plantea la realización de mediciones que conformarán una muestra mensual.

Todas las Instituciones Educativas son objeto de la muestra, por lo tanto, son susceptibles de ser medidas; esto significa que, independiente de la herramienta de medición, una Institución Educativa podrá ser seleccionada especificamente para realizarle mediciones de Velocidad Efectiva de Transmisión de Datos con resultados que harán parte del indicador.

Características de la medición
Las siguientes son características de las pruebas a realizar:

- Se programa una prueba cada hora sobre una población del mínimo del 20% de los servicios instalados en la totalidad de Instituciones Educativas Operativas (encendidas) de EL CONTRATISTA, para el cálculo de las Velocidades Efectivas de Transmisión de Datos tanto de subida, como de bajada y se propenderá que, al finalizar el día, se hayan lanzado al menos 2 pruebas a la totalidad de las Instituciones Educativas Operativas (encendidas) de EL CONTRATISTA separadas en un lazo de intervalo de tiempo de al menos cuatro (4) horas.
- Se programan pruebas durante diez (10) horas continuas en el horario establecido entre las 7:00 a.m., hasta las 5:00 p.m., de todos los días de la semana (lunes a domingo). Sin perjuicio de lo anterior, la interventoría y/o supervisión podrá requerir mediciones en horarios diferentes a los propuestos en el presente acápite.
- Como producto de las mediciones realizadas se debe obtener toda la información cuyos resultados se agrupan por rango, hora, día y mes.
- En los casos en que para una Institución Educativa Operativa no se hayan realizado las medidas para calcular las velocidades efectivas de transmisión de datos durante cinco (5) días calendario consecutivos, EL CONTRATISTA se obliga a forzar directamente las mediciones que permitan calcular las Velocidades Efectivas de Transmisión de Datos en los siguientes tres (3) días calendario. Si ello no es posible por cualquier circunstancia, el fallo de las mediciones se considera suficiente para la creación o apertura de un ticket al día hábil siguiente de la configuración de este hecho, con el concepto de "medición directa de Velocidad Efectiva de Transmisión de Datos". Este ticket deberá ser atendido y solucionado de acuerdo con los procedimientos establecidos en el indicador de disponibilidad.
- Las pruebas de velocidad de cada uno de los meses de operación deberán estar almacenadas y disponibles para consulta, durante los meses de operación del proyecto y hasta cuatro (4) meses posteriores a la finalización de la etapa de operación y mantenimiento.

Herramienta de medición

EL CONTRATISTA deberá contar con una herramienta que permita realizar la medición del **indicador** de tasa de transmisión de datos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.2.1 del documento técnico expedido por la UIT ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07), o el que lo modifique, derogue o sustituya.

Esta herramienta deberá estar certificada por un organismo certificador que indique que cumple con lo establecido en la norma ETSI y cada uno de los criterios establecidos en el presente documento para realizar la prueba de velocidad. Dicha herramienta y el organismo que la certificará será presentada por EL CONTRATISTA dentro del Informe de Ingeniería y Operación, donde se incluya la información, metodología de medición y características funcionales de la misma, la cual será revisada por la interventoría.

EL CONTRATISTA deberá proveer un servidor que se alojará en sus instalaciones y que deberá contar con todo el licenciamiento y características que cumplan las necesidades de la herramienta de medición desarrollada o adquirida por EL CONTRATISTA, y en el cual se almacenarán todas las pruebas de medición de velocidad y sobre el cual la interventoría y/o supervisión deberá tener los permisos necesarios para poder verificar la integridad de la información y descargar la data almacenada para realizar el cálculo del indicador. Este servidor deberá tener redundancia por cualquier medio (físico o en la nube) del 100% de la información almacenada día a día.

De acuerdo con lo establecido en el documento ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07), con una sola medición se deben obtener los dos registros de la Velocidad Efectiva de Transmisión de Datos tanto para el Descarda (Download) como para carga (Upload) y no se aceptarán mediciones con un solo registro.

La herramienta deberá tener la capacidad bidireccional de medir la Velocidad Efectiva de Transmisión de Datos entre un sitio de acceso remoto Web y el usuario final, que para este caso serán las Instituciones Educativas, de acuerdo con lo establecido en el documento ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07).

La herramienta de medición debe proveer separadamente las estadísticas para calcular las Velocidades Efectivas de Transmisión de Datos de Descarga (Download) y la Velocidades Efectivas de Transmisión de Datos de Carga (Upload).

La Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos[4] de Descarga (Download) y Carga (Upload), se calcularán de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.2 del documento ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07). El cumplimiento se verificará con respecto a las mediciones realizadas a todas las Instituciones Educativas Operativas que conforman la red; sin perjuicio de lo anterior, el cumplimiento del indicador Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos de Descarga (Download) y Carga (Upload) se verificará para cada una de las Instituciones Educativas Operativas del proyecto.

La interventoría y/o supervisión verificará que la herramienta realice las mediciones conforme a la recomendación ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07) y la veracidad de los valores reportados por EL CONTRATISTA.

[4] La definición de la "Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos" es igual a la del indicador "The lowest 5 % of the data transmission rate in kbit/s achieved" definido en el numeral 5.2.3 del documento ETSI

Reporte

El reporte del Indicador de velocidad efectiva de trasmisión de datos deberá ser presentado por EL CONTRATISTA. El informe debe contener:

- **Un archivo digital plano**, como anexo dentro del informe mensual, el cual debe contener la siguiente información.
- Fecha (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) de la medición.
- Identificación de la Institución Educativa (ID Beneficiario, Acto administrativo, Departamento, Municipio, Centro Poblado y Tipo de Institución Educativa, Nombre y código del Establecimiento y de la Sede Educativa. Tipo de Solución.
- Condición encontrada (E=éxito o F=fallida).
- Para las mediciones exitosas:
- Velocidades Efectivas de Transmisión de Datos de Subida (Upload) medidas para la correspondiente Institución Educativa.
- Velocidades Efectivas de Transmisión de Datos de Bajada (Download) medidas para la correspondiente Institución Educativa.
- **Una sección dentro del Capitulo de Indicadores del Informe mensual de Operación**, dentro de los indicadores Velocidad Efectiva de Transmisión de Datos, compuesta por los resultados de las mediciones con la siguiente información:
- Año - Mes del Reporte del Indicador (AAAA-MM).
- Cantidad total de Instituciones Educativas.
- Cantidad total de Instituciones Educativas con la herramienta de medición instalada.
- Cantidad total de Instituciones Educativas a las que se les realizó la prueba en el mes.
- Cantidad de pruebas realizadas en ambos sentidos (Download/Upload).
- Cantidad de pruebas exitosas en ambos sentidos (Download/Upload).
- Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos: Corresponderá al "[...] lowest 5 % of the data transmission rate in kbit/s achieved (5% más bajo de la velocidad de transmisión de datos en kbit/s alcanzado) [...]", de conformidad con lo establecido en el numeral 5.2 de la recomendación ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07). Se deberá reportar en Kbps con cuatro dígitos enteros y dos decimales. El indicador se deberá de reportar por separado para cada uno de los rangos y para los dos sentidos (Download/Upload), y deberá ser calculado por hora durante las quince (15) horas de medición.
- Una sección de resumen de los indicadores con los datos o gráficas que permitan visualizar los comparativos acumulados (hasta un máximo de 6 meses). Se debe incluir el análisis y las observaciones del comportamiento del indicador del mes con respecto al(los) mes(es) anterior(es).

Cálculo del indicador

El cálculo final del indicador lo deberá realizar la interventoría y/o supervisión. Para la medición se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Para la Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos, el cálculo del indicador se realizará de acuerdo con lo siguiente:
- Se subdividirán las muestras del mes guardadas en el servidor alojado en las instalaciones de EL CONTRATISTA en grupos por cada una de las horas de medición diarias, es decir se formarán 10 por cada uno de los tres (3) rangos de velocidad, grupos donde cada uno contendrá todas las muestras tomadas en cada una de las horas objeto de medición de cada uno de los días del mes.

- Se calculará el indicador de Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos por cada uno de los grupos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.2 del documento ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07). Basado en lo anterior se deberán tener 10 resultados de Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos, una por cada grupo.

Criterio de cumplimiento

El indicador de Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos[5] de Descarga (Download) y Carga (Upload), se entenderá que ha sido cumplido cuando 8 de los 10 resultados de Velocidades Efectivas Mínimas de Transmisión de Datos por cada uno de los rangos sean mayores o iguales que las velocidades efectivas mínimas de trasmisión de datos.

- INDICADOR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Se ejecuta de manera presencial en cada Institución Educativa, bajo programación para prevenir fallas o para introducir mejoras en la red. Este tipo de mantenimiento deberá ser avisado a las Instituciones Educativas como mínimo con cinco (5) días hábiles de anticipación y a la interventoría y/o supervisión, se deberá presentar el cronograma de mantenimientos cada año, detallando la cantidad de mantenimientos y su ubicación a realizar por mes; en caso de que haya modificaciones al cronograma deberá ser informado a la interventoría. Para el evento de prevenir fallas en la etapa de operación, el mantenimiento preventivo deberá realizarse por lo menos una (1) vez durante cada año de operación de la Institución Educativa, y su realización será programada por el(los) Ejecutor(s).

En caso de que se realice un mantenimiento correctivo en un periodo inferior a dos meses de tener programado un mantenimiento preventivo, EL CONTRATISTA podrá realizar el mantenimiento preventivo en esa visita.

Cuando se requieran actualizaciones o mejoras en la red de acceso y/o en la red de interconexión que brinda servicio a los Instituciones Educativas, el mantenimiento no podrá realizarse en horarios hábiles y deberán hacerse en horario nocturno, entre las 9:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. En casos excepcionales que se consideren de prioridad manifiesta las acciones de actualización se podrán realizar en horarios diferentes a los anteriormente establecidos previo acuerdo con a la interventoría.

- PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LOS INDICADORES

El procedimiento con el cual se deberá realizar el cálculo de los indicadores es el siguiente:

El cálculo de los indicadores lo deberá realizar la interventoría y/o supervisión con la información reportada por EL CONTRATISTA en los informes mensuales y deberá reportar el resultado durante los cinco (5) días calendario posteriores a la entrega por parte de EL CONTRATISTA del informe mensual.

En caso de que EL CONTRATISTA tenga observaciones sobre el cálculo realizado por la interventoría, deberán ser presentadas durante los cinco (5) días calendario posteriores al recibo del resultado del cálculo remitido por la interventoría. En caso de ser necesario se podrán realizar mesas de trabajo para revisar las observaciones, en estas mesas de trabajo podrá estar presente la interventoría.

La interventoría y/o supervisión contará con tres (3) días calendario después de recibir las observaciones por parte de EL CONTRATISTA, para emitir el concepto final del cumplimiento de los indicadores de calidad establecidos en el presente documento.

- SISTEMA DE GESTIÓN

EL CONTRATISTA deberá implementar un único sistema de gestión centralizado que permita realizar la configuración, monitoreo, detección y corrección de errores de la conectividad a internet implementada en las Instituciones Educativas, dicho sistema debe estar disponible y operativo las 24 horas del día los 7 días a la semana, durante los meses de operación del proyecto. El sistema de gestión deberá responder a las necesidades del Ministerio, teniendo en cuenta los datos, la periodicidad, la calidad, los protocolos, los estándares y mecanismos de intercambio de información que se definen en el presente documento y derivados.

Se deben contemplar los siguientes parámetros y requisitos para el sistema de gestión de todos las Instituciones Educativas a monitorear:

- Integración con herramientas de autenticación AAA (Autenticación, Autorización y Administración de los datos de red) de los equipos instalados por EL CONTRATISTA.
- Supervisión de indicadores de calidad y niveles de servicio en las Instituciones Educativas.
- Acceso a diferentes niveles de acceso de usuarios acorde con los requerimientos operativos.
- Monitorear tráfico, alarmas, fallas y tiempo de recuperación, etc.
- Reporte de incidentes de seguridad.
- Aprovisionamiento (Provisioning) configuración y parametrización de todos los componentes de la red de manera remota, segura y almacenando los parámetros de control.
- Visualización de alertas de redes en tiempo real.
- Como opcional EL CONTRATISTA podrá contar con equipos que tengan control dinámico de potencia bajo demanda.
- Administración: RFC 1155-1157 SNMP V1, SNMP V2c, SNMP V3.
- Mecanismos de gestión: Interfaz de línea de comando o HTTP(S) basado en la Web o Telnet. Soporte seguridad o SSH.
- Monitoreo del estado de la conexión, de la utilización, disponibilidad, consumos y estadísticas.
- Proveer estadísticas de uso del Internet, sitios visitados, sitios bloqueados por los filtros de contenido e intentos sin categoría.
- El sistema de gestión debe permitir visualizar el tipo de conexión suministrado para la Institución Educativa.
- Incluir reportes de posibles incidentes que se lleguen a presentar en la red.
- Toda la información que pueda medir el sistema de gestión debe poder ser reportada por el sistema de gestión.

Adicionalmente el sistema debe generar las siguientes alarmas:

- Instituciones Educativas sin tráfico de usuario.
- Fallas masivas de sitios.
- Sitios con bajo consumo.

- Sitios que no cumplan con los umbrales de las pruebas de velocidad.

Nota: Las alarmas generarán un Log el cual no podrá ser borrado o modificado por un periodo de treinta (30) días, cada LOG debe almacenarse en un archivo independiente por un periodo de doce (12) meses, la interventoría y/o supervisión tendrá acceso a dichos archivos para consulta, en el periodo anteriormente indicado. Además, EL CONTRATISTA deberá incluir todas las licencias de uso necesarias y que sean pertinentes para el buen funcionamiento de la conectividad hasta la finalización de la fase de operación.

- OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS A CARGO DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA deberá entregar a la interventoría o supervisión para su aprobación los informes que se describen en el presente numeral.

- PRESENTACIÓN DE INFORMES
- INFORME MENSUAL

Hasta la finalización del plazo de ejecución del convenio, se deberá presentar un informe mensual con fecha de corte al último día calendario de cada mes, comenzando a partir de la suscripción del acta de inicio. El informe deberá entregarse a la interventoría y supervisión en formato físico y digital durante los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a la fecha de corte, con copia digital a la supervisión del convenio.

El informe debe ser claro y conciso. Además, si es necesario, se deberá incluir cualquier información adicional solicitada por la interventoría y/o la supervisión del contrato.

El informe deberá incluir como mínimo:

- Informe por actividades respecto a las obligaciones del convenio.
- Resumen ejecutivo sobre el estado de avance del convenio
- Actividades realizadas de acuerdo con los hitos del cronograma de ejecución contractual que correspondan al periodo del reporte
- Avances de las metas de planeación, instalación y operación de hogares beneficiados.
- Ejecución presupuestal.
- Indicadores del convenio
- Reporte de comercialización durante la fase de operación.
- Gestión de riesgos del convenio.
- Medición y resultado de los indicadores de calidad y niveles de servicio.
- Estadísticas de PQRS (si los hay): Registrados vs atendidos, no atendidos en tiempos de respuesta, etc.

- Las lecciones aprendidas, principales casos de éxito y las principales dificultades encontradas durante la ejecución del convenio y las recomendaciones para mitigar las mismas en el siguiente periodo
- Cantidad de hogares beneficiarios que hayan estado por fuera del servicio en un tiempo mayor a 12 horas, las causas de dichas indisponibilidades, así como el plan de recuperación del servicio por cada una.
- Reporte del mantenimiento preventivo y correctivo.

Reporte del Sistema de Gestión:

- Número de hogares beneficiados.
- Medición del consumo de ancho de banda.
- Reporte de fallas total.
- Registro de conexiones por periodo de tiempo (mes), horario de mayor concurrencia,
- Días de mayor consumo.
- Información del estado de la red

El interventor revisará el informe mensual y tendrá hasta diez (10) días hábiles, contados a partir de su recepción, para efectuar las revisiones y emitir la aprobación correspondiente. Si se encuentran inconsistencias o datos incompletos, se requerirá realizar los ajustes necesarios, otorgándole una única oportunidad para hacerlo sin aplicar sanciones. Los ajustes deberán completarse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la solicitud de la interventoría o supervisión.

Si, al finalizar el plazo para corregir observaciones, no se han ajustado los documentos conforme a los requisitos o si la interventoría o supervisión no aprueba totalmente los documentos, la entidad procederá a aplicar las sanciones recomendadas por la interventoría o supervisión hasta que se obtenga la aprobación total del documento.
Una vez aprobado el informe mensual, el Cooperante deberá presentar a la supervisión del convenio una copia del informe aprobado y la comunicación correspondiente de la interventoría o supervisión que evidencie dicho cumplimiento.

Nota: La supervisión podrá solicitar en cualquier momento durante la ejecución del convenio un informe específico sobre las actividades relacionadas con el desarrollo del convenio.

Además del informe mensual, el Cooperante deberá diligenciar mensualmente un formato que el supervisor del convenio proporcionará dentro de los primeros cinco (5) días hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio. Este formato deberá detallar las actividades y gestiones realizadas en el marco del convenio.

- INFORME FINAL

Con fecha de corte al último día de operación del convenio, el Cooperante deberá entregar un informe final dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes. Este informe deberá presentarse a la interventoría en formato digital y físico, y a la supervisión del convenio solo en formato digital. El informe debe incluir información cronológica consolidada de las principales etapas del convenio, detalles históricos sobre su ejecución, lecciones aprendidas, principales casos de éxito, dificultades encontradas y recomendaciones para mitigar estas dificultades en futuros convenios.

También deberá incluir un listado de los usuarios de los hogares beneficiados que continuarán con el servicio por su cuenta al finalizar el convenio, segregado por zona rural/urbana de cada municipio.

El Interventor tendrá hasta cinco (5) días hábiles, contados a partir de la recepción del informe final, para revisarlo y emitir la aprobación correspondiente. Si se encuentran inconsistencias o datos incompletos, se requerirá al Cooperante que realice los ajustes necesarios en un plazo máximo de tres (3) días hábiles. Si, tras este plazo, la interventoría o supervisión no aprueba completamente el informe por causas imputables al Cooperante o a su delegado, se podrán aplicar sanciones hasta lograr la aprobación total del documento.

NOTA: Todos los informes que se indican en el presente anexo y los que la interventoría/supervisión solicite deben radicarse a la interventoría en formato físico y Digital y entregar copia digital a la supervisión

- INFORME ESPECÍFICO DE REDES DE ACCESO Y HOGARES FUERA DE SERVICIO

El Cooperante deberá mantener actualizada la información sobre la cantidad de redes de acceso y hogares que están por fuera del servicio por un tiempo mayor a 12 horas indicando el tiempo acumulado de afectación del servicio, con su correspondiente identificación, con el fin de que la supervisión y/o interventoria pueda realizar el seguimiento. Esta información deberá actualizarse, semanalmente, con corte al viernes de cada semana.

- INFORMES ADICIONALES

Adicional a los reportes e informes a los cuales se hace referencia en el presente numeral, el Cooperante deberá presentar la información que sea solicitada por parte de la supervisión y/o interventoría, en un tiempo no mayor a cinco
(5) días hábiles contados a partir del recibo de la solicitud.

La supervisión y/o interventoría, contará con un plazo de cinco (5) días hábiles para realizar observaciones a los informes presentados. En caso de que persistan observaciones a los informes presentados, el Cooperante tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para realizar los ajustes requeridos.

- GERENCIA OPERATIVA DEL PROYECTO

Para la adecuada ejecución del presente contrato, EL DEPARTAMENTO vinculará mínimo dos (2) profesionales con dedicación del 100% quienes deberán encargarse de la Gerencia Integral del proyecto y del liderazgo de la instalación de los hogares beneficiados, quienes atenderán los requerimientos generales del convenio frente a la supervisión o interventoría. El Gerente del proyecto, será la persona encargada por parte de EL DEPARTAMENTO, de acompañar, coordinar y liderar integralmente la ejecución del proyecto, será el principal canal de comunicación y coordinación entre EL CONTRATISTA, EL DEPARTAMENTO, EL INTERVENTOR y/o EL SUPERVISOR. El Gerente presentará y sustentará de datos e informes de ejecución integral ante EL DEPARTAMENTO, LA INTERVENTORÍA, el Comité operativo, los encargados del seguimiento y demás actores del proyecto, así como al FONDO ÚNICO TIC, en el caso en que le fuere solicitado. Todo ello, a través

de herramientas de gerencia de proyectos que permitan conocer el avance y estado del contrato y en general del proyecto.

En cualquier caso, el Gerente del Proyecto, está obligado a asistir a las reuniones que sean programadas en cualquier momento por EL DEPARTAMENTO, LA INTERVENTORÍA y/o SUPERVISIÓN, EL FONDO ÚNICO TIC- FUTIC. En el evento en que el gerente del proyecto no pueda asistir a las reuniones por causas debidamente justificadas, EL Gobernador de EL DEPARTAMENTO o su delgado, deberá designar un suplente que cuente con las mismas competencias del gerente del proyecto.

EL DEPARTAMENTO, a través del gobernador o de su delegado, designará al Gerente del Proyecto y dicha designación será informada a EL CONTRATISTA. La designación señalada se efectuará con amplias facultades al gerente del proyecto para que este tome decisiones y esté en capacidad de obligarse en nombre del del proyecto.

El gerente operativo del proyecto tendrá el siguiente perfil:

- Profesional en las áreas de Ingeniería de telecomunicaciones/electrónica o afines con especialización en gerencia de proyectos o Certificación PMP Vigente.
- Experiencia de más de 5 años liderando proyectos y/o como asesor, y/o estructurador de proyectos, y de los cuales al menos 1 año debe tener experiencia en procesos estratégicos de transformación digital.

El Lider técnico de instalación de hogares, será designado por EL DEPARTAMENTO. Será el responsable de sustentar técnicamente a la interventoría y/o la supervisión los aspectos de esta naturaleza de la ejecución del convenio y deberá contar con el siguiente perfil:

Profesional en las áreas de Ingeniería de telecomunicaciones/sistemas/electrónica o afines con especialización en tecnología o gerencia de proyectos.

- Experiencia de más de 3 años como líder técnico de proyectos de tecnología, de despliegue de infraestructura tecnológica o de conectividad hogares.
- Si por cualquier circunstancia, fuerza mayor o caso fortuito surja la necesidad de remplazar al gerente del proyecto o al líder técnico de instalación de hogares, EL DEPARTAMENTO garantizará que nuevo integrante debe cumplir las mismas condiciones mínimas del trabajador inicial.

- REPOSITORIO DE INFORMACIÓN

Durante los primeros 10 días hábiles de ejecución del contrato, contados a partir del acta de inicio, la supervisión y/o interventoría y el Cooperante deberán acordar los campos mínimos de registro que debe proporcionar el repositorio, y los mecanismos de acceso respectivos, para facilitar el seguimiento del proyecto. La supervisión y/o interventoría, deberá conocer el resultado de lo acordado durante los 5 siguientes días hábiles y tendrá hasta 5 días hábiles para emitir aprobación, y podrá requerir ajustes de considerarlo necesario, caso en el cual la supervisión y/o interventoría y el Cooperante tendrán hasta 5 días hábiles a partir del recibo de la comunicación para llevar a cabo las modificaciones.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La supervisión y/o interventoría, en caso de considerarlo necesario podrán solicitar la creación e implementación de otro (s) módulos que faciliten la gestión de la información requerida para el correcto seguimiento, control, gestión y vigilancia de la ejecución del Contrato. El Cooperante tendrá hasta cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la comunicación para llevar a cabo las modificaciones.

El Cooperante deberá tener implementado el repositorio con los módulos antes señalados durante los (10) días calendario contados a partir de la aprobación de la supervisión y/o interventoría y deberá informar a la supervisión y/o interventoría, dentro de ese plazo para que esta realice la verificación de los módulos e información que debe reposar en los mismos, para lo cual la supervisión y/o interventoría, contara con cinco (05) días calendario y en caso de existir observaciones por parte de la supervisión y/o interventoría, las remitirá al Cooperante quien deberá subsanarlas en un término no mayor de tres (03) días calendario contados a partir del recibo de las observaciones. En caso de persistir las observaciones o no haber remitido subsanación alguna, la supervisión y/o interventoría, emitirá el concepto de no aprobación del repositorio, y en consecuencia deberá recomendar a la Entidad iniciar el procedimiento administrativo correspondiente para la aplicación de las multas a que haya lugar al Cooperante hasta el cumplimiento de la obligación contractual, conforme a la normatividad vigente y lo señalado en los documentos contractuales.

El Cooperante tiene la obligación de que el repositorio debe estar disponible en línea 24/7, con el fin de poder realizar el control, seguimiento y verificación continuo de todas las obligaciones contractuales.

Nota: El Cooperante deberá considerar que el repositorio debe contar con la información necesaria que dé cuenta del real estado tanto de las obligaciones contractuales como del Proyecto para las dos iniciativas.

Una vez finalizado el plazo de ejecución, el Cooperante deberá entregar toda la información de manera digital contenida en el Repositorio de Información.

La supervisión y/o interventoría definirá los formatos y/o estructura de presentación de la información a cargar.

- INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA RED DE ACCESO IMPLEMENTADA EN LA JUNTA DE INTERNET – COMUNIDAD DE CONECTIVIDAD.

Con relación a las redes de acceso implementadas en las Juntas de Internet – Comunidades de conectividad (JI-CDC), se requiere que el repositorio contenga toda la información, documentos, reportes, solicitudes y aprobaciones que se generen en cada una de las etapas del proyecto, así:

- Etapa de Planeación (Ver numeral 5.1 de este Anexo)
- etapa de Instalación de la Red de Acceso (Ver numeral 5.2 de este Anexo)
- Etapa De Operación y Mantenimiento (Ver numeral 5.3 de este Anexo)
- Etapa de Capacitación (Ver numeral 5.4 de este Anexo)
- Información adicional que pueda ser almacenada sobre la red de acceso que sea relevante para el proyecto y de acuerdo a lo requerido por la supervisión y/o interventoría.
-

- INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS HOGARES A CONECTAR EN LAS JUNTAS DE INTERNET

Con relación a los hogares a conectar en las Juntas de internet – Comunidades de conectividad (JI-CDC), se enumeran los hitos mínimos que deberán estar en el Repositorio de Información, así:

a) Información de suscriptores (hogares conectados) con los siguientes campos mínimos:
   - Id Cuenta
   - Estado del servicio (, suspendidos, etc.), para los suscriptores (activos, inactivos, suspendidos, etc.)
   - Nombre
   - Apellido
   - Tipo Documento
   - No. Documento
   - Teléfono
   - Celular
   - Correo electrónico
   - Fecha Inicio Operación
   - Fecha Fin Operación
   - Código DANE Departamento
   - Departamento
   - Código DANE Municipio
   - Municipio
   - Dirección
   - Georeferenciación (Coordenadas geográficas)
   - Barrio o vereda (si aplica)

b) Sustituciones de suscriptores en el mismo predio.
c) Copia del documento de identidad del Usuario;
d) Copia del contrato entre la Juntas de internet – Comunidades de conectividad (JI-CDC) y el hogar (si aplica)
e) Foto de la fachada del predio del Usuario, en la que aparezca legible la nomenclatura de la dirección. En caso de que el predio no cuente con nomenclatura, se debe colocar para la toma de la foto una cartulina al lado de la puerta del predio con las indicaciones claras de su ubicación, que comúnmente están registradas en los recibos de servicios públicos de energía o de agua del predio y/o las coordenadas geográficas que inserta automáticamente el terminal móvil.
f) Fotografía del pantallazo de la prueba de velocidad realizada al momento de la instalación del servicio para acreditar el cumplimiento de las especificaciones del servicio de Internet de banda ancha;
g) Fotografía que permita identificar el número serial de los equipos instalados para dar la conectividad a internet al hogar.
h) Información adicional que pueda ser almacenada sobre la prestación del servicio que sea relevante para el proyecto y de acuerdo con lo requerido por la supervisión y/o interventoría.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- COMITÉ OPERATIVO

Para la adecuada ejecución, se creará un Comité Operativo, que actuará como máximo órgano de decisión y de dirección del proyecto. Dicho Comité estará integrado así: i) El Supervisor de EL DEPARTAMENTO, o el gerente operativo del proyecto; ii) El director de infraestructura del Ministerio TIC o a quien este delegue; iii) delegado del Fondo Único de TIC y iv) Un delegado de la interventoria y/o la supervisión. Podrán asistir invitados, y miembros del equipo de apoyo.

El comité establecerá un reglamento para plasmar de forma expresa las reglas que permitan a sus miembros discutir sobre los aspectos relevantes de la ejecución del proyecto. El comité tendrá por finalidad, realizar la dirección y el seguimiento a la adecuada ejecución del proyecto, y vigilar la correcta ejecución del del proyecto. Asimismo, establecerá el responsable de ejercer la secretaria técnica.

El Comité Operativo deberá reunirse ordinariamente, de manera presencial (preferente) o virtual, al menos una vez al mes, desde la firma del Convenio, y podrá hacerlo de manera extraordinaria cuando se estime conveniente.

En ningún caso, el comité operativo podrá introducir modificaciones al Contrato que apruebe el proyecto.

- REGLAS PARA EL USO DE LOS RECURSOS

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir las disposiciones y condiciones establecidas en la forma de pago y el anexo denominado ANEXO PROYECCIÓN DE GASTOS POR PRODUCTO, para la ejecución del proyecto en el Contrato. Por tal motivo los recursos autorizados por la supervisión y/o interventoría sólo podrán ser utilizados para los fines que se establezcan para el proyecto.

- COMUNICACIONES

Todos los comunicados, solicitudes, oficios enviados por la Entidad Contratante o la interventoria o supervisión, deberán contestarlos y atendidos por el Cooperante en un término máximo de cinco (5) días hábiles desde la recepción de la respectiva comunicación. Así mismo el Cooperante tiene la obligación de facilitar la información necesaria que requiera la interventoria/supervisión para dar respuesta oportuna, ajustada y pertinente a las diferentes PQRS o solicitudes que se requieran atender.

- GESTIÓN DOCUMENTAL

El Cooperante, o la persona designada para tal fin, deberá mantener un archivo ordenado y cronológico que cumpla con los estándares mínimos establecidos por la normativa vigente en gestión documental. Este archivo deberá estar disponible para la interventoría o supervisión del convenio cuando sea requerido. Los estándares de calidad incluyen, al menos, la aplicación sistemática de criterios para el registro, clasificación, seguridad y almacenamiento o conservación de la información generada durante la ejecución del convenio, tanto en formato físico como digital, garantizando así la calidad y fiabilidad de la información necesaria para su consulta.

- CUMPLIMIENTO A NORMAS DE MEDIO AMBIENTE

EL DEPARTAMENTO, a través del interventor deberá corroborar y garantizar que EL CONTRATISTA cumpla con el protocolo o plan integral de manejo de residuos (convencionales, peligrosos y/o especiales) previa intervención con el cual se garantice el manejo adecuado y la disposición final de los residuos que se generen durante la ejecución del contrato. Adicionalmente, deberá presentar, según aplique, los permisos para su generación, almacenamiento, transporte y disposición final, así como los certificados de disposición final o aprovechamiento, los cuales deberán ser emitidos por gestores debidamente autorizados, dando cumplimiento a las normas ambientales establecidas en el Decreto 4741 de 2005, Decreto 1076 de 2015 y Resolución 1188 de 2003, expedida por el DAMA, y demás normas que la modifiquen, complementen o adicionen; durante todo el plazo de ejecución del convenio y deberán realizar la correspondiente disposición final de los elementos conforme a lo prescrito en la legislación.

- PLAN DE SOSTENIBILIDAD

Entregar al supervisor del Ministerio TIC con mínimo 3 meses de anterioridad a la finalización del OPEX del convenio, un plan de sostenibilidad de los bienes y servicios objetos del mismo, en donde se presente la alternativa de sostenibilidad financiera, técnica, ambiental y jurídica del proyecto con su esquema de operación una vez finalizado la operación con recursos del convenio, para ser revisado y aprobado por el supervisor.

- ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA JUNTA DE INTERNET – COMUNIDAD DE CONECTIVIDAD

EL CONTRATISTA deberá garantizar que su(s) subcontratista(s) seleccionado(s) para cada región, desarrollen las siguientes etapas:

- ETAPA DE PLANEACIÓN

EL CONTRATISTA deberá diseñar una solución de acceso utilizando tecnología punto multipunto que responda a los requisitos y necesidades definidas en el objeto y alcance de la presente convocatoria.

EL CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos técnicos para garantizar el diseño, instalación y operación óptimos de la red residencial inalámbrica ofertada, mediante tecnologías Fixed Wireless Access (FWA) redes inalámbricas tipo punto multi punto en bandas no licenciadas. Los entregables incluyen desde los estudios preliminares hasta el dimensionamiento y selección de los componentes constitutivos de la red de acceso.

Las especificaciones descritas son parte integral de la presente convocatoria y de la Minuta del Contrato en caso de adjudicación. Para ítems no especificados, aplicarán las normativas de organismos como ITU-T, IEC, IEEE, ETSI, ANSI, TIA, IETF, entre otros.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Requisitos clave:

- Manejo eficiente del ancho de banda.
- Flexibilidad en la multiplexación y agregación de tráfico.
- Sostenibilidad y evolución en la infraestructura de red.
- Eficiencia operativa y escalabilidad.
- Alta confiabilidad, protección y restauración del sistema.
- Gestión ágil y transparente extremo a extremo.

En todo caso, EL CONTRATISTA deberá presentar tanto el diseño en la tecnología FWA punto multipunto, según lo establecido en los documentos del presente proceso, como el diseño de la alternativa propuesta, la cual deberá cumplir con la totalidad de condiciones establecidas en los documentos del presente proceso, en lo que le aplique y, deberá ser adicionada en aquellas condiciones y especificaciones propias de la solución FTTH. La Interventoria y/o supervisión realizarán el análisis de la propuesta.

- ESTUDIO DE CAMPO (SITE SURVEY)

EL CONTRATISTA realizará un análisis completo del área de despliegue para identificar las condiciones fisicas, de infraestructura y de cobertura necesarias, tanto para redes basadas en fibra como inalámbricas.

Objetivos del Site Survey

- Evaluar viabilidad de conectividad y puntos de acceso.
- Identificar ubicación de puntos de conexión de fibra y/o estaciones inalámbricas.
- Definir rutas óptimas y posibles obstáculos.
- Determinar la ubicación del Headend o centro de cabecera.

Entregable del site survey

- Un informe detallado del site survey con planos y documentación del análisis.
- Condiciones topográficas y dispersión de hogares
- Infraestructura existente (postes, torres, mástiles etc.)
- RF survey (indicando el piso de ruido electromagnético de la Zona y análisis de SNR), cableado, última milla, energía eléctrica etc.
- Viabilidad de conectividad y puntos de acceso.
- Identificación de ubicación de puntos de conexión de fibra y/o estaciones inalámbricas.
- Definición de rutas óptimas y posibles obstáculos.
- Determinación de la ubicación del Headend o centro de cabecera.
- Determinación de la ubicación de los hogares a conectar.
- Diseño de Bajo Nivel (Low-Level Design - LLD)
- EL CONTRATISTA desarrollará un diseño técnico detallado para la instalación, configuración y operación de la solución, considerando los requisitos de redes FWA redes inalámbricas tipo punto multi punto en bandas no licenciadas.

Requisitos del diseño de bajo nivel

- Topología de red y arquitectura detallada.

- KMZ en el que se identifique la ubicación de los AP, la zona de cobertura de la red de acceso y los hogares a conectar de la Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC).
- Simulación de cobertura garantizando en el que se evidencie el nivel de señal mínimo requerido para los hogares a conectar.
- Especificaciones de las torres y/o mástiles y normativa a cumplir de acuerdo con su altura (luces de obstrucción, pararrayos, protecciones eléctricas, sistemas de puesta a tierra, etc., según normativa de Aeronáutica Civil) .
- Resultado del análisis de espectro de la zona a cubrir.
- Especificación de componentes (antenas, switches, cableados, etc.).
- Configuración de políticas de QoS y gestión de ancho de banda
- Entregable del diseño de bajo nivel y cronograma detallado de instalación
- Planos de red, esquemas de conexión y documentación técnica del diseño.
- Cronograma detallado de instalación (MS Project, con copia en Excel) y puesta en servicio, acorde con el cronograma general, el cual incluye el plan de instalación y activación de la conectividad a internet de los hogares de la Junta.

Lista de Materiales (BOM - Bill of Materials)

- EL CONTRATISTA deberá documentar todos los materiales necesarios para implementar la red, especificando componentes para soluciones FWA.
- Requisitos de la lista de materiales
- Detalle de equipos (antenas, switches, etc.), equipos pasivos con especificaciones técnicas.
- Cantidades, modelos, proveedores sugeridos y costos estimados.
- Materiales para instalación, como racks, cableados y soportes.
- Entregable de lista de materiales
- BOM detallado con estimaciones de costos y especificaciones técnicas. El BOM debe incluir, adicional a los elementos componentes de la red de acceso, la entrega de un stock de repuestos para la red de acceso que permita garantizar la continuidad del servicio, al menos por dos años contados a partir del inicio de la operación y, un stock de equipos de usuarios (CPE, routers), equivalente al 10% de la cantidad de hogares a conectar en la Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC)., según se relaciona en el Anexo 1. EL CONTRATISTA deberá redondear el número resultante al entero inmediatamente superior.

Plan de Mantenimiento

EL CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Mantenimiento que deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

1) Descripción del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, en el cual se detallen las actividades a realizar.
   - Mantenimiento Preventivo: se ejecuta bajo programación para prevenir fallas o para introducir mejoras en la red, este se dará una vez cada 6 meses
   - Mantenimiento Correctivo: es aquel que se ejecuta una vez se presenten fallas en la etapa de operación del proyecto que afecten de manera parcial o total el servicio.
2) Esquema de atención y soporte técnico, especificando niveles y tiempos de escalamiento y prioridades.
3) Deberá especificarse el mantenimiento a aspectos de seguridad como configuraciones y filtros de navegación de acuerdo con los establecidos en el presente documento y política de seguridad física.

Plan de Formación

EL CONTRATISTA deberá presentar el Plan de Formación con el contenido mínimo establecido en el presente anexo técnico.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Aprobación de los documentos de Planeación
Los documentos de Planeación deberán ser presentados a la supervisión y/o interventoría, en medio físico y digital, en medio digital a través del portal de radicación de MINTIC.GOV.CO., https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Informes-de-PQRSD/125804:Registro-PQRSD

La revisión, verificación de cumplimiento y contenido de cada uno de los documentos de planeación, se adelantará por parte de la supervisión y/o interventoría en un plazo máximo de 5 días hábiles después de la presentación de estos, plazo en el cual se podrá solicitar al Ejecutor la información que considere necesaria.

Asimismo, cualquier solicitud de modificación que se realice a los Documentos de Planeación durante la ejecución del proyecto, deberá ser presentada a la supervisión y/o interventoría, en un plazo máximo de 5 días hábiles.

- ETAPA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO

- APROBACIÓN PARA INICIAR EL PROCESO DE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO

Para la aprobación del inicio del proceso de instalación de la red de acceso, EL CONTRATISTA deberá coordinar con la interventoría y/o supervisión, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, el modelo de validación de la correcta instalación y funcionamiento de la red de acceso y el Protocolo de Pruebas para su recepción establecido por la supervisión y/o interventoría.

Así mismo y con el fin de que la interventoría y/o supervisión pueda realizar la programación de las diferentes actividades, EL CONTRATISTA deberá acordar el cronograma específico de las diferentes actividades contempladas en el proceso de instalación: **a)** aprobación de la instalación, **b)** instalación de la infraestructura de red de acceso y conexión de hogares **c)** Notificación de la instalación, **d)** Verificación remota[5] **e)** Visita de Campo y pruebas de aceptación.

El plazo de instalación de la red de acceso de cada Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) es de hasta tres meses, contados a partir de que la supervisión y/o interventoría realice la ***aprobación para el inicio de la instalación de la red de acceso,*** periodo durante el cual EL CONTRATISTA debe realizar la conexión de los hogares de la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) y la activación de la conectividad a internet. Al final de los tres (3) meses deben estar conectados y activados la totalidad de los hogares de la Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC).

- INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ACCESO

EL CONTRATISTA deberá incluir los servicios de instalación, configuración, y puesta en marcha para todos los componentes de hardware y software que hagan parte de la red de acceso propuesta.

[5] La verificación remota tiene como objeto verificar el estado real de la instalación y adelantar la coordinación con los diferentes actores para garantizar la efectividad de la visita de campo, con el fin de evitar que la visita de campo sea fallida, ya que en el caso de que esto ocurra, los costos de la revisita serán a cargo del EL CONTRATISTA.

Los componentes físicos de la red de acceso deberán instalarse en cada una de las Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) que le sean adjudicadas. Esta instalación e implementación deberá cumplir con todas las Normas, Estándares, Recomendaciones y especificaciones vigentes de la industria a nivel nacional como a nivel internacional (ITU-T, ETSI, EIA, etc.), así como las especificaciones y requisitos contemplados en este Anexo Técnico, que garanticen el correcto funcionamiento y operación de los equipos de manera adecuada y segura para cada Junta de INTERNET dentro del alcance del presente proceso.

El detalle asociado al cumplimiento de las Normas y Estándares, junto con el plano de instalación, deberá ser presentado a la supervisión y/ o interventoría por EL CONTRATISTA seleccionado.

La instalación, cableado, implementación, comisionamiento, configuración, pruebas, puesta en servicio de toda la solución end to end deberá ser realizada por EL CONTRATISTA, quien deberá contar con todos los medios humanos, logísticos, herramientas, instrumentos analizadores de redes, equipos o instrumentos de medida y ensayo apropiados, materiales y medios de transporte necesarios, entre otros, que permitan cumplir con el objeto, alcance y plazos de entrega comprometidos.

NOTA 1: Solución end to end entiéndase todo el trayecto desde el origen hasta el destino (Usuario Final – Hogar de la Junta de INTERNET) sin interrupciones en el nivel de servicio.

- CONEXIÓN DE HOGARES Y ACTIVACIÓN DE LA CONECTIVIDAD EN LOS HOGARES

La conexión de los hogares en cada Junta de INTERNET y la activación de la conectividad a INTERNET se inicia a partir de que la supervisión y/o interventoría emiten el concepto de aprobación para el inicio de la instalación de la red de acceso.

A continuación, se definen las condiciones establecidas para llevar a cabo la instalación y activación de la conectividad de los accesos a Internet fijo en los hogares de las Juntas de INTERNET, materia de esta convocatoria.

- CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

EL CONTRATISTA seleccionado deberá presentar, el cronograma de conexión de hogares, en el cual se establezca la cantidad de hogares a conectar durante la etapa de instalación, garantizando que la totalidad de la meta de hogares instalados en la Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) se realice en las condiciones técnicas y de calidad establecidas para el proyecto.

EL CONTRATISTA debe incluir todos los componentes, módulos, accesorios, software, licenciamiento, suscripciones y cualquier otro elemento adicional que se requiera para la entrega, instalación, configuración y puesta en operación de los equipos a suministrar.

EL CONTRATISTA debe garantizar que los suministros y equipos a instalar deben ser nuevos, no se aceptan equipos tipo "refurbished", remanufacturados o clones.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Los costos asociados a la sustitución de hogares en las Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) estarán a cargo de estas.

- CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE USUARIO

Los equipos de usuario, instalados en los hogares, deberán tener un correcto y estable funcionamiento y conectividad, y cumplir todas las especificaciones exigidas bajo las condiciones técnicas de operación recomendadas por el fabricante.

EL CONTRATISTA será responsable de que todas aquellas unidades que resultaren de mala calidad o con defectos de diseño y/o fabricación, cuyo funcionamiento no sea correcto o no realicen alguna de las funcionalidades o compatibilidades contratadas sean reemplazadas a entera satisfacción.

Se entiende por correcto funcionamiento lo siguiente:

- Que los bienes suministrados ejecuten las funciones que les son propias y para las cuales fueron diseñados, libres de errores o defectos.
- Que los bienes suministrados sean aptos para el servicio para el cual fueron adquiridos y no existan eventuales vicios de diseño, calidad y fabricación, que impidan su óptima utilización y su funcionamiento idóneo y eficaz.
- Que los bienes suministrados cumplan con los requisitos mínimos definidos en este anexo técnico y cumplan con las especificaciones oficiales publicadas por el fabricante.

- PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN

Compras e inventario

La supervisión y/o interventoría realizará el seguimiento continuo a la ejecución, por parte de EL CONTRATISTA, de las actividades contenidas en el Contrato. EL CONTRATISTA deberá mantener actualizada la información de las compras y el inventario de los equipos a instalar en los hogares, en el Repositorio de Información, entendido como espacio centralizado donde se almacena, organiza, mantiene y difunde información digital, al que pueda acceder la Supervisión y/o Interventoría, adicionalmente, deberá remitir a la supervisión y/o interventoría, reportes (digitales) mensual de ejecución, de los avances del plan de compras de equipos y conexión de los hogares , hasta concluir las metas de conexión de hogares.

Por su parte, la Supervisión y/o Interventoría deberá efectuar la revisión y validación de los soportes de las compras, adquisiciones y/o ordenes de pedido, en un plazo de diez (10) días hábiles siguientes al reporte, con lo cual podrá mantener una relación actualizada de las aprobaciones y del inventario de los equipos instalados.

En el Repositorio de Información deberán estar disponibles las copias de los contratos y/o órdenes de compra o pedido, mediante los que EL CONTRATISTA adquiere los equipos a instalar en los hogares (CPE, Routers).

Instalación y puesta en servicio

EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes condiciones durante las actividades de instalación y puesta en servicio:

La tecnología, el diseño y la configuración de los equipos de la red de acceso, serán de libre elección por EL CONTRATISTA, siempre y cuando cumplan con la normatividad vigente, y permitan dar cumplimiento a la adecuada prestación del servicio de Internet, de acuerdo con lo establecido en el presente anexo.

EL CONTRATISTA cuya propuesta sea seleccionada en la presente convocatoria se obliga a:

Operar, mantener y gestionar la infraestructura de acceso para las Juntas de Internet, por un período de seis (6) meses, de tal manera que permitan la prestación del servicio de internet comunitario a sus Asociados, con velocidades mínimas de 25 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida, acorde con la capacidad IP.

Las Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) serán las responsables de:

- Suministrar al Ejecutor el listado de los hogares a instalar, con su correspondiente ubicación.
- Coordinar con los hogares a conectar el día y la hora en que EL CONTRATISTA realizará las actividades de conexión del hogar.
- EL CONTRATISTA deberá incorporar en el Repositorio de Información, al que pueda acceder, vía WEB, la Supervisión y/o Interventoría, los soportes documentales de cada una de las instalaciones realizadas, incluyendo, entre otros:
  - Datos de contacto de la persona que recibe el servicio en el hogar
  - Copia del documento de identidad de la persona que recibe el servicio en el hogar
  - Copia del documento mediante el cual la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) autoriza a un miembro de la comunidad a recibir el servicio en los hogares
  - Copia del documento de recepción del servicio por parte de un delegado autorizado por la Junta de Internet
  - Comunidad de Conectividad (JI-CDC)
  - Foto de la fachada del predio del beneficiario, en la que aparezca legible la nomenclatura de la dirección o las indicaciones que se registran en los recibos de los servicios públicos, y la georeferenciación, que permitan su ubicación clara en el caso de predios sin nomenclatura;
  - Una fotografía o pantallazo como soporte de la prueba de velocidad realizada al momento de la instalación del servicio para acreditar el cumplimiento de las especificaciones del servicio de Internet y calidad del servicio.
  - Una foto que permita identificar el número serial de los equipos (CPE, router) instalados para la prestación del servicio en ese hogar.
  - EL CONTRATISTA deberá mantener actualizada la base de datos de contacto de los hogares, y la fecha en la que se activó el acceso a Internet.
- De acuerdo con el plan de instalación y conexión de los hogares de la Junta, presentado por EL CONTRATISTA seleccionado en la etapa de planeación y las entregas realizadas por EL CONTRATISTA, la Supervisión y/o Interventoría realizará la validación de los hogares conectados reportados para verificar que cumplan con las condiciones de instalación y las condiciones de conectividad a internet, las cuales podrá realizar de forma remota o con visita en campo, para lo cual deberá contar con el acompañamiento de EL CONTRATISTA.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- En el caso en el que la instalación de los hogares conectados que hacen parte de las Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad (JI-CDC) no fuera aprobada por la supervisión y/o interventoría, EL CONTRATISTA podrá subsanar las observaciones que haya realizado la supervisión y/o interventoría en un plazo máximo de 5 días calendario, y las mismas podrán ser verificadas por la supervisión y/o interventoria, mediante visita remota dentro de los 5 días calendario siguientes. La supervisión y/o interventoría contará con los siguientes 5 días calendario para emitir el concepto definitivo de la instalación y puesta en servicio de los hogares conectados que hacen parte de las Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) asignadas al Ejecutor.
- EL CONTRATISTA reportará semanalmente a la supervisión y/o interventoría, vía correo electrónico el avance del cronograma de instalación de la infraestructura de la red de acceso y la conexión de hogares de cada Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) adjudicada, que permita realizar seguimiento y la coordinación de las visitas de aprobación por parte de la supervisión y/o interventoría.

Se aclara, que en el caso eventual de que la meta de hogares a conectar en cada Junta, no se alcance a cumplir al final del período planeado para tal fin, por motivos de falta de interés de los asociados a las Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC), EL CONTRATISTA seleccionado mantendrá almacenados y debidamente resguardados los CPE, routers y accesorios no utilizados, para eventualmente ser utilizados en futuras ampliaciones de las Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC).

- NOTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO

Dentro del proceso de recibo y aprobación de la red de acceso de cada Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC), se realizan las siguientes actividades:

- Notificación por parte de EL CONTRATISTA a la supervisión y/o interventoría, informando la finalización de la instalación de la red de acceso de cada Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC).
- Verificación por parte de la supervisión y/o interventoría de los soportes que evidencien la Instalación de red de acceso de cada Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC).
- Programación de Verificaciones Remotas y Visitas de Campo para la aprobación de la Instalación de la red de acceso de cada Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC).

NOTA 1: Las actividades inherentes a conseguir la aprobación de la supervisión y/o interventoría, de la instalación de la Red de acceso está en cabeza de EL CONTRATISTA, actividades que se deben realizar dentro de los plazos estipulados en el cronograma y cualquier atraso en la aprobación de estos no se puede entender como tiempo adicional para la instalación de la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC).

NOTA 2: En caso de que la Visita de Campo para aprobación de la instalación de la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) sea fallida, es decir que la supervisión y/o interventoría, no apruebe la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC), por causas imputables al Ejecutor, y que para la aprobación de la misma se requiera repetir la visita de campo de la supervisión y/o interventoría, el costo de esta visita adicional deberá ser asumido por EL CONTRATISTA, es decir no se podrán utilizar recursos de fomento para el pago de visitas adicionales. El valor de la visita será establecido en el Contrato, de acuerdo con la dificultad de acceso a la ubicación de la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) adjudicada al Ejecutor.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Una vez EL CONTRATISTA haya finalizado la Instalación de la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC), mediante comunicación, escrita y en formato digital, realizará un reporte a la supervisión y/o interventoría, con la siguiente información:

1) Información de ubicación de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) como código DANE departamento, código DANE municipio, código DANE centro poblado, coordenadas (mínimo 5 decimales) y dirección o referencias para llegar al sitio.
2) Soporte de la Instalación de la infraestructura de la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC):

- Informe semanal de implementación
- Planos de red, esquemas de conexión **(AS BUILT)** y documentación técnica de la instalación para cada nodo de la red y para la red desplegada, según aplique.
- Registró fotográfico de cada uno de los componentes de red
- Diagrama de Potencias en cada etapa del sistema, incluyendo resultados de apuntamiento de las antenas y los radioenlaces.
- Al menos un (1) video omnidireccional (360 grados) del área cubierta por la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC), identificando el lugar donde se encuentra instalado el nodo de servicio de la comunidad, los nodos de repetición; los lugares de importancia y lugares de posibles interferencias. El video deberá tener una duración mínima de 120 segundos para detallar los equipos instalados en el nodo de servicio de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) y los detalles relevantes de las torres y/o mástiles utilizados y de los equipos instalados en estas.
- Soportes del(los) permiso(s) gestionados.
- Carpeta con el informe final de instalación

3) Soporte de la conexión de los hogares de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC):

- Informe semanal de conexión de hogares
- Datos de contacto de la persona que recibe el servicio en el hogar
- Copia del documento de identidad de la persona que recibe el servicio en el hogar
- Copia del documento mediante el cual la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) autoriza a un miembro de la comunidad a recibir el servicio en los hogares
- Copia del documento de recepción del servicio por parte de un delegado autorizado por la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC)
- Foto de la fachada del predio del beneficiario, en la que aparezca legible la nomenclatura de la dirección o las indicaciones que se registran en los recibos de los servicios públicos, y la georeferenciación, que permitan su ubicación clara en el caso de predios sin nomenclatura;
- Una fotografía o pantallazo como soporte de la prueba de velocidad realizada al momento de la instalación del servicio para acreditar el cumplimiento de las especificaciones del servicio de Internet y calidad del servicio.
- Una foto que permita identificar el número serial de los equipos (CPE, router) instalados para la prestación del servicio en ese hogar.

- VERIFICACIÓN REMOTA

La supervisión y/o interventoría realizará pruebas remotas para verificar que la red de acceso se encuentra instalada, en funcionamiento y operativa.

EL CONTRATISTA deberá proponer un formato de verificación, la supervisión y/o interventoría podrá adicionar ítems al protocolo de pruebas y definir finalmente el formato a utilizar.

Del resultado de las pruebas remotas se levantará un acta en la cual se plasmen los resultados de estas. En dicha acta, deberán quedar expresados claramente los resultados de la verificación, de tal forma que se pueda evidenciar si es procedente continuar con el proceso de aprobación o si por el contrario EL CONTRATISTA debe realizar acciones de mejora.

El acta de verificación será el soporte para la realización de la visita de campo y hará parte integral del informe de aprobación de la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC).

- VISITA DE CAMPO PARA LA APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO

Se debe realizar visita de campo, la cual se deberá coordinar con la supervisión y/o interventoría, una (1) visita de verificación en la que deberán estar presentes un (1) representante técnico calificado de EL CONTRATISTA, (1) representante de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) y un (1) representante de la supervisión y/o interventoría.
La supervisión y/o interventoria, acordará el protocolo de pruebas con EL CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) días hábiles después de la firma del acta de inicio, el cual como mínimo contendrá los ítems que se describen a continuación, con el fin de verificar que el servicio a prestar en los hogares a conectar en la Junta de internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) cumpla con las condiciones establecidas en el presente Anexo Técnico.

- Información General.
- Verificación de la cobertura de la Red de acceso (garantizando un indicador de fuerza de la señal recibida (RSSI) como mínimo de -65 dBm).
- Pruebas de Conectividad.
- Pruebas de funcionamiento con dispositivos de usuario final en ambas frecuencias 2.4 GHz y 5 GHz. Como mínimo se debe garantizar navegabilidad de dispositivos con sistemas operativo Android y Windows. EL CONTRATISTA deberá garantizar por su cuenta que en el momento de las pruebas existan al menos 3 dispositivos con diferentes sistemas operativos que se conecten simultáneamente a la Red de acceso.
- Acceso a páginas Web y restricción de acceso a las páginas Web de acuerdo con los filtros definidos
- Funcionalidad de equipos.
- Relación de equipos recibidos.
- Conclusiones de la Visita (Aprobado o no aprobado).

Adicionalmente se deberán como mínimo hacer las siguientes pruebas

Tabla 20. Pruebas de red de acceso

PRUEBA	DESCRIPCIÓN
Pruebas de cobertura:	- Niveles de Señal (Calidad del Enlace) RSSI (Received Signal Strength Indicator): ▪ Nivel recomendado: Mejor que -65 dBm. ▪ Nivel mínimo aceptable: Entre -65 dBm y -75 dBm.

	Por debajo de -75 dBm: Requiere ajuste de alineación o evaluación de interferencias. - SNR (Signal-to-Noise Ratio): ▪ Valor recomendado: Mayor a 25 dB. ▪ Valor mínimo aceptable: Entre 20 dB y 25 dB. Por debajo de 20 dB: Se espera degradación en la calidad del enlace. - Interferencia de Canal: Mediante el uso de un analizador de espectro o herramienta de software se debe hacer la identificación de canales limpios. Niveles recomendados: Ruido de fondo menor a -90 dBm.
Pruebas de Conectividad	**Prueba de Ping para validación de la latencia en la red de acceso:** - Latencia hacia el AP Recomendada: ▪ Máxima permitida: Hasta 10 ms. - Pérdida de paquetes: ▪ Recomendada: <1%.
Prueba de velocidad	Realización y registro de pruebas de Velocidades mínimas garantizadas mediante la ejecución con alguna herramienta de pruebas como Speedtest. ▪ Descarga: 25 Mbps ▪ Subida: 5 Mbps
Pruebas de navegabilidad	Navegar por páginas nacionales e internacionales, tales como: - MINTIC - INTERNET SOCIETY - YOU TUBE

Nota: es responsabilidad de EL CONTRATISTA garantizar la realización de las anteriores pruebas. La supervisión y/o interventoría puede adicionar ítems al protocolo de pruebas.

Durante toda la etapa de instalación del proyecto, EL CONTRATISTA es responsable por cualquier evento o siniestro que ocurra sobre los equipos y está en la obligación de garantizar la reposición e instalarlos sin costo adicional para la entidad.

- ENTREGABLES DE LA ETAPA DE INSTALACIÓN

De la infraestructura de la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC):
- Informe semanal de implementación
- Planos de red, esquemas de conexión **(AS BUILT)** y documentación técnica de la instalación para cada nodo de la red y para la red desplegada, según aplique.

Nota: En el caso de que se hubieran realizado cambios en los diseños aprobados en la Etapa de Planeación, previa la aprobación de la supervisión y/o interventoría, se debe anexar los soportes que evidencien la solicitud realizada por EL CONTRATISTA con el debido soporte y la respectiva autorización de la supervisión y/o interventoría.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- Registro fotográfico de cada uno de los componentes de red instalados en el nodo de servicio de la comunidad, los nodos de repetición; los lugares de importancia y lugares de posibles interferencias.
- Diagrama de Potencias en cada etapa del sistema, incluyendo resultados de apuntamiento de las antenas y los radioenlaces.
- Al menos un (1) video omnidireccional (360 grados) del área cubierta por la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) identificando el lugar donde se encuentra instalado el nodo de servicio de la comunidad, los nodos de repetición; los lugares de importancia y lugares de posibles interferencias. El video deberá tener una duración mínima de 120 segundos para detallar los equipos instalados en el nodo de servicio de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) y los detalles relevantes de las torres y/o mástiles utilizados y los detalles de los equipos instalados en estas.
- Soportes del(los) permiso(s) gestionados.
- Protocolo de pruebas ejecutado y debidamente aprobado por la supervisión y/o interventoría
- Certificados de pruebas de recepción del servicio y marcación de elemento
- Certificados de calibración de equipos de medida usados.
- Carpeta con el informe final de instalación.
- Acta de recibo a conformidad de la instalación de la Red de Acceso que incluya el inventario respectivo, para dejar constancia de los trabajos realizados y dejar evidencia de que los bienes fueron entregados DDP, tal como se requiere en este Anexo Técnico. Para los equipos importados debe adjuntarse el manifiesto de importación.

De la conexión de los hogares de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC)

- Informe de conexión de hogares
- Datos de contacto de la persona que recibe el servicio en el hogar
- Copia del documento de identidad de la persona que recibe el servicio en el hogar
- Copia del documento mediante el cual la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) autoriza a un miembro de la comunidad a recibir el servicio en los hogares
- Copia del documento de recepción del servicio por parte de un delegado autorizado por la Junta de Internet Comunidad de Conectividad (JI-CDC)
- Foto de la fachada del predio del beneficiario, en la que aparezca legible la nomenclatura de la dirección o las indicaciones que se registran en los recibos de los servicios públicos, y la georeferenciación, que permitan su ubicación clara en el caso de predios sin nomenclatura;
- Una fotografía o pantallazo como soporte de la prueba de velocidad realizada al momento de la instalación del servicio para acreditar el cumplimiento de las especificaciones del servicio de Internet y calidad del servicio.
- Una foto que permita identificar el número serial de los equipos (CPE, router) instalados para la prestación del servicio en ese hogar.

- APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO

Los documentos de instalación deberán ser presentados a la supervisión y/o interventoría, en medio físico y digital, en medio digital a través del portal de radicación de MINTIC.GOV.CO., https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Informes-de-PQRSD/125804:Registro- PQRSD

La revisión, verificación de cumplimiento y contenido de cada uno de los documentos de instalación, se adelantará por parte de la supervisión y/o interventoría en un plazo máximo de 5 días hábiles después de la presentación de estos, plazo en el cual se podrá solicitar al Ejecutor la información que considere necesaria.

Asimismo, cualquier solicitud de modificación que se realice a los Documentos de Instalación durante la ejecución del proyecto, deberá ser presentada a la supervisión y/o interventoría, en un plazo máximo de 5 días hábiles.

Para que la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) se considere como instalada, en funcionamiento y operativa; y en consecuencia reciba la aprobación correspondiente por parte de la supervisión y/o interventoría, EL CONTRATISTA deberá contar con la aprobación expresa de los entregables de la etapa de instalación de la red de acceso.

- ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La etapa de Operación y Mantenimiento de la red de acceso de la Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) se inicia después de la visita de campo y la respectiva comunicación de la supervisión y/o interventoría, en la cual se dé el concepto de aprobación y entrada en servicio de la red de acceso de cada Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC). La red de acceso de cada Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI- CDC) debe tener independientemente el concepto de aprobación

El plazo de operación y mantenimiento de red de acceso de Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) es de 6 meses, contados a partir de su entrada en operación debidamente autorizada por la supervisión y/o interventoría, periodo durante el cual EL CONTRATISTA debe realizar las siguientes actividades:

Operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la red de acceso y de los hogares conectados y en servicio.

Soporte de nivel 0, 1, 2 y 3, entendido como:

Soporte de nivel 0:

El nivel de soporte técnico 0 es el nivel más básico de soporte técnico, en el que los usuarios pueden resolver problemas por sí mismos. Este nivel se basa en la filosofía del autoservicio y se caracteriza por no requerir de software o de personal para comunicarse con los clientes.

El objetivo del soporte técnico nivel 0 es que los usuarios puedan encontrar soluciones a sus problemas sin necesidad de que intervenga el personal de soporte técnico. Para ello, EL CONTRATISTA debe ofrecer recursos como:

- Base de conocimiento
- Portal de autoservicio
- Catálogo de servicios
- Preguntas frecuentes
- Glosarios
- Chatbots interactivos

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Algunos ejemplos de problemas que los usuarios pueden resolver con el soporte técnico nivel 0 son: Reiniciar un dispositivo, Restablecer contraseñas, Solicitar hardware o software, Registrar incidentes no urgentes.

Soporte de nivel 1:

Está diseñado para abordar problemas técnicos simples o de configuración básica que puedan resolverse sin intervenciones avanzadas, abarca el diagnóstico inicial de problemas técnicos simples y la ejecución de soluciones inmediatas. En este nivel, el personal técnico de EL CONTRATISTA valida configuraciones estándar de los equipos (CPE o Routers), en redes inalámbricas revisa parámetros básicos como niveles de señal (RSSI, SNR) en el CPE. Si el problema no se resuelve en este nivel, el incidente debe ser documentado y escalado al Nivel 2 con un diagnóstico preliminar detallado para un análisis más profundo

Soporte de nivel 2:

El soporte en Nivel 2 implica la atención de problemas técnicos más complejos que requieren intervención especializada. EL CONTRATISTA debe realizar diagnósticos detallados de los equipos principales de la red, como Access Points, o CPEs, mediante el acceso a los sistemas de monitoreo y gestión, monitoreando, soportando y manteniendo. Dentro de las validaciones se incluyen análisis de tráfico, comprobación de configuraciones avanzadas (VLANs, QoS, frecuencias y potencias), y la revisión de registros o logs de eventos en los equipos que conforman la red de acceso. Este nivel debe estar en la capacidad de realizar ajustes remotos en perfilamiento, configuraciones, ajustes de potencia y coordinar intervenciones en sitio si es necesario, tales como reemplazo de hardware, reparación de fibra óptica o ajuste de antenas.

Soporte de nivel 3:

El soporte en Nivel 3 está orientado a la resolución de problemas críticos o sistémicos que afectan la estabilidad y operación general de la red o la calidad del servicio de manera particular para un cliente final o de manera masiva. En este nivel, EL CONTRATISTA a través de soporte especializado debe llevar a cabo una revisión integral de la infraestructura, incluyendo análisis de tráfico en tiempo real, análisis de interferencias en bandas no licenciadas, revisión de configuración de equipos centrales (APs), y análisis detallado de la red de distribución (enlaces inalámbricos). Este nivel también incluye la gestión de soporte con los fabricantes de equipos y la aplicación de actualizaciones de firmware o parches de seguridad que sean necesarios. Adicionalmente, se deben implementar acciones correctivas, optimizaciones y recomendaciones para la mejora continua de la red, con el objetivo de prevenir incidentes similares en el futuro.

NOTA: En el caso que EL CONTRATISTA después de haber realizado el curso normal de los Niveles de Soporte aquí mencionado, considere la necesidad de involucrar al Proveedor del Servicio Troncal de Internet para realizar algún tipo de descarte adicional, lo podrá realizar teniendo presente el Check de pruebas y descartes que haya realizado previamente dentro de la red de acceso y el debido reporte según modelo operativo hacia el Proveedor de servicio de red Troncal. De igual manera dicho escalamiento debe realizarse a través del último nivel de soporte (3), con el objetivo de que, en el caso de requerirse alguna prueba adicional o entendimiento del problema técnico, se cuente con un soporte especializado por parte de EL CONTRATISTA.

Cada nivel de soporte debe contar y cumplir con los tiempos de respuesta de este documento, definidos en los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) e indicadores de disponibilidad para la red de acceso, de igual manera EL CONTRATISTA deberá garantizar la documentación detallada de cada incidente atendido, para asegurar un proceso de registro en una base de conocimiento y lecciones aprendidas, que a futuro permita enriquecer y ayudar a solucionar casos en el Soporte de Nivel 0. Este modelo de soporte asegura un servicio de alta calidad y la continuidad operativa del proyecto para la satisfacción de los usuarios finales.

- Capacitación virtual/presencial para el personal designado por la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC), según se detalla en este Anexo en la sección correspondiente a la Etapa de Capacitación.

NOTA: EL CONTRATISTA debe iniciar la etapa de capacitación, paralelamente a la etapa de socialización con la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad.

Vencido el anterior periodo de seis meses, EL CONTRATISTA deberá realizar el soporte de Nivel 3 a Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) por los seis (6) meses restantes, es decir desde el mes siete (7) al mes doce (12) de la duración del Contrato. La prestación del servicio finalizara cuando se haya cumplido el periodo de 12 meses.

La ejecución de los proyectos deberá corresponder al cumplimiento de cada uno de los componentes, especificaciones técnicas de la propuesta seleccionada en la Convocatoria, a las condiciones de participación y lineamientos del Contrato.

Durante la etapa de operación del proyecto, EL CONTRATISTA es responsable de reportar a la supervisión y/o interventoría la ocurrencia de cualquier evento o siniestro que se presente sobre los equipos y cualquier elemento de red o pérdida o daño de los equipos instalados en los hogares. EL CONTRATISTA, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al conocimiento del evento, deberá reportarlo a la supervisión y/o interventoría y realizará la gestión ante la compañía de seguros y/o usuario para la reclamación correspondiente.

- UTILIZACIÓN DE LA RED DE ACCESO

EL CONTRATISTA deberá reportar el uso y ocupación del canal de conectividad de la Red de acceso de cada Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC), de tal forma que a través de reportes periódicos generados por su repositorio y del monitoreo permanente por personal de EL CONTRATISTA, se pueda garantizar la operación y la utilización de Internet por parte de los hogares de la Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC).

Por lo anterior, EL CONTRATISTA deberá poner a disposición de la supervisión y/o interventoría, mínimo los siguientes reportes o información en línea:

- Informe detallado del tráfico cursado por la Red de acceso de cada Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) (por hora, día, mes), tanto entrante como saliente, mostrando los picos máximos y mínimos tanto de entrada como de salida, tráfico promedio, gráficos, etc.
- Reporte de Fallas presentadas en la Red de acceso de cada Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) con fecha, hora, causa de la falla, duración de la falla, impacto en la conectividad de

hogares a nivel de calidad y/o disponibilidad, tiempo y cantidad de hogares afectados, acciones tomadas para la solución. Esta información debe permitir el análisis y generación de estadísticas por cada Red de acceso; esto con la finalidad de establecer el desempeño de cada Red de acceso, y ocupación del canal.

- Información del estado de la red
- Número de hogares conectados (día, mes) y uso de la conectividad de Internet por Red de acceso
- Gráfico de uso de cada Red de acceso (por hora, día y mes)

La supervisión y/o interventoría podrá requerir la inclusión o modificación de los reportes anteriores

El repositorio debe permitir el monitoreo en tiempo real de la información de la utilización y estadísticas de la Red de acceso de cada Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC).

La información anterior deberá estar disponible en línea en el repositorio y deberá incluirse en el informe mensual de operación.

- ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIOS - INDICADORES

Desde el inicio y durante la Etapa de Operación y Mantenimiento, EL CONTRATISTA debe dar cabal cumplimiento al Acuerdo de Nivel de Servicios que se indica a continuación y su incumplimiento podrá dar lugar a la aplicación de descuentos en los pagos por operación y mantenimiento o a la aplicación de multas de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato.

A continuación, se describen el conjunto inicial de indicadores de calidad considerado en el Acuerdo de Nivel de Servicio con sus respectivos valores admisibles de cumplimiento; no obstante, la supervisión y/o interventoría y EL CONTRATISTA podrán acordar la inclusión de indicadores adicionales o complementarios.

En relación con la actualización, modificación o reemplazo de los indicadores aquí definidos, en caso de que no exista un acuerdo entre la supervisión y/o interventoría y EL CONTRATISTA, EL DEPARTAMENTO a través de la supervisión y/o la interventoría podrá establecerlos mediante comunicación dirigida a EL CONTRATISTA, dejando constancia de las discusiones efectuadas con el objetivo de lograr el acuerdo.

- VELOCIDAD EFECTIVA MÍNIMA DE NAVEGACIÓN

EL CONTRATISTA debe realizar el diseño de la red de acceso para garantizar que en la etapa de operación los hogares conectados a INTERNET puedan navegar a las siguientes velocidades mínimas:

Tabla 21 Velocidad de navegación

INDICADOR	VELOCIDADES MÍNIMAS
Velocidad de navegación	o Descarga: 25 Mbps o Subida: 5 Mbps o Rehusó: 1:8 o Prioridad: 20Gb

El valor mínimo de este indicador: independientemente de la tecnología de la red troncal y de la red de acceso debe cumplir con los valores mínimos indicados.

- REPORTE DE VELOCIDAD EFECTIVA

La supervisión y/o la interventoría determinarán la metodología para la medición de la velocidad de navegación en los hogares conectados y el contenido de los reportes de este indicador. Con base en los resultados, la supervisión y/o interventoría, podrá requerir al Ejecutor sobre las mejoras a implementar, en el caso de que la velocidad de navegación esté siendo afectada por la red de acceso y validará que en el periodo de corte inmediatamente siguiente se hayan implementado de modo satisfactorio.

En el caso de que la velocidad mínima de navegación no se cumpla por causas imputables a la red troncal, la supervisión y/o interventoría, podrá requerir a EL CONTRATISTA sobre las mejoras a implementar y validará que en el periodo de corte inmediatamente siguiente se hayan implementado de modo satisfactorio

- INDICADOR DE DISPONIBILIDAD POR RED DE ACCESO

El indicador de disponibilidad hace referencia al porcentaje de tiempo en el cual el servicio de conectividad debe estar disponible para los hogares en la Red de acceso de cada Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC), cumpliendo con la capacidad, funcionalidad y el nivel de servicio.

El valor mínimo de este indicador por Red de acceso, para que se considere como cumplido, deberá ser de mínimo:

Tabla 22 Acuerdo de nivel de servicios - Disponibilidad Red de Acceso

Indicador	Desde el nodo de servicio de la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) hasta los hogares
Disponibilidad mínima	96%

El tiempo de indisponibilidad de la Red de acceso de cada Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC), identificado por la supervisión y/o interventoría, a partir del inicio de la Etapa de Operación y mantenimiento y por un periodo de seis (6) meses, a través de la verificación correspondiente por la supervisión y/o interventoría, ocasionará un descuento en los pagos previstos en el contrato.

Tabla 23 Descuentos en los pagos mensuales de Operación y Mantenimiento de Red de acceso, según disponibilidad

Indicador	Desde el nodo de servicio de la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) hasta los hogares	Descuento
Disponibilidad	Mayor o igual a 98,0%	0%
	Entre 90,0% y 97,9%	10%
	Entre 85,0% y 89,9%	20%
	Entre 80,0% y 84,9%	30%
	Entre 70,0% y 79,9%	50%
	Entre 50,0% y 69,9%	70%
	Entre 0% y 49,9%	100%

NOTA:

- La anterior tabla de descuentos por indisponibilidad se aplicará de manera independiente para cada una de las Redes de acceso de las Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) asignadas al Ejecutor.
- Para el cálculo de la disponibilidad de la red de acceso, no se tomará en cuenta las paradas de reloj, entendidas como los tiempos de indisponibilidad por mantenimientos preventivos programados, ni el tiempo de indisponibilidad de la red de acceso por causas ajenas al Ejecutor.
- El incumplimiento reiterado del indicador de disponibilidad, por debajo del 85,0%, por tres meses o más dará lugar a la aplicación de multas de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato.

- REPORTE DE DISPONIBILIDAD

El periodo de reporte es mensual y debe ser parte del informe que presenta EL CONTRATISTA en el correspondiente mes. El reporte debe contener como mínimo la siguiente información:

a) Un archivo plano por cada una de las Redes de acceso de las Juntas de Internet, como anexo dentro del informe mensual en medio magnético, el cual debe contener la siguiente información:

- Fecha (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) del reporte
- Identificación de la Red de acceso: ID de la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) (a ser asignado por la supervisión y/o interventoría, Número del Contrato, Departamento, Municipio, Centro Poblado y nombre común de la ubicación de Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) y tecnología de la Red de acceso.
- Cantidad de tiempo de indisponibilidad (hh:mm:ss), registrado en el sistema de gestión del nodo de servicio de la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC).
- Cálculo del Indicador:
  Disponibilidad = [100% - (horas (con un decimal) de indisponibilidad al mes, imputables al Ejecutor, / horas total mes) *100) %]

- Una sección de resumen de los resultados del indicador con los datos o gráficas que permitan visualizar los comparativos acumulados (hasta un máximo de 6 meses). Se debe incluir el análisis y las observaciones del comportamiento del indicador del mes con respecto al(los) mes(es) anterior(es).

La supervisión y/o interventoría analizará y evaluará los reportes de disponibilidad con base en la metodología que se acuerde entre la supervisión y/o interventoría y el ISP, en la etapa de Planeación del proyecto. Estos reportes podrán ser modificados en la etapa de operación del proyecto, si así se requiere.

La supervisión y/o interventoría podrá libremente realizar las pruebas que estime convenientes con el fin de evidenciar el cumplimiento del indicador y en caso de encontrar incoherencias con lo reportado por EL CONTRATISTA o en el caso de evidenciar el no cumplimiento del indicador, dará lugar a la aplicación de multas de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato.

- MESA DE AYUDA

Para atender los reportes de fallas, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y brindar soporte técnico a los hogares conectados de la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC), EL CONTRATISTA deberá:

a) Brindar un Centro Telefónico de Soporte técnico o mesa de ayuda con **acceso gratuito para los hogares**, disponible durante ocho (8) horas de lunes a viernes, durante los seis (6) meses de duración de la etapa inicial del proyecto, en la cual se brindará soporte de nivel 0, 1, 2 y 3. Durante los seis meses restantes el Centro Telefónico de Soporte técnico o mesa de ayuda con **acceso gratuito para las Juntas de INTERNET,** disponible durante ocho (8) horas de lunes a viernes, brindará soporte de nivel 3 a las Juntas de INTERNET. Culminados los seis (6) meses, EL CONTRATISTA brindará a la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) el soporte de nivel 3 y la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) será la responsable de brindar el soporte de nivel 0,1 y 2 a los hogares conectados.
b) Brindar un canal de contacto alternativo: correo electrónico, mensajería telefónica, WhatsApp o cualquiera otro que sirva como soporte técnico o mesa de ayuda con acceso gratuito para los hogares, disponible las veinticuatro (24) horas del día, durante los primeros seis meses de la etapa de operación. Para los siguientes seis meses EL CONTRATISTA brindará un canal de contacto alternativo: correo electrónico, mensajería telefónica, WhatsApp o cualquiera otro que sirva como soporte técnico o mesa de ayuda con acceso gratuito para las Juntas de INTERNET, disponible las veinticuatro (24) horas del día, para el soporte de nivel 3.
c) Es responsabilidad de Ejecutor entregar un reporte mensual estadístico que se debe incluir en el informe mensual de seguimiento de todas las interacciones, tipificación de los problemas, eventos atendidos, resolución de fallas, durante los 12 meses de duración del proyecto: el informe de los primeros seis meses relacionados con soporte de nivel 1, 2 y 3 y el correspondiente a los últimos seis meses relacionado con el soporte de nivel 3.
d) La supervisión y/o interventoría podrá solicitar informes parciales de gestión de tickets (diarios, semanales, quincenales, etc.) durante la vigencia de operación del centro de contacto y para efectos de seguimiento a la atención y casos particulares.
e) EL CONTRATISTA para cada uno de los eventos reportados: fallas, peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de recibidas, debe registrar como mínimo:
   - El tipo de evento reportado
   - Número del reporte
   - Datos generales de quien reporta: (nombre, teléfono contacto, dirección física, correo electrónico, fecha)
   - Descripción de la falla
   - Solución a la falla
   - Fecha de solución de la falla
   - Canal utilizado para el reporte

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- Otra información relevante.

EL CONTRATISTA se obliga a hacer uso de medios expeditos y céleres que hagan efectivo y oportuno el trámite y atención que se dé a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, así como, las correspondientes a fallas del servicio.

Los valores máximos admisibles para los indicadores de la mesa de ayuda, que EL CONTRATISTA deberá cumplir en desarrollo del Contrato, son:

Tabla 24 Acuerdo de nivel de servicios de la mesa de ayuda

Ítem	ANS	
1	Tiempo promedio de atención al reporte (TMO).	ANS Pactado con la supervisión y/o interventoría en la etapa de planeación
2	Eficacia	# casos resueltos / # casos atendidos imputables al Ejecutor,>= 95%

EL CONTRATISTA deberá garantizar que la mesa de ayuda genere los reportes que contengan la información necesaria para el cálculo de los indicadores anteriormente descritos, los cuales serán validados por la supervisión y/o interventoría.

Calidad en la atención al usuario EL CONTRATISTA deberá incorporar al repositorio de información del proyecto, un reporte mensual del comportamiento del indicador de mesa de ayuda, para efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Con base en los resultados, la supervisión y/o interventoría, requerirá al Ejecutor sobre las mejoras a implementar, y validará que en el periodo de corte inmediatamente siguiente se hayan implementado de modo satisfactorio.

El incumplimiento a los umbrales que establezca la supervisión y/o interventoría, en las acciones de mejora dará lugar a las multas o sanciones a que haya lugar.

EL CONTRATISTA deberá tener esquemas de calidad en la operación de tal manera que los hogares no tengan la necesidad de reportar fallas, teniendo en cuenta que la tecnología propuesta reporte fallas, eventos y logs que sean de inmediata atención por EL CONTRATISTA afectando lo menos posible a los hogares conectados en las Juntas de INTERNET.

En todo caso, EL CONTRATISTA deberá llevar un archivo de control sobre los PQRSD reportados y el estado de la solución para control de la supervisión y/o interventoría.

- MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS

EL CONTRATISTA durante la ejecución del proyecto, debe realizar los Mantenimientos Preventivos y/o Correctivos establecidos en el Plan de Mantenimiento.

El alcance del Plan de Mantenimiento debe considerar la totalidad de los equipos, elementos y sistemas que sean suministrados por EL CONTRATISTA

- ETAPA DE CAPACITACIÓN

El proyecto busca implementar un enfoque integral para transferir conocimientos y habilidades técnicas a la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC), permitiendo su autogestión y sostenibilidad. La metodología combina formación práctica, evaluación continua y un modelo de gobernanza participativa. A través de esta estrategia, se garantizará que la comunidad pueda administrar, operar y dar soporte a la red de acceso inalámbrica punto-multipunto en bandas no licenciadas, convirtiendo a la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) en el gestor principal del servicio una vez finalice el periodo de seis (6) meses, en el que EL CONTRATISTA realizará la implementación, instalación, administración, soporte y mantenimiento de la red de acceso y de la conectividad a internet de los hogares de la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC).

La etapa de capacitación se inicia con la aprobación del Plan de Formación, presentado por EL CONTRATISTA en la etapa de Planeación y se desarrolla en paralelo con la etapa de instalación, operación, mantenimiento y soporte, que se realiza en los primeros seis (6) meses de la etapa de operación.

EL CONTRATISTA debe realizar la capacitación de acuerdo con el contenido del Plan de Formación aprobado por la supervisión y/o interventoría.

Durante el desarrollo de esta etapa y hasta su realización, EL DEPARTAMENTO evaluará el proceso de capacitación, con base en la aplicación del formato de evaluación aprobado por la supervisión y/o interventoría.

La supervisión y/o interventoría realizarán el seguimiento al proceso de capacitación y con base en el desarrollo del Plan de Formación y las evaluaciones realizadas, emitirá el concepto de aprobación de esta etapa, cuya duración como ya se mencionó es de seis (6) meses.

Con base en los resultados del seguimiento al Plan de Formación, la supervisión y/o interventoría, requerirá al Ejecutor sobre las mejoras a implementar, y validará que en el periodo de corte inmediatamente siguiente se hayan implementado de modo satisfactorio.

El incumplimiento a los umbrales que establezca la supervisión y/o interventoría, en las acciones de mejora dará lugar a las multas o sanciones a que haya lugar.

- RESUMEN DE ENTREGABLES DEL PROYECTO.

Tabla 25 Resumen de entregables del proyecto para las Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad

ETAPA	ENTREGABLES
	SITE SURVEYS • Un informe detallado del site survey con planos y documentación del análisis. **DISEÑO DE BAJO NIVEL** • Planos de red, esquemas de conexión y documentación técnica del diseño • Cronograma detallado de instalación (MS Project, con copia en

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

PLANEACIÓN	Excel) y puesta en servicio, acorde con el cronograma general establecido. • Lista de Materiales (BOM - Bill of Materials) • EL CONTRATISTA deberá documentar todos los materiales necesarios para implementar la red, especificando componentes para soluciones FWA. • BOM detallado con estimaciones de costos y especificaciones técnicas. **PLAN DE MANTENIMIENTO** • Descripción del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, en el cual se detallen las actividades a realizar. • Mantenimiento Preventivo: se ejecuta bajo programación para prevenir fallas o para introducir mejoras en la red, este se dara una vez cada 6 meses • Mantenimiento Correctivo: es aquel que se ejecuta una vez se presenten fallas en la etapa de operación del proyecto que afecten de manera parcial o total el servicio. • Esquema de atención y soporte técnico, especificando niveles y tiempos de escalamiento y prioridades. • Deberá especificarse el mantenimiento a aspectos de seguridad como configuraciones y filtros de navegación de acuerdo con los establecidos en el presente documento y política de seguridad física. **PLAN DE FORMACIÓN** • EL CONTRATISTA deberá presentar el Plan de Formación
INSTALACION DE RED DE ACCESO	**DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ACCESO** • Informe semanal de la implementación • Planos de red, esquemas de conexión (AS BUILT) y documentación técnica de la instalación para cada nodo de la red y para la red desplegada, según aplique. Nota: En el caso de que se hubieran realizado cambios en los • diseños aprobados en la Etapa de Planeación, previa la aprobación de la supervisión y/o interventoria, se debe anexar los soportes que evidencien la solicitud realizada por EL CONTRATISTA con el debido soporte y la respectiva autorización de la supervisión y/o interventoria. • Registro fotográfico de cada uno de los componentes de red instalados en el nodo de servicio de la comunidad, los nodos de repetición; los lugares de importancia y lugares de posibles interferencias. • Diagrama de Potencias en cada etapa del sistema, incluyendo resultados de apuntamiento de las antenas y los radioenlaces.

	• Al menos un (1) video omnidireccional (360 grados) del área cubierta por la red de acceso de la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) identificando el lugar donde se encuentra instalado el nodo de servicio de la comunidad, los nodos de repetición; los lugares de importancia y lugares de posibles interferencias. El video deberá tener una duración mínima de 120 segundos para detallar los equipos instalados en el nodo de servicio de la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) y los detalles relevantes de las torres y/o mástiles utilizados y los detalles de los equipos instalados en estas. • Soportes del(los) permiso(s) gestionados. • Protocolo de pruebas ejecutado y debidamente aprobado por la supervisión y/o interventoria • Certificados de pruebas de recepción del servicio y marcación de elemento • Certificados de calibración de equipos de medida usados • Carpeta con el informe final de instalación. • Acta de recibo a conformidad de la instalación de la Red de Acceso que incluya el inventario respectivo, para dejar constancia de los trabajos realizados y dejar evidencia de que los bienes fueron entregados DDP, tal como se requiere en este Anexo Técnico. Para los equipos importados debe adjuntarse el manifiesto de importación. Esta acta debe estar suscrita por un representante de EL CONTRATISTA y un representante de la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) **DE LA CONEXIÓN DE LOS HOGARES** • Informe de conexión de hogares • Datos de contacto de la persona que recibe el servicio en el hogar • Copia del documento de identidad de la persona que recibe el servicio en el hogar • Copia del documento mediante el cual la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) autoriza a un miembro de la comunidad a recibir el servicio en los hogares • Copia del documento de recepción del servicio por parte de un delegado autorizado por la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) • Foto de la fachada del predio del beneficiario, en la que aparezca legible la nomenclatura de la dirección o las indicaciones que se registran en los recibos de los servicios públicos, y la georeferenciación, que permitan su ubicación clara en el caso de predios sin nomenclatura; • Una fotografía o pantallazo como soporte de la prueba de velocidad realizada al momento de la instalación del servicio para acreditar

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

	el cumplimiento de las especificaciones del servicio de Internet y calidad del servicio. • Una foto que permita identificar el número serial de los equipos (CPE, router) instalados para la prestación del servicio en ese hogar
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	La etapa de Operación y Mantenimiento de la red de acceso de la Juntas de Internet- Comunidades de conectividad [JI-CDC] se inicia después de la visita de campo y la respectiva comunicación de la supervisión y/o interventoria, en la cual se dé el concepto de aprobación y entrada en servicio de la red de acceso de cada Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC). La red de acceso de cada debe tener independientemente el concepto de aprobación, con el cual inicia la operación y mantenimiento de la red de acceso por 6 meses. **SOPORTE DE NIVEL 0, 1, 2 Y 3, ENTENDIDO COMO:** • **Soporte de nivel 0:** El nivel de soporte técnico 0 es el nivel más básico de soporte técnico, en el que los usuarios pueden resolver problemas por sí mismos. Este nivel se basa en la filosofía del autoservicio y se caracteriza por no requerir de software o de personal para comunicarse con los clientes. El objetivo del soporte técnico nivel 0 es que los usuarios puedan encontrar soluciones a sus problemas sin necesidad de que intervenga el personal de soporte técnico. Para ello, EL CONTRATISTA debe ofrecer recursos como: o Base de conocimiento o Portal de autoservicio o Catálogo de servicios o Preguntas frecuentes o Glosarios o Chatbots interactivos Algunos ejemplos de problemas que los usuarios pueden resolver con el soporte técnico nivel 0 son: Reiniciar un dispositivo, Restablecer contraseñas, Solicitar hardware o software, Registrar incidentes no urgentes. • **Soporte de nivel 1:** Está diseñado para abordar problemas técnicos simples o de configuración básica que puedan resolverse sin intervenciones avanzadas, abarca el diagnóstico inicial de problemas técnicos simples y la ejecución de soluciones inmediatas. En este nivel, el personal

	técnico de EL CONTRATISTA valida configuraciones estándar de los equipos (CPE o Routers), en redes inalámbricas revisa parámetros básicos como niveles de señal (RSSI, SNR) en el CPE. • **Soporte de nivel 2**: El soporte en Nivel 2 implica la atención de problemas técnicos más complejos que requieren intervención especializada. EL CONTRATISTA debe realizar diagnósticos detallados de los equipos principales de la red, como Access Points, o CPEs, mediante el acceso a los sistemas de monitoreo y gestión y de acuerdo con el tipo de red de acceso que se encuentra Este nivel debe estar en la capacidad de realizar ajustes remotos en perfilamiento, configuraciones, ajustes de potencia y coordinar intervenciones en sitio si es necesario, tales como reemplazo de hardware, reparación de fibra óptica o ajuste de antenas. • **Soporte de nivel 3**: El soporte en Nivel 3 está orientado a la resolución de problemas críticos o sistémicos que afectan la estabilidad y operación general de la red o la calidad del servicio de manera particular para un cliente final o de manera masiva. En este nivel, EL CONTRATISTA a través de soporte especializado debe llevar a cabo una revisión integral de la infraestructura, incluyendo análisis de tráfico en tiempo real, análisis de interferencias en bandas no licenciadas, revisión de configuración de equipos centrales (APs), y análisis detallado de la red de distribución (enlaces inalámbricos). Este nivel también incluye la gestión de soporte con los fabricantes de equipos y la aplicación de actualizaciones de firmware o parches de seguridad que sean necesarios.
CAPACITACION	La etapa de CAPACITACIÓN se inicia con la aprobación del Plan de Formación, presentado por EL CONTRATISTA en la etapa de Planeación y se desarrolla en paralelo con la etapa de instalación, operación, mantenimiento y soporte, que se realiza en los primeros seis (6) meses de la etapa de operación. EL CONTRATISTA debe realizar la capacitación de acuerdo con el contenido del Plan de Formación aprobado por la supervisión y/o interventoría. Durante el desarrollo de esta etapa y hasta su realización, EL DEPARTAMENTO evaluará el proceso de capacitación, con base en la aplicación del formato de evaluación aprobado por la supervisión y/o interventoría. La supervisión y/o interventoría realizarán el seguimiento al proceso de capacitación y con base en el desarrollo del Plan de Formación y las evaluaciones realizadas, emitirá el concepto de aprobación de esta etapa, cuya duración como ya se mencionó es de seis (6) meses.

2.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS – ALCANCE DEL OBJETO.

Para el logro de los fines esperados con el proyecto, además de los requisitos, especificaciones, actividades bienes y servicios, detallados en la ficha técnica, EL CONTRATISTA se obliga a:

1. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, para lo cual deberá observar, acatar y ejecutar en condiciones de calidad y oportunidad, todas y cada una de las actividades, bienes y servicios que se describen en la ficha técnica del presente documento; ficha técnica que es concordante con el documento: ANEXO TÉCNICO – ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que hace parte del convenio interadministrativo 1211-2025, celebrado entre el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FUTIC, identificado con NIT 800.131.648-6 y la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NORTE SANTANDER; buscando con la ejecución el cumplimiento del proyecto denominado: IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

2. En virtud del alcance del proyecto, conforme a lo previsto en la ficha técnica, EL CONTRATISTA deberá diseñar, implementar, entregar en servicio, prestar la asistencia en la operación y mantener una solución de red de acceso capaz de **garantizar el suministro del servicio de internet comunitario fijo a los SEIS MIL (6000) hogares asociados de las CIEN (100) Juntas de Internet - Comunidades de Conectividad (JI-CDC)** beneficiarias con el proyecto. Así mismo deberá estructurar los planes de formación y brindar la capacitación requerida para que las Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad (JI-CDC) puedan, de manera autónoma, adelantar los procesos que les permita administrar, gestionar, operar y mantener el servicio de internet comunitario fijo.

3. En virtud del alcance del proyecto, conforme a lo previsto en la ficha técnica, EL CONTRATISTA deberá **diseñar, implementar y prestar el servicio de internet en CIENTO DIEZ (110) instituciones educativas priorizadas de los municipios de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander**. la prestación de servicio de internet en las instituciones educativas será concordante a la ejecución del calendario escolar, establecido y aprobado para la vigencia 2025, por la Secretaría de Educación del Departamento Norte de Santander, conforme a los actos administrativos: **i. Resolución No. 008682 de 23 de octubre de 2024** *(Por la cual se expide el calendario académico para la vigencia del año lectivo 2025 que regirá en los establecimientos educativos oficiales que funcionan en calendario A y que están adscritos a los treinta y nueve -39- municipios no certificados del departamento Norte de Santander)*; y, **ii. La Resolución No. 000210 de 17 de enero de 2025** *(Por la cual se modifica el calendario académico para la vigencia del año lectivo 2025 que regirá en los establecimientos educativos oficiales de Norte de Santander que tienen alteración del orden público)*. Actos administrativos que se adjuntan al presente estudio y que harán parte integral del expediente del contrato; así como con sujeción a los actos administrativos que expida la secretaría de educación Departamental, que ajusten, modifiquen o establezcan calendario escolar.

4. EL CONTRATISTA deberá entregar un plan de trabajo, contentivo de previsión de fechas de entrega de los bienes y servicios que componen el alcance y las etapas de: **i).** Planeación, **ii).** instalación operación; **iii).** mantenimiento,

iv). Capacitación, desglasando, las actividades que comprende cada una de estas y la fecha de entrega en los municipios que conforman la focalización, como lo son: **i).** Abrego, **ii).** Convención, **iii).** El Carmen, **iv).** El Tarra, **v).** El Zulia, **vi).** Hacarí, **vii).** La Playa, **viii).** Los Patios, **ix).** Ocaña, **x).** Puerto Santander, **xi).** San Calixto, **xii).** San Cayetano, **xiii).** San José de Cúcuta, **xiv).** Sardinata, **xv).** Teorama, **xvi).** Tibú; y, **xvii).** Villa del Rosario (Norte de Santander)

5. Conforme los establece la ficha técnica, realizar los estudios de campo de los bienes y servicios a implementarse dentro de los componentes del proyecto destinado a la infraestructura física y técnica para implementar la conectividad de alta calidad para la comunidad.

6. Desplegar ejecutar acciones, trámites, y sufragar los costos con cargo al proyecto, de la gestión de permisos y licencias a que haya lugar para llevar a cabo el proyecto.

7. Los bienes y/o equipos suministrados deberán cumplir con las especificaciones detalladas en la ficha técnica.

8. Garantizar la operación y mantenimiento de los bienes y servicios adquiridos durante el ciclo de vida del contrato a los hogares, instituciones educativas, juntas de internet conectados, entregando un informe mensual de indicadores de operación de dichos equipos, AL INTERVENTOR y/o al supervisor. Así mismo exigir las garantías del fabricante a que haya lugar.

9. Sin perjuicio de la exigencia de garantías o reposiciones a sus proveedores, descrita en el numeral anterior, EL CONTRATISTA deberá garantizar reposición inmediata de bienes y/o equipos en caso de falla o condiciones defectuosas.

10. EL CONTRATISTA, deberá entregar o trasferir a EL DEPARTAMENTO, la titularidad de los bienes e infraestructura del proyecto, garantizando la sostenibilidad Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN del servicio durante el plazo de ejecución del contrato, y a través de un modelo o esquema a presentar en el plan de sostenibilidad antes de finalizar la ejecución. En todo caso siempre debe mantenerse el servicio disponible a las comunidades.

11. Antes de proceder a la instalación de la infraestructura, previo visto bueno de recibido a satisfacción del interventor, y la supervisión designada por EL DEPARTAMENTO, EL CONTRATISTA deberá reportar, presentar e ingresar los bienes y/o equipos adquiridos para el proyecto, al almacén general de la Gobernación de Norte de Santander, junto con la documentación que soporte su adquisición, para ser ingresados al inventario de bienes o activos del departamento.

12. Asumir el rol de operador y/o administrador del proyecto, prestador del servicio público de conectividad a internet, del proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, acorde a las estipulaciones, términos y condiciones consagradas en el ficha técnica y anexo técnico.

13. Garantizar la idoneidad de la conceptualización, estructuración, planificación puesta en marcha del proyecto en su integridad, así como la prestación continua y/o sostenibilidad del servicio de internet conexo al proyecto durante la vigencia del presente contrato.

14. Desplegar las acciones y gestiones, trámites y procesos administrativos, técnicos, financieros, jurídicos y sociales necesarios para realizar y ejecutar: diseño ingeniería y operación (IDEO), estudios de campo para ubicación de los hogares, instituciones educativas, juntas de internet, ingeniería de detalle, plan de instalaciones, plan de comercialización, plan de Mantenimiento, plan de promoción y apropiación, plan de instalación y puesta en servicio, plan de sostenibilidad, aplicando la normatividad vigente.

15. Velar por la oportuna y efectiva instalación de la infraestructura física conforme se establece en la ficha técnica; así como garantizar que, una vez instalado el servicio de conectividad a internet, las condiciones de prestación sean óptimas, asegurando continuidad y calidad, sin interrupciones para el correcto funcionamiento y servicio de la red para los beneficiarios.

16. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto del contrato, dando aplicación a las disposiciones legales vigente.

17. **Rendir y/o presentar informes mensuales de ejecución** AL INTERVENTOR vinculado por el contratante. Los informes deberán presentarse como se dispone en la ficha técnica y además de los aspectos allí señalados, previo los pagos previstos en la cláusula de forma de pago. El informe deberá contener datos, evidencias y anexos de ejecución técnica, administrativa y jurídica.

18. **Rendir y/o presentar por separado e igualmente en forma mensualizada, informes de ejecución financiera y contable,** AL INTERVENTOR vinculado por el contratante, con los respectivos soportes, previo los pagos previstos en la cláusula de forma de pago, los cuales estarán condicionados a la presentación de dichos informes. La relación de los gastos efectuados con los recursos objeto del presente convenio, deberá ser incluida en el respectivo informe.

19. Previo al último pago, EL CONTRATISTA deberá presentar AL INTERVENTOR vinculado por el contratante, un informe consolidado final de gestión que deberá contener datos, evidencias y anexos de ejecución técnica, administrativa y jurídica.

20. Previo al último pago, EL CONTRATISTA deberá presentar AL INTERVENTOR vinculado por el contratante, un informe consolidado final financiero y de gestión.

21. Tener en cuenta los niveles de servicios mínimos de todos los componentes del proyecto en aras de garantizar la calidad, disponibilidad en la infraestructura digital, así como también garantizar la latencia velocidad de transferencia de datos y efectividad en la instalación del servicio de internet en los hogares.

22. Prestar soporte técnico de manera inmediata a los hogares beneficiarios mediante una mesa de servicio, cada vez que estos los requieran, conforme lo establece la ficha técnica.

23. Vincular, designar y mantener en la ejecución del contrato el personal técnico y administrativo con la suficiente idoneidad y autoridad para representarlo y actuar en su nombre.

24. Ejecutar los actos que se encuentren en el giro ordinario de las actividades contratadas.

25. Llevar en forma clara, correcta y precisa las cuentas de todos los gastos incurridos y, suministrar mensualmente a EL DEPARTAMENTO un informe con la relación de gastos en que ha incurrido el proyecto, acompañado de todos los comprobantes que justifiquen los gastos efectuados.

26. Responder en forma oportuna y objetiva las solicitudes, peticiones, quejas, reclamaciones, sugerencias u observaciones que pudieren efectuar los beneficiarios, la Interventoría, Supervisión, el contratante, o cualquier persona que tuviere interés en información del proyecto.

27. Exigir a los subcontratistas que eventualmente llegare a vincular para el cumplimiento del objeto, responder por la calidad de los diseños, al tenor de lo dispuesto en la ficha técnica del presente contrato y las disposiciones de la ley.

28. Atender las indicaciones solicitudes, SUGERENCIAS U OBSERVACIONES que efectúe EL INTERVENTOR o EL DEPARTAMENTO, y dar trámite de acuerdo con los plazos legales, de conformidad con las normas que regulan la materia que se presenten en el marco del contrato, en el caso de presentarse controversias e imprevistos en la ejecución se deberá remitir al Comité Operativo del proyecto, propuestas con alternativas para garantizar la correcta ejecución de este.

29. EL CONTRATISTA deberá integrar el COMITÉ OPERATIVO DEL PROYECTO, y por ende deberá asistir y participar activamente en las reuniones y actividades que conexas al comité.

30. Realizar la coordinación técnica, administrativa, jurídica y financiera de los contratos que se deriven del contrato que se suscriba.

31. Dar alcance y/o subsanar los informes de ejecución, en el evento en que fuere requerido, objetaos u observados por la interventoría o por EL DEPARTAMENTO.

32. Entregar a satisfacción la información técnica, financiera, contable y de contratación en los formatos que establezca EL DEPARTAMENTO a requerimiento de esta Entidad o de cualquier organismo de control.

33. Mantener informado al Interventor y/o a la supervisión del contrato, sobre los detalles, situaciones, acontecimientos, imprevistos que se susciten en la ejecución del objeto contractual, como: dificultades durante los estudios de campo, solicitudes de adiciones, ampliaciones, modificaciones y en general, deberá informarle de cualquier aspecto relacionado o acaecido durante la ejecución.

34. EL CONTRATISTA, deberá comunicar en forma inmediata al Interventor y al DEPARTAMENTO, sobre circunstancias sobrevivientes que puedan determinar la revocación o modificación del contrato.

35. Facilitar y/o poner a disposición de la GERENCIA OPERATIVA DEL PROYECTO, designada por EL DEPARTAMENTO, la información, datos, documentos, espacios, canales, herramientas y personal que fuere necesarios para garantizar la objetiva coordinación, liderazgo y ejecución del proyecto.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

36. Presentar en forma completa y oportuna, la facturación y/o cuentas de cobro de los bienes y servicios objetivamente entregados y/o ejecutados conforme cronograma de ejecución y al flujo y orden detallado en el ANEXO PROYECCIÓN DE GASTOS POR PRODUCTO que hace parte integral del proyecto.

37. Utilizar personal idóneo y calificado, conforme lo exige la ficha técnica, para adelantar todas las gestiones necesarias para cumplir con el encargo que se le extiende.

38. EL CONTRATISTA, debe garantizar que en todos los productos, piezas de comunicación, sesiones, encuentros, eventos públicos, ruedas de prensa, entrevistas, actividades misionales, visitas de campo y declaraciones de cualquier naturaleza, así como en los trabajos materiales realizados y cumplidos o recibidos en virtud de la ejecución contractual, se reconozcan los créditos o menciones a la GOBNERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER y el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FUTIC, adscrito al Ministerio TIC; pudiendo aludir a que se desarrollan mediante vinculación contractual con la entidad contratista. Por tal razón la imagen del DEPARTAMENTO y la de EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FUTIC; y MinTIC deben primar en todos los documentos, piezas publicitarias, videos, maquetas y demás productos y medios informativos que se desarrollen y/o utilicen en cumplimiento del contrato.

39. Cumplir con lo dispuesto en los manuales y procedimientos que disponga la normatividad colombiana, para identificar, estimar y establecer los tratamientos de los riesgos previsibles que eventualmente puedan afectar la ejecución del contrato y del proyecto.

40. Realizar de forma independiente las actividades en alcance al objeto del contrato, utilizando sus propios medios con autonomía administrativa sin que medie subrogación jurídica entre EL CONTRATISTA y EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, y/o el MINISTERIO TIC / FONDO ÚNICO TIC - FUTIC.

41. Permitir que el MINISTERIO TIC – MINTIC Y/O EL FONDO ÚNICO TIC – FUTIC, puedan indagar y hacer seguimiento o verificación a todas las labores o actividades a ejecutar.

42. Garantizar que, en el diseño de las piezas y la producción gráfica digital, el uso de redes sociales o de cualquier medio de comunicación se maneje las marcas, del MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – MINTIC y la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. Todas las piezas diseñadas deben ser previamente aprobadas por EL INTERVENTOR; por lo tanto, antes de ser publicadas en cualquier medio de comunicación o redes sociales, deben ser enviadas para su revisión y aprobación.

43. Contratar como mínimo el 50% de la mano de obra local para la ejecución del contrato en los municipios objeto del contrato a suscribir, siempre que se den las condiciones para ello según lo pactado en el artículo 80 de la Ley 2294 de 2023.

44. Para la liquidación del contrato interadministrativo, deberá hacer entrega al DEPARTAMENTO, de toda la documentación que repose en sus archivos relacionadas con el proyecto que se le encarga.

45. Exigir en los procesos de contratación con terceros, las garantías necesarias de conformidad con lo establecido en la Legislación y el Manual Interno de Contratación, estableciendo como beneficiarios y asegurados al DEPARTAMENTO y al FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, Unidad Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En general, establecerá y exigirá las garantías necesarias para cumplir el objeto contractual y se aminoren los riesgos específicos del objeto contractual.

46. El procedimiento que se adopte para la selección de los contratistas derivados deberá siempre considerar la aplicación de los principios contenidos en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y el Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades previsto para la contratación estatal y el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, sus modificaciones siempre en beneficio de los intereses del DEPARTAMENTO y de la calidad del proyecto encomendado.

47. Suscribir junto con EL DEPARTAMENTO las actas de inicio y liquidación del contrato interadministrativo, así como los demás documentos que fueren necesarios.

48. Informar oportunamente al interventor y al DEPARTAMENTO, sobre las solicitudes de conciliaciones prejudiciales, notificaciones y demandas que se presente con ocasión de los contratos que celebre en ejecución del contrato interadministrativo, emitiendo y allegando a la Secretaría Jurídica del DEPARTAMENTO, la recomendación del Comité de Conciliaciones de la empresa contratista, si este existiere; acompañado del informe técnico de los supervisores y del concepto jurídico sobre el asunto, a fin de que se analice y autorice el asunto al interior del Comité de Conciliaciones del DEPARTAMENTO.

49. Implementar esquemas de seguimiento y control de todas las actividades que se desarrollen en el marco del proyecto.

50. Recibir y administrar toda la información pertinente, relevante y necesaria sobre los usos, áreas requeridas, normativas técnicas, ambientales y legales y cualquier información correspondiente que pueda afectar la viabilidad, estructuración y/o ejecución del proyecto.

51. Realizar presentaciones de estado de avance de los estudios y/o diseños y ejecución del proyecto.

52. Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le correspondan en cumplimiento del objeto del contrato.

53. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del Contrato.

54. Tomar las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad de su personal y de terceros, esto durante la ejecución de las diversas labores generadas y requeridas durante la ejecución contractual, entre estas el cumplimiento integral de las normas de seguridad industrial.

55. Cumplir con la normatividad establecida por el POT/PBOT/EOT de la jurisdicción en la cual se ejecutará el contrato.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

56. Conforme a lo previsto en la ficha técnica, desplegar las acciones y gestiones que fueren necesarias ante las autoridades competentes en caso de ser necesaria la intervención o adecuación del espacio público de la zona objeto de ejecución contractual, cumpliendo con la normatividad en cuanto a las licencias y permisos.

57. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía, por el cumplimiento y de los servicios prestados, por el término previsto en el presente contrato.

58. Reintegrar los recursos desembolsados por EL DEPARTAMENTO que no hubieren sido ejecutados en el contrato que se celebre.

59. Asumir el cumplimiento a lo establecido en las políticas de tratamiento de Datos personales, Seguridad y Privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios y tratamiento de la Información de la entidad y suscribir dentro de los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el documento de compromiso de confidencialidad, de conformidad a lo preceptuado en la Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

60. Salvaguardar los activos de información confidencial que haya obtenido o conocido en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente. La información o documentos producidos en desarrollo de este contrato serán entregados a EL DEPARTAMENTO, obligándose a no los utilizarlos para fines distintos a los previstos en este convenio, y a no divulgar la información suministrada ni los resultados de su trabajo, conservando la confidencialidad de los mismos según la Ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar, de conformidad a lo preceptuado en la Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

61. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato, sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

62. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar que la información no será comercializada, cedida y/o transferida, ni se le dará un tratamiento distinto al de contribuir al cumplimiento de la finalidad del proyecto.

63. Acatar los lineamientos establecidos en la Ley 23 de 1982, referente a los derechos de propiedad intelectual o industrial; en todo caso si de la ejecución del futuro contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, y en general los productos resultantes de la ejecución del contrato, estos pertenecen a EL DEPARTAMENTO.

64. Asistir a las reuniones, sesiones o actividades que fueren convocadas por el Comité Operativo del proyecto, cuando le fuere requerido, así como presentar y/o exponer informes que le fueren requeridos por el comité.

65. Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información a su cargo, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística, sin perjuicio de las responsabilidades señaladas en la Ley 1952 de 2019. La cual deberá estar a disposición de EL DEPARTAMENTO, EL INTERVENTOR y/o EL SUPERVISOR, cuando se requiera.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

66. Mantener un archivo ordenado y cronológico que cumpla con los estándares mínimos establecidos por la normativa vigente en gestión documental. Este archivo deberá estar disponible para la interventoría o supervisión del convenio cuando sea requerido. Los estándares de calidad incluyen, al menos, la aplicación sistemática de criterios para el registro, clasificación, seguridad y almacenamiento o conservación de la información generada durante la ejecución del convenio, tanto en formato físico como digital, garantizando así la calidad y fiabilidad de la información necesaria para su consulta.

67. Garantizar el cumplimiento de un protocolo o plan integral de manejo de residuos (convencionales, peligrosos y/o especiales) previa intervención con el cual se garantice el manejo adecuado y la disposición final de los residuos que se generen durante la ejecución del contrato. Adicionalmente, deberá presentar, según aplique, los permisos para su generación, almacenamiento, transporte y disposición final, así como los certificados de disposición final o aprovechamiento, los cuales deberán ser emitidos por gestores debidamente autorizados, dando cumplimiento a las normas ambientales establecidas en el Decreto 4741 de 2005, Decreto 1076 de 2015 y Resolución 1188 de 2003, expedida por el DAMA, y demás normas que la modifiquen, complementen o adicionen; durante todo el plazo de ejecución del convenio y deberán realizar la correspondiente disposición final de los elementos conforme a lo prescrito en la legislación.

68. Elaborar y entregar a EL DEPERTAMENTO, con al menos TRES (3) MESES DE ANTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DEL OPEX del contrato, UN (1) PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETOS DEL MISMO, en donde se presente la alternativa de sostenibilidad financiera, técnica, ambiental y jurídica del proyecto con su esquema de operación una vez finalizado la operación con recursos del convenio, para ser revisado y aprobado por el supervisor.

69. Conforme a lo establecido en la ficha técnica, EL CONTRATISTA está obligado a prestar el servicio de internet en los términos, plazo y condiciones previstas en la ficha técnica.

70. Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.

3. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES

3.1.1. OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.

1. Desarrollar y cumplir a cabalidad el objeto del contrato, para lo cual deberá observar, acatar y ejecutar en condiciones de calidad y oportunidad, todas y cada una de las actividades, bienes y servicios que se describen en la ficha técnica.

2. Destinar los recursos exclusivamente para los fines atinentes a la ejecución objetiva del contrato y del proyecto.

3. EL CONTRATISTA está en la obligación de realizar y asumir en todo su contexto las gestiones, trámites y/o acciones necesarias para la adquisición de permisos necesarios para la instalación

de la infraestructura, así como para la prestación del servicio de conectividad ante quien corresponda.

4. EL CONTRATISTA está en la obligación de hacer la entrega de los bienes y servicios dentro de los tiempos estipulados, conforme se establece en la ficha técnica del contrato.

5. Conforme a lo estipulado en la ficha técnica, vincular y mantener personal idóneo y calificado para adelantar todas las gestiones necesarias para cumplir con el encargo que se le extiende

6. Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del personal puesto a disposición del servicio, si ello aplica.

7. Tomar las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad de su personal y de terceros, esto durante la ejecución de las diversas labores generadas y requeridas durante la ejecución contractual, entre estas el cumplimiento integral de las normas de seguridad industrial

8. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con la normatividad vigente aplicable, con el soporte de cobro deberá allegar la certificación expedida por el revisor fiscal o contador y representante legal con la cual acredite el pago de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral.

9. Ejecutar los actos que se encuentren en el giro ordinario de las actividades contratadas.

10. Presentar los Informes de ejecución en las periodicidades estipulas en la cláusula de obligaciones específicas de alcance del objeto; y en las circunstancias, situaciones o momentos en que le fueren requeridos por el interventor y/o por EL DEPARTAMENTO, a través de la supervisión designada.

11. Acatar y atender las indicaciones que llegare a efectuarle el Interventor o **EL DEPARTAMENTO,** a través de sus Supervisores.

12. Para la liquidación del contrato interadministrativo que se suscriba, deberá hacer entrega al **DEPARTAMENTO**, de toda la documentación que repose en sus archivos relacionadas con el proyecto que se le encarga.

13. El procedimiento que se adopte para la selección de los contratistas derivados deberá siempre considerar la aplicación de los principios contenidos en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y el Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades previsto para la contratación estatal y el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, sus modificaciones siempre en beneficio de los intereses del **DEPARTAMENTO** y de la calidad del proyecto encomendado.

14. Suscribir junto con **EL DEPARTAMENTO** las actas de inicio y liquidación del contrato interadministrativo, así como los demás documentos que fueren necesarios.

15. En caso de designar funcionarios de la empresa y/o contratistas para la ejecución del proyecto, deberá velar porque estos ejecuten labores directamente relacionadas con el objeto del contrato y cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige.

16. Implementar esquemas de seguimiento y control de todas las actividades que se desarrollen en el marco del proyecto.

17. Recibir y administrar toda la información pertinente, relevante y necesaria sobre los usos, áreas requeridas, normativas técnicas, ambientales y legales y cualquier información correspondiente que pueda afectar la viabilidad, estructuración y/o ejecución del proyecto.

3.1.2. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES. LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P, al asumir la ejecución del proyecto de manera integral y de acuerdo con el alcance pactado mediante la celebración del contrato, asume la responsabilidad de acuerdo con lo pactado en el contrato que se celebre, por lo que ante la existencia de un incumplimiento suyo o de los agentes que contrate para la ejecución de sus compromisos, responderá con sus propios recursos y medios por los costos de las acciones que sea necesario impulsar, para evitar, mitigar o reparar el daño.

Para efectos de determinar la responsabilidad para **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P,** será necesario que se presenten de manera clara y debidamente probada, por lo menos cuatro elementos básicos: ***i)*** un hecho que genere un incumplimiento; ***ii)*** un daño debidamente identificado; ***iii)*** la existencia de un vínculo entre el hecho generador y el daño y; ***iv)*** la inexistencia de una causa atribuible al contratante que motiva el hecho generador del daño, o el daño mismo.

De igual forma, **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P,** será responsable en los términos de los artículos 52 y siguientes de la Ley 80 de 1993 por fallas, errores, omisiones y en general por el incumplimiento, cumplimiento parcial o deficiente del objeto del futuro contrato. **1.** Deberá entregar el contrato que se suscriba debidamente liquidado, el Acta de Liquidación Final suscrita por las partes, así como las garantías de calidad de los bienes, de prestaciones sociales y de cumplimiento a favor de **EL DEPARTAMENTO**. **2.** Cuando terceros efectúen reclamaciones a **EL DEPARTAMENTO** por errores de **LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P,** en su gestión, aquel podrá repetir contra ésta por los actos que sean imputables a su negligencia, impericia, descuido, error u omisión. **3.** En caso de presentarse demanda y/o reclamaciones o conciliaciones, **LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P,** deberá llamar en garantía a sus contratistas y a la compañía aseguradora, cuando existe evidencia de que dichas demandas, conciliaciones o reclamaciones tengan lugar por las acciones u omisiones de los mismos. **4.** Responder con su propio patrimonio por las obligaciones y responsabilidades que se generen hasta por su culpa leve.

3.1.3. LIMITACIONES. LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P, no tendrá facultades para comprometer, por fuera del encargo otorgado, los recursos DEL DEPARTAMENTO. En consideración a lo anterior: **1.** LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P, no tendrá facultades para conciliar o transigir obligaciones cuando está inmersa la responsabilidad de EL DEPARTAMENTO, salvo autorización expresa del Comité de Conciliación de EL DEPARTAMENTO. **2.** Las reclamaciones que se presenten durante el plazo contractual y durante la etapa de liquidación de los contratos que suscriba LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P, con terceros, para la ejecución del contrato, serán atendidas y resueltas directamente por LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P, en ejercicio de sus facultades. **3.** No podrá realizar modificaciones de los componentes, sin la autorización previa de la interventoría y/o de EL DEPARTAMENTO, a través del supervisor designado.

3.2. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

1. Facilitar a EL CONTRATISTA, la documentación e información pertinente, relevante y necesaria, que constituya especificaciones técnicas del proyecto a fin que éste cuente con la información idónea y completa que permita objetiva ejecución del proyecto.
2. Asignar durante la ejecución del contrato interadministrativo, los recursos correspondientes para desarrollar los trabajos objeto de la ejecución contratada.
3. Pagar el valor del contrato en la forma, términos y condiciones que estipule el clausulado contractual.
4. Realizar las transferencias de los recursos asociados al valor del proyecto, previa solicitud de transferencia por parte de EL CONTRATISTA, con todos los soportes de acuerdo con la forma de pago pactada en el Contrato que se suscriba.
5. Conformar y/o hacer parte del Comité Operativo, participar activamente en las reuniones o sesiones que fueren convocadas para abordar asuntos conexos al contrato y proyecto.
6. Convocar y asistir a reuniones de seguimiento para coordinar todas las acciones referentes a los trabajos encomendados, tales como planeación, distribución de recursos, gestión administrativa, entre otras.
7. Apoyar la supervisión técnica de los estudios de campo ejecutados por EL CONTRATISTA, en atención a los componentes del proyecto, asignando a los profesionales necesarios para ello.
8. Velar por el buen desarrollo del contrato.
9. **EL DEPARTAMENTO** deberá dar respuesta oportuna a las comunicaciones incoadas por EL CONTRATISTA, relativas a inquietudes, necesidades o circunstancias sobrevinientes de que haya sido informado.
10. Cumplir con las obligaciones que a su nombre haya contraído EL CONTRATISTA, dentro de los límites del objeto y alcance del contrato que se le ha extendido.
11. Llamar en Garantía a EL CONTRATISTA, a sus subcontratistas y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución de los objetos de los contratos derivados (en caso de que aplique) del contrato.

12. Designar la Supervisión para efectuar control general sobre la debida ejecución del contrato interadministrativo.
13. Adelantar los procedimientos sancionatorios contractuales pertinentes en caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, del contrato interadministrativo del proyecto con el propósito de hacer exigibles las garantías del contrato de acuerdo a la normatividad vigente.
14. Aprobar las pólizas de garantía y/o de seguro que presente EL CONTRATISTA, como tomador (a) y cuyo beneficiario sea el **DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**
15. Verificar que EL CONTRATISTA, cumpla en lo atinente a la obligación de contratar como mínimo el 50% de mano de obra local del proyecto a ejecutarse en los municipios objeto del contrato que se suscriba, siempre que den las condiciones para ello según lo pactado en el artículo 80 de la Ley 2294 de 2023.
16. Suscribir el acta de inicio del contrato previa verificación de los requisitos de ejecución del mismo.
17. Definir al momento de la liquidación del contrato, la cuenta bancaria para el reintegro de los recursos desembolsados por El Departamento que no hayan sido ejecutados.
18. Revisar y hacer las observaciones que considere pertinentes de los entregables a cargo de EL CONTRATISTA, correspondientes a la ejecución del contrato.
19. Asumir la obligación legal y constitucional de proteger los datos personales a los que acceda con ocasión a la celebración del contrato interadministrativo acorde a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y demás normar a fines y constatar a través del interventor el cumplimiento de este aspecto por parte de EL CONTRATISTA.
20. Verificar a través del interventor, que EL CONTRATISTA adopte las medidas de seguridad necesarias para garantizar que la información no será comercializada, cedida y/o transferida, ni se le dará un tratamiento distino al de contribuir al cumplimiento de la finalidad del proyecto.
21. Constatar por medio del interventor, que EL CONTRATISTA, provea a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del personal puesto a disposición del servicio, si ello aplica.
22. Confirmar a través del interventor, que EL CONTRATISTA cumpla con las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad de su personal y de terceros, esto durante la ejecución de las diversas labores generadas y requeridas durante la ejecución contractual, entre estas el cumplimiento integral de las normas de seguridad industrial
23. Verificar a través del interventor que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, riesgos laborales, parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con la normatividad vigente aplicable, con el soporte de cobro deberá allegar la certificación expedida por el revisor fiscal o contador y representante legal con la cual acredite el pago de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral.
24. Contratar la interventoría para la vigilancia y seguimiento integral a la ejecución del contrato.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Como quiera que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos previos son el soporte del proyecto de pliego, el pliego de condiciones y el contrato aplicable a las entidades estatales sujetas al cumplimiento del estatuto general de la contratación pública; y que, a su turno dentro de los estudios, además de la necesidad y la forma de satisfacerla, del objeto y especificaciones, deberá describirse la modalidad de selección de EL CONTRATISTA y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos, procede la Secretaria de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – TIC, dar cumplimiento al condicionamiento, en los siguientes términos:

MODALIDAD:

La modalidad de contratación para el objeto del presente estudio corresponderá a **contratación directa**, la cual se concretará mediante formalización de contrato interadministrativo con base en la justificación y los fundamentos jurídicos que se exponen a continuación

En relación a esta modalidad, es menester indicar que, además de lo establecido en el EGCP (Ley 80/93; Ley 1150/2007; Ley 1474/2011; y, el Decreto 1082/2015), concordantemente, el documento denominado: "**MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**", adoptado mediante Decreto No. 000150 del 20 de febrero de 2025, instituye en su numeral 7.5 a la contratación como una de las modalidades de selección de contratistas, aplicables en la entidad territorial, con un procedimiento ágil y corto, que no exige el agotamiento de muchas etapas; sin embargo, en él deben aplicarse los principios de la contratación estatal, garantizando la selección objetiva. Establece además que, dentro de la reglamentación vigente se establece que para la contratación directa se requiere de estudio previo y acto administrativo que la justifique, en reemplazo del pliego de condiciones, el cual no aplica en esta modalidad de contratación.

Acto seguido, el referido subtítulo del manual de contratación, señala que dicha modalidad es viable por varias causales que allí se enumeran, dentro de los que sobresale el subnumeral **7.5.3. Contratos o convenios interadministrativos.** Subsiguientemente el citado manual de contratación instituye a estos, como acuerdos de voluntades entre entidades públicas, en los que, una de ellas, se obliga para con la otra a la prestación de un servicio, a cambio de una contraprestación o remuneración para satisfacer una necesidad de la entidad contratante; son en sí un contrato. En otras palabras, es un acuerdo de voluntades por el cual surgen obligaciones para cada una de las partes. En el contrato interadministrativo los intereses de cada una de las partes son independientes; para una, la finalidad será que le presten el servicio requerido y, para la otra, será el pago que obtendrá por el servicio prestado. Algo diferente ocurre con el convenio administrativo, pues allí, la finalidad de las partes contratantes es una sola, lograr un fin común, sumando sus fuerzas; sin que se dé la contraprestación, sino obligaciones conjuntas para lograr un interés común.

Mas adelante establece el manual que, son los (acuerdos de voluntades) que celebra el departamento Norte de Santander con entidades públicas siempre que las obligaciones del contrato tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. Los contratos interadministrativos se encuentran sometidos a lo señalado por el literal c numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011.

Arguye subsiguientemente el documento en cita que, para celebrar el contrato interadministrativo es necesario contar con el respectivo estudio previo y con el acto administrativo que lo justifique.

Concluye aquel documento el tema con la manifestación de que, el contrato interadministrativo es, al igual que el contrato, un acuerdo de voluntades que crea obligaciones para las partes, se rige por el estatuto de contratación pública.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

El artículo 2 de la Constitución Nacional expresa que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Por otra parte, el artículo 303 superior, ubica al gobernador de cada departamento como jefe de la administración seccional y representante legal del departamento; y, a su turno como agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público.

A su turno el subsiguiente artículo 305 constitucional fija entre las atribuciones del gobernador la de: **i).** Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas Departamentales; **ii).** Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes.

En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 2200 de 2022 (*Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos)* define a los departamentos forman parte de la organización territorial del Estado y como entidad territorial tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales, la planificación, promoción, coordinación del desarrollo económico, ambiental y social en los asuntos seccionales. Son instrumento de complementariedad de la acción municipal y enlace de las actividades y servicios que prestan los municipios y la Nación.

Al tiempo, el artículo 3 instituye los principios que rigen a los Departamentos, sobresaliendo de allí entre otros: **i). Complementariedad**. Es el mandato de mejorar el cumplimiento de las competencias exclusivas de las entidades territoriales de nivel inferior cuando éstas carezcan de la capacidad suficiente para cumplirlas en términos administrativos, técnicos o presupuestales; **ii). Cohesión territorial.** Exige a los departamentos que sus actuaciones públicas busquen dentro de su territorio: **Articulación física y de infraestructura**. A fin de que todos los entes territoriales

tengan accesibilidad de manera armónica y equilibrada; **Equidad territorial**. a fin de que todos los entes territoriales y sus habitantes tengan igualdad de oportunidades para alcanzar el desarrollo, el acceso a los servicios públicos y el equipamiento de infraestructuras que permitan acceder a capacidades productivas, económicas y de garantía de los derechos; y, **la implementación de forma progresiva**, de respuestas a las necesidades básicas insatisfechas de la población;

Asimismo, el **principio general de Planeación y prospectiva territorial**, inmerso dentro del artículo en cita, exige a los departamentos que la gestión pública y la asignación de recursos de inversión respondan a un contexto planificado de resultados, que permita tener una visión de las metas a cumplir y las estrategias a realizar para su logro, una prospectiva territorial que implique la visión de sostenibilidad futura de los resultados, así como la inclusión de las generaciones futuras.

Es así que, en los enfoques de planeación debe generarse la inclusión de los esquemas o comunidades vulnerables, el enfoque de construcciones colectivas y del interés general, así como el goce efectivo del bienestar social en la satisfacción de las necesidades de la población.

En virtud de lo anterior y en consideración de lo expuesto en la génesis de este estudio, en el que se vislumbró la necesidad, conveniencia y oportunidad de adquirir bienes y servicios específicos conforme al objeto del presente estudio técnico de oportunidad y conveniencia, en aras de cumplir con los fines constitucionales, legales y misionales de la entidad territorial; y atendiendo también a l cuantía estimada del proyecto; La Gobernación del Departamento Norte de Santander a través de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, a acudir a la estructuración del proceso contractual en búsqueda de una persona natural o jurídica que cuente con idoneidad, experiencia, capacidad, conocimientos técnicos especializados en la materia, para: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JUNTAS DE INTERNET DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, CONFORME A LAS ESTIPULACIONES PREVISTAS EN EL DOCUMENTO: "ANEXO TÉCNICO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1211-2025, SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - FUTIC, CON EL FIN DE CERRAR LA BRECHA DIGITAL, PROMOVER LA MASIFICACIÓN DEL ACCESO A INTERNET Y FORTALECER EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC".**

La **Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. E.S.P. - EMTEL S.A E.S.P.**, identificada con el NIT. No. 891.502.163-1, con domicilio principal en la Calle 5 No. 5-68, barrio Centro, del Municipio de Popayán, Departamento del Cauca, es una Sociedad anónima, por Acciones, constituida como Empresa de Servicios Públicos Mixta, regida por los parámetros legales consagrados en la ley 142 de 1994, opera bajo el régimen especial establecido en la Ley 1341 de 2009, es regulada y vigilada por entidades estatales como la CRC, el Ministerio de Comunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio (en lo no regulado por la Ley de servicios públicos

domiciliarios – servicios de valor agregado y demás) y por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; fue creada y constituida por la Alcaldía de Popayán, mediante la escritura Pública No 1757 del 20 de octubre de 1998, de la Notaría Tercera del Círculo de Popayán, registrada en la Cámara de Comercio el 30 de octubre de 1998, con el Número 13037 del Libro IX, como persona Jurídica de naturaleza comercial y tiene como objeto social la prestación de servicios referentes de telecomunicaciones, relacionadas y/o conexas con ellas suscribiendo todo tipo de contratos, y se denomina: **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P. - EMTEL E.S.P.** La **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. E.S.P. - EMTEL S.A. E.S.P,** identificada con NIT No. 891.502.163-1, es una empresa mixta de servicios públicos, con una composición accionaria mayoritariamente pública, conforme se define en el artículo 5 de la escritura pública No. 1757 del 20 de octubre de 1998; razón por la cual se considera como una entidad pública al tenor de lo dispuesto en el numeral 1°, literal A, del artículo 2º de la Ley 80 de 1.993.

A su turno, el numeral 2, literal F del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, integra como parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, del sector descentralizado por servicios, a las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta.

En igual sentido, el Parágrafo del citado artículo 38, previó que, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, están sometidas al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado

Subsiguientemente, el artículo 68 ibid., establece como entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas.

Póstumamente, el parágrafo del referido artículo preceptúa que, de conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución Política, **el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable a las de las entidades territoriales** sin perjuicio de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las autoridades del orden territorial.

Por su parte, el artículo 97 ejusdem, define taxativamente a las sociedades de economía mixta como organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley. Asimismo, el parágrafo conexo al citado artículo establece los regímenes de las actividades y de los servidores de las sociedades de economía mixta en las cuales el aporte de la Nación, de

entidades territoriales y de entidades descentralizadas, sea igual o superior al noventa (90%) del capital social es el de las empresas industriales y comerciales del Estado.

En relación a la existencia de una sociedad de economía mixta, la Corte Constitucional en la Sentencia C-953 de 1999, señaló que tan sólo requiere, conforme a la Carta Magna que surja la voluntad del legislador, si se trata de una perteneciente a la Nación, o por así disponerlo una ordenanza departamental o un acuerdo municipal, si se trata de entidades territoriales, a lo cual ha de agregarse que, lo que le da esa categoría de mixta es justamente, que su capital social se forme por aportes del Estado y de los particulares, característica que determina su sujeción a un régimen jurídico que le permita conciliar el interés general que se persigue por el Estado.

De acuerdo con lo expuesto, lo que otorga la categoría de mixta a la sociedad, es que su capital social se conforme por aportes del Estado cualquiera que sea el monto de participación del sector público y del sector privado.

Sin perjuicio de lo anterior, para efectos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, para que una entidad pueda considerarse «entidad estatal», en relación con las sociedades de economía mixta, debe tratarse de aquellas «en las que el Estado tenga una participación superior al cincuenta por ciento (50%)» de manera que si una sociedad de economía mixta no cumple con dicha participación mayoritaria del Estado, no es posible considerarla entidad estatal para efectos del Estatuto Contractual, Lo anterior, de conformidad con el literal a, del numeral 1, del artículo 2 de la Ley 80 de 1993

En tal sentido, es menester indicar que, efectuada la revisión de la composición accionaria definida en el artículo 5 de la escritura pública No. 1757 del 20 de octubre de 1998 y la documenta conexa a este aspecto, se denotó que, para el momento de elaboración del presente estudio técnico de conveniencia y oportunidad, ostenta la siguiente composición accionaria:

NOMBRE	IDENTIFICACION	PORCENTAJE
MUNICIPIO DE POPAYÁN	891.580.006-4	99,893%
SOCIEDAD ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A.	891.500.117-1	0,005%
FONDO DE EMPLEADOS DE EMTEL S.A. E.S.P.	817.000.034-4	0,005%
FONDO DE EMPLEADOS SOCIEDAD ACUEDUCTO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	891.502.273-1	0,005%
JOSÉ MANUEL CAMPO LÓPEZ	10.528.924	0,002%

De lo anterior sobresale sin lugar a dudas la composición accionaria mayoritariamente pública con lo cual se colige en forma subyacente la sujeción de EMTEL S.A. E.S.P., a la definición o categorización de esta sociedad, como entidad pública o como entidad estatal, conforme a lo previsto en el numeral 1°, literal A de la Ley 80 de 1993.

Al analizar el régimen aplicable para los actos y contratos que celebran estas entidades. En cuanto a, el literal a), del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, señala que son entidades estatales las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%). Esto significa que el legislador, en el año 1993, estableció que las sociedades de economía mixta

donde el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%) están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – ECGP.

Frente al particular, el Consejo de Estado, en el concepto 1127 del 10 de diciembre de 2004, estableció que del análisis de esta norma se concluye que: «***si la participación estatal en una sociedad de economía mixta es superior al cincuenta por ciento (50%) de su capital, ya no le aplica el derecho privado, como es la regla general, sino el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública***». Es claro, entonces, que las sociedades de economía mixta con participación estatal superior al cincuenta por ciento (50%) se rigen en materia contractual por la Ley 80 de 1993, de acuerdo con la libertad de configuración del legislador en la materia.

A su vez, el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, reitera lineamiento atinente al régimen contractual aplicable a las sociedades de economía mixta, sus filiales y empresas con participación mayoritaria del Estado señalando que, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.

A la vez, el artículo 2.2.1.2.1.2.24 del Decreto 1082 de 2015, presupone que las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, sus filiales y las empresas en las cuales el Estado tenga más del cincuenta por ciento (50%) del capital social que no se encuentren en situación de competencia, deben utilizar el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía para los contratos que tengan como objeto su actividad comercial e industrial, salvo para los contratos de obra pública, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargo fiduciario y fiducia pública para los cuales se aplicará la modalidad que corresponda.

Consonantemente, el mismo Decreto 1082 de 2015, establece en su artículo 2.2.1.2.1.4.4. La definición de Convenios o contratos interadministrativos, fijando además que la modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 de dicho decreto, esto es, señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de contratación directa

Como se expuso en el acápite relativo a necesidad conveniencia y oportunidad, se corroboró que, **LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P,** tiene por objeto social: *"(...) la prestación y organización de servicios y actividades de telecomunicaciones tales como telefonía básica local y de larga distancia, servicios móviles, portadores, teleservicios, telemáticos, de valor agregado, servicios satelitales y de televisión en sus diferentes modalidades, servicios de Internet y cualquier otro servicio de telecomunicaciones, así como, la creación,*

generación, implantación y explotación comercial de las tecnologías de la información y de la comunicación, dentro del territorio nacional y en el exterior, incluidas todas aquellas actividades técnicas y tecnológicas que resulten necesarias para la integración de los componentes requeridos para el recaudo físico y/o electrónico de medios o instrumentos de pago y las administrativas que en general exija la gestión del recaudo de los recursos que se produzcan por el pago de los precios o tarifas por el acceso al uso de bienes y servicios públicos y privados provistos por sí misma o por terceros, incluye también la producción y distribución de contenido propio y de terceros y las prestación del servicio de publicidad interactiva, así como la integración de todos los servicios que impliquen la divulgación de contenidos en los medios de comunicación, la prestación de los servicios de publicidad por cuenta propia y/o de un tercero, en aras de la difusión o divulgación de políticas públicas y de mensajes institucionales o comerciales, que implique la producción y distribución de contenidos propios y de terceros; la prestación de servicios de consultoría, asesoría, gerencia de proyectos y asistencia técnica sobre las materias que conforman el objeto, entre otros (...); objeto social que comporta estricta relación con las metas PDD, del Plan de Desarrollo Departamental: ***"2024 – 207, NORTE TERRITORIO DE PAZ***", igualmente con el proyecto **FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DIGITAL BASADOS EN EL ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"**, identificado con código **BPIN No. 2024004540048.** Todo lo anterior alineado al fin misional del ente territorial.

Teniendo en cuenta lo preliminar, el Departamento Norte de Santander, acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés general, considera necesario y oportuno realizar la celebración de un contrato Interadministrativo con **LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P,** que permita adelantar de manera correcta las gestiones que garanticen **la ejecución del presente contrato**, y en ese sentido, la Ley 489 de 1998 expresa que *"las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de las funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo (...)".*

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007**, articulo 2º, numeral 4°, literal c), modificado por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011**, procede la contratación directa cuando se trate de contratos o convenios interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección para la contratación entre entidades estatales es la contratación directa.

5. PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

El presupuesto o valor estimado para el presente proceso contractual ascenderá hasta la suma de **CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS, MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($44.916.969.831,oo)**, incluidos todos los costos administrativos, fiscales, tasas, impuestos y estampillas nacionales y locales.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La forma de estimación de valor del presupuesto para el presente proceso de contratación corresponde a la expuesta en el documento denominado: "ANÁLISIS DE SECTOR", que a su vez deriva de lo pactado en el convenio interadministrativo No. 1211-2025, celebrado entre EL Departamento Norte de Santander y FUTIC. El referido análisis de sector económico funge como instrumento de análisis de mercado, de competencia y de la oferta de los bienes y servicios a ser adquiridos con el fin de conocer y entender claramente: **(a)** cuál es la necesidad de la entidad y cómo puede satisfacerla; **(b)** cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y **(c)** el contexto en cuanto a comportamiento de costos y precios de la actividad objeto de la contratación, en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. Todo ello, orientado a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público.

6. IMPUTACIÓN PRESUPUSTAL

El valor estimado para el contrato resultante en el proceso será asumido con cargo al RUBRO PRESUPUESTAL No.: **2.3.2.02.02.009. Servicios para la comunidad sociales y personales,** amparado en el **certificado de Disponibilidad presupuestal No. 00-002869 de 30 de mayo de 2025,** expedido por la Secretaría de Hacienda del Departamento Norte de Santander..

Lo expuesto, en el marco del proyecto denominado: **"FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DIGITAL BASADOS EN EL ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"**, identificado con código **BPIN No. 2024004540048**

- **APUESTA PDD No.** 1. CONECTIVIDAD: CERRANDO BRECHAS DIGITALES.

- **ESTRATEGIAS PDD:**
  - **A.** Establecer convenios, alianzas para la dotación de equipos tecnológicos con especificaciones técnicas de última generación;
  - **F.** Instalar, mejorar, ampliar la cobertura y capacidad de la infraestructura tecnológica de la conectividad a internet con las distintas tecnologías disponibles de última generación en las zonas urbanas del departamento.
  - **G.** Utilizar las distintas tecnologías disponibles para conectar a todos los habitantes del territorio.

- **METAS PDD:**
  119. Sedes educativas oficiales beneficiadas con acceso a internet; hace necesario contratar.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

122. Conexiones a internet fijo y móvil.

7. FORMA DE PAGO

El DEPARTAMENTO pagará a EL CONTRATISTA, el valor del contrato, mediante pagos parciales, conforme a actas de recibo parcial y/o de recibo final de ejecución, contra entrega de productos completos, conforme a la desagregación detallada en el presupuesto por productos del proyecto, junto con el informe de avance de ejecución del contrato, acompañados de la certificación de recibo a satisfacción expedida por el interventor del contrato; aunado a la acreditación del pago de sus obligaciones en seguridad social integral en salud, pensiones, riesgos laborales, y parafiscales, de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

El detalle para cada desembolso está descrito en el documento: ANEXO PROYECCIÓN DE GASTOS POR PRODUCTO. Este anexo establece la relación entre cada actividad y los objetivos del proyecto con cada tarea especifica.

El valor de c/u de los pagos que desembolse el DEPARTAMENTO estará destinado exclusivamente al desarrollo del Contrato interadministrativo y ejecución del proyecto y serán distribuidos de conformidad con el presupuesto aceptado por el DEPARTAMENTO para el cumplimiento del objeto del proyecto

Los pagos aquí señalados estarán supeditados a los desembolsos que para tal fin realice el FONDO UNICO DE TECONOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES FUTIC, de conformidad con lo establecido en el Convenio interadministrativo No. **1211-2025** celebrado entre el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FUTIC, identificado con NIT 800.131.648-6 y la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NORTE SANTANDER.

En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato, tales como se relacionan en el estudio previo.

NOTA 1. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO. El CONTRATISTA deberá presentar al DEPARTAMENTO para cada pago la siguiente documentación: **1.** Informe(s) de ejecución contractual, (que contengan información del avance técnico, jurídica, financiera y administrativo) radicado(s) en medio físico; y, en magnético, debidamente aprobados por la interventoría del contrato, **2.** Constancia(s) de encontrarse a paz y salvo en parafiscales y/o seguridad social acompañados de las planillas de pago respectivas y, **3.** Factura o cuenta de cobro (según sea el caso) **4.** Informe de supervisión y cumplimiento emitido por el interventor del contrato que dé cuenta del recibo a satisfacción de la ejecución contractual. **5.** Demás documentos que soporten las actividades ejecutadas y anexos que permitan la verificación de información, solicitados por interventoría y/o supervisión.

Pago de los impuestos a que hubiere lugar. Todos los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC. En el valor del contrato se entiende incluido el IVA, los gravámenes departamentales y todos

los demás costos directos o indirectos que ocasione la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA autoriza al DEPARTAMENTO, para que, por conducto de secretaría de Hacienda, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes departamentales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.

NOTA 2. INTERVENTOR DEL CONTRATO: En cualquier caso, EL CONTRATISTA deberá adoptar las recomendaciones del interventor del contrato. Así mismo, todos los informes deberán ser aprobados por el interventor del contrato.

8. - CONDICIONES PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Como quiera que, en el presente estudio técnico de conveniencia y oportunidad se decantó la utilización de la modalidad de selección correspondiente a contratación directa, conforme lo dispone el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el art. 92 de la Ley 1474 de 2011), que conllevará a la formalización de contrato interadministrativo con oferente definido, en este caso la **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A E.S.P. - EMTEL E.S.P.,** identificada con NIT No. 891.502.163-1, la materialización del contrato, se sujetará a la verificación previa por la Gobernación de Norte de Santander, de los requisitos y formalidades que exige la Ley para la contratación entre entidades de derecho público, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política, los cuales se desarrollan en los artículos 6 Ley 80 de 1993, (modificado por el Art. 1 de la Ley 2160 de 2021), Artículos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con los artículos 2.2.1.1.1.5.3.; artículo 2.2.1.2.1.4.4.; y, artículo 2.2.1.2.1.4.1, del Decreto 1082 de 2015.

La corroboración de las condiciones exigidas a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. E.S.P. - EMTEL E.S.P., implica:

- Verificación de la oferta, ceñida a la necesidad, objeto, bienes y servicios, presupuesto y demás condiciones exigidas en la invitación remitida por la entidad contratante.
- Corroboración y/o verificación de documentos de constitución, composición, existencia y representación legal de la persona jurídica oferente y del representante legal, a través de los cuales, el evaluador deberá constatar, la naturaleza jurídica de la sociedad oferente; inhabilidades, incompatibilidades, antecedentes, impedimentos; facultades y restricciones del R.L. en materia de contratación; así como el estricto cumplimiento del oferente, de las previsiones del literal c, numeral 4, art. 2 de la Ley 1150 (modificado por el art. 92 de la L.1474/2011) esto es, que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.
- Verificación de documentos, soportes, certificaciones o RUP que contengan información de experiencia correspondiente a contratos ejecutados con objeto, bines y/o servicios, actividades que incluyan servicio de internet.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Conforme lo establece la ficha técnica, el objeto del presente contrato se ejecutará en los municipios del Departamento Norte de Santander, que conforman la focalización, como lo son:

i). ABREGO, **ii).** CONVENCIÓN, **iii).** EL CARMEN, **iv).** EL TARRA, **v).** EL ZULIA, **vi).** HACARÍ, **vii).** LA PLAYA, **viii).** LOS PATIOS, **ix).** OCAÑA, **x).** PUERTO SANTANDER, **xi).** SAN CALIXTO, **xii).** SAN CAYETANO, **xiii).** SAN JOSÉ DE CÚCUTA, **xiv).** SARDINATA, **xv).** TEORAMA, **xvi).** TIBÚ; y, **xvii).** VILLA DEL ROSARIO.

10. PLAZO DE EJECUCIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA ASUNCIÓN DE COMPROMISOS CON CARGO A VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES DEL AÑO 2026

10.1 PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución será **HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026**, del año 2026. Plazo contabilizado a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución

10.2. AUTORIZACIÓN DE ASUNCIÓN DE COMPROMISOS CON CARGO A VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES DEL AÑO 2026.

Para comprometer recursos de vigencias futuras excepcionales del año 2026 necesarias para cumplir obligaciones pecuniarias del departamento en ejecución del presente proceso, enmarcado en el proyecto denominado: "**FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DIGITAL BASADOS EN EL ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**", identificado con código **BPIN No. 2024004540048,** la honorable asamblea departamental de Norte de Santander, expidió la Ordenanza No. 0004 de 15 de abril de 2025.

11. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR

La Secretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Departamento Norte de Santander, se encuentra, facultada y/o autorizada para la formalización del presente proceso contractual, desde la etapa precontractual, contractual y poscontractual conforme a la delegación contenida en el Decreto Departamental No. 00073 de 15 de enero de 2024 (Por medio del cual se efectúan unas delegaciones en materia de contrafactual, se disponen medidas para ejercer el control y vigilancia en la actividad contractual de la administración departamental, se deroga el Decreto 01514 de 8 de noviembre de 2022, demás decretos concordantes y complementarios).

Además de lo expuesto, la Secretaría del despacho TIC Norte de Santander, considera oportuno que se incluya y resalte aquí que, partiendo de que una ostensible porción de los recursos pecuniarios del proyecto proviene de la sumatoria de esfuerzos, pactata entre la Gobernación del Departamento Norte de Santander y el Fondo único de Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones, adscrita al Ministerio TIC, mediante la suscripción del convenio interadministrativo No. 1211 de 2025. Que, además, a cargo de la entidad territorial se fijó la responsabilidad de desarrollo y/o ejecución del

proyecto; Que, como es sabido, el Departamento Norte de Santander, no cuenta con la infraestructura física y/o tecnológica, ni organizacional, para asumir en forma directa la instalación y prestación del servicio de conectividad a internet previsto en el proyecto; y que, dentro del subtítulo COMPROMISOS ESPECIALES de la cláusula segunda, denominada: "COMPROMISOS" del citado convenio interadministrativo No. 1211 de 2025 sobresalen: "**3.** *Adelantar los trámites y procesos administrativos, técnicos, financieros, jurídicos y sociales necesarios para realizar y ejecutar: diseño ingeniería y operación (IDEO), estudios de campo para ubicación de los hogares, instituciones educativas, juntas de internet, ingeniería de detalle, plan de instalaciones, plan de comercialización, plan de Mantenimiento, plan 3.de promoción y apropiación, plan de instalación y puesta en servicio, plan de sostenibilidad, aplicando la normatividad vigente*"; "**8.** *Estructurar y adelantar los trámites precontractuales y contractuales necesarios para la contratación de la interventoría y la contratación derivada, de acuerdo con lo previsto en este estudio previo, el anexo técnico y las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, y sus decretos reglamentarios para la selección de contratistas que requiera el Departamento para dar cumplimiento al objeto del convenio.* Adicionalmente, el numeral 15 de los compromisos generales de la referida clausula segunda, prevé: "*15. Incorporar y hacer valer en los contratos que celebre para la ejecución del proyecto, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema Integral de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con la normativa vigente*".

De lo expuesto se colige la clara noción del ente nacional de la necesidad de subcontratación de algunos aspectos atinentes a actividades, bienes y servicios del proyecto y la permisión tácita de tal aspecto.

13. ESTUDIO DEL SECTOR

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Departamento Norte de Santander, a través del personal designado por la Secretaría General, previo aporte de información técnica del proceso contractual (objeto, alcance, condiciones de los bienes y/o servicios, plazo, etc), entregada desde la Secretaría TIC, realizó el documento denominado Análisis del Sector, documento que permite establecer el contexto económico y competitivo del sector específico, conexo a los bienes y servicios inmersos en el objeto, del contrato, con el fin de tomar decisiones más informadas en la contratación pública. En el marco del presente proceso este análisis ayuda a establecer el entorno del proceso de contratación, identificar posibles riesgos, determinar los requisitos habilitantes. El referido documento ANALISIS DEL SECTOR hace parte integral de los documentos precontractuales y del contrato del contrato resultante.

14.- NECESIDAD DE CONTAR CON INTERVENTORÍA.

En virtud de las disposiciones normativas consagradas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, relativas al deber de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, que conllevan a las entidades públicas a la obligación de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, procede la entidad territorial a exponer la justificación de necesidad de interventoría del contrato en los siguientes términos:

Partiendo de la cantidad, extensión y complejidad de actividades, bienes y servicios que comporta

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

el objeto contractual correspondiente a: ***"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JUNTAS DE INTERNET DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, CONFORME A LAS ESTIPULACIONES PREVISTAS EN EL DOCUMENTO: "ANEXO TÉCNICO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1211-2025, SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - FUTIC, CON EL FIN DE CERRAR LA BRECHA DIGITAL, PROMOVER LA MASIFICACIÓN DEL ACCESO A INTERNET Y FORTALECER EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC"***, se subyace y justifica que, el seguimiento, vigilancia y control a la ejecución del proyecto deba ser encomendado a una persona natural o jurídica que cuente con capacidad, idoneidad experiencia conocimiento especializado en la materia para que en nombre del departamento Norte de Santander realice el seguimiento, vigilancia y control mediante interventoría integral.

La anterior justificación aunada a que, en el anexo técnico que hace parte integral del convenio interadministrativo No. 1211 DE 2025 suscrito entre el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FUTIC; y la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NORTE SANTANDER, que a su turno son sustento del presente proceso contractual, se prevé la necesidad de contar con interventoría que acompañe toda la fase de implementación (CAPEX), a fin de garantizar el cumplimiento de los aspectos técnicos y tecnológicos, previsto en el alcance del objeto contractual.

El interventor externo actuará como representante de la Entidad para efectos del contrato. Además de lo anterior, el contrato de interventoría externa contará con un supervisor designado por la entidad, que servirá de apoyo en el control y seguimiento del contrato interadministrativo.

Desde la suscripción del acta de inicio del contrato interadministrativo, el interventor verificará la ejecución del contrato hasta la terminación del CAPEX.

La interventoría del contrato será ejercida de conformidad lo establecido en las leyes vigentes aplicables a la materia en especial a lo consagrado en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto Manual de contratación del Departamento Norte de Santander.

En ningún caso el Interventor y/o supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del futuro contrato, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

Una finalizada la ejecución de la fase de implementación o etapa CAPEX, el Departamento asumirá el seguimiento vigilancia y control en forma directa a la fase de funcionalidad sostenibilidad del servicio o etapa OPEX.

15. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se liquidará conforme a lo establecido en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 o las normas que las sustituyan o modifiquen.
La liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo dentro del término de los cuatro (04) meses siguientes a la terminación efectiva del contrato. En el evento que EL CONTRATISTA, **no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o LAS PARTES no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, EL DEPARTAMENTO** tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1437 de 2011.

EL CONTRATISTA, podrá solicitar inclusión de salvedades en el acta de liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren LAS PARTES para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

16. INCLUSIÓN DE LA NECESIDAD EN EL PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

Inclusión de la necesidad en el Plan de Compras, Plan de Contratación y en el BPPID (Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental, cuando ésta vaya a ser financiada con recursos de inversión.)

NECESIDAD A SATISFACER	Incl. En el Plan de Compras		Certificado del Plan de Compras		Incl. En el Plan de Contratación		Certificado del Plan de Contratación		Incl. En el BPPID		Certificado del BPPID
	Si	No	N°	Fecha	Si	No	N°	Fecha	Si	No	Fecha
IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD Y CIERRE DE BRECHA DIGITAL MEDIANTE EL SERVICIO DE BANDA ANCHA A HOGARES ESTRATO 1 Y 2 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSE CUCUTA, VILLA DEL ROSARIO, LOS PATIOS, EL ZULIA Y SAN CAYETANO EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	X				X		X		X		2024004540048

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

17. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Aun cuando el presente proceso de selección se llevará a cabo mediante la modalidad contratación directa, conforme lo establece el estatuto general de contratación estatal, es un deber de la entidad contratante el analizar y justificar la necesidad de exigir o no la constitución de garantías, teniendo a la vista las condiciones económicas, técnicas y financieras de la los bienes y/o servicios inmersos en el objeto contractual a fin de mantener el equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993.

la entidad ha verificado lo expuesto a continuación:

- ***RIESGOS QUE DEBE ASUMIR EL CONTRATISTA***

ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS				
RIESGOS	EFECTO	IMPACTO (1 A 10)	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CUANTIFICACIÓN (PUNTOS)
Problemas Climatológicos	Retraso en instalación	5	50%	300
Condiciones imprevistas en el terreno	Retraso en las obras de instalación y obras no previstas	9	30%	270
Cambio no proyectado de precios de los insumos	Mayor costo de las obras de instalación contratadas	8	20%	160
Cambio no proyectado en los precios de los salarios	Mayor costo de las obras de instalación contratadas	7	5%	35
Incumplimiento del contratista	No ejecución de la instalación	10	15%	150
Mala Calidad de las obras ejecutadas	Daños en las instalaciones posteriores a la ejecución	8	30%	240
Daños a terceros	Indemnizaciones a terceros	10	20%	200
Incumplimiento en el pago de salarios a los trabajadores del contratista	Retrasos en la ejecución	8	20%	160
Mal manejo del anticipo por parte del contratista	Desfinanciamiento de la obra de instalación y no ejecución de los trabajos	10	20%	200

TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, donde se establecen los parámetros y los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, en cumplimiento de lo normado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, que cita "*Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente*" y según, se

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

hizo un análisis con base en la matriz de evaluación del riesgo como aparece a continuación:

RIESGO	TIPIFICACION	ASIGNACION	ESTIMACION
CAMBIOS NORMATIVOSY/O TRIBUTARIOS	Ocurre en aquellos casos, cuando las condiciones inicialmente estipuladas en el contrato han sufrido una modificación sustancial, tal y como es el caso de una norma que modifique o exija la inclusión de un nuevo componente técnico que implique la destinación de mayores recursos, o cuando a consecuencia de una norma con efectos Tributarios varía las condiciones económicas inicialmente establecidas.	La ocurrencia de este riesgo será resuelta a favor del contratista sujeto activo de la norma, es decir, a quien se obliga con la nueva condición técnica o al pago de nuevos tributos, pero en todo caso este deberá probar sustancialmente que la ocurrencia del hecho afectó de manera grave la utilidad esperada en el contrato, ello bajo el supuesto de la teoría del desequilibrio económico bien sea por Hecho del Príncipe o la teoría de la imprevisión.	El Departamento asumirá el 100% del valor del perjuicio probado
HURTO	Ocurre en los eventos de que trata el Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000(Código Penal).	La ocurrencia de los eventuales riesgos por Hurto será asumida por quienes víctima de ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, el Municipio no asumirá ningún sobrecosto por la pérdida de materiales o cualquier otro implemento en la obra.	La parte afectada por el Hurto asumirá el 100% del valor del perjuicio
DAÑOS OCASIONADOS POR DELINCUENCIA COMÚN	Ocurre en los eventos de que trata la Ley 599 de 2000 (Código Penal), por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra y que aún no han sido recibidos por parte de la Interventoría del contrato.	La ocurrencia de los eventuales riesgos por daños ocasionados en los bienes de la obra será asumida por quienes víctima de ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, el Municipio no asumirá ningún sobrecosto por la pérdida de materiales o cualquier otro implemento en la obra.	La parte afectada por los daños sobre los bienes de la obra asumirá el 100% del valor del perjuicio.
ATRASOS Y SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓNPOR TEMPORADAS INVERNALES Y EN GENERAL POR CIRCUNSTANCIAS CLIMÁTICAS	Ocurre en los eventos en los cuales el plazo del contrato es insuficiente como consecuencia de la temporada de invierno o por cualquier otra causa climática	La ocurrencia de los eventuales atrasos en la obra a consecuencia de la temporada de invierno o de cualquier otra causa climática será asumida en principio por el CONTRATISTA, quien debió pre verla época de ejecución del contrato, y de los registros históricos del clima, sin embargo en los casos de comportamiento extraordinario (anormal) del clima certificados por la autoridad pública competente, como es el caso del IDEAM o quien haga sus veces, los costos por el atraso de la obra serán asumidos proporcionalmente entre el contratista y el Municipio	El valor de los sobrecostos a consecuencia de un mayor valor de obra por las emporadas de invierno y en general cualquier causa climática, serán asumidas en un 100% por el CONTRATISTA, cuando dicha temporada es previsible de acuerdo con los registros históricos del clima, por el contrario, en los casos de temporadas del clima extraordinarios (anormal), serán asumidos en partes iguales por el Municipio y el contratista.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

RIESGO	TIPIFICACION	ASIGNACION	ESTIMACION
ATRASOS Y SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR OTRAS CAUSASDISTINTAS AL CLIMA O A LA FUERZA MAYOR O EL CASO FORTUITO	Ocurre en los eventos en los cuales el plazo del contrato y el valor del mismos o insuficientes como consecuencia de circunstancias distintas al clima, y propias de la ejecución del contrato, como puede ser el caso de una disminución en el ritmo de la ejecución de la obra, incumplimiento en el programa de ejecución de los trabajos, no puesta a disposición de la obra de los frentes de trabajo necesarios, mal manejo en el control financiero, técnico o administrativo del contrato y en general, cualquier hecho o circunstancia que atrase la ejecución de los trabajos de la obra, imputables a una de las partes del contrato.	La ocurrencia de los eventuales atrasos y sobre costos en la obra a consecuencia de los distintos posibles eventos imputables a una de las partes, será asumida por la parte que la causa	El valor de los sobrecostos a consecuencia de un mayor valor de obra en estas circunstancias, serán asumidas en un 100% por la parte que la causa
ACCIDENTES DE PERSONAL EN LA OBRA	Ocurre en aquellos casos en que cualquier persona que se encuentre en la zona de influencia de la obra, sufra un accidente, daños a su integridad físico, mental o moral	La ocurrencia de estos casos será asumida por el CONTRATISTA de obra y en estos casos procede responsabilidad contractual con sus trabajadores o extracontractual con personas ajenas a la obra y que estando en la obra de manera autorizada, no hayan sido contratados por el CONTRATISTA	Los perjuicios causados a trabajadores de la obra o terceros, serán asumidos por el CONTRATISTA con sus pólizas, y en caso de insuficiencia de las mismas, el CONTRATISTA asumirá el remanente. Para efectos de este riesgo se considera zona de influencia de la obra todo el radio de acción de los trabajos y cualquier punto donde se encuentre cualquier elemento de la obra.
SOBRECOSTOS POR VARIACIÓN EN PRECIOS DE MATERIALES O INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Ocurre en aquellos casos en que los precios de los materiales o insumos varían entre las fechas después de la firma del contrato, el acta de inicio y el acta de recibo final.	La ocurrencia de estos casos será asumida por el CONTRATISTA de obra.	Los perjuicios o pérdidas por este riesgo son asumidos el 100% por el contratista.

17.1 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

En desarrollo de lo señalado en la Ley 1150 de 2007, la ley 80 de 1993, artículo 25, numerales 7 y 12 y lo establecido en los artículos 3, 15, 17 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para

identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos.

Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionadas en el presente numeral y como principio general, EL CONTRATISTA como experto de negocio y como especialista, asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas al contratista en la presente distribución de riesgos de la contratación, Secretaria de General del DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, no estará obligado a reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista.

- **MATRIZ DE RIESGO**

	Categoría	Valoración
PROBABILIDAD	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO				
# DEL RIESGO	**1**	**2**	**3**	**4**
CLASE	ESPECIFICO	GENERAL	GENERAL	GENERAL
FUENTE	INTERNO	EXTERNO	INTERNO	INTERNO
ETAPA	SELECCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	FINANCIERO	OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN (que puede pasar y como puede ocurrir)	Incumplimiento de requisitos técnicos	Incumplimiento defectuoso o total del contrato	Demora en el pago de los elementos entregados	Cambio en los valores de los bienes y servicios adquiridos una manera exorbitante y que sobrepase los cálculos proyectados

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO		Incumplimiento defectuoso o total del contrato	Incumplimiento del contrato	Incumplimiento del contrato	Desequilibrio económico que lleve al Incumplimiento defectuoso o total del contrato
PROBABILIDAD		**1**	**1**	**1**	**1**
IMPACTO		**2**	**3**	**1**	**3**
VALORACIÓN DEL RIESGO		**3**	**4**	**2**	**4**
CATEGORÍA		MEDIO	ALTO	BAJO	ALTO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?		ENTIDAD	CONTRATISTA	ENTIDAD	CONTRATISTA
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS		ADECUADA EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE REQUISITOS DE EVALUACIÓN	ADECUADA SUPERVISIÓN - PÓLIZA DE GARANTÍA	ADECUADA ELABORACIÓN DEL PAC	ADECUADA REVISIÓN PARA EVITAR PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS - PÓLIZA DE GARANTÍA
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	**PROBABILIDAD**	**1**	**1**	**1**	**1**
	IMPACTO	**1**	**2**	**1**	**2**
	VALORACIÓN DEL RIESGO	**2**	**3**	**2**	**3**
	CATEGORÍA	BAJO	MEDIO	BAJO	MEDIO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?		POCO PROBABLE	POCO PROBABLE	POCO PROBABLE	POCO PROBABLE
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO		FUNCIONARIO EVALUADOR	SUPERVISOR	TESORERÍA Y CONTABILIDAD	SUPERVISOR Y ÁREA DE ALMACÉN
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO		FECHA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	A LA FIRMA DEL CONTRATO	A LA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO		FECHA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

MONITOREO Y REVISIÓN	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LA PROPUESTA	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS TÉCNICOS Y OFERTA ECONÓMICA
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	AL MOMENTO DE EVALUAR LA PROPUESTA	SEMANAL	MENSUAL	AL MOMENTO DE RECIBIR LOS BIENES Y SERVICIOS

18. GARANTÍA ÚNICA

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor y a satisfacción de: **1).** La Gobernación del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, con NIT. No. 800.103.927-7; **2).** El MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – MINTIC, identificado con NIT. 899999053-1; y, **3).** El FONDO ÚNICO DE TECNOLIGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FUTIC, identficado con NIT. 800.131.648-6, conforme al Decreto 1085 de 2015, una garantia expedida por una compañia de seguros legalmente constituida y autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera.

La garantía se deberá constituir dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del futuro contrato. Los siguientes amparos se cuentan a partir de la fecha de expedición de la póliza, la cual deberá amparar los siguientes riesgos:

GARANTÍA ÚNICA		
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL	15 % VALOR DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS.
CALIDAD DEL SERVICIO	15 % VALOR DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	15 % VALOR DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y APORTES PARAFISCALES.	15 % VALOR DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS.

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

POLIZAS ADICIONALES		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMLV	IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

19. INDICACIÓN DE SÍ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

Conforme a las estipulaciones del EGCP, concordantes con las previsiones del "MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN", expedido en el año 2024, por la Agencia Nacional de Contratación Pública -COLOMBIA COMPRA EFICIENTE – CCE, es posible colegir que, los Acuerdos Comerciales contemplan excepciones a la aplicación de los compromisos y obligaciones, basándose en un código distinto al del Clasificador de Bienes y Servicios.

En tal sentido, efectuada la verificación de rigor se denotó que revisado el anexo 4, Tabla 9, del referido manual, se encontró el listado de excepciones contempladas para la implementación de los Acuerdos Comerciales en los procesos de contratación basados en el clasificador de bienes y servicios, revelando que, la posición 17 de la tabla la conforman los contratos interadministrativos como el que ocupa la atención del presente estudio, el cual se encuentra excluido o exceptuado de la aplicación de los compromisos y obligaciones de acuerdos comerciales.

FIRMA	
NOMBRE	**SONIA ARANGO MEDINA**
CARGO	Secretaria de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TIC
Elaboró	Nefer Leandro Mora Durán – Profesional Especializado – Sec. TIC
Revisó:	Elkin H. Rangel Pérez – profesional contratista – Sec. TIC
Revisó:	Astrid Carolina Contreras Villamizar – Profesional Especializado – Sec. TIC
Aprobó:	Sonia Arango medina – Secretaria TIC

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

ANEXO I - FICHA TECNICA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. de Decreto 1082 de 2015, se emite el presente documento, correspondiente o denominado: ANEXO – FICHA TÉCNICA, que hará parte integral del contrato y que contiene y detalla de información relativa a especificaciones y condiciones mínimas, autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la correcta ejecución, presentación y recepción por el contratante de los Bienes y servicios conexos al objeto contractual que se describe a continuación:

OBJETO DEL CONTRATO.

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DENOMINADO: "IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JUNTAS DE INTERNET DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, CONFORME A LAS ESTIPULACIONES PREVISTAS EN EL DOCUMENTO: "ANEXO TÉCNICO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1211-2025, SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - FUTIC, CON EL FIN DE CERRAR LA BRECHA DIGITAL, PROMOVER LA MASIFICACIÓN DEL ACCESO A INTERNET Y FORTALECER EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC"

FICHA TÉCNICA – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La ejecución del contrato se efectuará conforme a las especificaciones técnicas que se detallan a continuación, concordantes con especificaciones técnicas del documento ANEXO TÉCNICO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", que hacen parte integral del convenio interadministrativo No. 1211-2025, suscrito entre la GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER y, el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FUTIC:

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE REDES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE INTERNET COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD CONECTIVIDAD A LOS TES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Objetivo Especifico 1:
Incrementar la penetración y cobertura de conectividad en hogares a través de la implementación de Juntas de Internet - Comunidades de Conectividad (JI-CDC) en los municipios de la región de Catatumbo y, Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander.

Producto:	Servicio de conexiones a redes de acceso
Indicador de Producto:	Conexiones a internet fijo y / o móvil
Medido a través de:	Número de conexiones a internet
Meta:	6000 hogares conectados
Indicador de Producto: Conexiones de	Comunidades de conectividad conectadas
Medido a través de:	Número de conexiones a internet
Meta:	100 Juntas de Internet - Comunidades de Conectividad (JI-CDC) conectadas

Objetivo Especifico 2
Incrementar la conectividad a internet de instituciones educativas en los municipios de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander.

Producto:	Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Indicador de producto:	Soluciones de conectividad en instituciones públicas instaladas
Medido a través de:	Número de centros
Meta:	110 situaciones educativas públicas conectadas

ANEXA AVANZAR CUPES

- DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA.

A efectos de una adecuada compresión del documento y de minimizar las diferencias conceptuales entre quienes lo consulten, se describen a continuación los principales términos empleados.

Acceso: La puesta a disposición por parte de un proveedor a otro proveedor, de recursos físicos y/o lógicos de su red para la provisión de servicios. El acceso implica el uso de las redes. (*Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.1*).

Acceso a Internet: Disponibilidad de medios físicos que incluye todas las funcionalidades y recursos de red nacionales y/o internacionales necesarios para permitir a un usuario interconectarse a la red de Internet y aprovechar sus recursos y servicios. (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 1).

Acceso a las TIC: Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de recursos, aplicaciones herramientas, programas informáticos, equipos, redes y medios; que permiten el almacenamiento, procesamiento, compilación, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes.

Access point (AP) o punto de acceso: Son dispositivos para establecer una conexión inalámbrica entre equipos y pueden formar una red inalámbrica externa (local o Internet)) con la que se pueden interconectar dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbricas. Esta red inalámbrica se llama WLAN (Wireless local área network) y se usa para reducir las conexiones cableadas. Pueden agregarse más puntos a una red para generar redes de cobertura más amplia o conectar antenas más grandes que amplifiquen la señal.

Backbone: Corresponde al termino red troncal o troncal de internet, el cual se considera como una de las principales conexiones de internet. Cada troncal está compuesta por un gran número de enrutadores interconectados, comerciales, gubernamentales, universitarios y de otra índole de gran capacidad que llevan los datos a través de países, continentes y océanos del mundo mediante cables de fibra óptica3.

Banda Ancha: Es la capacidad de transmisión cuyo ancho de banda es suficiente para permitir, de manera combinada, la provisión de voz, datos y video ya sea de manera alámbrica o inalámbrica. Las velocidades efectivas asociadas a la definición de Banda Ancha podrán ser revisadas y actualizadas cuando la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) lo considere apropiado. (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 4) indicando para los servicios ofrecidos a partir del 1 de enero de 2019, corresponde a velocidades mínimo de 25 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida.

Banda Ku: Corresponde a una banda de frecuencia para la tecnología satelital que cubre el espectro electromagnético en el rango de frecuencia de 11 a 20 GHz.

Calidad de servicio (QOS): El efecto global de la calidad de funcionamiento de un servicio que determina el grado de satisfacción del servicio por parte de un usuario. (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 6).

CAPEX: Capital Expenditures (inversiones en bienes de capitales) son inversiones de capital que crean beneficios. Corresponde al costo asociado a los servicios de adecuación e instalación de los equipos (hardware y software) concernientes a la zona Digital

Cargo de acceso y uso de las redes: Corresponde a la tarifa de los operadores, por parte de otros operadores, por concepto de la utilización de sus redes, medido en términos de unidades de tiempo o cualquier otro concepto que resulte apropiado para tal efecto. (Resolución CRT 087 de 1997, artículo 1.2)

Cargo por conexión: Valor que incluye únicamente los costos asociados a la conexión de los servicios de comunicaciones fijas y televisión por suscripción, el cual otorga al usuario el derecho a la conexión e instalación del servicio.

Si se prestan varios servicios de comunicaciones sobre una misma red de acceso, el cargo por conexión corresponde al valor de la conexión e instalación de un servicio más los costos incrementales en que se pueda incurrir por conectar los otros servicios a la red de acceso común. (Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 9, modificada por la Resolución CRC 4930 de 2016).

Caso fortuito y fuerza mayor: El artículo primero de la Ley 95 de 1890 señala que se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto á que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. De igual manera, el Código Civil en su artículo 64 establece que se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.

CCC: Centro de Contacto al Ciudadano. Es el punto integrado donde a través de diferentes canales como teléfono, correo electrónico, se brinda atención, respuestas inmediatas y se realiza seguimiento a las solicitudes a los beneficiarios de los proyectos de la Dirección de Infraestructura.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Acometida Residencial: Es la conexión eléctrica que permite llevar la energía desde la red de distribución de la empresa suministradora hasta una vivienda o edificio de viviendas; ya sea de forma aérea o subterránea, y es un elemento fundamental para dotar de electricidad a los hogares.

Conectividad: Modelo de cofinanciación en el que participen constructores, beneficiarios VIS, prestadores de servicios de Internet, y el Estado.

Enlace Satelital: Es un canal por el cual se envían y/o reciben datos, los cuales viajan a través de señales de radiofrecuencia, que se emiten desde una estación terrena principal (Tele puerto) hasta un satélite, este a su vez reenvía las señales a una estación remota ubicada en cualquier punto de la tierra. En la estación remota se convierten las señales en datos para tener acceso a: internet, telefonía, vídeo, streaming. Esto se logra por medio de un módem satelital.

Equipo Terminal: Dispositivo que permite el acceso a una red de telecomunicaciones, que está destinado a ser conectado directamente por cualquier medio a interfaces, entendidas estas últimas como puntos de terminación de red, tanto físicos como radioeléctricos. (Resolución CRT 087 de 1997, artículo 1.2, Adicionada por la Resolución CRC 4507 de 2014).

Fibra Óptica1: La fibra óptica se compone de filamentos de vidrio, aunque algunas veces se pueden encontrar de plástico. La forma de enviar información a través de la fibra óptica es a través de haces de luz, los cuales viajan dentro de ella. En telecomunicaciones, es el medio de transmisión más utilizado gracias a la gran capacidad que tiene de enviar información, ya que a través de un hilo de fibra óptica se pueden enviar millones de bits por segundo (bps) y acceder a servicios de manera simultánea con gran velocidad y calidad

FUTIC - Fondo Único de TIC: Corresponde al Fondo único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al que se refiere la Ley 1341 de 2009.

GEO: Corresponde a la órbita terrestre ubicada a 35,786 km de altitud, donde los satélites se mueven a la misma velocidad de rotación de la Tierra, manteniéndose fijos sobre un punto del planeta. Son ideales para telecomunicaciones, radiodifusión y monitoreo meteorológico, ya que ofrecen cobertura continua en amplias regiones. Sin embargo, presentan mayor latencia en comparación con las órbitas LEO y MEO.

GPON: Son las siglas de Gigabit Passive Optical Network, la alternativa a la conmutación Ethernet en redes de campus. GPON reemplaza el diseño tradicional de Ethernet de tres niveles con una red óptica de dos niveles al eliminar los conmutadores Ethernet de acceso y distribución con dispositivos ópticos pasivos.

Hogar Conectado: Es el hogar a conectar con el proyecto

Interconexión: Es la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos de las redes de telecomunicaciones, incluidas las instalaciones esenciales, necesarias para permitir el inter funcionamiento de redes y la interoperabilidad de plataformas, servicios y/o aplicaciones que permite que usuarios de diferentes redes se comuniquen entre sí o accedan a servicios prestados por otro proveedor. La interconexión de las redes implica el uso de estas y se constituye en un tipo especial de acceso entre proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.7).

Internet: Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación.

Interoperabilidad: Es el correcto funcionamiento de plataformas, servicios y/o aplicaciones que se prestan sobre redes interconectadas, a partir del intercambio mutuo de información y la utilización de esta. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.12).

Instalaciones: Son los elementos de la infraestructura de los operadores. (Resolución CRT 087 de 1997, artículo 1.2).

Instalaciones Esenciales: Toda instalación de una red o servicio de telecomunicaciones que sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o por un número limitado de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, y cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible en lo económico o en lo técnico. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.6).

IP: Una dirección IP (Internet Protocol) es un identificador único asignado a cada dispositivo conectado a una red que utiliza el Protocolo de Internet para comunicarse. Puede ser de dos tipos: IPv4 (formato numérico de 32 bits) e IPv6 (formato alfanumérico de 128 bits). Se usa para identificar y localizar dispositivos en la red, permitiendo la transferencia de datos entre ellos.

Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad (JI-CDC): Para el caso del servicio de Internet comunitario fijo, se entiende como la persona jurídica de naturaleza pública o privada sin ánimo de lucro, integrada por personas naturales o jurídicas que estén unidas por lazos de vecindad y colaboración, cumpliendo con fines cívicos, cooperativos, solidarios, académicos, ecológicos, educativos, recreativos, culturales o institucionales, y que pueden pertenecer a pueblos, organizaciones, comunidades o grupos étnicos

LEO: Corresponde a la órbita terrestre baja, situada entre 160 y 2,000 km de altitud. Los satélites en LEO completan una vuelta alrededor de la Tierra en 90 a 120 minutos, lo que permite una latencia muy baja. Esto los hace ideales para servicios de internet de alta velocidad, videoconferencias, juegos en línea y trading financiero. Las constelaciones de satélites en LEO trabajan en conjunto para proporcionar cobertura global con una menor latencia que las órbitas MEO y GEO.

Medidas Regulatorias: Medidas generales o particulares, adoptadas por la CRC con el fin de solucionar problemas según sean las condiciones de competencia de los mercados de telecomunicaciones. Las medidas de carácter particular serán adoptadas por la CRC mediante resoluciones de carácter particular y concreto. (Resolución CRC 2058 de 2009, artículo 4).

MEO: Corresponde a la órbita terrestre media, ubicada entre 2,000 y 35,786 km de altitud. Los satélites en MEO tienen una velocidad y latencia intermedia entre LEO y GEO, siendo utilizados principalmente para sistemas de navegación, como GPS, y algunos servicios de telecomunicaciones. Su cobertura es mayor que la de LEO, pero con una latencia más alta.

MinTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia.

Nemotécnica: La forma a emplear en la emisión y respuesta de los comunicados generados en el proyecto, asociados a cada una de las etapas y obligaciones contractuales del mismo.

NOC: Network Operations Center por sus siglas en inglés es una ubicación centralizada donde los sistemas informáticos, de telecomunicaciones o de redes satelitales se supervisan y gestionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es la primera línea de defensa contra interrupciones y fallas de la red.

Nodo de Interconexión: Es el elemento, o conjunto de elementos, de red que permite recibir, conmutar, enrutar y enviar comunicaciones entre diferentes redes. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.13).

OLT: El terminal de línea óptica, es un dispositivo que agrega todas las señales ópticas de las ONT en un único haz de luz multiplexado cuando se convierte en una señal eléctrica, formateada según los estándares de paquetes ethernet para el reenvío de capa dos o capa tres.

ONT: El terminal de red óptica conecta los dispositivos de usuarios finales (computadoras de escritorio, teléfonos, etc.) a la red GPON. Proporciona la conversión de señal óptica a eléctrica. Los ONT también proporcionan cifrado AES mediante la clave ONT.

ODF: Distribuidores de fibra óptica también conocidos como repartidores ópticos modulares, son armarios que permiten organizar los conectores terminales de fibra, su diseño los hace ideales para combinar altas densidades de fibras facilitando la operación, seguridad y sencillez de mantenimiento. Se instalan en las centrales EL CONTRATISTA para conectar las fibras que van hacia la red GPON con el OLT

OPEX: "Operating Expense", es un coste permanente para el funcionamiento de un producto, negocio o sistema. Puede traducirse como gasto de funcionamiento, gastos operativos, o gastos operacionales Corresponde al costo asociado a los servicios de operación y mantenimiento de los equipos de hardware y software necesarios concernientes.

Oferta básica de acceso y uso de Infraestructura: Es el proyecto de negocio que un proveedor de la infraestructura pone en conocimiento general y que contiene la definición de todos los elementos mínimos necesarios para el acceso y uso de su infraestructura, sometido a validación de la CRC. (Resolución CRC 4841 de 2015, artículo 3).

Petición para los usuarios del servicio de comunicaciones: Cualquier solicitud de servicios o de información asociada a la prestación de los servicios que presta el proveedor o cualquier manifestación verbal o escrita del usuario, mediante la cual se solicite ante el proveedor algún derecho derivado de la ejecución del contrato o inherente al mismo. (Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 9).

Phishing: Acto de enviar un correo electrónico a un usuario, afirmando falsamente ser una empresa legítima, en donde el usuario es dirigido a una página Web falsa, con el objeto de que el usuario entregue información privada que será utilizada para el robo de identidad y contraseñas. (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 25).

Promoción y apropiación: Corresponde al costo de las actividades en sitio para generar interacción de los ciudadanos con las Zona Digital. Adicionalmente, actividades de difusión como eventos, material POP, etc, y distintas estrategias de Promoción.

PQR para los usuarios del servicio de comunicaciones: Petición, queja o recurso formulado por el usuario ante el proveedor de servicios de comunicaciones, que contribuye al adecuado ejercicio de sus derechos. (Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 9)

Proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST): Persona jurídica responsable de la operación de redes y/o de la provisión de servicios de telecomunicaciones a terceros. En consecuencia, todos aquellos proveedores habilitados bajo regímenes legales previos a la Ley 1341 de 2009 se consideran cobijados por la presente definición. (Resolución CRC 3501 de 2011, artículo 3, numeral 3.8).

Proveedor de bienes y servicio: Persona natural o jurídica que suministra productos, materiales, insumos o presta servicios a entidades públicas o privadas.

Proveedor en el régimen de acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones: Persona natural o jurídica que, sirviéndose de redes de telecomunicaciones, presta a terceros servicios de telecomunicaciones, provee contenidos y/o aplicaciones, o comercializa redes o servicios de telecomunicaciones. Dicho proveedor puede o no operar una red. (Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 3, numeral 3.15).

PMP: Soluciones inalámbricas de redes punto multipunto que utilizan antenas omnidireccionales o sectoriales para establecer

conexiones inalámbricas entre un punto central y varios puntos remotos, es decir, varios puntos remotos comparten una conexión con el punto central.

Red de acceso2: Esta red tiene un alcance de pocos kilómetros (generalmente dentro de una ciudad o municipio), y utiliza principalmente alguna de las siguientes tecnologías: ADSL, DOCSIS, WiMax, UMTS, HSPA, LTE VSAT y/o líneas dedicadas

Red de alimentación: Conjunto de equipos activos y pasivos de telecomunicaciones, cables, regletas, conectores y demás elementos que hacen parte de una derivación de la red de acceso de telecomunicaciones, de propiedad del proveedor de servicios de telecomunicaciones, que conectan la red interna de telecomunicaciones del inmueble con las centrales o nodos de comunicaciones de las redes de dicho proveedor. (Resolución CRC 3499 de 2011, artículo 3, numeral 3.2)

Red de telecomunicaciones: Conjunto de nodos y enlaces alámbricos, radioeléctricos, ópticos u otros sistemas electromagnéticos, incluidos todos sus componentes físicos y lógicos necesarios, que proveen conexiones entre dos

(2) o más puntos, fijos o móviles, terrestres o espaciales, para cursar telecomunicaciones. Para su conexión a la red, los terminales deberán ser homologados y no forman parte de la misma. (MinTIC, Resolición 202 de 2010, artículo 1).

Red de transporte3: Consiste en la infraestructura, medios de transmisión y equipos necesarios para transportar las señales de telecomunicaciones. Esta red está constituida por enlaces que unen distintas zonas de una misma ciudad, así como las diversas regiones y municipios, y utiliza principalmente tres clases de medios de transporte: fibra óptica, enlaces microondas y enlaces satelitales.

SLA: Acuerdo de nivel de servicio o "Service Level Agreement" por sus siglas en Inglés Sistema básico de puesta a tierra: conjunto de elementos diseñados para proporcionar una conexión segura entre las partes metálicas de una instalación eléctrica y la tierra, con el objetivo de proteger tanto a las personas como a los equipos eléctricos de posibles fallas o descargas eléctricas. Compuesto por picas o jabalinas, conductor de puesta a tierra y sistema de conexión.

Sostenibilidad: Condición que garantiza que los objetivos e impactos positivos del proyecto de inversión perduren de forma duradera después de transferencia de los beneficios y la operatividad del servicio a la comunidad.

Tarifa social: Corresponde al pago mensual realizado por los usuarios el cual es establecido por la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad para la prestación del servicio de internet a los hogares y garantiza además de la sostenibilidad del proyecto, la asequibilidad del beneficiario en el marco de la prestación del servicio de Internet Comunitario Fijo.

Telecomunicaciones: Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos y sonidos, datos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios visuales u otros sistemas electromagnéticos. (Ley 72 de 1989, artículo 2).

TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones definidas conforme al artículo 6° de la Ley 1341 de 2009. (Resolución CRC 3066 de 2011, artículo 9).

Tránsito IP/Capacidad húmeda: Conexión a las redes mundiales que no se alcancen a través de las conexiones directas establecidas. Esta conexión se realiza a través de los cables submarinos que conectan Colombia con Estados Unidos y se realizan en Miami y Ashburn.

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones. (Resolución CRT 087 de 1997, artículo 1.2).

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

UPS: Es un sistema de alimentación ininterrumpida (unstoppable power supply), puede proporcionar o suministrar energía eléctrica por un tiempo limitado durante un corte de energía debido a sus baterías y otros elementos encargados de almacenar energía.

Velocidad efectiva de transmisión de datos: Es la capacidad de transmisión medida en Kbps, incluyendo tanto el segmento de acceso como los canales nacionales e internacionales, y que corresponde al valor mínimo de las mediciones asociadas al parámetro establecido en el numeral 5.2.3 de la recomendación ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-10). (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 3)

Verificación remota: Se refiere al monitoreo y verificación a distancia de los parámetros técnicos objeto de estudio, con equipos y personal especializado, que permitan una atención de las solicitudes de manera precisa y de acuerdo con las necesidades requeridas, para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de cobertura, verificación del cumplimiento de condiciones calidad, prestación del servicio, ancho de banda de internet, usuarios, acceso a internet, entre otros.

Visita de campo: Se refiere a la verificación de parámetros técnicos en el sitio motivo de estudio, con equipos y personal especializado, que permitan una atención de las solicitudes de manera precisa y de acuerdo con las necesidades requeridas.

Vulnerabilidad: Cualquier debilidad que podría explotarse con el fin de violar un sistema o la información que contiene. (Resolución CRC 3067 de 2011, artículo 1.8, numeral 28)

WIFI (Wireless Fidelity): Es una tecnología de red inalámbrica a través de la cual los dispositivos, como computadoras (portátiles y de escritorio), dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y accesorios) y otros equipos (impresoras y videocámaras), pueden interactuar con Internet. Permite que estos dispositivos, entre tantos otros, intercambien información entre sí y establezcan, de esta manera, una red. La conectividad a Internet se logra a través de un Router inalámbrico. Cuando accedera wifi, se conecta a un router inalámbrico que permite que los dispositivos que admiten wifi interactúen con Internet

- DESCRIPCIÓN GENERAL Y UBICACIÓN

El proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER", está orientado a proveer el despliegue, instalación y puesta en servicio de 100 Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad (JI-CDC), conectividad a internet de 6000 hogares y 110 instituciones educativas en los municipios de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Santander, quienes además cuentan con una baja penetración de acceso a internet

Figura 1 Ubicación del proyecto



De la figura 1 anterior, los municipio focalizados corresponden a los sombreados

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Tabla 1 Penetración de Acceso a Internet

CÓDIGO DANE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	No. ACCESOS FIJOS A INTERNET	POBLACIÓN DANE	PENETRACIÓN Accesos / Población
54003	NORTE DE SANTANDER	ABREGO	2.230	35.936	6,2%
54206	NORTE DE SANTANDER	CONVENCIÓN	80	21.175	0,4%
54245	NORTE DE SANTANDER	EL CARMEN	343	15.080	2,3%
54250	NORTE DE SANTANDER	EL TARRA	169	23.521	0,7%
54261	NORTE DE SANTANDER	EL ZULIA	1.435	30.816	4,7%
54344	NORTE DE SANTANDER	HACARI	89	11.559	0,8%
54398	NORTE DE SANTANDER	LA PLAYA	219	8.741	2,5%
54405	NORTE DE SANTANDER	LOS PATIOS	18.868	103.733	18,2%
54498	NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	7.863	135.344	5,8%
54553	NORTE DE SANTANDER	PUERTO SANTANDER	1.149	9.913	11,6%
54670	NORTE DE SANTANDER	SAN CALIXTO	28	14.495	0,2%
54673	NORTE DE SANTANDER	SAN CAYETANO	1.267	8.102	15,6%
54001	NORTE DE SANTANDER	SAN JOSE DE CUCUTA	123.478	812.176	15,2%
54720	NORTE DE SANTANDER	SARDINATA	1.060	28.989	3,7%
54800	NORTE DE SANTANDER	TEORAMA	42	18.731	0,2%
54810	NORTE DE SANTANDER	TIBU	1.798	62.151	2,9%
54874	NORTE DE SANTANDER	VILLA DEL ROSARIO	17.730	116.221	15,3%

- ALCANCE DEL PROYECTO

EL CONTRATISTA operador deberá diseñar, implementar, entregar en servicio, prestar la asistencia en la operación y mantener una solución de red de acceso capaz de **garantizar el suministro del servicio de internet comunitario fijo a los 6000 hogares asociados de las 100 Juntas de Internet - Comunidades de Conectividad (JI-CDC)** beneficiarias con el proyecto. Así mismo deberá estructurar los planes de formación y brindar la capacitación requerida para que las Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad (JI-CDC) puedan, de manera autónoma, adelantar los procesos que les permita administrar, gestionar, operar y mantener el servicio de internet comunitario fijo.

Además, deberá diseñar, **implementar y prestar el servicio de Internet en 110 Instituciones educativas** priorizadas de los municipios de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander.

EL CONTRATISTA operador realizará el estudio de sitio, el diseño de la red de acceso, el suministro de los bienes e insumos para la instalación de la red y su puesta en funcionamiento para las Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad (JI- CDC) y para las instituciones educativas; así mismo garantizará la transferencia de conocimiento a los Asociados a la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC), siguiendo las siguientes etapas:

- PLANEACIÓN

En esta etapa el contratista operador a partir del proceso de sensibilización y caracterización realizado por la oficina de fomento regional de TIC de MINTIC de las 100 Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad

(JI-CDC) realizara el estudio de sitio, el diseño de la red de acceso proyectando la infraestructura necesaria para la instalación y elaborara el plan de trabajo hasta la entrega en operación de la solución de conectividad a la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad.

Para las instituciones educativas realizará el estudio de sitio y el diseño de la red de acceso que permitirá prestar el servicio de conectividad de acuerdo con los parámetros establecidos, además proyectará la infraestructura necesaria para la instalación y elaborará el plan de trabajo.

EL CONTRATISTA realizará la planeación e implementación y puesta en servicio de los nodos de servicio satelital, de forma que se configuren los puntos de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad y de la Institución Educativa.

La Junta de Internet – Comunidad de Conectividad, por medio de su(s) delegado(s) participará en la planeación facilitando al Ejecutor el acceso a la zona, brindando la información necesaria y de manera activa aprendiendo del proceso.

Durante la etapa de planeación EL CONTRATISTA deberá entregar por metas de planeación, definidas en el plan detallado de trabajo, para aprobación de la interventoría y/o supervisión los estudios de campo, el informe de ingeniería y operación, el plan de instalación y puesta en servicio y el plan de mantenimiento para cada una de las **100 Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad (JI-CDC)** y las **110 instituciones educativas**

- INSTALACIÓN

Considerando las actividades realizadas en la etapa de planeación, EL CONTRATISTA realizará el suministro e instalación y configuración de toda la infraestructura de la red de acceso, red de última milla y equipos de usuario para el acceso a internet en los hogares de los asociados de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad, así como de las instituciones educativas.

Además, se realiza la puesta a punto del nodo principal y del equipo de monitoreo de la red, y se hacen las respectivas pruebas de funcionamiento y estabilización, que incluye la conexión del servicio satelital para los nodos.

La Junta de Internet – Comunidad de Conectividad, por medio de su(s) delegado(s) participará en la instalación y configuración de la solución tecnológica de manera activa, aprendiendo y adquiriendo conocimientos por medio de la transferencia práctica de conocimiento realizada por EL CONTRATISTA.

Durante la etapa de instalación, EL CONTRATISTA deberá entregar por metas de instalación, definidas en el plan detallado de trabajo, para aprobación de la interventoría y/o supervisión, la instalación de la infraestructura física y digital de la red troncal y red de acceso implementada para cada una de las **100 Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad (JI-CDC)** y las **110 instituciones educativas.**

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La gestión, operación y mantenimiento se enfoca a garantizar la calidad y disponibilidad de la red para la prestación eficiente y estable del servicio, la gestión de red y su monitoreo, la atención a fallos o incidentes y el mantenimiento preventivo y correctivo, como mínimo. La gestión, operación y el mantenimiento de la red de acceso es responsabilidad del EL CONTRATISTA, que se apoyará en los miembros seleccionados por la comunidad para "capacitarse haciendo".

La gestión, operación y mantenimiento,de la red de acceso, incluye el soporte de nivel 1, 2 y 3, así como el suministro de repuestos, mantenimiento preventivo, correctivo y solución de incidentes. Después de los doce (12) meses de operación, la Junta de Internet realizará la operación y mantenimiento de la red de acceso, limitada al soporte de bajo nivel: niveles 1 y 2. Período en el cual, con base en la capacitación y curva de aprendizaje de los primeros doce (12) meses del proyecto, la Junta de Internet se hace cargo de la gestión de la red de acceso.

El contratista estará a cargo del servicio de soporte de nivel 3, ligado a la resolución avanzada de problemas técnicos complejos, también denominados soporte de back end, el cual se trata de un soporte de alto nivel, donde los agentes son responsables por resolver los problemas más complejos. Será responsabilidad de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad el reporte de los nuevos accesos de INTERNET fijo en el Sistema de Información Integral del Sector de TIC –Colombia TIC.

Para las instituciones educativas, una vez concluida la etapa de instalación el contratista iniciará la etapa de operación y mantenimiento para garantizar el servicio de conectividad en las sedes educativas por un periodo de dieciocho (18) meses, además deberá presentar en el Plan de Sostenibilidad el costo fijo anual del servicio con el fin de que el Cooperante (Gobernación de Norte de Santander) garantice la disponibilidad del servicio con recursos de naturaleza permanente, una vez finalizada la etapa de operación correspondiente a los primeros dieciocho (18) meses de operación

- CAPACITACIÓN


La capacitación tiene como objetivo el aprendizaje y formación de la comunidad, que busca mejorar las habilidades, conocimientos y competencias de lo(s) delegado(s) de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad, para lograr la transferencia de conocimiento y la adquisición de las competencias requeridas para desempeñar las tareas y funciones, operación y mantenimiento básico de las redes de acceso.

Durante este proceso, se espera que la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad inicie la implementación de los módulos de la facturación, los canales de comunicación con la comunidad, determinando los roles del personal que apoyará las gestiones para la prestación del Servicio de Internet Fijo Comunitario, atendiendo las novedades y PQRSD que se presenten, entre otros aspectos administrativos.

- ARQUITECTURA DE CONECTIVIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL NODO DE SERVICIOS.

Las actividades de la etapa o fase CAPEX Corresponden a los costos relacionados con la infraestructura tecnológica de red necesaria para implementar las 100 Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad (JI-CDC) e instalar el servicio de internet fijo en los 6000 hogares urbanos y rurales además de las 110 instituciones educativas de los municipios de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander. Para la solución tecnológica se plantea una red troncal a través de la configuración de múltiples accesos satelitales en órbita LEO y para los hogares además de una red de acceso de última milla a través de radioenlaces en tecnología GPON

Figura 2 Diagrama de bloques de la solución

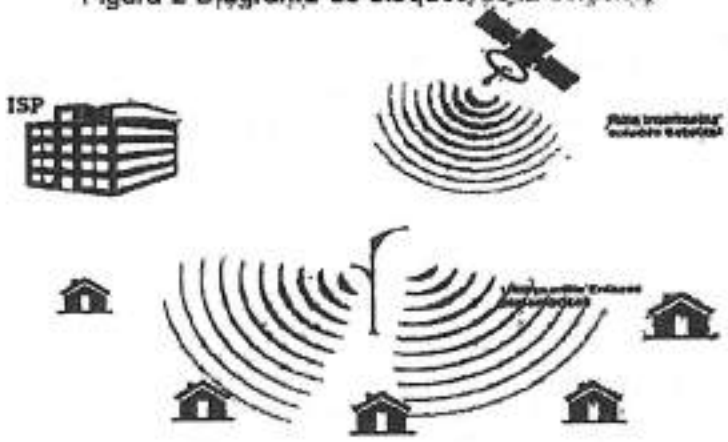

Las redes de acceso a través de radioenlaces para última milla son utilizadas como una alternativa de solución debido a las propiedades que posee la fibra óptica como medio de transmisión. Entre las principales propiedades de este medio de transmisión, se encuentra: un gran ancho de banda flexible capaz de ofrecer a los usuarios velocidades en el orden de los Mbps (Mega Bits Por Segundo).

Diez (10) días hábiles después de la firma del acta de inicio, el Cooperante deberá iniciar con la presentación del plan de ingeniería de detalle con el diseño de la arquitectura a implementar para cada junta de internet – comunidad de conectividad, en el que incluirá lo correspondiente al diagrama de la topología de red a usar, incluyendo la referencia de los equipos a instalar en la solución, este contará de manera general con la red troncal y la red de acceso para cada Junta de Internet – Comunidad de conectividad beneficiada por el proyecto, posterior a cada presentación, la Interventoría contará con cinco (5) días hábiles para la emisión de las observaciones resultantes o en su defecto del respectivo concepto de aprobación.

NOTA: EL DEPARTAMENTO garantizará que EL CONTRATISTA gestione y contrate durante el periodo inicial del proyecto la infraestructura necesaria, para la implementación de las 100 juntas de internet – comunidades de conectividad (JI- CDC) que brindaran la cobertura de internet a los 6000 hogares y la conectividad de las 110 instituciones educativas. Además, se garantice que EL CONTRATISTA asuma los trámites y gestión de permisos y licencias a que haya lugar para llevar a cabo el proyecto.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- NODOS DE CONEXIÓN PARA LAS JI-CDC

El nodo de servicios de la Junta de Internet – Comunidad de conectividad es el espacio físico provisto por cada Junta de Acción Comunal o entidad sin ánimo de lucro participante para EL CONTRATISTA realice las adecuaciones necesarias para brindar la capacidad troncal a Internet a través del servicio satelital y realice la instalación y puesta en operación de los equipos del nodo de servicio de la red de acceso.

El espacio para el nodo será provisto por cada Junta de Internet – Comunidad de conectividad, cumplirá con los requisitos técnicos, de seguridad, accesibilidad, protección contra las condiciones ambientales para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y asegurar como mínimo las siguientes características:

- **Disponibilidad de energía**
  Circuito eléctrico – Toma eléctrico 110-120 VAC (Acometida residencial que garantice el punto de alimentación del servicio de energía eléctrica al interior del nodo de servicio). Deberá tener contratado el servicio de energía domiciliaria y asumir el costo que se derive del consumo, o contar con una fuente de energía propia.

- **Espacio bajo Techo**
  Dimensiones: 2 metros x 2 metros (4 m²)
  Propósito: Ubicación del gabinete y los equipos necesarios para la Junta de Internet – Comunidad de conectividad.

- **Toma de Energía Eléctrica**
  Disponibilidad de una toma de energía eléctrica en el espacio provisto
  Voltaje y amperaje adecuados para alimentar los equipos de la junta (120Vac)

- **Espacio al Aire Libre para la instalación de la red de acceso de última milla PTMP - FWA**
  Espacio disponible al aire libre para la ubicación de la torre
  Dimensiones y características estructurales adecuadas para soportar la torre

- **Espacio en Fachada o Terraza para la instalación de las antenas satelitales**
  Espacio disponible en la fachada o terraza del edificio
  Propósito: Instalación de la antena satelital

El contratista realizará la adecuación del sitio provisto por la Junta de Internet – Comunidad de conectividad, para el funcionamiento del nodo, adecuación que consistirá en el tendido de la red eléctrica desde el rack indoor hasta el tablero o breakers eléctricos, la instalación del sistema de tierra, la adecuación y cableado para la interconexión con la red de acceso y con la red troncal, adecuación del sitio y suministro, instalación y configuración de los siguientes elementos:

- Kits satelitales (Antena y modem) necesarias de acuerdo con la ingeniería de detalle.
- Gabinete (rack) de pared INDOOR de 14 unidades de rack, de las cuales se encuentran libres para instalación de equipo de red de acceso 4 unidades.
- UPS mínimo de 3KVA.

- Sistema básico de puesta a tierra.
- Mástil Metálico.
- Switch 8 puertos con funciones de capa 3.
- Protecciones eléctricas

EL CONTRATISTA debe realizar el diseño para la instalación de los equipos de la red de acceso, a partir de las condiciones físicas y ambientales del sitio dispuesto por la comunidad y ya adecuado por EL CONTRATISTA.


EL CONTRATISTA sobre el equipo Switch Capa 3, dispondrá de puertos Ópticos y/o Eléctricos con los cuales interconectará los equipos de la red de acceso para proporcionar acceso a los hogares de la Junta de Internet

- CARACTERISTICAS DE LAS REDES PUNTO MULTIPUNTO (FWA)

Las redes de acceso inalámbrico Punto Multipunto se componen de diferentes elementos claves que permiten la comunicación entre el punto central emisor y los múltiples puntos remotos. A continuación, se relacionan los componentes principales para una red de este tipo:

A continuación, se describe en alto nivel la arquitectura de la red Punto Multipunto:

Figura 3 Arquitectura de red activa Punto Multipunto

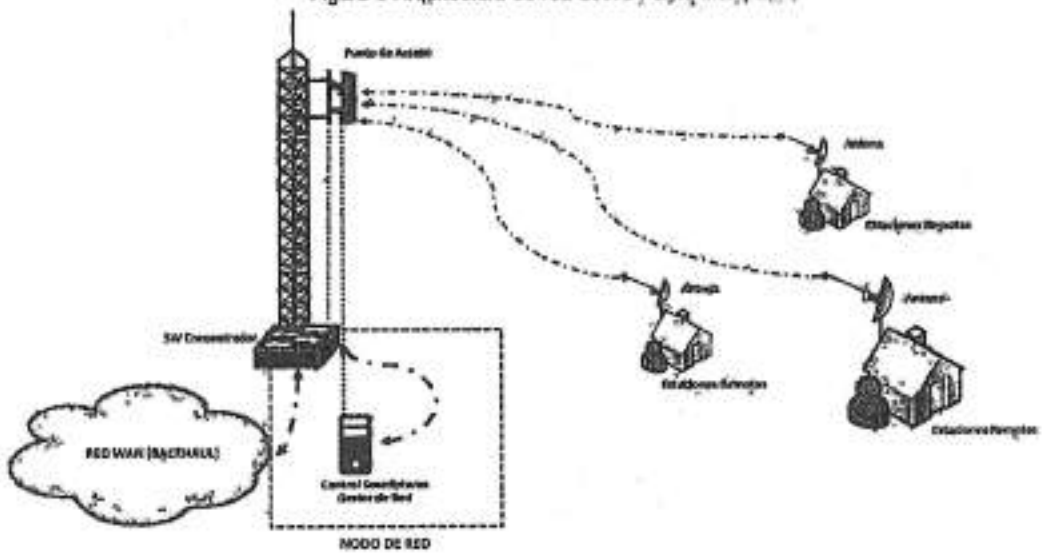

A continuación, se describe funcionalmente y de forma general, los componentes incluidos en la Arquitectura de la Red:

Punto de Acceso (AP): Este es el dispositivo central que se conecta a la red principal y transmite la señal inalámbrica a los dispositivos remotos. Actúe como el concentrador de la red.

Dispositivos Remotos (CPE): Los dispositivos de los hogares finales que se conectan al punto de acceso. Cada dispositivo remoto tiene una antena para recibir y enviar señales.

Antenas: Tanto el punto de acceso como las estaciones remotas utilizan antenas para la transmisión y recepción de señales. Las antenas pueden ser omnidireccionales (cubren un área amplia) o direccionales (enfocadas en una dirección especifica) dependiendo de la topología de la red

Backhaul: La conexión que une el punto de acceso a la red principal o a Internet. Puede ser una conexión cableada (fibra óptica, Ethernet) o inalámbrica (enlaces de radio, satélite).

Controlador o Gestor de Red: Un dispositivo o software que gestiona y optimiza el rendimiento de la red, asegurando que los datos se transmitan de manera eficiente y segura.

Estos componentes trabajan juntos para proporcionar conectividad inalámbrica a múltiples hogares desde un solo punto central, haciendo eficiente el uso de recursos y facilitando la gestión de la red.

- CONEXIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

El contratista Ejecutor realizará la adecuación del sitio provisto por la Institución Educativa, para el funcionamiento del servicio de conectividad, adecuación que consistirá en el tendido de la red eléctrica desde el rack indoor hasta el tablero o breakers eléctricos, la instalación del sistema de tierra, la adecuación y cableado para la interconexión con la red de acceso y con la red troncal, adecuación del sitio y suministro, instalación y configuración de los siguientes elementos.

- Kit satelital (Antena y Modem).
- Gabinete (rack) de pared INDOOR de 10 unidades de rack, de las cuales se encuentran libres para instalación de equipo de red de acceso 4 unidades.
- UPS mínimo de 1KVA.
- Sistema básico de puesta a tierra.
- Puntos de acceso interno y externo ubicados estratégicamente para el acceso de la comunidad educativa.
- Protecciones eléctricas.

El contratista debe realizar el diseño para la instalación de los equipos de la red de acceso, a partir de las condiciones físicas y ambientales del sitio dispuestas por la institución educativa.

- CÁLCULOS Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SISTEMA

EL CONTRATISTA deberá realizar el cálculo y análisis del sistema que permita dimensionar en cada estudio de sitio e informe de ingeniería de detalle el diseño de red de acceso y red satelital necesario para cada Junta de Internet –

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Comunidad de Conectividad, que garantice la prestación del servicio de internet comunitario acorde al estándar de banda ancha TR-069 con velocidades de 25 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida, rehusó de 1:8 y una capacidad satelital con prioridad mensual de 20Gb mínimo por hogar beneficiario; así mismo EL CONTRATISTA deberá garantizar la prestación del servicio de internet en cada institución educativa con velocidades de 40 Mbps a 220 Mbps de bajada y 8 Mbps a 50 Mbps de subida con prioridad mensual de 1Tb mínimo por institución educativa, como se detalla en la tabla a continuación:

Tabla 2 Velocidad efectiva por hogar e institución educativa

Tipo de Servicio	Total	Variable: Velocidad Efectiva de Tx de datos (Descarga/Carga; Prioridad)	Medio
Hogar conectado a través de JI-CDC	6000	25 Mbps / 5 Mbps; Rehusó 1:8; Prioridad: 20Gb	Satelital
Institución Educativa	110	40-200 Mbps / 8-50 Mbps; Prioridad: 1Tb	

- SOLUCIÓN TECNOLÓGICA A IMPLEMENTAR

La tecnología seleccionada deberá permitir la ampliación futura de la capacidad y cobertura de la red mediante: Inclusión de nuevos puntos de acceso sin interrupción del servicio.

- Compatibilidad con futuras actualizaciones en equipos/elementos de red de acuerdo con la normatividad vigente.
- Sostenibilidad tecnológica: EL CONTRATISTA deberá garantizar que los equipos seleccionados cuenten con soporte técnico y actualizaciones de firmware durante al menos 3 años.

El contratista podrá seleccionar los equipos de comunicaciones, de datos, software y todos los elementos y accesorios para implementar, poner en funcionamiento y operar las redes de acceso, SIEMPRE Y CUANDO sean nuevos, tengan representación en Colombia, presenten garantía mínima de calidad de veinticuatro (24) meses, garanticen el cumplimiento de las características mínimas del servicio de las especificaciones técnicas y de los componentes de red, establecidas en este Anexo y cuenten con el aval de la interventoría y supervisión.

- ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL SERVICIO

Dentro de las consideraciones que se deben tener presente para la entrega del servicio se incluyen:

- **Velocidad:** El contratista deberá realizar el cálculo y análisis del sistema que permita dimensionar en cada estudio de sitio e informe de ingeniería de detalle el diseño de red de acceso y red satelital necesario para cada Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC), que garantice la prestación del servicio de internet comunitario acorde al estándar de banda ancha con velocidades de 25 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida, rehusó de 1:8, una capacidad satelital con prioridad mensual de 20Gb mínimo por hogar beneficiario y dándole cumplimiento al protocolo TR-069; así mismo EL CONTRATISTA deberá garantizar la prestación del servicio de internet en cada institución educativa con velocidades de 40 Mbps a 220 Mbps de bajada y 8 Mbps a 50 Mbps de subida con prioridad mensual de 1Tb mínimo por institución educativa.

- **Baja Latencia:** Para experimentar una buena experiencia de usuario, se debe mantener este parámetro lo más bajo posible, es decir < 100 ms, en la red de acceso.
- **Calidad de Servicio (QoS):** Se debe contar con administración de parámetros dentro de la gestión del servicio, para priorizar el tráfico de datos crítico. Esto permitirá que aplicaciones sensibles al tiempo, como la voz sobre IP (VoIP) y el video en tiempo real, tengan prioridad sobre otros tipos de tráfico que se puedan presentar.
- **Fiabilidad y Disponibilidad:** Los diferentes segmentos que conforman la red para el transporte del servicio, tales como la Agregación y Acceso, deben ser fiables con un tiempo de actividad cercano al 100%.
- **Interoperabilidad:** Los diferentes equipos y componentes de la red de acceso, deben ser Interoperables con los estándares internacionales, así como los definidos por la ITU y la IEEE, para asegurar la compatibilidad y operatividad.
- **Seguridad:** Se deben considerar e implementar medidas de seguridad que permitan proteger los datos de los hogares, instituciones educativas y la infraestructura de la red contra amenazas y ataques. EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo señalado en el Capítulo II de la Ley 679 de 2001, en especial respecto de las prohibiciones y deberes frente al uso de redes globales de información en relación con menores de edad. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá impedir el acceso al tipo de páginas que se encuentren establecidas por el ente competente y sus respectivas actualizaciones.
- **Gestión y Monitoreo:** Se debe contar con un sistema para la gestión y el monitoreo de la red, permitiendo la detección y resolución rápida de problemas.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE LA RED DE ACCESO

Los equipos y antenas de la red de acceso deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas mínimas que la ANE (Agencia Nacional de Espectro) y la CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones) regulan en Colombia:

- <u>Puntos de acceso (AP)</u>

Protocolos:

- IEEE 802.11b/g/n: Operan en la banda de 2.4 GHz, ofreciendo velocidades de hasta 600 Mbps en el caso de 802.11n.
- IEEE 802.11a/n/ac: Funcionan en la banda de 5 GHz, con velocidades que pueden alcanzar hasta 1.3 Gbps en 802.11ac.
- IEEE 802.11k: Mejora la gestión de recursos de radio, permitiendo a los dispositivos identificar rápidamente los puntos de acceso disponibles para facilitar el roaming.
- IEEE 802.11v: Permite la gestión de la red inalámbrica, optimizando la transición de dispositivos entre AP y mejorando la eficiencia energética de los dispositivos conectados.

Niveles de Potencia Permitidos en Bandas No Licenciadas:

La ANE establece límites específicos de potencia para dispositivos que operan en bandas no licenciadas, con el fin de minimizar interferencias y garantizar un uso eficiente del espectro. Los niveles permitidos son:

- Banda de 2.4 GHz (2400-2483.5 MHz):
- Potencia Radiada Isotrópica Equivalente (EIRP) máxima: 30 dBm (1 W).
- Banda de 5 GHz:
- 5150-5250 MHz:EIRP máxima: 23 dBm (200 mW).
- 5250-5350 MHz: EIRP máxima: 30 dBm (1 W).
- 5470-5725 MHz: EIRP máxima: 30 dBm (1 W). También requiere DFS y TPC.
- 5725-5850 MHz: EIRP máxima: 36 dBm (4 W)

Requiere implementación de Dynamic Frequency Selection (DFS) y Transmit Power Control (TPC) para evitar interferencias con sistemas prioritarios como radares.

Es importante destacar que, en la banda de 5 GHz, la implementación de DFS y TPC es obligatoria en ciertos sub- rangos para proteger servicios existentes y minimizar interferencias. Además, el uso de antenas de alta ganancia puede requerir ajustes en la potencia de transmisión para cumplir con los límites de EIRP establecidos.

Para garantizar el cumplimiento de estas regulaciones, se recomienda consultar la normativa vigente de la ANE y, en caso de dudas, contactar directamente a la entidad para obtener información actualizada y específica sobre el uso del espectro en Colombia.

Los puntos de acceso (AP) seleccionados por EL CONTRATISTA para la red de acceso deben tener la capacidad suficiente para brindar los servicios de conectividad a internet fijo de banda ancha a cada hogar de la Junta, según lo especifica la CRC. EL CONTRATISTA debe garantizar que el diseño de la red de acceso permita un nivel de intensidad de señal y de relación señal-ruido en todos los hogares que integran la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) de acuerdo con la siguiente referencia:

Para los CPE en entornos residenciales, deberán estar dentro de los siguientes niveles de intensidad de señal:

- **Excelente:** -50 dBm o superior.
- **Buena:** Entre -50 dBm y -60 dBm.

Los valores aceptables de SNR para los CPE en hogares son:

- **Excelente:** 30 dB o superior.
- **Buena:** Entre 25 dB y 30 dB.

Consideraciones Adicionales:

- **Interferencias:** Las bandas no licenciadas, como las de 2.4 GHz y 5 GHz, son susceptibles a interferencias de otros dispositivos. Es esencial realizar un estudio de espectro en la zona de instalación para identificar posibles fuentes de interferencia y seleccionar los canales adecuados.

- **Obstáculos Físicos:** Paredes, estructuras, vegetación y otros objetos pueden atenuar la señal. La planificación de la ubicación de los AP y CPE debe considerar estos factores para optimizar la cobertura.

Tabla 3 Especificaciones de los Puntos de Acceso (AP) de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad

CATEGORIA	ESPECIFICACIONES MINIMAS
Compatibilidad Estándares	- IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz), IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz).
Potencia de Transmisión	- 2.4 GHz: Hasta 30 dBm (1 W). - 5 GHz: - 5150-5250 MHz: Hasta 23 dBm (200 mW). - 5250-5350 MHz y 5470-5725 MHz: Hasta 30 dBm (1 W). - 5725-5850 MHz: Hasta 36 dBm (4 W).
Antenas	- Tipo: Omnidireccionales, sectoriales o direccionales. - Ganancia ajustada al diseño, respetando límites de EIRP. - Soporte MIMO 2x2, 3x3 o 4x4.
Capacidad de Hogares	- Acorde con los requerimientos requeridos por la CRC - QoS para priorización de tráfico (voz, video). - Capacidad para soportar múltiples dispositivos simultáneamente, especialmente en entornos de alta densidad.
Seguridad	- Cifrado: WPA2 mínimo. - Protección contra ataques: Filtrado MAC
Gestión y monitoreo	- Interfaces: Web (HTTP/HTTPS), SNMP v2/v3. - Integración con controladores centralizados. - Análisis de espectro y optimización automática de canales
Rendimiento y latencia	- Velocidades: Hasta 1.2 Gbps (5 GHz, 802.11ac). - Latencia menor a 50 ms. - Capacidad para manejar tráfico de alta demanda en entornos residenciales
Resistencia y entorno	- Clasificación: IP65/IP67 para exteriores. - Protección contra sobretensiones y descargas eléctricas. - Rango de humedad hasta 95% - Resistencia a temperaturas extremas
Conectividad y energía	- Puertos: Ethernet Gigabit (RJ-45). - Soporte PoE (802.3af/at). - Opciones de backhaul: fibra óptica, microondas, enlaces inalámbricos o Satelitales
Compatibilidad normativa	- Cumplimiento ANE y CRC. - Soporte para bandas no licenciadas (2.4 GHz y 5 GHz) con DFS/TPC. - Alinesción con normativas internacionales de seguridad y emisiones.
Actualización y Soporte (HW y SOFTWARE)	- Firmware actualizable a través de métodos remotos. - Garantía mínima de 2 años. - Soporte para actualizaciones de seguridad periódicas

Tabla 4 Especificaciones de los Puntos de Acceso (AP) Indoor de la Institución Educativa

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL AP INTERIOR
Tipo	- Punto de acceso inalámbrico. Conexión dual, Banda de 2,4 GHz y 5.0 GHz.
Uso	- Interior (Indoor)
Norma	- RoHS/WEE (Una de estas normas). - Cumplimiento normativo Nacional para las diferentes bandas de frecuencia. Potencia de emisión ajustable restringida a máximos legales.
Estándares	- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2/ax
Compatibilidad y certificado con WiFi 6 (802.11ax)	- SI
Puertos	- Interface WAN 10/100/1000 Base T Ethernet network interface (RJ 45).
Auto selección de canal	- SI
Balanceador de carga	- SI
Selección dinámicade frecuencias (DFS) dé 802.11	- SI
Seguridad	- WPA/WPA2/WPA-Personal/Empresa, WPA2-Personal/Empresa, WPA3-Personal/Empresa
Protocolo de administración de red	- SNMP v3
Calidad del servicio	- Quality of Service (On board IDS, and secure guest hotspot Access), (WMM, WMMUAPSD, 802.1p, Diffserv and TOS), (QoS/ 802.11e) - (Mínimo una).
Energía	- Los Equipos deben ser alimentados por PoE o PoE+ acorde IEEE 802.3af, IEEE 802.3at.
Administración remota	- SI, Administración desde la plataforma de Gestión de forma remota de manera visual.
Frecuencia	- Conexión dual band, Banda de 2,4 GHz y 5 GHz. - Gestión automática y en tiempo real de la radio (Potencia de transmisión - y Canal – frecuencia (DFS)) que evite las interferencias y solucione defectos de cobertura
SSID múltiples	- Al menos 8
Manuales	- Incluidos
Concurrencia	- EL CONTRATISTA deberá entregar a la Interventoría la ficha técnica del AP, que demuestre la capacidad de conectividad mínima de 128 clientes por AP.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Tabla 5. Especificaciones mínimas de los Puntos de Acceso (AP) Outdoor de la Institución Educativa

ITEM	CARACTERISTICAS ESPECIFICAS MINIMAS DEL AP EXTERIOR
1	- RoHS/WEE (Una de estas normas).
2	- Quality of Service (On board IDS, and secure guest hotspot Access). (WMM, WMM-UAPSD, 802.1p, Diffserv and TOS). (QoS/ 802.11e) (Mínimo una).
3	- 802.1x (capacidad de autenticación por MAC).
4	- Punto de acceso inalámbrico. Conexión dual, Banda de 2,4 GHz y 5 GHz.
5	- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
6	- Índice o grado de protección climática IP 67 según estándar IEC 60529.
7	- Protección contra Descargas Eléctricas.
8	- Interface WAN 10/100/1000 Base T Ethernet network interface (RJ 45).
9	- Cumplimiento normativo Nacional para las diferentes bandas de frecuencia. Potencia de emisión ajustable restringida a máximos legales.
10	- Estándares Inalámbricos MAC: CSMA/CA; FCC:11 canales; Banda ISM:2.4GHz; Banda de 5Ghz
11	- Selección de canal automático en todas las Bandas.
12	- Ajuste de Potencia manual y automático.
13	- Gestión automática y en tiempo real de la radio (Potencia de transmisión y Canal –frecuencia (DFS)) que evite las interferencias y solucione defectos de cobertura.
14	- El equipo de acceso inalámbrico deberá incluir mécanismos que contrarresten los efectos de interferencia para proveer un óptimo servicio en espacios públicos
15	- El equipo debe permitir la configuración y/o conexión a un portal cautivo ya sea propio del equipo o por medio de redirección a un servidor de portales cautivos
16	- Los Equipos deben ser alimentados por PoE ó PoE+ acorde IEEE 802.3af, IEEE 802.3at.
17	- Balanceo y equilibrio de carga entre Puntos de Acceso.
18	- Gestión dinámica de RF canales y frecuencias por cada punto de acceso
19	- EL CONTRATISTA deberá entregar a la Interventoría la ficha técnica del AP, que demuestre la capacidad de conectividad mínima de 1.024 clientes por AP.
20	- Protocolo de Administración de red: SNMP v3

Tabla 6. Especificaciones del Terminal CPE (Customer Premises Equipment)

CONCEPTO	ESPECIFICACIONES MINIMAS
Compatibilidad con Estándares	- IEEE 802.11a/b/g/n/ac según la banda utilizada (2.4 GHz o 5.0 GHz).
Potencia de Transmisión	- **2.4 GHz:** Hasta 20 dBm (100 mW). - **5 GHz:** Hasta 23 dBm (200 mW) en rangos de 5150-5250 MHz.
Sensibilidad del Receptor	- Mínima de **-90 dBm** para enlaces estables a largo alcance.
Seguridad	- Soporte para WPA3 (preferido) y WPA2 como mínimo.
Gestión y Configuración	- Gestión mediante interfaces basadas en web o aplicaciones de escritorio/móviles. - Soporte para SNMP v2/v3 para monitoreo remoto.
Rendimiento	- Velocidades de hasta **600 Mbps** en 5 GHz (802.11ac) y 300 Mbps en 2.4 GHz (802.11n).
Backhaul	- Puertos Ethernet Gigabit para conexión con redes internas. Interface WAN 10/100/1000 Base T Ethernet network interface (RJ 45).
Condiciones de operación Ambiental	- Humedad 10% - 95 % - Protección IP67 para ambientes exteriores.
Energía	- Soporte para PoE (Power over Ethernet) bajo estándar IEEE 802.3af/at.
Normas Ambientales	- Cumplimiento con RoHS (Restriction of Hazardous Substances). - Compatibilidad con WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
Tipo de Antena	- Omnidireccional para entornos con cobertura general. - Direccional (panel o parabólica) para enlaces de largo alcance. - Sectorial para áreas densas. (Según diseño)
Ganancia de antena	- 2.4 GHz: Entre 8 dBi y 14 dBi - 5 GHz: Entre 14 dBi y 25 dBi para enlaces de largo alcance. (Según diseño)
Polarización	- Lineal o dual (vertical y horizontal) según la configuración de la red. - Compatible con MIMO para optimizar el rendimiento.
Beamwidth (Ángulo de Apertura)	- Omnidireccional: Cobertura de 360°. - Sectorial: Apertura entre **60° y 120°.** - Direccional: Haz estrecho menor a **10°** para enlaces PTP. (Según diseño)
Resistencia de la Antena	- Clasificación IP67 - Protección contra vientos de hasta 120 km/h. - Resistente a radiación UV y corrosión para exteriores
Normativa y cumplimiento	- Operación bajo los límites de potencia EIRP establecidos por la ANE y CRC - Cumple con DFS y TPC para operación en 5 GHz.

Tabla 7. Especificaciones del Router Interno Wi-Fi

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS
Puertos Ethernet	- (2) puertos Ethernet 10/100/1000 Base-T
Puerto WAN	- Un (1) puerto WAN
Conexión	- Dual band 2.4 GHz y 5 GHz
Normativa.	- Cumplimiento con RoHS/WEEE y normativas nacionales
Estándares	- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Seguridad	- Soporte para WPA3, WPA2 y WPA (Personal/Empresa)
Gestión remota	- Administración desde plataforma de gestión de forma remota
Calidad de Servicio	- Soporte para QoS (Quality of Service)
Alimentación	- Soporte para PoE o PoE+ (IEEE 802.3af/at)

- BANDAS DE FRECUENCIA A UTILIZAR

El contratista operador del proyecto está en libertad de diseñar la red de acceso haciendo uso de cualquiera de las siguientes bandas no licenciadas, siempre y cuando cumpla con la totalidad de las especificaciones de este anexo y con la normativa nacional de la Agencia Nacional del Espectro, en materia de utilización de frecuencias para bandas no licenciadas.

- 2.4 GHz: Rango de 2400 a 2483.5 MHz.
- 5 GHz: Rango de 5150 a 5850 MHz (según normatividad local).

Esto incluye cada uno de los equipos y elementos necesarios para el despliegue de red inalámbrica punto multipunto (AP, Repetidores, Antenas, Terminales CPE, Router Wifi entre otros) Cada uno de los parámetros y características necesarias para el diseño se deben tener en cuenta partiendo de las características mínimas sin limitarse a las que haya lugar teniendo siempre presente los entes regulatorios en Colombia como la CRC y ANE.

- El diseño de la red deberá garantizar el cumplimiento de los límites de potencia establecidos por las regulaciones locales, la normatividad local y nacional para el despliegue de antenas y la normatividad nacional en materia de exposición a campos electromagnéticos y despliegue de antenas.

- CARÁCTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LA INSTALACIÓN

El contratista dentro de lo contemplado para la instalación y despliegue de la red de Acceso Inalámbrica Punto multi Punto en banda no licenciada, deberá realizar un análisis completo del área de despliegue, con miras a identificar las condiciones físicas, de infraestructura, obstrucciones, cobertura y estudio de espectro en la zona para identificar fuentes de posibles interferencias, seleccionar los canales más adecuados que garanticen el mejor desempeño y permita entregar las velocidades establecidas en cada uno de los hogares que hacen parte de la

Junta de internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC). Adicionalmente deberá gestionar antes las entidades municipales, nacionales, gubernamentales, socioambientales, regulatorio entre otros que haya lugar, para garantizar los permisos y licencias de instalación del equipamiento que hará la cobertura de red inalámbrica en la zona.

Dentro de la gestión de permisos que hará EL CONTRATISTA a nombre de la Junta de internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) se contemplan algunos como:

- Infraestructura
- Aeronáutica
- Socioambientales
- Cultura
- Transporte
- Regulatorios,
- Seguridad
- Seguridad ocupacional

La instalación de Antenas en redes inalámbricas punto-multipunto en zonas rurales o urbanas en Colombia, deben cumplir con los requisitos establecidos por la Agencia Nacional del Espectro (ANE), la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y, de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), según aplique. Además, en áreas urbanas, es obligatorio tramitar permisos de uso de suelos y licencias de construcción con las alcaldías locales, mientras que en zonas rurales se deben seguir las normativas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Todas las instalaciones deben cumplir con los estándares ambientales, de seguridad estructural y con normativas internacionales como la RoHS y la WEEE para minimizar el impacto ambiental.

La antena y su torre deben estar conectadas a un sistema de puesta a tierra cumpliendo con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y la NTC 2050, así como estándares internacionales como IEEE 80 y NFPA 780.

Torres y mástiles deben ser metálicos y conductivos para disipar corrientes de rayos eficientemente.

- CONEXIÓN A LOS HOGARES

Una vez realizada la instalación del AP se procederá con la instalación de los Terminales CPE (Customer Premises Equipment) en los hogares de los asociados a la Junta de internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC).

Completada la instalación de la red de acceso (AP + CPE), EL CONTRATISTA procederá a informar a la supervisión y/o interventoría para la realización de las pruebas de recepción de la red de acceso inalámbrico punto-multipunto, garantizando la calidad del enlace, la estabilidad de la señal y el cumplimiento de los parámetros de rendimiento establecidos.

Esta etapa asegura que el equipo final esté correctamente configurado y alineado con el Access Point (AP) para maximizar la calidad del servicio. Durante la instalación, se verificará la conectividad, se optimizará la señal y se configurará el acceso a internet según las necesidades del cliente y la configuración de equipos utilizados para la solución. Además, se documentará el proceso para asegurar el mantenimiento futuro y se ofrecerá al cliente una explicación básica sobre el uso del servicio. Con esto, el cliente podrá disfrutar de una

conexión confiable y eficiente desde el momento de la instalación. Dentro de las consideraciones mínimas que se deben tener en cuenta están:

Terminal CPE (Customer Premises Equipment)

- Ubicación del CPE en una posición elevada, como un mástil o la parte superior de una pared exterior, garantizando que la antena tenga línea de vista directa hacia el Access Point (AP) del proveedor.
- Fijar el CPE firmemente utilizando soportes metálicos o abrazaderas resistentes, asegurándose de que la instalación sea estable ante condiciones climáticas adversas.
- Orientar el CPE hacia el AP utilizando herramientas como inclinómetros o aplicaciones de alineación para maximizar la calidad de la señal (RSSI).
- Conectar el CPE al sistema eléctrico mediante un inyector PoE, asegurando que este esté protegido contra sobretensiones mediante un protector de picos.
- Proveer del cableado Ethernet necesario en el exterior e interior de manera canalizada y protegida conservando la estética del lugar.
- Configurar el CPE según las indicaciones del fabricante, ingresando las credenciales y parámetros de red (SSID, canal, potencia de transmisión) mediante la interfaz web del equipo.
- Realizar pruebas de conectividad para verificar que los niveles de señal y la latencia sean óptimos antes de proceder con las configuraciones finales.

Router WiFi

- Conectar el cable Ethernet que proviene del CPE al puerto WAN del Router WiFi y asegurar la correcta instalación.
- Ubicar el Router en un punto central dentro de la residencia para maximizar la cobertura inalámbrica, evitando colocarlo cerca de objetos metálicos o paredes gruesas que puedan bloquear la señal.
- Ingresar a la interfaz de configuración del Router utilizando un navegador web y configure los parámetros básicos: SSID, contraseña WPA3 (o WPA2 como mínimo) y canal de transmisión. Configurar Quality of Service (QoS) si es necesario para priorizar aplicaciones críticas como videollamadas o streaming.
- Activar el control parental y redes de invitados, si el cliente lo requiere, para mejorar la seguridad y gestión de hogares.
- Realizar pruebas de conectividad inalámbrica en diferentes áreas del hogar para asegurar que la cobertura sea adecuada, ajustando la posición del Router o la antena si es necesario.

- PRUEBAS DE ENTREGA DEL SERVICIO.

El contratista ejecutor deberá realizar y documentar las siguientes pruebas:

Pruebas de cobertura

- **Niveles de Señal (Calidad del Enlace) RSSI (Received Signal Strength Indicator):**
- Nivel recomendado: Mejor que -65 dBm.
- Nivel mínimo aceptable: Entre -65 dBm y -75 dBm.

Por debajo de -75 dBm: Requiere ajuste de alineación o evaluación de interferencias.

- **SNR (Signal-to-Noise Ratio):**
- Valor recomendado: Mayor a 25 dB.
- Valor mínimo aceptable: Entre 20 dB y 25 dB.

Por debajo de 20 dB: Se espera degradación en la calidad del enlace.

- **Interferencia de Canal:**

Mediante el uso de un analizador de espectro o herramienta de software se debe hacer la identificación de canales limpios.

Niveles recomendados: Ruido de fondo menor a -90 dBm.

Pruebas de Conectividad

Prueba de Ping para validación de la latencia en la red de acceso:

- Latencia hacia el AP Recomendada:
- Máxima permitida: Hasta 10 ms.
- Pérdida de paquetes:
- Recomendada: 0%.

Prueba de velocidad:

Realización y registro de pruebas de Velocidad a través de una herramienta, cuyos resultados deben estar acordes con el diseño de la red troncal realizado por EL CONTRATISTA para cada Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC). Adicionalmente, se deberá realizar pruebas de velocidad a la red de acceso, de manera independiente de la conexión a la red troncal, cuyos resultados deberán mostrar que la red de acceso permite las velocidades mínimas de 25 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida, rehusó de 1:8 y una capacidad satelital con prioridad mensual de 20Gb mínimo por hogar beneficiario.

- ACTUALIZACIONES Y LICENCIAMIENTO DE SOFWARE DE EQUIPOS.

El alcance del suministro de los equipos del proyecto deberá incluir el licenciamiento y actualizaciones de hardware y software por un período de por lo menos cinco (5) años contados a partir del inicio de la etapa de operación y mantenimiento.

- ESTUDIO DE CAMPO Y VIABILIDAD.

EL CONTRATISTA deberá realizar estudios de campo, de manera que evalúe la viabilidad de la instalación en cada una de las Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) e instituciones educativas seleccionadas. Este documento será entregado como evidencia del informe de ingeniería de detalle.

El estudio de campo contempla visitas de personal de EL CONTRATISTA a las Juntas de Internet – Comunidades de conectividad (JI-CDC) e instituciones Educativas.

Los estudios de campo deben presentarse en los plazos establecidos en el Cronograma para el presente proyecto y bajo el formato acordado entre EL CONTRATISTA y la interventoría y/o supervisión.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

El estudio de campo será presentado a la interventoría y/o supervisión quien verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente documento. EL CONTRATISTA, se hace responsable de realizar un estudio de campo para las instalaciones y así poder implementar las 100 Juntas de internet – Comunidades de conectividad (JI-CDC) hacer entrega del servicio de internet a los 6000 hogares beneficiados por el proyecto y conectar las 110 instituciones educativas. El estudio de campo contempla visitas de personal, en las que deberá realizar las actividades necesarias que permitan levantar como mínimo la siguiente información:

- Nombre del Departamento, municipio, referencia de la Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) o Institución educativa con código DANE.
- Cantidad de hogares a conectar con la Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) o Matricula total de la institución educativa.
- Ubicación exacta de la Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) y de los hogares a conectar o de la institución educativa.
- Toma de coordenadas geográficas formato decimal.
- Registro fotográfico completo de la Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) y de los hogares a conectar o de la institución educativa con los espacios asociados a la intervención del proyecto.
- Diagrama de red de la Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) y de los hogares a conectar o de la institución educativa.
- Número telefónico del encargado de la Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) y de los hogares a conectar o de la institución educativa quien será el responsable del servicio.
- Evidenciar que cuenta con servicio eléctrico interconectado y no cuenta con un servicio de internet.
- Condiciones de las instalaciones (civiles, eléctricas, adecuaciones) para la instalación de los equipos, las cuales serán identificadas y registradas por EL CONTRATISTA al momento de realizar los estudios de campo de cada uno de los sitios beneficiados y deberán ser informados y acordados con los responsables de las Juntas de internet – Comunidades de conectividad (JI-CDC) y de los hogares a conectar o de la institución educativa

Para las instituciones educativas, además de lo anterior el estudio de campo debería incluir:

- Horario académico de la Sede Educativa donde se instalará el servicio.
- Verificar el cumplimiento de los siguientes criterios de elegibilidad de las instituciones educativas:

- **Ser de carácter y naturaleza oficial.** Los documentos que soportan el carácter de la Institución Educativa son las resoluciones de autorización de creación y operación de la Institución Educativa, o de fusión, en las cuales debe constar que son de carácter oficial, para ello es necesario utilizar como identificador único de la Institución Educativa o de la sede educativa el código DANE SEDE de esta. No pueden ser beneficiarias instituciones privadas, instituciones mixtas, educación contratada, juntas de acción comunal, jardines infantiles, asociaciones, escuelas comunitarias ni fundaciones. En caso de que la institución educativa no sea de carácter y naturaleza oficial, esta pasará a ser excluida del programa. Para los fines pertinentes a la actualización monetaria de su pago se deberá tener en cuenta como fecha fin la fecha de radicación del estudio de campo de la respectiva institución educativa.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- **No contar con servicio de Internet.** El cumplimiento de este criterio se realizará a través de una certificación expedida por el rector de la Institución Educativa o por la secretaría de educación de la entidad territorial a la cual se encuentra circunscrita la institución educativa.

En caso de contar con servicio de Internet, el rector o en su defecto la secretaría de educación de la entidad territorial deberá incluir en la certificación la fecha de finalización del servicio, el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que lo presta y la fuente de financiación con el fin de que el Ministerio determine la viabilidad de incluir la institución educativa en el marco del presente proyecto dentro de los siguientes dos meses a la radicación del estudio de campo.

En caso de que el Ministerio determine que no es viable incluir la institución educativa en el marco del presente proyecto, y por tanto, la excluya, para los fines pertinentes a la actualización monetaria de su pago se deberá tener en cuenta como fecha final, la fecha de radicación del estudio de campo de la respectiva institución educativa.

En ningún caso, la certificación podrá tener una fecha de expedición superior a 30 días calendario.

- **La Institución Educativa debe contar con fluido eléctrico interconectado a la red para la alimentación de todos los equipos involucrados en la prestación del servicio de internet.** El cumplimiento de este criterio se realizará a través de una certificación firmada por el rector de la institución educativa o por la secretaría de educación de la entidad territorial a la cual se encuentra circunscrita la institución educativa.

En caso de contar no contar con fluido eléctrico interconectado a la red, el rector o en su defecto la secretaría de educación de la entidad territorial deberá presentar dicha claridad con el fin de que el Ministerio determine dentro de los siguientes dos meses a la radicación del estudio de campo la viabilidad de incluir la institución educativa en el marco del presente proyecto.

En caso de que el Ministerio determine que no es viable incluir la institución educativa en el marco del presente proyecto, y por tanto, la excluya, para los fines pertinentes a la actualización monetaria de su pago se deberá tener en cuenta como fecha final, la fecha de radicación del estudio de campo de la respectiva institución educativa.

Al momento de realizar el estudio de campo EL CONTRATISTA deberá suscribir con el rector(a) responsable de la Institución Educativa o una persona autorizada por este, un acta de compromiso en la cual queden determinados los siguientes compromisos:

- Permitir la instalación de los equipos del servicio en la Institución Educativa, sin ningún costo de arrendamiento, incluyendo la realización de las obras civiles en caso de ser necesario, las cuales quedarán en el informe de la visita de campo respectiva y firmadas en el acta de compromiso con la Institución Educativa.
- Permitir el acceso de los técnicos de EL CONTRATISTA, para realizar la instalación del servicio en la Institución Educativa.
- Permitir el acceso de los técnicos de EL CONTRATISTA, en caso de ser necesario realizar un mantenimiento preventivo y/o correctivo, incluido el periodo de vacaciones.

- Permitir el acceso del personal del Ministerio o la interventoría y/o supervisión de ser necesario para realizar verificación de la instalación del servicio en la Institución Educativa y al momento de realizar las visitas de calidad.
- Garantizar que la Institución Educativa o sede Educativa beneficiada, asumirá los costos asociados a los servicios públicos que se generen por el funcionamiento del servicio.
- En caso necesario de realizar modificación a la infraestructura física de la IE, dicha modificación deberá ser aprobada por la IE.
- Garantizar la permanencia mínima de la institución educativa de acuerdo con el tiempo establecido para la obligación de hacer, objeto del presente documento técnico.

- SUSPENSIÓN O EXCLUSIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Se contempla la suspensión o exclusión de Instituciones Educativas, en las fases de planeación, instalación y puesta en servicio y en la de Operación, a solicitud de EL DEPARTAMENTO, EL CONTRATISTA y/o del MINISTERIO TIC, previa aprobación de la supervisión y/o interventoría de acuerdo con las siguientes causales:

- Ausencia de energía eléctrica interconectada a la red.
- Al momento de la instalación y puesta en servicio, la institución educativa cuente con servicio de internet, bien sea prestado por otro proyecto del Ministerio u otra entidad oficial o privada.
- Dada de baja de la Institución Educativa.
- Que el responsable de la Institución Educativa no firme el Acta de Compromiso.
- La exigencia demostrable por parte de la comunidad que se debe realizar el procedimiento de consulta previa.
- Cuando la institución Educativa NO cuente con matrícula escolar.
- Cuando el consumo de datos de la Institución Educativa esté por debajo de 1GB (tráfico total sumado de Download y Upload) al mes, durante dos (2) meses de operación continua, previo acuerdo de EL CONTRATISTA con la interventoría y/o supervisión y verificación de la situación con la institución educativa. Este numeral exceptúa los tiempos de receso, vacaciones o descanso laboral y académico de las Instituciones Educativas.
- Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentadas por EL CONTRATISTA ante la interventoría y/o supervisión, que impidan la instalación y/o aprobación y/o prestación del servicio en la Institución Educativa.
- La Institución Educativa no cumpla con alguno de los criterios establecidos.

El procedimiento detallado a seguir para la realización de exclusión o suspensión se describe a continuación:

- El contratista deberá presentar a la interventoría y/o supervisión la solicitud de exclusión o suspensión, debidamente sustentada de acuerdo con las causales enunciadas en el presente numeral, esta solicitud deberá contener toda la información que permita identificar la Institución Educativa que se va a excluir o suspender relacionando el centro poblado y la sede de la Institución Educativa. La Interventoría y/o supervisión verificará que la justificación para excluir o suspender el sitio del proyecto sea válida y esté soportada.
- La interventoría y/o supervisión emitirá su concepto y recomendaciones al Ministerio con copia al Ejecutor en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la solicitud.

- Si el concepto de la interventoría y/o supervisión no es favorable por elementos formales (insuficiencia de información, etc.), EL CONTRATISTA contará con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, para presentar la información que se requiera.
- Si el concepto es favorable el contratista procederá con la exclusión o suspensión de la Institución Educativa.

La exclusión supone retirar la Institución Educativa del listado de Instituciones Educativas a beneficiar, ya sea en la fase de instalación y puesta en servicio o en la de operación. La suspensión supone no realizar la instalación y puesta en servicio o cesar la prestación del servicio dado que existen situaciones que pueden ser superadas; sin embargo, la suspensión no podrá superar 12 meses, plazo en el cual deberá procederse con la exclusión de la Institución Educativa.

- APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE CAMPO

La revisión de los estudios de campo se adelantará por parte de la interventoría y/o supervisión, en un plazo de diez
(10) días hábiles contados a partir de la presentación de cada una de las entregas de estos. La interventoría y/o supervisión podrá solicitar aclaraciones y complementaciones al estudio de campo para su aprobación de acuerdo con el cronograma definido. No se podrá iniciar la fase de instalación hasta que no esté aprobado el estudio de campo. En el evento en que la interventoría y/o supervisión solicite aclaraciones, presente comentarios o rechace estudios de campo, EL CONTRATISTA contará con un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del pronunciamiento, para presentar los respectivos estudios de campo corregidos, y la interventoría y/o supervisión, tendrá nuevamente un plazo de diez (10) días hábiles para su pronunciamiento definitivo por escrito.

- INFORME DE INGENIERÍA Y OPERACIÓN

Teniendo en cuenta la información obtenida del estudio de campo, EL CONTRATISTA deberá presentar un informe en el cual detallará y sustentará la solución técnica para la prestación del servicio de conectividad a internet para cada Junta de Internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) y a cada institución educativa. En caso de que la solución a presentar en el Informe de Ingeniería y Operación varíe en relación con la solución prevista, deberá así manifestarlo con su respectiva justificación técnica y/o económica que demuestre que la solución por él considerada es la más eficiente lo que será analizado y aprobado o rechazado por el Ministerio.

El Informe de Ingeniería y Operación deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

- Presentación y justificación de la solución técnica a implementar, especificaciones de los elementos de la red de acceso, tipo de tecnología a utilizar, red de interconexión, memorias de cálculo del canal dedicado, velocidades y demás variables técnicas propias de la solución tecnológica.
- Descripción de la infraestructura de comunicaciones a instalar.
- Descripción de todos los equipos y software contemplados para la prestación del servicio de conectividad, incluyendo las certificaciones ISO 9001.
- Diagramas topológicos de la red.
- Documento de la configuración de equipos, servidores y demás equipos empleados para activar los servicios.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- Análisis de riesgos operacionales para los equipos de la red de interconexión en los sitios y para los procesos relacionados con la prestación del servicio.
- Plan de contingencia para mantener el servicio de conectividad a internet según corresponda en cada Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC), hogar e institución educativa.
- Red de acceso y la red de interconexión: La red de acceso y la red de interconexión deberán proveer el acceso a cada uno de los hogares o Instituciones Educativas y su interconexión a la red de Internet. Los elementos de la red de acceso y la red de interconexión en cada sitio deberán contar con la debida interfaz para conexión con la red LAN/WAN instaladas en cada sitio.
- Descripción del uso de infraestructura de soporte y de terceros, así como las gestiones adelantadas para este propósito y la relación de permisos y autorizaciones requeridas.
- Mapas georreferenciados en formato .kmz y .pdf, que ilustren la ubicación de Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC), hogares y las instituciones educativas y brinden información del tipo de conexión, operatividad y demás variables solicitadas por la supervisión y/o interventoría.
- Planos de equipamiento y de obra civil en formatos .dwg y .pdf.
- Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos con terceros para el uso de redes ya existentes.
- Metodología de medición de indicadores.

EL CONTRATISTA deberá garantizar:

- Es indispensable que EL CONTRATISTA cuente con un centro de operación de red en Colombia (NOC) con el fin de atender las fallas de nivel más bajo (Nivel 1 y 2).
- La red de acceso y la red de interconexión deberán incluir todo el equipo de red que permita el monitoreo remoto de velocidad y tráfico por Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) e institución educativa conectada. Para monitoreo de consumo de tráfico se deberá garantizar que este se realiza con resolución en minutos, que permitirá a la interventoría y/o supervisión, la evaluación de comportamiento de tráfico sin la necesidad de desplazamientos a cada sitio. La herramienta de medición instantánea de velocidad también deberá poderse operar remotamente, de tal forma que estas mediciones se puedan realizar el número de veces necesario para garantizar los objetivos ofrecidos de velocidad.
- Es obligación de EL CONTRATISTA asumir los costos asociados a la instalación de la infraestructura requerida para cada sitio. La ubicación y seguridad del equipamiento instalado de cada sitio será responsabilidad de EL CONTRATISTA de acuerdo con el estudio de campo del sitio que se efectúe; así como la adecuación de los sitios para la instalación de los equipos y sus elementos necesarios.
- EL CONTRATISTA debe presentar la propuesta para políticas de QoS.
- Descripción de las funcionalidades del sistema de gestión.
- Si la solución tecnológica prevé la utilización de redes de terceros se debe indicar el nombre del titular de la red.
- Presentar y detallar garantías de los componentes hardware de las soluciones de la red de acceso, red de interconexión en los sitios.
- Propuesta del protocolo de pruebas para la aceptación de la red de acceso, la red de interconexión, acceso.
- Programación de instalación de las Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) e instituciones educativas.

- APROBACIÓN DEL INFORME DE INGENIERÍA Y OPERACIÓN.

La revisión y aprobación o rechazo del Informe de Ingeniería y Operación se adelantarán por parte de la interventoría y/o supervisión, y esta tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles para su aprobación, plazo en el cual podrá solicitar ajustes o la información que considere necesaria. EL CONTRATISTA deberá realizar los ajustes correspondientes en un término de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales la interventoría y/o supervisión tendrá como máximo cinco (5) días hábiles para la revisión de los ajustes que presente EL CONTRATISTA.

Cualquier modificación al Informe de Ingeniería y Operación durante la ejecución del proyecto deberá ser aprobado por la interventoría y/o supervisión, antes de que EL CONTRATISTA instale o realice cualquier modificación en la infraestructura o equipos que se vean involucrados en la prestación del servicio de conectividad.

- CAMBIOS DE TECNOLOGÍA UNA VEZ APROBADO EL INFORME DE INGENIERÍA Y OPERACIÓN.

Como criterio general EL CONTRATISTA no podrá realizar cambios y/o variaciones de las tecnologías presentadas en su oferta y en el Informe de Ingeniería y Operación. No obstante, si por razones técnicas debidamente justificadas y avaladas por la Interventoría y/o supervisión es necesario modificar, EL GONTRATISTA podrá realizar cambios con las siguientes restricciones:

EL CONTRATISTA deberá realizar una solicitud oficial y por escrito a la interventoría y/o supervisión de dicho cambio, acompañando la solicitud de aprobación de un nuevo plan de ingeniería, operación y mantenimiento, en el cual deberá demostrar plenamente que esta modificación no degrada de ninguna manera las condiciones vigentes a la fecha para la prestación del servicio (provenientes del plan inicial, o la última modificación aprobada), y no incumple de ninguna manera la normatividad vigente. La interventoría y/o supervisión podrá rechazar esta solicitud de cambio de tecnología, si a su juicio, no se han ofrecido plenas garantías de las condiciones anteriores.

Estas modificaciones incluyen entre otros: cambio de equipos terminales de la red de acceso, cambios de redes de transporte, cambio de rutas de interconexión, cambios del tipo de solución tecnológica a implementar para el servicio de conectividad a internet. Cabe anotar que en ningún caso los cambios tecnológicos, modificaciones de la capacidad de la red que se realicen sobre las redes aprobadas ni ampliaciones de infraestructura con tecnologías aprobadas pueden desmejorar las condiciones iniciales.

En caso de que la interventoría y/o supervisión apruebe la realización de los cambios tecnológicos o de infraestructura solicitados, EL CONTRATISTA deberá implementar las acciones necesarias para que el proceso de cambio de los equipos no afecte la prestación del servicio ni el cumplimiento de los niveles de calidad exigidos. Lo anterior, debe garantizarse a través de la elaboración de planes de contingencia en los cuales se especifiquen los compromisos de EL CONTRATISTA sobre los períodos de afectación y recuperación del servicio y demás medidas que permitan ofrecer la continuidad en el servicio y la prestación de este en las condiciones exigidas en el presente Anexo.

En ningún caso, EL CONTRATISTA podrá solicitar recursos adicionales a EL DEPARTAMENTO para efectos de realizar las modificaciones al Informe de Ingeniería y Operación, ya que estos correrán por su cuenta y los efectuará bajo su propio riesgo y responsabilidad.

Así mismo, el Ministerio también podrá citar a mesas de trabajo con EL DEPARTAMENTO, EL CONTRATISTA y la interventoría y/o supervisión para analizar y determinar la necesidad de realizar actualizaciones tecnológicas que permitan la prestación del servicio en términos de calidad, capacidad y velocidad.

- PLAN DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría y/o supervisión para su aprobación en el plazo establecido en el cronograma, el Plan de Instalación y puesta en servicio de conectividad a Internet.

El Plan de Instalación y puesta en servicio contendrá como mínimo:

- Una programación de ejecución mensual de la instalación que este acorde con el cronograma establecido en el presente anexo técnico.
- Cantidad de Junta de Internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) e Instituciones Educativas que serán conectadas y puestas en servicio a través del cual se da cumplimiento a la programación enunciada en el literal anterior.
- Ruta crítica para la instalación y puesta en funcionamiento y acciones correctivas de mitigación.
- Todo el personal que realice las instalaciones en campo deberá contar con la certificación de trabajo en alturas donde se requiera, expedido por una entidad debidamente autorizada, cumpliendo con la normatividad vigente.
- Una programación de ejecución mensual por Junta de Internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) e Institución Educativa, en la que se detallen las actividades requeridas para la instalación y puesta en servicio de la conectividad en cada Junta de Internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) e Institución Educativa, incluyendo aquellas relacionadas con la logística de manejo de equipos, transporte, desplazamientos, instalaciones, configuraciones y demás que se deban adelantar desde el diseño de la solución para la Junta de Internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) e Institución Educativa, hasta su puesta en funcionamiento definitiva. Lo anterior se hace necesario para que el Ministerio a través de la supervisión interventoría pueda contar con la información necesaria de planeación y programación de actividades que les permita ejercer un adecuado control y seguimiento a este proyecto.

El contratista podrá realizar cambios al Plan de Instalación, siempre y cuando la modificación sea aprobada por la interventoría y/o supervisión, para lo cual tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de su presentación.

EL CONTRATISTA deberá entregar cada treinta (30) días calendario un avance del plan de instalación y un informe con sus documentos respectivos de soporte. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA la ejecución del Plan de Instalación y puesta en servicio aprobado.

- APROBACIÓN DEL PLAN DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

La revisión y el pronunciamiento de aprobación o rechazo del Plan de Instalación y Puesta en Servicio se adelantará por la interventoría y/o supervisión quien emitirá su concepto, dentro de los diez (10) días hábiles siguiente a su presentación, o solicitará aclaración o complemento de este. En caso de que se soliciten aclaraciones o

complementos del Plan de Instalación y Puesta en Servicio, EL CONTRATISTA deberá realizarlas dentro de un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.

Una vez recibido nuevamente el Plan de Instalación y Puesta en Servicio con las aclaraciones o complementos realizados, la interventoría y/o supervisión contará con un plazo de cinco (5) días hábiles para emitir su concepto.

- PLAN DE MANTENIMIENTO

EL CONTRATISTA es responsable del mantenimiento de los equipos y dispositivos entregados por su cuenta para el desarrollo de la obligación; así las cosas, es su responsabilidad realizar mantenimientos preventivos y correctivos con el fin de garantizar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (ANS) solicitados en el presente Anexo Técnico.

El Plan de Mantenimiento debe contener, como mínimo, lo siguiente:

- Descripción del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, EL CONTRATISTA deberá detallar las actividades a realizar, teniendo presente que en las Junta de Internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC), hogares e Instituciones Educativas siempre se deberá prestar el servicio de manera óptima cumpliendo los indicadores de calidad establecidos en el presente documento.
- Esquema de atención y soporte técnico, especificando niveles, tiempos de escalamiento y prioridades, recurso humano (perfiles), tecnológico (herramientas de hardware y software) y administrativo, así como el sistema de gestión de red.
- Indicar el medio de contacto a utilizar para atender PQRSD de los usuarios.
- Deberá mantenerse actualizado los aspectos de seguridad como configuraciones y filtros de navegación de acuerdo con la normatividad vigente.
- EL CONTRATISTA deberá presentar dentro del Plan de Mantenimiento Correctivo un capítulo para el manejo de contingencias asociadas a riesgos y desastre o fuerza mayor, indicando las actividades de respuesta para la recuperación del servicio.
- Información completa de las características del NOC en Colombia.
- Manual de instrucciones completo de operación del sistema de monitoreo donde se pueda conocer detalladamente el funcionamiento de dicho sistema. Adicionalmente el Ministerio o quien este designe para tal fin, podrán solicitar capacitaciones sobre el manejo del sistema de monitoreo.
- EL CONTRATISTA deberá presentar una metodología para la verificación de la política activa de seguridad física.
- Presentar el dimensionamiento del stock necesario, para atender las fallas que se pueden presentar en la ejecución del proyecto, que le permitan prestar el servicio contratado de manera óptima cumplimento los indicadores de calidad y niveles de servicio establecidos en el presente documento.
- Descripción de la estructura de mantenimiento y la metodología, demostrando que estas serán suficientes para cumplir con los indicadores de calidad y niveles de servicio.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA la ejecución del Plan de Mantenimiento aprobado. En caso de incumplimiento del indicador de disponibilidad, el Ministerio o quien este designe para tal fin podrán solicitar al Ejecutor, la modificación del Plan de Mantenimiento.

- APROBACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

EL CONTRATISTA presentará su plan de Mantenimiento para aprobación de la interventoría y/o supervisión. Cualquier modificación al Plan de Mantenimiento durante la ejecución del proyecto deberá ser informado y avalado por la interventoría y/o supervisión.

La revisión y el pronunciamiento de aprobación o rechazo del Plan de Mantenimiento se adelantará por parte de la interventoría y/o supervisión quien emitirá su concepto dentro de un plazo de diez (10) días hábiles a partir de su presentación, o solicitará la aclaración o complemento de este. En caso de que se soliciten aclaraciones o complementos del Plan Mantenimiento EL CONTRATISTA deberá realizarlas dentro de un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.

Una vez recibido nuevamente el Plan de Mantenimiento con las aclaraciones o complementos realizados, la interventoría y/o supervisión contará con un plazo de cinco (5) días hábiles para emitir su concepto.

- NEMOTECNIA DEL PROYECTO

Cinco (5) días hábiles después de la firma del acta de inicio, se acordará la nemotecnia a emplear en la emisión y respuesta de los comunicados generados en el proyecto, asociados a cada una de las etapas y obligaciones contractuales del mismo.

- FORMATOS DE INSTALACIÓN

Con la finalidad de contar con la evidencia correspondiente a las actividades adelantadas de manera clara y precisa, e deberán diseñar los siguientes formatos:

- **Acta de entrega de instalación del servicio:** Este documento debe ser diligenciado con el usuario responsable del servicio, deberá contar con la información asociada al hogar beneficiado y a la instalación del sitio (fecha de instalación, nombre del municipio, dirección del predio, barrio, coordenadas, estrato, nombre del usuario responsable del servicio, documento de identidad, relación de equipos instalados (nombre, serial, marca y modelo), resultado de las pruebas de Download, Upload, ping y latencia).

  Los documentos en mención deberán estar diligenciados debidamente y en su totalidad, firmados, sin tachones ni enmendaduras y con los soportes pertinentes.

- AVISOS Y MARQUILLAJE

Se debe en cada una de las juntas de internet – comunidades de conectividad (JI-CDC) de los hogares e instituciones educativas instalar un aviso de identificación, el cual debe dejarse ubicado en la entrada del predio una vez completada la instalación del servicio, y como evidencia de la actividad se deberá tomar el registro fotográfico correspondiente. Este deberá contar con el nombre del proyecto, la tecnología y la capacidad del enlace.

Una marquilla es un identificador de red, único e irrepetible con el que se le asigna un código distinto a cada tramo de cable y a cada empalme presente. En esta se relaciona la información correspondiente a su capacidad, tipo de medio, origen y destino.

Los equipos instalados en cada hogar deberán estar identificados mediante un aviso de identificación adhesivo, donde se indique que los equipos son propiedad del Cooperante y se encuentra favorecida por el proyecto y el número de contacto.

Cada equipo instalado deberá estar identificado de manera clara y duradera con:

- Nombre del proyecto y proveedor.
- Código de inventario único.
- Ubicación específica.
- Marca, Modelo y número de serie.
- Especificación técnica resumida (modelo, frecuencia, garancia).
- Etiquetas legibles, permanentes, de material resistente y amigables con el medio ambiente con cumplimiento de normas RoHS y la WEEE.

- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO – CONECTIVIDAD A HOGARES

El Cooperante seleccionará los usuarios beneficiados para completar los 6000 hogares conectados en las 100 Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) de los 17 municipios de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta garantizando además de los criterios de selección la distribución de la cantidad de hogares beneficiarios presentados en la Tabla 1.

La selección de los usuarios beneficiados por el proyecto se realizará durante la etapa de caracterización del proyecto, por tanto, durante la misma este deberá reportar de manera mensual mediante el INFORME DE ESTADO DE AVANCE DE LAS INSTALACIONES, según lo definido en el presente documento técnico.

Los criterios de selección de los usuarios son los siguientes:

- El predio para beneficiar debe corresponder a una vivienda de estrato 1, 2 o a una Vivienda de Interés Prioritarios. Se deberá identificar la dirección y las coordenadas géográficas (Latitud y Longitud), las cuales deberán estandarizarse y usando como respaldo un recibo de servicio público donde se incluya de manera clara la dirección o una foto con la identificación de coordenadas y municipio que identifique el predio.
- Que el predio (Hogar beneficiario) no esté beneficiado por otro proyecto

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- Que el hogar beneficiario no haya contado con un servicio de internet pago, para ello cada beneficiario firmará documento juramentado.
- Se dará prioridad a hogares cuyos integrantes formen parte de la lista integral de beneficiarios de la Agencia de Renovación del Territorio (ART).

El servicio podrá estar a nombre del propietario o arrendatario del predio, lo cual deberá ser identificado y usando copia del documento de identidad. El usuario deberá firmar un documento juramentado asociado a la manifestación de no haber contado con otro servicio de internet.

- CONEXIÓN DEL HOGAR BENEFICIARIO

El proyecto tiene como **objetivo conectar 6000 hogares de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta** del Departamento de Norte de Santander, brindando acceso a internet de alta calidad. Si durante su implementación, se ha identificado la necesidad de ajustar las áreas de cobertura basándose en estudios de factibilidad y en la cantidad de hogares que pueden ser beneficiados en las zonas rurales o urbanas seleccionadas. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se establecén los siguientes lineamientos que permiten la flexibilidad necesaria para alcanzar la meta de hogares conectados.

Para la conexión de los hogares beneficiarios se tendrá en cuenta:

- ***Factibilidad de Conexión***: La selección de las zonas rurales o urbanas inicialmente propuestas se basa en estudios de factibilidad de conexión. Estos estudios consideran factores como la infraestructura, la topografía, y la accesibilidad, entre otros.
- ***Número de Hogares Receptores***: La meta del proyecto es conectar un número específico de hogares. Si durante la implementación se evidencia que no se puede alcanzar esta meta en las zonas inicialmente seleccionadas, se debe permitir la reubicación para asegurar el éxito del proyecto previa autorización de la interventoría y aprobación de la supervisión.

- MODIFICACIÓN/SUSPENSIÓN DEL HOGAR CONECTADO

Procedimiento para Autorización de Cambios.

Informe de Factibilidad: El Cooperante debe presentar a la interventoría un informe detallado de los estudios de factibilidad que justifiquen la necesidad del cambio de zona.

Este informe debe incluir:

- Resultados de los estudios técnicos.
- Análisis de la capacidad de conexión.
- Evaluación del número de hogares beneficiados.

Solicitud de Autorización: Basado en el informe, el Cooperante deberá solicitar formalmente la autorización para cambiar la zona de implementación.

Esta solicitud debe ser dirigida a la interventoria y debe contener:

- Justificación detallada del cambio.
- Propuesta de nuevas zonas (urbanas o rurales aledañas).
- Plan de acción para alcanzar la meta de hogares conectados en las nuevas zonas.

Evaluación y Aprobación: La interventoría evaluará la solicitud y el informe de factibilidad. Durante esta evaluación, se considerarán los siguientes criterios:

- Viabilidad técnica y económica del cambio propuesto.
- Impacto en el cronograma del proyecto.
- Aseguramiento de la meta de hogares conectados.

Una vez realizada la evaluación, la interventoría emitirá un documento que apruebe o rechace la solicitud. En caso de aprobación, se incluirán recomendaciones y condiciones específicas para la implementación en las nuevas zonas.

Implementación y Seguimiento: Una vez autorizados los cambios, el Cooperante podrá proceder con la implementación en las nuevas zonas. La interventoría realizará un seguimiento continuo para asegurar que se cumplan las condiciones establecidas y que la meta de hogares conectados sea alcanzada.

- PLAN DE FORMACIÓN REDES PUNTO MULTIPUNTO

EL CONTRATISTA deberá presentar e implementar un plan de formación mixto virtual/presencial para el personal designado por la Junta de internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) de tipo técnico, teórico y práctico, tanto de los equipos como del Software de la Plataforma provista incluyendo también el Sistema de Gestión y la plataforma de Aprovisionamiento de hogares residenciales, que permita a los participantes tener sólidos conocimientos de la solución implementada, los equipos y las funciones para la óptima instalación, puesta en marcha, pruebas, operación, administración, ingeniería, planificación y mantenimiento correctivo y preventivo, que permitan, en un tiempo razonable, el autoabastecimiento de personal designado por la Junta de internet – Comunidad de Conectividad (JI- CDC).

La capacitación teórica debe realizarse de manera mixta virtual/presencial en las localidades o municipios y sus respectivas Juntas de Acción Comunal de interés definidos por el Proyecto. La capacitación práctica también deberá ser mixta, virtual/presencial y deberá realizarse durante la puesta en funcionamiento y operación (Aprovisionamiento y O&M).

Como parte inicial de la formación, EL CONTRATISTA, en la semana de planeación, anterior a la instalación del AP en el nodo de servicio, deberá impartir capacitación teórica a los miembros de la Junta de internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC), que esta seleccione, para que una vez se instale el AP en el nodo de servicio de la Junta EL CONTRATISTA proceda a impartir "capacitación haciendo" a los integrantes de la Junta, sobre los aspectos técnicos relevantes de los diferentes componentes de la red de acceso punto multipunto.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

El plan de formación incluirá por lo menos el siguiente temario y deberá ser impartido de manera teórico-práctica, de tres (3) a seis a (6) personas por comunidad y con una duración mínima de 8 horas teóricas y la "***capacitación haciendo***" se impartirá durante los 6 meses de operación y mantenimiento de la red de acceso.

Tabla 8 Contenido mínimo del Plan de formación

[illegible]	[illegible]
Generalidades de redes de telecomunicaciones	- Conceptos de redes de telecomunicaciones - Componentes de redes de datos LAN y WAN - Tecnologías para la transmisión de datos - Protocolos de comunicación - Direccionamiento IP - Mejores prácticas para la planeación e instalación de redes de telecomunicaciones - Administración de redes de telecomunicaciones - Seguridad de redes de telecomunicaciones - Capacitación en mantenimiento preventivo de redes
Fundamentos de la Red Inalámbrica Punto - Multipunto	- Explicación de la topología (AP y CPE). - Uso de bandas no licenciadas (2.4 GHz y 5 GHz). - Normatividad de la ANE para frecuencias y potencias. - Gestión de interferencias y asignación de canales.
Configuración y Operación del CPE	- Acceso a la interfaz de administración del CPE. - Configuración inicial: credenciales, SSID, canal y potencia. - Monitoreo de parámetros: RSSI, SNR y latencia. - Resolución de problemas básicos y actualización de firmware
Configuración y Mantenimiento del Access Point (AP)	- Gestión del AP desde sistemas centralizados - Configuración de QoS y manejo de hogares conectados. - Diagnóstico y ajuste de frecuencias y canales. - Monitoreo de tráfico y capacidad del AP.
Monitoreo y Herramientas de Gestión	- Uso de plataformas de gestión - Generación y análisis de reportes de rendimiento - Registro de incidencias y soluciones aplicadas.
Seguridad y Buenas Prácticas	- Implementación de WPA3 o WPA2 en redes WiFi. - Protección contra accesos no autorizados (firewalls, ACL). - Inspecciones periódicas de equipos y limpieza de antenas. - Gestión de contraseñas seguras para AP y CPE
Resolución de Incidencias	- Procedimientos básicos para atender quejas comunes. - Restauración de servicios en caso - de fallas del CPE o AP - Escalación de problemas a soporte técnico avanzado. - Protocolos de sustitución de equipos defectuosos
Capacitación para Atención al Cliente	- Técnicas de empatía y comunicación efectiva. - Explicación de problemas y soluciones en términos simples.

	- Educación al cliente sobre gestión básica de la red WiFi. - Proporcionar información de contacto para soporte técnico
Reportes y Auditorías	- Registro de configuraciones y mantenimientos realizados. - Generación de auditorías internas para monitorear la calidad del servicio. - Asegurar el cumplimiento con normativas como el RETIE y ANE

Cada módulo incluirá actividades teóricas y prácticas, simulaciones y talleres grupales. El contenido estará diseñado para adaptarse al nivel de conocimiento previo de los participantes y las necesidades específicas del proyecto. Además, se entregarán manuales de operación y guías rápidas para uso cotidiano. Se deben incluir videos para apoyar el proceso de capacitación y que en el futuro sirvan para la capacitación otros miembros de la comunidad como multiplicadores del conocimiento.

Se espera capacitar a miembros de la comunidad, seleccionados en conjunto con la Junta de internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC). Este equipo estará compuesto por el personal que indiquen, líderes comunitarios y usuarios que demuestren compromiso con el proyecto, en cuya conformación la Junta de internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC), buscará la participación de mujeres y personas de diversos grupos étnicos para fomentar la inclusión y diversidad en el equipo. Al finalizar la formación, se establecerán roles específicos, como administrador de la red, técnico de soporte y representante de atención al usuario.

EL CONTRATISTA propondrá un formato de evaluación que permita validar el éxito de la transferencia de conocimientos en el proceso de capacitación. La Interventoría y/o supervisión propondrá el formato de evaluación a ser aplicado.

El proceso de evaluación se basará en tres pilares: evaluación formativa, sumativa y práctica. Se realizarán exámenes escritos y orales para medir el dominio teórico, así como ejercicios prácticos para validar competencias técnicas en la configuración y mantenimiento de los equipos. Además, se implementarán simulaciones para evaluar la capacidad de resolución de problemas reales. Al concluir la formación, los participantes recibirán certificaciones que validen su preparación.

Esta metodología asegura la transferencia efectiva del conocimiento y la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

NOTA: EL CONTRATISTA deberá suministrar a la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC):

Un (1) Equipo de cómputo portátil con las siguientes características mínimas:

- Procesador: Intel Core i7 o superior, con fecha de lanzamiento sea el año 2023 o superior.
- Memoria RAM: Mínimo 16 GB.
- Almacenamiento: SSD de 512 GB.
- Sistema Operativo: Windows 10 Pro o equivalente y licencia de Office 365
- Pantalla: 14 pulgadas.
- Batería: Duración mínima de 4 horas.
- Conectividad: Bluetooth, Wifi,
- Puerto: Ethernet RJ45, USB, USB tipo C

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Un (1) equipo de medición de potencia (Power meter) para pruebas en punto del usuario, con las siguientes caracteristicas minimas:

- Rango Longitud de onda estándar (nm): 800-1700 nm
- Conector: SC/APC, LC/APC o FC/APC.
- Tipo de detector: InGaAs.
- Rango de medición: -70 a +25 db.
- Incertidumbre: 5%.

- INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Aprobado el estudio de campo de cada institución educativa se dará inicio a la fase de instalación y puesta en servicio de las instituciones educativas.

EL CONTRATISTA garantizará que toda creación o innovación, que haga parte de su propuesta o se refiera a una o varias de las prestaciones en el marco del presente proyecto, no infringe derechos de propiedad intelectual de terceros. En consecuencia, en el evento de presentarse cualquier reclamación por terceras personas alegando derechos de propiedad intelectual sobre la creación o innovación involucradas en este proyecto, asistirá y asumirá la defensa en tal sentido de la Nación.

La infraestructura de telecomunicaciones y los equipos terminales que serán instalados por EL CONTRATISTA en desarrollo del proyecto, deberán cumplir con las normas técnicas establecidas en Colombia para la prestación de cada uno de los servicios exigidos.

- SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA

Seguridad Física: Toda la infraestructura e instalaciones realizadas por EL CONTRATISTA en las Instituciones Educativas deberán contar con una política activa de seguridad física (elementos hardware AP, antenas, etc.; elementos antivandálicos y antirrobo). La política deberé ser descrita en el plan de mantenimiento y actualizada con los Estudios de Campo.

Seguridad Lógica:

- Servicio de protección contra virus, malware y demás amenazas que se presentan en la prestación del servicio de conectividad en las instituciones educativas.
- Filtro de contenido prohibido y maliciosos según legislación colombiana actual.

EL CONTRATISTA deberé dar cumplimiento a lo señalado en el Capítulo II de la Ley 679 de 2001, en especial respecto de las prohibiciones y deberes frente al uso de redes globales de información en relación con menores de edad. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá impedir el acceso al tipo de páginas que se encuentren establecidas por el ente competente y sus respectivas actualizaciones

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

La interventoría y/o supervisión, para la aprobación de la instalación y puesta en servicio de las instituciones educativas se realizará con un modelo de verificación remota y/o visitas de campo, el cual debe ser avalado por el Ministerio.

Para la aprobación de la instalación de las Instituciones Educativas, EL CONTRATISTA deberá coordinar y programar con la interventoría y/o supervisión el modelo de verificación de la instalación y puesta en servicio (Protocolo de pruebas), el cual debe ser avalado por el Ministerio.

La interventoría y/o supervisión dará el concepto de aprobación de las metas de instalación, sí y solo sí EL CONTRATISTA cumple con la totalidad de los requisitos exigidos para de las Instituciones Educativas, por tanto, no se contemplan aprobaciones parciales con pendientes por Institución Educativa, y en consecuencia EL CONTRATISTA deberá considerar el cronograma establecido en el proyecto para la aprobación de cada una de las metas. Para las metas dos (2) y tres (3) se podrá recibir mínimo con el 80% de la meta

Dentro del proceso de aprobación se realizan las siguientes actividades:

- Notificación por parte de EL CONTRATISTA a la interventoría y/o supervisión, informando la finalización de la instalación.
- Verificación por parte de la interventoría y/o supervisión de los soportes, actas de aprobación de instalación y recibo de los servicios, pruebas de conectividad y calidad del servicio que evidencien la correcta instalación.
- Verificación remota por parte de la interventoría y/o supervisión de la instalación, para esto utilizará los sistemas de gestión y de monitoreo puesto a disposición por EL CONTRATISTA.
- Programación y realización de las Visitas de Campo. EL CONTRATISTA deberá acordar con la interventoría y/o supervisión el cronograma de visitas de campo si es necesario.
- La interventoría y/o supervisión, EL CONTRATISTA y el representante de la Institución Educativa (para el caso de instituciones educativas) deberán suscribir el acta en la que conste la realización de las pruebas de recibo y pruebas de conectividad.

Adicionalmente, para que servicio se considere como instalado, en funcionamiento, operativo, y en consecuencia se realice el reconocimiento de la obligación de hacer, debe recibirse la aprobación correspondiente por parte de la interventoría y/o supervisión; además, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Tener revisado el Estudio de Campo.
- Tener aprobado el informe de ingeniería y operación.
- Tener aprobado el plan de mantenimiento.
- Tener aprobado el protocolo de pruebas.
- Prestar el servicio que permita la conectividad a Internet de las Instituciones Educativas, cumpliendo con las consideraciones señaladas en el presente documento.

El servicio en la Institución Educativa debe entrar en operación al día calendario siguiente de la aprobación por parte de la interventoría y/o supervisión; a partir de ese día se contará la etapa de operación del servicio.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

NOTA 1: En caso de que la Visita de Campo para aprobación del servicio sea rechazada, es decir, que la interventoría y/o supervisión no apruebe la instalación y por lo tanto no pueda entrar en operación dicho sitio, por causas imputables a EL CONTRATISTA y que se requiera repetir la visita de campo, el costo de esta visita adicional deberá ser asumida por EL CONTRATISTA. El valor de la visita a pagar será el mismo valor de visita establecido en el contrato de la interventoría y/o supervisión. Para estos casos se realizarán los respectivos descuentos de los valores a reconocer y EL CONTRATISTA deberá pagar dicho valor en efectivo.

NOTA 2: En caso de que la Visita de Campo para la aprobación de la instalación sea fallida, es decir que por motivos ajenos a la interventoría y/o supervisión o EL CONTRATISTA, no sea posible verificar que la infraestructura instalada por EL CONTRATISTA permite la prestación de los servicios, y que ello generará una visita adicional, ésta será descontada de la bolsa de visitas establecida en el en el contrato de la interventoría y/o supervisión, y deberá ser reprogramada dentro del plazo establecido para la aprobación de la meta de instalación. En todo caso, la visita fallida deberá estar debidamente justificada.

NOTA 3: EL CONTRATISTA será responsable del correcto cumplimiento a su cargo del plan de visitas programadas

- NOTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Una vez EL CONTRATISTA haya finalizado la instalación y puesta en servicio, mediante comunicación escrita y en formato digital, cumpliendo los tiempos establecidos en el cronograma definido en el presente documento, informará a la Interventoría y/o supervisión. Toda la información deberá estar disponible en el sistema de gestión documental de EL CONTRATISTA con acceso a la interventoría y/o supervisión y al Ministerio, incluyendo lo siguiente:

- Listado de las Instituciones Educativas Instaladas y puestas en servicio, con la información código DANE departamento, código DANE municipio, centro poblado, coordenadas (mínimo 5 decimales) y dirección o referencias para llegar al sitio, nombre sede educativa, DANE sede educativa, datos del rector (donde aplique).
- Soporte de las pruebas de la Instalación en Institución Educativa, como mínimo deberá entregar los siguientes soportes:
- Al menos una (1) fotografía de las coordenadas geográficas de la ubicación del sitio, arrojadas por el GPS.
- Al menos dos (2) fotografías que demuestre que los equipos en sitio están instalados.
- Soportes donde se evidencie la socialización del proyecto a los Encargados de la sede y la comunidad aledaña a donde se instalará el servicio de Internet.
- Acta de instalación del sitio debidamente firmada por EL CONTRATISTA, Interventoría y/o supervisión y el responsable en la entidad educativa (cuando aplique). Dentro del acta se debe establecer el cargo, número de teléfono de contacto, correo electrónico y fotocopia del documento de identificación de las personas que firman. El contenido del acta debe ser entregado por la interventoría y/o supervisión al Ejecutor.

EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría y/o supervisión el cronograma de vistas de verificación y aprobación con el fin de cumplir con la meta establecida en el cronograma.

- APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

En la etapa de planeación del cronograma establecido en el presente documento, la interventoría y/o supervisión a diseñará los protocolos de pruebas para las verificaciones remotas y para las visitas de campo que se utilizarán para verificar la instalación de los servicios, los cuales deberán ser validados por el Ministerio y se darán a conocer al contratista, una vez sean aprobados los estudios de campo.

- VERIFICACIÓN REMOTA DE LA INSTALACIÓN

Para realizar la verificación remota, la interventoría y/o supervisión coordinará con EL CONTRATISTA, la realización de pruebas remotas desde los Sistemas de Gestión y Monitoreo puestos a disposición por EL CONTRATISTA, con el fin de verificar que los servicios se encuentran instalados, en funcionamiento y operativos. El protocolo de pruebas desarrollado por la interventoría y/o supervisión deberá contener como mínimo los ítems que se describen a continuación, con el fin de verificar que los servicios cumpleh con las condiciones establecidas en el presente documento.

- Se realizarán como mínimo las siguientes pruebas:
- Información General.
- Pruebas de Conectividad.
- Acceso a páginas Web y restricción de acceso a las páginas Web de acuerdo con los filtros definidos.
- Inventario de Equipos.
- Verificación del funcionamiento y estabilidad del servicio de Internet en la Institución Educativa en el sistema de gestión. La sede de la Institución Educativa en las últimas 24 horas no debe haber registrado ninguna falla. Adicionalmente, la sede de la Institución Educativa debe haber registrado tráfico real de usuarios navegando, 24 horas para las sedes de las Instituciones Educativas con energía interconectada a la red.
- Páginas Web más visitadas en las Instituciones Educativas.
- Verificación de las alarmas generadas por fallas de conectividad a Internet.

Del resultado de las pruebas remotas se levantará un acta de verificación firmada por las personas presentes (interventoría y/o supervisión y EL CONTRATISTA), en la cual se plasmen los resultados de esta, las recomendaciones de la interventoría y/o supervisión y demás observaciones que se consideren pertinentes.

En dicha acta, deberán quedar expresados claramente los resultados de la verificación, de tal forma que se pueda evidenciar si es procedente continuar con el proceso de aprobación o si por el contrario EL CONTRATISTA debe realizar acciones de mejora.

El acta de verificación será el soporte para la realización de la visita de campo y hará parte integral del informe de aprobación de la sede de la Institución Educativa.

- VISITA DE CAMPO PARA LA APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Realizada y aprobada la visita remota, EL CONTRATISTA deberá coordinar con interventoría y/o supervisión una (1) visita de verificación al sitio en la que deberán estar presentes un (1) representante de la Institución Educativa (cuando aplique), un (1) representante de EL CONTRATISTA y un (1) representante de la interventoría y/o supervisión.

En cada una de las visitas se levantará un acta de instalación, la cual deberá estar suscrita por quienes participaron en la visita y deberá plasmar los resultados de esta, las recomendaciones de interventoría y/o supervisión y demás observaciones que se consideren pertinentes. En dicha acta, deberán quedar expresados claramente los resultados de la verificación de la instalación, de tal forma que se pueda evidenciar si es procedente continuar con el proceso de aprobación, o si, por el contrario, EL CONTRATISTA debe realizar acciones de mejora. El acta de instalación hará parte integral del informe de aprobación del sitio.

El protocolo de pruebas desarrollado por la interventoría y/o supervisión deberá contener como mínimo los ítems que se describen a continuación, con el fin de verificar que los servicios cumplen con las condiciones establecidas en el presente documento:

- Verificación tecnológica de la red de acceso.
- Listado de Equipos con respectivo registro fotográfico.
- Pruebas de Conectividad y funcionalidad:

Tabla 9 Pruebas de funcionalidad

Prueba	Resultado esperado
Reconocer el SSID	Broadcast de SSID
Escoger el SSID	Conexión de red
Página web con acceso (Usuario y password)	Habilitación de servicio
Simultaneidad y velocidad	Prueba de navegación de los equipos de la sede de la Institución Educativa En el sistema de monitoreo del Ejecutor se deberá, evidenciar la navegabilidad de hasta 5 equipos de la IE, visualizando la velocidad de acceso tara descarga (download) como para carga (upload).

La interventoría y/o supervisión deberá emitir el concepto de aprobación o rechazo de la instalación de cada sitio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización de la visita de campo. En caso de que la instalación del sitio no fuera aprobada por la interventoría y/o supervisión, EL CONTRATISTA podrá subsanar las observaciones que haya realizado la interventoría y/o supervisión en un plazo máximo de diez (10) días calendario, y las mismas podrán ser verificadas remotamente, siempre y cuando, ésta sea posible.

En las situaciones en las que la interventoría y/o supervisión evidencie en la visita de campo que no habla operatividad de los servicios y/o que existen riesgos eléctricos y/o de infraestructura derivados de la instalación que puedan afectar a la comunidad, la interventoría y/o interventoría y/o supervisión realizará una nueva Visita de Campo para la Aprobación del sitio.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La interventoría y/o supervisión deberá emitir el concepto de aprobación sobre la totalidad de las Instituciones Educativas que conforman las metas, el cual deberá realizarse según los plazos definidos en el cronograma establecido en el presente Anexo Técnico.

NOTA: En caso de que, por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificados por parte de la interventoría y/o supervisión no sea posible realizar la visita de campo podrá realizarse la verificación de aprobación remota. Sin embargo, al momento en que cesen los hechos generadores de la Fuerza Mayor, la interventoría y/o supervisión se encuentra en la obligación de ejecutar la visita de campo de manera presencial.

B. FASE O ETAPA OPEX

B-I. – OPEX HOGARES

Corresponde al gasto operacional, costo o recurso utilizado para mantener, operar o gestionar el servicio de conectividad prestado por las 100 Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) y EL CONTRATISTA a los 6000 hogares.

Para efectos de verificar el cumplimiento de la meta de operación que se establece en el cronograma, se considerará que el convenio cumpla con:

- Operación bajo las condiciones de calidad y niveles de servicio exigidos.
- Se apruebe por parte de la Supervisión/Interventoría la debida instalación, configuración y puesta en servicio basado en las condiciones de calidad y cumplimiento de los criterios de calidad.

EL DEPERTAMENTO, a través del interventor deberá garantizar que EL CONTRATISTA seleccionado de cumplimiento a los Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio incluidos.

A continuación, se describe el conjunto inicial de dichos indicadores con sus respectivos valores admisibles, no obstante, de mutuo acuerdo, se podrá acordar la inclusión de indicadores adicionales dentro del sistema de medición y seguimiento, en relación con la actualización, modificación o reemplazo de los indicadores aquí definidos.

- INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

Los indicadores mínimos de calidad que se deberán medir en el desarrollo del Convenio con una periodicidad mensual, salvo que se indique lo contrario, serán los siguientes:

- Disponibilidad de Canal de Conectividad a Internet.
- Velocidad efectiva de transmisión de datos y latencia del canal de conectividad a Internet.
- Tiempo de solución de Falla.

El control y seguimiento de indicadores para su cumplimiento se implementará, mediante metodología y protocolo de pruebas propuesto previa aprobación de la Supervisión/Interventoría.

Se iniciará la medición de los indicadores a partir de la puesta en servicio de conectividad en cada hogar beneficiario con la debida aprobación de la Supervisión/Interventoría.

Para la medición de indicadores, se adelantará el cálculo respectivo y se reportará mensualmente a la Supervisión/Interventoría los resultados de estos. Así mismo, deberá reportar, cada mes de forma consolidada, toda la información que fue utilizada en dicho procedimiento, con el propósito de validar el cálculo.

- DISPONIBILIDAD DE CANAL DE CONECTIVIDAD

El valor mínimo que debe arrojar el cálculo de este indicador, para que se considere como cumplido debe ser mínimo del 95%.

En caso de que se requiera realizar pruebas exhaustivas sobre el canal, se podrán realizar mediciones y utilizar la siguiente metodología:

Metodología de medición de la disponibilidad del canal:

El indicador de disponibilidad hace referencia al porcentaje de tiempo en el cual, el canal que brinda la conectividad a Internet debe estar disponible o funcionando correctamente para los hogares beneficiarios cumpliendo con la capacidad, funcionalidad y el nivel de servicio.

Para el cálculo del tiempo de indisponibilidad, no se tendrá en cuenta el tiempo de las fallas que no son imputables al Ejecutor, entre las que se encuentran:

- El tiempo en que se incurra para realizar trabajos de mantenimiento preventivo, según los procedimientos establecidos.
- En todo caso, eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito, debidamente soportados de acuerdo con lo legalmente definido.
- Las fallas que no son imputables al Ejecutor, no se tendrán en cuenta para el cálculo del indicador de disponibilidad.

El Cooperante será el responsable de soportar debidamente ante Supervisión/Interventoría estos casos, quien verificará que dichas fallas no son imputables al Ejecutor.

- INDICADOR DE DISPONIBILIDAD MENSUAL

Cálculo Del Indicador:

Los criterios para tener en cuenta en el cálculo de la disponibilidad son los siguientes:

- La disponibilidad deberá medirse para la totalidad de hogares conectados.
- Tiempo máximo de disponibilidad en horas, dependiendo la cantidad de días del mes de medición.
- Tiempo fuera de servicio o sin disponibilidad en horas para cada hogar beneficiario.
- El Indicador se calculará por cada hogar beneficiario.
- La disponibilidad será medida mensualmente.

Para medir la Disponibilidad por cada hogar beneficiario, se utilizará la siguiente fórmula:

$$DSWi = \left[1 - \frac{\sum IF}{(24 \times d)}\right]$$

Donde:
DSW i: Disponibilidad de la conectividad al hogar beneficiario.
IF (Intervalo de Falla): Tiempo en el cual el servicio no estuvo disponible, medido en horas.
d: Es el número de días calendario del mes medido.

- VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y LATENCIA

La velocidad de transmisión de datos se debe definir separadamente para la "bajada" de archivos de prueba entre un sitio remoto Web y el equipo Router instalado al hogar beneficiario.

- MUESTRA

Se tendrán en cuenta el 10% de los hogares beneficiarios aprobados con servicio de acceso a Internet a cargo de EL CONTRATISTA, independiente de la tecnología utilizada para brindar la conectividad de acceso a Internet.

- CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICIÓN

Las siguientes son características de las pruebas a realizar:

Se reportará el monitoreo del sistema de gestión para cada hogar beneficiario por lo menos durante 2 momentos diferentes del día. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá requerir mediciones en horarios diferentes a los propuestos en el presente acápite.

Como producto de las mediciones realizadas se debe obtener toda la información cuyos resultados se agrupan para obtener un indicador mensual con corte al último día calendario de cada mes.

- HERRAMIENTA DE MEDICIÓN

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Se deberá contar con una herramienta que permita realizar la medición remota del indicador de velocidad de transmisión de datos y se deberá presentar dentro del Informe Detallado de Ingeniería y Operación, donde se incluyan la información, metodología de medición y características funcionales de la misma.

Se deberá presentar la herramienta para la validación del cumplimiento de la funcionalidad de las mediciones conforme a las recomendaciones establecidas en este documento y la veracidad los valores reportados.

- REPORTE

El reporte de Indicadores es parte integral del informe mensual de Operación. Para efectos de determinar, analizar y validar los indicadores de transmisión de datos el informe debe contener:
Una sección de resumen de los indicadores con los datos o gráficas que permitan visualizar los comparativos de acumulados (hasta un máximo de 6 meses). Se debe incluir el análisis y las observaciones del comportamiento del indicador del mes con respecto al (los) mes (es) anterior (es).
Una sección donde se indiquen los incidentes de seguridad y plan de acción de mejora.

- CÁLCULO DEL INDICADOR

El cálculo del indicador se realizará de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.2 del documento ETSI EG 202 057- 4 V1.1.1 (2008-10).
https://www.etsi.org/deliver/etsi_eg/202000_202099/20205704/01.02.01_60/eg_20205704v010201p.pdf

- CRITERIO DE CUMPLIMIENTO.

Para verificar el cumplimiento de este indicador, se utilizará la metodología establecida en el numeral 5.2 del documento ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2008-10) el Anexo G del mismo documento. https://www.etsi.org/deliver/etsi_eg/202000_202099/20205704/01.02.01_60/eg_20205704v010201p.pdf

- PERIODO DE EVALUACIÓN.

La obligación de medir y presentar informes de indicadores es de periodicidad mensual, periodo que será revisado y evaluado la supervisión/interventoría, de tal ferma que se determine el cumplimiento de los niveles mínimos admisibles de calidad de servicio.

- TIEMPO DE SOLUCIÓN DE FALLAS.

Todas las fallas de operación de los beneficiarios del Proyecto deberán ser resueltas y corregidas. Las incidencias se dividirán en:

Tabla 10 Tipo de incidencias

[illegible]	TIPO
Alta	Servicio no disponible (Sin servicio)
Media	Servicio defectuoso (degradado)
Baja	Se refiere a un problema imputable al Ejecutor y que no impacta el servicio de conectividad

Cualquier otro tipo de incidencia que pueda ocurrir será clasificada en función de si afecta de forma directa a la prestación del servicio y en qué grado. El Tiempo de respuesta a una falla debe ser de la siguiente manera:

Tabla 11 Tiempo de respuestas ante incidencias

[illegible]	[illegible]
ALTA	8 horas calendario
MEDIA	24 horas calendario
BAJA	72 horas calendario

a) Para estas fallas no se considera los defectos de operación del equipo terminal del beneficiario.
b) Todos estos parámetros de incidencias quedan anulados en eventos de fuerza mayor o caso fortuito.
c) Se deberá tener una línea de atención al cliente para atención a reporte de fallas de los usuarios.

- MEDICIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

El protocolo de pruebas, la metodología de medición, la medición de los indicadores, los períodos de medición y demás aspectos relevantes deberán ser definidos en el segundo mes de ejecución del convenio, de conformidad con parámetros aplicables a condiciones de prestación similares definidos.

EL CONTRATISTA adelantará el cálculo respectivo del informe mensual y reportará a la supervisión/interventoría, los resultados de los mismos. Así mismo, deberá reportar, toda la información que fue utilizada en dicho procedimiento, con el propósito de que se pueda validar el cálculo. Se podrán realizar otras pruebas que se consideren pertinentes en cualquier momento del convenio, para verificar que el protocolo de pruebas se ejecute de acuerdo con lo estipulado.

- PENALIZACIÓN

Los indicadores sirven de base para conocer la calidad de los servicios que se están prestando y para el cálculo del valor que será deducido de la factura mensual durante la ejecución de los servicios. En pro del buen uso de los recursos contratados, se ha establecido que los resarcimientos generados producto de las penalizaciones aplicadas por el incumplimiento de los indicadores de servicio quedarán a favor del Contratante, quien los utilizará dentro del contrato de acuerdo con las necesidades del servicio.

La Interventoría/Supervisión, mediante el usuario y clave proporcionado, tendrá acceso al software de gestión y podrá en cualquier momento realizar la verificación de los indicadores. En este caso, se le indicará a la

Interventoría/Supervisión cómo puede obtener los resultados del indicador. Los tiempos de inactividad por causas no atribuibles al Ejecutor no serán tenidos en cuenta para el cálculo mensual del indicador.

- CRITERIO DE CUMPLIMIENTO Y FACTOR DE PENALIZACIÓN.

Tabla 12 Disponibilidad de servicio

TECNOLOGIA	NIVEL	RANGO (%)	PENALIDAD
Canales con Reuso (1:8)	96%	D>=96	0% del valor mensual del servicio
		90 ≤ D < 95	10% del valor mensual del servicio
		85 ≤ D < 90	20% del valor mensual del servicio
		80 ≤ D <85	30% del valor mensual del servicio
		70 ≤ D <80	50% del valor mensual del servicio
		50 ≤ D <70	70% del valor mensual del servicio
		D < 50,0	100% del valor mensual del servicio

Se deberá contar un sistema para la atención de los PQRs que interpongan los usuarios respecto de este indicador. La supervisión/interventoría validará los registros y estadísticas de la atención a PQRs a través del sistema de información entregado.

- CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA deberá garantizar que la tecnología incluya la respectiva plataforma de gestión asociada a la tecnología ofertada y necesarias para llevar a cabo toda la supervisión, configuración, aprovisionamiento, seguimiento, control, O&M, tanto de la red de acceso como de la plataforma de aprovisionamiento de servicios residencial.

Este alcance incluye el suministro de todos los elementos de hardware (cuando se trate de plataformas no virtualizables), software y accesorios complementarios que componen la tecnología ofertada, la plataforma de Gestión y la plataforma de aprovisionamiento, así como licenciamientos y/o software de virtualización necesario para su funcionamiento. El licenciamiento y actualizaciones de hardware y software debe cubrir un período de por lo menos cinco (5) años para cada red de acceso implementada en cada una de las Juntas de Internet, contados a partir del inicio de la etapa de operación y mantenimiento.

- ARQUITECTURA DE PLATAFORMA DE APROVISIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA deberá diseñar, implementar y entregar una plataforma capaz de realizar el aprovisionamiento de los servicios residenciales de usuario final, la arquitectura de alto nivel de esta plataforma se lista a continuación:

Plataforma de aprovisionamiento
Sistema que permite la activación, configuración y gestión automatizada de servicios de INTERNET para hogares en sus hogares. Facilita el proceso de activación inicial, asignación de recursos (como ancho de banda y direcciones IP) y la configuración remota de equipos en la red del cliente, como módems y Routers.

Servicio DDNS (Dynamic Domain Name System)
Servicio que permite asignar un nombre de dominio fijo a la dirección IP dinámica de un usuario. Esto facilita el acceso remoto a dispositivos en el hogar (como cámaras de seguridad, servidores o sistemas de automatización) al permitir que el usuario acceda a su red mediante un dominio constante, sin importar los cambios de IP pública.

Servicio SNMP (Simple Network Management Protocol)
Servicio que permite la gestión y monitoreo remoto de los dispositivos de los hogares, a través de SNMP, garantiza que sea posible supervisar el estado de estos equipos, recopilar métricas de rendimiento (como el uso de ancho de banda y el estado de conexión) y detectar problemas de forma proactiva.

Servicio TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
Servicio que permite transferir archivos de configuración y firmware a los dispositivos de los hogares, de manera sencilla y sin autenticación compleja. También permite que los dispositivos de los hogares descarguen automáticamente las actualizaciones y configuraciones desde el servidor del proveedor, facilitando el aprovisionamiento inicial, las actualizaciones de software y los ajustes de configuración remotos, manteniendo los equipos al día y funcionando de manera óptima.

Servicio DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Servicio encargado de asignar direcciones IP dinámicas a los dispositivos de los hogares de forma automática. Esto permite que cada dispositivo conectado a la red del hogar obtenga una dirección IP válida y otros parámetros de red esenciales (como la puerta de enlace y los servidores DNS) sin intervención manual.

Servicio DNS Caché (Domain Name System Caché)
Servicio que almacena copias temporales de las consultas de DNS realizadas por los hogares para nombres de dominio comunes. Esto permite que las solicitudes de acceso a sitios web y servicios en línea se resuelvan más rápidamente al evitar consultas repetidas a servidores DNS externos, el DNS Cache reduce la latencia y mejora la velocidad de navegación de los hogares, además de optimizar el uso de ancho de banda en la red al minimizar el tráfico hacia los servidores DNS externos.

Portal Cautivo
Se trata de una interfaz que restringe el acceso completo a internet y redirecciona al usuario a una página específica donde se le informa sobre el estado pendiente de su cuenta. Hasta que el usuario regularice su situación, el acceso a la red se limita únicamente a este portal, impidiendo la navegación normal y restaurando el servicio completo una vez realizado el pago.

Adicionalmente el portal cautivo servirá para que la Junta de Internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) publique a la comunidad noticias y avisos de interés específico para la comunidad.

EL CONTRATISTA deberá filtrar los siguientes contenidos de uso:

Tabla 13 Contenido y Filtrado

Contenido	Tipo Filtraje
Sitios de listas reportadas (Black & Grey List)	Permanente
Cualquier sitio Web	Pornografía Infantil de acuerdo con la normatividad vigente.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo señalado en la Ley 679 de 2001, el Decreto 1524 de 2002 y la Ley 1336 de 2009, así como aquellas normas que los modifiquen adiciona o sustituyan, en especial respecto de las prohibiciones y deberes frente al uso de redes globales de información en relación con menores de edad. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá adoptar las medidas técnicas que permitan realizar el filtrado de contenido que vulnere los derechos de los menores de edad y todo aquel contenido reportado por las autoridades judiciales o Policía Nacional, con sus respectivas actualizaciones.

EL CONTRATISTA deberá observar lo establecido en la resolución CRC 5050 de 2016, "Por la cual se compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación Comunicaciones", modificada por la resolución CRC 6890 del 2022, "Por la cual se modifican algunas disposiciones del régimen de calidad para los servicios de telecomunicaciones contenidas en los capítulos 1 y 2 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones", SECCIÓN 2. "OBLIGACIONES DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET", en especial el artículo 5.1.2.3. "GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN REDES DE TELECOMUNICACIONES", y todas las que lo modifiquen, deroguen o sustituyan.

B-II. OPEX INSTITUCIONES EDUCATIVAS

EL CONTRATISTA es el único responsable de llevar a cabo la administración, operación y mantenimiento de la conectividad a internet bajo las condiciones de calidad y niveles de servicio establecidas en el presente anexo técnico. Es obligación de EL CONTRATISTA coordinar con las autoridades respectivas el ingreso a Instituciones Educativas para realizar los mantenimientos preventivos y/o correctivos.

Se resalta que el servicio en la Institución Educativa debe entrar en operación al día hábil siguiente de la aprobación de la meta por parte de la interventoría y/o supervisión; a partir de ese día se contará la etapa de operación del servicio.

La entrega por EL CONTRATISTA de la instalación y puesta en servicio no generan derecho o expectativa alguna para el PRST, ni obligación alguna de aprobación y autorización por parte del Ministerio TIC. En caso de que sean aprobados la interventoría y/o supervisión deberá expedir documento correspondiente que apruebe la instalación y puesta en servicio de cada institución educativa.

- SERVICIO A PRESTAR EN CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

EL CONTRATISTA deberá proveer el servicio de Internet con tráfico nacional e internacional de la siguiente manera:

El servicio de Internet es previsto para uso exclusivo de los miembros de la Institución Educativa a través de un portal cautivo, si es requerido por la sede educativa, se habilitará un sistema de autenticación WEP, WPA, WPA2 o WPA3, y/o se registrarán las MAC de los equipos relacionados en el AP. Sin embargo, si durante la ejecución del proyecto se requiere registrar nuevos equipos, la solución propuesta por EL CONTRATISTA deberá contemplar el registro remoto de las nuevas MAC relacionadas, correspondiente a los nuevos terminales.

El servicio deberá estar operativo las 24 horas del día, 7 días a la semana, para las Instituciones Educativas con energía interconectada a la red durante los meses de operación del proyecto. En caso de ausencia o fallo de energía de

la Instituciones Educativas, se determinará como un tiempo de paro de reloj y no se tendrá en cuenta para el cálculo de los indicadores de calidad y servicio.

El filtraje de contenidos se realizará de acuerdo con lo establecido en la ley y por orden judicial, siempre y cuando sean técnicamente viables.

Se deberá controlar el tráfico de acuerdo con las siguientes indicaciones:

Tabla 14 Control de trafico

Contenido	Tipo de control
Sitios de streaming de video y audio	Control de la calidad de reproducción con el fin de gestionar la red de manera eficiente y evitar la mala percepción del servicio.
Sitios de descargas masivas	Tasas baja transferencia.
Actualización de aplicaciones y sistemas operativos	Tasas baja transferencia.
Sitios de intercambio de información P2P	Tasas baja transferencia.
Portales .gov.co y .edu.co	Tendrán prelación en la red y sus descargas.

- VELOCIDAD EFECTIVA MÍNIMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS

La velocidad efectiva mínima de trasmisión de datos para la prestación del servicio de Internet para las Instituciones Educativas se detalla a continuación:

Tabla 15 Capacidad Efectiva del Canal de Transmisión de Datos[1]

Tipo de Servicio	Total	Variable: Velocidad Efectiva de Tx de datos (Descarga/Carga; Prioridad)	Medio
Institución Educativa	110	40-200 Mbps / 8-50 Mbps; Prioridad: 1Tb	Satelital

En el evento en que se modifique o subrogue la Resolución que establece las velocidades de transmisión de la definición de banda (actualmente Resolución No 5161 del 2017) y el incremento anual del 10% aquí establecido ya haya sido aplicado, deberán recalcularse la velocidad mínimas de bajada y subida para cada institución educativa.

Se deberá controlar el tráfico de acuerdo con las siguientes indicaciones:

Tabla 16. Condiciones especiales por tecnología

Condiciones de cumplimiento	Usuarios concurrentes	Control de sesiones
Satelital	EL CONTRATISTA deberá entregar a la Interventoría la ficha técnica que demuestre la capacidad de	Deberá controlar sesiones a los usuarios por dos (2) horas, trascurrido este tiempo se deberá finalizar la sesión al usuario, sin embargo, este se

[1] Se entiende que la velocidad efectiva de Tx de datos para este proceso es la descrita en el presente numeral y está de acuerdo con lo establecido en la Resolución No 5161 del 2017 de la CRC o en la norma que lo modifique, derogue o sustituya

	conectividad mínima de 256 clientes por canal	podrá volver a conectar siempre y cuando existan recursos de red disponibles

Contenido	Tipo de control
Sitios de streaming de video y audio	Control de la calidad de reproducción con el fin de gestionar la red de manera eficiente y evitar la mala percepción del servicio
Sitios de descargas masivas	Tasas baja transferencia
Actualización de aplicaciones y sistemas operativos	Tasas baja transferencia
Sitios de intercambio de información P2P	Tasas baja transferencia
Portales .gov.co y edu.co	Tendrán prelación en la red y sus descargas .

- UTILIZACIÓN DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA deberá hacer seguimiento del uso y ocupación de la conectividad a internet de la red de acceso y de la red de interconexión en cada sitio, discriminando el tráfico de tal forma que a través de los reportes periódicos generados por su Sistema de Gestión y del monitoreo permanente que realice sobre él, se pueda garantizar las condiciones de operación definidas en el presente anexo. En especial dicha información debe permitir calcular el consumo - hora (GB) e identificar las horas pico y el comportamiento estadístico por cada sitio. Igualmente se deberá poder calcular el uso del ancho de banda en la red de acceso y red de interconexión para cada día y por sitio.
EL CONTRATISTA deberá poner a disposición de EL DEPARTAMENTO, la interventoría y/o supervisión, para ser remitidos al MINISTERIO TIC, como mínimo, los siguientes reportes o información en línea a través de un portal web único seguro (HTTPS) con autenticación el cual podrá ser consultado desde cualquier dispositivo.

- Informe del tráfico cursado por la Institución Educativa, detallándolo por hora, día, mes, año, tanto entrante como saliente, mostrando los picos máximos y mínimos tanto de entrada como de salida, tráfico promedio, y gráficos.
- Con respecto a las mediciones de tráfico real estas deberán tener una precisión de 10 minutos. Las mediciones con esta precisión deberán estar siempre disponibles durante la duración del proyecto.
- Reporte de fallas del servicio por sitio, con fecha, hora, causa de la falla, acciones tomadas para la solución, duración de la falla. Esta información debe permitir el análisis y generación de estadísticas por cada sitio; esto con la finalidad de establecer la operación de cada sitio, y ocupación del canal.
- Número de usuarios conectados (día, mes) y uso del servicio de Internet por sitio.
- Registro de conexiones por sitio por periodo de tiempo (día, semana, mes, año), horario de mayor concurrencia, días y horas de mayor consumo.
- Tiempo promedio de sesión por sitio.
- Tecnologías de terminales (Sistema operativo, Marca terminal y MAC) que accedieron a la Institución Educativa.
- Gráfico de uso de cada sitio (por hora, día y mes).
- Reporte de los sitios web de acceso más visitados. (top 10 Gráficos y texto) y agrupado por categorías.
- Informe del registro de los usuarios (Total usuarios por Institución Educativa, usuarios nuevos por mes, sesiones establecidas, etc.).
- Nivel de satisfacción de los usuarios (promedio de calificación municipal y departamental, cantidad de calificaciones recibidas).
- Reporte General consolidado de tráfico y usuarios, discriminado por cada Institución Educativa

Todos estos reportes deben tener la opción de poder ser exportados a Excel.

La información anterior deberá estar disponible online mediante el sistema de gestión, esta deberá tener una precisión de 10 minutos y podrá requerirse por parte del Ministerio o la interventoria, el detalle de estos datos en algún informe específico.

Nota: La información de estos reportes deberá estar disponible durante toda la ejecución del proyecto.

- PORTAL CAUTIVO

EL CONTRATISTA deberá implementar un Portal Cautivo, para acceso y registro de los usuarios al servicio de conectividad, el cual podrá ser un espacio web apto para acceder desde cualquier dispositivo móvil o terminal. Este sistema deberá estar habilitado durante toda la etapa de operación del proyecto. El sistema debe ser gráfico y funcionalmente atractivo para los usuarios.

EL CONTRATISTA deberá dimensionar el Portal Cautivo teniendo en cuenta las solicitudes de acceso que se pueda recibir de manera simultánea por parte de los usuarios del servicio de Internet, de tal manera que garantice la oportunidad en el acceso a los usuarios sin que se presenten retrasos para acceder al servicio de Internet. De acuerdo con las necesidades evidenciadas durante la ejecución del proyecto.

El Ministerio podrá solicitar ajustes al portal cautivo sin que esto implique un costo adicional al proyecto. Este sistema de control o portal cautivo deberá ser entregado por EL CONTRATISTA cinco (5) días hábiles antes de la entrega de la primera sede educativa conectada, para validación y aprobación por parte de la supervisión y/o interventoría durante los cinco
(5) días hábiles después de la entrega. El portal cautivo deberá controlar sesiones a los usuarios por dos (2) horas, trascurrido este tiempo se deberá finalizar la sesión al usuario, sin embargo, este se podrá volver a conectar siempre y cuando existan recursos de red disponibles.

- FUNCIONALIDADES DEL PORTAL CAUTIVO

Registro: La funcionalidad de Registro debe precisar el Municipio y la institución educativa de la cual se están conectando y será el pantallazo que visualice el usuario siempre y cuando sea un usuario nuevo.

El usuario deberá proveer los datos de caracterización que el Ministerio solicite, o quien este designe para tal fin, los cuales serán definidos en conjunto con EL CONTRATISTA durante el primer mes de ejecución del proyecto, posterior a esto el usuario deberá aceptar las condiciones de uso y políticas de privacidad, la cual deberá estar en línea a lo presentado en el artículo 7 de la Ley 1581 de 2012, que señala que la recolección y tratamiento de datos personales de menores, está prohibida, salvo aquellos datos de naturaleza pública.

El sistema debe garantizar la protección de datos personales de los usuarios que interactúen con él y para ello debe cumplir con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y aquellas normas que las deroguen, modifiquen o sustituyan y debe ser comunicado a los usuarios en las condiciones de uso.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Usuario nuevo: dispositivo que se conecta por primera vez en una zona digital, el usuario deberá registrar (Información de usuario) para navegar y el portal cautivo deberá registrar la dirección física (MAC) de dicho dispositivo.

Usuario recurrente: dispositivo cuya dirección física (MAC) ha sido registrada con anterioridad, es "reconocida" por el punto de Acceso inalámbrico WiFi e inicia una nueva sesión después de haber hecho uso del servicio en la zona digital en una ocasión anterior.

Experiencia: Una vez se haya realizado el registro del usuario, este entrará al servicio como un usuario recurrente, esto es, cuando el usuario se conecte de la misma institución educativa en la que navegó y desee seguir navegando en una nueva sesión. En este entorno, durante el uso del servicio de internet por parte del beneficiario, se debe disponer de la funcionalidad para preguntar al usuario su nivel de satisfacción de navegación, siempre que el usuario acepte hacerlo, especificando la institución educativa-municipio de la zona digital que está calificando. Esta pregunta deberá ser una encuesta con el siguiente resultado: Malo, Regular, Aceptable, Bueno y Excelente.

El número máximo de usuarios simultáneos que podrá estar conectado en cada Institución Educativa es 50.

El sistema de control y registro debe ser agradable a los usuarios, disponer de las anteriores funcionalidades y operar debidamente. Los diseños y funcionalidades de las interfaces anteriores deben ser sujetos a aprobación de la supervisión y/o interventoría. La aprobación del diseño de los pantallazos por parte de la supervisión y/o interventoría se realizará en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles después de la entrega del diseño por parte de EL CONTRATISTA.

- GESTIÓN DE RED.
- GESTIÓN DE CAPACIDAD, TRÁFICOS Y CONSUMO DE DATOS

Para poner en funcionamiento la gestión del proyecto, EL CONTRATISTA debe disponer de los sistemas, equipos y mediciones remotas relacionadas con los equipos en sitio, de modo que se tenga información en tiempo real sobre los siguientes aspectos:

- Tráficos y consumo de datos por minutos, por hora por día por sitio.
- Monitoreo remoto detallado de tráfico y fallas por sitio.
- Monitoreo remoto de fallas en equipos de terminales de conectividad en cada sitio.
- El sistema de gestión y de monitoreo de EL CONTRATISTA debe estar en la capacidad de generar alarmas por condiciones de indisponibilidad permitiendo identificar, cada 24 horas, las Instituciones Educativas que no se encuentran cursando tráfico (por ausencia y/o no reporte de tráfico) en el servicio de Internet, estas alertas deben quedar registradas de forma independiente en el Sistema de Gestión de EL CONTRATISTA generando un ticket, de tal forma que puedan ser validadas por la interventoría.

Asimismo, la información provista en tiempo real debe ser útil para ajustar la red a los tráficos reales en cada sitio, haciendo eficiente el recurso de ancho de banda.

- MESA DE AYUDA


ELCONTRATISTA deberá disponer del servicio de mesa de ayuda para atención de PQRSD.

- **Mesa de ayuda o centro de soporte:** es el medio a través del cual EL CONTRATISTA del proyecto recibirá y dará trámite a todas las Peticiones Quejas, Recursos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD), así como la atención de reportes de fallas y soporte técnico sobre los equipos, el servicio de conectividad y mantenimiento correctivo, esta mesa de ayuda deberá estar ubicada en el territorio Nacional.
- **Procedimiento**: Los usuarios de las Instituciones Educativas se contactarán con el CCC del Ministerio para solicitar soporte o información. Se define CCC como el medio de atención que el Ministerio dispone para consolidar y radicar todas las Peticiones Quejas, Recursos Solicitudes y Denuncias (PQRSD) que interponen los diferentes beneficiarios y proyectos del Ministerio. El agente del CCC realizará el registro, la tipificación del caso y realizará gestión informativa, en caso de que no se resuelva el caso este será escalado a la mesa de EL CONTRATISTA y se transferirá la llamada, por tal motivo EL CONTRATISTA debe contar con una línea de atención gratuita nacional (01 8000).
- **El tiempo máximo de respuesta** establecido para contestar una llamada es de 60 segundos.

La plataforma de gestión de atención de la mesa de servicio de EL CONTRATISTA deberá poder integrarse con la plataforma que este implementada para el Centro de Contacto al Ciudadano (CCC) de tal manera que se realice un intercambio automático en tiempo real de los casos creados y las actualizaciones posteriores.

Para tal efecto se realizarán mesas de trabajo entre ambas partes con el apoyo de la interventoría y/o supervisión para determinar la mejor manera de integración y desarrollar un cronograma de actividades, para puesta en producción.

Figura 4 Esquema de atención a los usuarios

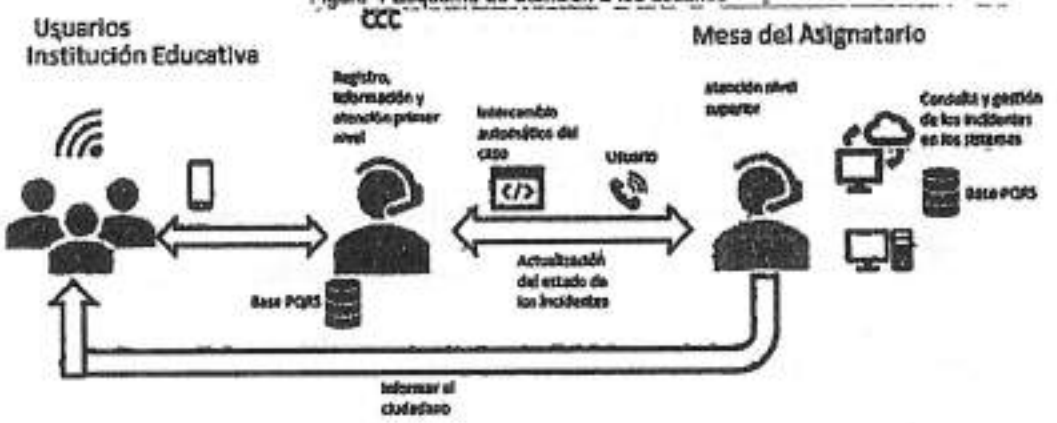

Durante el primer mes de ejecución EL DEPARTAMENTO realizará una mesa de trabajo con EL CONTRATISTA, interventoría y/o supervisión y el MINISTERIO TIC para revisar el procedimiento de atención de las PQRSD. La mesa de ayuda de EL CONTRATISTA deberá estar disponible desde el reporte de la instalación de la primera Institución Educativa.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Durante el plazo de ejecución del proyecto, el servicio de mesa de ayuda debe garantizar de manera permanente un horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., y sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
Asimismo, deberá generar reportes tales como:

- Total de tickets creados en el Centro de Soporte de EL CONTRATISTA diarios y mensuales, Total de llamadas abandonadas.
- Tiempo promedio de atención al usuario.
- Reporte detallado de cada uno de los tickets: clasificados de acuerdo con el nivel de servicio, su estado y responsable.
- Reporte de gestión de PQRSD.
- Reporte de tipificación de fallas presentadas para cada sitio, etc.

EL CONTRATISTA en cada una de las llamadas recibidas, debe registrar en una base de datos como mínimo:

- El tipo de evento reportado (incidente, solicitud)
- Número del reporte
- Datos generales de quien reporta: (nombre, teléfono contacto, dirección física, correo electrónico, fecha)
- Descripción de la falla
- Solución a la falla
- Fecha de solución de la falla
- Otra información relevante (información relevante para los procesos de mantenimiento y reparación que se requieran llevar a cabo).

Los valores máximos admisibles para los indicadores de la mesa de ayuda, que EL CONTRATISTA deberá cumplir en desarrollo del proyecto.

Tabla 17 Valores admisibles de la mesa de ayuda

Item		ANS
1	Nivel de Servicio para la atención de la llamada	Contestar el 80% de las llamadas antes de 30 segundos.
2	Disponibilidad de la plataforma tecnológica de Centro de Contacto. RTO (Tiempo para volver a operar después de un incidente - Recover Time Objective)	D>=99% RTO incidente: 120 min Periodo de medición: mensual
3	Eficacia	# casos resueltos/# casos atendidos >= 95%

EL CONTRATISTA deberá garantizar que la mesa de ayuda genere los reportes que contengan la información necesaria para el cálculo de los indicadores anteriormente descritos, los cuales serán validados por la interventoría y/o supervisión.

Calidad en la atención al usuario EL CONTRATISTA deberá incorporar al sistema de información del proyecto, un reporte mensual del comportamiento del indicador de mesa de ayuda, para efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Con base en los resultados, la interventoría y/o supervisión requerirá al Ejecutor sobre las mejoras a implementar, y validará que en el periodo de corte inmediatamente siguiente se hayan implementado de modo satisfactorio. El incumplimiento a los umbrales que establezca la interventoría y/ó supervisión en las acciones de

mejora dará lugar al procedimiento administrativo establecido en la Resolución 3617 de 2023 que deroga parcialmente la Resolución 2715 de 2020 o aquella que la derogue, subrogue o modifique

- INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

La medición oficial de los indicadores de calidad y niveles de servicio iniciará el día hábil siguiente al recibo de la comunicación de aprobación de la meta uno (1) emitida por parte de la interventoría y/o supervisión.

- EL CONTRATISTA deberá cumplir con los siguientes requerimientos, durante la ejecución del proyecto:
- El servicio deberá estar activo 7x24 para cada una de las instituciones educativas.
- Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el presente anexo para la conectividad de internet.
- Proveer el soporte necesario, a nivel de hardware y software, para realizar las configuraciones que se requieran para el acceso a Internet.
- Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los equipos instalados de tal forma que se pueda garantizar el cumplimiento de los Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio solicitados.

A continuación, se detallan los indicadores a ser medidos en el proyecto y los cuales deberá cumplir EL CONTRATISTA:

Tabla 18 Indicadores de calidad y servicio mensuales

Indicador	Valor Objetivo
Disponibilidad de Servicio de Conectividad por Institución Educativa	Mínimo 96%
Velocidad efectiva mínima de transmisión de datos	40-200 Mbps / 8-50 Mbps; Prioridad: 1Tb
Mantenimiento preventivo	Mínimo una (1) vez por año

Para el cálculo de los anteriores indicadores, no se tendrá en cuenta el tiempo de las fallas que no son imputables al Ejecutor, entre las que se encuentran:

- Cuando por causas externas y consideradas de fuerza mayor, no se pueda acceder a la sede de la Institución Educativa para recuperar el servicio.
- En todo caso, eventos de fuerza mayor debidamente soportados de acuerdo con lo legalmente definido.
- El tiempo en que se incurra para realizar trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo, según los procedimientos establecidos.
- Tiempos de paradas de reloj[2]

[2] Parada de reloj: Situación en que por causa no imputable a EL CONTRATISTA sea necesario aplazar la fecha de atención o solución de un requerimiento. Los tiempos de parada de reloj no cuentan para el cálculo de los indicadores de calidad y servicio

- PENALIZACIÓN

Los indicadores sirven de base para conocer la calidad de los servicios que se están prestando y para el cálculo del valor que será deducido de la factura mensual durante la ejecución de los servicios. En pro del buen uso de los recursos, se ha establecido que los resarcimientos generados producto de las penalizaciones aplicadas por el incumplimiento de los indicadores de servicio quedarán a favor del Ministerio.

La Supervisión y/o interventoría, mediante el usuario y clave proporcionado, tendrá acceso al software de gestión y podrá en cualquier momento realizar la verificación de los indicadores. En este caso, se le indicará a la Supervisión y/o interventoría cómo puede obtener los resultados del indicador. Los tiempos de inactividad por causas no atribuibles al Ejecutor no serán tenidos en cuenta para el cálculo mensual del indicador.

Table 19 Penalización por disponibilidad de servicio

TECNOLOGÍA	NIVEL	RANGO (%)	PENALIDAD
Canales con Reuso (1:2)	96%	D>=96	0% del valor mensual del servicio
		90 ≤ D < 95	10% del valor mensual del servicio
		85 ≤ D < 90	20% del valor mensual del servicio
		80 ≤ D <85	30% del valor mensual del servicio
		70 ≤ D <80	50% del valor mensual del servicio
		50 ≤ D <70	70% del valor mensual del servicio
		D < 50,0	100% del valor mensual del servicio

- FUENTES Y VARIABLES

Sistema de Información:

- Del Sistema de Información se tomarán las fallas reportadas por los usuarios y las fallas reportadas automáticamente por el Sistema de Gestión de Red. Este sistema deberá proporcionar:
- Tipo de Falla: Corresponde a la categorización asignada en el módulo de Gestión de Eventos y PQRS, el tipo de falla debe definir claramente el evento que se está presentando en el sitio, por ejemplo, Intermitencia en el Servicio.
- Fecha y hora de Inicio de Falla: Corresponde a la Fecha y Hora en que inicio la falla, en el caso en que la falla haya iniciado el mes anterior al cálculo esta fecha corresponderá al primer segundo del mes del cálculo, por ejemplo, si queremos realizar el cálculo del indicador para octubre y la falla inicio desde septiembre este campo será 01/10/2025 00:00:01.
- Fecha y hora de Solución de Falla: Corresponde a la Fecha y Hora en la que se le dio solución a la falla, en el caso que la falla se haya solucionado posterior a la fecha final del cálculo esta fecha corresponde al último segundo del mes vigente, por ejemplo, si el cálculo del indicador es para el mes de octubre y la falla se solucionó en noviembre este campo será 30/11/2025 23:59:59.
- Tipo de Solución: Corresponde a la categorización de cierre que tenemos en el módulo de Gestión de Eventos y PQRS, esta categorización nos indica si el cierre corresponde a una acción de mantenimiento, si fue una solución remota, si fue una solución mediante soporte telefónico, etc. Por

ejemplo, si la solución se dio mediante la configuración del equipo de forma remota, el tipo de solución será "Configuración de Equipo".

- Fuente: Corresponde al mecanismo usado por el usuario para manifestar el evento o la falla, este mecanismo también puede ser automático, los valores que podemos encontrar son: Llamada telefónica, correo electrónico, centro de gestión (Automática), chatbot, visita de mantenimiento, interventoría, correo.

- Otra fuente que proveerá entradas para el sistema de información es la fuente que entrega los datos de mantenimientos preventivos programados y aprobados por la interventoría, esta información se usará para descartar fallas que se presenten durante las ventanas de mantenimiento solicitadas.

Sistema de Gestión de Red: El sistema de Gestión de Red creará un ticket en el sistema de información cuando detecta una falla que afecte masivamente la prestación del servicio de transporte de datos en las instituciones educativas.

- PERIODO DE MEDICIÓN

La medición de este indicador se realizará mensualmente desde las 00:00:00 del primer día calendario del mes hasta las 23:59:59 del último día calendario del mismo mes y se deberá iniciar a partir del día hábil siguiente al recibo de la comunicación de aprobación de la meta uno (1) emitida por parte de la interventoría y/o supervisión.

- ENTREGABLE

El indicador de Disponibilidad Promedio de Red se entregará en un reporte de servicios con la siguiente información:

- Disponibilidad.
- Fallas reportadas durante el mes.
- Fecha y hora de falla.
- Tipo de falla.
- Duración de Falla.
- Número de Ticket (número de incidente).
- Información de mantenimientos preventivos y correctivos.
- Fecha de inicio de mantenimiento.
- Fecha de din de mantenimiento.
- Aprobador de mantenimiento.
- Identificador de las fallas que son imputables al Ejecutor y cuales no, esta información será usada para realizar seguimiento y tratar de disminuir las fallas que no son imputables.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- CÁLCULO DEL INDICADOR

- Del sistema de información se tomarán todas las fallas relacionadas que generen indisponibilidad en el servicio de transferencia de datos en donde el periodo de cobertura de la falla afecte el periodo de cobertura del indicador.
- Se clasificarán las fallas en imputables al Ejecutor o no, las que no sean por causas imputables al Ejecutor se descartarán del cálculo.
- Se deberá determinar el tiempo de indisponibilidad, tomando en cuenta que la máxima indisponibilidad de la red en un instante de tiempo es el 100%. Por tal razón cuando dos fallas se presenten de forma simultánea solo se deberá tener en cuenta la afectación de una única falla, es decir, el tiempo total hasta el restablecimiento del servicio.
- Se determinarán los tiempos de mantenimiento preventivo y periodos de falla por causas no imputables al Ejecutor. Si se encuentran eventos de este tipo en el mismo instante de tiempo de una falla esta falla no se tendrá en cuenta como indisponibilidad.
- Se determinará el tiempo máximo de disponibilidad que deba tener la red en Operación formal para el mes de cálculo (TA).
- Se calculará el indicador de disponibilidad promedio departamental de red de acceso, con la siguiente ecuación:

$$DPDRA = (1 - \frac{\sum Fallas\ Red\ Asignatario}{TA\ Red\ Asignatario}) * 100\%$$

- INDICADOR DE DISPONIBILIDAD POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA

El indicador de disponibilidad hace referencia al porcentaje de tiempo en el cual el servicio de conectividad debe estar disponible para los usuarios en cada una de las Instituciones Educativas, cumpliendo con la capacidad, funcionalidad y el nivel de servicio.

Muestra
Se tendrán en cuentan todas las Instituciones Educativas Operativas.

Periodo de medición
La medición de este indicador se realizará mensualmente desde las 00:00:00 del primer día calendario del mes hasta las 23:59:59 del último día calendario del mes, con la información contenida en los tickets generados durante el mes para cada una de las Instituciones Educativas.

Herramienta de medición
Para la medición de este indicador se tiene como referencia la información contenida en cada ticket abierto o cerrado, por Institución Educativa Operativa, durante el período de medición.

Cálculo del indicador
Será responsabilidad de la interventoría y/o supervisión, realizar el cálculo del indicador. Para esto descargará del Sistema de Gestión de EL CONTRATISTA, el reporte de Tickets generados durante el periodo comprendido desde

las 00:00:00 del primer día del mes hasta las 23:59:59 del último día del mes. Mediante cualquier software que utilice la interventoría y/o supervisión deberá en forma automática calcular el tiempo indisponible de la siguiente manera:

- Tiempo fuera de servicio o sin disponibilidad en horas para cada Institución Educativa (Suma de cada intervalo de falla) de acuerdo con la información contenida en los tickets de cada Institución Educativa.
- El Indicador se calculará por cada Institución Educativa.
- El indicador se cumplirá de acuerdo con lo establecido en el presente anexo técnico
- La disponibilidad será medida mensualmente.

La ecuación por usar será la siguiente:

$$DIE = \left[1 - \frac{\sum TF}{h \times d}\right]$$

Donde

- DIE: Disponibilidad del Servicio en la Institución Educativa operativa.
- TF (Tiempo de Falla): Tiempo en el cual el servicio no estuvo disponible en cada Institución Educativa operativa, medido en horas de acuerdo con la información contenida en el reporte tickets cerrados en el periodo de medición y los que se encuentren en estado abierto.
- d: Es el número de días calendario del mes medido.
- h: Será igual a 24 para las Instituciones Educativas que cuentan con energía interconectada a la red.

Criterio de Cumplimiento: El valor mínimo que debe arrojar el cálculo de este indicador, por Institución Educativa, para que se considere como cumplido, debe tomarse así:

- Mínimo noventa y seis por ciento (96%).

El Indicador se considerará cumplido de acuerdo con el siguiente criterio:

El indicador será cumplido cuando por lo menos el noventa y seis por ciento (96%) redondeado al entero superior, de las Instituciones Educativas esté por encima del porcentaje mínimo admisible de disponibilidad.

Es de aclarar que las Instituciones Educativas o los dueños de los sitios donde operarán las Instituciones Educativas no tienen ninguna obligación en colaborar con EL CONTRATISTA en el diagnóstico y solución de fallas, toda vez que la solución de éstas es responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.

Para el cálculo de la disponibilidad se tendrán en cuenta: I) Todas las Instituciones Educativas Operativas; II) Todos los equipos que afecten la conectividad y/o navegación y que sean de propiedad de EL CONTRATISTA

- VELOCIDAD EFECTIVA MÍNIMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS

De acuerdo con la recomendación establecida en el numeral 5.2.1 del documento ETSI 202 057-4 V1.2.1 (2008-073), la tasa de transmisión de datos se debe definir separadamente para la "bajada" y la "subida" de archivos de prueba entre un sitio remoto web y el equipo de borde ubicado en las Instituciones Educativas.

Muestra

EL CONTRATISTA deberá proporcionar un sistema automático, el cual permitirá programar bajo algoritmos de selección las Instituciones Educativas Operativas y se determinará de acuerdo con lo establecido en el siguiente numeral y el anexo C del documento ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07). En este orden de ideas, se plantea la realización de mediciones que conformarán una muestra mensual.

Todas las Instituciones Educativas son objeto de la muestra, por lo tanto, son susceptibles de ser medidas; esto significa que, independiente de la herramienta de medición, una Institución Educativa podrá ser seleccionada específicamente para realizarle mediciones de Velocidad Efectiva de Transmisión de Datos con resultados que harán parte del indicador.

Características de la medición

Las siguientes son características de las pruebas a realizar:

- Se programa una prueba cada hora sobre una población del mínimo del 20% de los servicios instalados en la totalidad de Instituciones Educativas Operativas (encendidas) de EL CONTRATISTA, para el cálculo de las Velocidades Efectivas de Transmisión de Datos tanto de subida, como de bajada y se propenderá que, al finalizar el día, se hayan lanzado al menos 2 pruebas a la totalidad de las Instituciones Educativas Operativas (encendidas) de EL CONTRATISTA separadas en un lazo de intervalo de tiempo de al menos cuatro (4) horas.
- Se programan pruebas durante diez (10) horas continuas en el horario establecido entre las 7:00 a.m., hasta las 5:00 p.m., de todos los días de la semana (lunes a domingo). Sin perjuicio de lo anterior, la interventoría y/o supervisión podrá requerir mediciones en horarios diferentes a los propuestos en el presente acápite.
- Como producto de las mediciones realizadas se debe obtener toda la información cuyos resultados se agrupan por rango, hora, día y mes.
- En los casos en que para una Institución Educativa Operativa no se hayan realizado las medidas para calcular las velocidades efectivas de transmisión de datos durante cinco (5) días calendario consecutivos, EL CONTRATISTA se obliga a forzar directamente las mediciones que permitan calcular las Velocidades Efectivas de Transmisión de Datos en los siguientes tres (3) días calendario. Si ello no es posible por cualquier circunstancia, el fallo de las mediciones se considera suficiente para la creación o apertura de un ticket al día hábil siguiente de la configuración de este hecho, con el concepto de "medición directa de Velocidad Efectiva de Transmisión de Datos". Este ticket deberá ser atendido y solucionado de acuerdo con los procedimientos establecidos en el indicador de disponibilidad.
- Las pruebas de velocidad de cada uno de los meses de operación deberán estar almacenadas y disponibles para consulta, durante los meses de operación del proyecto y hasta cuatro (4) meses posteriores a la finalización de la etapa de operación y mantenimiento.

Herramienta de medición

EL CONTRATISTA deberá contar con una herramienta que permita realizar la medición del indicador de tasa de transmisión de datos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.2.1 del documento técnico expedido por la UIT ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07), o el que lo modifique, derogue o sustituya.

Esta herramienta deberá estar certificada por un organismo certificador que indique que cumple con lo establecido en la norma ETSI y cada uno de los criterios establecidos en el presente documento para realizar la prueba de velocidad. Dicha herramienta y el organismo que la certificará será presentada por EL CONTRATISTA dentro del Informe de Ingeniería y Operación, donde se incluya la información, metodología de medición y características funcionales de la misma, la cual será revisada por la interventoría.

EL CONTRATISTA deberá proveer un servidor que se alojará en sus instalaciones y que deberá contar con todo el licenciamiento y características que cumplan las necesidades de la herramienta de medición desarrollada o adquirida por EL CONTRATISTA, y en el cual se almacenarán todas las pruebas de medición de velocidad y sobre el cual la interventoría y/o supervisión deberá tener los permisos necesarios para poder verificar la integridad de la información y descargar la data almacenada para realizar el cálculo del indicador. Este servidor deberá tener redundancia por cualquier medio (físico o en la nube) del 100% de la información almacenada día a día.

De acuerdo con lo establecido en el documento ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07), con una sola medición se deben obtener los dos registros de la Velocidad Efectiva de Transmisión de Datos tanto para el Descarda (Download) como para carga (Upload) y no se aceptarán mediciones con un sólo registro.

La herramienta deberá tener la capacidad bidireccional de medir la Velocidad Efectiva de Transmisión de Datos entre un sitio de acceso remoto Web y el usuario final, que para este caso serán las Instituciones Educativas, de acuerdo con lo establecido en el documento ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07).

La herramienta de medición debe proveer separadamente las estadísticas para calcular las Velocidades Efectivas de Transmisión de Datos de Descarga (Download) y la Velocidades Efectivas de Transmisión de Datos de Carga (Upload).

La Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos[3] de Descarga (Download) y Carga (Upload), se calcularán de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.2 del documento ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07). El cumplimiento se verificará con respecto a las mediciones realizadas a todas las Instituciones Educativas Operativas que conforman la red; sin perjuicio de lo anterior, el cumplimiento del indicador Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos de Descarga (Download) y Carga (Upload) se verificará para cada una de las Instituciones Educativas Operativas del proyecto.

La interventoría y/o supervisión verificará que la herramienta realice las mediciones conforme a la recomendación ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07) y la veracidad de los valores reportados por EL CONTRATISTA.

[3] La definición de la "Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos" es igual a la del indicador "The lowest 5 % of the data transmission rate in kbit/s achieved" definido en el numeral 5.2.3 del documento ETSI

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Reporte

El reporte del indicador de velocidad efectiva de trasmisión de datos deberá ser presentado por EL CONTRATISTA. El informe debe contener:

- **Un archivo digital plano**, como anexo dentro del informe mensual, el cual debe contener la siguiente información.
- Fecha (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) de la medición.
- Identificación de la Institución Educativa (ID Beneficiario, Acto administrativo, Departamento, Municipio, Centro Poblado y Tipo de Institución Educativa, Nombre y código del Establecimiento y de la Sede Educativa. Tipo de Solución.
- Condición encontrada (E=éxito o F=fallida).
- Para las mediciones exitosas:
- Velocidades Efectivas de Transmisión de Datos de Subida (Upload) medidas para la correspondiente Institución Educativa.
- Velocidades Efectivas de Transmisión de Datos de Bajada (Download) medidas para la correspondiente Institución Educativa.
- **Una sección dentro del Capítulo de Indicadores del Informe mensual de Operación**, dentro de los indicadores Velocidad Efectiva de Transmisión de Datos, compuesta por los resultados de las mediciones con la siguiente información:
- Año - Mes del Reporte del Indicador (AAAA-MM).
- Cantidad total de Instituciones Educativas.
- Cantidad total de Instituciones Educativas con la herramienta de medición instalada.
- Cantidad total de Instituciones Educativas a las que se les realizó la prueba en el mes.
- Cantidad de pruebas realizadas en ambos sentidos (Download/Upload).
- Cantidad de pruebas exitosas en ambos sentidos (Download/Upload).
- Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos: Corresponderá al "[...] lowest 5 % of the data transmission rate in kbit/s achieved (5% más bajo de la velocidad de transmisión de datos en kbit/s alcanzado) [...]", de conformidad con lo establecido en el numeral 5.2 de la recomendación ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07). Se deberá reportar en Kbps con cuatro dígitos enteros y dos decimales. El Indicador se deberá de reportar por separado para cada uno de los rangos y para los dos sentidos (Download/Upload), y deberá ser calculado por hora durante las quince (15) horas de medición.
- Una sección de resumen de los indicadores con los datos o gráficas que permitan visualizar los comparativos acumulados (hasta un máximo de 6 meses). Se debe incluir el análisis y las observaciones del comportamiento del indicador del mes con respecto al(los) mes(es) anterior(es).

Cálculo del Indicador

El cálculo final del indicador lo deberá realizar la interventoría y/o supervisión. Para la medición se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Para la Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos, el cálculo del indicador se realizará de acuerdo con lo siguiente:
- Se subdividirán las muestras del mes guardadas en el servidor alojado en las instalaciones de EL CONTRATISTA en grupos por cada una de las horas de medición diarias, es decir se formarán 10 por cada uno de los tres (3) rangos de velocidad, grupos donde cada uno contendrá todas las muestras tomadas en cada una de las horas objeto de medición de cada uno de los días del mes.

- Se calculará el indicador de Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos por cada uno de los grupos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.2 del documento ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07). Basado en lo anterior se deberán tener 10 resultados de Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos, una por cada grupo.

Criterio de cumplimiento

El indicador de Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos[5] de Descarga (Download) y Carga (Upload), se entenderá que ha sido cumplido cuando 8 de los 10 resultados de Velocidades Efectivas Mínimas de Transmisión de Datos por cada uno de los rangos sean mayores o iguales que las velocidades efectivas mínimas de trasmisión de datos.

- INDICADOR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Se ejecuta de manera presencial en cada Institución Educativa, bajo programación para prevenir fallas o para introducir mejoras en la red. Este tipo de mantenimiento deberá ser avisado a las Instituciones Educativas como mínimo con cinco (5) días hábiles de anticipación y a la interventoría y/o supervisión, se deberá presentar el cronograma de mantenimientos cada año, detallando la cantidad de mantenimientos y su ubicación a realizar por mes; en caso de que haya modificaciones al cronograma deberá ser informado a la interventoría. Para el evento de prevenir fallas en la etapa de operación, el mantenimiento preventivo deberá realizarse por lo menos una (1) vez durante cada año de operación de la Institución Educativa, y su realización será programada por el(los) Ejecutor(s).

En caso de que se realice un mantenimiento correctivo en un periodo inferior a dos meses de tener programado un mantenimiento preventivo, EL CONTRATISTA podrá realizar el mantenimiento preventivo en esa visita.

Cuando se requieran actualizaciones o mejoras en la red de acceso y/o en la red de interconexión que brinda servicio a los Instituciones Educativas, el mantenimiento no podrá realizarse en horarios hábiles y deberán hacerse en horario nocturno, entre las 9:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. En casos excepcionales que se consideren de prioridad manifiesta las acciones de actualización se podrán realizar en horarios diferentes a los anteriormente establecidos previo acuerdo con a la interventoría.

- PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LOS INDICADORES

El procedimiento con el cual se deberá realizar el cálculo de los indicadores es el siguiente:

El cálculo de los indicadores lo deberá realizar la interventoría y/o supervisión con la información reportada por EL CONTRATISTA en los informes mensuales y deberá reportar el resultado durante los cinco (5) días calendario posteriores a la entrega por parte de EL CONTRATISTA del informe mensual.

En caso de que EL CONTRATISTA tenga observaciones sobre el cálculo realizado por la interventoría, deberán ser presentadas durante los cinco (5) días calendario posteriores al recibo del resultado del cálculo remitido por la interventoría. En caso de ser necesario se podrán realizar mesas de trabajo para revisar las observaciones, en estas mesas de trabajo podrá estar presente la interventoría.

La interventoría y/o supervisión contará con tres (3) días calendario después de recibir las observaciones por parte de EL CONTRATISTA, para emitir el concepto final del cumplimiento de los indicadores de calidad establecidos en el presente documento.

- SISTEMA DE GESTIÓN

EL CONTRATISTA deberá implementar un único sistema de gestión centralizado que permita realizar la configuración, monitoreo, detección y corrección de errores de la conectividad a internet implementada en las Instituciones Educativas, dicho sistema debe estar disponible y operativo las 24 horas del día los 7 días a la semana, durante los meses de operación del proyecto. El sistema de gestión deberá responder a las necesidades del Ministerio, teniendo en cuenta los datos, la periodicidad, la calidad, los protocolos, los estándares y mecanismos de intercambio de información que se definen en el presente documento y derivados.

Se deben contemplar los siguientes parámetros y requisitos para el sistema de gestión de todos las Instituciones Educativas a monitorear:

- Integración con herramientas de autenticación AAA (Autenticación, Autorización y Administración de los datos de red) de los equipos instalados por EL CONTRATISTA.
- Supervisión de indicadores de calidad y niveles de servicio en las Instituciones Educativas.
- Acceso a diferentes niveles de acceso de usuarios acorde con los requerimientos operativos.
- Monitorear tráfico, alarmas, fallas y tiempo de recuperación, etc.
- Reporte de incidentes de seguridad.
- Aprovisionamiento (Provisioning) configuración y parametrización de todos los componentes de la red de manera remota, segura y almacenando los parámetros de control.
- Visualización de alertas de redes en tiempo real.
- Como opcional EL CONTRATISTA podrá contar con equipos que tengan control dinámico de potencia bajo demanda.
- Administración: RFC 1155-1157 SNMP V1, SNMP V2c, SNMP V3.
- Mecanismos de gestión: Interfaz de línea de comando o HTTP(S) basado en la Web o Telnet. Soporte seguridad o SSH.
- Monitoreo del estado de la conexión, de la utilización, disponibilidad, consumos y estadísticas.
- Proveer estadísticas de uso del Internet, sitios visitados, sitios bloqueados por los filtros de contenido e intentos sin categoría.
- El sistema de gestión debe permitir visualizar el tipo de conexión suministrado para la Institución Educativa.
- Incluir reportes de posibles incidentes que se lleguen a presentar en la red.
- Toda la información que pueda medir el sistema de gestión debe poder ser reportada por el sistema de gestión.

Adicionalmente el sistema debe generar las siguientes alarmas:

- Instituciones Educativas sin tráfico de usuario.
- Fallas masivas de sitios.
- Sitios con bajo consumo.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- Sitios que no cumplan con los umbrales de las pruebas de velocidad.

Nota: Las alarmas generarán un Log el cual no podrá ser borrado o modificado por un periodo de treinta (30) días, cada LOG debe almacenarse en un archivo independiente por un periodo de doce (12) meses, la interventoría y/o supervisión tendrá acceso a dichos archivos para consulta, en el periodo anteriormente indicado. Además, EL CONTRATISTA deberá incluir todas las licencias de uso necesarias y que sean pertinentes para el buen funcionamiento de la conectividad hasta la finalización de la fase de operación.

- OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS A CARGO DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA deberá entregar a la interventoría o supervisión para su aprobación los informes que se describen en el presente numeral.

- PRESENTACIÓN DE INFORMES
- INFORME MENSUAL

Hasta la finalización del plazo de ejecución del convenio, se deberá presentar un informe mensual con fecha de corte al último día calendario de cada mes, comenzando a partir de la suscripción del acta de inicio. El informe deberá entregarse a la interventoría y supervisión en formato físico y digital durante los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a la fecha de corte, con copia digital a la supervisión del convenio.

El informe debe ser claro y conciso. Además, si es necesario, se deberá incluir cualquier información adicional solicitada por la interventoría y/o la supervisión del contrato.

El informe deberá incluir como mínimo:

- Informe por actividades respecto a las obligaciones del convenio.
- Resumen ejecutivo sobre el estado de avance del convenio
- Actividades realizadas de acuerdo con los hitos del cronograma de ejecución contractual que correspondan al periodo del reporte
- Avances de las metas de planeación, instalación y operación de hogares beneficiados.
- Ejecución presupuestal.
- Indicadores del convenio
- Reporte de comercialización durante la fase de operación.
- Gestión de riesgos del convenio.
- Medición y resultado de los indicadores de calidad y niveles de servicio.
- Estadísticas de PQRS (si los hay): Registrados vs atendidos, no atendidos en tiempos de respuesta, etc.

- Las lecciones aprendidas, principales casos de éxito y las principales dificultades encontradas durante la ejecución del convenio y las recomendaciones para mitigar las mismas en el siguiente periodo
- Cantidad de hogares beneficiarios que hayan estado por fuera del servicio en un tiempo mayor a 12 horas, las causas de dichas indisponibilidades, así como el plan de recuperación del servicio por cada una.
- Reporte del mantenimiento preventivo y correctivo.

Reporte del Sistema de Gestión:

- Número de hogares beneficiados.
- Medición del consumo de ancho de banda.
- Reporte de fallas total.
- Registro de conexiones por periodo de tiempo (mes), horario de mayor concurrencia,
- Días de mayor consumo.
- Información del estado de la red

El interventor revisará el informe mensual y tendrá hasta diez (10) días hábiles, contados a partir de su recepción, para efectuar las revisiones y emitir la aprobación correspondiente. Si se encuentran inconsistencias o datos incompletos, se requerirá realizar los ajustes necesarios, otorgándole una única oportunidad para hacerlo sin aplicar sanciones. Los ajustes deberán completarse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la solicitud de la interventoría o supervisión.

Si, al finalizar el plazo para corregir observaciones, no se han ajustado los documentos conforme a los requisitos o si la interventoría o supervisión no aprueba totalmente los documentos, la entidad procederá a aplicar las sanciones recomendadas por la interventoría o supervisión hasta que se obtenga la aprobación total del documento.
Una vez aprobado el informe mensual, el Cooperante deberá presentar a la supervisión del convenio una copia del informe aprobado y la comunicación correspondiente de la interventoría o supervisión que evidencie dicho cumplimiento.

Nota: La supervisión podrá solicitar en cualquier momento durante la ejecución del convenio un informe específico sobre las actividades relacionadas con el desarrollo del convenio.

Además del informe mensual, el Cooperante deberá diligenciar mensualmente un formato que el supervisor del convenio proporcionará dentro de los primeros cinco (5) días hábiles a partir de la suscripción del acta de inicio. Este formato deberá detallar las actividades y gestiones realizadas en el marco del convenio.

- INFORME FINAL

Con fecha de corte al último día de operación del convenio, el Cooperante deberá entregar un informe final dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes. Este informe deberá presentarse a la interventoría en formato digital y físico, y a la supervisión del convenio solo en formato digital. El informe debe incluir información cronológica consolidada de las principales etapas del convenio, detalles históricos sobre su ejecución, lecciones aprendidas, principales casos de éxito, dificultades encontradas y recomendaciones para mitigar estas dificultades en futuros convenios.

También deberá incluir un listado de los usuarios de los hogares beneficiados que continuarán con el servicio por su cuenta al finalizar el convenio, segregado por zona rural/urbana de cada municipio.

El interventor tendrá hasta cinco (5) días hábiles, contados a partir de la recepción del informe final, para revisarlo y emitir la aprobación correspondiente. Si se encuentran inconsistencias o datos incompletos, se requerirá al Cooperante que realice los ajustes necesarios en un plazo máximo de tres (3) días hábiles. Si, tras este plazo, la interventoría o supervisión no aprueba completamente el informe por causas imputables al Cooperante o a su delegado, se podrán aplicar sanciones hasta lograr la aprobación total del documento.

NOTA: Todos los informes que se indican en el presente anexo y los que la interventoría/supervisión solicite deben radicarse a la interventoría en formato físico y Digital y entregar copia digital a la supervisión

- INFORME ESPECÍFICO DE REDES DE ACCESO Y HOGARES FUERA DE SERVICIO

El Cooperante deberá mantener actualizada la información sobre la cantidad de redes de acceso y hogares que están por fuera del servicio por un tiempo mayor a 12 horas indicando el tiempo acumulado de afectación del servicio, con su correspondiente identificación, con el fin de que la supervisión y/o interventoría pueda realizar el seguimiento. Esta información deberá actualizarse, semanalmente, con corte al viernes de cada semana.

- INFORMES ADICIONALES

Adicional a los reportes e informes a los cuales se hace referencia en el presente numeral, el Cooperante deberá presentar la información que sea solicitada por parte de la supervisión y/o interventoría, en un tiempo no mayor a cinco
(5) días hábiles contados a partir del recibo de la solicitud.

La supervisión y/o interventoría, contará con un plazo de cinco (5) días hábiles para realizar observaciones a los informes presentados. En caso de que persistan observaciones a los informes presentados, el Cooperante tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para realizar los ajustes requeridos.

- GERENCIA OPERATIVA DEL PROYECTO

Para la adecuada ejecución del presente contrato, EL DEPARTAMENTO vinculará mínimo dos (2) profesionales con dedicación del 100% quienes deberán encargarse de la Gerencia Integral del proyecto y del liderazgo de la instalación de los hogares beneficiados, quienes atenderán los requerimientos generales del convenio frente a la supervisión o interventoría. El Gerente del proyecto, será la persona encargada por parte de EL DEPARTAMENTO, de acompañar, coordinar y liderar integralmente la ejecución del proyecto, será el principal canal de comunicación y coordinación entre EL CONTRATISTA, EL DEPARTAMENTO, EL INTERVENTOR y/o EL SUPERVISOR. El Gerente presentará y sustentará de datos e informes de ejecución integral ante EL DEPARTAMENTO, LA INTERVENTORÍA, el Comité operativo, los encargados del seguimiento y demás actores del proyecto, así como al FONDO ÚNICO TIC, en el caso en que le fuere solicitado. Todo ello, a través

de herramientas de gerencia de proyectos que permitan conocer el avance y estado del contrato y en general del proyecto.

En cualquier caso, el Gerente del Proyecto, está obligado a asistir a las reuniones que sean programadas en cualquier momento por EL DEPARTAMENTO, LA INTERVENTORÍA y/o SUPERVISIÓN, EL FONDO ÚNICO TIC- FUTIC. En el evento en que el gerente del proyecto no pueda asistir a las reuniones por causas debidamente justificadas, EL Gobernador de EL DEPARTAMENTO o su delgado, deberá designar un suplente que cuente con las mismas competencias del gerente del proyecto.

EL DEPARTAMENTO, a través del gobernador o de su delegado, designará al Gerente del Proyecto y dicha designación será informada a EL CONTRATISTA. La designación señalada se efectuará con amplias facultades al gerente del proyecto para que este tome decisiones y esté en capacidad de obligarse en nombre del del proyecto.

El gerente operativo del proyecto tendrá el siguiente perfil:

- Profesional en las áreas de Ingeniería de telecomunicaciones/electrónica o afines con especialización en gerencia de proyectos o Certificación PMP Vigente.
- Experiencia de más de 5 años liderando proyectos y/o como asesor, y/o estructurador de proyectos, y de los cuales al menos 1 año debe tener experiencia en procesos estratégicos de transformación digital.

El Líder técnico de instalación de hogares, será designado por EL DEPARTAMENTO. Será el responsable de sustentar técnicamente a la interventoría y/o la supervisión los aspectos de esta naturaleza de la ejecución del convenio y deberá contar con el siguiente perfil:

Profesional en las áreas de Ingeniería de telecomunicaciones/sistemas/electrónica o afines con especialización en tecnología o gerencia de proyectos.

- Experiencia de más de 3 años como líder técnico de proyectos de tecnología, de despliegue de infraestructura tecnológica o de conectividad hogares.
- Si por cualquier circunstancia, fuerza mayor o caso fortuito surja la necesidad de remplazar al gerente del proyecto o al líder técnico de instalación de hogares, EL DEPARTAMENTO garantizará que nuevo integrante debe cumplir las mismas condiciones mínimas del trabajador inicial.

- REPOSITORIO DE INFORMACIÓN

Durante los primeros 10 días hábiles de ejecución del contrato, contados a partir del acta de inicio, la supervisión y/o interventoría y el Cooperante deberán acordar los campos mínimos de registro que debe proporcionar el repositorio, y los mecanismos de acceso respectivos, para facilitar el seguimiento del proyecto. La supervisión y/o interventoría, deberá conocer el resultado de lo acordado durante los 5 siguientes días hábiles y tendrá hasta 5 días hábiles para emitir aprobación, y podrá requerir ajustes de considerarlo necesario, caso en el cual la supervisión y/o interventoría y el Cooperante tendrán hasta 5 días hábiles a partir del recibo de la comunicación para llevar a cabo las modificaciones.

La supervisión y/o interventoria, en caso de considerarlo necesario podrán solicitar la creación e implementación de otro (s) módulos que faciliten la gestión de la información requerida para el correcto seguimiento, control, gestión y vigilancia de la ejecución del Contrato. El Cooperante tendrá hasta cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la comunicación para llevar a cabo las modificaciones.

El Cooperante deberá tener implementado el repositorio con los módulos antes señalados durante los (10) días calendario contados a partir de la aprobación de la supervisión y/o interventoria y deberá informar a la supervisión y/o interventoria, dentro de ese plazo para que esta realice la verificación de los módulos e información que debe reposar en los mismos, para lo cual la supervisión y/o interventoria, contara con cinco (05) días calendario y en caso de existir observaciones por parte de la supervisión y/o interventoria, las remitirá al Cooperante quien deberá subsanarlas en un término no mayor de tres (03) días calendario contados a partir del recibo de las observaciones. En caso de persistir las observaciones o no haber remitido subsanación alguna, la supervisión y/o interventoría, emitirá el concepto de no aprobación del repositorio, y en consecuencia deberá recomendar a la Entidad iniciar el procedimiento administrativo correspondiente para la aplicación de las multas a que haya lugar al Cooperante hasta el cumplimiento de la obligación contractual, conforme a la normatividad vigente y lo señalado en los documentos contractuales.

El Cooperante tiene la obligación de que el repositorio debe estar disponible en línea 24/7, con el fin de poder realizar el control, seguimiento y verificación continuo de todas las obligaciones contractuales.

Nota: El Cooperante deberá considerar que el repositorio debe contar con la información necesaria que dé cuenta del real estado tanto de las obligaciones contractuales como del Proyecto para las dos iniciativas.

Una vez finalizado el plazo de ejecución, el Cooperante deberá entregar toda la información de manera digital contenida en el Repositorio de Información.

La supervisión y/o interventoria definirá los formatos y/o estructura de presentación de la información a cargar.

- INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA RED DE ACCESO IMPLEMENTADA EN LA JUNTA DE INTERNET – COMUNIDAD DE CONECTIVIDAD.

Con relación a las redes de acceso implementadas en las Juntas de internet – Comunidades de conectividad (JI-CDC), se requiere que el repositorio contenga toda la información, documentos, reportes, solicitudes y aprobaciones que se generen en cada una de las etapas del proyecto; así:

- Etapa de Planeación (Ver numeral 5.1 de este Anexo)
- etapa de Instalación de la Red de Acceso (Ver numeral 5.2 de este Anexo)
- Etapa De Operación y Mantenimiento (Ver numeral 5.3 de este Anexo)
- Etapa de Capacitación (Ver numeral 5.4 de este Anexo)
- Información adicional que pueda ser almacenada sobre la red de acceso que sea relevante para el proyecto y de acuerdo a lo requerido por la supervisión y/o interventoría.
-

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS HOGARES A CONECTAR EN LAS JUNTAS DE INTERNET

Con relación a los hogares a conectar en las Juntas de Internet – Comunidades de conectividad (JI-CDC), se enumeran los hitos mínimos que deberán estar en el Repositorio de Información, así:

a) Información de suscriptores (hogares conectados) con los siguientes campos mínimos:
   - Id Cuenta
   - Estado del servicio (, suspendidos, etc.), para los suscriptores (activos, inactivos, suspendidos, etc.)
   - Nombre
   - Apellido
   - Tipo Documento
   - No. Documento
   - Teléfono
   - Celular
   - Correo electrónico
   - Fecha Inicio Operación
   - Fecha Fin Operación
   - Código DANE Departamento
   - Departamento
   - Código DANE Municipio
   - Municipio
   - Dirección
   - Georeferenciación (Coordenadas geográficas)
   - Barrio o vereda (si aplica)

b) Sustituciones de suscriptores en el mismo predio.
c) Copia del documento de identidad del Usuario;
d) Copia del contrato entre la Juntas de Internet – Comunidades de conectividad (JI-CDC) y el hogar (si aplica)
e) Foto de la fachada del predio del Usuario, en la que aparezca legible la nomenclatura de la dirección. En caso de que el predio no cuente con nomenclatura, se debe colocar para la toma de la foto una cartulina al lado de la puerta del predio con las indicaciones claras de su ubicación, que comúnmente están registradas en los recibos de servicios públicos de energía o de agua del predio y/o las coordenadas geográficas que inserta automáticamente el terminal móvil.
f) Fotografía del pantallazo de la prueba de velocidad realizada al momento de la instalación del servicio para acreditar el cumplimiento de las especificaciones del servicio de Internet de banda ancha;
g) Fotografía que permita identificar el número serial de los equipos instalados para dar la conectividad a Internet al hogar.
h) Información adicional que pueda ser almacenada sobre la prestación del servicio que sea relevante para el proyecto y de acuerdo con lo requerido por la supervisión y/o interventoría.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- COMITÉ OPERATIVO

Para la adecuada ejecución, se creará un Comité Operativo, que actuará como máximo órgano de decisión y de dirección del proyecto. Dicho Comité estará integrado así: I) El Supervisor de EL DEPARTAMENTO, o el gerente operativo del proyecto; II) El director de infraestructura del Ministerio TIC o a quien este delegue; III) delegado del Fondo Único de TIC y iv) Un delegado de la interventoría y/o la supervisión. Podrán asistir invitados, y miembros del equipp de apoyo.

El comité establecerá un reglamento para plasmar de forma expresa las reglas que permitan a sus miembros discutir sobre los aspectos relevantes de la ejecución del proyecto. El comité tendrá por finalidad, realizar la dirección y el seguimiento a la adecuada ejecución del proyecto, y vigilar la correcta ejecución del del proyecto. Asimismo, establecerá el responsable de ejercer la secretaría técnica.

El Comité Operativo deberá reunirse ordinariamente, de manera presencial (preferente) o virtual, al menos una vez al mes, desde la firma del Convenio, y podrá hacerlo de manera extraordinaria cuando se estime conveniente.

En ningún caso, el comité operativo podrá introducir modificaciones al Contrato que apruebe el proyecto.

- REGLAS PARA EL USO DE LOS RECURSOS

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir las disposiciones y condiciones establecidas en la forma de pago y el anexo denominado ANEXO PROYECCIÓN DE GASTOS POR PRODUCTO, para la ejecución del proyecto en el Contrato. Por tal motivo los recursos autorizados por la supervisión y/o interventoría sólo podrán ser utilizados para los fines que se establezcan para el proyecto.

- COMUNICACIONES

Todos los comunicados, solicitudes, oficios enviados por la Entidad Contratante o la interventoría o supervisión, deberán contestarlos y atendidos por el Cooperante en un término máximo de cinco (5) días hábiles desde la recepción de la respectiva comunicación. Así mismo el Cooperante tiene la obligación de facilitar la información necesaria que requiera la interventoría/supervisión para dar respuesta oportuna, ajustada y pertinente a las diferentes PQRS o solicitudes que se requieran atender.

- GESTIÓN DOCUMENTAL

El Cooperante, o la persona designada para tal fin, deberá mantener un archivo ordenado y cronológico que cumpla con los estándares mínimos establecidos por la normativa vigente en gestión documental. Este archivo deberá estar disponible para la interventoría o supervisión del convenio cuando sea requerido. Los estándares de calidad incluyen, al menos, la aplicación sistemática de criterios para el registro, clasificación, seguridad y almacenamiento o conservación de la información generada durante la ejecución del convenio, tanto en formato físico como digital, garantizando así la calidad y fiabilidad de la información necesaria para su consulta.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- CUMPLIMIENTO A NORMAS DE MEDIO AMBIENTE

EL DEPARTAMENTO, a través del interventor deberá corroborar y garantizar que EL CONTRATISTA cumpla con el protocolo o plan integral de manejo de residuos (convencionales, peligrosos y/o especiales) previa intervención con el cual se garantice el manejo adecuado y la disposición final de los residuos que se generen durante la ejecución del contrato. Adicionalmente, deberá presentar, según aplique, los permisos para su generación, almacenamiento, transporte y disposición final, así como los certificados de disposición final o aprovechamiento, los cuales deberán ser emitidos por gestores debidamente autorizados, dando cumplimiento a las normas ambientales establecidas en el Decreto 4741 de 2005, Decreto 1076 de 2015 y Resolución 1188 de 2003, expedida por el DAMA, y demás normas que la modifiquen, complementen o adicionen; durante todo el plazo de ejecución del convenio y deberán realizar la correspondiente disposición final de los elementos conforme a lo prescrito en la legislación.

- PLAN DE SOSTENIBILIDAD

Entregar al supervisor del Ministerio TIC con mínimo 3 meses de anterioridad a la finalización del OPEX del convenio, un plan de sostenibilidad de los bienes y servicios objetos del mismo, en donde se presente la alternativa de sostenibilidad financiera, técnica, ambiental y jurídica del proyecto con su esquema de operación una vez finalizado la operación con recursos del convenio, para ser revisado y aprobado por el supervisor.

- ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA JUNTA DE INTERNET – COMUNIDAD DE CONECTIVIDAD

EL CONTRATISTA deberá garantizar que su(s) subcontratista(s) seleccionado(s) para cada región, desarrollen las siguientes etapas:

- ETAPA DE PLANEACIÓN

EL CONTRATISTA deberá diseñar una solución de acceso utilizando tecnología punto multipunto que responda a los requisitos y necesidades definidas en el objeto y alcance de la presente convocatoria.

EL CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos técnicos para garantizar el diseño, instalación y operación óptimos de la red residencial inalámbrica ofertada, mediante tecnologías Fixed Wireless Access (FWA) redes inalámbricas tipo punto multi punto en bandas no licenciadas. Los entregables incluyen desde los estudios preliminares hasta el dimensionamiento y selección de los componentes constitutivos de la red de acceso.

Las especificaciones descritas son parte integral de la presente convocatoria y de la Minuta del Contrato en caso de adjudicación. Para ítems no especificados, aplicarán las normativas de organismos como ITU-T, IEC, IEEE, ETSI, ANSI, TIA, IETF, entre otros.

Requisitos clave:

- Manejo eficiente del ancho de banda.
- Flexibilidad en la multiplexación y agregación de tráfico.
- Sostenibilidad y evolución en la infraestructura de red.
- Eficiencia operativa y escalabilidad.
- Alta confiabilidad, protección y restauración del sistema.
- Gestión ágil y transparente extremo a extremo.

En todo caso, EL CONTRATISTA deberá presentar tanto el diseño en la tecnología FWA punto multipunto, según lo establecido en los documentos del presente proceso, como el diseño de la alternativa propuesta, la cual deberá cumplir con la totalidad de condiciones establecidas en los documentos del presente proceso, en lo que le aplique y, deberá ser adicionada en aquellas condiciones y especificaciones propias de la solución FTTH. La interventoría y/o supervisión realizarán el análisis de la propuesta.

- ESTUDIO DE CAMPO (SITE SURVEY)

EL CONTRATISTA realizará un análisis completo del área de despliegue para identificar las condiciones físicas, de infraestructura y de cobertura necesarias, tanto para redes basadas en fibra como inalámbricas.

Objetivos del Site Survey

- Evaluar viabilidad de conectividad y puntos de acceso.
- Identificar ubicación de puntos de conexión de fibra y/o estaciones inalámbricas.
- Definir rutas óptimas y posibles obstáculos.
- Determinar la ubicación del Headend o centro de cabecera.

Entregable del site survey

- Un informe detallado del site survey con planos y documentación del análisis.
- Condiciones topográficas y dispersión de hogares
- Infraestructura existente (postes, torres, mástiles etc.)
- RF survey (indicando el piso de ruido electromagnético de la Zona y análisis de SNR), cableado, última milla, energía eléctrica etc.
- Viabilidad de conectividad y puntos de acceso.
- Identificación de ubicación de puntos de conexión de fibra y/o estaciones inalámbricas.
- Definición de rutas, óptimas y posibles obstáculos.
- Determinación de la ubicación del Headend o centro de cabecera.
- Determinación de la ubicación de los hogares a conectar.
- Diseño de Bajo Nivel (Low-Level Design - LLD)
- EL CONTRATISTA desarrollará un diseño técnico detallado para la instalación, configuración y operación de la solución, considerando los requisitos de redes FWA redes inalámbricas tipo punto multi punto en bandas no licenciadas.

Requisitos del diseño de bajo nivel

- Topología de red y arquitectura detallada.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- KMZ en el que se identifique la ubicación de los AP, la zona de cobertura de la red de acceso y los hogares a conectar de la Junta de Internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC).
- Simulación de cobertura garantizando en el que se evidencie el nivel de señal mínimo requerido para los hogares a conectar.
- Especificaciones de las torres y/o mástiles y normativa a cumplir de acuerdo con su altura (luces de obstrucción, pararrayos, protecciones eléctricas, sistemas de puesta a tierra, etc., según normativa de Aeronáutica Civil) .
- Resultado del análisis de espectro de la zona a cubrir.
- Especificación de componentes (antenas, switches, cableados, etc.).
- Configuración de políticas de QoS y gestión de ancho de banda
- Entregable del diseño de bajo nivel y cronograma detallado de instalación
- Planos de red, esquemas de conexión y documentación técnica del diseño.
- Cronograma detallado de instalación (MS Project, con copia en Excel) y puesta en servicio, acorde con el cronograma general, el cual incluye el plan de instalación y activación de la conectividad a internet de los hogares de la Junta.

Lista de Materiales (BOM - Bill of Materials)

- EL CONTRATISTA deberá documentar todos los materiales necesarios para implementar la red, especificando componentes para soluciones *FWA.*
- Requisitos de la lista de materiales
- Detalle de equipos (antenas, switches, etc.), equipos pasivos con especificaciones técnicas.
- Cantidades, modelos, proveedores sugeridos y costos estimados.
- Materiales para instalación, como racks, cableados y soportes.
- Entregable de lista de materiales
- BOM detallado con estimaciones de costos y especificaciones técnicas. El BOM debe incluir, adicional a los elementos componentes de la red de acceso, la entrega de un stock de repuestos para la red de acceso que permita garantizar la continuidad del servicio, al menos por dos años contados a partir del inicio de la operación y, un stock de equipos de usuarios (CPE, routers), equivalente al 10% de la cantidad de hogares a conectar en la Junta de Internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC)., según se relaciona en el Anexo 1. EL CONTRATISTA deberá redondear el número resultante al entero inmediatamente superior.

Plan de Mantenimiento

EL CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Mantenimiento que deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

1) Descripción del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, en el cual se detallen las actividades a realizar.
   - Mantenimiento Preventivo: se ejecuta bajo programación para prevenir fallas o para introducir mejoras en la red, este se dará una vez cada 6 meses
   - Mantenimiento Correctivo: es aquel que se ejecuta una vez se presenten fallas en la etapa de operación del proyecto que afecten de manera parcial o total el servicio.
2) Esquema de atención y soporte técnico, especificando niveles y tiempos de escalamiento y prioridades.
3) Deberá especificarse el mantenimiento a aspectos de seguridad como configuraciones y filtros de navegación de acuerdo con los establecidos en el presente documento y política de seguridad física.

Plan de Formación

EL CONTRATISTA deberá presentar el Plan de Formación con el contenido mínimo establecido en el presente anexo técnico.

Aprobación de los documentos de Planeación
Los documentos de Planeación deberán ser presentados a la supervisión y/o interventoría, en medio físico y digital, en medio digital a través del portal de radicación de MINTIC.GOV.CO., https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Informes-de-PQRSD/125804:Registro-PQRSD

La revisión, verificación de cumplimiento y contenido de cada uno de los documentos de planeación, se adelantará por parte de la supervisión y/o interventoría en un plazo máximo de 5 días hábiles después de la presentación de estos, plazo en el cual se podrá solicitar al Ejecutor la información que considere necesaria.

Asimismo, cualquier solicitud de modificación que se realice a los Documentos de Planeación durante la ejecución del proyecto, deberá ser presentada a la supervisión y/o interventoría, en un plazo máximo de 5 días hábiles.

- ETAPA DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO

- APROBACIÓN PARA INICIAR EL PROCESO DE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO

Para la aprobación del inicio del proceso de instalación de la red de acceso, EL CONTRATISTA deberá coordinar con la interventoría y/o supervisión, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, el modelo de validación de la correcta instalación y funcionamiento de la red de acceso y el Protocolo de Pruebas para su recepción establecido por la supervisión y/o interventoría.

Así mismo y con el fin de que la interventoría y/o supervisión pueda realizar la programación de las diferentes actividades, EL CONTRATISTA deberá acordar el cronograma específico de las diferentes actividades contempladas en el proceso de instalación: a) aprobación de la instalación, b) Instalación de la infraestructura de red de acceso y conexión de hogares c) Notificación de la instalación, d) Verificación remota[4] e) Visita de Campo y pruebas de aceptación.

El plazo de instalación de la red de acceso de cada Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) es de hasta tres meses, contados a partir de que la supervisión y/o interventoría realice la ***aprobación para el inicio de la instalación de la red de acceso,*** período durante el cual EL CONTRATISTA debe realizar la conexión de los hogares de la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) y la activación de la conectividad a internet. Al final de los tres (3) meses deben estar conectados y activados la totalidad de los hogares de la Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC).

- INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ACCESO

EL CONTRATISTA deberá incluir los servicios de instalación, configuración, y puesta en marcha para todos los componentes de hardware y software que hagan parte de la red de acceso propuesta.

[4] La verificación remota tiene como objeto verificar el estado real de la instalación y adelantar la coordinación con los diferentes actores para garantizar la efectividad de la visita de campo, con el fin de evitar que la visita de campo sea fallida, ya que en el caso de que esto ocurra, los costos de la revisita serán a cargo del EL CONTRATISTA.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Los componentes físicos de la red de acceso deberán instalarse en cada una de las Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) que le sean adjudicadas. Esta instalación e implementación deberá cumplir con todas las Normas, Estándares, Recomendaciones y especificaciones vigentes de la industria a nivel nacional como a nivel internacional (ITU-T, ETSI, EIA, etc.), así como las especificaciones y requisitos contemplados en este Anexo Técnico, que garanticen el correcto funcionamiento y operación de los equipos de manera adecuada y segura para cada Junta de INTERNET dentro del alcance del presente proceso.

El detalle asociado al cumplimiento de las Normas y Estándares, junto con el plano de instalación, deberá ser presentado a la supervisión y/ o interventoría por EL CONTRATISTA seleccionado.

La instalación, cableado, implementación, comisionamiento, configuración, pruebas, puesta en servicio de toda la solución end to end deberá ser realizada por EL CONTRATISTA, quien deberá contar con todos los medios humanos, logísticos, herramientas, instrumentos analizadores de redes, equipos o instrumentos de medida y ensayo apropiados, materiales y medios de transporte necesarios, entre otros, que permitan cumplir con el objeto, alcance y plazos de entrega comprometidos.

NOTA 1: Solución end to end entiéndase todo el trayecto desde el origen hasta el destino (Usuario Final – Hogar de la Junta de INTERNET) sin interrupciones en el nivel de servicio.

- CONEXIÓN DE HOGARES Y ACTIVACIÓN DE LA CONECTIVIDAD EN LOS HOGARES

La conexión de los hogares en cada Junta de INTERNET y la activación de la conectividad a INTERNET se inicia a partir de que la supervisión y/o interventoría emiten el concepto de aprobación para el inicio de la instalación de la red de acceso.

A continuación, se definen las condiciones establecidas para llevar a cabo la instalación y activación de la conectividad de los accesos a Internet fijo en los hogares de las Juntas de INTERNET, materia de esta convocatoria.

- CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

EL CONTRATISTA seleccionado deberá presentar, el cronograma de conexión de hogares, en el cual se establezca la cantidad de hogares a conectar durante la etapa de instalación, garantizando que la totalidad de la meta de hogares instalados en la Junta de internet – Comunidad de conectividad (JI-CDC) se realice en las condiciones técnicas y de calidad establecidas para el proyecto.

EL CONTRATISTA debe incluir todos los componentes, módulos, accesorios, software, licenciamiento, suscripciones y cualquier otro elemento adicional que se requiera para la entrega, instalación, configuración y puesta en operación de los equipos a suministrar.

EL CONTRATISTA debe garantizar que los suministros y equipos a instalar deben ser nuevos, no se aceptan equipos tipo "refurbished", remanufacturados o clones.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Los costos asociados a la sustitución de hogares en las Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) estarán a cargo de estas.

- CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE USUARIO

Los equipos de usuario, instalados en los hogares, deberán tener un correcto y estable funcionamiento y conectividad, y cumplir todas las especificaciones exigidas bajo las condiciones técnicas de operación recomendadas por el fabricante.

EL CONTRATISTA será responsable de que todas aquellas unidades que resultaren de mala calidad o con defectos de diseño y/o fabricación, cuyo funcionamiento no sea correcto o no realicen alguna de las funcionalidades o compatibilidades contratadas sean reemplazadas a entera satisfacción.

Se entiende por correcto funcionamiento lo siguiente:

- Que los bienes suministrados ejecuten las funciones que les son propias y para las cuales fueron diseñados, libres de errores o defectos.
- Que los bienes suministrados sean aptos para el servicio para el cual fueron adquiridos y no existan eventuales vicios de diseño, calidad y fabricación, que impidan su óptima utilización y su funcionamiento idóneo y eficaz.
- Que los bienes suministrados cumplan con los requisitos mínimos definidos en este anexo técnico y cumplan con las especificaciones oficiales publicadas por el fabricante.

- PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN

Compras e inventario

La supervisión y/o interventoría realizará el seguimiento continuo a la ejecución, por parte de EL CONTRATISTA, de las actividades contenidas en el Contrato. EL CONTRATISTA deberá mantener actualizada la información de las compras y el inventario de los equipos a instalar en los hogares, en el Repositorio de Información, entendido como espacio centralizado donde se almacena, organiza, mantiene y difunde información digital, al que pueda acceder la Supervisión y/o Interventoría, adicionalmente, deberá remitir a la supervisión y/o interventoría, reportes (digitales) mensual de ejecución, de los avances del plan de compras de equipos y conexión de los hogares , hasta concluir las metas de conexión de hogares.

Por su parte, la Supervisión y/o Interventoría deberá efectuar la revisión y validación de los soportes de las compras, adquisiciones y/o ordenes de pedido, en un plazo de diez (10) días hábiles siguientes al reporte, con lo cual podrá mantener una relación actualizada de las aprobaciones y del inventario de los equipos instalados.

En el Repositorio de Información deberán estar disponibles las copias de los contratos y/o órdenes de compra o pedido, mediante los que EL CONTRATISTA adquiere los equipos a instalar en los hogares (CPE, Routers).

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Instalación y puesta en servicio

EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes condiciones durante las actividades de instalación y puesta en servicio:

La tecnología, el diseño y la configuración de los equipos de la red de acceso, serán de libre elección por EL CONTRATISTA, siempre y cuando cumplan con la normatividad vigente, y permitan dar cumplimiento a la adecuada prestación del servicio de Internet, de acuerdo con lo establecido en el presente anexo.

EL CONTRATISTA cuya propuesta sea seleccionada en la presente convocatoria se obliga a:

Operar, mantener y gestionar la infraestructura de acceso para las Juntas de Internet, por un período de seis (6) meses, de tal manera que permitan la prestación del servicio de internet comunitario a sus Asociados, con velocidades mínimas de 25 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida, acorde con la capacidad IP.

Las Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) serán las responsables de:

- Suministrar al Ejecutor el listado de los hogares a instalar, con su correspondiente ubicación.
- Coordinar con los hogares a conectar el día y la hora en que EL CONTRATISTA realizará las actividades de conexión del hogar.
- EL CONTRATISTA deberá incorporar en el Repositorio de Información, al que pueda acceder, vía WEB, la Supervisión y/o Interventoría, los soportes documentales de cada una de las instalaciones realizadas, incluyendo, entre otros:
  - Datos de contacto de la persona que recibe el servicio en el hogar
  - Copia del documento de identidad de la persona que recibe el servicio en el hogar
  - Copia del documento mediante el cual la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) autoriza a un miembro de la comunidad a recibir el servicio en los hogares
  - Copia del documento de recepción del servicio por parte de un delegado autorizado por la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC)
  - Foto de la fachada del predio del beneficiario, en la que aparezca legible la nomenclatura de la dirección o las indicaciones que se registran en los recibos de los servicios públicos, y la georeferenciación, que permitan su ubicación clara en el caso de predios sin nomenclatura;
  - Una fotografía o pantallazo como soporte de la prueba de velocidad realizada al momento de la instalación del servicio para acreditar el cumplimiento de las especificaciones del servicio de Internet y calidad del servicio.
  - Una foto que permita identificar el número serial de los equipos (CPE, router) instalados para la prestación del servicio en ese hogar.
  - EL CONTRATISTA deberá mantener actualizada la base de datos de contacto de los hogares, y la fecha en la que se activó el acceso a Internet.
- De acuerdo con el plan de instalación y conexión de los hogares de la Junta, presentado por EL CONTRATISTA seleccionado en la etapa de planeación y las entregas realizadas por EL CONTRATISTA, la Supervisión y/o Interventoría realizará la validación de los hogares conectados reportados para verificar que cumplan con las condiciones de instalación y las condiciones de conectividad a Internet, las cuales podrá realizar de forma remota o con visita en campo, para lo cual deberá contar con el acompañamiento de EL CONTRATISTA.

- En el caso en el que la instalación de los hogares conectados que hacen parte de las Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad (JI-CDC) no fuera aprobada por la supervisión y/o interventoría, EL CONTRATISTA podrá subsanar las observaciones que haya realizado la supervisión y/o interventoría en un plazo máximo de 5 días calendario, y las mismas podrán ser verificadas por la supervisión y/o interventoría, mediante visita remota dentro de los 5 días calendario siguientes. La supervisión y/o interventoría contará con los siguientes 5 días calendario para emitir el concepto definitivo de la instalación y puesta en servicio de los hogares conectados que hacen parte de las Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) asignadas al Ejecutor.
- EL CONTRATISTA reportará semanalmente a la supervisión y/o interventoría, vía correo electrónico el avance del cronograma de instalación de la infraestructura de la red de acceso y la conexión de hogares de cada Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) adjudicada, que permita realizar seguimiento y la coordinación de las visitas de aprobación por parte de la supervisión y/o interventoría.

Se aclara, que en el caso eventual de que la meta de hogares a conectar en cada Junta, no se alcance a cumplir al final del periodo planeado para tal fin, por motivos de falta de interés de los asociados a las Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC), EL CONTRATISTA seleccionado mantendrá almacenados y debidamente resguardados los CPE, routers y accesorios no utilizados, para eventualmente ser utilizados en futuras ampliaciones de las Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC).

- NOTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO

Dentro del proceso de recibo y aprobación de la red de acceso de cada Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC), se realizan las siguientes actividades:

- Notificación por parte de EL CONTRATISTA a la supervisión y/o interventoría, informando la finalización de la instalación de la red de acceso de cada Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC).
- Verificación por parte de la supervisión y/o interventoría de los soportes que evidencien la instalación de red de acceso de cada Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC).
- Programación de Verificaciones Remotas y Visitas de Campo para la aprobación de la instalación de la red de acceso de cada Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC).

NOTA 1: Las actividades inherentes a conseguir la aprobación de la supervisión y/o interventoría, de la instalación de la Red de acceso está en cabeza de EL CONTRATISTA, actividades que se deben realizar dentro de los plazos estipulados en el cronograma y cualquier atraso en la aprobación de estos no se puede entender como tiempo adicional para la instalación de la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC).

NOTA 2: En caso de que la Visita de Campo para aprobación de la instalación de la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) sea fallida, es decir que la supervisión y/o interventoría, no apruebe la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC), por causas imputables al Ejecutor, y que para la aprobación de la misma se requiera repetir la visita de campo de la supervisión y/o interventoría, el costo de esta visita adicional deberá ser asumido por EL CONTRATISTA, es decir no se podrán utilizar recursos de fomento para el pago de visitas adicionales. El valor de la visita será establecido en el Contrato, de acuerdo con la dificultad de acceso a la ubicación de la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) adjudicada al Ejecutor.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Una vez EL CONTRATISTA haya finalizado la Instalación de la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC), mediante comunicación, escrita y en formato digital, realizará un reporte a la supervisión y/o interventoría, con la siguiente información:

1) Información de ubicación de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) como código DANE departamento, código DANE municipio, código DANE centro poblado, coordenadas (mínimo 5 decimales) y dirección o referencias para llegar al sitio.
2) Soporte de la Instalación de la infraestructura de la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC):

- Informe semanal de implementación
- Planos de red, esquemas de conexión **(AS BUILT)** y documentación técnica de la instalación para cada nodo de la red y para la red desplegada, según aplique.
- Registró fotográfico de cada uno de los componentes de red
- Diagrama de Potencias en cada etapa del sistema, incluyendo resultados de apuntamiento de las antenas y los radioenlaces.
- Al menos un (1) video omnidireccional (360 grados) del área cubierta por la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC), identificando el lugar donde se encuentra instalado el nodo de servicio de la comunidad, los nodos de repetición; los lugares de importancia y lugares de posibles interferencias. El video deberá tener una duración mínima de 120 segundos para detallar los equipos instalados en el nodo de servicio de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) y los detalles relevantes de las torres y/o mástiles utilizados y de los equipos instalados en estas.
- Soportes del(los) permiso(s) gestionados.
- Carpeta con el informe final de instalación

3) Soporte de la conexión de los hogares de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC):

- Informe semanal de conexión de hogares
- Datos de contacto de la persona que recibe el servicio en el hogar
- Copia del documento de identidad de la persona que recibe el servicio en el hogar
- Copia del documento mediante el cual la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) autoriza a un miembro de la comunidad a recibir el servicio en los hogares
- Copia del documento de recepción del servicio por parte de un delegado autorizado por la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC)
- Foto de la fachada del predio del beneficiario, en la que aparezca legible la nomenclatura de la dirección o las indicaciones que se registran en los recibos de los servicios públicos, y la georeferenciación, que permitan su ubicación clara en el caso de predios sin nomenclatura;
- Una fotografía o pantallazo como soporte de la prueba de velocidad realizada al momento de la instalación del servicio para acreditar el cumplimiento de las especificaciones del servicio de internet y calidad del servicio.
- Una foto que permita identificar el número serial de los equipos (CPE, router) instalados para la prestación del servicio en ese hogar.

- VERIFICACIÓN REMOTA

La supervisión y/o interventoría realizará pruebas remotas para verificar que la red de acceso se encuentra instalada, en funcionamiento y operativa.

EL CONTRATISTA deberá proponer un formato de verificación, la supervisión y/o interventoría podrá adicionar ítems al protocolo de pruebas y definir finalmente el formato a utilizar.

Del resultado de las pruebas remotas se levantará un acta en la cual se plasmen los resultados de estas. En dicha acta, deberán quedar expresados claramente los resultados de la verificación, de tal forma que se pueda evidenciar si es procedente continuar con el proceso de aprobación o-si por el contrario EL CONTRATISTA debe realizar acciones de mejora.

El acta de verificación será el soporte para la realización de la visita de campo y hará parte integral del informe de aprobación de la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC).

- VISITA DE CAMPO PARA LA APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO

Se debe realizar visita de campo, la cual se deberá coordinar con la supervisión y/o interventoría, una (1) visita de verificación en la que deberán estar presentes un (1) representante técnico calificado de EL CONTRATISTA, (1) representante de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) y un (1) representante de la supervisión y/o interventoría.
La supervisión y/o interventoría, acordará el protocolo de pruebas con EL CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) días hábiles después de la firma del acta de inicio, el cual como mínimo contendrá los ítems que se describen a continuación, con el fin de verificar que el servicio a prestar en los hogares a conectar en la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) cumpla con las condiciones establecidas en el presente Anexo Técnico.

- Información General.
- Verificación de la cobertura de la Red de acceso (garantizando un indicador de fuerza de la señal recibida (RSSI) como mínimo de -65 dBm).
- Pruebas de Conectividad.
- Pruebas de funcionamiento con dispositivos de usuario final en ambas frecuencias 2.4 GHz y 5 GHz. Como mínimo se debe garantizar navegabilidad de dispositivos con sistemas operativo Android y Windows. EL CONTRATISTA deberá garantizar por su cuenta que en el momento de las pruebas existan al menos 3 dispositivos con diferentes sistemas operativos que se conecten simultáneamente a la Red de acceso.
- Acceso a páginas Web y restricción de acceso a las páginas Web de acuerdo con los filtros definidos
- Funcionalidad de equipos.
- Relación de equipos recibidos.
- Conclusiones de la Visita (Aprobado o no aprobado).

Adicionalmente se deberán como mínimo hacer las siguientes pruebas

Tabla 20. Pruebas de red de acceso

Pruebas de cobertura:	- Niveles de Señal (Calidad del Enlace) RSSI (Received Signal Strength Indicator): ▪ Nivel recomendado: Mejor que -65 dBm. ▪ Nivel mínimo aceptable: Entre -65 dBm y -75 dBm.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

	Por debajo de -75 dBm: Requiere ajuste de alineación o evaluación de interferencias. - SNR (Signal-to-Noise Ratio): ▪ Valor recomendado: Mayor a 25 dB. ▪ Valor mínimo aceptable: Entre 20 dB y 25 dB. Por debajo de 20 dB: Se espera degradación en la calidad del enlace. - Interferencia de Canal: Mediante el uso de un analizador de espectro o herramienta de software se debe hacer la identificación de canales limpios. Niveles recomendados: Ruido de fondo menor a -90 dBm.
Pruebas de Conectividad	**Prueba de Ping para validación de la latencia en la red de acceso:** - Latencia hacia el AP Recomendada: ▪ Máxima permitida: Hasta 10 ms. - Pérdida de paquetes: ▪ Recomendada: <1%.
Prueba de velocidad	Realización y registro de pruebas de Velocidades mínimas garantizadas mediante la ejecución con alguna herramienta de pruebas como Speedtest. ▪ Descarga: 25 Mbps ▪ Subida: 5 Mbps
Pruebas de navegabilidad	Navegar por páginas nacionales e internacionales, tales como: - MINTIC - INTERNET SOCIETY - YOU TUBE

Nota: es responsabilidad de EL CONTRATISTA garantizar la realización de las anteriores pruebas. La supervisión y/o interventoría puede adicionar ítems al protocolo de pruebas.

Durante toda la etapa de instalación del proyecto, EL CONTRATISTA es responsable por cualquier evento o siniestro que ocurra sobre los equipos y está en la obligación de garantizar la reposición e instalarlos sin costo adicional para la entidad.

- ENTREGABLES DE LA ETAPA DE INSTALACIÓN

De la infraestructura de la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC):
- Informe semanal de implementación
- Planos de red, esquemas de conexión **(AS BUILT)** y documentación técnica de la instalación para cada nodo de la red y para la red desplegada, según aplique.

Nota: En el caso de que se hubieran realizado cambios en los diseños aprobados en la Etapa de Planeación, previa la aprobación de la supervisión y/o interventoría, se debe anexar los soportes que evidencien la solicitud realizada por EL CONTRATISTA con el debido soporte y la respectiva autorización de la supervisión y/o interventoría.

- Registro fotográfico de cada uno de los componentes de red instalados en el nodo de servicio de la comunidad, los nodos de repetición; los lugares de importancia y lugares de posibles interferencias.
- Diagrama de Potencias en cada etapa del sistema, incluyendo resultados de apuntamiento de las antenas y los radioenlaces.
- Al menos un (1) video omnidireccional (360 grados) del área cubierta por la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) identificando el lugar donde se encuentra instalado el nodo de servicio de la comunidad, los nodos de repetición; los lugares de importancia y lugares de posibles interferencias. El video deberá tener una duración mínima de 120 segundos para detallar los equipos instalados en el nodo de servicio de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) y los detalles relevantes de las torres y/o mástiles utilizados y los detalles de los equipos instalados en estas.
- Soportes del(los) permiso(s) gestionados.
- Protocolo de pruebas ejecutado y debidamente aprobado por la supervisión y/o interventoría
- Certificados de pruebas de recepción del servicio y marcación de elemento
- Certificados de calibración de equipos de medida usados.
- Carpeta con el informe final de instalación.
- Acta de recibo a conformidad de la instalación de la Red de Acceso que incluya el inventario respectivo, para dejar constancia de los trabajos realizados y dejar evidencia de que los bienes fueron entregados DDP, tal como se requiere en este Anexo Técnico. Para los equipos importados debe adjuntarse el manifiesto de importación.

De la conexión de los hogares de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC)

- Informe de conexión de hogares
- Datos de contacto de la persona que recibe el servicio en el hogar
- Copia del documento de identidad de la persona que recibe el servicio en el hogar
- Copia del documento mediante el cual la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) autoriza a un miembro de la comunidad a recibir el servicio en los hogares
- Copia del documento de recepción del servicio por parte de un delegado autorizado por la Junta de Internet Comunidad de Conectividad (JI-CDC)
- Foto de la fachada del predio del beneficiario, en la que aparezca legible la nomenclatura de la dirección o las indicaciones que se registran en los recibos de los servicios públicos, y la georeferenciación, que permitan su ubicación clara en el caso de predios sin nomenclatura;
- Una fotografía o pantallazo como soporte de la prueba de velocidad realizada al momento de la instalación del servicio para acreditar el cumplimiento de las especificaciones del servicio de Internet y calidad del servicio.
- Una foto que permita identificar el número serial de los equipos (CPE, router) instalados para la prestación del servicio en ese hogar.

- APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INSTALACIÓN DE LA RED DE ACCESO

Los documentos de instalación deberán ser presentados a la supervisión y/o interventoría, en medio físico y digital, en medio digital a través del portal de radicación de MINTIC.GOV.CO., https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Informes-de-PQRSD/125804:Registro- PQRSD

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La revisión, verificación de cumplimiento y contenido de cada uno de los documentos de instalación, se adelantará por parte de la supervisión y/o interventoría en un plazo máximo de 5 días hábiles después de la presentación de estos, plazo en el cual se podrá solicitar al Ejecutor la información que considere necesaria.

Asimismo, cualquier solicitud de modificación que se realice a los Documentos de Instalación durante la ejecución del proyecto, deberá ser presentada a la supervisión y/o interventoría, en un plazo máximo de 5 días hábiles.

Para que la red de acceso de la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) se considere como instalada, en funcionamiento y operativa; y en consecuencia reciba la aprobación correspondiente por parte de la supervisión y/o interventoría, EL CONTRATISTA deberá contar con la aprobación expresa de los entregables de la etapa de instalación de la red de acceso.

- ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La etapa de Operación y Mantenimiento de la red de acceso de la Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) se inicia después de la visita de campo y la respectiva comunicación de la supervisión y/o interventoría, en la cual se dé el concepto de aprobación y entrada en servicio de la red de acceso de cada Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC). La red de acceso de cada Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI- CDC) debe tener independientemente el concepto de aprobación

El plazo de operación y mantenimiento de red de acceso de Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) es de 6 meses, contados a partir de su entrada en operación debidamente autorizada por la supervisión y/o interventoría, período durante el cual EL CONTRATISTA debe realizar las siguientes actividades:

Operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la red de acceso y de los hogares conectados y en servicio.

Soporte de nivel 0, 1, 2 y 3, entendido como:

Soporte de nivel 0:

El nivel de soporte técnico 0 es el nivel más básico de soporte técnico, en el que los usuarios pueden resolver problemas por sí mismos. Este nivel se basa en la filosofía del autoservicio y se caracteriza por no requerir de software o de personal para comunicarse con los clientes.

El objetivo del soporte técnico nivel 0 es que los usuarios puedan encontrar soluciones a sus problemas sin necesidad de que intervenga el personal de soporte técnico. Para ello, EL CONTRATISTA debe ofrecer recursos como:

- Base de conocimiento
- Portal de autoservicio
- Catálogo de servicios
- Preguntas frecuentes
- Glosarios
- Chatbots interactivos

Algunos ejemplos de problemas que los usuarios pueden resolver con el soporte técnico nivel 0 son: Reiniciar un dispositivo, Restablecer contraseñas, Solicitar hardware o software, Registrar incidentes no urgentes.

Soporte de nivel 1:

Está diseñado para abordar problemas técnicos simples o de configuración básica que puedan resolverse sin intervenciones avanzadas, abarca el diagnóstico inicial de problemas técnicos simples y la ejecución de soluciones inmediatas. En este nivel, el personal técnico de EL CONTRATISTA valida configuraciones estándar de los equipos (CPE o Routers), en redes inalámbricas revisa parámetros básicos como niveles de señal (RSSI, SNR) en el CPE. Si el problema no se resuelve en este nivel, el incidente debe ser documentado y escalado al Nivel 2 con un diagnóstico preliminar detallado para un análisis más profundo

Soporte de nivel 2:

El soporte en Nivel 2 implica la atención de problemas técnicos más complejos que requieren intervención especializada. EL CONTRATISTA debe realizar diagnósticos detallados de los equipos principales de la red, como Access Points, o CPEs, mediante el acceso a los sistemas de monitoreo y gestión, monitoreando, soportando y manteniendo. Dentro de las validaciones se incluyen análisis de tráfico, comprobación de configuraciones avanzadas (VLANs, QoS, frecuencias y potencias), y la revisión de registros o logs de eventos en los equipos que conforman la red de acceso. Este nivel debe estar en la capacidad de realizar ajustes remotos en perfilamiento, configuraciones, ajustes de potencia y coordinar intervenciones en sitio si es necesario, tales como reemplazo de hardware, reparación de fibra óptica o ajuste de antenas.

Soporte de nivel 3:

El soporte en Nivel 3 está orientado a la resolución de problemas críticos o sistémicos que afectan la estabilidad y operación general de la red o la calidad del servicio de manera particular para un cliente final o de manera masiva. En este nivel, EL CONTRATISTA a través de soporte especializado debe llevar a cabo una revisión integral de la infraestructura, incluyendo análisis de tráfico en tiempo real, análisis de interferencias en bandas no licenciadas, revisión de configuración de equipos centrales (APs), y análisis detallado de la red de distribución (enlaces inalámbricos). Este nivel también incluye la gestión de soporte con los fabricantes de equipos y la aplicación de actualizaciones de firmware o parches de seguridad que sean necesarios. Adicionalmente, se deben implementar acciones correctivas, optimizaciones y recomendaciones para la mejora continua de la red, con el objetivo de prevenir incidentes similares en el futuro.

NOTA: En el caso que EL CONTRATISTA después de haber realizado el curso normal de los Niveles de Soporte aquí mencionado, considere la necesidad de involucrar al Proveedor del Servicio Troncal de Internet para realizar algún tipo de descarte adicional, lo podrá realizar teniendo presente el Check de pruebas y descartes que haya realizado previamente dentro de la red de acceso y el debido reporte según modelo operativo hacia el Proveedor de servicio de red Troncal. De igual manera dicho escalamiento debe realizarse a través del último nivel de soporte (3), con el objetivo de que, en el caso de requerirse alguna prueba adicional o entendimiento del problema técnico, se cuente con un soporte especializado por parte de EL CONTRATISTA.

Cada nivel de soporte debe contar y cumplir con los tiempos de respuesta de este documento, definidos en los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) e indicadores de disponibilidad para la red de acceso, de igual manera EL CONTRATISTA deberá garantizar la documentación detallada de cada incidente atendido, para asegurar un proceso de registro en una base de conocimiento y lecciones aprendidas, que a futuro permita enriquecer y ayudar a solucionar casos en el Soporte de Nivel 0. Este modelo de soporte asegura un servicio de alta calidad y la continuidad operativa del proyecto para la satisfacción de los usuarios finales.

- Capacitación virtual/presencial para el personal designado por la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC), según se detalla en este Anexo en la sección correspondiente a la Etapa de Capacitación.

NOTA: EL CONTRATISTA debe iniciar la etapa de capacitación, paralelamente a la etapa de socialización con la Junta de Internet – Comunidad de Conectividad.

Vencido el anterior período de seis meses, EL CONTRATISTA deberá realizar el soporte de Nivel 3 a Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC) por los seis (6) meses restantes, es decir desde el mes siete (7) al mes doce (12) de la duración del Contrato. La prestación del servicio finalizara cuando se haya cumplido el periodo de 12 meses.

La ejecución de los proyectos deberá corresponder al cumplimiento de cada uno de los componentes, especificaciones técnicas de la propuesta seleccionada en la Convocatoria, a las condiciones de participación y lineamientos del Contrato.

Durante la etapa de operación del proyecto, EL CONTRATISTA es responsable de reportar a la supervisión y/o interventoría la ocurrencia de cualquier evento o siniestro que se presente sobre los equipos y cualquier elemento de red o pérdida o daño de los equipos instalados en los hogares. EL CONTRATISTA, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al conocimiento del evento, deberá reportarlo a la supervisión y/o interventoría y realizará la gestión ante la compañía de seguros y/o usuario para la reclamación correspondiente.

- UTILIZACIÓN DE LA RED DE ACCESO

EL CONTRATISTA deberá reportar el uso y ocupación del canal de conectividad de la Red de acceso de cada Junta de Internet – Comunidad de Conectividad (JI-CDC), de tal forma que a través de reportes periódicos generados por su repositorio y del monitoreo permanente por personal de EL CONTRATISTA, se pueda garantizar la operación y la utilización de Internet por parte de los hogares de la Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC).

Por lo anterior, EL CONTRATISTA deberá poner a disposición de la supervisión y/o interventoría, mínimo los siguientes reportes o información en línea:

- Informe detallado del tráfico cursado por la Red de acceso de cada Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) (por hora, día, mes), tanto entrante como saliente, mostrando los picos máximos y mínimos tanto de entrada como de salida, tráfico promedio, gráficos, etc.
- Reporte de Fallas presentadas en la Red de acceso de cada Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) con fecha, hora, causa de la falla, duración de la falla, impacto en la conectividad de

hogares a nivel de calidad y/o disponibilidad, tiempo y cantidad de hogares afectados, acciones tomadas para la solución. Esta información debe permitir el análisis y generación de estadísticas por cada Red de acceso; esto con la finalidad de establecer el desempeño de cada Red de acceso, y ocupación del canal.

- Información del estado de la red
- Número de hogares conectados (día, mes) y uso de la conectividad de Internet por Red de acceso
- Gráfico de uso de cada Red de acceso (por hora, día y mes)

La supervisión y/o interventoría podrá requerir la inclusión o modificación de los reportes anteriores

El repositorio debe permitir el monitoreo en tiempo real de la información de la utilización y estadísticas de la Red de acceso de cada Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC).

La información anterior deberá estar disponible en línea en el repositorio y deberá incluirse en el informe mensual de operación.

- ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIOS - INDICADORES

Desde el inicio y durante la Etapa de Operación y Mantenimiento, EL CONTRATISTA debe dar cabal cumplimiento al Acuerdo de Nivel de Servicios que se indica a continuación y su incumplimiento podrá dar lugar a la aplicación de descuentos en los pagos por operación y mantenimiento o a la aplicación de multas de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato.

A continuación, se describen el conjunto inicial de indicadores de calidad considerado en el Acuerdo de Nivel de Servicio con sus respectivos valores admisibles de cumplimiento; no obstante, la supervisión y/o interventoría y EL CONTRATISTA podrán acordar la inclusión de indicadores adicionales o complementarios.

En relación con la actualización, modificación o reemplazo de los indicadores aquí definidos, en caso de que no exista un acuerdo entre la supervisión y/o interventoría y EL CONTRATISTA, EL DEPARTAMENTO a través de la supervisión y/o la interventoría podrá establecerlos mediante comunicación dirigida a EL CONTRATISTA, dejando constancia de las discusiones efectuadas con el objetivo de lograr el acuerdo.

- VELOCIDAD EFECTIVA MÍNIMA DE NAVEGACIÓN

EL CONTRATISTA debe realizar el diseño de la red de acceso para garantizar que en la etapa de operación los hogares conectados a INTERNET puedan navegar a las siguientes velocidades mínimas:

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Tabla 21 Velocidad de navegación

	o Descarga: 25 Mbps o Subida: 5 Mbps o Rehusó: 1:8 o Prioridad: 20Gb

El valor mínimo de este indicador: independientemente de la tecnología de la red troncal y de la red de acceso debe cumplir con los valores mínimos indicados.

- REPORTE DE VELOCIDAD EFECTIVA

La supervisión y/o la interventoría determinarán la metodología para la medición de la velocidad de navegación en los hogares conectados y el contenido de los reportes de este indicador. Con base en los resultados, la supervisión y/o interventoría, podrá requerir al Ejecutor sobre las mejoras a implementar, en el caso de que la velocidad de navegación esté siendo afectada por la red de acceso y validará que en el periodo de corte inmediatamente siguiente se hayan implementado de modo satisfactorio.

En el caso de que la velocidad mínima de navegación no se cumpla por causas imputables a la red troncal, la supervisión y/o interventoría, podrá requerir a EL CONTRATISTA sobre las mejoras a implementar y validará que en el periodo de corte inmediatamente siguiente se hayan implementado de modo satisfactorio

- INDICADOR DE DISPONIBILIDAD POR RED DE ACCESO

El indicador de disponibilidad hace referencia al porcentaje de tiempo en el cual el servicio de conectividad debe estar disponible para los hogares en la Red de acceso de cada Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC), cumpliendo con la capacidad, funcionalidad y el nivel de servicio.

El valor mínimo de este indicador por Red de acceso, para que se considere como cumplido, deberá ser de mínimo:

Tabla 22 Acuerdo de nivel de servicios - Disponibilidad Red de Acceso

Indicador	Desde el nodo de servicio de la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) hasta los hogares
Disponibilidad mínima	96%

El tiempo de indisponibilidad de la Red de acceso de cada Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC), identificado por la supervisión y/o interventoría, a partir del inicio de la Etapa de Operación y mantenimiento y por un periodo de seis (6) meses, a través de la verificación correspondiente por la supervisión y/o interventoría, ocasionará un descuento en los pagos previstos en el contrato.

Tabla 23 Descuentos en los pagos mensuales de Operación y Mantenimiento de Red de acceso, según disponibilidad

Indicador	Desde el nodo de servicio de la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) hasta los hogares	Descuento
Disponibilidad	Mayor o igual a 98,0%	0%
	Entre 90,0% y 97,9%	10%
	Entre 85,0% y 89,9%	20%
	Entre 80,0% y 84,9%	30%
	Entre 70,0% y 79,9%	50%
	Entre 50,0% y 69,9%	70%
	Entre 0% y 49,9%	100%

NOTA:

- La anterior tabla de descuentos por indisponibilidad se aplicará de manera independiente para cada una de las Redes de acceso de las Juntas de Internet - Comunidades de conectividad (JI-CDC) asignadas al Ejecutor.
- Para el cálculo de la disponibilidad de la red de acceso, no se tomará en cuenta las paradas de reloj, entendidas como los tiempos de indisponibilidad por mantenimientos preventivos programados, ni el tiempo de indisponibilidad de la red de acceso por causas ajenas al Ejecutor.
- El incumplimiento reiterado del indicador de disponibilidad, por debajo del 85,0%, por tres meses o más dará lugar a la aplicación de multas de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato.

- REPORTE DE DISPONIBILIDAD

El periodo de reporte es mensual y debe ser parte del informe que presenta EL CONTRATISTA en el correspondiente mes. El reporte debe contener como mínimo la siguiente información:

a) Un archivo plano por cada una de las Redes de acceso de las Juntas de Internet, como anexo dentro del informe mensual en medio magnético, el cual debe contener la siguiente información:

- Fecha (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) del reporte
- Identificación de la Red de acceso: ID de la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) (a ser asignado por la supervisión y/o interventoría, Número del Contrato, Departamento, Municipio, Centro Poblado y nombre común de la ubicación de Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) y tecnología de la Red de acceso.
- Cantidad de tiempo de indisponibilidad (hh:mm:ss), registrado en el sistema de gestión del nodo de servicio de la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC).
- Cálculo del Indicador:
  Disponibilidad = [100% - (horas (con un decimal) de indisponibilidad al mes, imputables al Ejecutor, / horas total mes) *100) %]

- Una sección de resumen de los resultados del indicador con los datos o gráficas que permitan visualizar los comparativos acumulados (hasta un máximo de 6 meses). Se debe incluir el análisis y las observaciones del comportamiento del indicador del mes con respecto al(los) mes(es) anterior(es).

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La supervisión y/o interventoría analizará y evaluará los reportes de disponibilidad con base en la metodología que se acuerde entre la supervisión y/o interventoría y el ISP, en la etapa de Planeación del proyecto. Estos reportes podrán ser modificados en la etapa de operación del proyecto, si así se requiere.

La supervisión y/o interventoría podrá libremente realizar las pruebas que estime convenientes con el fin de evidenciar el cumplimiento del indicador y en caso de encontrar incoherencias con lo reportado por EL CONTRATISTA o en el caso de evidenciar el no cumplimiento del indicador, dará lugar a la aplicación de multas de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato.

- MESA DE AYUDA

Para atender los reportes de fallas, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y brindar soporte técnico a los hogares conectados de la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC), EL CONTRATISTA deberá:

a) Brindar un Centro Telefónico de Soporte técnico o mesa de ayuda con **acceso gratuito para los hogares**, disponible durante ocho (8) horas de lunes a viernes, durante los seis (6) meses de duración de la etapa inicial del proyecto, en la cual se brindará soporte de nivel 0, 1, 2 y 3. Durante los seis meses restantes el Centro Telefónico de Soporte técnico o mesa de ayuda con **acceso gratuito para las Juntas de INTERNET**, disponible durante ocho (8) horas de lunes a viernes, brindará soporte de nivel 3 a las Juntas de INTERNET. Culminados los seis (6) meses, EL CONTRATISTA brindará a la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) el soporte de nivel 3 y la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) será la responsable de brindar el soporte de nivel 0,1 y 2 a los hogares conectados.
b) Brindar un canal de contacto alternativo: correo electrónico, mensajería telefónica, WhatsApp o cualquiera otro que sirva como soporte técnico o mesa de ayuda con acceso gratuito para los hogares, disponible las veinticuatro (24) horas del día, durante los primeros seis meses de la etapa de operación. Para los siguientes seis meses EL CONTRATISTA brindará un canal de contacto alternativo: correo electrónico, mensajería telefónica, WhatsApp o cualquiera otro que sirva como soporte técnico o mesa de ayuda con acceso gratuito para las Juntas de INTERNET, disponible las veinticuatro (24) horas del día, para el soporte de nivel 3.
c) Es responsabilidad de Ejecutor entregar un reporte mensual estadístico que se debe incluir en el informe mensual de seguimiento de todas las interacciones, tipificación de los problemas, eventos atendidos, resolución de fallas, durante los 12 meses de duración del proyecto: el informe de los primeros seis meses relacionados con soporte de nivel 1, 2 y 3 y el correspondiente a los últimos seis meses relacionado con el soporte de nivel 3.
d) La supervisión y/o interventoría podrá solicitar informes parciales de gestión de tickets (diarios, semanales, quincenales, etc.) durante la vigencia de operación del centro de contacto y para efectos de seguimiento a la atención y casos particulares.
e) EL CONTRATISTA para cada uno de los eventos reportados: fallas, peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de recibidas, debe registrar como mínimo:
   - El tipo de evento reportado
   - Número del reporte
   - Datos generales de quien reporta: (nombre, teléfono contacto, dirección física, correo electrónico, fecha)
   - Descripción de la falla
   - Solución a la falla
   - Fecha de solución de la falla
   - Canal utilizado para el reporte

- Otra información relevante.

EL CONTRATISTA se obliga a hacer uso de medios expeditos y céleres que hagan efectivo y oportuno el trámite y atención que se dé a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, así como, las correspondientes a fallas del servicio.

Los valores máximos admisibles para los indicadores de la mesa de ayuda, que EL CONTRATISTA deberá cumplir en desarrollo del Contrato, son:

Tabla 24 Acuerdo de nivel de servicios de la mesa de ayuda

ITEM		ANS
1	Tiempo promedio de atención al reporte (TMO).	ANS Pactado con la supervisión y/o interventoría en la etapa de planeación
2	Eficacia	# casos resueltos / # casos atendidos imputables al Ejecutor,>= 95%

EL CONTRATISTA deberá garantizar que la mesa de ayuda genere los reportes que contengan la información necesaria para el cálculo de los indicadores anteriormente descritos, los cuales serán validados por la supervisión y/o interventoría.

Calidad en la atención al usuario EL CONTRATISTA deberá incorporar al repositorio de información del proyecto, un reporte mensual del comportamiento del indicador de mesa de ayuda, para efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Con base en los resultados, la supervisión y/o interventoría, requerirá al Ejecutor sobre las mejoras a implementar, y validará que en el periodo de corte inmediatamente siguiente se hayan implementado de modo satisfactorio.

El incumplimiento a los umbrales que establezca la supervisión y/o interventoría, en las acciones de mejora dará lugar a las multas o sanciones a que haya lugar.

EL CONTRATISTA deberá tener esquemas de calidad en la operación de tal manera que los hogares no tengan la necesidad de reportar fallas, teniendo en cuenta que la tecnología propuesta reporte fallas, eventos y logs que sean de inmediata atención por EL CONTRATISTA afectando lo menos posible a los hogares conectados en las Juntas de INTERNET.

En todo caso, EL CONTRATISTA deberá llevar un archivo de control sobre los PQRSD reportados y el estado de la solución para control de la supervisión y/o interventoría.

- MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS

EL CONTRATISTA durante la ejecución del proyecto, debe realizar los Mantenimientos Preventivos y/o Correctivos establecidos en el Plan de Mantenimiento.

El alcance del Plan de Mantenimiento debe considerar la totalidad de los equipos, elementos y sistemas que sean suministrados por EL CONTRATISTA

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- ETAPA DE CAPACITACIÓN

El proyecto busca implementar un enfoque integral para transferir conocimientos y habilidades técnicas a la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC), permitiendo su autogestión y sostenibilidad. La metodología combina formación práctica, evaluación continua y un modelo de gobernanza participativa. A través de esta estrategia, se garantizará que la comunidad pueda administrar, operar y dar soporte a la red de acceso inalámbrica punto-multipunto en bandas no licenciadas, convirtiendo a la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) en el gestor principal del servicio una vez finalice el periodo de seis (6) meses, en el que EL CONTRATISTA realizará la implementación, instalación, administración, soporte y mantenimiento de la red de acceso y de la conectividad a internet de los hogares de la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC).

La etapa de capacitación se inicia con la aprobación del Plan de Formación, presentado por EL CONTRATISTA en la etapa de Planeación y se desarrolla en paralelo con la etapa de instalación, operación, mantenimiento y soporte, que se realiza en los primeros seis (6) meses de la etapa de operación.

EL CONTRATISTA debe realizar la capacitación de acuerdo con el contenido del Plan de Formación aprobado por la supervisión y/o interventoría.

Durante el desarrollo de esta etapa y hasta su realización, EL DEPARTAMENTO evaluará el proceso de capacitación, con base en la aplicación del formato de evaluación aprobado por la supervisión y/o interventoría.

La supervisión y/o interventoría realizarán el seguimiento al proceso de capacitación y con base en el desarrollo del Plan de Formación y las evaluaciones realizadas, emitirá el concepto de aprobación de esta etapa, cuya duración como ya se mencionó es de seis (6) meses.

Con base en los resultados del seguimiento al Plan de Formación, la supervisión y/o interventoría, requerirá al Ejecutor sobre las mejoras a implementar, y validará que en el periodo de corte inmediatamente siguiente se hayan implementado de modo satisfactorio.

El incumplimiento a los umbrales que establezca la supervisión y/o interventoría, en las acciones de mejora dará lugar a las multas o sanciones a que haya lugar.

- RESUMEN DE ENTREGABLES DEL PROYECTO.

Tabla 25 Resumen de entregables del proyecto para las Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad

	SITE SURVEYS • Un informe detallado del site survey con planos y documentación del análisis. **DISEÑO DE BAJO NIVEL** • Planos de red, esquemas de conexión y documentación técnica del diseño • Cronograma detallado de instalación (MS Project, con copia en

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

PLANEACIÓN.	Excel) y puesta en servicio, acorde con el cronograma general establecido. • Lista de Materiales (BOM - Bill of Materials) • EL CONTRATISTA deberá documentar todos los materiales necesarios para implementar la red, especificando componentes para soluciones FWA. • BOM detallado con estimaciones de costos y especificaciones técnicas. **PLAN DE MANTENIMIENTO** • Descripción del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, en el cual se detallen las actividades a realizar. • Mantenimiento Preventivo: se ejecuta bajo programación para prevenir fallas o para introducir mejoras en la red, este se dará una vez cada 6 meses • Mantenimiento Correctivo: es aquel que se ejecuta una vez se presenten fallas en la etapa de operación del proyecto que afecten de manera parcial o total el servicio. • Esquema de atención y soporte técnico, especificando niveles y tiempos de escalamiento y prioridades. • Deberá especificarse el mantenimiento a aspectos de seguridad como configuraciones y filtros de navegación de acuerdo con los establecidos en el presente documento y política de seguridad física. **PLAN DE FORMACIÓN** • EL CONTRATISTA deberá presentar el Plan de Formación
INSTALACION DE RED DE ACCESO	**DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ACCESO** • Informe semanal de la implementación • Planos de red, esquemas de conexión (AS BUILT) y documentación técnica de la instalación para cada nodo de la red y para la red desplegada, según aplique. Nota: En el caso de que se hubieran realizado cambios en los • diseños aprobados en la Etapa de Planeación, previa la aprobación de la supervisión y/o interventoría, se debe anexar los soportes que evidencien la solicitud realizada por EL CONTRATISTA con el debido soporte y la respectiva autorización de la supervisión y/o interventoría. • Registro fotográfico de cada uno de los componentes de red instalados en el nodo de servicio de la comunidad, los nodos de repetición; los lugares de importancia y lugares de posibles interferencias. • Diagrama de Potencias en cada etapa del sistema, incluyendo resultados de apuntamiento de las antenas y los radioenlaces.

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

- Al menos un (1) video omnidireccional (360 grados) del área cubierta por la red de acceso de la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) identificando el lugar donde se encuentra instalado el nodo de servicio de la comunidad, los nodos de repetición; los lugares de importancia y lugares de posibles interferencias. El video deberá tener una duración mínima de 120 segundos para detallar los equipos instalados en el nodo de servicio de la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) y los detalles relevantes de las torres y/o mástiles utilizados y los detalles de los equipos instalados en estas.
- Soportes del(los) permiso(s) gestionados.
- Protocolo de pruebas ejecutado y debidamente aprobado por la supervisión y/o interventoría
- Certificados de pruebas de recepción del servicio y marcación de elemento
- Certificados de calibración de equipos de medida usados
- Carpeta con el informe final de instalación.
- Acta de recibo a conformidad de la instalación de la Red de Acceso que incluya el inventario respectivo, para dejar constancia de los trabajos realizados y dejar evidencia de que los bienes fueron entregados DDP, tal como se requiere en este Anexo Técnico. Para los equipos importados debe adjuntarse el manifiesto de importación. Esta acta debe estar suscrita por un representante de EL CONTRATISTA y un representante de la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC)

DE LA CONEXIÓN DE LOS HOGARES

- Informe de conexión de hogares
- Datos de contacto de la persona que recibe el servicio en el hogar
- Copia del documento de identidad de la persona que recibe el servicio en el hogar
- Copia del documento mediante el cual la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC) autoriza a un miembro de la comunidad a recibir el servicio en los hogares
- Copia del documento de recepción del servicio por parte de un delegado autorizado por la Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC)
- Foto de la fachada del predio del beneficiario, en la que aparezca legible la nomenclatura de la dirección o las indicaciones que se registran en los recibos de los servicios públicos, y la georeferenciación, que permitan su ubicación clara en el caso de predios sin nomenclatura;
- Una fotografía o pantallazo como soporte de la prueba de velocidad realizada al momento de la instalación del servicio para acreditar

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

	el cumplimiento de las especificaciones del servicio de Internet y calidad del servicio. • Una foto que permita identificar el número serial de los equipos (CPE, router) instalados para la prestación del servicio en ese hogar
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	La etapa de Operación y Mantenimiento de la red de acceso de la Juntas de Internet- Comunidades de conectividad (JI-CDC) se inicia después de la visita de campo y la respectiva comunicación de la supervisión y/o interventoría, en la cual se dé el concepto de aprobación y entrada en servicio de la red de acceso de cada Junta de Internet - Comunidad de conectividad (JI-CDC). La red de acceso de cada debe tener independientemente el concepto de aprobación, con el cual inicia la operación y mantenimiento de la red de acceso por 6 meses. **SOPORTE DE NIVEL 0, 1, 2 Y 3, ENTENDIDO COMO:** • **Soporte de nivel 0:** El nivel de soporte técnico 0 es el nivel más básico de soporte técnico, en el que los usuarios pueden resolver problemas por sí mismos. Este nivel se basa en la filosofía del autoservicio y se caracteriza por no requerir de software o de personal para comunicarse con los clientes. El objetivo del soporte técnico nivel 0 es que los usuarios puedan encontrar soluciones a sus problemas sin necesidad de que intervenga el personal de soporte técnico. Para ello, EL CONTRATISTA debe ofrecer recursos como: o Base de conocimiento o Portal de autoservicio o Catálogo de servicios o Preguntas frecuentes o Glosarios o Chatbots interactivos Algunos ejemplos de problemas que los usuarios pueden resolver con el soporte técnico nivel 0 son: Reiniciar un dispositivo, Restablecer contraseñas, Solicitar hardware o software, Registrar incidentes no urgentes. • **Soporte de nivel 1:** Está diseñado para abordar problemas técnicos simples o de configuración básica que puedan resolverse sin intervenciones avanzadas, abarca el diagnóstico inicial de problemas técnicos simples y la ejecución de soluciones inmediatas. En este nivel, el personal

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

	técnico de EL CONTRATISTA valida configuraciones estándar de los equipos (CPE o Routers), en redes inalámbricas revisa parámetros básicos como niveles de señal (RSSI, SNR) en el CPE. • **Soporte de nivel 2:** El soporte en Nivel 2 implica la atención de problemas técnicos más complejos que requieren intervención especializada. EL CONTRATISTA debe realizar diagnósticos detallados de los equipos principales de la red, como Access Points, o CPEs, mediante el acceso a los sistemas de monitoreo y gestión y de acuerdo con el tipo de red de acceso que se encuentra Este nivel debe estar en la capacidad de realizar ajustes remotos en perfilamiento, configuraciones, ajustes de potencia y coordinar intervenciones en sitio si es necesario, tales como reemplazo de hardware, reparación de fibra óptica o ajuste de antenas. • **Soporte de nivel 3:** El soporte en Nivel 3 está orientado a la resolución de problemas críticos o sistémicos que afectan la estabilidad y operación general de la red o la calidad del servicio de manera particular para un cliente final o de manera masiva. En este nivel, EL CONTRATISTA a través de soporte especializado debe llevar a cabo una revisión integral de la infraestructura, incluyendo análisis de tráfico en tiempo real, análisis de interferencias en bandas no licenciadas, revisión de configuración de equipos centrales (APs), y análisis detallado de la red de distribución (enlaces inalámbricos). Este nivel también incluye la gestión de soporte con los fabricantes de equipos y la aplicación de actualizaciones de firmware o parches de seguridad que sean necesarios.
CAPACITACION	La etapa de CAPACITACIÓN se inicia con la aprobación del Plan de Formación, presentado por EL CONTRATISTA en la etapa de Planeación y se desarrolla en paralelo con la etapa de instalación, operación, mantenimiento y soporte, que se realiza en los primeros seis (6) meses de la etapa de operación. EL CONTRATISTA debe realizar la capacitación de acuerdo con el contenido del Plan de Formación aprobado por la supervisión y/o interventoría. Durante el desarrollo de esta etapa y hasta su realización, EL DEPARTAMENTO evaluará el proceso de capacitación, con base en la aplicación del formato de evaluación aprobado por la supervisión y/o interventoría. La supervisión y/o interventoría realizarán el seguimiento al proceso de capacitación y con base en el desarrollo del Plan de Formación y las evaluaciones realizadas, emitirá el concepto de aprobación de esta etapa, cuya duración como ya se mencionó es de seis (6) meses.

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-PC-04	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 17/11/2011	VERSIÓN 2
	PLANIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Página 103 de 103	

ESTUDIO TECNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

FIRMA	
NOMBRE	SONIA ARANGO MEDINA
CARGO	Secretaria de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TIC
Elaboró	Nefer Leandro Mora Durán – Profesional Especializado – Sec. TIC
Revisó:	
Revisó:	Astrid Carolina Contreras Villamizar – Profesional Especializado – Sec. TIC
Aprobó:	

ANEXO PLAN DE UTILIZACION					
# Utilización	Concepto	Fechas Tentativo	Valor utilización Hasta por	% CAPEX	Entregable
1					
2					
3					
4					
5					
6					

# Utilización	Concepto	Fechas Tentativa	Valor utilización Hasta por	% CAPEX	Entregable
7	Hito 7 - 40 % de la Obra - Cobro contra la Suscripción del Acta de Avance	30-dic-26	$ 12.512.728.497	31,35%	1) Aprobación de la interventoría y concepto favorable de la Supervisión de la Subdirección de Vivienda (SV) Fondo de Cesantía y el Comité de avance por 12 meses de 48 meses de obra. - Consentimiento de Comunidades 2) Ingeniería del 100% de las entregas de la Utilización No. 6 3) La utilización se autoriza con la aprobación de la interventoría, la Supervisión de la Gobernación de Norte de Santander y la Supervisión del PMGRC en el respectivo Comité Operativo
8	Hito 8 - Obra 50 % de Avance (2) Acta de corte correspondiente a los meses de julio y agosto de 2026 para los 177 Apartamentos Colectivos	15-sep-26	$ 687.104.903	1,72%	1) Aprobación de la interventoría y concepto favorable de la Supervisión de la Subdirección de Vivienda (SV) Fondo de Cesantía y Comité de avance de los meses 7 y 8 (julio y agosto de 2026) de Operación de las Instalaciones Educativas y 2) Ingeniería del 100% de las entregas de la Utilización No. 7 3) La utilización se autoriza con la aprobación de la interventoría, la Supervisión de la Gobernación de Norte de Santander y la Supervisión del PMGRC en el respectivo Comité Operativo
9	Hito 9 - OPEX de los (3) meses correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026 para los 177 Apartamentos Colectivos	5-dic-26	$ 918.857.330	2,30%	1) Aprobación de la interventoría y concepto favorable de la Supervisión de la Subdirección de Vivienda (SV) Fondo de Cesantía por los meses de octubre y noviembre de 2026 de Operación de las Instalaciones Educativas y 2) Ingeniería del 100% de las entregas de la Utilización No. 8 3) La utilización se autoriza con la aprobación de la interventoría, la Supervisión de la Gobernación de Norte de Santander y la Supervisión del PMGRC en el respectivo Comité Operativo
10	Hito 10 - OPEX de los (3) meses correspondiente al acta de corte de los 177 Apartamentos Colectivos	23-dic-26	$ 343.332.440	0,86%	1) Aprobación de la interventoría y concepto favorable de la Supervisión de la Subdirección de Vivienda (SV) Fondo de Cesantía por los meses de diciembre de 2026 de Operación de las Instalaciones Educativas y 2) Ingeniería del 100% de las entregas de la Utilización No. 9 3) La utilización se autoriza con la aprobación de la interventoría, la Supervisión de la Gobernación de Norte de Santander y la Supervisión del PMGRC en el respectivo Comité Operativo
			$ 39.916.969.831	100,00%	

OPEX		
PERIODO	OPEX IE	Apropiación Inicial
ene-26	347.934.070,00	137.465.193,00
feb-26	347.934.070,00	137.465.193,00
mar-26	347.934.070,00	137.465.193,00
abr-26	347.934.070,00	137.465.193,00
may-26	347.934.070,00	137.465.194,00
jun-26	347.934.070,00	137.465.194,00
jul-26	347.934.070,00	
ago-26	347.934.070,00	
sep-26	347.934.070,00	
oct-26	347.934.070,00	
nov-26	347.934.070,00	
dic-26	347.934.070,00	
SUB TOTAL	4.175.208.840,00	823.791.160,00
A Total		5.000.000.000,00

Gran Total CAPEX+OPEX	$ 44.916.969.831,00
