	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1**
Proceso de Contratacion		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 21-06-2026		**ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCIÓN**	
CONTRATO No: 01512-2025		**TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA**	
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PORH 2025			
Nit o C.C. No.	**NIT: 902020742-4**	**No. DE INFORME: 6**	
OBJETO:	FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO (PORH) DE LA CORRIENTE PRINCIPAL DEL RÍO OPÓN Y SUS PRINCIPALES TRIBUTARIOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)		
VALOR INICIAL: $ 1,580,229,634		**VALOR ADICIONAL:**	
PLAZO CONTRATO: DOCE (12) MESES		**PLAZO ADICIONAL:**	

SUPERVISOR: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

CARGO SUPERVISOR: Subdirectora de Planeación y Ordenamiento ambiental

INTERVENTOR: Hernando Leguizamón Galindo

FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**7/01/2026**				
FECHA DE SUSPENSIÓN:		NO APLICA		**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	
FECHA DE REINICIO:		NO APLICA		**TIEMPO DE PRORROGAS:**	
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	**31/12/2026**			**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	
PERIODO DEL INFORME:	1/06/2026 AL 30/06/2026				

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	6	1/06/2026 AL 30/06/2026

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
Se realiza la solicitud de información secundaria y se adanta el Plan de Trabajo y Operativo		0	0	Hasta 31/12/2026	1 mes	**2,50%**	**0**
Fase 1 - Acciones Previas completada (Localización del cuerpo de agua, identificación de actores, recopilación de información secundaria, prediseño del plan de monitoreo, plan de trabajo y cronograma).		0	0	Hasta 31/12/2026	3 meses	**17,50%**	0
Fase 2 - Diagnóstico: Primera campaña de monitoreo de calidad de agua ejecutada (21-25 abr) en 5 puntos. 30 encuestas de censo realizadas. Socialización realizada en Barrancabermeja. Cálculos de oferta hídrica, demanda y caudales ambientales finalizados. Definición de tramos y estructura conceptual para modelación.		0	0	Hasta 31/12/2026	3 meses	**10,89%**	0
		0	0	Hasta 31/12/2026			0
		0	0	Hasta 31/12/2026			0
		0	0	Hasta 31/12/2026			0
		0	0	Hasta 31/12/2026			0
		0	0	Hasta 31/12/2026			0
		0	0	Hasta 31/12/2026			0

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHADEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	Inicio	1/7/2026	56-44-101012119	12/31/2026	0	$ 1.580.229.634	0	0

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

AVANCES: Se alcanzó 35,20% de avance físico acumulado frente a 45,50% programado (rezago de 10,3 puntos porcentuales, superior al de mayo). Fase Aprestamiento completada al 100%. En Fase de Diagnóstico el avance mensual fue de 4,3 puntos (pasó de 10,90% a 15,20%), concentrado en la definición de los 5 tramos de análisis de la cuenca, el censo de usuarios (378 de 587 predios) y el levantamiento de 15 estructuras de ocupación de cauce y 3 PTAP.

DIFICULTADES: (1) Situación de seguridad identificada el 06 de junio en el sector de la Ciénaga del Opón (presencia de embarcaciones presuntamente asociadas a grupos armados ilegales), que obligó a suspender el avance hacia los sectores de Yarima, Tenerife y La Yé. (2) Baja participación comunitaria en las socializaciones de Vélez y Contratación (10 personas por evento). (3) Indicadores ICA y BMWP incompletos, pendientes de los resultados de la segunda campaña de monitoreo.

REPROGRAMACIONES: Reprogramación de la segunda campaña de monitoreo (temporada seca), prevista para julio, según oficios OF-PORH.O066 y O067. No se registraron reprogramaciones formales del cronograma general de actividades.


RECOMENDACIONES: 1. Solicitar al consultor un plan de contingencia y cronograma alterno para completar censo y caracterización en sectores con restricción de acceso por orden público. 2. Requerir aclaración de la cifra de avance del censo (67% vs. 64% reportados en el mismo informe). 3. Fortalecer la estrategia de convocatoria previa a las próximas socializaciones. 4. Dar seguimiento prioritario a la programación de la segunda campaña de monitoreo. 5. Evaluar con la CAS un ajuste formal de cronograma que refleje el rezago acumulado de mayo y junio.

RIESGOS: ALTO – Riesgo de seguridad por presencia reportada de grupos armados ilegales en sectores de la cuenca, con antecedentes de afectación a funcionarios públicos (mitigación: coordinación con autoridades civiles y de seguridad, priorización de la integridad del personal). MEDIO – Acumulación de rezago frente al cronograma (10,3 pp). MEDIO – Baja participación comunitaria persistente (mitigación: fortalecer estrategia de comunicación y convocatoria).

FIRMA INTERVENTOR **FIRMA SUPERVISOR**

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

Verificación y seguimiento actividades ejecutadas

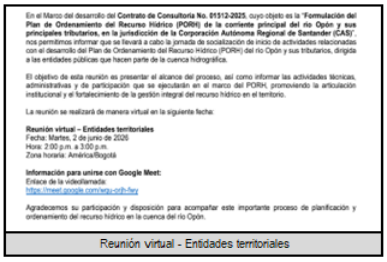

En el Marco del desarrollo del **Contrato de Consultoría No. 011/12-2025**, cuyo objeto es la "**Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) de la corriente principal del río Opón y sus principales tributarios, en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)**", nos permitimos informar que se llevará a cabo la jornada de socialización de inicio de actividades relacionadas con el desarrollo del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) del río Opón y sus tributarios, dirigida a las entidades públicas que hacen parte de la cuenca hidrográfica.

El objetivo de esta reunión es presentar el alcance del proceso, así como informar las actividades técnicas, administrativas y de participación que se ejecutarán en el marco del PORH, promoviendo la articulación institucional y el fortalecimiento de la gestión integral del recurso hídrico en el territorio.


La reunión se realizará de manera virtual en la siguiente fecha:

Reunión virtual – Entidades territoriales
Fecha: Martes, 2 de junio de 2026
Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
Zona horaria: América/Bogotá

Información para unirse con Google Meet:
Enlace de la videollamada:
https://meet.google.com/wgu-orjh-fwy

Agradecemos su participación y disposición para acompañar este importante proceso de planificación y ordenamiento del recurso hídrico en la cuenca del río Opón.

Reunión virtual - Entidades territoriales

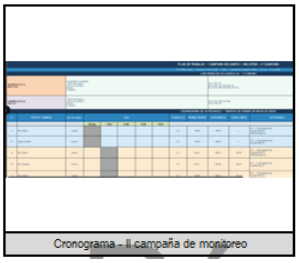

Cronograma - II campaña de monitoreo


Corporación Autónoma Regional de Santander
CAS
