	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	2
		Vigencia	31/12/2020

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	28/01/2021	**PERIODO REPORTADO DEL:**	30/11/2020	**AL:**	28/01/2021
CONTRATO Nº	152-00-J-EMAVI-GRUAL-2020	**CONTRATISTA**	COL ENERGY		
OBJETO	"MANTENIMIENTO, CONSTRUCCCIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA SANITARIO EN ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD PAN DE AZUCAR "				
FECHA DE INICIO	15/09/2020	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15/12/2020		

VALOR INICIAL	$ 270,285,297.35	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ -	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ -	**VALOR TOTAL**	$ 270,285,297.35

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Contrato suscrito el 09-09-2020, sin modificatorio a la fecha. Garantias contractuales a la fecha con ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO Póliza Cumplimiento No:14-44-101121256 FECHA DE EXPEDICION 11-09-2020 y póliza RCE No. 14-40-101033795 FECHA DE EXPEDICION 11-09-2020, relacionadas en el acta de inicio del 15-09-2020

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
		(ver anexo materiales y equipos)		(ver anexo materiales y equipos)		Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Ambiental y Sanitario	1
						Gestor SISOMA	1
						Ingeniero Electricista	1
						Ingeniero Civil	1
						TOTAL	4

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
Semana 1	15.00%	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
Semana 2	22.39%			
Semana 3	35.00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA










AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**100.00%**
EJECUTADO		**100.00%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
7. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
15. CARPINTERÍA METALICA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
19. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**

26. EQUIPOS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	91	135	-44
Proyección	91	135	-44

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
135	0	15/12/2020

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

El contratista culmina las actividades contractuales sin novedad. Se observa que el equipo y redes instaladas funcionan en conjunto dando solucion integral a la necesidad planteada inicialmente en el estudio previo. Se realiza constante seguimiento y vigilancia a esta operacion por parte del personal que se destaca en la zona desconcentrada reportando a la supervision ante cualquier novedad.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	

OBSERVACIONES: NINGUNA

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 270,285,297.35	$ 270,285,297.35	$ 270,285,297.35	100.00%	$ 0.00	0%
Adiciones	N/A	$ 0.00				
Reducciones		$ 0.00				
TOTAL	$ 270,285,297.35	$ 270,285,297.35				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 270,285,297.35	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 270,285,297.35	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 0.00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0.00	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
ENTREGA DOCUMENTACION DE PAGO	SI	SI	SI	RADICADO EN DECON Y DEFIN S/N

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar seguimiento a la operación de todo el sistema y reporte en informes de supervision previo al acta de liquidacion del proceso.


14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Predomina temporada de lluvias durante el mes de diciembre.

ELABORO:	REVISO:
	No Aplica
Capitán HENAO GUERRERO JHON EDINSON Supervisor Principal	Director de Interventoria Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO



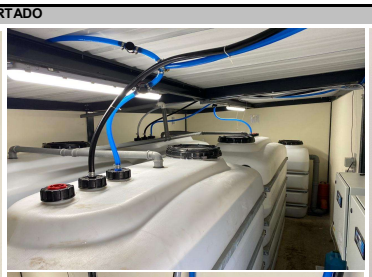













LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

Contrato No. 152-00-J-EMAVI-GRUAL-2020

MANTENIMIENTO, CONSTRUCCCIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA SANITARIO EN ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD PAN DE AZUCAR


ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		SUPERVISORSUPLENTE DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO – NOTIFICADOS MEDIANTE FORMATO REMISIÓN DOCUMENTACIÓN SUPERVISOR O INTERVENTOR GA-FR-108 VIG 04/04/2016
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		DOCUMENTACION SOPORTE PUBLICADA EN SECOP 2 – CONTRATO EN LAPSO PREVIO PARA FORMALIZAR ACTA DE LIQUIDACION Y MODIFICACION DE POLIZAS CONTRACTUALES A REALIZARSE 15 DE MARZO DE 2021
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCION POR SUPERVISOR PRINCIPAL CON EL PLAZO DE EJECUCION 15 DE DICIEMRE DE 2020
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCION POR SUPERVISOR PRINCIPAL CON EL PLAZO DE EJECUCION 15 DE DICIEMRE DE 2020

5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		SE ENCUENTRA PUBLICADA Y FORMALIZADA EN SECOP 2 PREVIO REQUISITO PARA INICIO DEL CONTRATO
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL DE FECHA 15-12-2020 EL SUPERVISOR PRINCIPAL SOPORTO LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		DURANTE EL ULTIMO LAPSO EL CONTRATISTA NO REALIZA ACTIVIDADES CONTRACTUALES, EL SUPERVISOR PRINCIPAL RECIBE A SATISFACCION Y LAS EVIDENCIAS HACEN PARTE DEL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		DURANTE EL ULTIMO LAPSO EL CONTRATISTA NO REALIZA ACTIVIDADES CONTRACTUALES, EL SUPERVISOR PRINCIPAL RECIBE A SATISFACCION Y LAS EVIDENCIAS HACEN PARTE DEL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA EN SITIO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EVIDENCIANDO SU OPERACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. ACTIVIDAD REALIZADA POR EL SUPERVISOR PRINCIPAL Y EVIDENCIADA EN EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL.
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor		**X**	ULTIMO INFORME DE SUPERVISION DEL SUPERVISOR PRINCIPAL DE FECHA 30-11-2020. ACTA DE ENTREGA DE CONTRATO A SUPLENTE DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2020. PRESENTE INFORME DE SUPERVISIION DE FECHA 28 DE ENERO DE 2020 POR NOVEDADES LOGISTICAS Y DE SERVICIO DEL SUPERVISOR SUPLENTE.
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		NO SE EVIDENCIA REPORTE DE SUPERVISOR PRINCIPAL Y NO SE GENERARON POR PARTE DEL SUPLENTE HASTA LA FECHA

12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	**X**		EL CONTRATO SERA LIQUIDADO EL 15 DE MARZO DE 2021. DE ACUERDO AL LAPSO CORRESPONDIENTE POSTERIOR AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION TOTAL.



CAPITAN HENAO GUERRERO JHON EDINSON
SUPERVISOR SUPLENTE

BITACORA DE OBRA

CONTRATO: 152-00-J-EMAVI-GRUAL-2020

"MANTENIMIENTO, CONSTRUCCCIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA SANITARIO EN ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD PAN DE AZUCAR "

CONTRATISTA
COL ENERGY
NIT: 900.535.180-9

SUPERVISOR PRINCIPAL: CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS
SUPERVISOR SUPLENTE: CT.HENAO GUERRERO JHON EDINSON

INGENIERO DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO: ING. YAIR TIBATÁ GACHA

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PERIODO REPORTE 30 NOVIEMBRE DE 2020 A 15 DE DICIEMBRE DE 2020

Fecha	Hora de Ingreso	Hora de Salida	Estado del Tiempo	Personal de Obra	Frentes de Obra	Actividades	Registro Fotográfico / Evidencia
30-11-2020	06:00	18:00	Lluvioso	5	ZDS Pan de Azúcar	Continuación construcción redes hidrosanitarias	

INGENIERO DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO
ING. YAIR TIBATÁ GACHA

SUPERVISOR:
CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS

Ct. Henao Guerrero Jhon Edinson

Fecha	Hora de Ingreso	Hora de Salida	Estado del Tiempo	Personal de Obra	Frentes de Obra	Actividades	Registro Fotográfico / Evidencia
01-12-2020	06:00	18:00	Lluvioso	5	ZDS Pan de Azúcar	Continuación cimentación y atraque de tuberías redes hidrosanitarias	

INGENIERO DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO
ING. YAIR TIBATÁ GACHA

SUPERVISOR:
CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS

Ct. Henao Guerrero Jhon Edinson

Fecha	Hora de Ingreso	Hora de Salida	Estado del Tiempo	Personal de Obra	Frentes de Obra	Actividades	Registro Fotográfico / Evidencia
02-12-2020	06:00	18:00	Lluvioso	5	ZDS Pan de Azúcar	Transporte estructura metálica a sitio de obra para instalación, adecuación de terreno zapatas para fijación de columnas metálicas	

INGENIERO DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO
ING. YAIR TIBATÁ GACHA

SUPERVISOR:
CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS

Ct. Henao Guerrero Jhon Edinson

Fecha	Hora de Ingreso	Hora de Salida	Estado del Tiempo	Personal de Obra	Frentes de Obra	Actividades	Registro Fotográfico / Evidencia
03-12-2020	06:00	18:00	Lluvioso	5	ZDS Pan de Azúcar	Cimentación completa	

INGENIERO DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO
ING. YAIR TIBATÁ GACHA

SUPERVISOR:
CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS

Ct. Henao Guerrero Jhon Edinson

Escriba

Fecha	Hora de Ingreso	Hora de Salida	Estado del Tiempo	Personal de Obra	Frentes de Obra	Actividades	Registro Fotográfico / Evidencia
04-12-2020	06:00	18:00	Lluvioso	5	ZDS Pan de Azúcar	Inicio traslado de equipos preparación accesorios conexiones electricas	 

INGENIERO DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO
ING. YAIR TIBATÁ GACHA

SUPERVISOR:
CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS

Ct. Henao Guerrero Jhon Edinson

Fecha	Hora de Ingreso	Hora de Salida	Estado del Tiempo	Personal de Obra	Frentes de Obra	Actividades	Registro Fotográfico / Evidencia
05-12-2020	06:00	18:00	Lluvioso	5	ZDS Pan de Azúcar	Rellenos redes hidrosanitarias posterior a pruebas hidraulicas de funcionamiento	

INGENIERO DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO
ING. YAIR TIBATÁ GACHA

SUPERVISOR:
CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS

Ct. Henao Guerrero Jhon Edinson

Fecha	Hora de Ingreso	Hora de Salida	Estado del Tiempo	Personal de Obra	Frentes de Obra	Actividades	Registro Fotográfico / Evidencia
06-12-2020	06:00	18:00	Lluvioso	5	ZDS Pan de Azúcar	Pintura estructura metálica, verificación redes eléctricas, transporte equipos	

INGENIERO DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO
ING. YAIR TIBATÁ GACHA

SUPERVISOR:
CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS

Ct. Henao Guerrero Jhon Edinson

Fecha	Hora de Ingreso	Hora de Salida	Estado del Tiempo	Personal de Obra	Frentes de Obra	Actividades	Registro Fotográfico / Evidencia
08-12-2020	06:00	18:00	Lluvioso	5	ZDS Pan de Azúcar	Transporte plantas a sitio de obra	

INGENIERO DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO
ING. YAIR TIBATÁ GACHA

SUPERVISOR:
CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS

Ct. Henao Guerrero Jhon Edinson

Fecha	Hora de Ingreso	Hora de Salida	Estado del Tiempo	Personal de Obra	Frentes de Obra	Actividades	Registro Fotográfico / Evidencia
09-12-2020	06:00	18:00	Lluvioso	5	ZDS Pan de Azúcar	Pintura y acabados caseta principal	

INGENIERO DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO
ING. YAIR TIBATÁ GACHA

SUPERVISOR:
CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS

Ct. Henao Guarrero Jhon Edinson

Fecha	Hora de Ingreso	Hora de Salida	Estado del Tiempo	Personal de Obra	Frentes de Obra	Actividades	Registro Fotográfico / Evidencia
10-12-2020	06:00	18:00	Lluvioso	5	ZDS Pan de Azúcar	Limpieza de obra cajas de inspección alrededores redes, alrededores caseta principal. Retiro de escombros ysobrantes de obra, transporte equipo	

INGENIERO DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO
ING. YAIR TIBATÁ GACHA

SUPERVISOR:
CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS

Ct. Henao Guerrero Jhon Edinson

Fecha	Hora de Ingreso	Hora de Salida	Estado del Tiempo	Personal de Obra	Frentes de Obra	Actividades	Registro Fotográfico / Evidencia
11-12-2020	06:00	18:00	Lluvioso	5	ZDS Pan de Azúcar	Traslado de equipos a zona desconcentrada – corrección de anotaciones acabados en todas las áreas intervenidas	

INGENIERO DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO
ING. YAIR TIBATÁ GACHA

SUPERVISOR:
CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS

Ct. Henao Guerrero Jhon Edinson

Fecha	Hora de Ingreso	Hora de Salida	Estado del Tiempo	Personal de Obra	Frentes de Obra	Actividades	Registro Fotográfico / Evidencia
12-12-2020	06:00	18:00	Lluvioso	5	ZDS Pan de Azúcar	Traslado de equipos a zona desconcentrada – corrección de anotaciones acabados en todas las áreas intervenidas	

INGENIERO DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO
ING. YAIR TIBATÁ GACHA

SUPERVISOR:
CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS

Ct. Henao Guerrero Jhon Edinson

Fecha	Hora de Ingreso	Hora de Salida	Estado del Tiempo	Personal de Obra	Frentes de Obra	Actividades	Registro Fotográfico / Evidencia
13-12-2020	06:00	18:00	Lluvioso	5	ZDS Pan de Azúcar	Instalacion de equipos y calibracion	 

INGENIERO DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO
ING. YAIR TIBATÁ GACHA

SUPERVISOR:
CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS

Ct. Henao Guerrero Jhon Edinson

Fecha	Hora de Ingreso	Hora de Salida	Estado del Tiempo	Personal de Obra	Frentes de Obra	Actividades	Registro Fotográfico / Evidencia
14-12-2020	06:00	18:00	Lluvioso	5	ZDS Pan de Azúcar	Instalacion de equipos y calibracion	 

INGENIERO DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO
ING. YAIR TIBATÁ GACHA

SUPERVISOR:
CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS

Ct. Henao Guerrero Jhon Edinson

Fecha	Hora de Ingreso	Hora de Salida	Estado del Tiempo	Personal de Obra	Frentes de Obra	Actividades	Registro Fotográfico / Evidencia
15-12-2020	06:00	18:00	Lluvioso	5	ZDS Pan de Azúcar	Instalacion de equipos ,calibración pruebas de funcionamiento y culminación de contrato.	  

INGENIERO DE PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO ING. YAIR TIBATÁ GACHA	SUPERVISOR: CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS Ct. Henao Guerrero Jhon Edinson

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-018
	ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y/O INTERVENTORIA	Versión:	1
		Vigencia:	14/11/2019

LUGAR Y FECHA	EMAVI, 11 diciembre 2020
SUPERVISOR QUE SALE	CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS
SUPERVISOR QUE RECIBE	CT. HENAO GUERRERO JHON EDISON
RAZONES DE ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN	VACACIONES Y POSTERIOR TRASLADO SUPERVISOR TITULAR
CONTRATO DE OBRA	
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	9 SEPTIEMBRE DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCCIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA SANITARIO EN ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD PAN DE AZUCAR
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE Y/O CXP PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2021 RUBRO: C-1502-0100-34-0-1502090-02 RECURSO 11
CONTRATISTA	COL ENERGY SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 270.285.297,35
PLAZO DE ENTREGA	15 DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO	15 SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA
CONTRATO DE INTERVENTORIA	
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
CONTRATISTA	NO APLICA
INTERVENTOR	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	NO APLICA
FECHA DE INICIO	NO APLICA
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

El día 11 del mes de diciembre del 2020 a las 14:00 horas se reunieron: CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS, CT. HENAO GUERRERO JHON EDISON, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, con el fin de realizar la entrega de la supervision del contrato por vacaciones y traslado del supervisor titular.

ESTADO CONTRATO

PORCENTAJE PONDERADO					
PROGRAMADO A LA FECHA	76,48	EJECUTADO A LA FECHA	100,00%	ATRASO (-) / ADELANTO (+)	23,52%
JUSTIFICACION DEL ATRASO	NINGUNA				

LISTA DE CHEQUEO DE ENTREGA

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS, CPA, CDP Y CRP DEL PROCESO		X		
2	ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL		X		
3	ACTA DE INICIO		X		
4	REVISION Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES		X		
5	REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO		X		
6	REVISION Y APROBACION DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO		X		
7	REVISION Y APROBACION DE PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO			X	
8	INFORMES DE SUPERVISION PRESENTADOS A LA FECHA		X		3 INFORMES DE SUPERVISIÓN EL ULTIMO ENTREGADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
9	CORTE DE OBRA Y/O INTERVENTORIA		X		PAGO TOTAL TRAMITADO EL 11 DICIEMBRE DE 2020
10	RELACION DE PAGOS REALIZADOS		X		PAGO TOTAL TRAMITADO EL 11 DICIEMBRE DE 2020. PENDIENTE EL GIRO DE LOS RECURSOS AL CONTRATISTA
11	DEMAS FORMATOS QUE REQUIERA DEPENDIENDO EL ESTADO DEL PROYECTO	X			PRESENTAR INFORMES DE SUPERVISIÓN HASTA QUE SE REALICEN LOS PAGOS AL CONTRATISTA, POSTERIOR LIQUIDACIÓN DEL MISMO.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

CT. ROSERO MUÑOZ JORGE LUIS SUPERVISOR QUE SALE FIRMA Y POSTFIRMA	CT. HENAO GUERRERO JHON EDISON SUPERVISOR QUE ENTRA FIRMA Y POSTFIRMA
