OF-MO2024-147

Bogotá, 21 de julio de 2026

Señores
CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI
Atn. YEFER CUEVAS MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PARA. "EJECUTAR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y TERMINACIÓN (FASE II) PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO CESAR CONTO FERRER EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA.

Respetado ingeniero cordial saludo

El suscrito, HENRY SANCHEZ ARDILA, actuando en calidad de representante legal del Consorcio Obras MO 2024, estando dentro del término contractual oportuno y teniendo en cuenta las condiciones actuales del proyecto de la referencia, me permito realizar la solicitud de una tercera prórroga del contrato de obra, con fundamento en las siguientes consideraciones.

A continuación, se evidencian los principales soportes para la respectiva **justificación,** que soporta el origen de la necesidad de la presente solicitud de prorroga al contrato en ejecución, respecto a las siguientes situaciones identificadas:

1. **ADECUACIONES DE CARÁCTER TECNICO PARA ETAPA DE DOTACION DEL TEATRO.**

La entidad genero el proceso de adjudicación formal del mobiliario, sonido e iluminación escénica para el teatro Cesar Conto Ferrer. Los contratistas para cada especialidad, realizaron la verificación en sitio de las condiciones existentes en la infraestructura, necesarias para proceder con la ejecución de los respectivos contratos en la etapa de dotación.

De estas inspecciones técnicas, surgieron requerimientos de adecuaciones civiles y eléctricas en el teatro, que deben ser atendidas por el Consorcio para garantizar la funcionalidad del teatro. Las adecuaciones solicitadas de carácter urgente son entre otras

- **Fundida de refuerzos en concreto en el piso de platea, para el soporte de la gradería retráctil a instalar posteriormente.** Para la ejecución de esta actividad, se requieren 17 días, para adquisición de materiales para mezcla de concreto, alquiler de la mezcladora de un bulto, trasiego manual de todos los materiales para la fundida, teniendo en cuenta que la etapa de obra gris ya había sido culminada, armado de los 4 elementos de las dimensiones y espesor solicitados, instalación de acero de refuerzo, mezclado de

concreto en obra, fundida y fraguado de concreto. Este tiempo adicional afecta directamente:

El armado de andamios para instalaciones eléctricas de voz y datos, para instalación de cielo raso, instalación de revestimiento acústico en cielo raso, instalación de luminarias, instalación de madera en muros por protección de la mezcla y finalmente, hasta no retirar los andamios y fundir los soportes hasta su etapa de fraguado, no se puede iniciar la instalación de estructura de piso y piso final para platea, actividad que posterior a su inicio toma 4 semanas para su ejecución

- **Ajuste de cielo raso en platea bajo palco de piso 4, para ajustar altura mínima necesaria para la retracción de la gradería.**

  Si bien esta actividad no es predecesora de una posterior, requirió un reproceso que utiliza recursos destinados al avance de la obra, la intervención consistió en desmontar el cielo existente, ajustar su nivel de instalación y reinstalar nuevamente, lo que tomo 3 días para su ejecución.

- **Instalar puntos eléctricos adicionales para la caja escénica, para funcionamiento de iluminación escénica y sonido**.

  Esta instalación de los puntos adicionales, requirió cableado por bandeja en 6to piso, situación que demoro la instalación de cielo raso 2 días.

- **ajustar diseño y altura de barandas en palcos para garantizar la visual y la funcionalidad de los palcos.**

  Esta solicitud implico la modificación de las barandas ya fabricadas para su instalación (recortar su altura). Actividad que tomo 3 días entra su corte y retoque de acabado final, durante este tiempo no se puede instalar barandas e iniciar la instalación de piso en madera.

- **demoler y reconstruir la gradería intermedia en palcos, para volver a fundir, ajustando a modulación de las sillas a instalar, recibida mediante planimetría en julio.**

  Para realizar el ajuste de estas gradas intermedias en los palcos de piso 4 y piso 5, una vez se recibió la planimetría definitiva de ubicación y dimensionamiento, se realizó:

  En cuarto piso, primero se demolieron las gradas existentes para, replantear las correctas y posteriormente, se replantearon y se fundieron las nuevas gradas. Esta actividad tomo 10 días.

  En el quinto piso, se replantearon y se fundieron. Esta actividad tomo 9 días

  Esta actividad afecto directamente la actividad de instalación de piso en madera en graderías, no se pudo dar inicio hasta no concluir la intervención en el palco 4.

- **Desmonte de muros en superar en caja escénica para instalación de refuerzos para la instalación de los equipos para sonido en la platea.**

Si bien esta actividad no es predecesora de una posterior, requirió un reproceso que utiliza recursos destinados al avance de la obra, la intervención consistió en abrirle una ventana a 2 paneles de muros ya terminados a 12 metros de altura, instalar refuerzo y resanar nuevamente el muro para pintar de negro.
Esta actividad requirió torres de andamio que entorpecen el inicio de trabajo de instalación de refuerzos para piso en platea.

Estas actividades adicionales, generaron no solo la utilización de recursos y personal destinado para otras adecuaciones, sino que también dilatan el inicio o la continuidad de la instalación de acabados en los espacios donde se debe generar una intervención adicional.

A continuación se muestra el cronograma en el que fueron ejecutadas, con el fin de determinar los días en que la programación fue afectada en su ruta crítica, teniendo en cuenta que las actividades de instalación de cielo raso, instalación de luminarias, instalación de madera en palcos e instalación de refuerzo, quintuplex y piso en madera de platea, son afectadas directamente por las nuevas actividades predecesoras de estos acabados.

			JULIO																								
Descripcion	**inicio**	**duracion**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
Fundida de refuerzos en concreto en el piso de platea, para el soporte de la gradería retráctil a instalar posteriormente.	jul-09	17																											
Ajuste de cielo raso en platea bajo palco de piso 4, para ajustar altura mínima necesaria para la retracción de la gradería.	jul-03	3																											
Instalar puntos de datos adicionales para la caja escénica, para funcionamiento de iluminación escénica y sonido.	jul-15	2																											
ajustar diseño y altura de barandas en palcos para garantizar la visual y la funcionalidad de los	jul-13	3																											
demoler reconstruir la gradería intermedia en palcos, para volver a fundir, ajustando a modulación de las sillas a instalar, palco 4	jul-14	10																											
construir la gradería intermedia en palcos, para fundir, ajustando a modulación de las sillas a instalar, palco 5	jul-16	9																											
Desmonte de muros en superboard en caja escénica para instalación de refuerzos para la instalación de los equipos para sonido en la platea	jun-25	10																											
total de dias. Para actividades adicionales. se tienen en cuanta tiempos que no se traslapan		25																											

En resumen, los días que estas actividades afectaron la ruta crítica del proyecto son 25 días calendario que se incluyen en la programación, y que influyen directamente en el inicio de sus actividades predecesoras de instalación de cielo raso y revestimiento acústico, luminarias en platea, instalación de pisos en madera en palcos y en platea, siendo las más críticas las correspondientes a los pisos en madera en platea y palcos, que requieren al menos 45 días para su ejecución.

Teniendo en cuenta que estas intervenciones deben ser ejecutadas en la caja escénica y la platea, las cuales son la ruta crítica de la terminación del teatro, se requiere un tiempo adicional para su ejecución a satisfacción y poder dar continuidad a la fase final de acabados del teatro.

2. ALTERACIONES DE ORDEN PUBLICO. BLOQUEO DE VIAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE QUIBDO.

Durante la primera quincena del mes de julio, se presentaron enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos al margen de la ley en las vías entre Pereira y Medellín hacia Quibdó. Esta situación ajena al contratista, impidió la llegada a tiempo de insumos, equipos, materiales y personal calificado al proyecto, que retrasaron actividades, la instalación del equipo montacargas y de la planta eléctrica, llegada de láminas para barandas de fachada piso 3 y cortasoles barandas, entre otras.

Gracias al equipo profesional de interventoría en obra, se realizó la siguiente matriz de eventos de afectaciones de orden público y su incidencia en el proyecto, en lo corrido del mes de julio, que han afectado la logística de llegada de materiales, insumos, equipos y personal al proyecto, generando retrasos En el normal desarrollo de las actividades en ejecución.

Fecha	Tipo de afectación	Hecho / novedad	Incidencia para el proyecto
4 de julio de 2026	**Orden público**	Se registran hechos de orden público en el corredor Risaralda–Chocó, incluyendo ataques con explosivos mediante drones en Santa Cecilia.	Generación de condiciones de inseguridad y posteriores restricciones sobre el corredor de acceso a Quibdó.
5 de julio de 2026	**Orden público / cierre vial**	Inicio del bloqueo reportado sobre la vía **Pereira–Quibdó**, asociado a enfrentamientos y vehículos atravesados en la vía.	Restricción al transporte de carga, pasajeros, materiales y equipos con destino a Quibdó.
6 de julio de 2026	**Cierre vial / orden público**	Continúa bloqueada la vía Pereira–Quibdó por condiciones de seguridad y presunta presencia de elementos explosivos.	Imposibilidad o restricción significativa para el ingreso de materiales, equipos y personal por este corredor.
7 de julio de 2026	**Cierre vial / transporte**	Se reportaban aproximadamente **48 horas de bloqueo**. La Terminal de Pereira suspendió temporalmente rutas hacia Chocó, despachando únicamente hasta Santa Cecilia.	Afectación directa de la cadena logística y represamiento del transporte hacia Quibdó.
8 de julio de 2026	**Normalización / efecto logístico**	Se reporta nuevamente habilitado el corredor Pereira–Quibdó y reanudación de rutas. El contratista formaliza mediante **OF-MO2024-144** la afectación sufrida por el cierre.	Persistencia de retrasos derivados del represamiento de materiales, equipos e insumos durante los días anteriores.
14 de julio de 2026	**Orden público / bloqueo vial**	Se presenta una nueva afectación sobre la vía **Quibdó–Medellín**, con vehículos utilizados para bloquear el corredor.	Nueva restricción sobre uno de los principales corredores alternos de

			abastecimiento y transporte hacia Quibdó.
15 de julio de 2026	**Orden público / logística**	Persisten alertas y dificultades de seguridad para transportadores en corredores de acceso al Chocó.	Alteraciones en la programación logística y transporte de carga.

Como se evidencia en el cuadro presentado, las situaciones de alteración de orden público y dificultad de paso del transporte, han sido una constante durante el mes en curso, situación que es ajena al Consorcio y que genero la demora en la llegada de materiales e insumos para el proyecto, de hasta 5 días en su llegada a obra.

Se anexa comunicado emitido a interventoría MO-2024-144 de julio 8 de 2026.

3. INTERRUPCIONES CONSTANTES DE FLUIDO ELECTRICO.

Otra de las situaciones que han influido en la ejecución normal de las actividades en el proyecto, han sido los cortes del fluido eléctrico que se han registrado de manera constante por daños en la infraestructura y un incendio en el centro de la ciudad, interrupciones prolongadas del servicio de energía que, si bien se cuenta con planta de emergencia en obra, su capacidad no es suficiente para atender todos los frentes que lo requieren por los prolongados lapsos de tiempo de suspensión y de manera continua. Estas interrupciones han afectado la continuidad del desarrollo normal de actividades.

A continuación se relacionan los cortes de energía programados o reportados, sin embargo se presentan cortes intermitentes adicionales que se registran en bitácora, para controlar el tiempo a diario en que se debe parar actividades, por falta de energía eléctrica.

El tiempo acumulado en días, que se calcula se ha perdido en obra a causa de los cortes de energía casi a diario, se estima en 5 días.



Imagen 01. Información de corte de energía por

En conclusión, los factores expuestos anteriormente, han generado un atraso en la ruta crítica del proyecto que no es posible recuperar antes de culminar el tiempo contractual, por lo que se requiere un plazo adicional para la etapa final de terminación del teatro, de al menos 30 días calendario.

SOLICITUD

Tal como se evidencio en las causas anteriormente explicadas, se procede a la formalización de solicitud de un plazo adicional requerido de un mes, hasta el **31 de agosto de 2026.**

La solicitud se fundamenta en situaciones que generan afectaciones a la programación de obra, afectación evidenciada en tiempo para ejecutar actividades adicionales y recuperación de actividades afectadas por los motivos de fuerza mayor, expuestos en los numerales 1, 2 y 3 del presente documento.

Agradeciendo la atención prestada, a la espera de sus comentarios.

Atentamente

HENRY OMAR SANCHEZ ARDILA
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS MO 2024

Anexo 01. Comunicado sobre cierre de vías por paro armado

OF-MO2024-147

Bogotá, 21 de julio de 2026

Señores
CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI
Atn. YEFER CUEVAS MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PARA. "EJECUTAR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y TERMINACIÓN (FASE II) PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO CESAR CONTO FERRER EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA.

Respetado ingeniero cordial saludo

El suscrito, HENRY SANCHEZ ARDILA, actuando en calidad de representante legal del Consorcio Obras MO 2024, estando dentro del término contractual oportuno y teniendo en cuenta las condiciones actuales del proyecto de la referencia, me permito realizar la solicitud de una tercera prórroga del contrato de obra, con fundamento en las siguientes consideraciones.

A continuación, se evidencian los principales soportes para la respectiva **justificación,** que soporta el origen de la necesidad de la presente solicitud de prorroga al contrato en ejecución, respecto a los siguientes situaciones identificadas:

1. **ADECUACIONES DE CARÁCTER TECNICO PARA ETAPA DE DOTACION DEL TEATRO.**

La entidad genero el proceso de adjudicación formal del mobiliario, sonido e iluminación escénica para el teatro Cesar Conto Ferrer. Los contratistas para cada especialidad, realizaron la verificación en sitio de las condiciones existentes en la infraestructura, necesarias para proceder con la ejecución de los respectivos contratos en la etapa de dotación.

De estas inspecciones técnicas, surgieron requerimientos de adecuaciones civiles y eléctricas en el teatro, que deben ser atendidas por el Consorcio para garantizar la funcionalidad del teatro. Las adecuaciones solicitadas de carácter urgente son entre otras

- Fundida de refuerzos en concreto en el piso de platea, para el soporte de la gradería retráctil a instalar posteriormente.

- Ajuste de cielo raso en platea bajo palco de piso 4, para ajustar altura mínima necesaria para la retracción de la gradería.

- Instalar puntos de datos adicionales para la caja escénica, para funcionamiento de iluminación escénica y sonido.

- ajustar diseño y altura de barandas en palcos para garantizar la visual y la funcionalidad de los palcos.

- demoler reconstruir la gradería intermedia en palcos, para volver a fundir, ajustando a modulación de las sillas a instalar, recibida mediante planimetría en julio.

- Desmonte de muros en superboard en caja escénica para instalación de refuerzos para la instalación de los equipos para sonido en la platea

Estas actividades adicionales, generan no solo la utilización de recursos y personal destinado para otras adecuaciones, sino que también dilatan el inicio o la continuidad de la instalación de acabados en los espacios donde se debe generar una intervención adicional.

Teniendo en cuenta que estas intervenciones deben ser ejecutadas en la caja escénica y la platea, las cuales son la ruta crítica de la terminación del teatro, se requiere un tiempo adicional para su ejecución a satisfacción y poder dar continuidad a la fase final de acabados del teatro.

2. **ALTERACIONES DE ORDEN PUBLICO. BLOQUEO DE VIAS DE ACCESO A LA CIUDAD DE QUIBDO.**

Durante la primera quincena del mes de julio, se presentaron enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos al margen de la ley en las vías entre Pereira y Medellín hacia Quibdó. Esta situación ajena al contratista, impidió la llegada a tiempo de insumos, equipos, materiales y personal calificado al proyecto, que retrasaron actividades, la instalación del equipo montacargas y de la planta eléctrica, llegada de láminas para barandas de fachada piso 3 y cortasoles barandas, entre otras.

Se anexa comunicado emitido a interventoría

3. **INTERRUPCIONES CONSTANTES DE FLUIDO ELECTRICO.**

Se han generado de manera constante por daños en la infraestructura y un incendio en el centro de la ciudad, interrupciones prolongadas del servicio de energía, si bien se cuenta con planta de emergencia en obra, su capacidad no es suficiente para atender todos los frentes que lo requieren por tanto tiempo de manera continua. Estas interrupciones merman el desarrollo normal de actividades.

En conclusión, los factores expuestos anteriormente, han generado un atraso en la ruta critica del proyecto que no es posible recuperar antes de culminar el tiempo contractual, por lo que se requiere un plazo adicional para la etapa final de terminación del teatro, de 30 días calendario.



Imagen 01. Información de corte de energía por

4. INGRESO DE RECURSOS ECONOMICOS

Como es de conocimiento de las partes, para la adición presupuestal aprobada en el modificatorio 3 al contrato, se solicitó el trámite de un segundo anticipo, destinado a la ejecución de las actividades no previstas incluidas en el mismo modificatorio, a la fecha, y teniendo en cuenta que no se han recibido los recursos mencionados y no han ingresado los pagos correspondientes a los cortes 10 y 11, los insumos, equipos y personal necesarios, han sido cubiertos con recursos propios, para garantizar el continuo desarrollo del proyecto con el fin de ejecutar las actividades dentro de los ¿plazos estipulados, sin embargo a la fecha ante el desconocimiento de la fecha de ingreso de estos recursos, el contratista ha presentado un desequilibrio económico que afecta el flujo continuo para la fase de terminación del proyecto.

SOLICITUD

Tal como se evidencio en las causas anteriormente explicadas, se procede a la formalización de solicitud de un plazo adicional requerido de un mes, hasta el **31 de agosto de 2026.**

La solicitud se fundamenta en situaciones que generan afectaciones a la programación de obra, afectación evidenciada en tiempo para ejecutar actividades adicionales y recuperación de actividades afectadas por los motivos de fuerza mayor, expuestos en los numerales 1, 2 y 3 del presente documento.

Agradeciendo la atención prestada, a la espera de sus comentarios.

Atentamente

HENRY OMAR SANCHEZ ARDILA
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS MO 2024

Anexo 01. Comunicado sobre cierre de vías por paro armado

Quibdó, 08 de julio de 2026

OF-MO2024-144

Señores:
CONSORCIO JCB – 005 – MINCUL – CHOQUI
Atn. YEFER CUEVAS MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL
Bogotá.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No.4327-2024, cuyo objeto **"**EJECUTAR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y TERMINACIÓN (FASE II) PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO CESAR CONTO FERRER EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".

Asunto: Comunicación sobre cierre de vía principal de acceso al Departamento del Chocó.

Cordial saludo,

En Consorcio Obras MO 2024, en su calidad de constructor, se permite informar sobre la situación actual de la vía Pereira - Quibdó, debido a que como se evidencia en las publicaciones digitales adjuntas a este comunicado, se encuentra bloqueada desde el 4 de julio del año en curso, debido a enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del ELN. Esta situación ha generado un impacto significativo en la movilidad de carga y pasajeros, teniendo en cuenta que, actualmente, la vía se encuentra bloqueada por dos camiones atravesados en la via, en el corregimiento de playa de oro, Choco, lo que afecta gravemente la movilidad, hasta la fecha no se ha reportado la normalización del paso en la vía, ni de la situación de orden público, lo que es inminente riesgo para quienes quisieran transitar por este corredor vial.

Esta situación ha generado retrasos significativos en el transporte de materiales requeridos en la obra, concernientes a la etapa final de acabados y llegada de equipos para voz, datos, sonido, entre otros.

El Consorcio se ve en la obligación de informar esta situación de orden público, que ha generado atrasos que no son resorte del control interno del proyecto y pueden representar afectación en las fechas de culminación de las actividades que dependen del material e insumos que se encuentran en proceso de transporte por carretera desde estas ciudades.

Atentamente,

HENRY OMAR SÁNCHEZ ARDILA
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS MO 2024

Anexo: evidencia de información periodística publicada en internet

Correo electrónico: obrasmo2024quibdo@gmail.com
Nit: 901.896.732-6
Tel. 3133876020

Anexo 1.

CIERRAN LA VÍA PEREIRA - QUIBDÓ POR LOS NUEVOS 4T4QU3S DEL ELN

Las autoridades confirmaron el cierre de la vía Pereira - Quibdó debido a los nuevos ataques atribuidos al ELN, que durante este lunes volvieron a generar graves alteraciones del orden público en el departamento del Chocó.

Según confirmó la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, el grupo armado bloqueó este importante corredor vial mientras se registraban combates en la zona.

Las autoridades mantienen presencia militar y policial en el corredor mientras intentan recuperar el control y garantizar las condiciones de seguridad para reabrir la carretera. Por ahora, se recomienda a los viajeros aplazar sus desplazamientos hacia el departamento del Chocó hasta que la situación sea normalizada.

La gobernadora advirtió que la ofensiva del ELN continúa y pidió al Gobierno Nacional fortalecer las operaciones de la Fuerza Pública para contener esta nueva escalada de violencia. #pereiraenvivo



https://web.facebook.com/pereiraenvivo/posts/cierran-la-v%C3%ADa-pereira-quibd%C3%B3-por-los-nuevos-4t4qu3s-del-elnlas-autoridades-conf/1577113903972274/?_rdc=1&_rdr#:~:text=CIERRAN%20LA%20V%C3%8DA,238

Correo electrónico: obrasmo2024quibdo@gmail.com
Nit: 901.896.732-6
Tel. 3133876020

Anexo 2

Bloquean la vía entre Risaralda y Chocó por combates entre el Ejército y el ELN: dos vehículos pesados estarían cargados con explosivos

La Terminal de Transportes de Pereira suspendió sus rutas hacia el departamento de Chocó por enfrentamientos armados y presuntos explosivos.

Julio 7, 2026



la situación de orden público en la vía Panamericana que conecta a los departamentos de **Risaralda y Chocó** está cada vez más compleja. Este martes se completan **dos días de bloqueos** en la carretera entre Pereira y Quibdó por enfrentamientos armados y presuntos explosivos.

El **gremio transportador** manifestó su preocupación debido a que ya son 48 horas en las que este importante corredor vial permanece cerrado por problemas de seguridad, afectando sus ingresos y creando zozobra entre la comunidad.

Por su parte, **Héctor Fabio Artunduaga**, gerente de la Terminal de Transportes de Pereira, señaló a la opinión pública que **dos vehículos de carga** permanecen atravesados en el corregimiento de **Playa de Oro**, al parecer **cargados con explosivos.**

Además, indicó que se registran **enfrentamientos** entre el **Ejército Nacional** y presuntos integrantes del **ELN** en jurisdicción del municipio de Tadó, situación que mantiene bloqueado el paso entre ambos departamentos, afectando gravemente la movilidad de carga y pasajeros.

“La información que nosotros tenemos, recopilada a través de los conductores que viajan hacia esa zona del país, es que en el sector de Playa de Oro atravesaron **dos camiones**, presuntamente cargados con explosivos. También nos han informado que cerca del **municipio de Tadó** se presentan enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército Nacional”, advirtió Artunduaga.

El gerente de la terminal de Pereira enfatizó que se suspendieron las rutas hacia el Chocó por estas situaciones de orden público, y el **servicio de transporte** únicamente se está prestando hasta el corregimiento de **Santa Cecilia**, en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda.

"Por esa razón, las dos empresas que despachan buses desde la Terminal de Pereira hacia ese sector, **Flota Occidental y Expreso Arauca**, suspendieron temporalmente sus recorridos. Solo estamos despachando buses hasta el corregimiento de Santa Cecilia, en el municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda, dejando de despachar 16 buses diarios y **afectando a más de 500 pasajeros**", dijo Héctor Fabio Artunduaga en sus declaraciones.

https://www.elheraldo.co/colombia/2026/07/07/bloquean-la-via-entre-risaralda-y-choco-por-combates-entre-el-ejercito-y-el-eln-dos-vehiculos-pesados-estarian-cargados-con-explosivos/#:~:text=Bloquean%20la%20v%C3%ADa,en%20sus%20declaraciones.

Anexo 3

Continúan las afectaciones al orden público en el Chocó. En la vía Quibdó–Medellín fueron reportadas banderas atribuidas al ELN y, de manera preliminar, la presunta instalación de explosivos sobre la carretera, situación que es verificada por las autoridades.

A estos hechos se suma que, durante la noche del lunes, drones sobrevolaron nuevamente la estación de Policía de Tadó. Aunque no se registró una detonación, el hecho generó temor entre los habitantes.

Las autoridades mantienen las labores de verificación y recomiendan a los usuarios de la vía atender únicamente la información oficial y seguir las indicaciones de la Fuerza Pública.

#Chocó #Quibdó #Tadó #ELN #Orden Público Seguridad Última Hora TelepacíficoNoticias

https://web.facebook.com/TelepacificoNoticias360/videos/contin%C3%BAan-las-afectaciones-al-orden-p%C3%BAblico-en-el-choc%C3%B3-en-la-v%C3%ADa-quibd%C3%B3medell%C3%ADn/27804963285804190/#:~:text=Seguir-,Contin%C3%BAan%20las%20afectaciones%20al%20orden%20p%C3%BAblico%20en%20el%20Choc%C3%B3.%20En%20la,%23Quibd%C3%B3%20%23Tad%C3%B3%20%23ELN%20%23OrdenP%C3%BAblico%20Seguridad%20%C3%9AltimaHora%20Telepac%C3%ADficoNoticias,-Ver%20menos

Suspenden despachos de buses entre Pereira y Chocó: habría carros con explosivos en la vía y enfrentamientos

La vía Pereira - Quibdó está cerrada por camiones interpuestos, al parecer con explosivos. La terminal de transportes de Pereira solo está enviando buses hasta Santa Cecilia.



Los buses que cubren la ruta Pereira - Quibdó solo están llegando hasta el corregimiento de Santa Cecilia.

La movilidad entre **Pereira y el departamento del Chocó** volvió a verse afectada este lunes debido a la situación de orden público que persiste en la zona limítrofe entre ambos departamentos.

La **Terminal de Transportes de Pereira** suspendió los despachos de buses hacia territorio chocoano, luego de recibir reportes sobre bloqueos en la vía y enfrentamientos armados.

Según informó el gerente del Terminal de Transportes de Pereira, **Héctor Fabio Artunduaga**, las empresas transportadoras recibieron información de los conductores que operan la ruta, quienes reportaron que **dos camiones, presuntamente cargados con explosivos, fueron atravesados en el sector conocido como Playa de Oro**.

Mientras que cerca del municipio de **Tadó** se estarían registrando enfrentamientos entre integrantes de un grupo armado ilegal y el Ejército Nacional.

"Por esa razón, las dos empresas que despachan buses desde aquí hacia ese sector no lo están haciendo. **Solo estamos despachando buses hasta el corregimiento de Santa Cecilia"**, explicó Artunduaga.

El directivo agregó que diariamente **16 buses movilizan cerca de 500 pasajeros** entre Pereira y el departamento del Chocó, por lo que el servicio permanecerá restringido hasta que las autoridades confirmen que existen condiciones de seguridad para reanudar la operación.

De acuerdo con información publicada por el medio digital **Ahinformación**, desde la madrugada hombres armados obligaron al conductor de un camión a atravesar el vehículo sobre la carretera en el sector de **Peñas del Olvido**, en el departamento del Chocó, sobre la vía que comunica con Risaralda.

Según ese reporte, los responsables se llevaron las llaves del vehículo, impidiendo su movilización y manteniendo cerrada la carretera mientras las autoridades hacen presencia en el lugar.

Tensión en la vía desde el 4 de julio

La suspensión del transporte se produce luego de varios hechos de orden público registrados durante el fin de semana en el occidente de Risaralda.

El sábado 4 de julio, el **Ejército Nacional** y la **Policía de Risaralda** atribuyeron al **Frente Manuel Hernández El Boche del ELN** los ataques con explosivos lanzados mediante drones contra la subestación de Policía del corregimiento de **Santa Cecilia**, en el municipio de **Pueblo Rico**.

Las autoridades informaron inicialmente que los dos ataques, ocurridos hacia las **6:30 a. m.** y **7:15 a. m.**, no dejaron personas lesionadas ni afectaron la capacidad operativa de la estación policial.

Sin embargo, posteriormente la **Defensoría del Pueblo** indicó que los hechos sí ocasionaron daños en la infraestructura y que **un uniformado resultó herido de manera leve**.

“En Risaralda, se registraron ataques contra la Estación de Policía y el batallón en el casco urbano de San José del Palmar, así como hostigamientos en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, que dejaron afectaciones a la infraestructura policial y un uniformado herido levemente. También aparecieron banderas y elementos alusivos al ELN en Pereira y Dosquebradas”, dice el documento.

https://www.lapatria.com/eje-cafetero/suspenden-despachos-de-buses-entre-pereira-y-choco-habria-carros-con-explosivos-en-la#:~:text=Suspenden%20despachos%20de,dice%20el%20documento.

LO ÚLTIMO
Colombia sumó dos medallas de oro en ciclismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe
8:41 PM

Publicidad

País

Bloquean la vía entre Risaralda y Chocó por combates entre el Ejército y el ELN: dos vehículos pesados estarían cargados con explosivos

La Terminal de Transportes de Pereira suspendió sus rutas hacia el departamento de Chocó por enfrentamientos armados y presuntos explosivos.

Julio 7, 2026

Redes sociales

Dos camiones, presuntamente cargados con explosivos, están atravesados en la vía Pereira-Chocó.

P AÍS |

Por: **Redacción ELHERALDO.CO**

la situación de orden público en la vía Panamericana que conecta a los departamentos de **Risaralda y Chocó** está cada vez más compleja. Este martes se completan **dos días de bloqueos** en la carretera entre Pereira y Quibdó por enfrentamientos armados y presuntos explosivos.

Leer más: **Juez ordena extinción de dominio a inmueble de René Higuita que había sido obtenido con dineros del narcotráfico**

Links promovidos por Taboola

El **gremio transportador** manifestó su preocupación debido a que ya son 48 horas en las que este importante corredor vial permanece cerrado por problemas de seguridad, afectando sus ingresos y creando zozobra entre la comunidad.

explosivos.

Además, indicó que se registran **enfrentamientos** entre el **Ejército Nacional** y presuntos integrantes del **ELN** en jurisdicción del municipio de Tadó, situación que mantiene bloqueado el paso entre ambos departamentos, afectando gravemente la movilidad de carga y pasajeros.

“La información que nosotros tenemos, recopilada a través de los conductores que viajan hacia esa zona del país, es que en el sector de Playa de Oro atravesaron **dos camiones**, presuntamente cargados con explosivos. También nos han informado que cerca del **municipio de Tadó** se presentan enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército Nacional”, advirtió Artunduaga.

Ver también: “No esperaban encontrarse con un equipo preparado”: comisión de empalme de De la Espriella arremete contra el Gobierno Petro

El gerente de la terminal de Pereira enfatizó que se suspendieron las rutas hacia el Chocó por estas situaciones de orden público, y el **servicio de transporte** únicamente se está prestando hasta el corregimiento de **Santa Cecilia**, en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda.

“Por esa razón, las dos empresas que despachan buses desde la Terminal de Pereira hacia ese sector, **Flota Occidental y Expreso Arauca**, suspendieron temporalmente sus recorridos. Solo estamos despachando buses hasta el corregimiento de Santa Cecilia, en el municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda, dejando de despachar 16 buses diarios y **afectando a más de 500 pasajeros**”, dijo Héctor Fabio Artunduaga en sus declaraciones.

Temas tratados

- Vía entre Risaralda y Chocó
- bloqueos
- combates
- Ejército
- ELN
- Terminal de Pereira

Más noticias



DEPORTES

Colombia sumó dos medallas de oro en ciclismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe



MUNDO

Muere Betye Saar, la artista que exploró la dolorosa historia del racismo en EE. UU.

Publicidad

Convierta a **EL HERALDO** en su fuente de noticias

Más de País

PAÍS

Sucre se alista para su Feria del Calzado y la Marroquinería



PAÍS

La Policía de Bolívar se incautó de más de un kilo de marihuana en un operativo vial



PAÍS

Defensa de alias 'Papá Pitufo' denuncia penalmente a Petro por injuria y calumnia



PAÍS

Mauricio Gaona será el embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en el gobierno de De la Espriella



PAÍS

Ministerio de Hacienda no declaró insubsistente a Angie Rodríguez; Javier Pava fue designado como nuevo gerente del Fondo Adaptación



Publicidad

PAÍS |

Publicidad

Te puede interesar



PAÍS

"Es el sueño histórico del Caribe": Arana respalda anuncio de De la Espriella sobre el Canal del Dique



PAÍS

Mineducación designada pide suspender proceso de elección de miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional



PAÍS

"Quien tenga pruebas de algún hecho ilícito, que las presente; no me intimidarán": Gabriela Muñoz



PAÍS

Siete unidades móviles recorrerán Colombia para encontrar a personas desaparecidas



PAÍS

En Montería iniciaron las obras de rehabilitación del CDI El Dorado



PAÍS

Juliana Guerrero presentó su renuncia al Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar



PAÍS

Revelan la razón por la que dejaron en libertad al hombre que agredió a la dueña de una pastelería en Bogotá



PAÍS

San Marcos, Sucre, anuncia su mejoramiento en la calificación del DNP



PAÍS

Empalme del Ejército alerta por déficit de $1,6 billones para salarios y pide revisar la escala salarial militar



PAÍS

La escultura 'Luna de Bembeo' engalanará la glorieta de la nueva vía de acceso a Tierra Baja, en Cartagena

Publicidad

Tu próxima fuente de ingresos podría estar en Avianca CFD
Empieza a ganar un segundo sueldo con Avianca CFD [Regístrate]
segundo ingreso | Patrocinado

P AÍS |

La IA que hace dinero: ¿por qué está causando tanto ruido en la web?
Empieza a ganar un segundo sueldo con IA cfd
Wnwrcby | Patrocinado

Cómo Operar ETH/USD Sin Poseer Ether
Aprenda cómo los CFDs de Ethereum le permiten especular sobre los movimientos de precios sin necesidad de almacenar monedas. Disfrute de cero comisiones, soporte en vivo y acceso a MT4, MT5, cTrader o TradingView.
IC | Patrocinado

De la Espriella ordena a Restrepo emprender acciones jurídicas por los supuestos acuerdos entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo
El Heraldo

De la Espriella lanza advertencia a Iván Cepeda tras llamado a la desobediencia civil: “Todo lo que esté por fuera de la ley será enfrentado”
El Heraldo

Los Índices Globales Están en Movimiento — ¡Es Hora de Operar!
Dow, DAX, FTSE, S&P y más — opere los mayores índices del mundo con herramientas premium, cero comisiones y ejecución rápida.Operar con derivados implica un alto riesgo para su capital.
IC | Patrocinado

Bogotá: Consultar el valor de cualquier propiedad al instante por dirección
WonderMapped | Patrocinado

Aprende a invertir con inteligencia artificial como un profesional
Tu próxima fuente de ingresos podría estar en la inteligencia artificial.
Wnwrcby | Patrocinado

‘Es un gravísimo atentado contra la democracia y un berrinche antidemocrático’: Restrepo sobre llamado de Cepeda a la “desobediencia civil”
El Heraldo

Liberada liquidación de perfumes importados en Bogotá
mejorentrega | Patrocinado

WonderMapped | Patrocinado

Colombianos aprovechan liquidación de perfumes importados (50% off)
mejorentrega | Patrocinado

Publicar un clasificado ó edicto

EL HERALDO

EL HERALDO S.A. Prohibida la reproducción y utilización, total o parcial, de los contenidos en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo su mera reproducción y/o puesta a disposición con fines comerciales, directa o indirectamente lucrativos. 2000 - 2024 ©

Síguenos en redes:

Portada del día



Noticia del día

Barranquilla aumenta su capital verde con bonos sostenibles

SUSCRÍBETE
Desde $30.000

Portadas pasadas

Ver portada

SECCIONES
REGIÓN CARIBE
SOCIEDAD
NUESTROS PORTALES
Términos y condiciones
Contactenos

Dirección: Cra. 46 #85-26 piso 5 | Servicio al cliente: (+57) (605) 322 5199 | WhatsApp: (+57) 321 832 7990 | Clasificados: (+57) 301 586 7966 | Publicidad: (+57) 321 541 9954 | Barranquilla - Atlántico | Bogotá: (+57) 320 498 2967

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA


Miembro de: ami

facebook

Iniciar sesión

Video Inicio En vivo Reels Explorar

Buscar videos

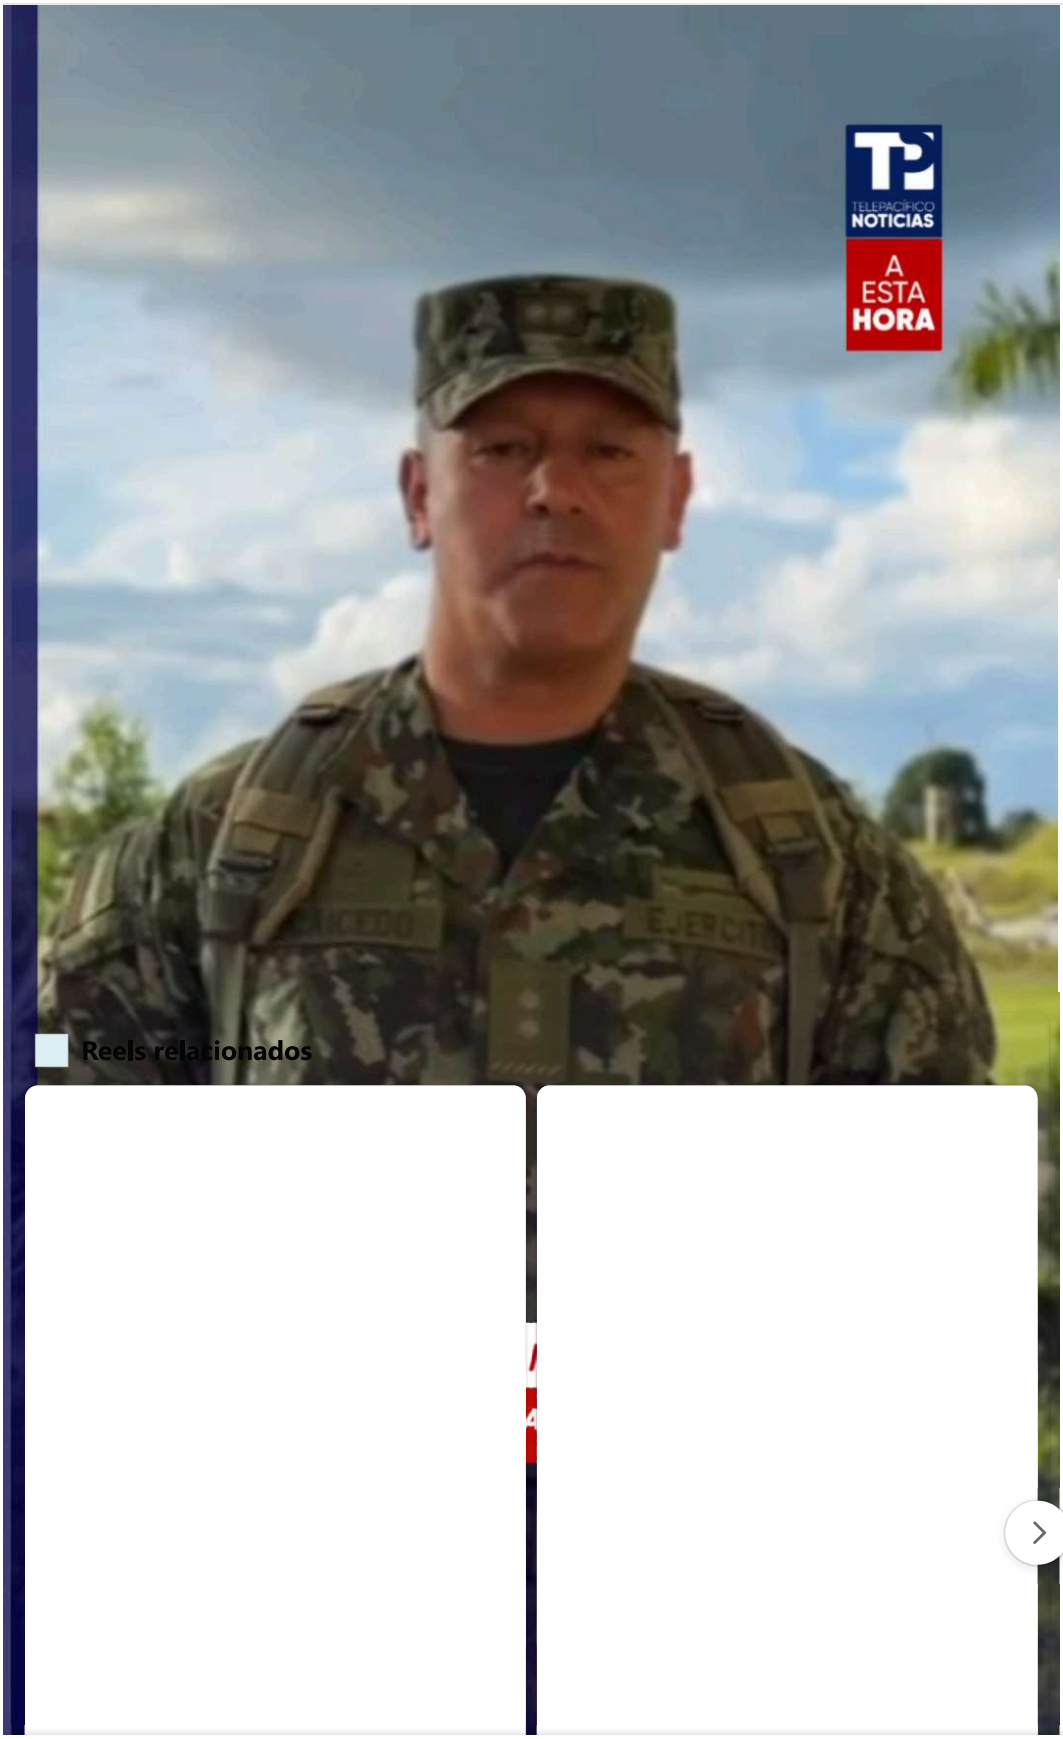

Telepacífico Noticias
7 de julio a las 12:01 pm

Seguir

Continúan las afectaciones al orden públi
Chocó. En la vía Quibdó–Medellín fueron
reportadas banderas atribuidas al ELN y,
manera preliminar, la presunta instalació
explosivos sobre la carretera, situación qu
verificada por las autoridades.

A estos hechos se suma que, durante la n
lunes, drones sobrevolaron nuevamente l
estación de Policía de Tadó. Aunque no s
una detonación, el hecho generó temor e
habitantes.

Las autoridades mantienen las labores de
verificación y recomiendan a los usuarios
atender únicamente la información oficia
las indicaciones de la Fuerza Pública

Ver menos

Más relevantes

Jose Otero
Eso es la pas total q se espera ma
gente
2 sem

Suldery Rios
Paz total
2 sem

Ver más comentarios

Reels relacionados

Inicio En vivo

Explorar

Privacidad · Condiciones · Publicidad · Opcione
anuncios · Cookies · Más

Inicia sesión o regístrate en Facebook para conectarte con amigos, familiares y personas que conoces.

Iniciar sesión o Crear cuenta nueva

facebook

Iniciar sesión

Video Inicio En vivo Reels Explorar



1:02

#OrdenPúblico | Autoridades intensifican la búsqueda de cuatro uniformados de la Policí...
Telepacífico Noticias 360
2 mil visualizaciones · 1 h ago



1:38

EmergenciaSanitaria | La empresa Refinal suspendió la recolección y el procesamiento ...
Telepacífico Noticias 360
2,8 mil visualizaciones · 2 h ago



0:37

#Telepacífico38Años | En el marco de la celebración de sus 38 años de historia,...
Telepacífico Noticias 360
583 visualizaciones · 2 h ago



1:37

#Cultura | Cali vivió una nueva jornada de "borondo" por el emblemático barrio San...
Telepacífico Noticias 360
3,3 mil visualizaciones · 8 h ago



1:06

#Justicia | Cientos de ciudadanos marcharon en Cali para exigir celeridad en la investigación...
Telepacífico Noticias 360
21,6 mil visualizaciones · 9 h ago



1:38

#Región | La preservación de los manglares en el Pacífico colombiano resulta clave para el...
Telepacífico Noticias 360
2,1 mil visualizaciones · 10 h ago



1:26

#Inseguridad | Crece la preocupación en el Valle del Cauca por el hallazgo recurrente de...
Telepacífico Noticias 360
29,6 mil visualizaciones · 11 h ago



1:44

Una familia en Cali denuncia la desaparición de Jheyns Stivenson Rodríguez en Rusia, tras...
Telepacífico Noticias 360
14,1 mil visualizaciones · 15 h ago



Inicia sesión o regístrate en Facebook para conectarte con amigos, familiares y personas que conoces.

Iniciar sesión o Crear cuenta nueva

facebook

Iniciar sesión

Video Inicio En vivo Reels Explorar

Páginas ■ Empresas ■ Medio de comunicación/noticias ■ Telepacífico Noticias 360 ■ Videos ■

Ver transcripción ■

Inicia sesión o regístrate en Facebook para conectarte con amigos, familiares y personas que conoces.

Iniciar sesión o Crear cuenta nueva

LA PATRIA
LUNES, 27 DE JULIO

SUCESOS 04 JUL, 2026

Tensión en el occidente del Eje Cafetero: atacan con drones estación de policía en corregimiento

Varios ataques con drones se han registrado en Santa Cecilia, corregimiento de Pueblo Rico en el occidente de Risaralda. Las autoridades han atendido varios hechos en esa zona.

REDACCIÓN JUDICIAL

Compartir en: Google News



Foto | Captura de pantalla | LA PATRIA | PEREIRA |

En las últimas horas se han presentado banderas del Eln cerca a Pueblo Rico, cilindros de gas en la vía Risaralda - Chocó y ataques con drones en esa zona.

Escuchar resumen de la nota

00:30

En las últimas horas Pueblo Rico (Risaralda) ha vivido varias situaciones de orden público, que han generado temor entre los habitantes del municipio.

Desde el viernes 3 de julio, **se han presentado al menos tres eventos que involucran intimidaciones,** mensajes en lugares públicos y ataques contra instalaciones policiales.

En la vía **fueron vistas banderas alusivas al Eln,** en la noche hubo objetos, al parecer explosivos, en una parte **de la carretera que comunica a Santa Cecilia,** y en la mañana del sábado 4 de julio, se han registrado ataques con drones a la estación de policía del corregimiento.

Según el medio AhInformación, conductores que transitaban por el occidente del departamento **avistaron una bandera del grupo guerrillero** cerca al casco urbano del municipio.

Luego**, en la vía que comunica a Risaralda con el Chocó,** conductores también observaron lo que parecían ser dos cilindros de gas con las insignias del grupo armado, **restringiendo el paso entre ambos departamentos.**

El Ejército hizo presencia en la zona en la noche del viernes, **retiró la bandera y además desactivó los cilindros que bloqueaba el paso.**

Sin embargo, a pesar de las acciones durante la noche para garantizar la normalidad en la zona, en la madrugada s**e registraron ataques con drones en Santa Cecilia.**

Información extraoficial indica que al menos han ocurrido dos ataques, **uno a las 6:00 a.m., y otro cerca de las 7:30 a.m.,** en la estación de policía de Santa Cecilia, el corregimiento que limita con Tadó (Chocó).

A pesar de la ofensiva criminal no se han reportado heridos, **ni personas afectadas por los ataques armados.**

Hasta el momento las autoridades del departamento no han entregado mayor información sobre lo que viene sucediendo en el occidente de Risaralda en las últimas horas.

Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.

Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, X, Spotify, TikTok y en nuestro canal de WhatsApp, para que reciba noticias de última hora y más contenidos.

Etiquetas: PUEBLO RICO (RISARALDA) EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (ELN) EJÉRCITO NACIONAL

NOTICIAS RELACIONADAS



SUCESOS

A mototaxista desaparecido en el Centrosur de Caldas hace 4 días lo hallaron muerto

03 Jul, 2026

La IA que hace dinero: ¿por qué está causando tanto ruido en la web?

Empieza a ganar un segundo sueldo con IA cfd

Wnwrcby | Patrocinado

Más información

Aprende a invertir con inteligencia artificial como un profesional

Tu próxima fuente de ingresos podría estar en la inteligencia artificial.

Wnwrcby | Patrocinado

Más información

Ataque sicarial en la vía Pereira - Manizales: en zona de obras de segunda calzada asesinaron una persona

A las 10:00 a.m., del lunes 27 de julio sicarios asesinaron a un hombre que se movilizaba sobre la vía Pereira- Manizales. La víctima falleció en el lugar del ataque

Tu próxima fuente de ingresos podría estar en Avianca CFD

Empieza a ganar un segundo sueldo con Avianca CFD [Regístrate]

segundo ingreso | Patrocinado

Solicita ahora

Más que una tarjeta

Es tu tranquilidad en cada momento

BBVA CO | Patrocinado

Solicítala ya

Cómo Operar ETH/USD Sin Poseer Ether

Aprenda cómo los CFDs de Ethereum le permiten especular sobre los movimientos de precios sin necesidad de almacenar monedas. Disfrute de cero comisiones, soporte en vivo ...

IC | Patrocinado

Más información

A hombre le dispararon y lo hirieron cerca de una avenida de Manizales

El lugar se llenó rápidamente de policías. El lesionado recibió los impactos en cabeza y pierna.

Este Podría Ser el Mejor Momento para Operar Con Oro en 5 Años

Acceda al mercado del oro con un apalancamiento de hasta 1:1000 y spreads ajustados. Registro rápido. Sin comisiones ocultas.Operar con derivados implica un alto riesgo para su...

IC | Patrocinado

Más información

Bogotá: Consultar el valor de cualquier propiedad al instante por dirección

WonderMapped | Patrocinado

Más información

Liberada liquidación de perfumes importados en Bogotá

mejorentrega | Patrocinado

Motociclista pierde la vida tras choque en vía de municipio de Caldas, otras dos personas resultaron heridas

Motociclista pierde la vida tras choque en vía de municipio de Caldas, otras dos personas resultaron heridas

Bogotá: Consulta el valor de cualquier casa al instante por dirección

WonderMapped | Patrocinado

Más información

Liquidación de perfumes importados viraliza en Colombia por bajos precios

mejorentrega | Patrocinado

¿Rostro caído? Olvida el colágeno. Haz esto por la noche (muy fácil)

Piel Renovada | Patrocinado

Identifican a víctima de homicidio en Villamaría: salió de la cárcel hace 25 días

Jhon Alexánder García Álzate, de 41 años de edad, el asesinado.

Carros usados a cuotas sin Datacrédito: soluciones para 2026

Visionary Echo | Patrocinado

Más información

Apartamentos sin cuota inicial: pagos mensuales asequibles

Visionary Echo | Patrocinado

Más información

Truco japonés para reducir la apnea del sueño (¡es genial!)

Sueño Perfecto | Patrocinado

Sufrió infarto tras incendio en su finca y murió: llamas consumieron estancia y un carro al norte de Caldas

José Gustavo Echeverry Peláez murió en Manizales, luego de que sufrió un infarto. Un incendio destruyó parte de su propiedad en Pácora.

Todos querían salir con ella en los 80, pero ahora es difícil incluso mirarla.

One Daily | Patrocinado

LA PATRIA

Manizales (principal)

Dirección: Carrera 20 # 46 - 35
Teléfonos: (606) 893 28 80 - (606) 878 17 00

Bogotá

Cel: 321 812 24 68

Medellín

Cel: 320 727 36 38

Chinchiná

311 334 82 24

Tú también haces parte de La Patria. ¡Hablemos!

Escríbenos y haz parte de una comunidad que informa, participa y transforma. Porque tu voz también construye la noticia.

Contactar por Whatsapp

Nuestros aliados

MANIZALES cómovamos

ami

Nuestros portales

Q'hubo

Regístrate al boletín

Nombre

Tu correo electrónico

Celular

Acepto la política de privacidad

Registrarme

El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones, Políticas de privacidad y Política de uso de Cookies de LA PATRIA S.A.

Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited.

Copyright 2026 | Desarrollo web por micoworker

facebook

Iniciar sesión

Publicación de Pereira En Vivo

Pereira En Vivo

6 de julio a las 7:56 pm ·

CIERRAN LA VÍA PEREIRA - QUIBDÓ POR LOS NUEVOS 4T4QU3S DEL ELN

Las autoridades confirmaron el cierre de la vía Pereira - Quibdó debido a los nuevos 4t4qu3s atribuidos al ELN, que durante este lunes volvieron a generar graves alteraciones del orden público en el departamento del Chocó.

Según confirmó la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, el grupo armado bloqueó este importante corredor vial mientras se registraban combates en la zona. Además, también se reportaron 4t4qu3s con explosivos lanzados desde drones contra una estación de Policía en el municipio de Río Iró.

Las autoridades mantienen presencia militar y policial en el corredor mientras intentan recuperar el control y garantizar las condiciones de seguridad para reabrir la carretera. Por ahora, se recomienda a los viajeros aplazar sus desplazamientos hacia el departamento del Chocó hasta que la situación sea normalizada.

La gobernadora advirtió que la ofensiva del ELN continúa y pidió al Gobierno Nacional fortalecer las operaciones de la Fuerza Pública para contener esta nueva escalada de violencia. #pereiraenvivo



facebook

Iniciar sesión
