FECHA: Julio de 2026

PARA: **Doctor JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR**
Director General CARDER

DE: **Ingeniero JOSE WILLIAM VELEZ SANTA**
Profesional Especializado Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

Contrato de	Interventoría				
Contrato No.	948	De fecha:	18/11/2025		
Suscrito con:	INGENIRYA S.A.S				
Objeto:	Interventoría para la construcción de las obras de saneamiento y mitigación, para control de inundaciones en el municipio de la virginia fase II.				
Plazo de ejecución inicial:	195 DIAS				
Indicar si el contrato o convenio ha presentado modificaciones, otrosí o cesiones:	**ACTA DE SUSPENSION 1 20/01/2026** **ACTA DE REINICIO 1 20/02/2026** **ACTA DE SUSPENSION 2 20/02/2026** **ACTA DE REINICIO 2 24/03/2026**				
Fecha Acta de Inicio:	18/11/2025				
Fecha de terminación:	31/07/2026				
Valor total inicial del contrato:	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.L ($ 192.573.942,00)				
Valor con adiciones: (en los casos que aplique)	N.A				
Garantías:	SI (_X_) NO (___)				
Valor ejecutado a la fecha:	$ 59.860.392				
Porcentaje de ejecución a la fecha:	Física		Presupuestal		
	40%		40%		
Estado actual del contrato:	Vigente (_X_)		Sin Acta de inicio: (__)		Suspendido: (__)
En caso de estar suspendido indicar:	Término de suspensión: NA		Fecha de reinicio: NA		dd/mm/aa NA
Última acta de Supervisión – Interventoría efectuada:	Tipo de acta:		Número de Acta:		Fecha del acta:
	PARCIAL		2		06/04/2026
Si el contrato es en desarrollo de otro contrato o convenio indicar N° de éste, vigencia, y fecha de finalización. De lo contrario indicar N/A	No. contrato		Vigencia		Fecha de finalización
	NA		NA		NA

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y/O PRORROGA:

Teniendo en cuenta que el plazo contractual actual tiene como fecha de vencimiento el próximo **17 de julio de 2026** en obra y del **31/07/2026** en interventoría, se requiere de esta ampliación para establecer como nueva fecha estimada o aproximada de terminación el **30 de septiembre de 2026**.

Esta solicitud se fundamenta en situaciones imprevistas, ajenas a la voluntad del contratista, tipificadas como causales de fuerza mayor y dificultades técnicas no imputables a nuestra

ejecución durante la construcción e interventoría de los **24 metros lineales (24 ml) de Túnel Liner**, las cuales se sustentan detalladamente a continuación:

Anexo Técnico Justificatorio

1. Condiciones Climáticas Adversas y Afectación al Frente del Túnel (Fuerza Mayor)

- **Sustento Técnico:** Durante el periodo de ejecución, las intensas lluvias incrementaron drásticamente la infiltración de agua en el subsuelo y elevaron el nivel freático en la zona de inserción del túnel.
- **Impacto en Ingeniería:** En un proceso de excavación manual para **Túnel Liner**, el aumento de la presión hidrostática del agua subterránea reduce la cohesión del suelo en el frente de ataque, generando un riesgo inminente de desprendimiento de carga, colapso de la bóveda antes del armado del anillo, o lavado del material de soporte.
- **Consecuencia Operativa:** Se debió suspender el avance de la excavación manual dentro del túnel para garantizar la vida del personal en espacio confinado. El tiempo se invirtió en estabilizar el frente de excavación y operar sistemas de agotamiento de acuíferos mediante bombeo continuo, ralentizando los rendimientos estándar.

2. Colmatación Severa de Box Coulvert Existente e Inundación de la Fosa de Lanzamiento

- **Sustento Técnico:** El Box Coulvert existente que debía evacuar las aguas de escorrentía de la zona de trabajos presentó una colmatación crítica por sedimentos y lodos compactos que obstruían su sección útil.
- **Impacto en Ingeniería:** Al no funcionar este drenaje, se generó un efecto de remanso que provocó el reflujo e inundación total de la **fosa de lanzamiento (portal de entrada)** del Túnel Liner. Un túnel inundado imposibilita cualquier labor de excavación manual y montaje de chapas de acero estructural bajo condiciones seguras.
- **Consecuencia Operativa:** Parálisis total del frente del túnel. El personal debió evacuar el área confinada y concentrarse de manera imprevista en el bombeo de achique de la fosa de lanzamiento, así como en la limpieza y descolmatación manual de la estructura hidráulica taponada para poder reiniciar de forma segura la excavación subterránea.

3. Interferencia y Rediseño con Tubería de Drenaje Novafort de Ø 36" de la Madre Vieja

- **Sustento Técnico:** Al avanzar con la excavación manual y el armado de los anillos de acero de los **24 ml del Túnel Liner**, se confrontó la posición de la tubería de drenaje de PVC de pared estructural tipo Novafort de 36 pulgadas de diámetro (Ø 36") contemplada en los planos iniciales. Sin embargo, al contrastar el diseño con la realidad del terreno, se evidenció una interferencia física geométrica crítica (colisión de cotas de clave/batea o proximidad milimétrica) entre el contorno del túnel y la tubería flexible.
- **Impacto en Ingeniería:** Debido a que el Túnel Liner modifica los esfuerzos del suelo circundante durante su excavación manual, la extrema cercanía o interferencia con la tubería Novafort de 36" ponía en riesgo inminente este drenaje vital de la Madre Vieja por aplastamiento, deformación o pérdida de confinamiento, con la consecuente amenaza de inundación para el municipio.

- **Consecuencia Operativa:** Se ordenó la suspensión inmediata de la excavación manual e instalación de chapas del túnel en ese sector. Fue estrictamente necesario paralizar el frente subterráneo para realizar levantamientos topográficos de precisión y tramitar ante la interventoría **INGENIERYA S.A.S.** un rediseño hidráulico y geométrico que permitiera recalcular el alineamiento, pendientes o cotas del sistema para salvar la interferencia de manera segura sin afectar la funcionalidad del drenaje.

Resumen de la Distribución del Tiempo Solicitado

Con el fin de facilitar la evaluación de la Interventoría, los sesenta (60) días solicitados se indexan técnicamente bajo la siguiente distribución estimada de afectación en obra:


Ítem	Descripción del Evento / Imprevisto	Plazo Solicitado
1	Afectación por condiciones climáticas adversas, nivel freático y manejo de lodos	**20 días**
2	Labores de bombeo, evacuación e inundación de fosa de lanzamiento por Box Coulvert	**15 días**
3	Suspensión, levantamiento topográfico y rediseño de cotas por interferencia con Novafort de ø 36"	**25 días**
-	**TOTAL PLAZO DE PRÓRROGA SOLICITADO**	**60 días**

Cabe precisar que tanto la adición como la prórroga están respaldadas en los estudios previos iniciales y en el marco normativo vigente, incluyendo el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con lo contenido en el Manual de Supervisión e Interventoría CARDER, que autorizan modificaciones al contrato en razón de la necesidad del servicio y del interés público como pilares sustantivos que rigen al estatuto general de la Contratación Pública.

Finalmente, se considera jurídica, técnica y económicamente viable proceder con la Prorroga y la Adición en virtud la necesidad actual que demanda el presente proceso, con el propósito de dar continuidad a las actividades encomendadas, en miras a asegurar el cumplimiento de los objetivos Misionales, Institucionales y de índole Administrativo de este ente Ambiental.

Como soporte de la presente solicitud, se anexan a este oficio los registros fotográficos correspondientes.



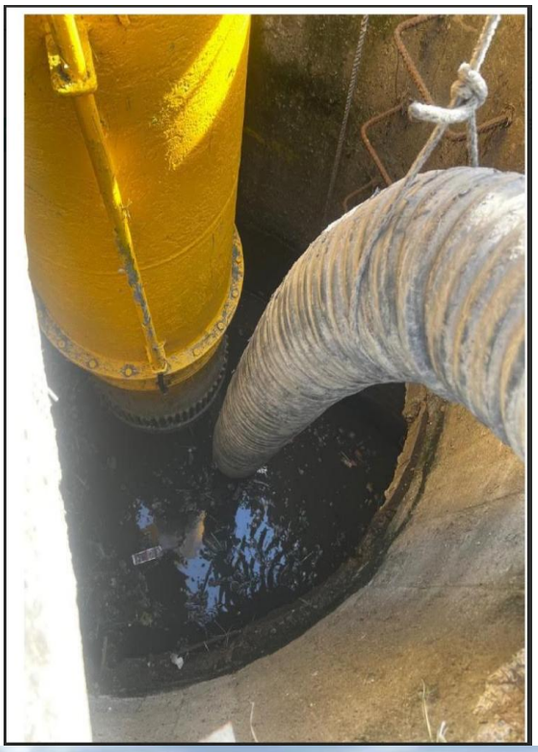



3. TIPO DE SOLICITUD:

Tiempo:	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
Dinero:	**$ 30.954.599.00**
Obligaciones específicas y/o alcances:	Siguen siendo las establecidas en el contrato inicial de obra firmado entre las partes, las cuales guardan relación con la adecuada entrega de las aguas de la Madrevieja al río Risaralda mediante la adecuación del paso de tuberías por

	debajo del jarillón del sector de Alfonso López y la bomba en perfecto funcionamiento.

De acuerdo al siguiente cuadro de ajuste de actividades a saber:

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO Y MITIGACIÓN, PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA FASE II. .

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	948-2025	FECHA INICIO	18/11/2025
CONTRATISTA	INGENIERYA SAS	FECHA TERMINACION INICIAL	31/05/2025
NIT.	901.507.519-6	SUPENSION N°1	20/01/2026
VALOR INICIAL DE INTERVENTORIA	$ 192.573.942,00	SUSPENSION N°2	20/02/2026
PLAZO INICIAL (MESES)	6,5 MESES	REINICIO SUSPENSIONES	24/03/2026
PLAZO DE PRORROGA N°1 A SOLICITAR	2 MESES	FECHA DE INICIO DE PRORROGA A SOLICITAR	1/08/2026
PLAZO TOTAL	8,5 MESES	NUEVA FECHA DE TERMINACION	30/09/2026

BALANCE No.01 (ADICIÓN PARA PRORROGA N°1)

$ 30.954.599,00

CONDICIONES GENERALES CONTRATADAS						MODIFICACIONES			ADICION N°1		ACUMULADO	
1.Personal Profesional de planilla												
	unidad	SUELDO (MES)	DEDICACION (MES)	N° MESES	VR PARCIAL	+/-	CANT	VALOR	No. MESES	VALOR PARCIAL	No. MESES	VALOR TOTAL
Director de Interventoría	mes	$ 7.000.000,00	0,86	6,5	$ 39.095.530,97	-	0,00	$ -	0,00	$ -	6,50	$ 39.095.530,97
Residente de Interventoria	mes	$ 4.500.000,00	0,50	6,0	$ 13.500.000,00	+	2,00	$ 4.500.000,00	2,00	$ 4.500.000,00	8,00	$ 18.000.000,00
				SUBTOTAL	$ 52.595.530,97			$ 4.500.000,00		$ 4.500.000,00		$ 57.095.530,97
				FACTOR MULTIPLICADOR	2,04			2,04		$ 2,04		$ 2,04
				TOTAL PERSONAL DE PLANILLA	$ 107.505.265,31			$ 9.198.000,00		$ 9.198.000,00		$ 116.703.265,31
2. Personal Técnico y de Planilla												
Secretaria o aux administrativo	mes	$ 1.423.500,00	1,00	6,5	$ 9.252.750,00	+	2,00	$ 2.847.000,00	2,00	$ 2.847.000,00	8,50	$ 12.099.750,00
				SUBTOTAL	$ 9.252.750,00			$ 2.847.000,00		$ 2.847.000,00		$ 12.099.750,00
				FACTOR MULTIPLICADOR	2,04			2,04		$ 2,04		$ 2,04
				TOTAL PERSONAL DE PLANILLA	$ 18.912.621,00			$ 5.819.268,00		$ 5.819.268,00		$ 24.731.889,00
3. Asesores												
Ingeniero civil Asesor en geotécnica y/o patologia de la construcción	mes	$ 7.000.000,00	0,20	2,0	$ 2.800.000,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.800.000,00
Profesional en el área de Salud Ocupacional	mes	$ 3.500.000,00	1,00	6,0	$ 21.000.000,00	+	2,00	$ 7.000.000,00	2,00	$ 7.000.000,00	8,00	$ 28.000.000,00
Ingeniero civil especialista en estructuras	mes	$ 7.000.000,00	0,14	1,0	$ 1.013.955,71	-	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.013.955,71
Trabajador Social y/o psicologo	mes	$ 4.000.000,00	0,40	6,0	$ 9.600.000,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 9.600.000,00
				SUBTOTAL	$ 34.413.955,71			$ 7.000.000,00		$ 7.000.000,00		$ 41.413.955,71
4. Costos Directos Reembolsables												
Comunicaciones (teléfono, celular, internet, etc.)	Según Factura	$ 1.500.000,00	0,00	6,0	$ -	+	2,00	$ 3.000.000,00	2,00	$ 3.000.000,00	8,00	$ 3.000.000,00
Edición informes	Un	$ 995.000,00	0,50	2,0	$ 995.000,00	+	2,00	$ 995.000,00	2,00	$ 995.000,00	4,00	$ 1.990.000,00
				SUBTOTAL	$ 995.000,00			$ 3.995.000,00		$ 3.995.000,00		$ 4.990.000,00
				COSTOS DIRECTOS	$ 161.826.842,02			$ 26.012.268,00		$ 26.012.268,00		$ 187.839.110,00
				IVA (19%)	$ 30.747.099,98			$ 4.942.331,00		$ 4.942.331,00		$ 35.689.432,00
				PRESUPUESTO TOTAL DE INTERVENTORIA	$ 192.573.942,00			$ 30.954.599,00		$ 30.954.599,00		$ 223.528.542,00

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 192.573.942,00
ADICION N°1	$ 30.954.599,00
SUMAS IGALES	$ 223.528.541,00

JOSE HIRMIDES CASILIMAS BUENO
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERYA SAS

JOSE WILLIAM PEREZ SANTA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
CARDER

4. IMPUCACIÓN PRESUPUESTAL:

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD y SUBACTIVIDAD	VALOR ($)
1.3203. Gestión integral del recurso hídrico.	**1.1.** Planificación y administración para la gestión del recurso hídrico	**ACTIVIDAD 4:** Gestión para la calidad del recurso hídrico. **SUBACTIVIDAD 1.** Mejorar la calidad del recurso hídrico	$30.954.599 **Rec.20**

JOSE WILLIAM VELEZ SANTA
Profesional Especializado Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial
Supervisor Contrato 948-2025

NATALY MARÍA GÓMEZ RODRIGEZ
Subdirector de gestión ambiental Sectorial

LUIS ALBERTO SILVA JARAMILLO
Subdirector de gestión ambiental Territorial

Aprobado:

JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

Revisó: Juan Pablo Castaño Ocampo
Abogado Especialista
OAJ-CPS-009-2026

ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA
N° 2 Parcial

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE RECIBO: 06/04/2026

Tipo de documento: Contrato **Número:** 948 2025 **Clase:** INTERVENTORIA

Origen: **CONCURSO DE MERITOS** **Fecha Elaboración:** 11/11/2025 **Fecha Legalización:** 18/11/2025

Fecha de Inicio: 18/11/2025 **Fecha Terminación:** 31/07/2026

Objeto: Interventoría para la construcción de las obras de saneamiento y mitigación, para control de inundaciones en el municipio de la virginia fase II.

PERIODO DE PAGO: 18/11/2025 **AL** 17/01/2026

CONTRATO

Vr efectivo del contrato:	$192,573,942.00
Adiciones en efectivo:	$0.00
Contrato + Adiciones:	$192,573,942.00
Aporte Efectivo Otros:	$0.00
Ejecutado actas anteriores:	$0.00
Ejecutado esta acta:	$59,860,392.00
Saldo por ejecutar:	$132,713,550.00

Vr especie del contrato: **$0.00**

ANTICIPO

Vr entregado:	$57,772,183.00
Vr amortizado antes de acta:	$0.00
Amortización esta acta:	$17,958,118.00
Pendiente de amortizar:	$39,814,065.00

PAGO ESTA ACTA

Vr ejecutado:	$59,860,392.00
Vr menos amortización anticipo:	$17,958,118.00
Vr a cancelar presente acta:	$41,902,274.00

Vr total del contrato: **$192,573,942.00**

Concepto de pago
Parcial de las labores ejecutadas

Observaciones
Planillas Nos 35678696, 7995914233, 36137663, 7997961662

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
901507519	INGENIERYA S.A.S	N	C

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066400	LA VIRGINIA

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 1.320 GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO
Proyecto: 1.1 Planificación y administración para la gestión del recurso hídrico
Actividad: 4 Gestión para la calidad del recurso hídrico
Subactividad: 1 Mejorar la calidad del recurso hídrico

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1468	03/10/2025	$138,992,489.00	1503	2219	$138,992,489.00

Programa: 7.320 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE CARDER EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA GE
Proyecto: 7.1 Gestión del Riesgo de Desastres
Actividad: 2 Reducción del riesgo de desastres
Subactividad: 2 Implementar acciones, intervenciones y obras para la reducción del riesgo de puntos que cuenten con estudios y d

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1468	03/10/2025	$53,581,453.00	1503	2219	$53,581,453.00

El 06/04/2026 se reunieron los abajo firmantes para recibir a satisfacción.

ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA
N° 2 Parcial

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE RECIBO: 06/04/2026

Interventor / Supervisor
10120905 **JOSE WILLIAM VELEZ SANTA**

Contratista
901507519 **INGENIERYA S.A.S**

Elaborado por: Jose William Velez Santa
Impreso por: Jose William Velez Santa

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

OBJETO:

ADICION al Contrato 948 – 2025, cuyo objeto es: Interventoría para la construcción de las obras de saneamiento y mitigación, para control de inundaciones en el municipio de La Virginia fase II.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

No. y NOMBRE DEL PROGRAMA: 1.3203. Gestión integral del recurso hídrico

CÓDIGO y NOMBRE DEL PROYECTO: 1.1. Planificación y administración para la gestión del recurso hídrico

No. y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD y SUBACTIVIDAD **PLAN DE ACCIÓN**	**CÓDIGO PRESUPUESTO** **06-3202**	**TIEMPO: Marque con X** **Días calendario (X)** **Días hábiles ( )** **Meses ()**	**VALOR ($)**
ACTIVIDAD 4: Gestión para la calidad del recurso hídrico. **Subactividad 1.** Mejorar la calidad del recurso hídrico	2.3.2.2.2.4.2.4 Entidades de Gobierno General.	60	$30.954.599 **Rec.20**

SUPERVISOR / INTERVENTOR SUGERIDO

JOSÉ WILLIAM VÉLEZ SANTA
SUPERVISOR
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SGAS

Nataly M Gómez R.

NATALY MARÍA GÓMEZ RODRIGEZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL

JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR
Director General

ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Recurso Presupuestal : 20

No. Ficha: 980 Fecha. Julio 30 de 2026

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER

NIT. 891410354-4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **985**
Fecha de Vencimiento 28/10/2026
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.026 **Fecha de Expedición:** 30 jul 2026

Objeto: ADICION al Contrato 948 - 2025, cuyo objeto es: Interventoría para la construcción de las obras de saneamiento y mitigación, para control de inundaciones en el municipio de La Virginia fase II. SOLICITUD 980
Solicitante: NATALY GOMEZ - JOSE VELEZ

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversion Vigencia 2026 3215 - 2.3.100.3203.11.4.2.4 - 20	ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	30.954.599,00
	TOTAL CERTIFICADO	30.954.599,00

Viviana Quintero H.

VIVIANA QUINTERO HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

ADICIÓN Y/O PRÓRROGA No. 001 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 948 DE 2025 (CONCURSO DE MERITOS 069-2025), CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER E INGENIERYA S.A.S

Entre los suscritos a saber: **LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER**, identificada con el NIT 891.410.354-4, representada legalmente por el señor **JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR**, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.110.976 expedida en Pereira, en su calidad de Director General, designado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo de la Corporación No. 020 del 11 de diciembre de 2023, posesionado según Acta de Posesión No. 001 del 1 de enero de 2024, quien para efectos del presente documento y en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATANTE o LA CARDER**; e **INGENIERYA S.A.S,** identificada con el NIT número 901,507,519-6, quien para los efectos del presente Contrato se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente **Adición y/o prórroga al Contrato de Interventoría No. 948 de 2025**, previas las consideraciones que a continuación se estipulan y las contenidas en la solicitud de adición de julio de 2026, suscrita por el supervisor del contrato, el Subdirector de Gestión Ambiental territorial, el Subdirector de gestión ambiental Sectorial y aprobada por la Dirección General de la CARDER: **a)** Que LA CARDER suscribió con INGENIERYA S.A.S, el Contrato de No. 948 de 2025, cuyo objeto es: « Interventoría para la construcción de las obras de saneamiento y mitigación, para control de inundaciones en el municipio de la virginia fase II.»; **b)** Que se hace necesario adicionar el contrato según lo relacionado en la justificación de la solicitud de adición anexa. **c) -** Que para asumir el valor del adicional existe el certificado de disponibilidad presupuestal No. 985 del 30 de julio de 2026**.** Que, como consecuencia de lo anterior, se requiere suscribir el presente adicional en los siguientes términos: **CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar al valor inicial del Contrato No. 948 de 2025, por un valor de **TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($30.954.599). CLÁUSULA SEGUNDA:** Prorrogar el plazo inicial estipulado en el Contrato No. 948 de 2025, en **SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO** más, contados a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución. **CLÁUSULA TERCERA:** EL CONTRATISTA se compromete a ampliar la vigencia de los riesgos amparados en la garantía única, incrementando a cada uno de dichos riesgos establecidos en las **"GARANTIAS"** del

contrato y según lo acordado anteriormente. **CLÁUSULA CUARTA:** Los gastos de legalización que llegare a generar el contrato modificatorio serán cubiertos por EL CONTRATISTA. **CLÁUSULA QUINTA- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente adicional será cancelada por LA CARDER a EL CONTRATISTA con cargo al Programa: 1.3203. Gestión integral del recurso hídrico, Proyecto: 1.1, de acuerdo con la Solicitud de Disponibilidad Presupuestal No. 980 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 985 Identificación Presupuestal 3215 - 2.3.100.3203.11.4.2.4–20, de la vigencia 2026**.** **CLÁUSULA SEXTA:** Las demás estipulaciones contractuales contenidas en el Contrato aquí citado, continuarán vigentes y no sufren modificación alguna. Para constancia se firma en Pereira (R), a los

Proyectó: Lis Gómez

Revisó: Paula Andrea Murillo Taborda
Profesional Especializado
