	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/07/2026
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1932 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024
(Dia / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/07/2026
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026.
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 4.990.584.396,00 **50% EN SMMLV:** $ 1.919,46
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.990.584.396
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Teniendo en cuenta que no se han ejecutado a la fecha la totalidad de los recursos asignados al contrato de Administración Vial, mediante memorando 2026I-VBOG-030454 la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales solicito la documentación requerida para la modificación y prorroga de los mismos hasta el 31 de diciembre de 2026, realizando la redistribución de los recursos no ejecutados por medio de acta de modificacion No. 3.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Todas las actividades correspondientes a la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Meta, Grupo AMV 3, Lote 1, contempladas en el Contrato No. 1932 de 2024, se desarrollan mediante el ejercicio de funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, dirección, coordinación, seguimiento y control de las actividades rutinarias, periódicas y demás acciones orientadas a garantizar la adecuada y oportuna conservación de los siguientes corredores viales:

Ruta 6508 – Cruce Puerto Rico–Ye de Granada: PR0+0000 al PR103+0900.
Ruta 65A02 – Uribe–Ye de Granada: PR0+0000 al PR109+0821.
Ruta 65MTA – Paso por Puerto Lleras: PR0+0000 al PR14+0000.
Ruta 65MTB – Paso por Puerto Limón: PR0+0000 al PR1+0200.
Ruta 65MTC – Paso por Puerto Santander: PR2+0200 al PR3+0000.
Ruta 65MTD – Paso por Puerto Aljure: PR0+0000 al PR4+0110.
Ruta 65AMTA – Paso por Puerto Caldas: PR0+0000 al PR3+0900.
Ruta 65AMTB – Acceso al puente Guillermo León Valencia: PR0+0000 al PR2+0840.
Ruta 65AMTC – Acceso a Granada: PR0+0000 al PR1+0300.

El alcance de las actividades se encuentra establecido en los pliegos de condiciones y en el anexo técnico que forman parte integral del contrato. En términos generales, se realiza la actualización permanente de la información técnica de los corredores viales, la cual es incorporada en los diferentes sistemas de información del Instituto Nacional de Vías —INVIAS—, permitiendo a la entidad adoptar decisiones técnicas, administrativas y presupuestales relacionadas con la infraestructura vial a su cargo y con la priorización de las inversiones de los recursos asignados.

De igual manera, se efectúan actividades de planeación, control, seguimiento y evaluación de las labores ejecutadas por los trabajadores de mano de obra no calificada dispuestos en los diferentes frentes de trabajo para la prestación del servicio de mantenimiento rutinario. Asimismo, se monitorean y coordinan las acciones requeridas para la atención de emergencias, puntos críticos y demás eventos que se presenten sobre las vías, con el propósito de garantizar la transitabilidad y seguridad de los usuarios, así como mitigar oportunamente los efectos ocasionados por condiciones climáticas, afectaciones naturales u otros eventos que puedan incidir en la operación de los corredores viales.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/07/2026
(Día / Mes / Año)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1 Descripción	Valor total inicial	Valor total actualizado - Última modificación de costos No. 02 de Fecha: 08/01/2026	Valor variación (Mayores o menores)	Valor actualizado presente solicitud
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	$ 1.056.899.000,00	$ 893.291.965,00	$ 115.688.575,00	$ 1.008.980.540,00
FACTOR MULTIPLICADOR	2,40	2,40	2,40	2,40
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 2.536.557.600,00	$ 2.143.900.716,00	$ 277.652.580,00	$ 2.421.553.296,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 765.058.000,00	$ 697.798.490,00	$ 829.034.226,00	$ 1.526.832.716,00
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)	$ 537.370.000,00	$ 373.621.000,00	-$ 181.190.000,00	$ 192.431.000,00
Costo basico (D) = (A) + (B) + (C)	$ 3.838.985.600,00	$ 3.215.320.206,00	$ 925.496.806,00	$ 4.140.817.012,00
Provision (E)	$ 354.782.800,00	$ 978.448.194,00	-$ 925.496.806,00	$ 52.951.388,00
Subtotal (D) + (E) = (F)	$ 4.193.768.400,00	$ 4.193.768.400,00	$ -	$ 4.193.768.400,00
IVA = 19% * (F) = (G)	$ 796.815.996,00	$ 796.815.996,00	$ -	$ 796.815.996,00
Costo Total = (F) + (G) = (H)	$ 4.990.584.396,00	$ 4.990.584.396,00	$ -	$ 4.990.584.396,00

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Junio (mes anterior a la presente solicitud) de 2026 (año) $ 2.864.040.996,60

Último mes facturado: Junio del 2026 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 2.126.543.399,40 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N.A.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

El supervisor del contrato ve viable la solicitud elevada por el contratista de Administración Vial para la **modificación y** prórroga del contrato No.1932 de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026 en virtud de que se disponen recursos y se requiere seguir atendiendo las sectores a cargo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	4/07/2026
	(Día / Mes / Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

1) Formato ACPA-FR-1 2) Comunicación solicitud del contratista 3) Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 4) Paquete de garantías 5) Acta(s) de modificación de costos 6) Constancia actualización de aplicativos suscrita por el supervisor del contrato.

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: **RUBEN ISAZA PALACIO**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No. 05202-197804 ANT

Firma

Nombre: **FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula No. 70202232984 TLM

Vo.Bo.Firma

Nombre: **LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE**
Director Territorial

Vo.Bo.Firma: N/A

Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: **ALEJANDRO SALINAS CRISTANCHO**
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Firma

Nombre: **CARLOS ANDREZ MENDOZA RONDON**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 68202-092436 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	4/07/2026
	(Día / Mes / Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

1) Formato ACPA-FR-1 2) Comunicación solicitud del contratista 3) Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 4) Paquete de garantías 5) Acta(s) de modificación de costos 6) Constancia actualización de aplicativos suscrita por el supervisor del contrato.

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría

Firma
Nombre: **RUBEN ISAZA PALACIO**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No. 05202-197804 ANT

Firma
Nombre: **FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula No. 70202232984 TLM

Vo.Bo.Firma
Nombre: **LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE**
Director Territorial

Vo.Bo.Firma: N/A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: **ALEJANDRO SALINAS CRISTANCHO**
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **CARLOS ANDREZ MENDOZA RONDON**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 68202-092436 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

Granada, 01 julio 2026

CE-1932-2024-298

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Calle 25G # 73B - 90 - Complejo Empresarial Central Point l Bogotá D.C. - Colombia
atencionciudadano@invias.gov.co


Referencia: CONTRATO No. 1932 de 2024 Objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1

Asunto: Solicitud Prorroga No.1 Contrato No. 1932-2024 - Administración Vial G3

Cordial saludo:

Atendiendo el **Memorando Individual No. 2026I-VBOG-030454 del 04 de mayo de 2026**, mediante el cual se solicitó la documentación previa para prorrogar los contratos de **Administración Vial** hasta el plazo máximo posible dentro de la vigencia 2026, se realizó el balance financiero del **Contrato No. 1932 de 2024**, considerando los saldos no ejecutados de las vigencias **2024 y 2025**, así como la redistribución de los recursos correspondientes a la vigencia **2026**.
El balance efectuado permitió evidenciar que el contrato cuenta con recursos suficientes para garantizar su ejecución hasta el **31 de diciembre de 2026**, **sin necesidad de adición de recursos**. En consecuencia, se hace necesario modificar de forma articulada la **Cláusula Sexta – Valor del Contrato** y la **Cláusula Séptima – Apropiación Presupuestal**, con el fin de consolidar la discriminación de recursos en las grandes partidas del contrato, sin alterar su valor total ni los montos aprobados por vigencia.
Así mismo, se verificó que **el contratista** cuenta con la logística, el personal y el equipo requeridos para dar continuidad a las actividades contractuales hasta el **31 de diciembre de 2026**.

Atentamente,



Ruben Isaza Palacios
R/L COINZA SAS.

Anexo: Lo enunciado
c.c. Archivo

Fecha: 2026-06-16 10:49:00
Radicado: 2026I-VMET-045452
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 1 (1 Tabla Externos)

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VMET-045452
Fecha: 2026-06-16 10:49:00

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
DIRECCIÓN TERRITORIAL META

Asunto: Solicitud de prorroga del contrato AMV No. 1932-2024, Grupo 03, DT MET

Respetado ingeniero,

Con base en la solicitud realizada por medio del comunicado No. 2026I-VBOG-043491 del 09/06/2026 nos permitimos remitir:

- Formato ACPA-FR-1
- Comunicado No. CE-1932-2024-298 con la solicitud del administrador vial.
- Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1
- Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13
- Comunicado No. 2024S-VMET-040612 del 21/06/2024.
- Certificado de supervisor del contrato de la actualización de los aplicativos.

Se adjuntan los formatos MEPI-MN1-IN-13-FR-1 y MEPI-MN1-IN-9-FR-1 teniendo en cuenta que los enviados previamente por medio del comunicado No. 2026I-VMET-032329 del 07/05/2026 el acumulado en la ejecución del contrato se encontraba hasta el mes de abril de 2026, por lo cual se reenvían actualizando la ejecución al último mes de facturación.

Cordialmente,

LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
Directora Territorial Meta

Proyectado por: Fabian Andres Ortiz Colmenares
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: JAIRO ANDRES PAEZ HERRERA ()

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932-2024

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS – COINZA ING S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

FECHA DE INICIO: 5/07/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.990.584.396,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.990.584.396,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 499.058.439,60	7	6	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 998.116.879,20	7	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.497.175.318,80	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100231914

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 26/06/2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	N/A	N/A		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A		
Calidad del servicio	N/A	N/A		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma _____
Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Firma _____
Nombre: FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202232984 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Qr/s06/kqZWnluacqnS5Dw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100231914	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14890529	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/06/2024	24:00 Horas Del	31/07/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S.	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.164.885-3
DIRECCIÓN	CL 40 81 A 132	**TELÉFONO**	4137967
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.1932 DE 2024 , CUYO OBJETO ES

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO POR TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 07/06/2024	24:00 Horas Del 31/01/2027	499.058.439,60	2.382.355,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 07/06/2024	24:00 Horas Del 31/07/2029	998.116.879,20	7.711.478,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 31/07/2026	24:00 Horas Del 31/01/2029	1.497.175.318,80	6.755.747,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.994.350.637,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
IDEAR SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	16.849.580,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	16.849.580,00
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	3.202.902,20
TOTAL A PAGAR	$	20.060.282,20

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100231914	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14890529	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/06/2024	24:00 Horas Del	31/07/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)

1. RIESGOS AMPAROS

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:
(I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO;
(II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y
(III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLEALCONTRATISTAGARANTIZADO, DERIVADOSDE UNPROCESODERESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

seguros mundial® tu compañía siempre

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).
2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.
2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.
2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

4. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERÍODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERÍODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.

LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁN DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO OBSERVARAN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARA A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN, ACOMPAÑANDO EL INFORME DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE SE SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARA LAS NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSISTA EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;

B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO REPRESENTE, Y AL GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD;

C) HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE LO OCURRIDO EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO

ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA MISMA AUDIENCIA;

D) EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO DE LA CESACIÓN DE SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

7. COMPENSACIÓN

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, FUERE DEUDORA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARA LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

8. PAGO DEL SINIESTRO.

LA ASEGURADORA PAGARA EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

8.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

8.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

8.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

PARÁGRAFO. - DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TOME POSESIÓN DE LA OBRA O CONTINÚE INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ GARANTÍAS.

9. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

10. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

11. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

12. NATURALEZA DEL SEGURO

LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN.

13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

14. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRO LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS

15. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

16. PRESCRIPCIÓN

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

17. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS_____DÍAS DEL MES DE_____DE 20____

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	**EL TOMADOR/ASEGURADO**

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100231914** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **11/06/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **11** días del mes **JUNIO** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Al contestar cite este radicado: 2024S-VMET-040612
Fecha: 2024-06-21 16:54:56

Señor (a):
CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS - COINZA ING SAS

CLL 40 81A 132 OFI 401
3113083033
coinza.sas@hotmail.com
MEDELLÍN ANTIOQUIA

Asunto: APROBACION POLIZA 1932-2024

Cordial Saludo:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios, se comunica que en la fecha se imparte aprobación a la Garantía Única de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales: Cumplimiento del Contrato, Pago de Salarios, Prestaciones Sociales y Calidad del servicio, según Póliza No. M-100231914 anexo 0, expedida el 11/06/2024, por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., la póliza de cumplimiento fue expedida conforme del contrato No. 1932 de 2024, objeto ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV3 LOTE 1 y Cuyos amparos son:

AMPAROS	INICIA LA VIGENCIA	TERMINA LA VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	07/06/2024	31/01/2027	$ 499.058.439,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENNIZACIONES LAB.	07/06/2024	31/07/2029	$ 998.116.879,20
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$ 1.497.175.318,80

Atentamente,

Carlos German Corzo Upegui
DIRECTOR TERRITORIAL META (E)

Proyectado Por: CLAUDIA ESPERANZA ROMERO VILLAR
Revisado Por:
Aprobado Por:

Copia Interna a: WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO (1000017)
Copia Externa a: RUBEN ISAZA PALACIO (CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS - COINZA ING SAS)

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.04.24 15:46:17 -05:00

Código de Seguridad: fBBACzROgtxzy3kJfBPxeg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100231914	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	15070287	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/04/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/06/2024	24:00 Horas Del	31/07/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S.	**No. DOC. IDENTIDAD**	901164885-3
DIRECCIÓN	CL 40 81 A 132	**TELÉFONO**	4137967
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800215807-2
DIRECCIÓN	CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23, MANIZALES, CALDAS, COLOMBIA	**TELÉFONO**	68982444
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800215807-2
DIRECCIÓN	CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23, MANIZALES, CALDAS, COLOMBIA	**TELÉFONO**	68982444

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ORDEN DE INICIO AL CONTRATO 1932 DE 2024 AMV 3, SE ACLARA: SE IMPARTE LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO A PARTIR DEL 05 DE JULIO DE 2024.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.1932 DE 2024 , CUYO OBJETO ES

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO POR TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 07/06/2024	24:00 Horas Del 31/01/2027	499.058.439,60	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 07/06/2024	24:00 Horas Del 31/07/2029	998.116.879,20	0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 31/07/2026	24:00 Horas Del 31/01/2029	1.497.175.318,80	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 2.994.350.637,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
IDEAR SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/07/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100231914	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	15070287	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/04/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/06/2024	24:00 Horas Del	31/07/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100231914** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS ,** expedida por la Compañía en **24/04/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **24** días del mes **ABRIL** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha: 2026-06-26 08:21:16
Radicado: 2026I-VBOG-049317
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 0

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-049317
Fecha: 2026-06-26 08:21:16

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA
SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Asunto: Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-044207

Respetado Ingeniero Carlos Andrés Mendoza

En atención al memorando de la referencia, me permito informarle que el trámite de revisión y aprobación de la póliza al contrato No.1932 de 2024, fue aprobado en la Plataforma SECOP II el día 25 de junio de 2026

Cordialmente,

ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA
Subdirectora de Gestion Contractual Y Procesos Admin

Proyectado por: Soledad Angela Castro Orjuela
Revisado por: César Fruto Corredor Gomez
Aprobado por:

Copia Interna a:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 21/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
RESOLUCIÓN No.: 3 DE 27/02/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (n meses según contrato princip)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4 990 584 396.00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	MODIFICACIONES CONDICIONES ACTA ANTERIOR TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	PRESENTES +/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.10 de fecha 02 de mayo de 2025 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6 996 000.00	$ 400 000	10.00	$ 73 960 000.00					-	4.14	$ 30 619 440.00	5.86	$ 43 340 560.00	5.86	$ 43 340 560.00
			$ 7 416 000.00	$ 450 000	12.00	$ 94 392 000.00								4.00	$ 31 464 000.00	12.00	$ 94 392 000.00
			$ 7 860 000.00	$ 500 000	7.00	$ 58 520 000.00										7.00	$ 58 520 000.00
2	1	Ingeniero Residente	$ 6 996 000.00	$ 400 000	10.00	$ 73 960 000.00					-	4.14	$ 30 619 440.00	5.86	$ 43 340 560.00	5.86	$ 43 340 560.00
			$ 7 416 000.00	$ 450 000	12.00	$ 94 392 000.00								4.00	$ 31 464 000.00	12.00	$ 94 392 000.00
			$ 7 860 000.00	$ 500 000	7.00	$ 58 520 000.00										7.00	$ 58 520 000.00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4 452 000.00	$ 400 000	10.00	$ 48 520 000.00					-	4.14	$ 20 087 280.00	5.86	$ 28 432 720.00	5.86	$ 28 432 720.00
			$ 4 720 000.00	$ 450 000	12.00	$ 62 040 000.00								4.00	$ 20 680 000.00	12.00	$ 62 040 000.00
			$ 5 100 000.00	$ 500 000	7.00	$ 39 200 000.00										7.00	$ 39 200 000.00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3 074 000.00	$ 400 000	10.00	$ 34 740 000.00					-	4.14	$ 14 382 360.00	5.86	$ 20 357 640.00	5.86	$ 20 357 640.00
			$ 3 260 000.00	$ 450 000	12.00	$ 44 520 000.00								4.00	$ 14 840 000.00	12.00	$ 44 520 000.00
			$ 3 500 000.00	$ 500 000	7.00	$ 28 000 000.00										7.00	$ 28 000 000.00
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7 410 000.00			$ 45 000 000.00					-		$ 41 295 000.00	0.50	$ 3 705 000.00	0.50	$ 3 705 000.00
			$ 7 860 000.00			$ 55 000 000.00											$ 55 000 000.00
			$ 8 600 000.00			$ 40 000 000.00											$ 40 000 000.00
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	Inspector SISO	$ 2 280 000.00		10.00	$ 22 800 000.00					-	4.14	$ 9 439 200.00	5.86	$ 13 360 800.00	5.86	$ 13 360 800.00
			$ 2 415 000.00		12.00	$ 28 980 000.00								4.00	$ 9 660 000.00	12.00	$ 28 980 000.00
			$ 2 565 000.00		7.00	$ 17 955 000.00										7.00	$ 17 955 000.00
7	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1 438 000.00		10.00	$ 14 380 000.00					-	4.14	$ 5 953 320.00	5.86	$ 8 426 680.00	5.86	$ 8 426 680.00
			$ 1 525 000.00		12.00	$ 18 300 000.00								4.00	$ 6 100 000.00	12.00	$ 18 300 000.00
			$ 1 700 000.00		7.00	$ 11 900 000.00										7.00	$ 11 900 000.00
8	2	Conductor	$ 1 500 000.00		10.00	$ 30 000 000.00					-	4.14	$ 12 420 000.00	5.86	$ 17 580 000.00	5.86	$ 17 580 000.00
			$ 1 590 000.00		12.00	$ 38 160 000.00								4.00	$ 12 720 000.00	12.00	$ 38 160 000.00
			$ 1 690 000.00		7.00	$ 23 660 000.00										7.00	$ 23 660 000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 1 056 899 000.00**							**$ 164 816 040.00**		**$ 305 471 960.00**		**$ 892 082 960.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2.4**							**2.40**		**2.40**		**2.4**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 2 536 557 600.00**							**$ 395 558 496.00**		**$ 733 132 704.00**		**$ 2 140 999 104.00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIERO RESIDENTE	$ 330 000.00	DIA	10.00	$ 6 600 000.00					-	3.50	$ 2 310 000.00	6.50	$ 4 290 000.00	6.50	$ 4 290 000.00
			$ 349 000.00	DIA	10.00	$ 6 980 000.00					+	4.00	$ 2 792 000.00	5.50	$ 3 839 000.00	14.00	$ 9 772 000.00
			$ 370 000.00	DIA	10.00	$ 7 400 000.00										10.00	$ 7 400 000.00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6 750 000.00	MES	10.00	$ 135 000 000.00					-	4.14	$ 55 890 000.00	5.86	$ 79 110 000.00	5.86	$ 79 110 000.00
			$ 7 200 000.00	MES	12.00	$ 172 800 000.00								4.00	$ 57 600 000.00	12.00	$ 172 800 000.00
			$ 7 350 000.00	MES	7.00	$ 102 900 000.00										7.00	$ 102 900 000.00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56 000 000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 56 000 000.00					-	0.23	$ 12 880 000.00	0.77	$ 43 120 000.00	0.77	$ 43 120 000.00
			$ 67 000 000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 67 000 000.00					+		$ 33 500 000.00			1.00	$ 100 500 000.00
			$ 39 000 000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 39 000 000.00										1.00	$ 39 000 000.00
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6 837 000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 6 837 000.00					-	0.94	$ 6 426 780.00	0.06	$ 410 220.00	0.06	$ 410 220.00
			$ 7 250 000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 7 250 000.00								0.11	$ 797 500.00	1.00	$ 7 250 000.00
			$ 7 680 000.00	Global S/comprobante	1.00	$ 7 680 000.00										1.00	$ 7 680 000.00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2 120 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 21 200 000.00					-	4.37	$ 9 264 400.00	5.63	$ 11 935 600.00	5.63	$ 11 935 600.00
			$ 2 250 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 27 000 000.00								3.98	$ 8 955 000.00	12.00	$ 27 000 000.00
			$ 2 400 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 16 800 000.00										7.00	$ 16 800 000.00
14	1	Dotación de Oficina	$ 583 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 5 830 000.00					-	4.01	$ 2 337 830.00	5.99	$ 3 492 170.00	5.99	$ 3 492 170.00
			$ 618 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 7 416 000.00								4.00	$ 2 472 000.00	12.00	$ 7 416 000.00
			$ 650 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 4 550 000.00										7.00	$ 4 550 000.00
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 318 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 3 180 000.00					-	7.95	$ 2 528 100.00	2.05	$ 651 900.00	2.05	$ 651 900.00
			$ 335 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 4 020 000.00								0.55	$ 184 250.00	12.00	$ 4 020 000.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 21/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
RESOLUCIÓN No.: 3 DE 27/02/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (n meses según contrato princip)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4 990 584 396.00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
			$ 350 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 2 450 000.00										7.00	$ 2 450 000.00
16	1	Comunicaciones	$ 520 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 5 200 000.00					-	7.02	$ 3 650 400.00	2.98	$ 1 549 600.00	2.98	$ 1 549 600.00
			$ 590 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 7 080 000.00								1.76	$ 1 038 400.00	12.00	$ 7 080 000.00
			$ 590 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 4 130 000.00										7.00	$ 4 130 000.00
17	1	Capacitación microempresas	$ 690 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 6 900 000.00					-	4.00	$ 2 760 000.00	6.00	$ 4 140 000.00	6.00	$ 4 140 000.00
			$ 730 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 8 760 000.00								4.00	$ 2 920 000.00	12.00	$ 8 760 000.00
			$ 775 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 5 425 000.00										7.00	$ 5 425 000.00
18	1	Peajes	$ 640 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 6 400 000.00					-	8.60	$ 5 504 000.00	1.40	$ 896 000.00	1.40	$ 896 000.00
			$ 680 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 8 160 000.00								0.33	$ 224 400.00	12.00	$ 8 160 000.00
			$ 730 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 5 110 000.00										7.00	$ 5 110 000.00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 765 058 000.00**							**$ 67 259 510.00**		**$ 227 626 040.00**		**$ 697 798 490.00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL															
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 40 000 000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 40 000 000.00					-	1.00	$ 40 000 000.00			0.00	$ -
			$ 41 000 000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 41 000 000.00										1.00	$ 41 000 000.00
			$ 20 000 000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 20 000 000.00										1.00	$ 20 000 000.00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750 000.00	Km	140.00	$ 105 000 000.00					-	140.00	$ 105 000 000.00			0.00	$ -
			$ 795 000.00	Km	150.00	$ 119 250 000.00										150.00	$ 119 250 000.00
			$ 843 000.00	Km	155.00	$ 130 665 000.00										155.00	$ 130 665 000.00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3 192 000.00	Km	5.00	$ 15 960 000.00					-	5.00	$ 15 960 000.00			0.00	$ -
			$ 3 384 000.00	Km	5.00	$ 16 920 000.00										5.00	$ 16 920 000.00
			$ 3 587 000.00	Km	5.00	$ 17 935 000.00										5.00	$ 17 935 000.00
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6 300 000.00	global	1.00	$ 6 300 000.00					-	0.13	$ 819 000.00	0.87	$ 5 481 000.00	0.87	$ 5 481 000.00
			$ 6 900 000.00	global	1.00	$ 6 900 000.00										1.00	$ 6 900 000.00
			$ 7 080 000.00	global	1.00	$ 7 080 000.00										1.00	$ 7 080 000.00
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1 970.00	UNIDAD	2.00	$ 3 940 000.00					-	1.00	$ 1 970 000.00	1.00	$ 1 970 000.00	1.00	$ 1 970 000.00
			$ 2 100.00	UNIDAD	2.00	$ 4 200 000.00										2.00	$ 4 200 000.00
			$ 2 220.00	UNIDAD	1.00	$ 2 220 000.00										1.00	$ 2 220 000.00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION				**$ 537 370 000.00**							**$ 163 749 000.00**		**$ 7 451 000.00**		**$ 373 621 000**
		Ajuste por Acta de modificación															
	*	Costo basico (D) = (A) + (B) + (C)				**$ 3 838 985 600.00**							**$ (626 567 006.00)**		**$ 968 209 744.00**		**$ 3 212 418 594.00**
	*	Provision (E)				**$ 354 782 800.00**							**$ 626 567 006.00**				**$ 981 349 806.00**
	*	Subtotal (D) + (E) = (F)				**$ 4 193 768 400.00**							**$ -**		**$ 968 209 744.00**		**$ 4 193 768 400.00**
	*	IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 796 815 996.00**							**$ -**		**$ 183 959 851.36**		**$ 796 815 996.00**
	*	Costo Total = (F) + (G) = (H)				**$ 4 990 584 396.00**							**$ -**		**$ 1 152 169 595.36**		**$ 4 990 584 396.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4 193 768 400.00	$ 796 815 996.00	$ 4 990 584 396.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) FEBRERO 2025	$ 968 209 744.00	$ 183 959 851.36	$ 1 152 169 595.36
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 3 225 558 656.00	$ 612 856 144.64	$ 3 838 414 800.64

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29 MESES
ADICIONAL	
ACUMULADO	29 MESES
FALTANTE	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). REDISTRIBUCION DE RECURSOS POR NECESIDADES DEL CONTRATO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 21/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
RESOLUCIÓN No.: 3 DE 27/02/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL:	29 MESES (n meses según contrato princip	PLAZO ACUMULADO:	(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	5/07/2024 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	- (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	- (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**:	$ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	$ 4 990 584 396.00		

MODIFICACIONES

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Firma
Nombre: FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202232984 TLM

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Revisión:

Director Territorial — Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1 de 3 1
PÁGINA	
FECHA	08/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [x]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 DE 2024
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.
INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
RESOLUCIÓN No.: 3 DE 27/02/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (n meses según contrato princip)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	MODIFICACIONES CONDICIONES ACTA ANTERIOR TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	MODIFICACIONES PRESENTES TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.18 de fecha diciembre de 2025 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00			5,86	$ 43.340.560,00					5,86	$ 43.340.560,00	5,86	$ 43.340.560,00
			$ 7.416.000,00	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00			12,00	$ 94.392.000,00					12,00	$ 94.392.000,00	12,00	$ 94.392.000,00
			$ 7.860.000,00	$ 500.000	7,00	$ 58.520.000,00			7,00	$ 58.520.000,00							7,00	$ 58.520.000,00
2	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00			5,86	$ 43.340.560,00					5,86	$ 43.340.560,00	5,86	$ 43.340.560,00
			$ 7.416.000,00	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00			12,00	$ 94.392.000,00					12,00	$ 94.392.000,00	12,00	$ 94.392.000,00
			$ 7.860.000,00	$ 500.000	7,00	$ 58.520.000,00			7,00	$ 58.520.000,00							7,00	$ 58.520.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000,00	$ 400.000	10,00	$ 48.520.000,00			5,86	$ 28.432.720,00					5,86	$ 28.432.720,00	5,86	$ 28.432.720,00
			$ 4.720.000,00	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000,00			12,00	$ 62.040.000,00					12,00	$ 62.040.000,00	12,00	$ 62.040.000,00
			$ 5.100.000,00	$ 500.000	7,00	$ 39.200.000,00			7,00	$ 39.200.000,00							7,00	$ 39.200.000,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000,00	$ 400.000	10,00	$ 34.740.000,00			5,86	$ 20.357.640,00					5,86	$ 20.357.640,00	5,86	$ 20.357.640,00
			$ 3.260.000,00	$ 450.000	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00					12,00	$ 44.520.000,00	12,00	$ 44.520.000,00
			$ 3.500.000,00	$ 500.000	7,00	$ 28.000.000,00			7,00	$ 28.000.000,00							7,00	$ 28.000.000,00
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000,00			$ 45.000.000,00			0,50	$ 3.705.000,00					0,50	$ 3.705.000,00	0,50	$ 3.705.000,00
			$ 7.860.000,00			$ 55.000.000,00				$ 55.000.000,00								$ 55.000.000,00
			$ 8.600.000,00			$ 40.000.000,00				$ 40.000.000,00								$ 40.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	Inspector SISO	$ 2.280.000,00		10,00	$ 22.800.000,00			5,86	$ 13.360.800,00					5,86	$ 13.360.800,00	5,86	$ 13.360.800,00
			$ 2.415.000,00		12,00	$ 28.980.000,00			12,00	$ 28.980.000,00					12,00	$ 28.980.000,00	12,00	$ 28.980.000,00
			$ 2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000,00			7,00	$ 17.955.000,00							7,00	$ 17.955.000,00
7	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000,00		10,00	$ 14.380.000,00			5,86	$ 8.426.680,00					5,86	$ 8.426.680,00	5,86	$ 8.426.680,00
			$ 1.525.000,00		12,00	$ 18.300.000,00			12,00	$ 18.300.000,00					12,00	$ 18.300.000,00	12,00	$ 18.300.000,00
			$ 1.700.000,00		7,00	$ 11.900.000,00			7,00	$ 11.900.000,00	-	-7	$ (11.900.000,00)				0,00	$ -
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria (Ajuste SMMLV 2026)					$ 1.750.905,00				+	7	$ 12.256.335,00				7,00	$ 12.256.335,00
8	2	Conductor	$ 1.500.000,00		10,00	$ 30.000.000,00			5,86	$ 17.580.000,00					5,86	$ 17.580.000,00	5,86	$ 17.580.000,00
			$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000,00			12,00	$ 38.160.000,00					12,00	$ 38.160.000,00	12,00	$ 38.160.000,00
			$ 1.690.000,00		7,00	$ 23.660.000,00			7,00	$ 23.660.000,00	-	-7	$ (23.660.000,00)				0,00	$ -
	2	Conductor (Ajuste SMMLV 2026)					$ 1.750.905,00				+	7	$ 24.512.670,00				7,00	$ 24.512.670,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 1.056.899.000,00**				**$ 892.082.960,00**			**$ 1.209.005,00**			**$ 559.327.960,00**		**$ 893.291.965,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,4**				**2,4**			**2,40**			**2,40**		**2,4**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 2.536.557.600,00**				**$ 2.140.999.104,00**			**$ 2.901.612,00**			**$ 1.342.387.104,00**		**$ 2.143.900.716,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
9	2	INGENIERO RESIDENTE	$ 330.000,00	**DIA**	10,00	$ 6.600.000,00			6,50	$ 4.290.000,00				6,50	$ 4.290.000,00	6,50	$ 4.290.000,00
			$ 349.000,00	**DIA**	10,00	$ 6.980.000,00			14,00	$ 9.772.000,00				14,00	$ 9.772.000,00	14,00	$ 9.772.000,00
			$ 370.000,00	**DIA**	10,00	$ 7.400.000,00			10,00	$ 7.400.000,00						10,00	$ 7.400.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS														0,00	
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.750.000,00	**MES**	10,00	$ 135.000.000,00			5,86	$ 79.110.000,00				5,86	$ 79.110.000,00	5,86	$ 79.110.000,00
			$ 7.200.000,00	**MES**	12,00	$ 172.800.000,00			12,00	$ 172.800.000,00				12,00	$ 172.800.000,00	12,00	$ 172.800.000,00
			$ 7.350.000,00	**MES**	7,00	$ 102.900.000,00			7,00	$ 102.900.000,00						7,00	$ 102.900.000,00
		OTROS COSTOS														0,00	
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.000.000,00	**Global S/comprobante**	1,00	$ 56.000.000,00			0,77	$ 43.120.000,00				0,77	$ 43.120.000,00	0,77	$ 43.120.000,00
			$ 67.000.000,00	**Global S/comprobante**	1,00	$ 67.000.000,00			1,00	$ 100.500.000,00				0,14	$ 14.070.000,00	1,00	$ 100.500.000,00
			$ 39.000.000,00	**Global S/comprobante**	1,00	$ 39.000.000,00			1,00	$ 39.000.000,00						1,00	$ 39.000.000,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [-]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
RESOLUCIÓN No.: 3 DE 27/02/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (n meses según contrato princip)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.837.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.837.000,00			0,06	$ 410.220,00				0,06	$ 410.220,00	0,06	$ 410.220,00
			$ 7.250.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.250.000,00			1,00	$ 7.250.000,00				0,58	$ 4.205.000,00	1,00	$ 7.250.000,00
			$ 7.680.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.680.000,00			1,00	$ 7.680.000,00						1,00	$ 7.680.000,00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	MES s/comprobante	10,00	$ 21.200.000,00			5,63	$ 11.935.600,00				5,63	$ 11.935.600,00	5,63	$ 11.935.600,00
			$ 2.250.000,00	MES s/comprobante	12,00	$ 27.000.000,00			12,00	$ 27.000.000,00				11,98	$ 26.955.000,00	12,00	$ 27.000.000,00
			$ 2.400.000,00	MES s/comprobante	7,00	$ 16.800.000,00			7,00	$ 16.800.000,00						7,00	$ 16.800.000,00
14	1	Dotación de Oficina	$ 583.000,00	MES s/comprobante	10,00	$ 5.830.000,00			5,99	$ 3.492.170,00				5,99	$ 3.492.170,00	5,99	$ 3.492.170,00
			$ 618.000,00	MES s/comprobante	12,00	$ 7.416.000,00			12,00	$ 7.416.000,00				12,00	$ 7.416.000,00	12,00	$ 7.416.000,00
			$ 650.000,00	MES s/comprobante	7,00	$ 4.550.000,00			7,00	$ 4.550.000,00						7,00	$ 4.550.000,00
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 318.000,00	MES s/comprobante	10,00	$ 3.180.000,00			2,05	$ 651.900,00				2,05	$ 651.900,00	2,05	$ 651.900,00
			$ 335.000,00	MES s/comprobante	12,00	$ 4.020.000,00			12,00	$ 4.020.000,00				3,77	$ 1.262.950,00	12,00	$ 4.020.000,00
			$ 350.000,00	MES s/comprobante	7,00	$ 2.450.000,00			7,00	$ 2.450.000,00						7,00	$ 2.450.000,00
16	1	Comunicaciones	$ 520.000,00	MES s/comprobante	10,00	$ 5.200.000,00			2,98	$ 1.549.600,00				2,98	$ 1.549.600,00	2,98	$ 1.549.600,00
			$ 590.000,00	MES s/comprobante	12,00	$ 7.080.000,00			12,00	$ 7.080.000,00				5,25	$ 3.097.500,00	12,00	$ 7.080.000,00
			$ 590.000,00	MES s/comprobante	7,00	$ 4.130.000,00			7,00	$ 4.130.000,00						7,00	$ 4.130.000,00
17	1	Capacitación microempresas	$ 690.000,00	MES s/comprobante	10,00	$ 6.900.000,00			6,00	$ 4.140.000,00				6,00	$ 4.140.000,00	6,00	$ 4.140.000,00
			$ 730.000,00	MES s/comprobante	12,00	$ 8.760.000,00			12,00	$ 8.760.000,00				12,00	$ 8.760.000,00	12,00	$ 8.760.000,00
			$ 775.000,00	MES s/comprobante	7,00	$ 5.425.000,00			7,00	$ 5.425.000,00						7,00	$ 5.425.000,00
18	1	Peajes	$ 640.000,00	MES s/comprobante	10,00	$ 6.400.000,00			1,40	$ 896.000,00				1,40	$ 896.000,00	1,40	$ 896.000,00
			$ 680.000,00	MES s/comprobante	12,00	$ 8.160.000,00			12,00	$ 8.160.000,00				1,56	$ 1.060.800,00	12,00	$ 8.160.000,00
			$ 730.000,00	MES s/comprobante	7,00	$ 5.110.000,00			7,00	$ 5.110.000,00						7,00	$ 5.110.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 765.058.000,00**				**$ 697.798.490,00**			**$ -**		**$ 398.994.740,00**		**$ 697.798.490,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL															
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 40.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 40.000.000,00			0,00	$ -						0,00	$ -
			$ 41.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 41.000.000,00			1,00	$ 41.000.000,00						1,00	$ 41.000.000,00
			$ 20.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 20.000.000,00			1,00	$ 20.000.000,00						1,00	$ 20.000.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	3 de 3 1 .
PÁGINA	

FECHA: 08/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [-]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES

RESOLUCIÓN No.: 3 DE 27/02/2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (n meses según contrato princip)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	Km	140,00	$ 105.000.000,00			0,00	$ -								0,00	$ -				
			$ 795.000,00	Km	150,00	$ 119.250.000,00			150,00	$ 119.250.000,00								150,00	$ 119.250.000,00				
			$ 843.000,00	Km	155,00	$ 130.665.000,00			155,00	$ 130.665.000,00								155,00	$ 130.665.000,00				
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	Km	5,00	$ 15.960.000,00			0,00	$ -								0,00	$ -				
			$ 3.384.000,00	Km	5,00	$ 16.920.000,00			5,00	$ 16.920.000,00								5,00	$ 16.920.000,00				
			$ 3.587.000,00	Km	5,00	$ 17.935.000,00			5,00	$ 17.935.000,00								5,00	$ 17.935.000,00				
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.300.000,00	global	1,00	$ 6.300.000,00			0,87	$ 5.481.000,00						0,87	$ 5.481.000,00	0,87	$ 5.481.000,00				
			$ 6.900.000,00	global	1,00	$ 6.900.000,00			1,00	$ 6.900.000,00								1,00	$ 6.900.000,00				
			$ 7.080.000,00	global	1,00	$ 7.080.000,00			1,00	$ 7.080.000,00								1,00	$ 7.080.000,00				
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.970,00	UNIDAD	2,00	$ 3.940.000,00			1,00	$ 1.970.000,00						1,00	$ 1.970.000,00	1,00	$ 1.970.000,00				
			$ 2.100,00	UNIDAD	2,00	$ 4.200.000,00			2,00	$ 4.200.000,00								2,00	$ 4.200.000,00				
			$ 2.220,00	UNIDAD	1,00	$ 2.220.000,00			1,00	$ 2.220.000,00								1,00	$ 2.220.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION				**$ 537.370.000,00**				**$ 373.621.000,00**			**$ -**				**$ 7.451.000,00**		**$ 373.621.000**				
		Ajuste por Acta de modificación																					
		* Costo basico (D) = (A) + (B) + (C)				**$ 3.838.985.600,00**				**$ 3.212.418.594,00**			**$ 2.901.612,00**				**$ 1.748.832.844,00**		**$ 3.215.320.206,00**				
		* Provision (E)				**$ 354.782.800,00**				**$ 981.349.806,00**			**$ (2.901.612,00)**						**$ 978.448.194,00**				
		* Subtotal (D) + (E) = (F)				**$ 4.193.768.400,00**				**$ 4.193.768.400,00**			**$ -**				**$ 1.748.832.844,00**		**$ 4.193.768.400,00**				
		* IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 796.815.996,00**				**$ 796.815.996,00**			**$ -**				**$ 332.278.240,36**		**$ 796.815.996,00**				
		* Costo Total = (F) + (G) = (H)				**$ 4.990.584.396,00**				**$ 4.990.584.396,00**			**$ -**				**$ 2.081.111.084,36**		**$ 4.990.584.396,00**				

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4.193.768.400,00	$ 796.815.996,00	$ 4.990.584.396,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) DICIEMBRE 2025	$ 1.748.832.844,00	$ 332.278.240,36	$ 2.081.111.084,36
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2.444.935.556,00	$ 464.537.755,64	$ 2.909.473.311,64

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29 MESES
ADICIONAL	
ACUMULADO	29 MESES
FALTANTE	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Ajuste salarial de la auxiliar administrativa y conductores debido a que el salario previsto para el 2026 estaba por debajo del salario minimo del presente año

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Firma
Nombre: FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202232984 TLM

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firma
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: JAIME LEON BALLEN BUITRAGO — Matrícula Profesional No.: 25202-337905 CND — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
RESOLUCIÓN No.: 3 DE 27/02/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 24,86 MESES (n meses según contrato princip)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: 24,86 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.23 de fecha mayo de 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00			5,86	$ 43.340.560,00				5,86	$ 43.340.560,00	5,86	$ 43.340.560,00
			$ 7.416.000,00	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00			12,00	$ 94.392.000,00				12,00	$ 94.392.000,00	12,00	$ 94.392.000,00
			$ 7.860.000,00	$ 500.000	7,00	$ 58.520.000,00			7,00	$ 58.520.000,00	+	5	$ 41.800.000,00	5,00	$ 41.800.000,00	12,00	$ 100.320.000,00
2	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000	10,00	$ 73.960.000,00			5,86	$ 43.340.560,00				5,86	$ 43.340.560,00	5,86	$ 43.340.560,00
			$ 7.416.000,00	$ 450.000	12,00	$ 94.392.000,00			12,00	$ 94.392.000,00				12,00	$ 94.392.000,00	12,00	$ 94.392.000,00
			$ 7.860.000,00	$ 500.000	7,00	$ 58.520.000,00			7,00	$ 58.520.000,00	+	5	$ 41.800.000,00	5,00	$ 41.800.000,00	12,00	$ 100.320.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.452.000,00	$ 400.000	10,00	$ 48.520.000,00			5,86	$ 28.432.720,00				5,86	$ 28.432.720,00	5,86	$ 28.432.720,00
			$ 4.720.000,00	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000,00			12,00	$ 62.040.000,00				12,00	$ 62.040.000,00	12,00	$ 62.040.000,00
			$ 5.100.000,00	$ 500.000	7,00	$ 39.200.000,00			7,00	$ 39.200.000,00	+	5	$ 28.000.000,00	5,00	$ 28.000.000,00	12,00	$ 67.200.000,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.074.000,00	$ 400.000	10,00	$ 34.740.000,00			5,86	$ 20.357.640,00				5,86	$ 20.357.640,00	5,86	$ 20.357.640,00
			$ 3.260.000,00	$ 450.000	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00				12,00	$ 44.520.000,00	12,00	$ 44.520.000,00
			$ 3.500.000,00	$ 500.000	7,00	$ 28.000.000,00			7,00	$ 28.000.000,00	+	5	$ 20.000.000,00	5,00	$ 20.000.000,00	12,00	$ 48.000.000,00
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000,00			$ 45.000.000,00			0,50	$ 3.705.000,00				0,50	$ 3.705.000,00	0,50	$ 3.705.000,00
			$ 7.860.000,00			$ 55.000.000,00				$ 55.000.000,00	-		$ 55.000.000,00				$ -
			$ 8.600.000,00			$ 40.000.000,00				$ 40.000.000,00							$ 40.000.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	Inspector SISO	$ 2.280.000,00		10,00	$ 22.800.000,00			5,86	$ 13.360.800,00				5,86	$ 13.360.800,00	5,86	$ 13.360.800,00
			$ 2.415.000,00		12,00	$ 28.980.000,00			12,00	$ 28.980.000,00				12,00	$ 28.980.000,00	12,00	$ 28.980.000,00
			$ 2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000,00			7,00	$ 17.955.000,00	+	5	$ 12.825.000,00	5,00	$ 12.825.000,00	12,00	$ 30.780.000,00
7	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000,00		10,00	$ 14.380.000,00			5,86	$ 8.426.680,00				5,86	$ 8.426.680,00	5,86	$ 8.426.680,00
			$ 1.525.000,00		12,00	$ 18.300.000,00			12,00	$ 18.300.000,00				12,00	$ 18.300.000,00	12,00	$ 18.300.000,00
			$ 1.700.000,00		7,00	$ 11.900.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
		Auxiliar Administrativo o Secretaria (Ajuste SMMLV 2026)					$ 1.750.905,00		7,00	$ 12.256.335,00	+	5	$ 8.754.525,00	5,00	$ 8.754.525,00	12,00	$ 21.010.860,00
8	2	Conductor	$ 1.500.000,00		10,00	$ 30.000.000,00			5,86	$ 17.580.000,00				5,86	$ 17.580.000,00	5,86	$ 17.580.000,00
			$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000,00			12,00	$ 38.160.000,00				12,00	$ 38.160.000,00	12,00	$ 38.160.000,00
			$ 1.690.000,00		7,00	$ 23.660.000,00			0,00	$ -				0,00	$ -	0,00	$ -
		Conductor (Ajuste SMMLV 2026)					$ 1.750.905,00		7,00	$ 24.512.670,00	+	5	$ 17.509.050,00	5,00	$ 17.509.050,00	12,00	$ 42.021.720,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 1.056.899.000,00**				**$ 893.291.965,00**			**$ 115.688.575,00**		**$ 730.016.535,00**		**$ 1.008.980.540,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,4**				**2,4**			**2,40**		**2,40**		**2,4**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 2.536.557.600,00**				**$ 2.143.900.716,00**			**$ 277.652.580,00**		**$ 1.752.039.684,00**		**$ 2.421.553.296,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIERO RESIDENTE	$ 330.000,00	**DIA**	10,00	$ 6.600.000,00			6,50	$ 4.290.000,00				6,50	$ 4.290.000,00	6,50	$ 4.290.000,00
			$ 349.000,00	**DIA**	10,00	$ 6.980.000,00			14,00	$ 9.772.000,00				14,00	$ 9.772.000,00	14,00	$ 9.772.000,00
			$ 370.000,00	**DIA**	10,00	$ 7.400.000,00			10,00	$ 7.400.000,00	+	5,00	$ 3.700.000,00	4,00	$ 2.960.000,00	15,00	$ 11.100.000,00
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.750.000,00	**MES**	10,00	$ 135.000.000,00			5,86	$ 79.110.000,00				5,86	$ 79.110.000,00	5,86	$ 79.110.000,00
			$ 7.200.000,00	**MES**	12,00	$ 172.800.000,00			12,00	$ 172.800.000,00				12,00	$ 172.800.000,00	12,00	$ 172.800.000,00
			$ 7.350.000,00	**MES**	7,00	$ 102.900.000,00			7,00	$ 102.900.000,00	+	5,00	$ 73.500.000,00	5,00	$ 73.500.000,00	12,00	$ 176.400.000,00
		OTROS COSTOS															
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.000.000,00	**Global S/comprobante**	1,00	$ 56.000.000,00			0,77	$ 43.120.000,00				0,77	$ 43.120.000,00	0,77	$ 43.120.000,00
			$ 67.000.000,00	**Global S/comprobante**	1,00	$ 67.000.000,00			1,00	$ 100.500.000,00	-	0,86	$ 86.430.000,00	0,14	$ 14.070.000,00	0,14	$ 14.070.000,00
			$ 39.000.000,00	**Global S/comprobante**	1,00	$ 39.000.000,00			1,00	$ 39.000.000,00				0,95	$ 37.050.000,00	1,00	$ 39.000.000,00
		Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. (ajuste para 2026)		**Global S/comprobante**							+	21,44	$ 39.000.000,00			21,44	$ 836.067.976,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 3

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
RESOLUCIÓN No.: 3 DE 27/02/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 24,86 MESES (n meses según contrato princip)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: 24,86 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.837.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.837.000,00			0,06	$ 410.220,00				0,06	$ 410.220,00	0,06	$ 410.220,00
			$ 7.250.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.250.000,00			1,00	$ 7.250.000,00	-	0,42	$ 3.045.000,00	0,58	$ 4.205.000,00	0,58	$ 4.205.000,00
			$ 7.680.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.680.000,00			1,00	$ 7.680.000,00				0,38	$ 2.918.400,00	1,00	$ 7.680.000,00
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	MES s/comprobante	10,00	$ 21.200.000,00			5,63	$ 11.935.600,00				5,63	$ 11.935.600,00	5,63	$ 11.935.600,00
			$ 2.250.000,00	MES s/comprobante	12,00	$ 27.000.000,00			12,00	$ 27.000.000,00	-	0,02	$ 45.000,00	11,98	$ 26.955.000,00	11,98	$ 26.955.000,00
			$ 2.400.000,00	MES s/comprobante	7,00	$ 16.800.000,00			7,00	$ 16.800.000,00	+	5,00	$ 12.000.000,00	5,00	$ 12.000.000,00	12,00	$ 28.800.000,00
14	1	Dotación de Oficina	$ 583.000,00	MES s/comprobante	10,00	$ 5.830.000,00			5,99	$ 3.492.170,00				5,99	$ 3.492.170,00	5,99	$ 3.492.170,00
			$ 618.000,00	MES s/comprobante	12,00	$ 7.416.000,00			12,00	$ 7.416.000,00				12,00	$ 7.416.000,00	12,00	$ 7.416.000,00
			$ 650.000,00	MES s/comprobante	7,00	$ 4.550.000,00			7,00	$ 4.550.000,00	+	5,00	$ 3.250.000,00	5,00	$ 3.250.000,00	12,00	$ 7.800.000,00
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 318.000,00	MES s/comprobante	10,00	$ 3.180.000,00			2,05	$ 651.900,00				2,05	$ 651.900,00	2,05	$ 651.900,00
			$ 335.000,00	MES s/comprobante	12,00	$ 4.020.000,00			12,00	$ 4.020.000,00	-	8,23	$ 2.757.050,00	3,77	$ 1.262.950,00	3,77	$ 1.262.950,00
			$ 350.000,00	MES s/comprobante	7,00	$ 2.450.000,00			7,00	$ 2.450.000,00				1,71	$ 598.500,00	7,00	$ 2.450.000,00
16	1	Comunicaciones	$ 520.000,00	MES s/comprobante	10,00	$ 5.200.000,00			2,98	$ 1.549.600,00				2,98	$ 1.549.600,00	2,98	$ 1.549.600,00
			$ 590.000,00	MES s/comprobante	12,00	$ 7.080.000,00			12,00	$ 7.080.000,00	-	6,75	$ 3.982.500,00	5,25	$ 3.097.500,00	5,25	$ 3.097.500,00
			$ 590.000,00	MES s/comprobante	7,00	$ 4.130.000,00			7,00	$ 4.130.000,00				2,34	$ 1.380.600,00	7,00	$ 4.130.000,00
17	1	Capacitación microempresas	$ 690.000,00	MES s/comprobante	10,00	$ 6.900.000,00			6,00	$ 4.140.000,00				6,00	$ 4.140.000,00	6,00	$ 4.140.000,00
			$ 730.000,00	MES s/comprobante	12,00	$ 8.760.000,00			12,00	$ 8.760.000,00				12,00	$ 8.760.000,00	12,00	$ 8.760.000,00
			$ 775.000,00	MES s/comprobante	7,00	$ 5.425.000,00			7,00	$ 5.425.000,00	+	5,00	$ 3.875.000,00	5,00	$ 3.875.000,00	12,00	$ 9.300.000,00
18	1	Peajes	$ 640.000,00	MES s/comprobante	10,00	$ 6.400.000,00			1,40	$ 896.000,00				1,40	$ 896.000,00	1,40	$ 896.000,00
			$ 680.000,00	MES s/comprobante	12,00	$ 8.160.000,00			12,00	$ 8.160.000,00	-	10,44	$ 7.099.200,00	1,56	$ 1.060.800,00	1,56	$ 1.060.800,00
			$ 730.000,00	MES s/comprobante	7,00	$ 5.110.000,00			7,00	$ 5.110.000,00				0,53	$ 386.900,00	7,00	$ 5.110.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 765.058.000,00**				**$ 697.798.490,00**			**$ 31.966.250,00**		**$ 536.914.140,00**		**$ 1.526.832.716,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL															
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 40.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 40.000.000,00			0,00	$ -						0,00	$ -
			$ 41.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 41.000.000,00			1,00	$ 41.000.000,00	-	1,00	$ 41.000.000,00			0,00	$ -
			$ 20.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 20.000.000,00			1,00	$ 20.000.000,00						1,00	$ 20.000.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 DE 2024
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.
INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
RESOLUCIÓN No.: 3 DE 27/02/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 24,86 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: 24,86 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

												MODIFICACIONES								
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	Km	140,00	$ 105.000.000,00			0,00	$ -							0,00	$ -
			$ 795.000,00	Km	150,00	$ 119.250.000,00			150,00	$ 119.250.000,00	-	150,00	$ 119.250.000,00				0,00	$ -
			$ 843.000,00	Km	155,00	$ 130.665.000,00			155,00	$ 130.665.000,00							155,00	$ 130.665.000,00
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	Km	5,00	$ 15.960.000,00			0,00	$ -							0,00	$ -
			$ 3.384.000,00	Km	5,00	$ 16.920.000,00			5,00	$ 16.920.000,00	-	5,00	$ 16.920.000,00				0,00	$ -
			$ 3.587.000,00	Km	5,00	$ 17.935.000,00			5,00	$ 17.935.000,00							5,00	$ 17.935.000,00
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6.300.000,00	global	1,00	$ 6.300.000,00			0,87	$ 5.481.000,00				0,87	$ 5.481.000,00		0,87	$ 5.481.000,00
			$ 6.900.000,00	global	1,00	$ 6.900.000,00			1,00	$ 6.900.000,00	-	1,00	$ 6.900.000,00				0,00	$ -
			$ 7.080.000,00	global	1,00	$ 7.080.000,00			1,00	$ 7.080.000,00				1,00	$ 7.080.000,00		1,00	$ 7.080.000,00
		Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas (ajuste para 2026)		global							+	1,00	$ 7.080.000,00				1,00	$ 7.080.000,00
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.970,00	UNIDAD	2,00	$ 3.940.000,00			1,00	$ 1.970.000,00				1,00	$ 1.970.000,00		1,00	$ 1.970.000,00
			$ 2.100,00	UNIDAD	2,00	$ 4.200.000,00			2,00	$ 4.200.000,00	-	2,00	$ 4.200.000,00				0,00	$ -
			$ 2.220,00	UNIDAD	1,00	$ 2.220.000,00			1,00	$ 2.220.000,00				1,00	$ 2.220.000,00		1,00	$ 2.220.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL				**$ 537.370.000,00**				**$ 373.621.000,00**			**$ (181.190.000,00)**		**$ 16.751.000,00**			**$ 192.431.000**
		Ajuste por Acta de modificación																
		* Costo basico (D) = (A) + (B) + (C)				**$ 3.838.985.600,00**				**$ 3.215.320.206,00**			**$ 128.428.830,00**		**$ 2.305.704.824,00**			**$ 4.140.817.012,00**
		* Provision 2024 (E)				**$ 205.204.800,00**				**$ -**			**$ -**					**$ -**
		Provision 2025 (E)				**$ 93.725.000,00**				**$ 925.496.806,00**			**$ (925.496.806,00)**					**$ -**
		Provision 2026 (E)				**$ 55.853.000,00**				**$ 52.951.388,00**			**$ -**					**$ 52.951.388,00**
		* Subtotal (D) + (E) = (F)				**$ 4.193.768.400,00**				**$ 4.193.768.400,00**			**$ (797.067.976,00)**		**$ 2.305.704.824,00**			**$ 4.193.768.400,00**
		* IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 796.815.996,00**				**$ 796.815.996,00**			**$ (151.442.915,44)**		**$ 438.083.916,56**			**$ 796.815.996,00**
		* Costo Total = (F) + (G) = (H)				**$ 4.990.584.396,00**				**$ 4.990.584.396,00**			**$ (948.510.891,44)**		**$ 2.743.788.740,56**			**$ 4.990.584.396,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4.140.817.012,00	$ 796.815.996,00	$ 4.937.633.008,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) MAYO 2026	$ 2.305.704.824,00	$ 438.083.916,56	$ 2.743.788.740,56
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ 128.428.830,00	$ (151.442.915,44)	$ (23.014.085,44)
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1.963.541.018,00	$ 207.289.164,00	$ 2.170.830.182,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	24,86 MESES
ADICIONAL	5 MESES
ACUMULADO	29,86 MESES
FALTANTE	6 MESES

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Por Prorroga del contrato
Conforme al memorando 2026I-VBOG-030454 de la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales se realiza la redistribución de recursos asignados no ejecutados a la fecha para prorrogar el contrato hasta el 31 de diciembre de 2026

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Firma
Nombre: FABIAN ANDRÉS ORTIZ COLMENARES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202232984 TLM

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE — Matrícula Profesional No.: 25202-238888 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE AMV No. 1932 de 2024

CERTIFICA:


Que el **CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS,** identificado con el NIT 901.164.885-3, en desarrollo del Contrato N°.1932 de 2024, cuyo objeto contractual es ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1., que el contratista ha cumplido a cabalidad con las actividades de actualización de los aplicativos informáticos y herramientas tecnológicas asignadas bajo su ejecución, específicamente la plataforma transaccional SECOP II.


Lo anterior, según a lo establecido para el trámite de prórroga del contrato en mención.

Dado en Villavicencio - Meta, a los DIEZ (16) días del mes de JUNIO de 2026.


ING. FABIAN ANDRÉS ÒRTIZ COLMENARES
Matrícula No. 70202-232984 TLM
Supervisor del contrato de AMV

ACTAS DE COSTOS Y FACTURAS

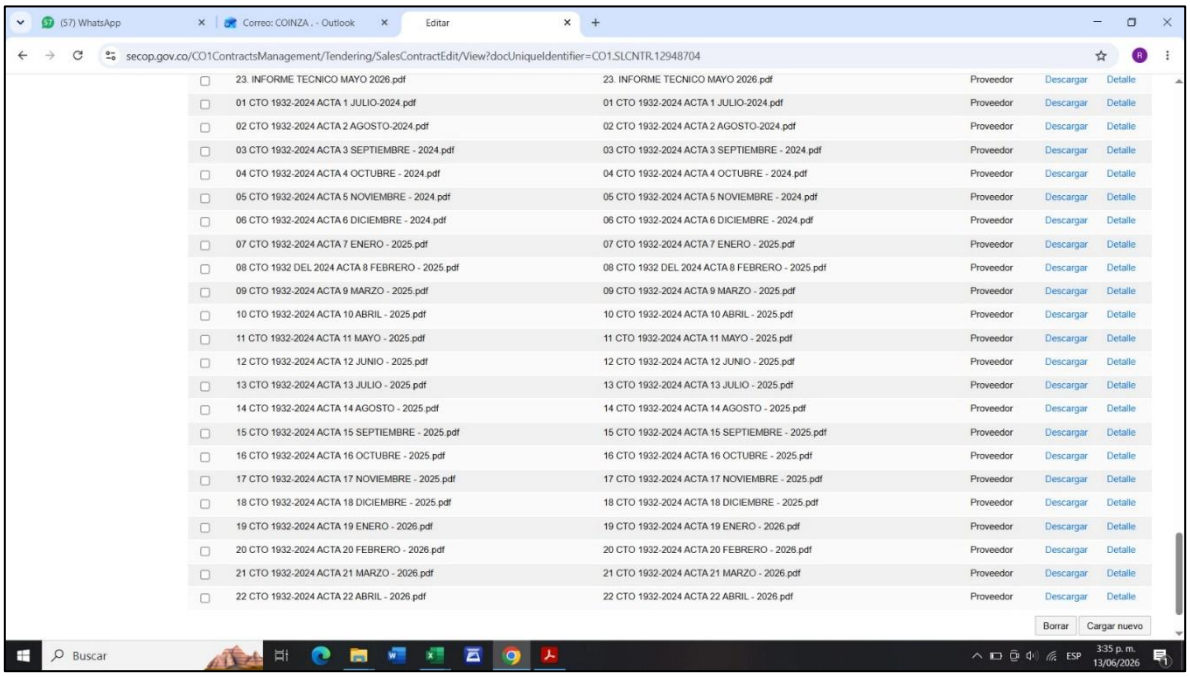

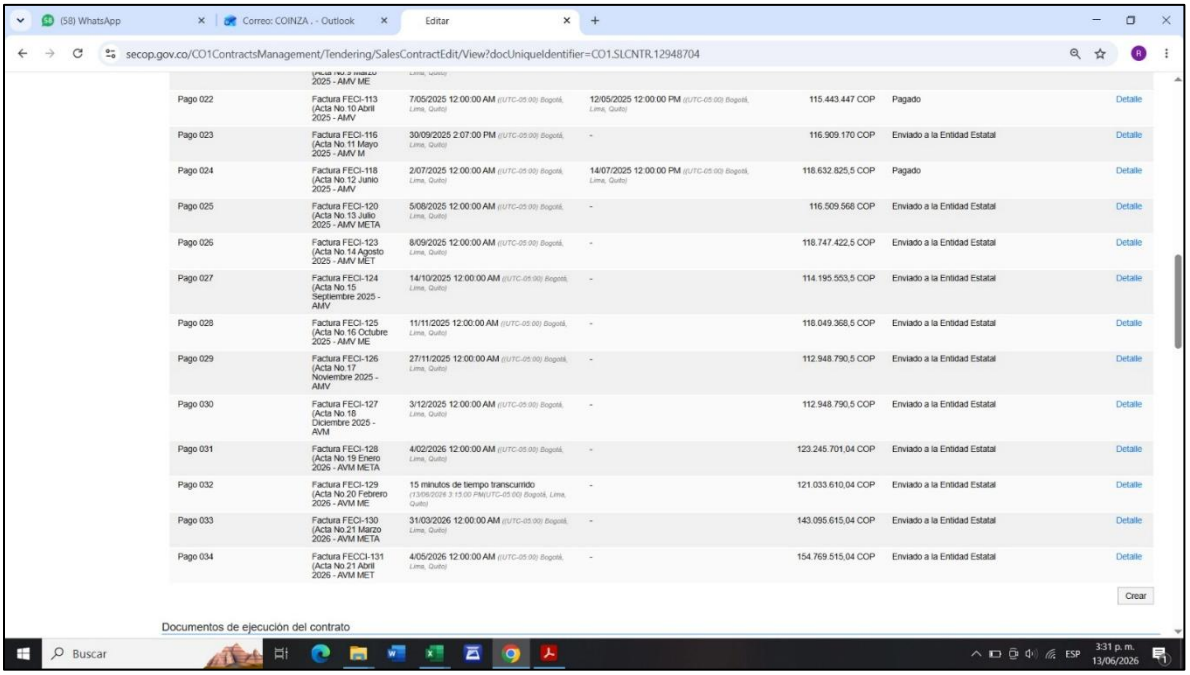

INFORMES

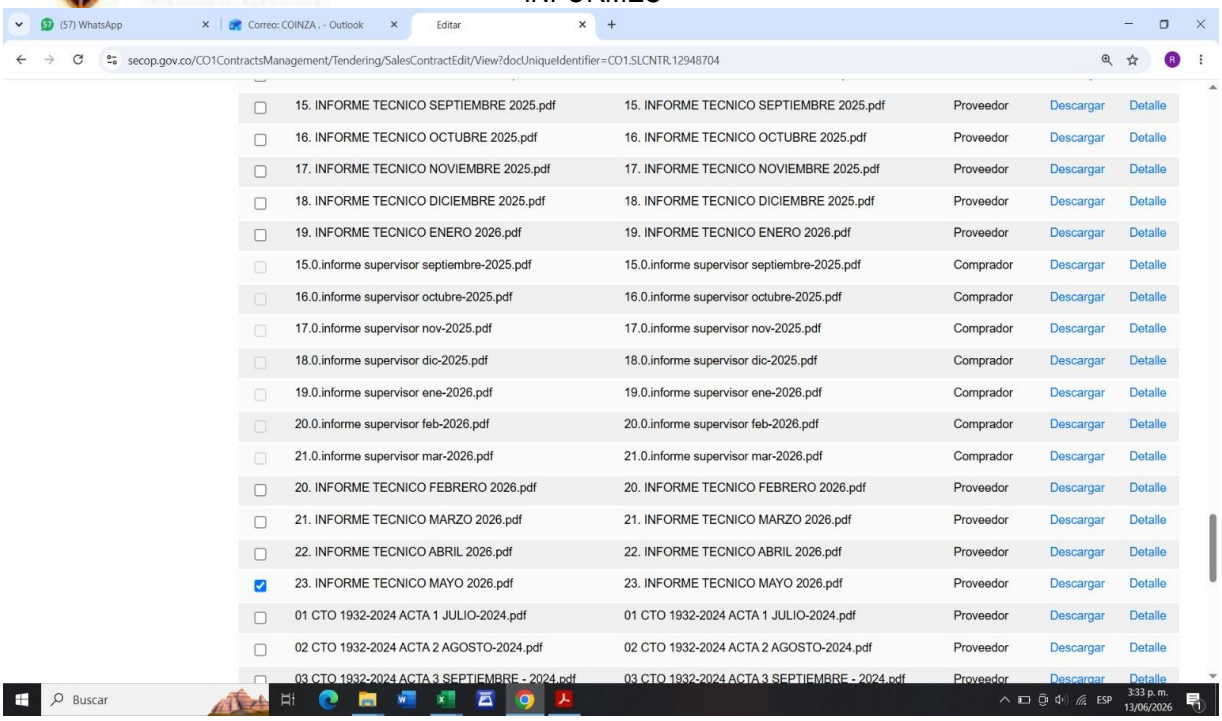

15. INFORME TECNICO SEPTIEMBRE 2025.pdf	15. INFORME TECNICO SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
16. INFORME TECNICO OCTUBRE 2025.pdf	16. INFORME TECNICO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
17. INFORME TECNICO NOVIEMBRE 2025.pdf	17. INFORME TECNICO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
18. INFORME TECNICO DICIEMBRE 2025.pdf	18. INFORME TECNICO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
19. INFORME TECNICO ENERO 2026.pdf	19. INFORME TECNICO ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
15.0.informe supervisor septiembre-2025.pdf	15.0.informe supervisor septiembre-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
16.0.informe supervisor octubre-2025.pdf	16.0.informe supervisor octubre-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
17.0.informe supervisor nov-2025.pdf	17.0.informe supervisor nov-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
18.0.informe supervisor dic-2025.pdf	18.0.informe supervisor dic-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
19.0.informe supervisor ene-2026.pdf	19.0.informe supervisor ene-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
20.0.informe supervisor feb-2026.pdf	20.0.informe supervisor feb-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
21.0.informe supervisor mar-2026.pdf	21.0.informe supervisor mar-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
20. INFORME TECNICO FEBRERO 2026.pdf	20. INFORME TECNICO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
21. INFORME TECNICO MARZO 2026.pdf	21. INFORME TECNICO MARZO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
22. INFORME TECNICO ABRIL 2026.pdf	22. INFORME TECNICO ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
23. INFORME TECNICO MAYO 2026.pdf	23. INFORME TECNICO MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
01 CTO 1932-2024 ACTA 1 JULIO-2024.pdf	01 CTO 1932-2024 ACTA 1 JULIO-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
02 CTO 1932-2024 ACTA 2 AGOSTO-2024.pdf	02 CTO 1932-2024 ACTA 2 AGOSTO-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
03 CTO 1932-2024 ACTA 3 SEPTIEMBRE - 2024.pdf	03 CTO 1932-2024 ACTA 3 SEPTIEMBRE - 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

POLIZAS



Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle
CO1.WRT.19808083	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.994.350.637,60 COP	MUNDIAL DE SEGUROS SA	31/07/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12948704 1/2


13/6/26, 3:37 p.m. Editar


CO1.WRT.14516327	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.994.350.637,60 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/07/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle
CO1.WRT.14443049	Seriedad de la oferta	-	499.058.439,60 COP	-	10/05/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Caducado	Detalle


Agregar


Configuración financiera - Pago de anticipos

APLICATIVOS

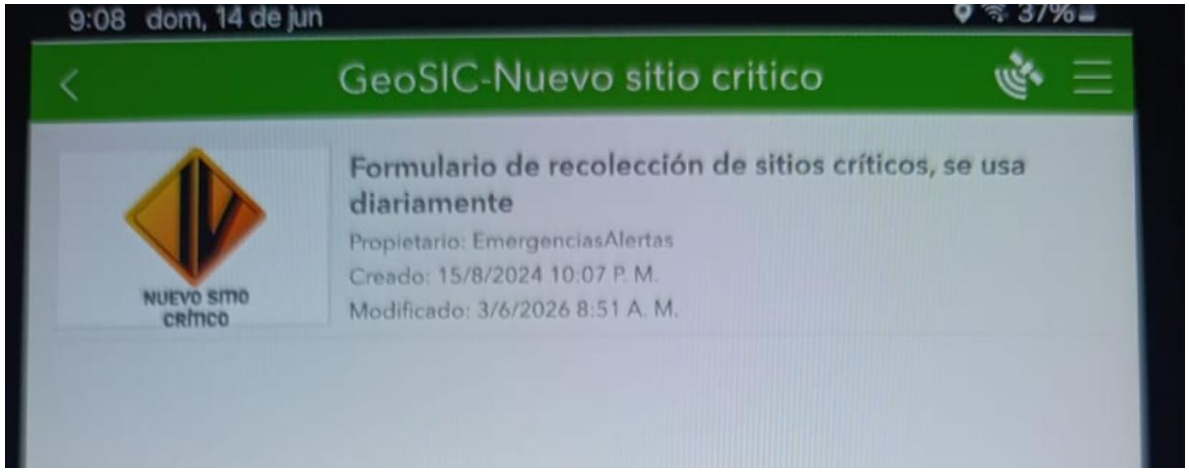

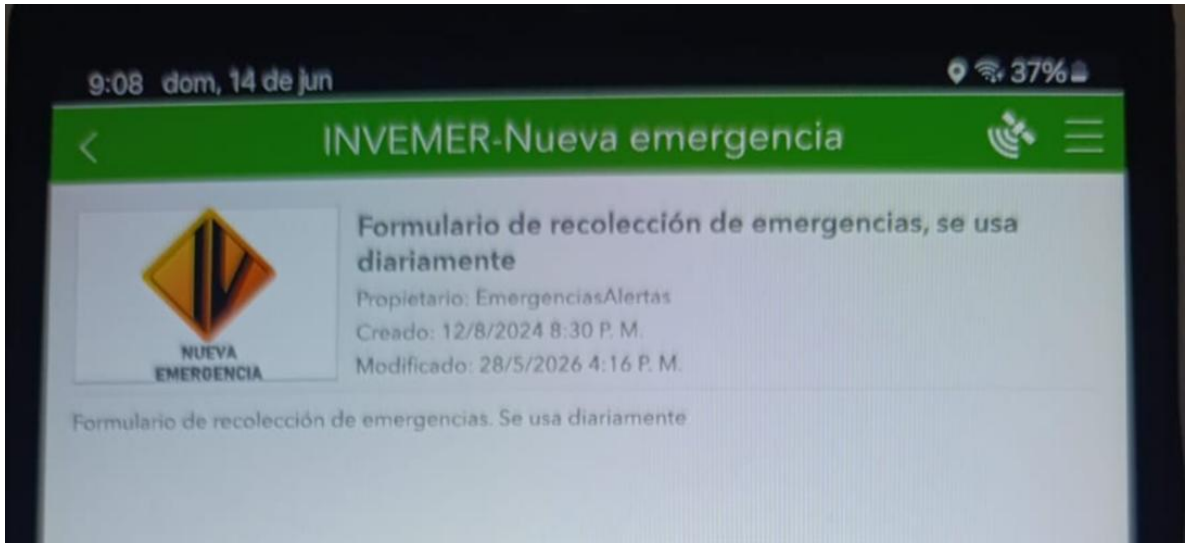

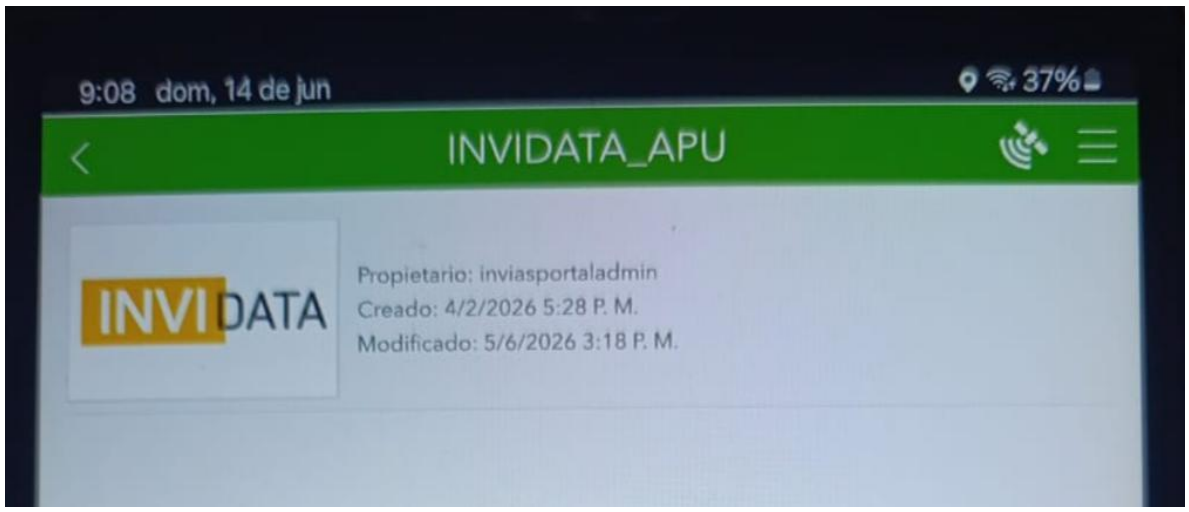

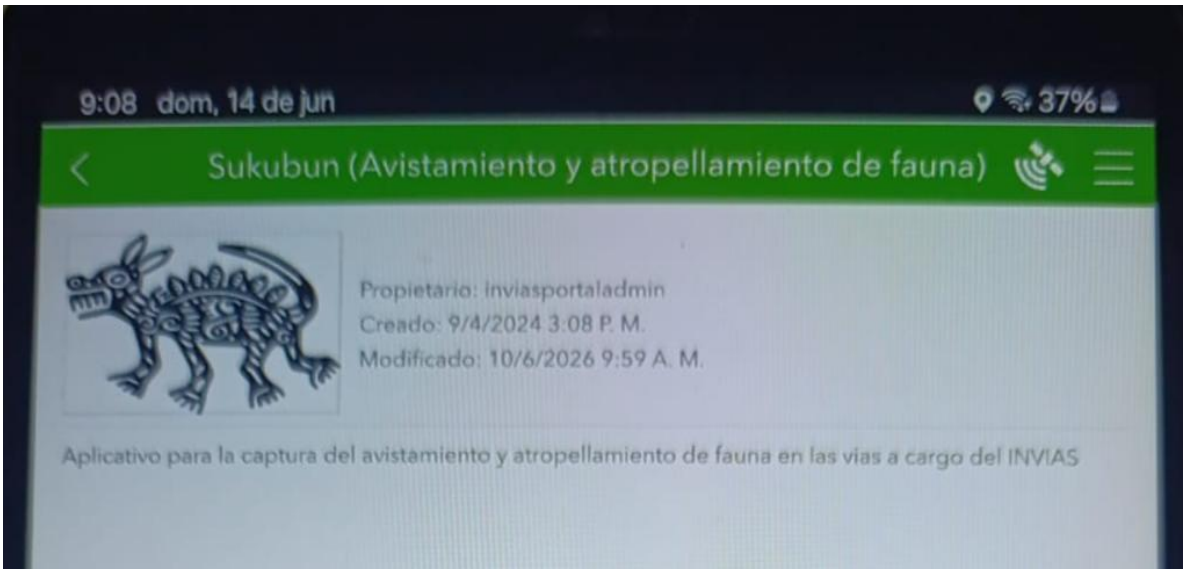
9:08 dom, 14 de jun
37%
Sukubun (Avistamiento y atropellamiento de fauna)
Propietario: inviasportaladmin
Creado: 9/4/2024 3:08 P. M.
Modificado: 10/6/2026 9:59 A. M.
Aplicativo para la captura del avistamiento y atropellamiento de fauna en las vias a cargo del INVIAS
