Prosperidad Social | Familias en su Tierra



CONVENIO 920 FIP 2024

PROSPERIDAD SOCIAL – FUPAD

Mayo 2026

PADF
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO

INFORME TÉCNICO No. 17

FAMILIAS EN SU TIERRA

Intervención No. 10

Fecha de Corte del Informe: 29 de mayo de 2026

Identificación del Informe

Consecutivo	**17**
Periodo	1 de mayo de 2026 – 29 de mayo de 2026
Fecha de Entrega	Junio de 2026
Objetivo	Presentar el estado de avance acumulado de las actividades realizadas durante la etapa de ejecución del Programa FAMILIAS EN SU TIERRA X.

Identificación del Convenio

Convenio No.	**920 FIP 2024**
Suscrito Entre:	Prosperidad Social y FUPAD Colombia
Fecha Inicio de Convenio:	31 de diciembre de 2024
Fecha Fin de Convenio:	31 de julio de 2026
Valor Total de Convenio (incluyendo Otrosí):	COP$196.400.406.549
Valor Total Recursos PS Desembolsados:	$70.523.585.082
Zona:	73 municipios en 18 departamentos
No. Total, de Hogares a Atender:	28.936 hogares

Tabla de Contenido

1. Introducción 6
2. Plan Operativo Anual (POA) 7
3. Avances en la Etapa de Ejecución 9
3.1. Estado de Contratación 9
3.2. Seguimiento a Monitoreo y Evaluación 11
3.2.1. Encuentros Integrados 13
3.2.2. Mesas de Articulación Municipal (MAM) 14
3.2.3. Comités de Control Social (CCS) 16
3.3. Vinculación y Caracterización 18
3.4. Avances por Componente 19
3.4.1. Visitas a Hogares 19
3.4.2. Produciendo para mi Hogar (PPMH) 21
3.4.3. Cosechando mi Huerta (CMH) 28
3.4.4. Vivir mi Casa (VMC) 32
3.4.5. Fortalecimiento Social y Comunitario (FSC) 39
4. Comunicaciones 47
4.1. Publicaciones en Redes Sociales 48
4.2. Productos Institucionales y Branding 50
4.3. Cubrimiento en Territorio 50
4.4. Monitoreo de Medios 52
5. Gestión y Articulación 53
5.1. Gestión con Aliados Estratégicos 53
5.2. Resultados 57
6. Dificultades Operativas 58
6.1. Orden Público y Restricciones Territoriales 58
6.2. Condiciones Climáticas 68
7. Próximas Actividades 75
8. Conclusiones 76

Tabla de Ilustraciones

Diagrama 1. Avance POA por entregable - Mayo 2026 8
Diagrama 2. Comparativo Visitas por Componente – Mayo 2026 20

Ilustración 1. Avance Plan Operativo Anual - Mayo 2026 7

Foto 1. Encuentro Integrado N°. 3. Pelaya, Cesar 14
Foto 2. MAM N°. 3. Alejandría, Antioquia 15
Foto 3. MAM N°. 3. El Roble, Sucre 15
Foto 4. CCS N°. 2. San Onofre, Sucre 16
Foto 5. CCS N°. 2. Viotá, Cundinamarca 17
Foto 6. Visita 3 PPMH. Mercaderes, Cauca 23
Foto 7. Visita 4 PPMH. Carmen de Bolívar, Bolívar 24
Foto 8. Formación Cacaoteros. Agustín Codazzi, Cesar 25
Foto 9. Formación Cacaoteros. Turbo, Antioquia 25
Foto 10. Proyecto productivo ganadero de Yury Vanessa Dorado Valencia. Cajibío, Cauca 28
Foto 11. Entregas insumos CMH. Sabanas de San Ángel, Magdalena 31
Foto 12. Entregas insumos CMH. Becerril, Cesar 31
Foto 14. Entregas insumos CMH. El Peñón, Bolívar 31
Foto 13. Entregas insumos CMH. Granada, Antioquia 31
Foto 15. Visita N°. 4 VMC. Carmen de Bolívar, Bolívar 36
Foto 16. Visita N°. 4 VMC. Leiva, Nariño 36
Foto 17. Visita 4 FSC. Ataco, Tolima 41
Foto 18. Visita 4 FSC. Yondó, Antioquia 41
Foto 19. Experiencia destacada IFC en Turbo, Antioquia 47
Foto 20.Jornada de transferencia de capacidades y fortalecimiento en comunicaciones - Mayo 2026 51
Foto 21. Cubrimiento jornada de transferencia de capacidades y fortalecimiento en comunicaciones - Mayo 2026 51
Foto 22. Capacitación en Cacao Agrosostenible - Mayo 2026 54
Foto 23. Formación en microlearning - Mayo 2026 56

Tabla 1. Distribución de Talento Humano por Cargo y Estado Contractual – Mayo 2026 10
Tabla 2. Estado de contratación gestores - Mayo 2026 10

Tabla 3. Consolidado Encuentros Integrados - Mayo 2026 13
Tabla 4. Consolidado MAM N°. 3 y CCS N°.2 - Mayo 2026 18
Tabla 5. Estado de caracterización e inscripción de hogares FEST X por departamento - Mayo 2026 19
Tabla 6. Líneas productivas PPMH - Mayo 2026 22
Tabla 7. Reporte visitas PPMH - Mayo 2026 22
Tabla 8. Consolidado Encuentros Específicos PPMH - Mayo 2026 24
Tabla 9. Reporte visitas CMH - Mayo 2026 29
Tabla 10. Consolidado Encuentros Específicos CMH - Mayo 2026 30
Tabla 11. Planes de inversión por modalidad de huerta CMH - Mayo 2026 30
Tabla 12. UPA entregadas por departamento y municipio CMH - Mayo 2026 31
Tabla 13. Reporte visitas VMC - Mayo 2026 34
Tabla 14. Aspectos priorizados para intervención - Visita N°. 1 VMC 34
Tabla 15.Indicadores de habitabilidad - Visita N°. 2 VMC 35
Tabla 16. Resultados por eje temático - Visita N°. 3 VMC 35
Tabla 17. Resultados por eje temático - Visita N°. 4 VMC 37
Tabla 18. Consolidado Encuentros Específicos VMC - Mayo 2026 37
Tabla 19. Distribución del plan de inversión por línea de intervención VMC - Mayo 2026 38
Tabla 20. Modalidad de mano de obra prevista VMC - Mayo 2026 38
Tabla 21. Reporte visitas FSC - Mayo 2026 40
Tabla 22. Consolidado Encuentros Específicos FSC - Mayo 2026 42
Tabla 23. Consolidado Taller de Participación Ciudadana N°. 1 - Mayo 2026 43
Tabla 24. Consolidado Taller de Participación Ciudadana N°. 2 - Mayo 2026 43
Tabla 25. Consolidado de IFC por municipio - Mayo 2026 45
Tabla 26. Indicadores agregados de comunicaciones - Mayo 2026 48
Tabla 27. Tabla 2. Publicaciones en RR. SS. – Mayo 2026 49
Tabla 28. Registro monitoreo de medios - Mayo 2026 53
Tabla 29. Jornadas de capacitación en Cacao Agrosostenible - Mayo 2026 55
Tabla 30. Síntesis de afectaciones territoriales por orden público - Mayo 2026 62
Tabla 31. Síntesis de afectaciones territoriales por condiciones climáticas - Mayo 2026 70

1. Introducción

El presente documento constituye el Informe Técnico No. 17 del Programa Familias en su Tierra – FEST X, correspondiente a su décima intervención, y da cuenta del estado de avance de la etapa de ejecución durante el período comprendido entre el 1 y el 29 de mayo de 2026. El programa se desarrolla en el marco del Convenio 920 FIP 2024, suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD Colombia), y está dirigido a la población víctima del conflicto armado en condición de retorno y reubicación, con el propósito de contribuir a su estabilización socioeconómica y al arraigo en sus territorios.

En términos de cobertura, el programa tiene una meta contractual de atención de 28.936 hogares distribuidos en 73 municipios de 18 departamentos del país. Con corte al 29 de mayo de 2026, y una vez finalizado el proceso de vinculación, caracterización e inscripción en el sistema de información KOKAN, se cuenta con 28.213 hogares vinculados activos en la ruta de atención, equivalentes al 97 % de la meta total. Esta base constituye el universo sobre el cual se concentra la implementación de las actividades técnicas, sociales y comunitarias definidas para el programa, y sirve de referente para el cálculo de los avances reportados en el presente informe.

La intervención se estructura en torno a cuatro componentes complementarios, orientados a la atención integral de las familias: Produciendo para mi Hogar (Generación de Excedentes Agropecuarios), enfocado en la consolidación de proyectos productivos y la generación de ingresos; Cosechando mi Huerta (Seguridad Alimentaria), orientado al establecimiento de Unidades Productivas para Autoconsumo; Vivir mi Casa (Casa Digna – Vida Digna), dirigido al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la vivienda; y Fortalecimiento Social y Comunitario, de carácter transversal, encaminado al ejercicio de derechos, la organización social y la integración comunitaria. Estos componentes se desarrollan mediante un proceso de acompañamiento integral que combina actividades individuales y grupales y la entrega de incentivos condicionados.

Durante el período reportado, el programa registró un avance técnico acumulado del 53 % frente a lo previsto en el Plan Operativo Anual (POA), con progresos coherentes con el momento programático de cada línea de trabajo: la consolidación plena de las etapas de alistamiento y vinculación, el avance sostenido de la ruta de visitas

domiciliarias, el inicio de la dispersión de insumos en el componente de Seguridad Alimentaria y la formulación y aprobación de Iniciativas de Fortalecimiento Comunitario. De manera paralela, y considerando que la vigencia del convenio se proyectaba inicialmente hasta el 31 de julio de 2026, FUPAD ha venido adelantando las gestiones técnicas, administrativas y financieras necesarias para obtener su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de las metas previstas.

En coherencia con lo anterior, el informe presenta de manera detallada la evolución técnica del convenio conforme al Plan Operativo Anual; los avances en la etapa de ejecución —estado de contratación, seguimiento y monitoreo, vinculación y caracterización, y avances por componente—; la gestión en materia de comunicaciones, articulación con aliados estratégicos y atención de situaciones territoriales; y, finalmente, las actividades proyectadas para el siguiente período y las principales conclusiones del mes.

2. Plan Operativo Anual (POA)

El presente apartado detalla la evolución técnica del convenio conforme a lo estipulado en el Plan Operativo Anual (POA). Con corte al 29 de mayo de 2026 y considerando la vigencia inicialmente establecida hasta el 31 de julio, se presenta el avance técnico alcanzado hasta la fecha.

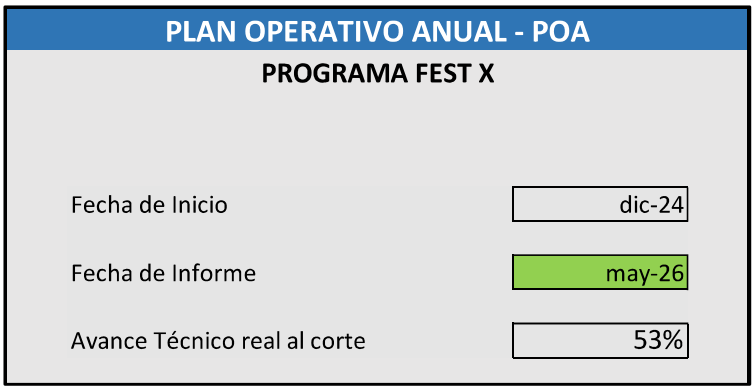


Ilustración 1. Avance Plan Operativo Anual - Mayo 2026

En términos de ejecución, se reporta un avance técnico acumulado del 53 %, lo que representa un incremento de 2 puntos porcentuales en comparación con el mes de abril (51 %), evidenciando la continuidad y el fortalecimiento de la gestión operativa orientada a optimizar la implementación del programa. A continuación, se detalla el estado de implementación por entregable.

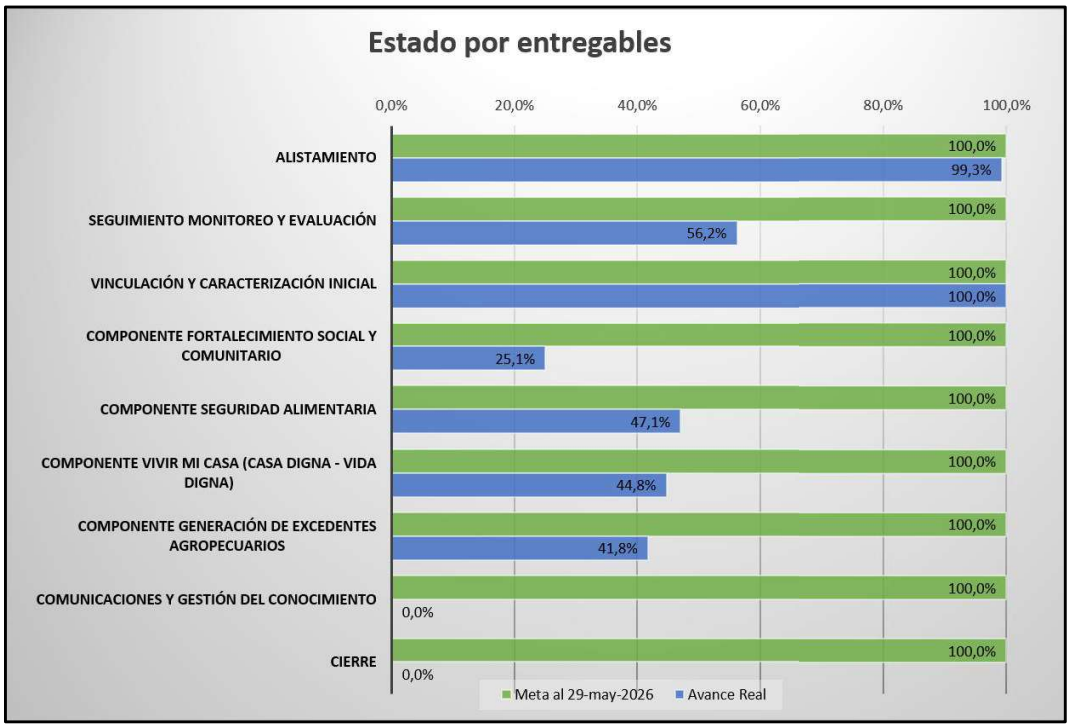


Diagrama 1. Avance POA por entregable - Mayo 2026

El análisis por entregable evidencia una ejecución diferenciada según el momento programático de cada línea de trabajo. El Alistamiento y la Vinculación y Caracterización Inicial presentan los avances más sólidos, con un 99,3 % y un 100 % respectivamente, lo que confirma que la base operativa del programa se encuentra plenamente consolidada: los equipos técnicos están desplegados en territorio, los hogares vinculados y la ruta operativa en marcha.

En cuanto a los componentes de implementación directa con los hogares, se observa una ejecución progresiva y coherente con la fase actual del programa. El Componente Cosechando mi Huerta con un 47,1 %, seguido por el Componente Vivir Mi Casa con un 44,8 % y el Componente Produciendo para mi Hogar con un 41,8 %, entregables que concentran las actividades de mayor intensidad operativa en este período, incluyendo el acompañamiento técnico, la formulación de planes de inversión y la dispersión de incentivos condicionados. El Componente de Fortalecimiento Social y Comunitario registra un 25,1 %, avance que responde a la estructura propia de este componente, cuyas actividades de mayor peso, como la implementación de las Iniciativas de Fortalecimiento Comunitario, están programadas para una etapa más avanzada de la ruta operativa.

Frente al Seguimiento, Monitoreo y Evaluación, se presenta un avance del 56,2 %, que refleja la actividad sostenida de reporte, gestión documental y actualización de los sistemas de información que acompaña transversalmente toda la intervención. Por su parte, los entregables de Comunicaciones y Gestión del Conocimiento y de Cierre se mantienen en 0,0 %, en tanto sus actividades están previstas para las etapas finales de la ejecución del programa.

Finalmente, en relación con la vigencia del convenio, y considerando que su finalización se proyectaba inicialmente para el 31 de julio de 2026, FUPAD ha venido adelantando todas las gestiones técnicas, administrativas y financieras necesarias para obtener la prórroga del convenio, con el propósito de extender su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta gestión busca garantizar el cumplimiento integral de las metas previstas en el Plan Operativo Anual, así como asegurar la adecuada culminación de las actividades pendientes en cada uno de los entregables y componentes del programa.

3. Avances en la Etapa de Ejecución

3.1. Estado de Contratación

Durante mayo de 2026, el estado de las contrataciones mantuvo un comportamiento estable y coherente, sin variaciones significativas frente al periodo anterior. En este marco, se reforzaron las diferentes líneas operativas del programa, contribuyendo a la continuidad de las acciones previstas. El consolidado de la dinámica contractual del mes reportado se presenta a continuación:

Cargo	Activo	Anulado	Gestante	Renuncia	Terminación de Contrato	Terminación Justa Causa	Total
Coordinador de Monitoreo y Seguimiento	8				2		10
Coordinador Zonal	36	4	1	6	12		59
Gerente de Convenio	1						1
Líder de Componente Cosechando Mi Huerta	6				2		8
Líder de Componente Fortalecimiento Social y Comunitario	6				3		9
Líder de Componente Produciendo para mi Hogar	5			3	2		10
Líder de Componente Vivir mi Casa	6			1	1	1	9
Profesional de Compras y Logística	12				4		16
Profesional de Monitoreo y Seguimiento	2						2
Profesional Financiero	1						1
Profesional de Comunicaciones	4						4

Cargo	Activo	Anulado	Gestante	Renuncia	Terminación de Contrato	Terminación Justa Causa	Total
Profesional de Sistemas	2						2
Técnico Operativo en Gestión Documental	36			2			38
Total	**125**	**4**	**1**	**12**	**26**	**1**	**169**

Tabla 1. Distribución de Talento Humano por Cargo y Estado Contractual – Mayo 2026

Al cierre del periodo reportado se mantiene un total de 169 personas vinculadas, de las cuales 125 permanecen activas, 26 registraron terminación de contrato, 12 renuncia, 4 anulación, 1 terminación por justa causa y 1 en estado de gestante. La mayor concentración de talento humano activo se distribuye entre los roles de Coordinador Zonal y Técnico Operativo en Gestión Documental, con 36 personas activas cada uno; el primero es, además, el cargo de mayor rotación acumulada del periodo, con 12 terminaciones de contrato y 6 renuncias sobre un total de 59 vínculos contractuales registrados. En cuanto a los líderes de componente, los cuatro cargos misionales —Cosechando Mi Huerta, Fortalecimiento Social y Comunitario, Vivir Mi Casa y Produciendo para Mi Hogar— registran entre 5 y 6 personas activas cada uno, reflejando una distribución equilibrada del acompañamiento técnico entre los componentes. Las áreas transversales de compras y logística, monitoreo y seguimiento, financiera, comunicaciones, sistemas y gestión documental mantienen su funcionamiento dentro de los parámetros operativos del convenio.

En cuanto al equipo de consultores gestores, responsables del acompañamiento técnico directo a los hogares participantes en territorio, se reporta lo siguiente:

Gestores	Cantidad
Activos	1.347
En proceso de contratación	57
Pendiente por contratar	20
Total	**1.424**

Tabla 2. Estado de contratación gestores - Mayo 2026

Se registra un total de 1.424 personas proyectadas, de las cuales 1.347 se encuentran activas, 57 están en proceso de contratación y 20 permanecen pendientes por contratar. Las gestiones correspondientes a estos cupos se adelantan conforme a los procedimientos internos de la Fundación y en articulación con los requerimientos operativos del programa en cada territorio focalizado.

En términos generales, los movimientos contractuales identificados responden a situaciones de carácter personal, ajustes operativos y condiciones territoriales propias del despliegue en campo. Las particularidades asociadas a la rotación de personal en los municipios de Tibú, El Tarra, Puerto Gaitán, Carmen de Bolívar, María la Baja,

Nariño, Planadas, Ataco y Rioblanco han sido reportadas de manera oportuna y continúan vigentes durante este periodo.

3.2. Seguimiento a Monitoreo y Evaluación

Durante el periodo de reporte, el equipo de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación dio continuidad a las acciones técnicas de control, validación y análisis de la información generada en territorio, con el propósito de verificar el avance de la ruta operativa frente a las metas establecidas en el Plan Operativo Anual (POA) y fortalecer la toma de decisiones por parte de la gerencia, el equipo técnico nacional y las coordinaciones territoriales.

En este periodo, el seguimiento se orientó principalmente a la consolidación de la información reportada por los equipos territoriales, la revisión de avances por componente, la identificación de rezagos, la validación de soportes y la generación de alertas oportunas sobre actividades pendientes o con riesgo de incumplimiento. Este trabajo permitió mantener una lectura actualizada del estado de ejecución del programa y orientar acciones correctivas en los municipios que presentaron mayores necesidades de acompañamiento.

Las principales acciones desarrolladas se organizaron en los siguientes frentes de gestión:

- **Articulación con coordinaciones territoriales:** Se mantuvieron espacios diarios de seguimiento con las coordinaciones territoriales, líderes y equipos técnicos, orientados a revisar el avance de las actividades programadas, validar la información registrada en los sistemas de información y formularios KOBO, identificar rezagos y definir acciones de mejora para fortalecer la oportunidad y calidad del reporte territorial.

- **Consolidación de la etapa de vinculación:**

    - Se realizó la validación en KOKAN de los últimos hogares vinculados y, posteriormente, se tramitaron ante la supervisión las solicitudes de aprobación e inscripción correspondientes.
    - Se gestionó el control de metas y la revisión de soportes de novedades (retiros, fallecimientos, cambios de domicilio, cambios de titularidad).
    - Se elaboraron reportes semanales sobre el estado de vinculación de los hogares, los cuales se compartieron con los equipos técnicos nacionales y territoriales.

- **Seguimiento y gestión de novedades:** Se mantuvo el control de las novedades reportadas por los equipos territoriales, incluyendo retiros voluntarios, fallecimientos, cambios de residencia, privaciones de la libertad y demás situaciones que afectaron la permanencia de los hogares en la ruta operativa. Esta información fue revisada y consolidada para mantener actualizada la base de hogares activos y garantizar la trazabilidad del proceso.

- **Creación de formularios para captura de información:**

    - Se desarrollaron formularios en KOBO para la captura de información asociada a actividades de la ruta operativa.
    - Se gestionaron los usuarios y permisos necesarios en el sistema para los nuevos gestores incorporados durante el mes.

- **Soporte técnico:** Se brindó acompañamiento técnico a gestores, coordinadores y líderes territoriales en el uso de tabletas, formularios KOBO, cargue de información, corrección de registros y manejo de herramientas de seguimiento. Este soporte permitió atender dificultades operativas relacionadas con el registro de información y contribuir a la calidad del reporte..

- **Procesamiento y consolidación de información:** Se generaron bases consolidadas, reportes de avance, matrices de seguimiento y análisis de actividades ejecutadas y pendientes. Estos insumos permitieron contar con información actualizada para el seguimiento interno del programa, la preparación de informes y la toma de decisiones frente a la ejecución territorial.

- **Elaboración de informes:** Se elaboraron informes de avance y de ejecución dirigidos a Casa Matriz, Prosperidad Social, la gerencia del programa, el equipo técnico nacional y demás instancias de seguimiento. Estos reportes permitieron documentar los avances alcanzados, las principales alertas operativas, el estado de cumplimiento de metas y las acciones implementadas para fortalecer la ejecución.

- **Gestión de PQRSF:** Se reciben y atienden las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (PQRSF) del programa, gestionando los insumos y la información necesarios para su análisis, trámite y respuesta. Este proceso se

realiza en estrecha articulación con las áreas técnicas y operativas correspondientes, garantizando la trazabilidad de cada requerimiento y procurando el cumplimiento de los términos legales dispuestos.

Con corte al 29 de mayo de 2026, se recibieron y gestionaron 52 PQRSF. Los temas más recurrentes estuvieron relacionados con solicitudes de información sobre el estado del programa, exclusión o no vinculación, reintegros, gestión de pagos, cambios de titularidad, actualización de datos o residencia, así como requerimientos asociados a entregas de insumos e incentivos. El tiempo promedio de respuesta fue de 11,8 días calendario.

3.2.1. Encuentros Integrados

Los Encuentros Integrados son espacios grupales de carácter transversal, comunes a los cuatro componentes del programa, orientados a articular los contenidos de la ruta metodológica y a fortalecer la participación comunitaria de las familias. Durante el período, el programa dio continuidad a su implementación y a la nivelación de las jornadas pendientes. El balance consolidado al corte se presenta a continuación.

Encuentro Integrado	# de Encuentros Realizados	Avance Meta Grupos de Formación (1.265)
Encuentro Integrado N°. 1	1.686	83 %
Encuentro Integrado N°. 2	1.339	90 %
Encuentro Integrado N°. 3	810	59 %

Tabla 3. Consolidado Encuentros Integrados - Mayo 2026

Los Encuentros Integrados N.° 1 y N.° 2, desarrollados principalmente en períodos anteriores, registran coberturas del 83 % y 90 % respectivamente y durante el mes fueron objeto de acciones de nivelación en los municipios pendientes. En consecuencia, la actividad del período se concentró en el Encuentro Integrado N.° 3, que alcanzó un avance del 59 % sobre la meta de grupos de formación.

El Encuentro Integrado N.° 3 se desarrolló con amplia participación de los hogares y, por su carácter transversal, articuló líneas temáticas diferenciadas según el énfasis de cada componente. En Produciendo para mi Hogar, la jornada se orientó al fortalecimiento de las capacidades comerciales y empresariales, abordando la identificación del mercado objetivo, la construcción de marca y del nombre del proyecto, el reconocimiento de las etapas del proceso de venta y el diseño de logo e identidad visual mediante herramientas digitales como la plataforma Strive. En Cosechando mi Huerta, se trabajaron aspectos básicos de suelos y semillas para la implementación de la Unidad Productiva para Autoconsumo, incluyendo la estrategia de banco de semillas comunal, los principios de protección y producción de semillas

y la práctica de germinación. En Fortalecimiento Social y Comunitario, el encuentro se centró en la consolidación de las Iniciativas de Fortalecimiento Comunitario, con la construcción y socialización participativa de los planes de inversión de las iniciativas priorizadas por las comunidades. Entre los municipios donde se desarrollaron estas jornadas se destacan Turbo y San Juan de Urabá (Antioquia) y Chiriguaná, Pelaya y Becerril (Cesar).



Foto 1. Encuentro Integrado N°. 3. Pelaya, Cesar

Estas jornadas se desarrollaron mediante metodologías participativas y prácticas, con acompañamiento permanente de los gestores, y se orientaron además a garantizar la participación efectiva de las familias que ingresaron recientemente al programa o que no habían podido asistir a estos espacios.

3.2.2. Mesas de Articulación Municipal (MAM)

Durante mayo de 2026 se desarrollaron **37 Mesas de Articulación Municipal (MAM) N°. 3**, consolidándose como espacios de coordinación interinstitucional, seguimiento territorial y fortalecimiento de la articulación entre los diferentes actores vinculados al programa. Estas jornadas, lideradas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), permitieron socializar los avances de los diferentes componentes del programa, incluyendo acciones individuales y grupales, encuentros integrados y específicos, Jornadas de Integración Comunitaria (JIC), procesos de fortalecimiento social comunitario y el seguimiento a los planes de inversión familiares y comunitarios.



Foto 2. MAM N°. 3. Alejandría, Antioquia

Las mesas contaron con la participación de representantes del DPS, FUPAD, alcaldías municipales, personerías, enlaces de víctimas, Unidad para las Víctimas, SENA, ICBF, secretarías municipales, Juntas de Acción Comunal, líderes comunitarios y demás actores institucionales presentes en los territorios. Durante los encuentros se revisaron los compromisos previamente establecidos, se identificaron avances, necesidades y dificultades en la implementación del programa y se promovió la coordinación de acciones para fortalecer el acompañamiento a las familias beneficiarias.



Foto 3. MAM N°. 3. El Roble, Sucre

Como resultado, se fortaleció el trabajo articulado entre instituciones y comunidades, favoreciendo el seguimiento conjunto a las actividades del programa, la organización comunitaria y la consolidación de espacios permanentes de diálogo y coordinación territorial. Asimismo, las entidades participantes manifestaron su disposición para

continuar fortaleciendo la oferta institucional y mejorar los procesos de comunicación con las comunidades, especialmente en aspectos relacionados con incentivos, cronogramas y ejecución de actividades.

En términos generales, las Mesas de Articulación Municipal se consolidaron como espacios estratégicos para fortalecer la articulación institucional, promover la participación de los actores territoriales y realizar seguimiento a la implementación del programa FEST. Estos escenarios facilitaron la construcción conjunta de soluciones, el fortalecimiento de la confianza entre las instituciones y las comunidades, y la identificación oportuna de oportunidades de mejora para el desarrollo de las acciones en los territorios.

3.2.3. Comités de Control Social (CCS)

En el mes reportado se desarrollaron **37 Comités de Control Social N°. 2**, como espacios de participación orientados al seguimiento de la implementación del programa, la transparencia en la gestión y el fortalecimiento del control social comunitario. Estos encuentros contaron con la participación de hogares beneficiarios, líderes comunitarios, representantes de Juntas de Acción Comunal, DPS y FUPAD.

Durante las jornadas se socializaron los avances de los diferentes componentes del programa, se resolvieron inquietudes de las comunidades y se realizó seguimiento a los procesos de acompañamiento técnico y social desarrollados en los territorios. Asimismo, se promovieron espacios de diálogo y escucha activa que permitieron recoger observaciones, recomendaciones y percepciones de las familias frente al desarrollo de las actividades.



Foto 4. CCS N°. 2. San Onofre, Sucre

Como resultado, se fortaleció la participación comunitaria y la interacción entre beneficiarios, equipos territoriales y entidades participantes, favoreciendo una mayor apropiación de los procesos del programa. De igual manera, se destacó la valoración positiva de las familias frente a las acciones de acompañamiento y formación implementadas en temas relacionados con seguridad alimentaria, fortalecimiento productivo, organización comunitaria y proyectos de vida.



Foto 5. CCS N°. 2. Viotá, Cundinamarca

Entre las principales dificultades identificadas se encuentran los retrasos en algunos incentivos, así como las limitaciones derivadas de las condiciones climáticas, el estado de las vías y las dificultades de acceso a zonas rurales, factores que afectaron la participación en algunos municipios.

En general, los Comités de Control Social permitieron fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, promover la transparencia y consolidar espacios de diálogo entre las comunidades y las entidades implementadoras, contribuyendo al mejoramiento continuo de las acciones desarrolladas en el marco del programa FEST.

A continuación, se relaciona los municipios que desarrollaron los Comités de Control Social No. 2 y las Mesas de Articulación Municipal No. 3:

Zona	Municipios	Zona	Municipios
Zona 1	Turbo	Zona 4	Policarpa
	Dabeiba		Los Andes
	San Luis		Puerto Guzmán
	Granada		Valle del Guamuez
	Montebello		Caloto
	Heliconia		Leiva
	Sonsón		Mercaderes
	Nariño		Tangua
	Alejandría		San Lorenzo
	Necoclí	Zona 5	Viotá
	San Juan de Urabá		Puerto Carreño
Zona 2	Chalan		Puerto Rico
	María La Baja		Milán
	El Roble		Solita
	San Onofre		Puerto Gaitan
Zona 3	Barranco de Loba - Bolívar		Rioblanco
	El Peñón - Bolívar		Planadas
	Fundación		Páez
	Aracataca		

Tabla 4. Consolidado MAM N°. 3 y CCS N°.2 - Mayo 2026

3.3. Vinculación y Caracterización

Con corte a mayo de 2026, el proceso de vinculación, caracterización, gestión de recambios e inscripción en el sistema de información KOKAN se encuentra finalizado. Si bien los últimos ingresos de participantes al programa se realizaron durante el mes de abril, en mayo se consolidó y cerró el proceso de inscripción en KOKAN.

En relación con la meta contractual de 28.936 hogares, se cuenta a la fecha con 28.213 hogares vinculados activos en la ruta de atención, equivalentes al 97% de la meta total del programa. Esta base constituye el universo de atención sobre el cual se concentra la implementación de las actividades técnicas, sociales y comunitarias definidas en los componentes del Programa FEST X.

Durante la ejecución se han gestionado 2.617 novedades posteriores a la inscripción, asociadas principalmente a retiros voluntarios, fallecimientos, cambios de lugar de residencia, privaciones de la libertad y otras situaciones que afectaron la permanencia de algunos hogares en la ruta operativa. En municipios como El Tarra, Planadas, Puerto Carreño y San Juan Nepomuceno, el porcentaje de novedades posteriores a la inscripción superó el 30%, evidenciando una mayor dinámica de movilidad, rotación o pérdida de continuidad en estos territorios.

Es importante señalar que la incorporación de hogares durante la ejecución se presentó de manera progresiva y no lineal, debido a la necesidad de atender novedades, validar hogares de reemplazo y completar procesos de inscripción en diferentes momentos del convenio. Por esta razón, los hogares activos no ingresaron de forma simultánea a la ruta operativa, lo que implicó organizar grupos de atención en distintos momentos de avance y ajustar la planeación territorial para garantizar que cada hogar iniciara su proceso desde las actividades correspondientes.

De esta manera, con la finalización del proceso de vinculación, caracterización, recambios e inscripción en KOKAN, el seguimiento se orienta al avance de los componentes, la permanencia de los hogares activos en la ruta y el cumplimiento de las actividades programadas en el marco del Convenio.

A continuación, se presenta el estado de caracterización e inscripción por departamento con corte a mayo de 2026:

Departamento	Meta	Inscripción KOKAN	Novedades retiro	Familias estado vinculado
Antioquia	6.030	6.292	348	5.944
Bolívar	4.874	5.241	425	4.816
Boyacá	240	263	23	240
Caquetá	400	438	67	371
Casanare	320	352	36	316
Cauca	1.520	1.709	197	1.512
Cesar	2.640	2.752	119	2.633
Córdoba	160	183	18	165
Cundinamarca	240	247	9	238
Guaviare	80	81	3	78
Magdalena	2.694	2.784	99	2.685
Meta	640	669	56	613
Nariño	1.790	1.993	222	1.771
Norte de Santander	3.654	3.973	702	3.271
Putumayo	1.120	1.231	126	1.105
Sucre	1.494	1.536	51	1.485
Tolima	960	1.016	89	927
Vichada	80	70	27	43
Total	**28.936**	**30.830**	**2.617**	**28.213**

Tabla 5. Estado de caracterización e inscripción de hogares FEST X por departamento - Mayo 2026

3.4. Avances por Componente

3.4.1. Visitas a Hogares

El análisis del comportamiento de las visitas a hogares durante el mes reportado evidencia la consolidación plena de las primeras visitas de acompañamiento y un

avance sostenido en las visitas de seguimiento subsiguientes de la ruta, acorde con el momento de implementación de cada componente, tal como se presenta a continuación:

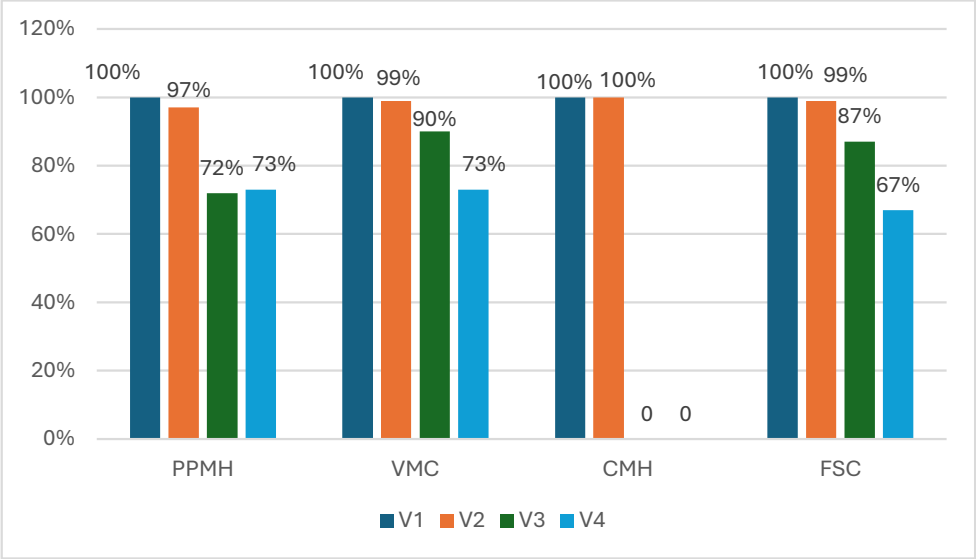


Diagrama 2. Comparativo Visitas por Componente – Mayo 2026

Antes de analizar los resultados, conviene precisar que, de acuerdo con el Anexo de Especificaciones Técnicas del programa, la ruta operativa contempla veintisiete (27) visitas domiciliarias por hogar, distribuidas en seis (6) visitas para Cosechando Mi Huerta y siete (7) para cada uno de los componentes Produciendo para mi Hogar, Vivir Mi Casa y Fortalecimiento Social y Comunitario. En consecuencia, las visitas de Cosechando Mi Huerta concluye en la Visita N°. 6 y la de los demás componentes en la Visita N°. 7.

Como se observa en el diagrama que precede, la Visita N°. 1 alcanzó el 100% de ejecución en los cuatro componentes —Produciendo para mi Hogar (PPMH), Vivir Mi Casa (VMC), Cosechando Mi Huerta (CMH) y Fortalecimiento Social y Comunitario (FSC). Este resultado refleja una cobertura universal en la primera fase de acompañamiento y confirma la consolidación operativa de los equipos territoriales y la adecuada gestión del acceso a los hogares vinculados al programa.

En cuanto a la Visita N°. 2, los cuatro componentes mantienen niveles de avance prácticamente equivalentes a la meta: CMH alcanzó el 100%, VMC y FSC registran un 99% cada uno y PPMH un 97%. Estas cifras confirman la culminación de la segunda fase de acompañamiento en la totalidad de los componentes, con diferencias mínimas atribuibles al avance escalonado de los hogares en la ruta metodológica.

Respecto a la Visita N°. 3, se observan avances significativos en tres de los cuatro componentes: VMC reporta el mayor nivel de ejecución con un 90%, seguido de FSC con un 87% y de PPMH con un 72%. El componente CMH no registra ejecución en esta visita durante el periodo (0%), en correspondencia con su ruta metodológica, en la cual las Visitas N°. 3 y 4 se desarrollan una vez los hogares han recibido los insumos para el establecimiento de la Unidad Productiva para Autoconsumo; la dispersión de estos insumos, iniciada en el periodo, establece la condición para el avance de estas visitas en los próximos meses.

En lo que respecta a la Visita N°. 4, el periodo registró un incremento sustantivo frente a meses anteriores, configurándola como uno de los principales frentes de ejecución del mes: PPMH y VMC alcanzaron el 73% cada uno y FSC el 67%. CMH no reporta ejecución en esta visita (0%), en línea con lo señalado para la Visita N°. 3.

En términos generales, el comportamiento de las visitas durante mayo refleja una cobertura plena en las primeras visitas y una progresión consistente en las visitas de seguimiento subsiguientes de la ruta de acompañamiento. La consolidación de las Visitas N°. 3 y 4 en los componentes que ya superaron las visitas iniciales, junto con el inicio de la ruta de Visitas N°. 3 y 4 de CMH tras la entrega de insumos, constituye la prioridad operativa para los próximos periodos.

3.4.2. Produciendo para mi Hogar (PPMH)

Panorama General

Durante mayo de 2026, el componente Produciendo para mi Hogar concentró su gestión en la profundización del plan de negocio de cada hogar y en la consolidación de capacidades para la administración económica de las unidades productivas. El acompañamiento avanzó a través de las Visitas N°. 3 y 4 de la ruta, articulando actividades individuales y grupales orientadas al fortalecimiento de competencias técnicas, comerciales y organizativas. Frente a abril —mes centrado en la formulación y aprobación de los planes de inversión—, el énfasis metodológico de mayo se desplazó de la producción hacia la comercialización y la gestión del negocio: el modelo CANVAS avanzó hacia sus bloques comerciales (socios clave, relación con los clientes y canales de comercialización) y la herramienta financiera CALMIO consolidó el registro y control de ingresos y gastos del hogar y de la unidad productiva.

El incentivo del componente mantiene su carácter de capitalización para la adquisición de activos, por lo que el avance de las visitas y la solidez del plan de negocio constituyen condiciones habilitantes para su materialización. Los porcentajes

de avance reportados en este apartado se calculan sobre la base de familias activas en la ruta al corte de mayo de 2026 (28.213, frente a 28.037 en abril).

En el plano territorial, las unidades productivas acompañadas confirman la diversidad de líneas de negocio observada en los territorios priorizados, con predominio de las actividades pecuarias y de comercio, así como de cultivos permanentes propios de la economía campesina de la región. La siguiente tabla sintetiza las líneas productivas predominantes a partir de los proyectos abordados en las visitas del mes.

Línea productiva	Unidades de negocio representativas
Pecuaria	Ganadería (leche y derivados lácteos), cría de cerdos.
Comercio y servicios	Tiendas, salones de belleza.
Cultivos permanentes	Café, cacao, limón.

Tabla 6. Líneas productivas PPMH - Mayo 2026

Adicionalmente, durante el mes se desarrollaron procesos de formación especializada con la red cacaotera, orientados al fortalecimiento técnico y comercial de los productores, que se detallan en el apartado de actividades.

Actividades Desarrolladas

Visitas a Hogares

El balance de la ruta de visitas al corte del mes evidencia que las dos primeras jornadas se encuentran completas o próximas a concluir —Visita N°. 1 al 100 % y Visita N°. 2 al 97 %—, mientras las Visitas N°. 3 y 4, correspondientes a los bloques comerciales y financieros del plan de negocio, avanzan de manera simultánea con coberturas del 72 % y 73 % respectivamente. La proximidad entre ambas refleja el desarrollo paralelo de estas jornadas durante el mes; el cierre de la brecha frente a las Visitas N°. 1 y 2 constituye una de las prioridades operativas del próximo periodo. A continuación, se presenta el consolidado del mes:

PPMH		
Tipo de Visita	# de Visitas	% de Avance vs Familias Activas (28.213)
Visita 1	28.200	100%
Visita 2	27.482	97%
Visita 3	20.205	72%
Visita 4	20.618	73%

Tabla 7. Reporte visitas PPMH - Mayo 2026

Visita N°. 3

La jornada se orientó a la construcción y consolidación del plan de negocio bajo la metodología CANVAS, abordando específicamente los bloques de Socios Clave (C5),

Relación con los Clientes (C6) y Canales de Comercialización (C7), junto con la orientación práctica sobre el uso de CALMIO para el registro y control de cuentas, ingresos y gastos. En el bloque C5, los hogares identificaron y clasificaron a sus socios estratégicos —proveedores locales, asociaciones y vecinos—, registrando el beneficio específico que cada uno aporta para mitigar riesgos y optimizar recursos; el 99,5 % de los participantes identificó correctamente a sus socios clave. En el bloque C6 diferenciaron los tipos de interacción comercial (asistencia personal, autoservicio y comunidades) y definieron su estrategia de relacionamiento, comprendiendo el trato con el cliente como una relación de largo plazo y no como un acto puntual de venta. En el bloque C7 completaron la matriz de funciones de comercialización (conocimiento, evaluación, compra, entrega y postventa) y precisaron si su distribución sería directa o mediante minoristas.



Foto 6. Visita 3 PPMH. Mercaderes, Cauca

Visita N°. 4

El acompañamiento se dirigió a consolidar las ideas productivas y a finalizar el plan de negocio tipo CANVAS, orientando el proceso hacia la materialización de los proyectos. Las familias completaron el lienzo identificando con claridad su propuesta de valor, clientes, canales de comercialización, fuentes de ingreso y costos asociados, y avanzaron en la diferenciación entre las finanzas del hogar y las del negocio mediante el registro sistemático de ingresos y egresos. Los proyectos abordados abarcaron tiendas, cría de cerdos, cultivos de café, cacao y limón, salones de belleza y ganadería, entre otros, evidenciando la diversidad de iniciativas en los territorios. La apropiación de los conceptos de costos y precios fue alta: el 98 % de los hogares acompañados reconoce e identifica correctamente sus costos fijos; el 97 % define con claridad sus costos variables; el 96 % calcula el margen de ganancia de sus productos o servicios; y el 97 % establece adecuadamente el precio de venta incorporando criterios de costo, ganancia y competitividad.



Foto 7. Visita 4 PPMH. Carmen de Bolívar, Bolívar

Encuentros Específicos

Los encuentros específicos del componente concentran la formación colectiva de los grupos de participantes en torno al fortalecimiento de capacidades productivas, comerciales y empresariales. Con el fin de evitar reiteraciones frente a la información narrativa presentada en informes anteriores, este apartado se concentra en el balance cuantitativo y en los avances acumulados de los encuentros específicos durante el periodo reportado. El consolidado de los encuentros se presenta a continuación:

Encuentro	# de Encuentros Realizados	Avance Meta Grupos de Formación (1.265)
Encuentro Específico N.º 1	1.498	92 %
Encuentro Específico N.º 2	1.031	75 %

Tabla 8. Consolidado Encuentros Específicos PPMH - Mayo 2026

Al corte de mayo, el Encuentro Específico N.º 1 registró 1.498 encuentros realizados, equivalentes a un avance del 92 % sobre la meta de 1.265 grupos de formación, mientras que el Encuentro Específico N.º 2 alcanzó 1.031 encuentros realizados, con un avance del 75 %. Frente a abril —cuando el N.º 1 acumulaba 1.381 encuentros y el N.º 2, 847—, ambos espacios muestran una progresión sostenida en su cobertura, más pronunciada en el segundo encuentro, en coherencia con la secuencia de la ruta del componente.

Planes de Inversión

El plan de inversión es el instrumento mediante el cual se canaliza el incentivo monetario del componente, condicionado a su aprobación y a una asistencia mínima del 80 %. Su formulación se nutre directamente del plan de negocio tipo CANVAS

consolidado durante las Visitas N.º 3 y N.º 4: la definición de la propuesta de valor, la estructura de costos y el precio de venta de cada unidad productiva orientan el destino de la capitalización hacia la adquisición de activos pertinentes y sostenibles.

Al corte de mayo, los planes de inversión realizados alcanzaron **28.183**, equivalentes al **99,9 % de las 28.213 familias activas de la base**. En paralelo, se identificó la necesidad de cierre y subsanación de planes pendientes en algunos municipios, con especial énfasis en Puerto Gaitán, El Tarra y Armero Guayabal, lo que constituye una de las prioridades operativas del próximo periodo.

Procesos de Formación Especializada

En el marco de la gestión y articulación con la red cacaotera, se desarrolló un proceso de formación dirigido a productores de cacao bajo el enfoque de Escuelas de Campo, orientado a transferir conocimientos prácticos sobre producción sostenible, buenas prácticas agrícolas y ambientales, y al fortalecimiento técnico, productivo y comercial de los cultivos. El proceso, proyectado para 930 participantes, alcanzó 870 productores capacitados en trece municipios: Turbo, Necoclí, San Luis, Dabeiba, Policarpa, Valle del Guamuez, Agustín Codazzi, Pueblo Bello, Aracataca, Ataco, Armero, El Tarra y Tibú. La metodología participativa favoreció el aprendizaje práctico, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento organizativo de las comunidades cacaoteras.



Foto 8. Formación Cacaoteros. Agustín Codazzi, Cesar



Foto 9. Formación Cacaoteros. Turbo, Antioquia

De manera complementaria, se realizó un proceso de formación en habilidades blandas dirigido a 22 profesionales que tendrán a cargo los talleres de habilidades asociativas con las familias participantes. El espacio fortaleció competencias de comunicación, liderazgo y facilitación mediante técnicas de Programación Neurolingüística (PNL), coaching grupal y facilitación experiencial, así como metodologías estructuradas para el diseño de talleres de alto impacto y la gestión de grupos.

Mesa Productiva de Articulación Interinstitucional

Durante el mes reportado se desarrolló la segunda Mesa Productiva de Articulación Interinstitucional (MPAI), concebida como un espacio de encuentro y fortalecimiento de alianzas estratégicas orientado a articular la oferta institucional en favor de las familias participantes del programa. La jornada, adelantada con el acompañamiento del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, contó con la participación de PALNORTE S.A.S., la Gobernación del Cauca (Cooperación Internacional), el SENA, la Federación Nacional de Cafeteros (Comité Cauca), la Agencia de Renovación del Territorio, Corpoamazonia, Corpouraba y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena. La convocatoria de estos actores permitió reunir a entidades comprometidas con el desarrollo social, económico y productivo de los territorios, y consolidar un escenario de cooperación orientado a la construcción conjunta de estrategias en beneficio de las comunidades y familias participantes.

En el desarrollo de la jornada, cada entidad realizó una presentación institucional en la que dio a conocer su misión, su visión, sus objetivos y las principales líneas de trabajo que adelanta en los distintos territorios del país. Este ejercicio inicial facilitó el reconocimiento mutuo de competencias y ámbitos de intervención, sentando las bases para identificar complementariedades entre la oferta de las entidades y las necesidades de la población atendida por el programa.

Posteriormente, se socializó la oferta institucional disponible para posibles acciones de articulación, identificando oportunidades concretas de apoyo y acompañamiento dirigidas a las familias participantes. En este marco, cada entidad compartió los criterios de inclusión y elegibilidad que definen el acceso a sus procesos y beneficios, lo que permitió precisar las condiciones y los requisitos que deben cumplir los hogares para vincularse a la oferta presentada y orientar de manera más efectiva las futuras remisiones.

Asimismo, se abrió un espacio de diálogo e intercambio de experiencias en torno a las líneas de articulación susceptibles de implementarse de manera conjunta, enfocadas principalmente en asistencia técnica, procesos de formación y fortalecimiento de capacidades, entrega de dotación e insumos productivos, alternativas de financiamiento, estrategias de comercialización y fortalecimiento de procesos asociativos. Estas líneas se orientan a fortalecer las unidades productivas de los hogares, promover su sostenibilidad económica y ampliar las oportunidades de generación de ingresos en los territorios priorizados.

En términos generales, la realización de esta mesa productiva permitió consolidar relaciones interinstitucionales, identificar intereses comunes y establecer posibles

rutas de trabajo colaborativo encaminadas a potenciar el impacto de las intervenciones y a fortalecer los procesos de desarrollo comunitario y productivo. Como resultado del espacio, se establecieron dos compromisos concretos: la gestión de reuniones con las entidades por parte de los líderes de zona y la programación de la tercera Mesa Productiva de Articulación Interinstitucional para el siguiente periodo.

Logros PPMH

Durante mayo de 2026, el componente PPMH evidenció avances cualitativos relevantes en el fortalecimiento de capacidades productivas, empresariales y financieras de los hogares participantes.

Uno de los principales resultados fue el cambio en la autopercepción de las familias, quienes pasaron de identificarse únicamente como productoras a reconocerse como pequeñas empresarias con capacidad para gestionar costos, ingresos, clientes, alianzas y canales de comercialización; este reconocimiento fue expresado por los propios participantes durante el cierre de las jornadas.

En materia de planeación estratégica, los hogares completaron los bloques C5, C6 y C7 del modelo CANVAS, relacionados con socios clave, relación con los clientes y canales de comercialización, alcanzando niveles de comprensión superiores al 99 % e identificando actores estratégicos, posibles alianzas y mecanismos de venta acordes con sus contextos territoriales. De manera complementaria, a través del ejercicio *“cuentas claras y negocios prósperos”* y del uso de la herramienta CALMIO, los participantes incorporaron prácticas concretas de registro y control financiero, diferenciando las finanzas del hogar de las del negocio y analizando los rubros de mayor egreso para la toma de decisiones orientadas al equilibrio económico. Este proceso se refleja en los indicadores de la Visita 4, en la cual el 98 % de los hogares reconoció sus costos fijos, el 97 % identificó sus costos variables, el 96 % calculó el margen de ganancia y el 97 % estableció el precio de venta, lo que evidencia una base sólida para la sostenibilidad de las unidades productivas.

Asimismo, se observó una apropiación progresiva de la metodología CANVAS, en tanto los hogares diligenciaron y relacionaron los distintos bloques del modelo de negocio, reconocieron la secuencia entre visitas y articularon los contenidos con su realidad productiva. El cumplimiento del 99 % de los compromisos adquiridos en la Visita 2, junto con una participación del 100 % durante las jornadas y la ausencia de retiros o inasistencias, refleja responsabilidad, autonomía y permanencia en el proceso formativo.

Finalmente, se evidenció receptividad frente al uso de herramientas digitales como CALMIO, reconocida por los participantes como un recurso práctico para el registro, control y análisis financiero de sus unidades productivas.

Experiencias Destacadas

Yury Vanessa Dorado Valencia — vereda Cacahual, corregimiento El Carmelo, municipio de Cajibío (Cauca)

Víctima de desplazamiento forzado, Yury Vanessa (38 años) regresó con su familia a su territorio con el propósito de reconstruir su proyecto de vida. A partir de su vinculación a procesos de apoyo productivo y, posteriormente, al Programa Familias en su Tierra X, fortaleció sus conocimientos en ganadería y consolidó una unidad de producción lechera y de derivados lácteos que hoy constituye una fuente estable de ingresos.

Como resultado del acompañamiento, la familia decidió mejorar el establo para optimizar el manejo del ganado y la producción. Es la única participante del programa en el municipio que desarrolla un proyecto productivo enfocado en ganadería, lo que la convierte en un referente de permanencia en el territorio y fortalecimiento económico rural.



Foto 10. Proyecto productivo ganadero de Yury Vanessa Dorado Valencia. Cajibío, Cauca

> *"Volver al territorio no fue fácil, pero gracias al esfuerzo familiar y a las oportunidades que encontramos, hoy tenemos una actividad que nos permite salir adelante y pensar en un mejor futuro para nuestros hijos." - Yury Vanessa Dorado Valencia*

3.4.3. Cosechando mi Huerta (CMH)

Panorama General

Durante mayo de 2026, el componente Cosechando mi Huerta marcó el tránsito del pre - alistamiento hacia la implementación productiva: el mes estuvo caracterizado por el inicio de la dispersión y entrega de los insumos para la conformación de las Unidades Productivas para Autoconsumo (UPA) en las veredas donde se desarrollan

los encuentros con las familias participantes. En paralelo, el componente concentró su gestión en la nivelación de las Visitas N.º 1 y N.º 2 de la ruta y en la verificación de lo definido en el plan de inversión para las dos modalidades de huerta —tradicional y vertical—, consolidando las condiciones para el establecimiento de las huertas.

El incentivo del componente se materializa en especie, mediante la entrega de un paquete de herramientas, insumos agrícolas, semillas, material vegetal y elementos para el hogar destinados al establecimiento de la UPA en sus dos modalidades. Para asegurar la calidad del material vegetal (arbustivos, musáceas y tubérculos), se adelantaron estrategias con viveros locales orientadas a garantizar el cumplimiento de los requerimientos del ICA y del programa. Los porcentajes de avance reportados en este apartado se calculan sobre la base de familias activas en la ruta al corte de mayo de 2026 (28.213).

El desarrollo de las jornadas estuvo condicionado por el contexto operativo de los territorios: las restricciones de movilidad asociadas al conflicto armado generaron retrasos de tres a cinco días en algunas zonas, mientras que el deterioro de las vías terciarias por las lluvias y la dispersión geográfica de las familias incrementaron los tiempos de desplazamiento y la complejidad logística de las entregas.

Actividades Desarrolladas

Visitas a Hogares

El trabajo del componente se concentró en la nivelación de las dos primeras jornadas de la ruta, en las que se dio a conocer y se eligió el tipo de UPA (tradicional o vertical) y se diligenció el plan de inversión, mediante el cual cada familia seleccionó las aromáticas, hortalizas, musáceas, cereales, leguminosas y tubérculos que orientarían los elementos a suministrar. Al corte de mayo, las Visitas N.º 1 y 2 se encuentran completas, según el siguiente balance.

CMH		
Tipo de Visita	**# de Visitas**	**% de Avance vs Familias Activas (28.213)**
Visita 1	28.484	100%
Visita 2	28.118	100%

Tabla 9. Reporte visitas CMH - Mayo 2026

Encuentros Específicos

Los encuentros específicos del componente concentran la formación colectiva de los grupos de participantes. Durante mayo se avanzó en la implementación del Encuentro Específico N.º 2, orientado al fortalecimiento de capacidades prácticas en manipulación y transformación de alimentos. Las familias reconocieron la importancia de transformar los productos para diversificar la alimentación del hogar, reducir

pérdidas y aprovechar mejor los recursos disponibles, e incorporaron prácticas de higiene y manejo seguro de utensilios como un elemento de cuidado de la salud familiar. El balance de los encuentros específicos se presenta a continuación.

Encuentro	# de Encuentros Realizados	Avance Meta Grupos de Formación (1.265)
Encuentro Específico N.º 1	1.542	93 %
Encuentro Específico N.º 2	914	64 %

Tabla 10. Consolidado Encuentros Específicos CMH - Mayo 2026

Planes de Inversión

El plan de inversión es el instrumento mediante el cual cada hogar define los elementos, semillas y material vegetal que recibirá para el establecimiento de su huerta, así como la modalidad de UPA. Durante mayo se consolidó la generación, impresión y firma de los planes de inversión, proceso que permitió socializar con las comunidades los insumos a entregar y que generó tranquilidad entre las familias ante la proximidad de las jornadas de dispersión. Al corte, los planes de inversión del componente ascienden a 27.840, distribuidos por modalidad de huerta según la siguiente tabla.

Modalidad de UPA	Planes de inversión	Participación
Huerta tradicional	26.222	94,2 %
Huerta vertical	1.618	5,8 %
TOTAL	**27.840**	**100 %**

Tabla 11. Planes de inversión por modalidad de huerta CMH - Mayo 2026

Entrega del incentivo e implementación de las UPA

El hito del mes fue el inicio de la entrega del incentivo en especie para la implementación de las UPA, que requirió la articulación permanente entre el equipo territorial, las coordinaciones zonales, el operador logístico y los actores institucionales para desarrollar jornadas de entrega en múltiples puntos rurales de difícil acceso. Las entregas comprendieron herramientas, insumos agrícolas, elementos para el hogar, semillas y material vegetal (tubérculos, musáceas y frutales), priorizados según las características productivas, climáticas y territoriales de cada municipio. En la modalidad tradicional, el paquete incluyó, entre otros, herramientas agrícolas (azadón, machete, palín ahoyador, zapapico), pulverizador, tanque de 250 litros con accesorios, malla y polisombra, cal dolomita, melaza y una dotación de menaje para el hogar; en la modalidad vertical se entregaron jardines verticales, abono orgánico, herramientas de jardinería y la misma dotación complementaria de hogar.



Foto 11. Entregas insumos CMH. Sabanas de San Ángel, Magdalena



Foto 12. Entregas insumos CMH. Becerril, Cesar



Foto 14. Entregas insumos CMH. Granada, Antioquia



Foto 13. Entregas insumos CMH. El Peñón, Bolívar

Durante el mes se entregaron 3.123 UPA en seis departamentos, según el siguiente consolidado.

Departamento	Municipios	UPA Entregadas
Antioquia	Alejandría, Granada, Heliconia, Montebello	435
Bolívar	El Peñón, Villanueva	236
Cauca	Tambo	32
Cesar	Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Chiriguaná, González, Pueblo Bello	1.516
Magdalena	Aracataca, Chibolo, Sabanas de San Ángel	625
Sucre	Chalán, El Roble	279
Total		**3.123**

Tabla 12. UPA entregadas por departamento y municipio CMH - Mayo 2026

Estas 3.123 UPA constituyen el primer tramo de la dispersión frente al universo de 27.840 planes de inversión formulados, en coherencia con el inicio gradual de la entrega de insumos durante el periodo. De manera complementaria, se realizaron transferencias metodológicas con los gestores en varios municipios, orientadas a unificar criterios de implementación, resolver dudas operativas en campo y mejorar la calidad del acompañamiento a los hogares.

Logros CMH

El principal logro del mes fue el inicio de la materialización de las UPA, con 3.123 unidades entregadas en sus modalidades tradicional y vertical, lo que representa un avance concreto hacia la implementación productiva del componente. La dotación de herramientas, semillas y material vegetal sienta las bases para procesos de diversificación orientados al autoconsumo, fortaleciendo la seguridad alimentaria de los hogares y reduciendo su dependencia de alimentos procesados.

Este avance se complementó con los resultados de los encuentros específicos, en los que las familias demostraron haber interiorizado recomendaciones de higiene y manejo seguro de alimentos, evidenciadas en la forma en que presentaron y trataron sus productos. Asimismo, se fortaleció la valoración de los productos de la huerta como fuente de alimentación nutritiva y segura, junto con la capacidad de elaborar preparaciones variadas a partir de lo cultivado, contribuyendo a mejorar la calidad de la dieta familiar.

De igual manera, la generación, firma y socialización de los planes de inversión permitió consolidar con las comunidades los insumos a entregar y generó tranquilidad frente a la proximidad de las jornadas de dispersión. Este proceso también favoreció dinámicas de apropiación anticipada, reflejadas en familias que adelantaron la adecuación del terreno y la preparación del suelo antes de recibir los insumos, lo cual evidencia que el enfoque metodológico está promoviendo cambios en el comportamiento, en la toma de decisiones y en la disposición de los participantes para asumir la huerta como una oportunidad de mejora de sus condiciones de vida.

3.4.4. Vivir mi Casa (VMC)

Panorama General

En el período comprendido entre el 25 de abril y el 29 de mayo de 2026, el componente Vivir Mi Casa (VMC) concentró su gestión en la culminación del ciclo de visitas domiciliarias, atendiendo 17.911 hogares en actividades del período, con la Visita N.º 4 como eje dominante (12.530 hogares). Al corte, la cobertura acumulada de la ruta alcanza el 100 % en la Visita N.º 1, el 99 % en la Visita N.º 2, el 90 % en la Visita N.º 3 y

el 73 % en la Visita N.º 4, sobre la base de 28.213 familias activas. Norte de Santander se consolidó como el epicentro de los hogares nuevos —concentra el 48,8 % del Plan de Inversión y el 50,1 % de la Visita N.º 1—, mientras que las visitas de mayor recorrido se desplegaron sobre un abanico territorial más amplio, liderado por Bolívar, Cesar y Antioquia.

El diagnóstico de los hogares nuevos confirma condiciones de alta vulnerabilidad habitacional: el 79,2 % carece de acueducto y el 89,8 % de alcantarillado, cifras que superan los registros de abril (60,8 % y 82,9 %) y reflejan las condiciones particulares de los hogares incorporados en Norte de Santander. En coherencia con ese perfil, las necesidades priorizadas por los hogares se concentran en el mejoramiento de pisos (50,1 %) y paredes (47,2 %), seguidas de la reparación de techos (30,0 %).

En el Plan de Inversión, el período registró la distribución más equilibrada desde el inicio del programa entre las líneas de Mejoramiento locativo (48,1 %) y Dotación (47,3 %), lo que evidencia que el componente está alcanzando un espectro más diverso de perfiles habitacionales; a ello se suma una alta corresponsabilidad financiera, con el 86,0 % de los hogares aportando recursos adicionales al incentivo. En el plano formativo, los hogares muestran hábitos consolidados en habitabilidad saludable (el 98,4 % se compromete a aplicar lo aprendido en la Visita N.º 2) y en eficiencia energética básica (uso de bombillas LED, 77,1 %); no obstante, persisten brechas en temas más especializados: el conocimiento de energías renovables (62,8 %) y de las rondas hídricas (55,8 %) constituyen los principales rezagos formativos del período. En el plano sanitario, los desafíos más críticos siguen siendo el bajo acceso a agua de red pública (24,3 %) y la presencia de plagas (58,2 % de los hogares).

En cuanto a la formación grupal, el Encuentro Específico N.º 1 —espacio preparatorio para la identificación de déficits habitacionales y la priorización de mejoras— alcanzó al corte 1.524 encuentros realizados, equivalentes a un avance del 92 % sobre la meta de 1.265 grupos de formación, consolidándose como un insumo clave para la calidad de la formulación de los planes de inversión.

Actividades Desarrolladas

Visitas a Hogares

Durante el período, el acompañamiento domiciliario del componente avanzó en las cuatro visitas de la ruta, con la Visita N.º 4 como la de mayor alcance. El balance de cobertura al corte, sobre la base de 28.213 familias activas, se presenta a continuación.

VMC		
Tipo de Visita	**# de Visitas**	**% de Avance vs Familias Activas (28.213)**
Visita 1	28.484	100%
Visita 2	27.856	99%
Visita 3	25.414	90%
Visita 4	20.696	73%

Tabla 13. Reporte visitas VMC - Mayo 2026

El balance evidencia una cobertura plena en la Visita N.º 1 (100 %) y casi total en la Visita N.º 2 (99 %), mientras que la Visita N.º 3 (90 %) y la Visita N.º 4 (73 %) avanzan de manera escalonada, en coherencia con la secuencialidad de la ruta y con el hecho de que la Visita N.º 4 fue el foco del acompañamiento del período, con 12.530 de los 17.911 hogares atendidos. El cierre de la Visita N.º 4 constituye una de las prioridades del próximo periodo.

Visita N°. 1

Concentrada en los hogares nuevos de Norte de Santander, esta visita cumplió su función de orientación técnica a partir del diagnóstico de las condiciones de la vivienda. El diagnóstico confirmó la alta vulnerabilidad estructural de estos hogares (79,2 % sin acueducto y 89,8 % sin alcantarillado), lo que orienta la pertinencia de las líneas del Plan de Inversión. Los aspectos priorizados por los hogares para intervención fueron los siguientes:

Aspecto que necesita más atención	% de Hogares
Mejorar los pisos	50,1%
Mejorar las paredes	47,2%
Reparación del techo	30,0%
Mejorar ventilación/iluminación	16,9%
Reparar sistema de agua/alcantarillado	5,0%

Tabla 14. Aspectos priorizados para intervención - Visita N°. 1 VMC

Visita N°. 2

Desplegada principalmente en Norte de Santander (38,1 %), Antioquia (17,0 %) y Meta (16,0 %), esta visita evalúa y refuerza los hábitos de habitabilidad saludable. Los resultados muestran una apropiación muy alta de los contenidos —el 98,2 % comprende los temas y el 98,4 % se compromete a aplicarlos—, pero también exponen los indicadores más críticos del componente: el acceso a agua de red pública cae a un mínimo histórico de 24,3 % y el hacinamiento afecta a un tercio de los hogares, situación agravada porque el 47,2 % carece de titularidad de la vivienda y, por tanto, tiene limitada capacidad de ampliación estructural. A continuación, se presenta el consolidado de las condiciones de habitabilidad:

Indicador de habitabilidad	% Favorable	Tendencia	Nivel
Buena ventilación	92,3%	Estable	Alto
Sin hacinamiento	65,7%	—	Positivo
Agua de red pública	24,3%	Mínimo histórico	Crítico
Sin presencia de pagas/roedores	41,8%	↑ Mejora	Bajo
Sanitario en funcionamiento	80,8%	Estable	Positivo
Almacena agua siempre tapada	73,8%	Estable	Positivo
Comprende temas de la visita	98,2%	Óptimo	Óptimo
Aplica hábitos (compromiso)	98,4%	Óptimo	Óptimo

Tabla 15.Indicadores de habitabilidad - Visita N°. 2 VMC

Visita N°. 3

Con una distribución territorial más amplia —Norte de Santander (25,1 %), Antioquia (21,6 %), Bolívar (14,5 %), Nariño (9,9 %) y Cauca (8,7 %)—, la Visita N.° 3 trabaja la cotización y compra responsable de materiales, las prácticas ecoamigables y el mantenimiento preventivo. Las dos mejoras más significativas del período se dieron aquí: la cotización habitual antes de comprar materiales subió 8,7 puntos (77,4 %) y el mantenimiento periódico 8,1 puntos (82,3 %), señales de consolidación de hábitos en los hogares con mayor recorrido en el programa. En contraste, el uso de materiales locales descendió 10,9 puntos (45,6 %), atribuible a la mayor participación de hogares urbanos de Antioquia y Norte de Santander, donde el acceso a materiales industrializados es más frecuente. Adicionalmente, el 85,0 % de los hogares presenta una propuesta de embellecimiento viable o parcialmente viable, la mayoría con intención de ejecutarla dentro del año. En la siguiente tabla se presentan los resultados por eje temático:

Eje	Indicador principal	Resultado	Nivel
Cotización	Comprende importancia de cotizar	90,5 %	Alto
Eco-amigable	Aplica luz natural	75,1 %	Positivo
	Aplica ventilación natural	70,0 %	Positivo
	Usa materiales locales	45,6 %	Medio
	Interés alto o medio	95,3 %	Alto
Mantenimiento	Realiza mantenimiento periódico	82,3 %	Positivo
	Comprende importancia del mantenimiento	88,5 %	Alto
Compromisos	Socializará lo aprendido	90,8 %	Alto

Tabla 16. Resultados por eje temático - Visita N°. 3 VMC

Visita N°. 4

Visita de mayor alcance del período, liderada por Bolívar (25,7 %), Cesar (13,9 %), Antioquia (11,1 %), Norte de Santander (9,0 %) y Magdalena (8,8 %). Aborda la eficiencia energética, las energías renovables y la gestión responsable del agua y el entorno. Los hábitos energéticos básicos están consolidados (bombillas LED 77,1 %, apagar luces 72,9 %, desconectar cargadores 72,3 %) y el conocimiento sobre el manejo del agua es alto (94,5 % conoce la importancia de taparla).



Foto 15. Visita N°. 4 VMC. Carmen de Bolívar, Bolívar



Foto 16. Visita N°. 4 VMC. Leiva, Nariño

Las brechas formativas se concentran en los temas más especializados: aunque el 62,8 % conoce las energías renovables y el 50,8 % ha considerado usar energía solar, solo el 4,7 % (589 hogares) ya la utiliza, y el conocimiento de las rondas hídricas se queda en 55,8 %, brecha especialmente relevante en departamentos ribereños como Bolívar y Magdalena. La visita cierra con el indicador de apropiación más alto del componente: el 96,1 % de los hogares se compromete a socializar lo aprendido con su familia. A continuación, se presentan los resultados por eje temático:

Eje temático	Indicador	Resultado	Nivel
Energía	Usan bombillas LED o bajo consumo	77,1 %	Positivo
	Apagan luces cuando no las usan	72,9 %	Positivo
	Desconectan cargadores	72,3 %	Positivo
Renovables	Conoce energías renovables	62,8 %	Medio
	Ha pensado en usar solar u otra renovable	50,8 %	Medio
	Ya utiliza alguna energía renovable	4,7 % (589 hogares)	Creciente
Agua	Conoce importancia de tapar el agua	94,5 %	Alto
	Limpia el tanque semanalmente	65,9 %	Positivo
	Conoce concepto de ronda hídrica	55,8 %	Medio

Eje temático	Indicador	Resultado	Nivel
Materiales	Conoce medidas de conservación	93,3 %	Alto
Compromisos	Socializará lo aprendido con su familia	96,1 %	Óptimo
Metodología	Conforme con la metodología	87,6 %	Alto

Tabla 17. Resultados por eje temático - Visita N°. 4 VMC

Encuentros Específicos

Encuentro Específico N°. 1

El Encuentro Específico N.° 1 es el espacio grupal del componente, orientado a que los hogares identifiquen sus déficits habitacionales y prioricen sus necesidades de mejora. Su estructura metodológica avanza sobre seis ejes: el déficit de vivienda, el hacinamiento, los espacios diferenciados, la priorización escalonada de mejoras (sanitaria → cocina → habitaciones → pisos → cubierta), las posibles soluciones y las mejoras en espacios productivos, y culmina con la construcción de una maqueta del "hogar soñado". El balance de ejecución al corte se presenta a continuación.

Encuentro Específico No. 1 VMC	
# de Encuentros Realizados	Avance Meta Grupos de Formación (1.265)
1.524	92%

Tabla 18. Consolidado Encuentros Específicos VMC - Mayo 2026

Al corte, el Encuentro Específico N.° 1 alcanzó 1.524 encuentros realizados, equivalentes a un avance del 92 % sobre la meta de 1.265 grupos de formación. Durante el período, los encuentros se concentraron principalmente en Norte de Santander, Antioquia y Sucre. El valor estratégico de este espacio radica en su función preparatoria: los hogares que participan en él llegan a las visitas domiciliarias con mayor claridad sobre qué mejorar y en qué orden, lo que facilita la formulación del Plan de Inversión y eleva la calidad de las decisiones. La construcción de la maqueta del "hogar soñado", además de fortalecer la conciencia sobre el entorno, funciona como insumo visual para la planificación de las mejoras.

Planes de Inversión

Durante el período reportado, la formulación de los planes de inversión alcanzó un total de 28.261 planes, concentrados en los hogares nuevos de Norte de Santander —que reúne el 48,8 % de los planes— y con la distribución más equilibrada entre líneas de intervención desde el inicio del programa. Su distribución por línea de intervención se presenta a continuación.

Línea de intervención	% del Total (28.261)
Mejoramiento locativo	48,1%
Dotación	47,3%
Mixta (locativo + dotación)	4,7%
Total	100.0%

Tabla 19. Distribución del plan de inversión por línea de intervención VMC - Mayo 2026

Un rasgo destacado del período es la alta corresponsabilidad financiera de los hogares: el 86,0 % reportó contar con recursos adicionales al incentivo para la ejecución de sus mejoras. La distribución de la mano de obra prevista confirma que buena parte de esos recursos se orienta a los costos operativos de la intervención, lo que evidencia la capacidad del programa para catalizar inversión propia del hogar. La forma en que los hogares prevén cubrir la mano de obra de sus intervenciones se presenta a continuación.

Modalidad de mano de obra	% del Total (28.261)
Contratación con aportes propios	40,1%
No requiere mano de obra	39,8%
Apoyo familiar	19,8%
Apoyo comunitario	0,3%
Total	100,0%

Tabla 20. Modalidad de mano de obra prevista VMC - Mayo 2026

La formulación de los planes de inversión durante el período confirma que la Visita N.° 1 cumple efectivamente su función de orientación técnica: las necesidades priorizadas por los hogares (pisos, paredes y techos) guardan coherencia con las líneas de intervención seleccionadas, lo que asegura la pertinencia de la inversión frente a las condiciones reales de vulnerabilidad habitacional identificadas.

Logros VMC

Equilibrio inédito en el Plan de Inversión. Dotación (47,3%) y Mejoramiento locativo (48,1%) presentan la distribución más equilibrada desde el inicio del programa. Esto indica que el componente está llegando a un espectro más diverso de perfiles habitacionales, incorporando hogares con necesidades de equipamiento básico junto a los que requieren intervención física.

Alta corresponsabilidad financiera. El 86,0% de los hogares aporta recursos adicionales al incentivo, con el rango $300.001–$500.000 como el más frecuente (25,0%). El 64,7% de los aportes se destina a cubrir costos operativos (transporte, mano de obra), confirmando que el programa cataliza inversión privada del hogar.

Mejoras en cotización y mantenimiento en Visita N°. 3. La cotización habitual mejoró 8,7pp (77,4%) y el mantenimiento periódico 8,1pp (82,3%) frente a abril, las dos

mejoras más significativas del período en cualquier indicador continuo. Sugieren que los hogares con más recorrido en el programa consolidan los hábitos formativos clave.

Máximo indicador de apropiación en Visita N°. 4. El 96,1% de los hogares se compromete a socializar lo aprendido — el indicador de cierre más alto del programa. Proyecta un alcance de sensibilización secundaria potencial de más de 50.000 personas en el entorno familiar de los 12.521 hogares exitosos

3.4.5. Fortalecimiento Social y Comunitario (FSC)

Panorama General

Durante el mes de mayo de 2026, el componente de Fortalecimiento Social y Comunitario orientó su gestión a la consolidación, revisión y entrega de las Iniciativas de Fortalecimiento Comunitario (IFC), así como al desarrollo de los comités de aprobación adelantados con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Este proceso se erigió como uno de los principales hitos operativos y metodológicos del programa, en tanto materializó las necesidades, prioridades y propuestas construidas participativamente por las comunidades en el marco de los encuentros integrados, y viabilizó la gestión de acciones dirigidas al fortalecimiento organizativo, la participación comunitaria y el mejoramiento de las condiciones de bienestar colectivo en los territorios.

De manera complementaria, se dio continuidad a la ejecución de la ruta metodológica del componente, registrándose avances significativos en la Visita Familiar No. 4 *"Ejerciendo Nuestros Derechos",* orientada al fortalecimiento de las capacidades de las familias para el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos. En este mismo marco se llevaron a cabo los Comités de Control Social y las Mesas de Articulación Municipal, escenarios de carácter estratégico para la promoción de la participación ciudadana, la transparencia en la ejecución del programa, el seguimiento a los compromisos institucionales y la articulación con los actores clave del territorio.

Asimismo, se adelantó la nivelación de los encuentros integrados en aquellos municipios que presentaban rezagos operativos, lo cual aseguró el cumplimiento de la ruta metodológica y propició la participación efectiva de las familias beneficiarias. En conjunto, estas acciones contribuyeron a fortalecer la coordinación territorial, a sostener la dinámica de acompañamiento comunitario y a garantizar el avance progresivo hacia el cumplimiento de las metas previstas para el componente.

Actividades Desarrolladas

Visitas a Hogares

Durante mayo de 2026, el acompañamiento domiciliario del componente se concentró en el avance de la Visita No. 4 "Ejerciendo Nuestros Derechos" y en la nivelación de las jornadas previas en los municipios con rezago. El balance de la ruta al corte del mes se presenta a continuación.

FSC		
Tipo de Visita	**# de Visitas**	**% de Avance vs Familias Activas (28.213)**
Visita 1	28.339	100%
Visita 2	27.898	99%
Visita 3	24.584	87%
Visita 4	18.987	67%

Tabla 21. Reporte visitas FSC - Mayo 2026

El balance evidencia una alta cobertura en las dos primeras jornadas de la ruta —100 % en la Visita No. 1 (28.339) y 99 % en la Visita No. 2 (27.898)—, lo que indica que la casi totalidad de las familias activas ya surtió las etapas iniciales del acompañamiento. A partir de la Visita No. 3 se observa una reducción gradual en el volumen de visitas, con un avance del 87 % (24.584), que se acentúa en la Visita No. 4, situada en el 67 % (18.987). Este comportamiento escalonado es coherente con la secuencialidad de la ruta metodológica, en la que cada jornada depende de la realización de la anterior, y con el hecho de que la Visita No. 4 fue precisamente el foco del acompañamiento domiciliario durante el mes y se encuentra en pleno despliegue.

Visita N°. 4

La Visita No. 4 constituyó el eje del acompañamiento domiciliario del mes y concentró los avances cualitativos más relevantes del componente. Orientada al fortalecimiento de las capacidades familiares para el reconocimiento y el ejercicio de derechos, esta jornada permitió que los hogares identificaran necesidades relacionadas con el acceso a derechos fundamentales y ampliaran su conocimiento sobre las rutas institucionales dirigidas a la población retornada y reubicada.



Foto 17. Visita 4 FSC. Ataco, Tolima

Como resultado del proceso, se observó una mayor participación de los hogares en espacios comunitarios e institucionales, así como una disposición más activa para expresar sus necesidades, construir acuerdos y fortalecer la corresponsabilidad familiar y comunitaria. Las actividades desarrolladas favorecieron el diálogo al interior de las familias, la toma de decisiones conjuntas y la proyección de metas orientadas al mejoramiento de sus condiciones de vida, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social en los territorios.

En el marco de esta visita, el seguimiento al Plan de Vida del Hogar ocupó un lugar central: permitió que las familias reflexionaran sobre los avances alcanzados frente a las metas propuestas y fortalecieran la apropiación de sus procesos de transformación, así como la confianza en sus capacidades para gestionar soluciones y acceder a la oferta institucional disponible. De esta manera, la jornada consolidó el reconocimiento de los hogares como sujetos de derechos y reafirmó la articulación entre comunidad e institucionalidad como condición para avanzar en procesos de atención integral y reparación.



Foto 18. Visita 4 FSC. Yondó, Antioquia

Entre los principales resultados se destacan el fortalecimiento de las capacidades de autogestión y de articulación con la oferta institucional disponible en el territorio, y la identificación de necesidades prioritarias en materia de acceso a derechos, seguridad alimentaria y condiciones de habitabilidad. Como aprendizaje del periodo, se confirmó que el conocimiento de los derechos y de las rutas institucionales fortalece la capacidad de gestión y participación de las familias, y que los planes de vida familiares constituyen una herramienta clave para orientar metas y hacer seguimiento a los procesos de transformación de los hogares.

Encuentros Específicos

Encuentro Específico N.º 1 – Resiliencia y reconciliación

En el mes reportado, el componente dio continuidad a la implementación del Encuentro Específico N.º 1, que mantiene su orientación metodológica hacia el fortalecimiento de capacidades socioemocionales asociadas a la resiliencia, la convivencia y la reconciliación. El balance de ejecución al cierre del periodo se presenta a continuación.

Encuentro Específico No. 1 FSC	
# de Encuentros Realizados	**Avance Meta Grupos de Formación (1.265)**
1.058	76%

Tabla 22. Consolidado Encuentros Específicos FSC - Mayo 2026

Al corte de mayo, el Encuentro Específico N.º 1 alcanzó 1.058 encuentros realizados, equivalentes a un avance del 76 % sobre la meta de 1.265 grupos de formación, lo que representa una progresión sostenida frente a los 889 encuentros (70 %) acumulados en abril.

Bajo una metodología participativa y experiencial, el encuentro continúa privilegiando la introspección individual y la construcción colectiva, de manera que los participantes reconozcan y resignifiquen sus experiencias de vida —incluidas las asociadas al desplazamiento forzado— como punto de partida para procesos de transformación personal y familiar. Durante las sesiones del periodo se mantuvo la progresión característica de este espacio: una disposición inicial de reserva a compartir experiencias en un entorno grupal que, a medida que se consolida un ambiente de seguridad y escucha activa, da paso a una mayor apertura y participación; este tránsito confirma que el componente sigue generando condiciones reales de confianza en los territorios, requisito indispensable para procesos de reconciliación genuinos.

En consecuencia, los resultados del encuentro conservan su naturaleza cualitativa y se orientan al fortalecimiento de vínculos de confianza y empatía entre los participantes, la consolidación de dinámicas de apoyo mutuo al interior de los grupos

y una mayor disposición al diálogo y a la construcción colectiva de soluciones frente a situaciones comunes.

Talleres de Participación Ciudadana

Durante el mes de mayo de 2026, el componente dio continuidad a la implementación de los Talleres de Participación Ciudadana N.º 1 y N.º 2, que conservan su propósito y estructura metodológica y ampliaron su cobertura respecto al periodo anterior, con un mayor número de talleres realizados y, en consecuencia, una mayor participación.

Taller N.º 1 - ¿A qué vinimos?

El primer taller mantiene su objetivo de afianzar en los representantes una comprensión clara de su rol dentro del programa y del alcance de su participación como actores comunitarios. El balance de ejecución del periodo se presenta a continuación.

Talleres de Participación Ciudadana N°. 1	
# de Talleres Realizados	# de Asistentes
276	1.839

Tabla 23. Consolidado Taller de Participación Ciudadana N°. 1 - Mayo 2026

Las sesiones dieron continuidad al abordaje de la representación, el liderazgo comunitario y la gestión del Plan de Gestión Comunitaria (PGC), con énfasis en la responsabilidad de actuar como vocero y articulador entre el grupo de participantes y las instancias del programa —Mesas de Articulación Municipal y Comités de Control Social—. Con la mayor cobertura del mes (369 talleres y 2.355 asistentes, frente a 276 talleres y 1.839 asistentes en abril), se consolidó la identificación de liderazgos emergentes: representantes que, a partir de la clarificación de su rol, asumen con creciente proactividad la convocatoria de sus grupos, la comunicación de compromisos y la gestión de los procesos organizativos asociados a las IFC, avance cualitativo de alta relevancia para la sostenibilidad comunitaria del programa.

Taller N°. 2 – El ABC de la participación ciudadana

El segundo taller conserva su carácter eminentemente práctico y profundiza en el conocimiento y la aplicación de los mecanismos formales de participación ciudadana disponibles en el ámbito local: veedurías ciudadanas, mesas de participación de víctimas, consejos de política social y planes de desarrollo municipal. El balance de ejecución del periodo se presenta a continuación.

Talleres de Participación Ciudadana N°. 2	
# de Talleres Realizados	# de Asistentes
291	1.972

Tabla 24. Consolidado Taller de Participación Ciudadana N°. 2 - Mayo 2026

En línea con el periodo anterior, los participantes identificaron los espacios de participación existentes en sus municipios y analizaron cuáles resultan pertinentes para la gestión de sus necesidades como comunidades retornadas o reubicadas. Con 291 talleres y 1.972 asistentes (frente a 198 talleres y 1.312 asistentes en abril), se reafirmó el principal resultado del espacio: el reconocimiento de que la participación ciudadana no se limita al voto ni a la asistencia a reuniones, sino que implica el ejercicio activo de derechos y la incidencia en la toma de decisiones públicas, comprensión que amplía el horizonte de acción de los representantes más allá del programa FEST y fortalece su articulación con la institucionalidad local.

Jornadas de Integración Comunitaria

Jornada de Integración Comunitaria N°. 2

Durante el mes de mayo se dio continuidad a la Jornada de Integración Comunitaria N.° 2, espacio de encuentro entre participantes FEST y No FEST orientado al fortalecimiento de la cohesión social, la confianza comunitaria y la recuperación de la memoria y los saberes colectivos del territorio, cuya actividad central es el "Mural de la memoria, sabores y saberes". En el período se realizaron 613 jornadas, con una asistencia total de 13.614 personas, lo que representa un incremento significativo frente a las 334 jornadas y 7.478 asistentes registrados en abril.

Este avance evidencia la ampliación progresiva de la cobertura de la actividad en los territorios y su consolidación como uno de los espacios de mayor convocatoria del componente comunitario, manteniendo los resultados que la caracterizan: el fortalecimiento de la integración y la cohesión social, la recuperación de la memoria colectiva y de los saberes tradicionales, la promoción de espacios de diálogo y expresión comunitaria, el reconocimiento de las capacidades asociadas a la resiliencia y la alta participación de hogares FEST y No FEST.

Iniciativas de Fortalecimiento Comunitario (IFC)

Las Iniciativas de Fortalecimiento Comunitario (IFC) constituyen el principal producto comunitario del componente y traducen en acciones concretas las necesidades, prioridades y propuestas construidas de manera participativa por las comunidades a lo largo de la ruta metodológica. Durante mayo de 2026, la gestión se orientó a la consolidación documental, la revisión técnica y el seguimiento de las IFC en los municipios focalizados, con miras a su presentación ante los comités de aprobación.

Las acciones adelantadas comprendieron la verificación de soportes, los ajustes técnicos requeridos, la formulación de los planes de inversión de cada iniciativa y la preparación de los comités de aprobación liderados por el Departamento

Administrativo para la Prosperidad Social, con el propósito de garantizar la pertinencia, la viabilidad y la coherencia de las iniciativas priorizadas por las comunidades.

Al corte de mayo se registran 349 IFC formuladas en 23 municipios de nueve departamentos, de las cuales 57 fueron aprobadas en comité, mientras que las restantes se encuentran en ajuste o pendientes de comité de aprobación. El detalle por municipio se presenta a continuación.

Departamento	Municipio	No. IFC realizadas	Estado de la IFC
Antioquia	Necoclí	68	En ajuste
Antioquia	San Juan de Uraba	26	En ajuste
Antioquia	Turbo	65	Aprobadas (22)
Bolivar	San Juan de Nepomuceno	11	En ajuste
Bolivar	San Jacinto	6	Pendiente Comité
Bolivar	María La Baja	25	Pendiente Comité
Boyacá	Páez	5	Pendiente Comité
Boyacá	Cubará	3	Pendiente Comité
Cauca	El Tambo	13	En ajuste
Córdoba	Canalete	7	En ajuste
Córdoba	Moñitos	7	En ajuste
Magdalena	Aracataca	6	En ajuste
Magdalena	Chibolo	4	Aprobadas
Magdalena	Pivijay	27	Aprobadas
Magdalena	Plato	2	Aprobadas
Magdalena	Sabanas de San Ángel	9	Pendiente Comité
Magdalena	Fundación	14	Pendiente Comité
Magdalena	Pivijay	2	Aprobadas
Nariño	San Lorenzo	13	Pendiente Comité
Nariño	Tangua	6	Pendiente Comité
Nariño	Los Andes	6	Pendiente Comité
Putumayo	Puerto Guzman	5	Pendiente Comité
Sucre	Chalan	6	En ajuste
Sucre	El Roble	13	En ajuste
Total		**349**	**57 aprobadas**

Tabla 25. Consolidado de IFC por municipio - Mayo 2026

En conjunto, la formulación y consolidación de las IFC fortaleció las capacidades organizativas y de gestión de los hogares y líderes comunitarios, promovió la corresponsabilidad en la identificación y priorización de las inversiones más pertinentes, y afianzó el sentido de pertenencia y el compromiso colectivo con el desarrollo de los territorios, consolidándose como un instrumento orientado al

fortalecimiento organizativo, la integración comunitaria y el mejoramiento del bienestar colectivo.

Logros FSC

Durante mayo de 2026, las acciones del componente contribuyeron al fortalecimiento de la participación comunitaria, la apropiación de la ruta metodológica y el reconocimiento de las capacidades individuales, familiares y colectivas de los hogares. Se evidenció un mayor involucramiento de las familias en los espacios de diálogo, formación, seguimiento y toma de decisiones, reflejado en su participación en visitas, encuentros grupales, Mesas de Articulación Municipal, Comités de Control Social y procesos de formulación de las Iniciativas de Fortalecimiento Comunitario. A partir de la Visita No. 4 "Ejerciendo Nuestros Derechos", los hogares fortalecieron su conocimiento sobre el ejercicio de sus derechos y sobre las rutas institucionales disponibles para acceder a la oferta pública, promoviendo procesos de autogestión, corresponsabilidad y participación ciudadana. En la misma línea, el seguimiento a los Planes de Vida Familiares mostró un avance significativo en la capacidad de proyección de las familias hacia metas relacionadas con el bienestar familiar, el fortalecimiento productivo, el mejoramiento de vivienda y la generación de oportunidades para sus integrantes.

A nivel comunitario, la formulación y consolidación de 349 Iniciativas de Fortalecimiento Comunitario en 23 municipios de nueve departamentos —de las cuales 55 fueron aprobadas en comité y las restantes avanzan en ajuste o pendientes de aprobación— evidencia el fortalecimiento de las capacidades organizativas y de gestión de los hogares y líderes comunitarios, así como su corresponsabilidad en la identificación y priorización de las inversiones más pertinentes. Este avance se reforzó con los Talleres de Participación Ciudadana, que propiciaron la identificación de liderazgos emergentes y ampliaron la comprensión de la participación como un ejercicio activo de derechos e incidencia en lo público, y con la continuidad del Encuentro Específico No. 1, orientado a la resiliencia y la reconciliación, que favoreció la construcción de vínculos de confianza y empatía y la consolidación de dinámicas de apoyo mutuo al interior de los grupos. De esta manera se consolidaron espacios de diálogo y construcción colectiva que favorecieron la integración entre las familias, el fortalecimiento de las redes de apoyo y la articulación con actores del territorio, tales como Juntas de Acción Comunal, instituciones educativas, entidades de salud y administraciones municipales, afianzando el sentido de pertenencia, el arraigo territorial y el compromiso de las comunidades con la identificación y solución de problemáticas colectivas.

De igual manera, se evidenció una mayor apropiación de los mecanismos de participación y control social, que permitió a las comunidades expresar sus inquietudes, realizar seguimiento a los compromisos institucionales y aportar recomendaciones para el mejoramiento de las acciones implementadas, fortaleciendo la confianza entre los participantes, el programa y las entidades territoriales y promoviendo relaciones más cercanas y transparentes. Finalmente, el acompañamiento técnico y social desarrollado con los equipos territoriales permitió fortalecer las capacidades organizativas y de gestión tanto de las familias como de los gestores, mejorando la calidad de los procesos de formulación, seguimiento y consolidación de las iniciativas comunitarias, y avanzando en la construcción de propuestas orientadas al bienestar colectivo, el fortalecimiento del tejido social y la generación de soluciones comunitarias sostenibles en los territorios intervenidos.

Experiencias Destacadas

IFC vereda Punto Rojo, corregimiento de Nueva Colonia — Turbo, Antioquia

A través de una Iniciativa de Fortalecimiento Comunitario, los participantes lograron la construcción de la caseta comunal partiendo únicamente del terreno disponible y movilizando a la comunidad para unir esfuerzos en su materialización. La caseta se concibe como un escenario de reunificación y cohesión social, y el programa garantizará la dotación necesaria para su funcionamiento. El proceso fortaleció la capacidad organizativa de los participantes y el compromiso colectivo con el desarrollo comunitario, y se vio enriquecido por el acompañamiento del componente de fortalecimiento social y comunitario, que consolidó la participación y el sentido de pertenencia de la comunidad.



Foto 19. Experiencia destacada IFC en Turbo, Antioquia

4. Comunicaciones

En cumplimiento de los lineamientos del Anexo 6 (Comunicaciones y Gestión del Conocimiento) del programa Familias en su Tierra de Prosperidad Social, durante mayo de 2026 el área ejecutó las acciones estratégicas y operativas previstas en el plan de comunicaciones del Convenio 920 FIP 2024, orientadas a fortalecer la visibilidad

institucional del programa y a comunicar de manera verificable sus avances. En el periodo, los canales institucionales de PADF Colombia alcanzaron 11.029 espectadores, 14.884 visualizaciones y 420 interacciones, como se sintetiza a continuación:

11.029 Espectadores totales	**14.884** Visualizaciones	**420** Interacciones

Tabla 26. Indicadores agregados de comunicaciones - Mayo 2026

4.1. Publicaciones en Redes Sociales

El área de Comunicaciones desarrolló y entregó el 100 % de los contenidos previstos en la parrilla editorial de mayo, garantizando su oportunidad, calidad y alineación estratégica con los mensajes definidos para el programa. Previo a su difusión, se gestionó ante la supervisión del Convenio la aprobación para la publicación de los contenidos en las redes sociales institucionales de PADF Colombia, con el fin de visibilizar la continuidad y los avances del programa entre las comunidades participantes y los grupos de interés. Las piezas publicadas y sus resultados se presentan en la siguiente tabla[1]:

Pieza	Fecha	Espectadores	Visualizaciones	Alcance IG	Interacciones
Video testimonial – Katherine Hoyos, El Tambo (Cauca)	5 may.	3.322	4.918	675	171
Video – Luz Elena Sierra, Puerto Guzmán (Putumayo)	16 may.	2.471	3.472	571	140

[1] Espectadores corresponde al dato de Facebook; Alcance, al de Instagram; Visualizaciones e Interacciones consolidan ambas plataformas.

Pieza	Fecha	Espectadores	Visualizaciones	Alcance IG	Interacciones
Carrusel – campesinos participantes, Cosechando Mi Huerta	23 may.	3.540	6.494	450	109
TOTAL		**9.333**	**14.884**	**1.696**	**420**

Tabla 27. Tabla 2. Publicaciones en RR. SS. – Mayo 2026

Publicación 1. Testimonio de Katherine Hoyos – El Tambo (Cauca)

Publicada el 5 de mayo, la pieza recoge el testimonio de Katherine Hoyos, participante del corregimiento de Piagua, quien relata cómo su vinculación al programa ha fortalecido sus capacidades productivas, evidenciando el aporte de la intervención al arraigo, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de las familias rurales.

Enlaces: Instagram | Facebook

Publicación 2. Cuidado de la huerta por Luz Elena Sierra – Puerto Guzmán (Putumayo)

Publicada el 16 de mayo, la pieza presenta a Luz Elena Sierra compartiendo recomendaciones prácticas para el cuidado, mantenimiento y fortalecimiento de las huertas caseras. El contenido promovió buenas prácticas agrícolas orientadas a mejorar la productividad, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los cultivos familiares, favoreciendo la apropiación de conocimientos por parte de las comunidades participantes.

Enlaces: Instagram | Facebook

Publicación 3. Carrusel "Cosechando mi Huerta"

Publicado el 23 de mayo, el carrusel fotográfico destaca a las campesinas y los campesinos que, con su esfuerzo, mantienen vivo el campo colombiano en el marco del componente Cosechando Mi Huerta. Fue la pieza con mayor número de visualizaciones del mes (6.494).

Enlaces: Instagram | Facebook

4.2. Productos Institucionales y Branding

Como parte del fortalecimiento de la identidad visual del Convenio 920 FIP 2024, el área elaboró diversas piezas gráficas conforme a los lineamientos de marca de Prosperidad Social y PADF Colombia. Entre ellas se diseñó y diagramó la portada del informe mensual de abril de 2026, asegurando la correcta aplicación de los lineamientos de identidad visual y la presentación estandarizada de los productos técnicos del convenio.

Para la socialización de avances ante Prosperidad Social, se diseñaron una presentación ejecutiva y una infografía a partir de la información consolidada por la gerencia del convenio sobre las acciones implementadas en los 18 departamentos y 73 municipios priorizados. Estas piezas presentaron de forma clara y visual los principales resultados, los porcentajes de avance por componente y el alcance de las intervenciones con los distintos grupos poblacionales beneficiarios.

Asimismo, se produjo y editó un video de avances del programa, presentado ante la Dirección General de Prosperidad Social. La pieza integró imágenes de las jornadas de entrega de insumos del componente Cosechando Mi Huerta, evidenciando de manera dinámica el alcance territorial, la implementación de las acciones y los resultados obtenidos con las comunidades participantes.

4.3. Cubrimiento en Territorio

Articulación con líderes comunitarios – Caloto (Cauca)

Con el propósito de fortalecer la apropiación territorial del programa, se desarrolló un encuentro con líderes y lideresas de los corregimientos del municipio de Caloto (Cauca), orientado a socializar el plan de comunicaciones y a coordinar las visitas de campo para la identificación, documentación y producción de historias de éxito de las familias participantes. Esta articulación consolidó el trabajo conjunto con actores comunitarios clave y facilitó la planeación de las acciones de comunicación previstas en el territorio.

Jornada de transferencia de capacidades y fortalecimiento en comunicaciones



Foto 20.Jornada de transferencia de capacidades y fortalecimiento en comunicaciones - Mayo 2026

Los días 25 y 26 de mayo el área de Comunicaciones realizó el cubrimiento fotográfico y documental de la jornada de transferencia de capacidades y desarrolló un espacio de fortalecimiento en comunicaciones dirigido a los equipos territoriales. Durante la jornada se socializaron los lineamientos institucionales sobre el uso adecuado de la barra de logos de Prosperidad Social y FUPAD, las directrices de vocería institucional y los criterios técnicos para la captura del material fotográfico y audiovisual requerido para darle visibilidad a las acciones del programa.



Foto 21. Cubrimiento jornada de transferencia de capacidades y fortalecimiento en comunicaciones - Mayo 2026

En articulación con la supervisión del convenio por parte de Prosperidad Social, se reforzaron además los lineamientos asociados a la comunicación de los hitos estratégicos del programa y al cumplimiento de las medidas de blindaje electoral emitidas por la entidad. Estas orientaciones buscan prevenir el uso indebido de las acciones institucionales durante el periodo electoral, garantizando la transparencia, la neutralidad y la adecuada difusión de los resultados ante las comunidades y autoridades locales.

4.4. Monitoreo de Medios

Durante mayo de 2026 se realizó el monitoreo de medios y redes sociales con el propósito de identificar la visibilidad externa del programa Familias en su Tierra – FEST X y analizar su posicionamiento en la agenda pública a nivel local, regional y nacional. A diferencia de las piezas difundidas por los canales propios de PADF Colombia (numeral 4.1), este seguimiento da cuenta de la cobertura generada por terceros. En el periodo se registraron diez (10) menciones distribuidas en tres tipos de fuente: plataformas de datos abiertos del Estado (1), medios web y digitales regionales y nacionales (4) y publicaciones en redes sociales de administraciones municipales (5). El detalle de los registros se presenta a continuación:

Fecha	Fuente / Canal	Contenido	Enlace
7 may.	datos.gov.co (datos abiertos)	Publicación del conjunto de datos de beneficiarios del programa	Ver
8 may.	Periódico El Coco (web)	Socialización del programa en San Juan de Urabá (Antioquia)	Ver
14 may.	Diario La Libertad (web)	Cobertura de contexto territorial en El Salado (Bolívar)	Ver
14 may.	Facebook – Alcaldía de González	Articulación municipal y entregas a los hogares participantes	Ver
14 may.	Instagram – Alcaldía de González	Articulación municipal y entregas a los hogares participantes	Ver
22 may.	Facebook – Alcaldía de González	Huertas caseras y seguridad alimentaria (Cosechando Mi Huerta)	Ver

Fecha	Fuente / Canal	Contenido	Enlace
22 may.	Instagram – Alcaldía de González	Huertas caseras y seguridad alimentaria (Cosechando Mi Huerta)	Ver
26 may.	OvidioHoyos.com (web)	Logros del Sector de la Inclusión Social	Ver
26 may.	Ayudas10.com (web)	Cifra récord de subsidios y víctimas indemnizadas (Prosperidad Social)	Ver
27 may.	Instagram – Alcaldía de Montelíbano	Preinscripciones del programa en Montelíbano (Córdoba)	Ver

Tabla 28. Registro monitoreo de medios - Mayo 2026

La narrativa predominante fue favorable y se concentró en cuatro ejes: la socialización y preinscripción del programa en San Juan de Urabá y Montelíbano; las entregas y la articulación con las administraciones municipales en torno a las huertas caseras y la seguridad alimentaria del componente Cosechando Mi Huerta, en el municipio de González; el reconocimiento de los logros del Sector de la Inclusión Social a nivel nacional; y la publicación del conjunto de datos de beneficiarios en la plataforma de datos abiertos del Estado, en coherencia con los principios de transparencia institucional.

5. Gestión y Articulación

El programa concentró sus esfuerzos en el seguimiento a las acciones de implementación en los territorios, con énfasis en la estrategia de microlearning, el acompañamiento en la estrategia Strive y la capacitación presencial dirigida a 930 hogares con unidades productivas de cacao. De manera complementaria, se avanzó en la proyección de las jornadas de capacitación en el marco del acuerdo con el Comité de Cafeteros del Cauca, que beneficiarán a 543 familias con unidades productivas de café en los municipios priorizados de El Tambo, Cajibío y Caloto, en el departamento del Cauca.

5.1. Gestión con Aliados Estratégicos

En el periodo de reporte se desarrollaron las siguientes acciones de fortalecimiento institucional, técnico y territorial con los aliados estratégicos vinculados al programa:

Fundación Capital

Se mantuvo el acompañamiento técnico a las familias vinculadas al componente Produciendo para mi Hogar, alcanzando 12.258 espacios de orientación enfocados en la incorporación y uso práctico de herramientas digitales para el fortalecimiento de las iniciativas productivas.

Adicionalmente, se promovió el acceso y apropiación de soluciones tecnológicas orientadas a la inclusión financiera, incluyendo billeteras digitales, datáfonos, plataformas de financiamiento y recursos virtuales que contribuyen a la comercialización, administración y sostenibilidad de las unidades productivas.

Red Cacaotera

En el marco de la alianza estratégica entre FEST y la Red Cacaotera, se implementó el proceso de formación técnica en Cacao Agrosostenible dirigido a 870 hogares con unidades productivas priorizadas de cacao. Al cierre del reporte, las actividades se encontraban en ejecución, con proyección de culminación al 12 de junio de 2026.



Foto 22. Capacitación en Cacao Agrosostenible - Mayo 2026

La siguiente tabla presenta los municipios en los que se registraron jornadas de capacitación en Cacao Agrosostenible culminadas durante el periodo:

Departamento	Municipio	Lugar	Fecha
Antioquia	Turbo	Vereda El Dos	14/5/2026
			15/5/2026
			16/5/2026
		Vereda El Tres	17/5/2026
		Vereda Alto Mulato	18/5/2026
			19/5/2026
		Corregimiento Nueva Antioquia	20/5/2026
	Necoclí	Pueblo Nuevo	6/5/2026
			7/5/2026
			8/5/2026
		Vereda El Totumo	9/5/2026

Departamento	Municipio	Lugar	Fecha
			10/5/2026
		Vereda El Mellito	11/5/2026
		Vereda Vale Pava	12/5/2026
Cesar	Agustín Codazzi	Vereda Iberia	5/5/2026
		Vereda La Duda Baja	6/5/2026
		Vereda Fernanbuco	7/5/2026
	Pueblo Bello	Vereda Berlín	9/5/2026
		Vereda La Honda	11/5/2026
Magdalena	Aracataca	Vereda El Torito	13/5/2026
Tolima	Ataco	Centro poblado de Santiago Pérez	25/05/2026
	Armero	Casco urbano/ Regreso a Ibagué	22/05/2026
Norte de Santander	Tibú	Casco urbano	15/5/2026
		Casco urbano/ Regreso a Cúcuta	16/5/2026
	El Tarra	Casco urbano de El Tarra	18/5/2026
		Vereda la Campana	19/5/2026
		Vereda el Paso/ Regreso a Cúcuta	20/5/2026

Tabla 29. Jornadas de capacitación en Cacao Agrosostenible - Mayo 2026

Como principal avance del mes, se consolidó el inicio formal del proceso de formación técnica en Cacao Agrosostenible con 870 hogares. Este proceso fortalece las capacidades agrícolas de los productores vinculados al componente productivo y contribuye al mejoramiento de la productividad de las unidades de cacao en los territorios priorizados.

Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) – Formación en microlearning

Se dio continuidad a la implementación de la estrategia de Microlearning. Posterior a la vinculación inicial de los hogares y al acompañamiento territorial para facilitar su participación, la estrategia avanzó en la difusión de contenidos pedagógicos orientados al fortalecimiento de la equidad de género en el entorno rural.

La ejecución combinó el envío secuencial de contenidos por WhatsApp con el acompañamiento permanente del equipo territorial, favoreciendo la permanencia de los hogares, el seguimiento del proceso formativo y el cumplimiento del cronograma establecido.



Foto 23. Formación en microlearning - Mayo 2026

Como resultado, se logró la difusión completa de los cinco capítulos de la serie formativa a las familias vinculadas al programa, consolidando el cierre de la fase pedagógica de la estrategia de Microlearning y fortaleciendo las capacidades de los hogares FEST X.

Fundación Colombiana para el Desarrollo (FUCOLDE) – Talento humano

Las acciones del componente de talento humano y gestión territorial se orientaron al sostenimiento operativo, la articulación interna y el acompañamiento permanente de las estrategias en implementación y alistamiento en los territorios priorizados. La coordinación entre las áreas de gerencia, técnica, financiera y territorial permitió mantener la trazabilidad de las acciones desarrolladas con los aliados estratégicos.

De manera complementaria, el equipo territorial fortaleció la relación de confianza con las familias participantes mediante el acompañamiento constante a las estrategias de formación, inclusión digital y fortalecimiento productivo, favoreciendo la permanencia y participación de los hogares en las actividades del periodo.

Asimismo, la capacidad técnica e institucional del talento humano permitió dar continuidad a la gestión de alianzas estratégicas, tanto en el seguimiento a las iniciativas en marcha con Fundación Capital, Red Cacaotera y Microlearning, como en la estructuración de nuevos Memorandos de Entendimiento con Uniagraria y el Comité de Cafeteros del Cauca.

Comité de Cafeteros del Cauca

Se avanzó en la definición de los alcances de cooperación, responsabilidades institucionales, compromisos técnicos y componentes metodológicos que soportarán la ejecución de la iniciativa orientada a fortalecer la competitividad y sostenibilidad cafetera de 543 caficultores en Cajibío, El Tambo y Caloto.

En este marco, el Comité de Cafeteros del Cauca proyecta la entrega de 1.000 chapolas de café con variedades resistentes para cada uno de los 543 beneficiarios.

La iniciativa busca promover procesos de renovación y siembra nueva de café, mejorar los niveles de producción e incrementar los ingresos de las familias cafeteras del Cauca vinculadas al programa FEST. Adicionalmente, contempla la posibilidad de implementar cultivos de pancoger como plátano, yuca, maíz y frijol dentro del cafetal, contribuyendo a la seguridad alimentaria de la población rural beneficiaria.

5.2. Resultados

A partir de las acciones desarrolladas con los aliados estratégicos, el periodo reportó avances en el acompañamiento técnico a hogares, la formación en Cacao Agrosostenible, la implementación de la estrategia de microlearning y la estructuración de nuevas alianzas. Los principales resultados fueron:

- **Acompañamiento técnico a hogares:** Se realizaron 12.258 espacios de orientación a familias vinculadas al componente Produciendo para mi Hogar, enfocados en el uso práctico de herramientas digitales para fortalecer sus iniciativas productivas.
- **Inclusión digital y financiera:** Se promovió el acceso y apropiación de soluciones tecnológicas, entre ellas billeteras digitales, datáfonos, plataformas de financiamiento y recursos virtuales asociados a la comercialización y administración de las unidades productivas.
- **Formación en Cacao Agrosostenible:** Se inició el proceso de capacitación técnica dirigido a 870 hogares con unidades productivas de cacao, en el marco de la alianza con la Red Cacaotera.
- **Gestión de alianzas:** Se avanzó en la definición de alcances, responsabilidades y componentes metodológicos para la iniciativa con el Comité de Cafeteros del Cauca, orientada a beneficiar a 543 hogares cafeteros en Cajibío, El Tambo y Caloto.

En la alianza con la Red Cacaotera, el principal avance correspondió al inicio y desarrollo del proceso de formación en Cacao Agrosostenible, dirigido a hogares con unidades productivas priorizadas de cacao. Las jornadas registradas en el periodo evidencian la ejecución territorial de esta capacitación en los municipios relacionados en la tabla anterior.

En materia de articulación institucional, se avanzó en la estructuración de la iniciativa con el Comité de Cafeteros del Cauca, mediante la definición de alcances de cooperación, responsabilidades institucionales, compromisos técnicos y

componentes metodológicos. Esta gestión proyecta beneficiar a 543 hogares cafeteros en los municipios de Cajibío, El Tambo y Caloto.

Frente a la estrategia de microlearning, se completó la difusión de los cinco capítulos de la serie formativa orientada al fortalecimiento de la equidad de género en el entorno rural. La implementación combinó el envío de contenidos por WhatsApp con el acompañamiento del equipo territorial para favorecer la participación de los hogares vinculados.

6. Dificultades Operativas

Durante el mes de mayo de 2026, el desarrollo de la ruta operativa del Programa Familias en su Tierra X se vio afectado por dos tipos de condiciones territoriales que comprometieron temporal o estructuralmente la atención a hogares participantes en municipios de intervención: situaciones de orden público asociadas al conflicto armado interno y a alteraciones del orden social, y eventos climáticos derivados de la temporada invernal junto con otras afectaciones operativas de origen externo. A continuación, se presenta el balance consolidado de estas afectaciones, seguido del detalle narrativo por municipio.

6.1. Orden Público y Restricciones Territoriales

Durante el periodo se registraron once (11) eventos de orden público que comprometieron la operación territorial del programa en nueve (9) departamentos. La concentración geográfica más crítica se ubica en los departamentos de Norte de Santander, Cauca y Cesar, donde la convergencia de actores armados, restricciones de movilidad, hechos violentos y bloqueos de corredores estratégicos generó interrupciones reiteradas en las actividades de la ruta operativa. La siguiente tabla consolida los principales hechos registrados:

Departamento	Municipio	Evento	Periodo	# Hogares afectados	Actividades comprometidas	Corregimientos / Veredas
Casanare	Maní	Anuncio de control territorial y restricciones de movilidad atribuido al ELN (Frente José David Suárez)	Mayo 2026 – Vigente	30	Visitas 2, 3 y 4 (todos los componentes)	Veredas de intervención del municipio

Departamento	Municipio	Evento	Periodo	# Hogares afectados	Actividades comprometidas	Corregimientos / Veredas
Cauca	El Tambo y Cajibío	Restricciones de movilidad y riesgo para la población civil por presunto comunicado de grupo armado ilegal en municipios del Cauca	2 mayo 2026 – Vigente	875	Visitas 1, 2, 3 y 4 (PPMH, FSC, VMC) / Visitas 1 y 2 (CMH) / Encuentro Integrado 3 / JIC / Visitas de Pertinencia / Encuentro Específico 1 FSC / MAM	El Tambo: Puente Alta, Murgueitio, El Guayabo, Puerto Rico, El Ramal, Unión Gramalote, El Recuerdo, Perolindes Bajo, Piagua, La Muyunga, Alto Miraflores, Río Blanco, Uribe, Río Hondo, Cerrito, Paso Malo, Palmichal, Los Anayes, El Márquez, Seguengue, San Pedro, Gueleito, Las Guacas, El Molino, Bella Vista, Pueblo Nuevo, Tamboral, entre otras. Cajibío: El Diamante, Cacahual, La Arroyuela, El Dorado, Monterredondo, Puerta Chiquita, La Paz, Michinchal, La Independencia, San José, Altamira, entre otras.
Cesar	Chiriguaná	Bloqueo total del corredor vial San Roque – La Paz (Km 14, corregimiento Rincón Hondo)	18 mayo 2026	s. c.	Visitas y encuentros programados en zona rural	Corregimiento Rincón Hondo (Km 14 corredor San Roque – La Paz)

Departamento	Municipio	Evento	Periodo	# Hogares afectados	Actividades comprometidas	Corregimientos / Veredas
Guaviare	Miraflores	Restricciones a la movilidad y a la presencia institucional por comunicado de las FARC-EP (Estado Mayor Bloque Amazonas)	13 marzo 2026 – Vigente	24	Visitas y encuentros	Barrio Chino, Divino Niño, El Progreso, La Paz, Centro Caño Yavilla, Mateguadua Alta, Puerto Monforth y veredas Buenos Aires, Caño Majiña, La Esperanza, La Guaraperia, La Milagrosa, Lagos del Paso, Piñalito, Pueblo Nuevo, Puerto Esperanza, Puerto Nare, Yarumal
Meta	Puerto Gaitán	Paro del sector metalmecánico en campos de producción petrolera – alteraciones en disponibilidad y movilidad de hogares vinculados a la industria	1.ª semana de mayo 2026 – Vigente	360	Visitas 2, 3 y 4 (todos los componentes)	Tillava, Puerto Trujillo, Puerto Triunfo, Cuernavaca, Porvenir Rubiales, Puente Arimena, San Pedro de Arimena, Porvenir Río, Matarratón, Carimagua 1 y 2, Santa Helena
Nariño	San Lorenzo	Alteraciones de orden público por presunta presencia y expansión de grupos armados no identificados en zona rural – posible exigencia de carné para el	1 – 31 mayo 2026	45	Visitas 3 y 4 (todos los componentes)	Salinas, El Tablón del Guabo

Departamento	Municipio	Evento	Periodo	# Hogares afectados	Actividades comprometidas	Corregimientos / Veredas
		ingreso de gestores				
Nte. de Santander	El Tarra	Incursión armada en vereda Kilómetro 84 – homicidios, desapariciones, incineración de establecimiento y desplazamiento masivo de familias participantes	Última semana de mayo 2026 – Vigente	234	Visitas 1, 2, 3 y 4 (todos los componentes) / Encuentros Específicos 1 y 2 (todos los componentes) / Talleres de Participación Ciudadana	Kilómetro 84 y Kilómetro 92
Nte. de Santander	Tibú	Ataque con drones cargados de explosivos del ELN contra tropas del Ejército Nacional	24 mayo 2026	s. c.	Visitas domiciliarias / Encuentros grupales / Actividades de la ruta operativa en zona rural	Zona rural del municipio
Nte. de Santander / Cesar	Ábrego y González	Disputas entre grupos armados por control territorial – masacre en vereda Oropoma (6 personas asesinadas, incluido el líder Freiman David Velásquez)	1 – 31 mayo 2026	950	Visitas y encuentros	Todas las veredas donde residen los participantes
Sucre	San Onofre	Bloqueo de la vía nacional San Onofre – Cartagena a la altura del corregimiento de Pajonal (plantón comunitario de San Antonio)	27 mayo 2026	36	Visitas 3 y 4	Pajonal, Palo Alto, Libertad, Sabanas de Mucacal, Barranca

Departamento	Municipio	Evento	Periodo	# Hogares afectados	Actividades comprometidas	Corregimientos / Veredas
Tolima	Ataco	Deterioro progresivo del orden público asociado a operativos contra minería ilegal – enfrentamientos, bloqueos viales y restricciones de movilidad	Abril 2026 – Vigente	210	Visitas de todos los componentes / Encuentros / Visitas de Pertinencia / CCS No. 2 / MAM No. 3	Corredor Santiago Pérez con conexión a 25 veredas de intervención; afectaciones concentradas en La Dorada y El Aceituno
Tolima	Planadas	Retención del vehículo de la coordinadora zonal por actores armados y confinamiento de tres gestores por enfrentamientos activos en territorio	Mayo 2026	s. c.	Suspensión de actividades programadas en territorio	Vereda Santiago Pérez y vereda Polecito

Tabla 30. Síntesis de afectaciones territoriales por orden público - Mayo 2026

A continuación, se presenta el detalle narrativo por departamento y municipio, con los respectivos soportes documentales:

Casanare

Maní

Durante mayo de 2026, un panfleto atribuido al Frente José David Suárez del ELN generó preocupación en comunidades de Casanare, luego de que el grupo anunciara supuestas medidas de control territorial y restricciones de movilidad en horarios nocturnos para conductores y motociclistas. Esta situación representó un factor de riesgo adicional para la movilidad del equipo territorial y el desarrollo de las actividades programadas en el municipio, comprometiendo la atención de 30 familias del programa.

Soporte:

- Panfleto de grupo al margen de la ley amenaza con supuestas restricciones en municipios de Boyacá y Casanare.

Cauca

El Tambo y Cajibío

A partir del 2 de mayo de 2026, los municipios de El Tambo y Cajibío continuaron registrando afectaciones derivadas de la escalada de violencia armada y de un presunto comunicado de un grupo armado ilegal con restricciones de movilidad sobre el territorio. Durante el mes se registraron, además, hechos violentos en el corredor de la vía Panamericana en Cajibío, incluyendo el ataque al esquema de seguridad de un congresista de la República (20 de mayo) y el atentado contra una lideresa social en el sector de El Túnel (21 de mayo). En el municipio de El Tambo, el 31 de mayo tropas del Ejército destruyeron más de 25 dispositivos explosivos pertenecientes a una estructura armada ilegal en el corregimiento de La Emboscada, evidenciando la capacidad ofensiva activa de este grupo en zonas rurales del municipio. Estas situaciones comprometieron la atención de 875 familias del programa y obligaron a mantener medidas preventivas de seguridad y monitoreo permanente del contexto territorial.

Soportes:

- El procurador general pidió reforzar de manera urgente la seguridad de candidatos y actores políticos.
- Atentado contra lideresa social Jannet Mosquera.
- Operativo en Villa Rica (Cauca) – incautación de detonadores eléctricos.

Cesar

Chiriguaná

El 18 de mayo de 2026, el municipio de Chiriguaná reportó un bloqueo total en el kilómetro 14 del corredor vial San Roque – La Paz, en el corregimiento de Rincón Hondo, que impidió completamente el tránsito vehicular en esta vía departamental. Esta condición representó un riesgo para la movilidad del equipo gestor y el acceso a las comunidades participantes ubicadas en las veredas de intervención.

Soporte:

- Bloqueo total en Rincón Hondo (registro audiovisual).

Guaviare

Miraflores

Durante mayo de 2026 se mantuvieron vigentes las restricciones derivadas del comunicado emitido el 13 de marzo por las FARC-EP (Estado Mayor Bloque Amazonas), dirigido a líderes sociales, juntas de acción comunal y organizaciones sociales con jurisdicción en los departamentos de Amazonas, Putumayo, Caquetá, Meta, Vaupés, Guainía, Vichada y Guaviare. El comunicado impone restricciones directas a la movilidad y participación de líderes sociales y condiciona el ingreso de funcionarios públicos a los territorios bajo su control a autorización expresa de los estados mayores de los frentes, situación que representa un riesgo operativo grave para las 24 familias del programa ubicadas en el municipio.

Soporte:

- Comunicado de orden público – Guaviare (archivo OneDrive).

Meta

Puerto Gaitán

Durante la primera semana de mayo de 2026, el municipio de Puerto Gaitán registró un cese de actividades en varios campos de producción petrolera, promovido por integrantes del sector metalmecánico. Según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), la situación afectó el desarrollo normal de las operaciones e impactó el empleo, la cadena operativa del sector y los ingresos de las comunidades del municipio. Dado que una parte significativa de los participantes del programa se encuentra vinculada laboralmente a la industria petrolera, esta coyuntura generó alteraciones en la disponibilidad y movilidad de 360 hogares, derivando en reprogramaciones de visitas y ajustes en la logística operativa del equipo territorial durante el período.

Soporte:

- Bloqueos en campos petroleros de Puerto Gaitán ponen en riesgo empleo e ingresos para la región – El Colombiano.

Nariño

San Lorenzo

Durante el mes, el municipio de San Lorenzo presentó afectaciones de orden público asociadas a la presunta presencia y expansión de grupos armados no identificados en

la zona rural. Se reportaron restricciones a la movilidad y una posible exigencia de carné para el ingreso y la permanencia de los gestores en el territorio, con afectación sobre 45 familias del programa en las veredas Salinas y El Tablón del Guabo. La información suministrada se encuentra pendiente de verificación por parte de las autoridades locales.

Soporte:

- Reporte PONAL operativo San Lorenzo, Nariño.

Norte de Santander

El Tarra

En el transcurso del mes de mayo de 2026, la situación de orden público en el municipio de El Tarra registró una nueva escalada crítica que derivó en afectaciones directas sobre la operación del programa. Entre la noche del 31 de mayo y la madrugada del 1 de junio de 2026, un grupo armado ejecutó una incursión violenta en la vereda Kilómetro 84, en zona rural del municipio, con un saldo de dos personas asesinadas, tres desaparecidas y un establecimiento comercial incinerado. Los hechos generaron desplazamiento de familias campesinas hacia los cascos urbanos de Tibú, El Tarra y Ocaña, impactando directamente a 234 familias activas del programa. Como medida de respuesta inmediata, el equipo territorial implementó la suspensión preventiva de actividades y visitas programadas en el municipio, particularmente en las zonas ubicadas sobre la vía que conduce al corregimiento de Filo Gringo.

Soporte:

- Recrudecimiento del conflicto en El Tarra ha provocado el desplazamiento masivo de 298 familias – Caracol Radio.

Tibú

Durante mayo de 2026, el municipio de Tibú continuó siendo epicentro de acciones violentas que prolongan la crisis humanitaria del Catatumbo y mantienen activas las afectaciones sobre la operación del programa. El 24 de mayo de 2026 se registró un ataque con drones cargados de explosivos perpetrado por el ELN contra tropas del Ejército Nacional, dejando un soldado muerto y siete heridos; en el mismo operativo, las autoridades neutralizaron y destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo improvisado instalado en zona rural. Este contexto de operaciones militares activas y acciones armadas continúa limitando la movilidad del equipo gestor y el desarrollo de actividades en las zonas rurales del municipio.

Soportes:

- Nuevo ataque del ELN en Tibú deja un soldado muerto y siete heridos – Infobae.
- Ejército frustró posible atentado con explosivos en Tibú – Caracol Radio.

Ábrego (Norte de Santander) y González (Cesar)

Durante el mes, el municipio de Ábrego presentó un recrudecimiento de la situación de orden público derivado de la presencia y confrontación entre grupos armados ilegales que disputan el control territorial. Esta situación se ha evidenciado principalmente en las vías principales de acceso al casco urbano del municipio, así como en las veredas priorizadas en el programa. En este contexto, el 19 de mayo de 2026 se registró una masacre en la vereda Oropoma, sobre la vía que comunica a Ábrego con Ocaña, en la que fueron asesinadas seis personas, entre ellas el líder juvenil y campesino Freiman David Velásquez, integrante de ASUNCAT. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, este hecho ocurrió en un territorio previamente incluido en la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026, lo que confirma la persistencia del riesgo para la población civil, los liderazgos sociales y el desarrollo de actividades institucionales en el municipio. La afectación se mantiene sobre 950 familias del programa distribuidas en ambos municipios.

Soportes:

- Rechazo a la masacre en la que murió el joven líder Freiman Velásquez en el Catatumbo – Defensoría del Pueblo.
- Seis personas fueron asesinadas en el Catatumbo, entre ellas un líder social – El Espectador.

Sucre

San Onofre

El 27 de mayo de 2026 se registró el bloqueo de la vía nacional que comunica al municipio de San Onofre con la ciudad de Cartagena, específicamente a la altura de la entrada al corregimiento de Pajonal, como consecuencia de un gran plantón convocado por la comunidad de San Antonio, Sucre. La movilización, denominada “Nos tomamos la carretera municipal”, fue liderada por organizaciones de base y liderazgos comunitarios, quienes exigieron la entrega inmediata de la resolución al nuevo Consejo Comunitario elegido democráticamente, así como respuestas institucionales frente al arreglo de vías, la entrega del PAE, la garantía del transporte escolar y el acceso a agua potable, en rechazo a la Resolución N.º 110 del 4 de mayo

de 2026. La situación generó restricciones temporales a la movilidad y comprometió el desarrollo de las visitas programadas para 36 familias del programa.

Soporte:

- Reporte de coordinación zonal – plantón de San Antonio, Sucre.

Tolima

Ataco

Durante mayo de 2026 se mantuvieron vigentes las afectaciones reportadas desde abril, asociadas a operativos adelantados por la fuerza pública contra estructuras vinculadas a minería ilegal en cercanías al centro poblado de Santiago Pérez. Esta zona corresponde a un corredor vial estratégico para la operación del programa, ya que conecta aproximadamente 25 veredas con presencia de participantes. La persistencia de enfrentamientos, bloqueos sobre las vías y restricciones de movilidad incrementó el riesgo para las comunidades y para el equipo territorial, con afectaciones concentradas en las veredas La Dorada y El Aceituno, obligando a disminuir temporalmente el ritmo de visitas y actividades programadas para 210 familias.

Soportes:

- Asonada en operativo de minería ilegal en Ataco, Tolima – La FM.
- Capturadas cinco personas por minería ilegal en zona rural de Ataco, Tolima – Policía Nacional.

Planadas

Durante mayo de 2026, el municipio de Planadas registró una situación de orden público que afectó directamente al equipo del programa. En la vereda Santiago Pérez, el vehículo en que se desplazaba la coordinadora zonal fue retenido por actores armados durante el trayecto de regreso hacia el municipio de Ataco, obligándola a descender e irse en transporte particular hasta Planadas. De manera simultánea, tres gestores que se encontraban en territorio reportaron las siguientes situaciones: una gestora residente en la misma vereda quedó confinada por los enfrentamientos activos en la zona; un segundo gestor debió refugiarse en una finca de la vereda Polecito hasta que se normalizara la situación; y una tercera gestora fue requerida por la comunidad para prestar primeros auxilios a una persona herida por arma de fuego. Como medida de respuesta inmediata, se instruyó a la coordinadora permanecer en el casco urbano de Planadas hasta tanto se restablecieran las condiciones de seguridad, con la consecuente suspensión de las actividades programadas en el territorio.

Soporte:

- Reporte de coordinación zonal – Planadas (archivo SharePoint).

6.2. Condiciones Climáticas

Durante el periodo se registraron quince (14) eventos asociados a condiciones climáticas adversas y afectaciones operativas de origen externo que comprometieron la ejecución de la ruta operativa en nueve (9) departamentos, con una afectación acumulada de 3.690 hogares participantes. Los eventos abarcan crecientes súbitas, inundaciones, vendavales, deterioro de vías terciarias por temporada invernal, deslizamientos, interrupciones del servicio eléctrico y caídas de la red de telecomunicaciones, configurando un escenario de afectaciones distribuidas que exigió ajustes operativos y reprogramación de actividades. La siguiente tabla consolida los principales hechos registrados:

Departamento	Municipio	Evento	Periodo	# Hogares afectados	Actividades comprometidas	Corregimientos / Veredas
Bolívar	San Pablo	Cortes reiterados de energía eléctrica – afectación de comunicaciones y daños materiales	4.ª semana de febrero 2026 – Vigente	320	Visitas 3 y 4 (todos los componentes)	Por confirmar
Bolívar	Simití	Cortes reiterados de energía eléctrica – afectación de comunicaciones y daños materiales	2.ª semana de abril 2026 – Vigente	100	Visitas 3 y 4 (todos los componentes)	Las Brisas, Monterrey, San Blas
Caquetá	Milán	Lluvias, inundaciones y crecientes sostenidas – daños materiales en viviendas	Enero 2026 – Vigente	20	Visita de Pertinencia IFC	La Rastra, Las Margaritas, Agua Blanca
Caquetá	Solita	Lluvias, inundaciones y crecientes – daños materiales en viviendas	Mediados de marzo 2026 – Vigente	44	Visitas 3 y 4 (todos los componentes)	Brisas, Sinaí, La Amistad, La Libertad, Ángeles, Progreso, El Recreo, Marsella, La Española, Unión Sincelejo, Betania
Casanare	Chámeza	Alerta amarilla por riesgo hidrológico y	Finales de marzo	25	Visitas 2, 3 y 4 (todos los	Sinagaza, Guruvita

Departamento	Municipio	Evento	Periodo	# Hogares afectados	Actividades comprometidas	Corregimientos / Veredas
		amenaza de deslizamientos – derrumbes y crecientes súbitas	2026 – Vigente		componentes) / Visita de Pertinencia IFC	
Casanare	Maní	Alerta amarilla hidrológica por aumento de caudales y acumulación de lluvias – afectación de vías de acceso	Finales de marzo 2026 – Vigente	30	Visitas 2, 3 y 4 (todos los componentes)	Campanero, Guafal Pintado, Santa Helena, Santa María, zonas bajas de Chavinave, La Guinea (por inundación del Río Charte)
Cauca	Mercaderes	Interrupción del servicio de energía eléctrica por desenergización preventiva de la subestación de Bolívar (Cauca)	26 – 29 mayo 2026	319	Visitas en territorio / Cargue de información / Operación de equipos electrónicos / Seguimiento a hogares	Todo el municipio
Cauca	Páez	Deslizamiento en vía que comunica el casco urbano con los sectores de Ururúa y Aguablanca por la temporada de lluvias	2.ª semana de mayo 2026	s. c.	Entregas y visitas programadas para los días 18 y 19 de mayo	Ururúa, Aguablanca
Cesar	Agustín Codazzi	Temporada invernal sostenida – deterioro de vías terciarias y accesos rurales	Enero 2026 – Vigente	80	Visitas 1, 2, 3 y 4	Las Vegas, Caño Frío, Milagro Alto
Cesar	Pueblo Bello	Temporada invernal sostenida – deterioro de vías terciarias y accesos rurales	Enero 2026 – Vigente	150	Visitas 1, 2, 3 y 4	Nuevo Colón, El Hondo, Costa Rica, La Florida, Santa Tirsa, Antiguos

Departamento	Municipio	Evento	Periodo	# Hogares afectados	Actividades comprometidas	Corregimientos / Veredas
Magdalena	Chibolo	Vendaval – daños en aproximadamente 400 viviendas del casco urbano y la zona rural; pérdidas de enseres y documentos de trabajo de dos gestores del programa	Mayo 2026	400	Visitas / Encuentros / Cronograma del municipio	Casco urbano de Chibolo y zona rural
Meta	La Macarena	Alerta amarilla por inundaciones – daños materiales en viviendas y cultivos	Vigente	153	Toda la ruta operativa	San José de Caquetania, La Cristalina, Los Medios, Alto Morichal, Alto Esperanza, El Carmen, Bajo Lozada, Caño Azul, El Billar, Caño Rojo, San Antonio
Meta	Puerto Gaitán	Deterioro significativo de las vías de acceso por ola invernal – aumento de tiempos de desplazamiento y caídas de gestores en campo	1.ª semana de mayo 2026 – Vigente	360	Visitas 2, 3 y 4 (todos los componentes)	Tillava, Puerto Trujillo, Puerto Triunfo, Cuernavaca, Porvenir Rubiales, Puente Arimena, San Pedro de Arimena, Porvenir Río, Matarratón, Carimagua 1 y 2, Santa Helena
Nte. de Santander / Cesar	Ábrego y González	Lluvias torrenciales – deterioro de vías rurales	10 abril – 5 mayo 2026	949	Visitas 3 y 4 / Encuentros Integrados y Específicos / Visitas de Pertinencia	Todas las veredas donde residen los participantes

Tabla 31. Síntesis de afectaciones territoriales por condiciones climáticas - Mayo 2026

Bolívar

San Pablo

Desde la cuarta semana de febrero de 2026, cortes reiterados en el flujo eléctrico han afectado las comunicaciones del equipo técnico en el municipio de San Pablo, dificultando el contacto con los participantes y la planeación de actividades. Los cortes también han producido daños materiales en viviendas y deteriorado las condiciones de seguridad de la población. La situación permanece activa y afecta a 320 familias del programa.

Soporte:

- Reporte de coordinación zonal.

Simití

Desde la segunda semana de abril de 2026, cortes en el flujo eléctrico han afectado las comunicaciones del equipo técnico en el municipio de Simití, generando dificultades para el contacto con participantes y la planeación de actividades. Los cortes también han producido daños materiales en viviendas y deteriorado las condiciones de seguridad de 100 familias del programa.

Soporte:

- Reporte de coordinación zonal.

Caquetá

Milán

A lo largo del año 2026, el municipio de Milán ha registrado lluvias, inundaciones y crecientes de manera sostenida que han causado daños materiales en las viviendas de los participantes. La situación afecta la pertinencia de las intervenciones del componente IFC para 20 familias en las veredas de intervención.

Soporte:

- Alcaldía de Milán – Atención: temporada de lluvias en Milán, prevención y manejo.

Solita

Desde mediados de marzo de 2026, el municipio de Solita ha registrado lluvias, inundaciones y crecientes que han causado daños materiales en las viviendas de los participantes del programa. La situación permanece activa a la fecha del informe y ha afectado la realización de visitas a 44 familias distribuidas en 11 veredas del municipio.

Soporte:

- Registro fotográfico reportado por coordinación zonal – archivo OneDrive.

Casanare

Chámeza

Durante mayo de 2026, el municipio de Chámeza se mantuvo bajo alerta amarilla por riesgo hidrológico y amenaza de deslizamientos, con reporte de saturación de terrenos, inestabilidad de taludes y deterioro de vías rurales. Se identificó riesgo de crecientes súbitas en quebradas de la zona, así como dificultades de conectividad con los municipios de Recetor y Aguazul. La situación compromete la pertinencia de las intervenciones del componente IFC y la atención de 25 familias del programa en las veredas Sinagaza y Guruvita.

Soporte:

- Gobernación de Casanare – Casanare continúa alistándose para lo más fuerte del invierno.

Maní

Durante el mes de mayo de 2026, el municipio de Maní se encontró bajo alerta amarilla hidrológica debido al aumento de caudales y la acumulación de lluvias, con registros de inundaciones temporales, anegamientos y problemas de drenaje en zonas bajas. Se presentaron afectaciones en vías terciarias y corredores utilizados por los sectores ganadero y arrocero, comprometiendo la atención de 30 familias del programa.

Soporte:

- IDEAM reporta incremento de alertas por lluvias en la jurisdicción de Corporinoquia.

Cauca

Mercaderes

Entre el 26 y el 29 de mayo de 2026 se presentó la interrupción del servicio de energía eléctrica debido a la desenergización preventiva de la subestación de Bolívar (Cauca), ocasionada por el ingreso no autorizado de terceros y por condiciones que comprometían la seguridad del personal técnico. Esta situación afectó el desarrollo de las visitas en territorio, el cargue de información y la operación de los equipos electrónicos para 319 familias del programa.

Soporte:

- TV Norte Noticias – Restablecimiento del servicio de energía en el sur del Cauca.

Páez

Durante la segunda semana de mayo de 2026, un deslizamiento sobre la vía que comunica el casco urbano de Páez con los sectores de Ururúa y Aguablanca, ocasionado por la temporada de lluvias, generó afectaciones en la movilidad e impidió el acceso a estos dos territorios. La situación comprometió el desarrollo de las entregas y visitas programadas para los días 18 y 19 de mayo en las zonas afectadas.

Soporte:

- Reporte de coordinación zonal – Páez.

Cesar

Pueblo Bello y Agustín Codazzi

Desde el inicio del año 2026, los municipios de Pueblo Bello y Agustín Codazzi han enfrentado una fuerte temporada invernal que ha generado afectaciones en las vías terciarias y accesos rurales. Las lluvias han dificultado el desplazamiento del equipo territorial hacia las veredas y corregimientos focalizados, ocasionando retrasos en los tiempos de movilización, limitaciones para el ingreso de vehículos y la necesidad de reprogramar actividades operativas en territorio. La afectación ha comprometido la atención de 150 familias en Pueblo Bello y 80 en Agustín Codazzi, con una duración indefinida dado que la temporada invernal ha sido sostenida a lo largo del año.

Soporte:

- Registro fotográfico reportado por coordinación zonal – Codazzi.

Magdalena

Chibolo

Durante el mes de mayo de 2026, el municipio de Chibolo fue afectado por un fuerte vendaval que ocasionó daños en aproximadamente 400 viviendas del casco urbano, además de un número aún no cuantificado de afectaciones en la zona rural. El evento generó levantamiento de techos, agrietamiento de paredes, colapsos totales y parciales de viviendas, así como caída de árboles en diferentes sectores del municipio. Entre los afectados se contaron dos gestores del programa, quienes reportaron pérdidas considerables de enseres personales y documentos de trabajo en sus viviendas. Esta situación generó afectaciones directas sobre el cronograma de actividades programadas y el cumplimiento de metas del período.

Soporte:

- Reporte de coordinación zonal – Chibolo (archivo SharePoint).

Meta

La Macarena

De manera paralela a las afectaciones de orden público, La Macarena mantiene activa una alerta amarilla por inundaciones en varias veredas del municipio. Las lluvias y crecientes súbitas han causado daños materiales en viviendas y cultivos de los participantes del programa, comprometiendo la totalidad de la ruta operativa para 153 familias.

Soporte:

- Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Puerto Gaitán

Durante mayo de 2026, la operación del programa en el municipio de Puerto Gaitán se vio afectada principalmente por la temporada invernal, que ocasionó un deterioro significativo de las vías de acceso a las veredas del municipio. Como consecuencia, los tiempos de desplazamiento aumentaron considerablemente, llegando en algunos casos a duplicarse respecto a los recorridos habituales, con afectaciones físicas para los gestores derivadas de caídas durante el tránsito por vías en mal estado. Esta situación limitó la capacidad operativa de los equipos territoriales y redujo el número de visitas posibles por jornada para 360 familias en territorios rurales priorizados.

Soporte:

- Gobernación del Meta – Ola invernal.

Norte de Santander / Cesar

Ábrego y González

Entre el 10 de abril y el 5 de mayo de 2026, lluvias torrenciales afectaron la movilidad hacia las veredas de los municipios de Ábrego y González, generando dificultades de acceso por el deterioro de las vías rurales. Esta situación se sumó a las condiciones de orden público documentadas, agravando el rezago operativo para las 949 familias atendidas en ambos municipios.

Soporte:

- Reporte de coordinación zonal.

7. Próximas Actividades

Para el mes de junio de 2026, la programación de la ruta operativa del programa contempla dar continuidad al avance de los cuatro componentes y consolidar los procesos de formación, articulación y participación comunitaria, de acuerdo con las siguientes líneas de trabajo.

En la ruta de visitas domiciliarias se continuará con las Visitas N.° 3 en los cuatro componentes y con las Visitas N.° 4 en todos los componentes, con excepción de Cosechando mi Huerta. Asimismo, se iniciarán las Visitas N.° 5 en los componentes Produciendo para mi Hogar y Fortalecimiento Social y Comunitario, correspondientes a las etapas de seguimiento y profundización de la ruta.

En materia de formación grupal, se continuará con la implementación del Encuentro Específico N.° 2 en los componentes Cosechando mi Huerta y Produciendo para mi Hogar. En este último se desarrollarán, además, los Talleres de Habilidades para la Asociatividad N.° 1 y N.° 2. De igual manera, en Cosechando mi Huerta se proseguirá con las entregas del incentivo en especie para el establecimiento de las Unidades Productivas para Autoconsumo (UPA).

En el marco del componente de Fortalecimiento Social y Comunitario se desarrollarán las Jornadas de Integración Comunitaria (JIC) N.° 2 y los Talleres de Participación Ciudadana N.° 1 y N.° 2, orientados al fortalecimiento de las capacidades organizativas, la cohesión social y la participación ciudadana de las familias participantes.

Finalmente, en cuanto a los espacios de articulación interinstitucional y control social, se llevará a cabo la tercera Mesa Productiva de Articulación Interinstitucional (MPAI), se finalizarán los Encuentros Integrados N.° 3 y se dará continuidad a los Comités de Control Social N.° 2 y a las Mesas de Articulación Municipal N.° 3, escenarios clave para la transparencia en la ejecución del programa y la articulación con los actores estratégicos del territorio.

8. Conclusiones

Al cierre de mayo de 2026, el programa cruzó un umbral significativo: el paso de la planeación a la materialización tangible de las intervenciones. A diferencia de los meses previos —centrados en la formulación de los planes de inversión y en la preparación de las condiciones—, mayo concentró el inicio de la entrega efectiva de incentivos y de la ejecución de las mejoras. La dispersión de insumos de Cosechando mi Huerta arrancó con 3.123 Unidades Productivas para Autoconsumo entregadas; las Iniciativas de Fortalecimiento Comunitario transitaron de la formulación a la aprobación, con 55 de 349 iniciativas ya avaladas en comité; y los planes de inversión de Vivir mi Casa alcanzaron su distribución más equilibrada hasta la fecha entre mejoramiento locativo (48,1 %) y dotación (47,3 %), señal de que el componente atiende un espectro más amplio de perfiles habitacionales. Este giro se produjo, además, sobre una base ya consolidada: el cierre de la vinculación e inscripción en KOKAN fijó el universo definitivo de 28.213 hogares activos, lo que otorga estabilidad y previsibilidad al resto de la ejecución.

Los hallazgos del mes confirman que la apropiación de los hogares continúa profundizándose y se expresa cada vez más en decisiones y comportamientos propios. En Produciendo para mi Hogar, las familias asumieron una autopercepción empresarial —gestionando costos, precios, clientes y alianzas— con niveles de comprensión superiores al 99 % en los bloques comerciales del modelo CANVAS; en Vivir mi Casa, el 86 % de los hogares comprometió recursos propios adicionales al incentivo; y en Cosechando mi Huerta se observaron casos de apropiación anticipada, con familias que adecuaron el terreno y prepararon el suelo antes de recibir los insumos. Este patrón —inversión propia, planeación autónoma y disposición proactiva— refuerza la perspectiva de sostenibilidad de las intervenciones más allá del horizonte contractual.

La ejecución, sin embargo, siguió condicionada por factores externos que exigen gestión activa. Las afectaciones de orden público asociadas al conflicto armado —con restricciones de movilidad en municipios como Ataco, San Lorenzo, Tibú y El Tarra— y los eventos climáticos de la temporada invernal, que deterioraron las vías y limitaron el acceso a las zonas rurales, generaron retrasos y reprogramaciones que fueron atendidos mediante el ajuste de las rutas de trabajo y el fortalecimiento del seguimiento remoto. La persistencia de estas condiciones en territorios estratégicos obliga a mantener márgenes de reprogramación que no comprometan las metas.

Finalmente, mayo introdujo un factor determinante para el cierre del programa: dado que la vigencia del convenio se proyectaba hasta el 31 de julio de 2026, FUPAD adelantó las gestiones técnicas, administrativas y financieras necesarias para obtener su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026, condición indispensable para culminar las actividades pendientes, el cierre de las Visitas N.° 3 y N.° 4, el inicio de las Visitas N.° 5 en Produciendo para mi Hogar y Fortalecimiento Social y Comunitario, la continuidad de la dispersión en Cosechando mi Huerta y la formulación de las IFC, y asegurar la adecuada graduación de los hogares. Con una base consolidada, una ejecución que ya se traduce en entregas concretas y una articulación sostenida entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, FUPAD y los equipos territoriales, el programa cierra mayo en condiciones técnicas y operativas favorables para avanzar hacia el cumplimiento de la ruta operativa.

Nombre: Diego Mauricio Ramírez Moreno

Firma del Representante Legal de FUPAD

Nombre: John Mario López Alarcón

Firma del Gerente de convenio
