Pasca, 3 de agosto de 2026
Oficio No. **P130-349-2026**

Arquitecta,
**YESENIA HERREÑO BERNAL**
Gerente del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU)
Ingeniera,
**SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ**
Supervisora del convenio 840-2025
sandra.castillo@cundinamarca.gov.co
**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA.**
Bogotá, Cundinamarca
comunicacionesiccu@gmail.com

**Referencia:** Convenio Interadministrativo No. ICCU-CTO-840-2025 "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA ARGENTINA A LA VEREDA LA ESPERANZA EN EL SECTOR TRES ESQUINA DEL MUNICIPIO DE PASCA CUNDINAMARCA"

**Asunto:** Solicitud de suspensión temporal del Convenio Interadministrativo No. 840 de 2025.

Reciba un cordial saludo de parte de la Administración Juntos Podemos, deseándole éxito en sus actividades diarias.

En atención al Convenio Interadministrativo No. ICCU 840-2025, de manera atenta nos permitimos solicitar la suspensión temporal por el término de un (1) mes y medio de su ejecución, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en ejecución el Contrato de Obra No. 083-2026, cuyo objeto corresponde a la Construcción del Puente Vehicular La Esperanza, municipio de Pasca, departamento de Cundinamarca, derivado del Convenio ICCU-293-2025.

La vía objeto del mejoramiento mediante el Convenio ICCU 840-2025 constituye el acceso principal para el ingreso de maquinaria, equipos y vehículos requeridos para la ejecución de la obra del Puente Vehicular La Esperanza. En consecuencia, la ejecución previa de la placa huella implicaría que el tránsito permanente de maquinaria pesada sobre la estructura recientemente construida podría generar afectaciones que no corresponden al uso normal previsto para la obra.

En ese sentido, se considera técnicamente conveniente que las actividades relacionadas con la construcción del puente alcancen un mayor grado de ejecución antes de iniciar las obras correspondientes al Convenio ICCU 840-2025, evitando así que el tránsito de maquinaria pesada comprometa las condiciones de la placa huella y genere posibles afectaciones que excedan el alcance de las garantías previstas para el contrato.

Por lo anterior, esta Administración Municipal solicita la suspensión temporal del Convenio Interadministrativo No. ICCU 840-2025 por el término de un (1) mes y medio, tiempo durante el cual se espera avanzar en las actividades de mayor impacto de la construcción del Puente Vehicular La

Esperanza, permitiendo posteriormente la ejecución del mejoramiento vial en condiciones técnicas más favorables.

Como soporte de la presente solicitud, se anexa imagen de ubicación en la que se señalan el tramo objeto del Convenio Interadministrativo No. ICCU 840-2025 y la ubicación de la obra correspondiente al Contrato de Obra No. 083-2026, evidenciando la relación entre ambos proyectos.

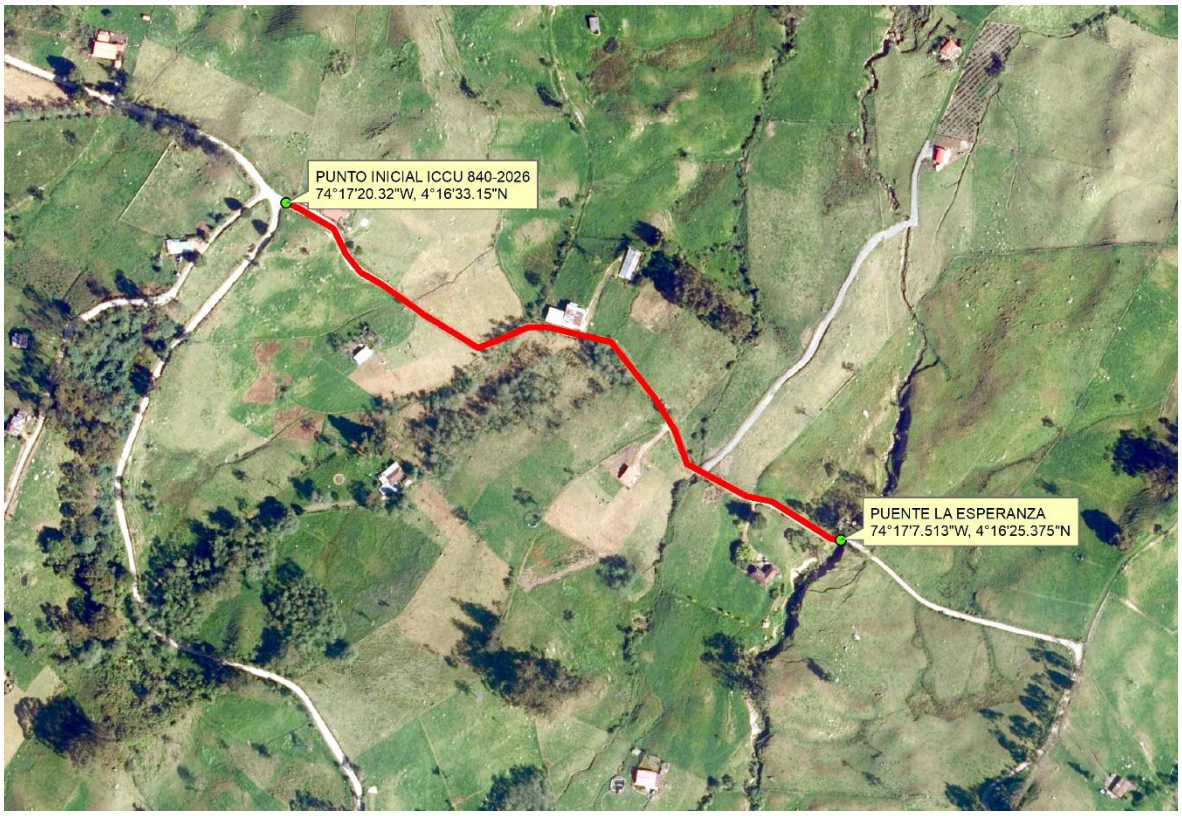



Imagen 1. Ubicación del tramo objeto del Convenio ICCU 840-2025 y de la obra Puente Vehicular La Esperanza.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos al trámite correspondiente para la formalización de la suspensión temporal del convenio.

Atentamente,

**JONATHAN ALFONSO PARRA FORERO**
**Alcalde Municipal**

| | | |
|---|---|---|
| **Aprobó:** | **Brian José Dorado Melo - Secretario de Planeación e Infraestructura** | **Fecha: 3 de agosto de 2026** |
| **Revisó:** | **Brian José Dorado Melo - Secretario de Planeación e Infraestructura** | **Fecha: 3 de agosto de 2026** |
| **Proyectó:** | **Maria Fernanda Avellaneda Orozco - Contratista** | **Fecha: 3 de agosto de 2026** |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes. | | |

PASCA, 03 DE AGOSTO DE 2026

Señores
MUNICIPIO DE PASCA
Cra. 1 No. 2 - 06 Centro
Pasca - Cundinamarca
Ingeniero,
**BRIAN JOSÉ DORADO MELO**
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor.

**Referencia:** Convenio Interadministrativo No. ICCU-CTO-840-2025 "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA ARGENTINA A LA VEREDA LA ESPERANZA EN EL SECTOR TRES ESQUINA DEL MUNICIPIO DE PASCA CUNDINAMARCA"

**Asunto:** Solicitud de suspensión temporal del convenio Interadministrativo No. 840 de 2025.

Cordial saludo, en mi calidad de contratista del contrato en referencia solicito de manera atenta la suspensión temporal por termino de (1) mes y medio de su ejecución, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en ejecución el Contrato de Obra No. 083-2026, cuyo objeto corresponde a la Construcción del Puente Vehicular La Esperanza, municipio de Pasca, departamento de Cundinamarca, derivado del Convenio ICCU-293-2025.

La vía objeto del mejoramiento mediante el Convenio ICCU 840-2025 constituye el acceso principal para el ingreso de maquinaria, equipos y vehículos requeridos para la ejecución de la obra del Puente Vehicular La Esperanza. En consecuencia, la ejecución previa de la placa huella implicaría que el tránsito permanente de maquinaria pesada sobre la estructura recientemente construida podría generar afectaciones que no corresponden al uso normal previsto para la obra.

En ese sentido, se considera técnicamente conveniente que las actividades relacionadas con la construcción del puente alcancen un mayor grado de ejecución antes de iniciar las obras correspondientes al Convenio ICCU 840-2025, evitando así que el tránsito de maquinaria pesada comprometa las condiciones de la placa huella y genere posibles afectaciones que excedan el alcance de las garantías previstas para el contrato.

cordialmente,

DIEGO ARMANDO ROMERO PORRAS
C.C. No. 1.010.184.700 de Bogotá D.C.
Representante Legal ROMING S.A.S.

Gmail

secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion <secretariadeplaneacion@pasca-cundinamarca.gov.co>

# Solicitud de suspensión temporal del Convenio Interadministrativo No. 840 de 2025

1 mensaje

**secretariadeplaneacion secretariadeplaneacion** <secretariadeplaneacion@pasca-cundinamarca.gov.co> 4 de agosto de 2026 a las 9:44
Para: sandra.castillo@cundinamarca.gov.co, Comunicaciones ICCU <comunicacionesiccu@gmail.com>

Cordial saludo

Por medio de la presente adjunto  Solicitud de suspensión temporal del Convenio Interadministrativo No. 840 de 2025.

--
**Cordialmente,**


**ING. BRIAN JOSE DORADO MELO**
***Secretario de Planeación E Infraestructura***
***Municipio de Pasca - Cundinamarca***
***http://www.pasca-cundinamarca.gov.co/***


**2 adjuntos**

**OFICIO 349 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 840 DE 2025.pdf**
529K

**SOLICITUD DE SUSPENSION.pdf**
349K
