	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/26

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	13/07/26				
INFORME No.	6	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	1/06/26	Y EL	30/06/26
OBJETO DEL CONTRATO	FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO (PORH) DE LA CORRIENTE PRINCIPAL DEL RÍO SOGAMOSO Y SUS PRINCIPALES TRIBUTARIOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS).				
ESTADO	EN EJECUCIÓN		PLAZO INICIAL CONTRATO	12 meses	
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA		VALOR INICIAL CONTRATO	$	2.712.674.896,00
PROCESO No.:	CM2-019-2025		FECHA DE INICIO:	31/12/25	
CONTRATO No.:	Contrato de consultoría No. 01511-2025		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/12/26	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PORH SOGAMOSO		LOCALIZACIÓN	Santander	
NIT CONTRATISTA:	902.020.735-2		SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	HERNANDO LEGUIZAMON	
LINK DE PROCESO	https://acortar.link/1U99m4		APOYO SUPERVISIÓN	CHRISTIAN BONILLA	

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	21/12/25	31/12/25	30/12/26	12				


2. EJECUCION PRESUPUESTAL

		ADICIONES			
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00				
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 0,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 2.712.674.896,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 2.712.674.896,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 2.712.674.896,00				
VALOR PAGADO:	$ 0,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 2.712.674.896,00				
% POR PAGAR	100,00%				
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
TOTAL		$ -

3. CURVA "S"

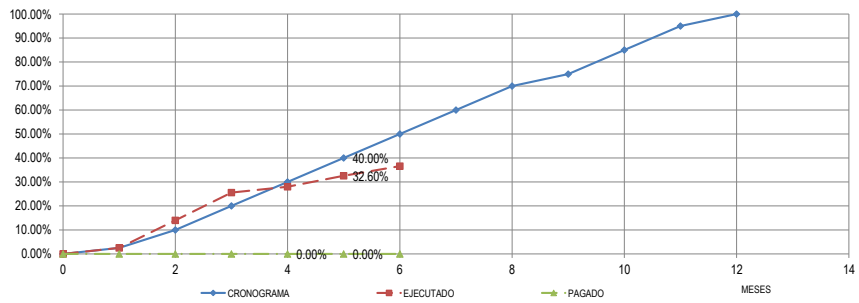

MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	2,50%	2,50%	0,00%
2	10,00%	14,00%	0,00%
3	20,00%	25,60%	0,00%
4	30,00%	28,00%	0,00%
5	40,00%	32,60%	0,00%
6	50,00%	36,60%	0,00%
7	60,00%		
8	70,00%		
9	75,00%		
10	85,00%		
11	95,00%		
12	100,00%		

PROGRAMADO	50,00%	
EJECUTADO	36,60%	
ATRASOS	-13,40%	
DESEMPEÑO		0,73
% PAGADO A LA FECHA	0,00%	
Pendiente por Ejecutar total	$	2.712.674.896,00
% POR CANCELAR A LA FECHA	100,00%	
Índice de avance financiero		0,00

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

En el marco del seguimiento realizado, se informa que la consultoría ha cumplido con actividades clave orientadas al fortalecimiento del proyecto, entre las cuales se destacan:

ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO, ALCANZANDO UN TOTAL DE 242 REGISTROS, CORRESPONDIENTES AL 50 % DE LA META PROGRAMADA.

EVANTAMIENTO, VERIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA DE LOS USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO MEDIANTE TRABAJO DE CAMPO.

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL RECURSO HÍDRICO, INCLUYENDO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y OTRAS OBRAS DE SANEAMIENTO.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO.

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PTAR Y PTAP SUMINISTRADA POR LAS ENTIDADES COMPETENTES.

VANCE EN LA ESTIMACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA TOTAL, OFERTA HÍDRICA DISPONIBLE E INDICADORES DE ESTADO.

* CONTINUIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE RECARGA DEL ACUÍFERO E INTERACCIONES ENTRE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

LABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES DE LOS ÍNDICES DE CALIDAD DEL AGUA (ICA), BMWP/COL Y ASPT PARA LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA

IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE LAS PROBLEMÁTICAS Y CONFLICTOS DERIVADOS DEL RECURSO HÍDRICO PARA LOS DIFERENTES NÚCLEOS TERRITORIALES DEL ÁREA DE ESTUDIO.

CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA BASE DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO DEL PORH.


CONTINUIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE RECARGA E INTERACCIÓN ENTRE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS.

EGUIMIENTO AL AVANCE CONTRACTUAL, ALCANZANDO UN AVANCE ACUMULADO DEL 36,6 %, FRENTE AL 44,6 % PROGRAMADO PARA EL MES DE JUNIO, EVIDENCIÁNDOSE UN REZAGO DEL 8,0 %.

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>



ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO



MIENTO Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE INFRAEST



CARACTERIZACIÓN DE PTAR

ESTIMACIÓN DE LA OFERTA HÍDRICA

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE RECARGA DEL ACUÍFERO

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA

EVALUACIÓN BIOLÓGICA DEL RECURSO HÍDRICO



IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE PROBLEMÁTICAS Y CONFLICTOS



COMUNICACIONES OFICIALES DEL PERÍODO

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: **HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO**

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	Christian David Bonilla Beltrán	Director Interventoria	

REVISO:	Hernando Leguizamon Galindo	R/L Interventoria	
V.B:			
