ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 7	
Hora: 8:30 a.m	**Fecha: 15 de abril de 2026**
Lugar:	Virtual – Plataforma Teams
Dependencia que Convoca:	Grupo Interno de Trabajo de Prevención – Primera infancia Centro Zonal Urabá
Proceso:	Promoción y prevención
Objetivo:	Realizar seguimiento a las acciones técnicas, administrativas y financieras del contrato 050204172025 de la FUNDACIÓN EDUCATIVA SOY PAZ su ejecución y prestación del servicio de los meses febrero y marzo del 2026

Agenda:

1. Saludo y presentación del objetivo.
2. Revisión de los participantes
3. Lectura y seguimiento a compromisos comité anterior
4. Aspectos financieros:
Ejecución presupuestal: Inejecuciones, ahorro y descuentos.
Seguimiento de aportes contrapartida
Legalización de cuentas.
5. Aspectos técnicos:
Seguimiento a las atenciones priorizadas y registro en el sistema de información cuéntame.
Sistema de información cuéntame – Prescripción de los usuarios.
Componente de calidad ambientes educativos y protectores
Seguimiento a la adquisición y uso de la dotación.
Seguimiento a la cobertura atendida de los meses de febrero y marzo, registro del RAM en el sistema de información cuéntame.
Componente de calidad talento humano
Seguimiento a novedades en contratación del talento humano y aprobación de perfiles (Hojas de vida)
Seguimiento al cronograma de las jornadas de reflexión pedagógica.
Componente de calidad Salud y nutrición
Seguimiento a la toma de medidas antropométricas y seguimiento a los casos identificados de desnutrición aguda o severa
Seguimiento adecuaciones en los ciclos de menús.
Seguimiento a compras locales.
Socialización de la entrega de los alimentos de alto valor nutricional.
Componente de calidad Familia comunidad y redes
Seguimiento al ejercicio de control social.
seguimiento al plan de formación a familias**.**
Seguimiento a los casos identificados y reportados por presunta amenaza, vulneración o inobservancia de derechos de niñas y niños
Revisión de los casos de usuarios fallecidos, haciendo lectura y análisis de la atención brindada desde la EAS y la activación de rutas que se hayan realizado.
Seguimiento a la matriz de riesgo del contrato.
Seguimiento a las obligaciones contractuales (cumplimiento y acciones correctivas por parte de la EAS)
Socialización situaciones identificadas en visitas de supervisión.
6. Decisiones y varios

PUBLICA

Desarrollo:

Se da inicio al comité técnico operativo de seguimiento con un cordial saludo, por la supervisora del contrato del Centro Zonal Urabá - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Sully Johana Lopez Jimenez, dando la bienvenida a los presentes, agradeciendo la participación y disponibilidad.

Saludo y presentación del objetivo.

Seguidamente el profesional Lucy Mena Palacios, enlace de seguimiento a la ejecución técnica, da lectura al objetivo que es: Realizar seguimiento a las acciones técnicas, administrativas y financieras del contrato 050204172025 de la FUNDACIÓN EDUCATIVA SOY PAZ su ejecución y prestación del servicio de los meses febrero y marzo del 2026

Revisión de participantes: Dando continuidad al comité la profesional Lucy Mena Palacios, procede a dar paso a cada uno de los profesionales para su respectiva presentación.

Los cuales se relacionan así y se detallan en listado de asistencia

Equipo ICBF

- Sully Johana Lopez Jimenez, Supervisora del contrato de aporte Centro Zonal Urabá
- Julio Cesar Páez Sinitave, Enlace de seguimiento a la Ejecución Financiero
- Lucy Mena Palacios, Enlace de seguimiento a la Ejecución Técnica

Equipo Fuedupaz

- Haiver Cuesta Moya, en calidad de representante legal
- Merling Sancez - coordinadora General
- Yudis Arboleda – Financiera
- Deyis Mercado - Nutricionista

La profesional Lucy Mena Palacios, enlace de seguimiento a la ejecución técnica da lectura a los compromisos del comité anterior, el cual se detalla a continuación y se le dio cumplimiento

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.	EAS Fuedupaz	Durante la ejecución del contrato de aporte
Enviar soporte de entrega de botiquines a las UDS	EAS Fuedupaz	Mes de junio

Aspectos financieros

La EAS socializa que: El valor del contrato de aportes corresponde hasta la suma de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE (884.636.519)** el cual se encuentra discriminado de la siguiente manera:

- Parala vigencia 2025, la suma de **CIENTO UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE (101.745)**

PÚBLICA

- Para la vigencia 2026, la suma de **OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (867.188.960)**
- **Aporte a contrapartida por un valor de DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCEPESOS M/CTE, (17.345.814)**

Ejecución presupuestal: Inejecuciones, ahorro y descuentos.

De los cuales se cuenta con una ejecución de enero a marzo, por un valor de $ 310.665.740, correspondiente al 35,82%, del valor total del contrato. Frente a las legalizaciones a la fecha se tienen pendiente los meses de enero, febrero y marzo.

Frente a la ejecución de los meses de enero febrero y marzo presentamos el valor ejecutado

	EJECUCION
ENERO	$ 101.881
FEBRERO	$ 146.982.601
MARZO	$ 163.581.258
	$ 310.665.740

Seguimiento de contrapartida o valor técnico agregado

La EAS presentó propuesta de los aportes de contrapartida que por valor de DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. ($ 17.345.814), correspondiente al 2% de los aportes asignados por el ICBF

VALOR PRESUPUESTADO EN CONTRAPARTIDA	
Bienes y Servicios (kit botiquines y Extintores)	$ 17.345.889,00
TOTAL CONTRAPARTIDA	**$ 17.345.889,00**

A continuación, se relacionan la dotación de botiquines y extintores de la contrapartida: CONTRAPARTIDA FAMILIAR			COTIZACIONES	
CONCEPTO	CANTIDADES	Proveedor # 1 SANANDRESITO 2	Proveedor #2 BLESSING DOTACIONES Y SUMINISTROS S.A.S	Proveedor #3 YORIBER S.A.S
BOTIQUINES Y EXTINTORES	11 11	$ 17.661.699,00	17.345.892,00	$ 17.612.585,00

Seguimiento a legalización de cuentas

El profesional del rol financiero del ICBF, Julio Páez refiere a la fecha de los meses en ejecución se cuanta legalizado el contrato de aporte

Aspectos técnicos

Seguimiento a las atenciones priorizadas y registro en el sistema de información cuéntame

Respecto a las atenciones priorizadas, las cuales tienen que ver con la garantía de derechos de niñas y niños relacionados con que cuenten con su documento de identidad, acceso a libros, afiliación vigente al sistema de salud, seguimiento al crecimiento y desarrollo, esquema de vacunación, evaluación nutricional, formación a familias y educación inicial.

Con base en la información analizada con corte a 30 de marzo del presente año, se evidencia un cumplimiento del 100 % en cada uno de estos aspectos para el presente contrato como se describe en la siguiente tabla:

Ítem	Porcentaje de cumplimiento
Documento de identidad	100%
Acceso a libros	100%
Afiliación vigente a salud	100%
Crecimiento y desarrollo	100%
Vacunas	100%
Seguimiento nutricional	100%
Formación a familias	100%
Educación inicial	100%

Seguimiento a la cobertura atendida de los meses de febrero y marzo registro del RAM en el sistema de información cuéntame

Con relación a la cobertura se presentó de la siguiente manera:

COBERTURA ATENTIDAD 2041	
FEBRERO	MARZO
375	388

Componente de calidad ambientes educativos y protectores

Con relación a el componente ambiente educativos y protectores se realiza el plan de riesgo, protocolo de accidentes, se socializan y se le hace seguimiento de las situaciones atípicas presentada en el municipio

y el certificado de no ocurrencia de presuntos hechos de violencia, lecciones o fallecimiento de los usuarios.

Seguimiento a la adquisición y uso de la dotación.

La EAS manifiesta que cuenta con dotación de material pedagógico, material didáctico extintores, botiquines y demás elementos necesarios para garantizar una atención con calidad.

Seguimiento de los eventos que afecten la permanencia o atención de las niñas, los niños y las mujeres gestantes.

No se ha presentado eventos que afecten la permanencia o atención de las niñas, niños y las mujeres gestantes.

Realizar seguimiento al talento humano contratado de acuerdo con la relación técnica y relacionar las novedades presentadas en los meses de ejecución (incapacidades, ingresos y egresos del talento humano que se dieron posterior a la aprobación inicial)

Se cuenta con el talento de acuerdo con los cupos (399) del contrato de aporte de la siguiente manera:

EIH 2041		
PERFILES	TH CONTRATADO -FEBRERO	TH CONTRATADO - MARZO
COORDINADOR PEDAGOGICO	1	1
APOYO PSICOSOCIAL	2	2
APOYO EN SALUD Y NUTRICION	2	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1
AGENTES EDUCATIVOS	8	8
AUXILIAR PEDAGOGICO	8	8

Es importante mencionar que presentaron tres ingresos de talento humano en el servicio de EIH, después de la aprobación del talento humano inicial.

Revisar, aprobar y hacer seguimiento al cronograma de las jornadas de reflexión pedagógica

Con relación a las jornadas de reflexión pedagógica, se adjunta el cronograma del servicio de EIH.

CRONOGRAMA DE LAS JORNADAS PEDAGÓGICAS				
Temas de la jornada	**Propósito**	**Responsable**	**Duración**	**Tiempo**
- Proyecto pedagógico y Plan de acompañamiento grupal y familiar	Orientar al talento humano sobre lo que nos permite definir el proyecto pedagógico. (el sentido para la planeación y organización de las practicas) Profundizar en la importancia que tienen los planes de acompañamiento grupal y familiar y en las practicas trazadoras para este proceso Reflexionar sobre el quehacer profesional.	Coordinador pedagógico	4 horas	Febrero
- Planeación pedagógica (Practicas de cuidado y crianza). **- Ambientes pedagógicos**	Dotar de herramientas metodológicas al talento humano para la construcción de las planeaciones pedagógicas. Orientar al talento humano sobre la importancia de la exploración de los elementos de los materiales estructurados y no estructurados. Reflexionar sobre el quehacer profesional.	Coordinador pedagógico	4 horas	Marzo

seguimiento al plan de cualificación del talento humano

Se realiza plan de cualificación al talento humano, la cual consiste en cualificar o capacitar al talento humano sobre los temas que se van a realizar durante el mes con las familias, la cual se le hace seguimiento a través de actas informativas de la jornada. Se adjunta plan de cualificación al talento humano.

GOBIERNO DE COLOMBIA

PLAN DE CUALIFICACION ANUAL AL TALENTO HUMANO 2026

MES	TEMÁTICA	OBJETIVO DEL PROCESO	METODOLOGÍA	NÚMERO DE HORAS	PERFIL	NÚMERO DE PARTICIPANTES	REPONSABLES
FEBRERO	CONSTRUCCION DEL PACTO DE CONVIVENCIA, RUTAS DE ATENCION PARA LA GARANTIA DEL DERECHO, SOCIALIZACION DEL SERVICIO, SOCIALIZACION DEL BUZON DE SUGERENCIA, CONFORMACION DEL COMITE DEL CONTROL SOCIAL, SOCIALIZACION DE PLANES Y PROTOCOLOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO, SOCIALIZACION DE LOS DIRECTORIOS INSTITUCIONALES.	Brindar orientación, asesoría y/o herramientas sobre la construcción del pacto de convivencia, buzón de sugerencia; la conformación del comité de control social. Además de informar acerca de los planes y protocolos necesarios para la prestación del servicio con el fin, de que estos profesionales despejar dudas y brindar un mejor servicio.	La temática se desarrollará a través de una actividad lúdico-practica	1 hora	Coordinadoras pedagógicas, Agentes Educativos; Auxiliares pedagógicas, Apoyos salud y nutrición.	Talento humano modalidad familiar y comunitaria.	Psicosociales
MARZO	SALUD E HIGIENE MENTAL Y LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	Promover la salud e higiene mental, reconociendo a su vez que la salud mental, es igual de importante que la salud física	La temática se desarrollará a través de una actividad lúdico-teórico	1 hora	Coordinadoras pedagógicas, Agentes Educativos; Auxiliares pedagógicas, Apoyos salud y nutrición.	Talento humano modalidad familiar y comunitaria.	Psicosociales

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

23	Plan de Saneamiento Básico - PSB	Socializar con TH del componente de salud y nutrición el PSB, para que apliquen en las unidades de servicios las acciones que implcan los cuatro programas del mismo.	Limpieza y desinfección Control de plagas y roedores Manejo de residuos sólidos y líquidos Abastecimiento de agua	Taller Teórico	Profesional en Nutrición	Febrero
4	Procedimiento para la identificación, reporte y notificación de posibles casos relacionados con enfermedades inmunoprevenibles, prevalentes de la infancia, transmitidas por alimentos (ETA) y de origen cultural	Socializar con TH del componente de salud y nutrición los protocolos de enfermedades inmunoprevenibles y ETA´S, con el fin de que adquieran las competencias en identificación, reporte y notificación de estos casos.	Procedimiento para la identificación, reporte y notificación de posibles casos relacionados con enfermedades inmunoprevenibles Procedimiento para la identificación, reporte y notificación de posibles casos de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)	Taller Teórico	Equipo de salud y nutrición	Marzo

Componente de calidad Salud y nutrición
Seguimiento a la toma de medidas antropométricas y seguimiento a los casos identificados de desnutrición aguda o severa

Durante el periodo de ejecución del contrato se mantuvo un seguimiento constante al estado nutricional de los usuarios, sin que se evidenciaran casos de desnutrición en la población atendida. Este resultado refleja la efectividad de las acciones implementadas y la adecuada articulación con las directrices establecidas en la normatividad vigente. Es importante resaltar que, a la fecha, todos los usuarios cuentan con sus tomas nutricionales completas, cargadas en el aplicativo cuéntame y realizadas conforme a la periodicidad definida en el manual, la guía operativa y los lineamientos técnicos, lo que garantiza un control oportuno, sistemático y preventivo frente a posibles riesgos de desnutrición, asegurando la continuidad en la prestación del servicio y la protección integral de la salud infantil.

Seguimiento adecuaciones en los ciclos de menús

- ✓ **Derivación de minuta patrón:** fue ajustado acorde a las devoluciones y cargado en la ruta establecida por la supervisión en marzo y, a la fecha, se encuentra en proceso de revisión por parte del enlace Regional, la EAS está atenta a posibles ajustes para su respectiva aprobación, garantizando así la pertinencia y calidad del servicio.
- ✓ **Preferencia y rechazos:** en cuanto a las preferencias alimentarias, en este contrato los niños y niñas muestran mayor consumo de leche, huevo y Bienestarina; también se evidencian alimentos con menor aceptación tales como: garbanzo y harina de trigo.
- ✓ **Estrategias implementadas:** para esta modalidad de atención se realizan diferentes preparaciones que incluyan aquellos alimentos con menor aceptación y también se incluye el AAVN… en este ejercicio se experimentan diversas recetas que hacen las mismas familias y lo más importante es que siempre se destacan las propiedades nutricionales de cada producto para que los usuarios incluyan su consumo en sus hogares, y nos ha funcionado.
- ✓ **ETA´S:** durante este periodo no se presentaron enfermedades transmitidas por alimentos.

Seguimiento a compras locales

Durante la ejecución presentada hasta el mes de marzo se presenta ejecución en compras locales de los meses de febrero y marzo teniendo en cuenta que para el mes de enero no se presentó ejecución en la alimentación.

PUBLICA

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO DE SEGUIMIENTO COMPRAS LOCALES

F1.GS.ABS 18/02/2025
Versión 12 Página 1 de1
Clasificación de la Información: Pública

REGIONAL: ANTIOQUIA
Nº DE CONTRATO: 0502041202S
FECHA DE INICIO: 31/dic/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 6
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 884.636.519
No. CUPOS ASIGNADOS: 399
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 901376433
NOMBRE DEL OPERADOR: FUNDACION EDUCATIVA SOY PAZ
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: FAMILIAR Y COMUNITARIA
SERVICIO: EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - B

USUARIO: SPAntioquia
MES VALIDADO: FEBRERO
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 27/03/2026 6:36
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $59.228.995,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	30,61
Validado (%):	30,61

NOTA DEL SUPERVISOR: Para el mes de febrero la entidad administradora de servicios reporto un porcentaje validado de 30,61%

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor: SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ
Firma de quien reporta:
Nombre de quien reporta: HAIVER CUESTA MOYA

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
1	Febrero	Papa	Kilos	428□	$1.498.000,00	Girardota - Antioquia	Organización de PP o ACFC	CAMPOGIL	2,53
2	Febrero	Cebolla de bulbo	Kilos	240	$1.195.200,00	Girardota - Antioquia	Organización de PP o ACFC	CAMPOGIL	2,02
3	Febrero	Naranja	Kilos	542	$2.146.320,00	Girardota - Antioquia	Organización de PP o ACFC	CAMPOGIL	3,62
4	Febrero	Huevo	Unidades	11970	$11.371.500,00	Tarazá - Antioquia	Organización de PP o ACFC	ASOCIACION PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS	19,2
5	Febrero	Leche líquida UHT	Litros	280	$1.918.000,00	Entrerríos - Antioquia	Industria Transformadora	LACTEOS EL GALAN	3,24

PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO DE SEGUIMIENTO COMPRAS LOCALES

F1.GS.ABS 10/03/2026
Versión 13 Página 1 de1
Clasificación de la Información: Pública

REGIONAL: ANTIOQUIA
Nº DE CONTRATO: 0502041202S
FECHA DE INICIO: 31/dic/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 7
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 884.636.519
No. CUPOS ASIGNADOS: 399
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 901376433
NOMBRE DEL OPERADOR: FUNDACION EDUCATIVA SOY PAZ
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA
SERVICIO: EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - FAMILIAR Y COMUNITARIA

USUARIO: SPAntioquia
MES VALIDADO: MARZO
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 8-abr-2026 22:05
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $77.640.903,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	31,59
Validado (%):	31,59

NOTA DEL SUPERVISOR: Para el mes de marzo la entidad administradora de servicios reportó un porcentaje de cumplimiento de compras locales de alimentos de 31,59%

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor: SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ
Firma de quien reporta:
Nombre de quien reporta: HAIVER CUESTA MOYA

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio de Producción	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
1	Marzo	Papa	Kilos	428	$1.497.990,00	Girardota - Antioquia	Organización de PP o ACFEC	CAMPOGIL	1,93
2	Marzo	Naranja	Kilos	542	$2.146.320,00	Girardota - Antioquia	Organización de PP o ACFEC	CAMPOGIL	2,76
3	Marzo	Cebolla de bulbo	Kilos	240	$1.195.200,00	Girardota - Antioquia	Organización de PP o ACFEC	CAMPOGIL	1,54
4	Marzo	Huevo	Unidad	19425	$18.453.750,00	Tarazá - Antioquia	Organización de PP o ACFEC	APROCAMPO	23,77
5	Marzo	Leche líquida UHT	litros	864	$1.233.600,00	Entrerríos - Antioquia	Industria Transformadora	LACTEOS EL GALAN	1,59

Socialización de la entrega de los alimentos de alto valor nutricional

Desde la EAS Se implementa la estrategia de “Píldoras de AAVN” la cual consiste en educar a las familias todos los meses en el uso adecuado de los AAVN y enseñar diferentes preparaciones, mediante diversas acciones que incluyen talleres prácticos con material educativo adaptado a las necesidades de la comunidad y sesiones demostrativas sobre la preparación y aprovechamiento de los Alimentos de Alto

Valor Nutricional (AAVN). A través de estas estrategias se fortalece el conocimiento de las familias en lo que respecta al uso adecuado de este producto, también se promueven hábitos alimentarios saludables y sostenibles, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las familias.

Durante este periodo se recibieron 399 unidades de Bienestarina para consumo marzo; recibidas en marzo.


Componente de calidad Familia comunidad y redes

Seguimiento al ejercicio de control social y socialización de los servicios

Con relación a el ejercicio de control social desde el inicio de la atención que fue en el mes de febrero se realizó acta de conformación del comité, seguidamente en el mes de marzo de realizo plan de acción del comité, reunión y verificación del comité. Por otro lado, en el mes de marzo se realizó la socialización de los servicios; la cual participaron entes territoriales, miembros del comité y las familias del servicio.

seguimiento al plan de formación a familias

El plan de formación a las familias es una herramienta de priorización, planeación e implementación de estrategias y experiencias pedagógicas, de seguimiento y evaluación que construye en conjunto todo el talento humano, cuyo fin es potenciar o resignificar a nivel familiar y comunitario, las prácticas de cuidado y crianza que se dan en la cotidianidad con las niñas y los niños, así como las acciones de bienestar de las mujeres y personas en estado de gestación.

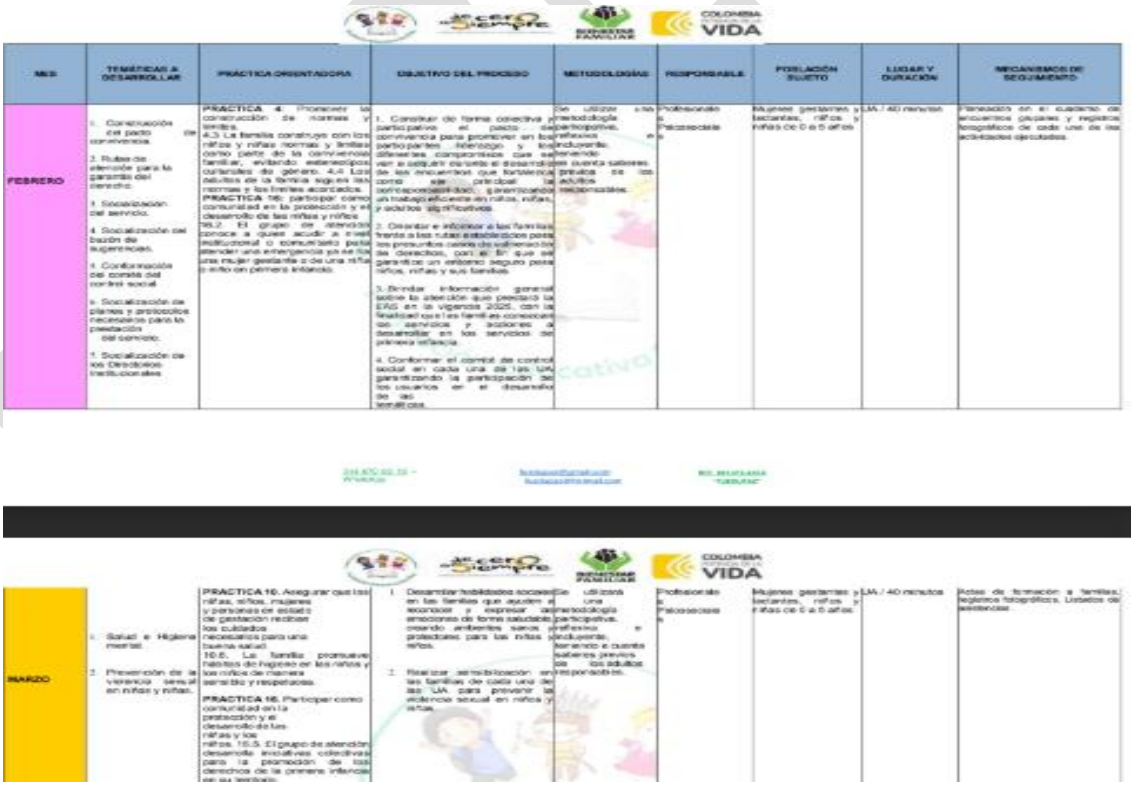

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

23	**Plan de Saneamiento Básico - PSB**	Socializar con TH del componente de salud y nutrición el PSB, para que apliquen en las unidades de servicios las acciones que implcan los cuatro programas del mismo.	Limpieza y desinfección Control de plagas y roedores Manejo de residuos sólidos y líquidos Abastecimiento de agua	Taller Teórico	Profesional en Nutrición	Febrero
4	**Procedimiento para la identificación, reporte y notificación de posibles casos relacionados con enfermedades inmunoprevenibles, prevalentes de la infancia, transmitidas por alimentos (ETA) y de origen cultural**	Socializar con TH del componente de salud y nutrición los protocolos de enfermedades inmunoprevenibles y ETA´S, con el fin de que adquieran las competencias en identificación, reporte y notificación de estos casos.	Procedimiento para la identificación, reporte y notificación de posibles casos relacionados con enfermedades inmunoprevenibles Procedimiento para la identificación, reporte y notificación de posibles casos de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)	Taller Teórico	Equipo de salud y nutrición	Marzo

Seguimiento a los casos identificados y reportados por presunta amenaza, vulneración o inobservancia de derechos de niñas y niños

Durate los meses de febrero y marzo no se presentaron casos de presunta amenaza, vulneración o inobservancia de derechos de niñas y niños.

Revisión de los casos de usuarios fallecidos, haciendo lectura y análisis de la atención brindada desde la EAS y la activación de rutas que se hayan realizado.

Durante los meses de febrero y marzo, no se presentaron incidentes que resultaran en el fallecimiento de usuarios.

Seguimiento a la matriz de riesgo del contrato


En el marco de la socialización de la matriz del contrato, y teniendo en cuenta la identificación, valoración y asignación de riesgos del contrato de aporte No. 0502412025, se establece lo siguiente:

La Entidad Administradora del Servicio (EAS) deberá notificar oportunamente las situaciones atípicas que afecten la prestación del servicio.

Se requiere implementar acciones de mitigación frente a la baja cobertura del contrato, situación evidenciada durante los meses de febrero y marzo.

Como consecuencia de lo anterior, la matriz de riesgos se ve afectada, razón por la cual se invita a la entidad administradora del servicio a buscar estrategias que permitan garantizar la cobertura completa y mantenerla de manera sostenida.

PÚBLICA

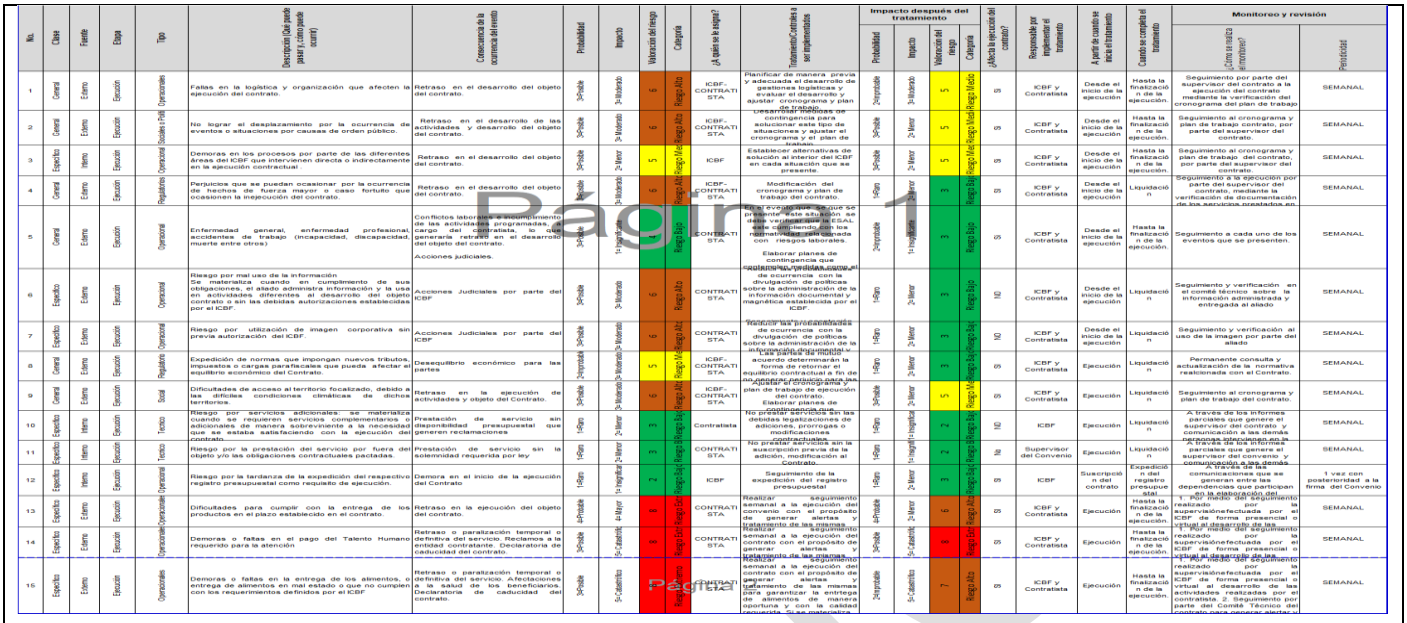

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se cumple el tratamiento	Monitoreo y revisión: ¿Como se realiza seguimiento?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato.	Retraso en el desarrollo del objeto del contrato.	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF-CONTRATISTA	Planificar de manera previa y adecuada el desarrollo de gestiones de logísticas y evaluar el desarrollo y ajustar cronograma y plan de trabajo.	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Moderado	05	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento por parte del supervisor del contrato a la ejecución del contrato mediante la verificación del cronograma del plan de trabajo	SEMANAL
2	General	Externo	Ejecución	Seguridad y Salud	No lograr el desplazamiento por la ocurrencia de eventos o situaciones por causas de orden público.	Retraso en el desarrollo de las actividades y desarrollo del objeto del contrato.	3-Posible	2-Menor	6	Riesgo Alto	ICBF-CONTRATISTA	Desarrollar estrategias de contingencia para solucionar este tipo de situaciones y ajustar el cronograma y el plan de trabajo.	3-Posible	2-Menor	5	Riesgo Moderado	05	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución.	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento al cronograma y plan de trabajo contrato, por parte del supervisor del contrato.	SEMANAL
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en los procesos por parte de las diferentes áreas del ICBF que intervienen directa o indirectamente en la ejecución contractual.	Retraso en el desarrollo del objeto del contrato.	3-Posible	2-Menor	5	Riesgo Moderado	ICBF	Establecer alternativas de solución al interior del ICBF en cada situación que se presente.	3-Posible	2-Menor	5	Riesgo Moderado	05	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento al cronograma y plan de trabajo del contrato, por parte del supervisor del contrato.	SEMANAL
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Perjuicios que se puedan ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito que ocasionen la inejecución del contrato.	Retraso en el desarrollo del objeto del contrato.	4-Probable	3-Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF-CONTRATISTA	Modificación del cronograma y plan de trabajo del contrato.	1-Raro	3-Menor	3	Riesgo Bajo	05	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Liquidación	Seguimiento a la ejecución por parte del supervisor del contrato, mediante la verificación de documentación de los servicios prestados en	SEMANAL
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros)	Conflictos laborales e incumplimiento de las actividades programadas a cargo del contratista, lo que generaría retraso en el desarrollo del objeto del contrato. Acciones judiciales.	3-Posible	1-Insignificante	3	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Es la evaluación que se hace de si se presenta. Este seguimiento se debe verificar que la EESAL este cumpliendo con los requerimientos que tenga con la normatividad con relación con riesgos laborales. Elaborar planes de contingencia que contengan la medida a tomar en	2-Improbable	1-Insignificante	3	Riesgo Bajo	05	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	Seguimiento a cada uno de los eventos que se presenten.	SEMANAL
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información Se materializa cuando en cumplimiento de sus obligaciones, el aliado administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo del objeto contrato o sin las debidas autorizaciones establecidas por el ICBF.	Acciones Judiciales por parte del ICBF	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	de ocurrencia con la divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética establecida por el ICBF.	1-Raro	3-Menor	3	Riesgo Bajo	NO	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Liquidación	Seguimiento y verificación en el comité técnico sobre la información administrada y entregada al aliado	SEMANAL
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por utilización de imagen corporativa sin previa autorización del ICBF.	Acciones Judiciales por parte del ICBF	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar una presentación de ocurrencia con la divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y	1-Raro	3-Menor	3	Riesgo Bajo	NO	ICBF y Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Liquidación	Seguimiento y verificación al uso de la imagen por parte del aliado	SEMANAL
8	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del Contrato.	Desequilibrio económico para las partes	2-Improbable	3-Moderado	5	Riesgo Moderado	ICBF-CONTRATISTA	acuerdo determinarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de	1-Raro	3-Menor	3	Riesgo Bajo	05	ICBF y Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualización de la normativa realcionada con el Contrato.	SEMANAL
9	General	Externo	Ejecución	Social	Dificultades de acceso al territorio focalizado, debido a las difíciles condiciones climáticas de dichos territorios.	Retraso en la ejecución de actividades y objeto del Contrato.	3-Posible	3-Moderado	6	Riesgo Alto	ICBF-CONTRATISTA	Elaborar planes de contingencia que contengan la medida a tomar en el plan de trabajo de ejecución del contrato.	3-Posible	2-Menor	5	Riesgo Moderado	05	ICBF y Contratista	Ejecución	Liquidación	Seguimiento al cronograma y plan de trabajo del contrato.	SEMANAL
10	Específico	Interno	Ejecución	Tecnico	Riesgo por servicios adicionales se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato.	Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones	1-Raro	2-Menor	2	Riesgo Bajo	Contratista	No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales.	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	NO	ICBF	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y supervisión se realizan mesas	SEMANAL
11	Específico	Interno	Ejecución	Tecnico	Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas.	Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley	1-Raro	2-Menor	2	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación al Contrato.	1-Raro	1-Insignificante	2	Riesgo Bajo	Na	Supervisor del Convenio	Ejecución	Liquidación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del convenio y comunicaciones que se	SEMANAL
12	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución.	Demora en el inicio de la ejecución del Contrato	1-Raro	2-Menor	2	Riesgo Bajo	ICBF	Seguimiento de la expedición del registro presupuestal	1-Raro	2-Menor	3	Riesgo Bajo	05	ICBF	Suscripción del registro presupue Mal	Expedición del registro presupue Mal	1. Por medio del seguimiento realizado por la supervisiónefectuada por el ICBF de forma presencial o virtual al desarrollo de las actividades realizadas por el contratista. 2. Seguimiento por parte del Comité Técnico del contrato para generar alertas y	1 vez con posterioridad a la firma del Convenio
13	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades para cumplir con la entrega de los productos en el plazo establecido en el contrato.	Retraso en la ejecución del objeto del contrato.	4-Probable	2-Menor	6	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar seguimiento semanal a la ejecución del convenio con el propósito de generar alertas y tratamiento de las mamas	4-Probable	2-Menor	6	Riesgo Alto	05	ICBF y Contratista	Ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	1. Por medio del seguimiento realizado por la supervisiónefectuada por el ICBF de forma presencial o virtual al desarrollo de las	SEMANAL
14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras o fallas en el pago del Talento Humano requerido para la atención	Retraso o paralización temporal o definitiva del servicio. Reclamos a la entidad contratante. Declaratoria de caducidad del contrato.	3-Posible	5-Catastrófico	8	Riesgo Extremo	CONTRATISTA	Realizar seguimiento semanal a la ejecución del contrato con el propósito de generar alertas y tratamiento de las mamas para garantizar la entrega de alimentos de manera oportuna y con la calidad requerida. Si se materializa	3-Posible	5-Catastrófico	8	Riesgo Extremo	05	ICBF y Contratista	Ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	1. Por medio del seguimiento realizado por la supervisiónefectuada por el ICBF de forma presencial o virtual al desarrollo de las actividades realizadas por el contratista. 2. Seguimiento por parte del Comité Técnico del contrato para generar alertas y	SEMANAL
15	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras o fallas en la entrega de los alimentos, o entrega de alimentos en mal estado o que no cumplen con los requerimientos definidos por el ICBF	Retraso o paralización temporal o definitiva del servicio. Afectaciones a la salud de los beneficiarios. Declaratoria de caducidad del contrato.	3-Posible	5-Catastrófico	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Realizar seguimiento semanal a la ejecución del contrato con el propósito de generar alertas y tratamiento de las mamas para garantizar la entrega de alimentos de manera oportuna y con la calidad requerida. Si se materializa	2-Improbable	5-Catastrófico	7	Riesgo Alto	05	ICBF y Contratista	Ejecución	Hasta la finalización de la ejecución.	1. Por medio del seguimiento realizado por la supervisiónefectuada por el ICBF de forma presencial o virtual al desarrollo de las actividades realizadas por el contratista. 2. Seguimiento por parte del Comité Técnico del contrato para generar alertas y	SEMANAL

Seguimiento a las obligaciones contractuales (informes técnico-administrativos, cumplimiento y acciones correctivas por parte de la EAS)

Desde la EAS se ha suministrado la información de manera oportuna al centro zonal, no se tiene pendiente entregar o subsanar por el mes de ejecución, no se ha presentado dificultades presentadas con los informes técnicos y financieros. En cuanto al seguimiento de las obligaciones contractuales a la fecha se le ha dado cumplimiento oportuno a la entrega de informes técnicos y financieros, sin dificultades en el proceso y sin pendientes por entregar o subsanar

Socialización situaciones identificadas en visitas de supervisión

En el mes de marzo se presentaron visitas de supervisión, la cual se encontraron hallazgos y fueron subsanados.

Seguimientos a acciones administrativas (requerimientos)

No se han realizado requerimiento al contrato de aportes.

Decisiones: Una vez finalizado el comité de seguimiento, se precisa la importancia de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de aporte, reafirmando el compromiso de la entidad administradora del servicio con la adecuada ejecución y cobertura de este.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Cumplir a cabalidad las clausulas contractuales del contrato de aporte	Fuedupaz	Siempre
Derivación de la minuta servicio EIH	ICBF	17/04/2026

Revisar temas financieros	ICBF- Fuedupaz	17/04/2026

FIRMA ASISTENTES			
La presente acá se entiende firmada por las partes con el listado de conexión a la misma.			
Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
Colaborador que elabora el acta:			

Se anexa listado de asistencia vía teams

