CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 19-7-0008-0-2025

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI" – CORPORACIÓN AUTONOMA DEL CESAR "CORPOCESAR"

INFORME TÉCNICO Y FINANCIERO

PERIODO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 – 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO AMBIENTAL, SOCIAL Y PRODUCTIVO CON ENFOQUE EN RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, GOBERNANZA AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO.

VALLEDUPAR, DICIEMBRE 2025

www.anei.org.co

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
1. RESUMEN EJECUTIVO 5
1.1 Información general del convenio 5
1.2 Resumen avance físico 6
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9
4. IMPORTANCIA DEL PROYECTO PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ 10
4.1 Especificación poblacional por vereda 11
4.2 Indicadores - Productos Esperados 13
5. INFORME ADMINISTRATIVO Y LEGAL 14
5.1 Plazos del convenio y control presupuestal 14
5.2 Estado actual de pólizas 15
5.3 Comité de obras y reuniones 15
6. INFORME FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL 16
6.1 Desembolsos 16
6.1.1 Primer Desembolso 16
6.2 Estado actual de facturación 16
7. INFORME TÉCNICO 17
7.1 Actividades desarrolladas 17
PRODUCTO 1.1 17
Realización de Convocatoria para Conformación del equipo técnico del proyecto 17
PRODUCTO 1.2 18
Apertura de cuenta bancaria exclusiva del convenio 18
PRODUCTO 1.3 18
Ejecución de Mesas de Trabajo con Equipo Técnico 18
PRODUCTO 1.4 19
Planes de Trabajo Productivos y de Formación Elaborados 19
PRODUCTO 1.5 20
Realización de Encuentro de Armonización Territorial Inicial 20
PRODUCTO 1.6 22
Realización de Convocatoria, Selección y Vinculación de las Familias Beneficiarias 22
PRODUCTO 1.7 22

www.anei.org.co

Realización de Convocatoria, Selección y Vinculación de Grupo de Jóvenes Guardianes del Territorio 22
PRODUCTO 1.8 23
20 Familias Beneficiarias Vinculadas al Proyecto 23
PRODUCTO 1.9 23
25 Miembros Conformando el Grupo de jóvenes Guardianes del Territorio 23
PRODUCTO 3.1 24
Visitas de asistencia técnica y acompañamiento 24
7.2 Avance de actividades 25
8. PERSONAL, EQUIPOS E INSTALACIONES DEL CONTRATISTA 25
8.1 Equipo de trabajo con intervención en el proyecto 25
8.2 Roles y funciones de los profesionales 25
Profesional agroecológico 25
Profesional Social 26
Dinamizador Social 26
Gestor Técnico de Campo 27
Gestor Administrativo Contable 27

INTRODUCCIÓN

El presente informe se elabora en el marco del proyecto desarrollado mediante convenio interinstitucional, orientado a la implementación de acciones de carácter ambiental, social y productivo en el territorio de intervención. El origen del proyecto responde a la necesidad de fortalecer las capacidades comunitarias, promover el uso sostenible del territorio y mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias, a través de procesos participativos, acompañamiento técnico y articulación institucional.

Este documento tiene como propósito presentar el seguimiento a las actividades ejecutadas durante la primera etapa del proyecto, analizando los avances alcanzados, las acciones implementadas y los resultados preliminares derivados del proceso de planificación y alistamiento. El informe busca brindar una visión clara y estructurada del estado inicial de ejecución, sirviendo como insumo para la toma de decisiones y el ajuste oportuno de las estrategias planteadas.

El período evaluado en el presente informe comprende del 28 de noviembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, lapso durante el cual se desarrollaron las actividades iniciales del proyecto, enfocadas principalmente en la organización administrativa, la conformación del equipo técnico, la vinculación de las familias beneficiarias y jóvenes participantes, así como la realización de acciones de verificación, asistencia técnica y armonización territorial.

El alcance del seguimiento se delimita al análisis de las actividades correspondientes a la fase de planificación y alistamiento, considerando criterios técnicos, administrativos y sociales que permiten evaluar la coherencia entre lo planificado y lo ejecutado. En este sentido, el informe no aborda aún impactos de largo plazo, sino que se centra en describir y valorar los procesos iniciales que sientan las bases para la ejecución integral del proyecto.

El proyecto se enmarca dentro de un enfoque integral que articula componentes ambientales, sociales y productivos, reconociendo la interdependencia entre la conservación del territorio, el fortalecimiento del tejido social y el desarrollo de alternativas productivas sostenibles. En su implementación participan la entidad ejecutora del convenio, la entidad aliada y de acompañamiento institucional, el equipo técnico del proyecto y las comunidades beneficiarias del territorio, quienes cumplen un rol activo en la construcción y apropiación de las acciones desarrolladas.

1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto busca impulsar un proceso integral de Restauración ecológica y gobernanza ambiental en la Serranía del Perijá, Municipio de Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar, como respuesta a la degradación de ecosistemas estratégicos y a la necesidad de fortalecer el tejido social en torno a su protección. A través de soluciones basadas en la naturaleza, se promoverá la recuperación funcional de estos ecosistemas, incrementando la cobertura vegetal con especies nativas en sistemas agroforestales que no solo regeneran el paisaje y mejoran la conectividad ecológica, sino que también fortalecen los medios de vida y la economía de las familias campesinas del territorio.

El componente social se consolida mediante la estrategia Escuela Guardianes del Territorio, que formará a jóvenes como líderes ambientales, combinando saberes técnicos y conocimientos tradicionales para enfrentar los retos del cambio climático, la gestión del riesgo y la restauración ecológica. Esta apuesta no solo generará capital humano preparado para el manejo sostenible de los recursos, sino que fomentará la apropiación comunitaria y la continuidad intergeneracional de las acciones de conservación.

La intervención contempla la restauración ecológica de 20 hectáreas y la capacitación de 25 jóvenes como líderes locales en gestión ambiental. Los impactos ambientales positivos incluyen la recuperación de la cobertura vegetal y la conectividad ecológica, el aumento de la biodiversidad y la restauración de hábitats para fauna y flora nativa, la reducción de la erosión y la mejora de la calidad del suelo, el incremento de la captura de carbono para la mitigación del cambio climático y la protección de fuentes hídricas. Adicionalmente, la formación de jóvenes generará mayor apropiación comunitaria de los procesos ambientales y garantizará la continuidad intergeneracional de las acciones de conservación.

1.1 Información general del convenio

Tabla 1 - Información general del convenio

CONVENIO ASOCIATIVO	Corporación Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR) y la Asociación de Productores Agroecológicos Indígenas y Campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá (ASOANEI)
OBJETO	Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Económicos Para La Restauración Ecológica Integral Y Gobernanza Ambiental En La Serranía Del Perijá, Municipio De Agustín Codazzi, En El Departamento Del Cesar.
TEMÁTICA	Restauración ecológica y educación ambiental comunitaria
PROGRAMA	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
OBJETIVOS	▪ Implementar Soluciones Basadas en la Naturaleza para la conservación, restauración y rehabilitación de ecosistemas

www.anei.org.co

	estratégicos. ▪ Fortalecer los sistemas de gobernanza ambiental de las comunidades campesinas de la Serranía del Perijá, Municipio de Agustín Codazzi.
ACTIVIDADES	Ejecutar las actividades contempladas en la Clausula Primera - Objetivos Específicos del Contrato, inmersa en el Convenio de asociación No. 19-7-0008-0-2025 y en el Estudio Previo.
VALOR DEL CONTRATO	El valor del presente convenio asciende a la suma de QUINIENTOS SETENTA DOSCIENTOS NOVENTA CINCO Y MILLONES SIETE ML CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($575.297423,95) MICTE.
APORTES CORPOCESAR	$399.663.662,95
APORTES ASOANEI	$175.633.761,00
FECHA DE INICIACIÓN	28 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	27 de noviembre de 2026

1.2 Resumen avance fisico

Tabla 2 - Resumen avance fisico

TAREAS					
TAREA N°1. Planificación y Alistamiento del Proyecto					
PRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**PERIODOS**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**INFORME N°**
PRODUCTO 1.1	Realización de Convocatoria para Conformación del equipo técnico del proyecto	1	100%	100%	1
PRODUCTO 1.2	Apertura de cuenta bancaria exclusiva del convenio	1	100%	100%	1
PRODUCTO 1.3	Ejecución de Mesas de Trabajo con Equipo Técnico	1	100%	100%	1
PRODUCTO 1.4	Planes de Trabajo Productivos y de Formación Elaborados	1	100%	100%	1
PRODUCTO 1.5	Realización de Encuentro de Armonización Territorial Inicial	1	100%	100%	1

PRODUCTO 1.6	Realización de Convocatoria, Selección y Vinculación de las Familias Beneficiarias	1	100%	100%	1
PRODUCTO 1.7	Realización de Convocatoria, Selección y Vinculación de Grupo de Jóvenes Guardianes del Territorio	1	100%	100%	1
PRODUCTO 1.8	20 Familias Beneficiarias Vinculadas al Proyecto	1	100%	100%	1
PRODUCTO 1.9	25 Miembros Conformando el Grupo de jóvenes Guardianes del Territorio	1	100%	100%	1

TAREA N°2. Establecimiento de sistemas productivos sostenibles bajo esquemas agroforestales-renovación por Zoca.

PRODUCTO	ACTIVIDAD	PERIODOS	AVANCE	EJECUTADO	INFORME N°
PRODUCTO 2.1	Adquisición de material vegetal, Insumos y Herramientas	3	0%	0%	NA
PRODUCTO 2.2	Adquisición Guadañas	2	0%	0%	NA
PRODUCTO 2.3	Zoqueo y Selección de Chupones	2	0%	0%	NA
PRODUCTO 2.4	Mantenimiento del sistema (fertilización, podas, control fitosanitario)	4	0%	0%	NA
PRODUCTO 2.4	Establecimiento del sistema agroforestal (siembra de café, forestales, musáceas y leguminosa)	3	0%	0%	NA

TAREA N°3. Plan de Fortalecimiento Productivo

PRODUCTO	ACTIVIDAD	META	AVANCE	EJECUTADO	INFORME N°
PRODUCTO 3.1	Visitas de asistencia técnica y acompañamiento	240	20	8.3%	1
PRODUCTO 3.2	Entrega de Equipo de Manejo de Arvenses (Guadaña)	20	0	0%	NA
PRODUCTO 3.2	Hectáreas Fortalecidas de Sistemas Agroforestales	20	0	0%	NA

TAREA N°4. Escuela Guardianes del Territorio					
PRODUCTO 4.1	Desarrollo de Taller de Formación Guardianes del Territorio	10	0	0%	NA
PRODUCTO 4.2	Jóvenes Guardianes del Territorio Formados	25	0	0%	NA
PRODUCTO 4.3	Red de Voluntariado Ambiental Conformada	1	0	0%	NA
TAREA N°5. Estrategia de Comunicación y Difusión					
PRODUCTO 5.1	Difusión a Través de Cuñas Radiales	48	0	0%	NA
TAREA N°6. Seguimiento y Monitoreo del Proyecto					
PRODUCTO 6.1	Realización de Informes de Ejecución y Financieros	12	1	8.3%	NA
TAREA N°7. Cierre y Liquidación del Convenio					
PRODUCTO 7.1	Realización de Encuentro de Armonización Territorial Final	1	0	0%	NA

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Tabla 3 - Información general del proyecto

DESCRIPCIÒN DEL CONVENIO	El día 28 de noviembre de 2025, en la ciudad de Valledupar, se reunieron MONICA INES GONZALEZ THOMAS, Subdirectora General del Area de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en calidad Supervisora, y AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES, en su condición de representante legal de ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI, con el fin de dar inicio a los trabajos correspondientes al CONVENIO DEACTIVIDADES COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO.
COMPONENTE 1 - Restauración Ecológica	
ACTIVIDADES	**MEDIOS DE VERIFICACIÓN**
Selección de beneficiarios	Actas de concertación, formatos visita técnica de verificación, registros georreferenciados y demás soportes en formato PDF, JPG, SHP, KML, entre otros.
1.1 Establecimiento de sistemas productivos	Registro de ejecución (Actas, bitácora, formatos de asistencia técnica), Planos y mapas georreferenciados con delimitación de las áreas,

www.anei.org.co

sostenibles bajo esquemas agroforestales-renovación por Zoca.	certificado de almacenamiento y disposición de residuos en sitio autorizado, soportes en formato PDF, JPG, SHP, KML, entre otros.
COMPONENTE 2 - Gobernanza Ambiental	
ACTIVIDADES	**MEDIOS DE VERIFICACIÓN**
2.1 Desarrollo de encuentros territoriales en el marco de la Escuela Guardianes del Territorio.	Actas celebradas con la comunidad, planillas de asistencia, registros audiovisuales, certificado emisiones radiales, soportes en formato PDF, JPG, entre otros.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

En 2020, el municipio de Agustín Codazzi contaba con 97.300 ha de bosque natural, que se extendía por el 55% de su superficie terrestre. En 2024, perdió 464 ha de bosque natural, equivalente a 197 kt de emisiones de CO_2. Desde 2001 hasta 2024, Agustín Codazzi perdió 86 ha de bosque primario húmedo, lo que representa 1.1% de su pérdida total de cobertura arbórea en el mismo periodo de tiempo. El área total de bosque primario húmedo en Agustín Codazzi disminuyó en 2.5% en este periodo de tiempo. https://www.globalforestwatch.org/

Entre los factores tensionantes se identifican la ampliación de la frontera agropecuaria, la deforestación para el establecimiento de cultivos tradicionales y no tradicionales incluyendo algunos de uso ilícito, la conversión de bosques en potreros para ganadería extensiva, la tala comercial selectiva de especies maderables de alto valor y la cacería de fauna silvestre.

Desde el componente social y cultural, el territorio está habitado por comunidades campesinas y pueblos indígenas Yukpa, que mantienen prácticas culturales y productivas estrechamente ligadas a la montaña. Estos grupos dependen de los bienes y servicios ecosistémicos para su subsistencia, particularmente del agua, la leña, la madera, la fauna para autoconsumo y el uso de plantas medicinales. Sin embargo, el contexto histórico de conflicto armado ha limitado la presencia institucional y la gobernanza ambiental, dejando áreas sin manejo formal, lo que por un lado permitió la regeneración natural en zonas abandonadas, pero por otro propició economías extractivas de carácter ilegal.

En el componente económico, predominan la agricultura de subsistencia, cultivos comerciales como café, caña panelera y frutales, así como la ganadería extensiva, que frecuentemente entran en conflicto con la vocación natural de conservación de suelos y agua del territorio. Estas prácticas han generado presión directa sobre la cobertura forestal y las fuentes hídricas, incrementando la vulnerabilidad ambiental y socioeconómica de la zona.

La alternativa seleccionada plantea la implementación de acciones de restauración ecológica integral y gobernanza ambiental en la Serranía del Perijá, Municipio de Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar, bajo un enfoque territorial participativo. La estrategia contempla la vinculación directa de la comunidad residente en las áreas de intervención, asegurando su participación en todas las etapas del proyecto con el fin de fomentar la apropiación social del territorio. Este proceso busca

garantizar la recuperación funcional y estructural del ecosistema estratégico, fortaleciendo simultáneamente la gobernanza ambiental local y la sostenibilidad de las acciones emprendidas.

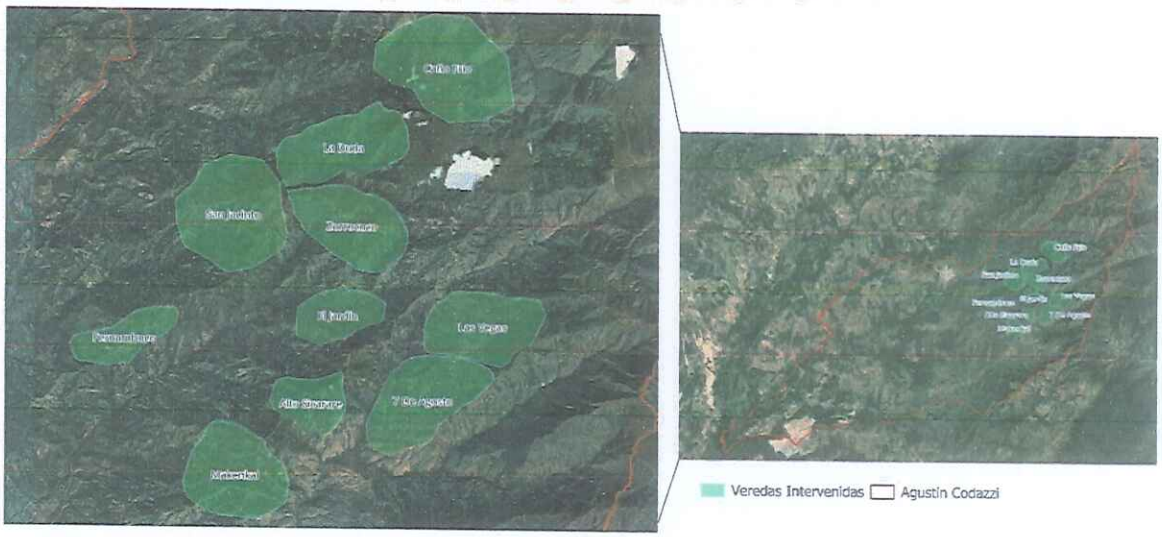


Imagen 1 - Localización del proyecto

El proyecto durante su planificación se enfocó en ser desarrollado en zona rural del Municipio de Agustín Codazzi, Cesar en las veredas La Duda, Alto Sicarare, Makenkal, 07 de agosto, Las Vegas, Zorrocuco y El Milagro. Sin embargo, teniendo en cuenta las verificaciones de los predios para la elección de beneficiarios, realizadas en este primer periodo de ejecución correspondiente al mes de diciembre, se incluyeron las siguientes veredas: Caño Frio, El jardín, Fernambuco, San Jacinto, por su potencial para el desarrollo optimo del proyecto, logrando un mayor impacto.

4. IMPORTANCIA DEL PROYECTO PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ.

Los beneficiarios del proyecto son comunidades campesinas localizadas en zonas rurales dispersas de la Serranía del Perijá en jurisdicción del Municipio de Agustín Codazzi, que históricamente han estado marcadas por la pobreza, el limitado acceso a infraestructura, servicios básicos y asistencia técnica, así como por las secuelas del conflicto armado y la presión sobre los ecosistemas que habitan. Estas familias dependen en gran medida de la caficultura como sustento principal, pero enfrentan bajos niveles de productividad y altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica. La implementación de los sistemas agroforestales y las prácticas agroecológicas se plantea como una alternativa que responde a su realidad territorial, al tiempo que promueve la seguridad alimentaria, la diversificación de ingresos, el fortalecimiento de la organización comunitaria y la conservación de los ecosistemas estratégicos de los que depende su bienestar.

En total, la población objetivo corresponde a 80 personas beneficiarias, correspondientes a 20 familias campesinas con un promedio de 4 integrantes por hogar, quienes serán directamente impactados por las actividades plasmadas en el proyecto.

Población objetivo

Tabla 4 - Población objetivo

Género	Rangos de edad (años)			
	<18	18- 30	>30	Total
Hombre		0	17	17
Mujer		0	3	3

4.1 Especificación poblacional por vereda

El municipio de Agustín Codazzi cuenta con un total de 45 veredas rurales, distribuidas en los corregimientos de Casacara, Llerasca, San Jacinto y Sicarare. A partir de la focalización inicial y del posterior proceso de identificación y verificación de predios en campo, el proyecto logró una intervención efectiva en diez (10) veredas, en las cuales se encuentran vinculados los beneficiarios directos.

Desde una perspectiva cuantitativa, la cobertura territorial del proyecto representa aproximadamente el 22,2 % del total de veredas del municipio de Agustín Codazzi, lo que evidencia un alcance significativo, especialmente considerando que la intervención se concentra en zonas estratégicas de la Serranía del Perijá, caracterizadas por su importancia ambiental y su vulnerabilidad ecológica.

En relación con la priorización inicial, el proyecto contemplaba siete (7) veredas, lo que equivalía al 15,6 % del total de veredas del municipio. No obstante, gracias a las actividades de verificación en campo y al análisis de las condiciones reales de las familias postuladas, se amplió el alcance territorial, incorporando beneficiarios que se encuentran en nuevas veredas que cumplen con los criterios técnicos y sociales establecidos. Este ajuste incrementó la cobertura en 6,6 puntos porcentuales, pasando de una focalización inicial a una intervención más representativa del contexto rural del municipio.

www.anei.org.co



Figura 1 - Impacto veredal

Es importante destacar que, aunque la vereda El Milagro hacía parte de la priorización inicial, ésta no registró beneficiarios postulados tras el proceso de convocatoria, caracterización, verificación y selección, lo que reafirma el compromiso técnico de selección basado en criterios anteriormente definidos y amplía el alcance del proyecto y su impacto en territorio. En contraste, para garantizar el logro de las metas del proyecto, a través de la inclusión de otras veredas se pudo ampliar la cobertura, favoreciendo que el 24,4% de las veredas del municipio cuenten con beneficiarios efectivamente vinculados y con condiciones reales para la implementación de las acciones del proyecto.

En conjunto, este análisis evidencia que el proyecto no solo alcanza una cobertura territorial relevante, sino que lo hace de manera estratégica y responsable, asegurando que la intervención se concentre en aquellas veredas y familias donde el impacto ambiental, social y productivo puede ser mayor y más sostenible en el tiempo.

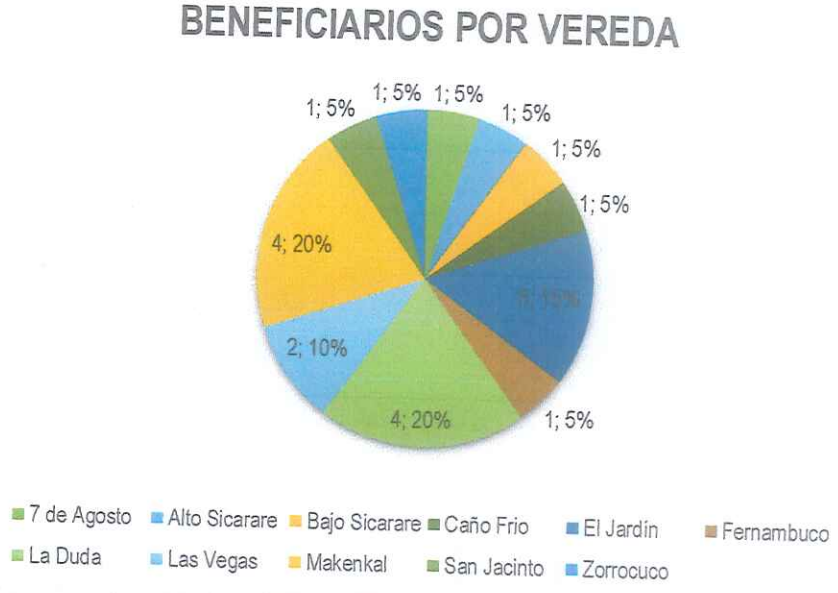


Figura 2 – Beneficiarios por Vereda

4.2 Indicadores - Productos Esperados

Tabla 5 - Indicadores - productos esperados

ítem	Objetivo	Actividades	Unidad de medida	Cantidad
1	Implementar soluciones basadas en la naturaleza para la conservación y restauración de ecosistemas estratégicos.	Establecimiento de sistemas productivos sostenibles bajo esquemas agroforestales-renovación por Zoca.	Hectáreas	20
2	Fortalecer los sistemas de gobernanza ambiental de las comunidades campesinas de la Serranía del Perijá, Municipio de Agustín Codazzi.	Desarrollo de encuentros territoriales en el marco de la Escuela Guardianes del Territorio.	Unidad	10

5. INFORME ADMINISTRATIVO Y LEGAL

5.1 Plazos del convenio y control presupuestal

Se presenta a corte de diciembre 2025 relación de ejecución presupuestal

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PLANEACIÓN ESTRATEGICA PRESUPUESTO GENERAL DE PROYECTOS	CODIGO: PCE-01-F-17 VERSIÓN: 1.0 FECHA: 03/04/2023	1

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR								EJECUCION PRESUPUESTAL - MES 1 (DIC 2025)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIOS UNITARIOS($)	TOTAL ($)	APORTES CORPOCESAR	APORTES ANEI	APORTES CORPOCESAR	APORTES ANEI	TOTAL DIC 2025	ACUMULADO DIC 2025
1	RESTAURACION ECOLOGICA										
1.1	Establecimiento de sistemas productivos sostenibles bajo esquemas agroforestales-renovación por Zoca	Hectareas	20,0	$ 21.204.408,60	$ 424.088.171,95	$ 339.950.782,95	$ 84.137.389	3.495.600,00	-	3.495.600,00	3.495.600,00
2	GOBERNANZA AMBIENTAL										
2.1	Desarrollo de encuentros territoriales en el marco de la Escuela Guardianes del Territorio	Numero	10,0	$ 6.671.288,00	$ 66.712.880,00	$ 59.712.880,00	$ 7.000.000,00	2.392.740,00	-	2.392.740,00	2.392.740,00
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 490.801.051,95	$ 399.663.662,95	$ 91.137.389,00	5.888.340,00	-	5.888.340,00	5.888.340,00
				ADMINISTRACIÓN (14,69%):	$ 84.496.372,00	$ -	$ 84.496.372,00	-	12.839.231,00	12.839.231,00	12.839.231,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS:	$ 575.297.423,95	$ 399.663.662,95	$ 175.633.761,00	5.888.340,00	12.839.231,00	18.727.571,00	18.727.571,00
						AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTADO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTADO	3,77%	$ 21.706.737,67
							EJECUTADO		EJECUTADO	3,26%	$ 18.727.571,00

Imagen 2 - Control presupuestal

Ver Anexo 1. Soportes ejecución presupuestal

5.2 Estado actual de pólizas

El presente convenio asociativo cuenta con dos pólizas vigentes con la entidad SEGUROS DEL ESTADO con NIT 860.009.578-6, las cuales se detallan en a la siguiente tabla

Tabla 6 - Ejecución presupuestal a diciembre 2025

Póliza	No. Póliza	Amparos	Suma asegurada	Vigencia		Estado
				Desde	Hasta	
Cumplimiento	47-44-101033040	Pago anticipado	$ 49.997924,11	28/11/2025	28/3/2027	Vigente
		Cumplimiento del contrato	$ 39.966.366,20	28/11/2025	28/3/2027	Vigente
		Pago de salario	$ 39.966.366,20	28/11/2025	28/11/2029	Vigente
		Calidad del servicio	$ 39.966.366,20	28/11/2025	28/3/2027	Vigente
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101010391	Predios labores y operaciones	$ 119.899.099,00	28/11/2025	28/11/2026	Vigente
		Contratistas y subcontratistas	$ 119.899.099,00	28/11/2025	28/11/2026	Vigente
		Vehículos propios y no propios	$ 119.899.099,00	28/11/2025	28/11/2026	Vigente

5.3 Comité de obras y reuniones

El día 28 de noviembre 2025, en las instalaciones de la corporación autónoma, la señora Aurora María Izquierdo Torres actuando como representante legal de ASOANEI y su equipo interdisciplinario de apoyo, se reunieron con el supervisor del convenio Ing. Mónica Ines González Thomas, en representación de CORPOCESAR, cuya finalidad fue la firma de acta de inicio, durante esta reunión se establecieron los siguientes puntos clave: socialización del plan de trabajo, donde el equipo de ASOANEI, expuso de forma detallada el plan de trabajo y se hizo la verificación de los requisitos de perfeccionamiento del convenio.



Imagen 3 - Firma acta de inicio



Imagen 4- Firma acta de inicio



Imagen 5- Firma acta de inicio

Ver Anexo 2. Acta de inicio y listado de asistencia

6. INFORME FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

6.1 Desembolsos

6.1.1 Primer Desembolso

El día 04 de diciembre de 2025 ASOANEI realiza mediante radicado 16304 la entrega a CORPOCESAR de Plan De Trabajo y demás documentos como requisito para el primer desembolso del convenio, adicionalmente el 18 de diciembre del mismo año mediante radicado 16873 se entrega factura de venta No. FVE 524 con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula Tercera del convenio de asociación. Valor Y Forma De Pago. "Forma De Pago: Los aportes de Corpocesar serán desembolsados de la siguiente manera: Primer desembolso: Equivalente al 12,51% de los recursos aportados por Corpocesar al convenio, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización, así a la firma del acta de inicio de este y previa entrega del plan de trabajo"

6.2 Estado actual de facturación

A corte de diciembre 2025 se ha emitido 1 factura correspondiente al primer desembolso, se entregan más detalles a continuación

Tabla 7 - Estado actual de facturación

DESCRIPCIÓN	%	APORTES CORPOCESAR	TOTAL	ESTADO	FACTURA	RADICACIÓN
Desembolso 1	12,51%	$ 399.663.662,95	$ 49.997.924,24	No pagado	FVE 524	No. 16873 18/DIC/2025

7. INFORME TÉCNICO

Periodo de informe	28 de Noviembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025
Persona de contacto	Alecy Andrade Carmona – Ingeniero Agroecológico
Dirección de e-mail	a.andrade@anei.org.co
Informe realizado por	Liney Magdalena Tamayo Rueda – Dinamizador Técnico

7.1 Actividades desarrolladas

TAREA N°1. Planificación y Alistamiento del Proyecto					
PRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**PERIODOS**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**INFORME N°**
PRODUCTO 1.1	***Realización de Convocatoria para Conformación del equipo técnico del proyecto***	1	100%	100%	1

La metodología empleada para la realización de la convocatoria y conformación del equipo técnico del convenio se fundamentó en un enfoque de diagnóstico participativo y selección concertada, orientado a identificar perfiles idóneos con conocimiento técnico, experiencia territorial y capacidad de articulación comunitaria.

Este proceso, se origina de un diagnóstico inicial de capacidades locales y necesidades técnicas del convenio, el cual permitió definir los perfiles profesionales y técnicos requeridos para la adecuada ejecución de las acciones de restauración ecológica, fortalecimiento de la gobernanza ambiental, monitoreo ecológico y acompañamiento social. Con base en este diagnóstico, se diseñó y ejecutó una convocatoria pública, abierta y transparente, la cual fue difundida principalmente a través del sitio web institucional, garantizando el acceso equitativo a la información, la amplia divulgación de los términos de referencia y la participación de profesionales interesados.

Adicionalmente, la convocatoria fue socializada mediante estrategias complementarias de difusión territorial con la ayuda de la coordinadora municipal de la sede Agustín Codazzi, comunicando de manera personal a actores del territorio y mediante grupos oficiales de WhatsApp, asegurándose de convocar a personal con experiencia previa en la Serranía del Perijá o en contextos socioambientales similares.

El proceso de postulación y selección incluyó la recepción y revisión de hojas de vida, la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos, entrevistas semiestructuradas y, cuando fue pertinente, la validación de competencias relacionadas con el trabajo comunitario y territorial. Todo el proceso se desarrolló bajo criterios de transparencia, equidad, meritocracia y pertinencia territorial.

Tabla 8 - Equipo de Trabajo

N°	NOMBRE COMPLETO	CARGO
1	Alecy Andrade Carmona	Profesional agroecológico
2	Yalidys Lorena Olivares Baquero	Profesional social
3	Clarena Maestre Martinez	Dinamizador social
4	Yaleidys Lopez Bula	Gestor técnico de campo
5	Yeidis Meliza Montero Gutiérrez	Gestor Administrativo Contable

El objetivo de esta metodología fue conformar un equipo técnico interdisciplinario, idóneo y con arraigo territorial, capaz de responder de manera efectiva a los retos ambientales, sociales y culturales del proyecto. De igual manera, se buscó promover la participación de talento humano local, fortaleciendo la apropiación social del proyecto, la corresponsabilidad y los esquemas de gobernanza ambiental en la Serranía del Perijá.

Ver Anexo 3. Producto 1.1

TAREA N°1. Planificación y Alistamiento del Proyecto					
PRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**PERIODOS**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**INFORME N°**
PRODUCTO 1.2	***Apertura de cuenta bancaria exclusiva del convenio***	1	100%	100%	1

Como parte del alistamiento administrativo y financiero, se realizó la apertura de una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos del convenio creada en el Banco del Occidente. Esta acción se implementó con el fin de garantizar la adecuada administración, control y trazabilidad de los recursos financieros asignados al proyecto.

La cuenta bancaria permite asegurar la transparencia en la ejecución presupuestal, facilitando los procesos de seguimiento, control y rendición de cuentas. Asimismo, contribuye a una gestión financiera ordenada, evitando la mezcla de recursos y fortaleciendo la confianza institucional y comunitaria en el desarrollo del proyecto.

Ver Anexo 4. Producto 1.2

TAREA N°1. Planificación y Alistamiento del Proyecto					
PRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**PERIODOS**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**INFORME N°**
PRODUCTO 1.3	***Ejecución de Mesas de Trabajo con Equipo Técnico***	1	100%	100%	1

Una vez conformado el equipo técnico, se llevó a cabo la mesa de trabajo inicial, orientada a la planificación operativa del proyecto. Este espacio permitio analizar de manera conjunta los objetivos, actividades, metas, cronogramas e indicadores, así como definir roles y responsabilidades específicas para cada integrante del equipo.

La mesa de trabajo se constituyó como un escenario de articulación técnica y metodológica, en los que se identificaron las diversas tareas y se ajustaron a las realidades del territorio, esta facilitó la construcción de una visión compartida del proyecto y fortaleció el trabajo colaborativo entre los profesionales involucrados.

Ver Anexo 5. Producto 1.3

TAREA N°1. Planificación y Alistamiento del Proyecto					
PRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**PERIODOS**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**INFORME N°**
PRODUCTO 1.4	***Planes de Trabajo Productivos y de Formación Elaborados***	1	100%	100%	1

Se realizó la adecuación detallada de los Planes de Trabajo Productivos y de Formación, los cuales constituyen los principales instrumentos de orientación para la ejecución técnica y operativa de las acciones en territorio. Este proceso permitió organizar, programar y articular de manera coherente las actividades previstas, en concordancia con los objetivos del proyecto, los resultados esperados y el cronograma general de ejecución.

Como eje central de este ejercicio de planificación, se actualizó el Plan Operativo Anual (POA), mediante el cual se definieron de forma clara y estructurada las actividades a desarrollar, las metas asociadas, los productos esperados, los tiempos de ejecución y la financiación. El POA fue actualizado de manera participativa con el equipo técnico del proyecto, garantizando la articulación entre los componentes productivo, formativo, ambiental y social, y permitiendo una adecuada planeación y distribución de los recursos humanos, técnicos y financieros durante el período de ejecución.

De manera complementaria, se elaboró la herramienta de programación tipo Project, que permitió estructurar la secuencia temporal de las actividades y visualizar la diversificación de las acciones a lo largo del tiempo correspondiente a la ejecución del proyecto. Esta herramienta facilitó la identificación de hitos, dependencias entre actividades y momentos clave de intervención, fortaleciendo la capacidad de seguimiento, control y ajuste oportuno del cronograma.

La incorporación del POA y del Project permitió diversificar las actividades del proyecto de forma equilibrada, integrando acciones productivas, procesos de formación, acompañamiento técnico, visitas de seguimiento y fortalecimiento comunitario, en coherencia con las dinámicas del territorio y las capacidades de las familias beneficiarias. En conjunto, estos planes de trabajo se consolidaron como instrumentos técnicos dinámicos y estratégicos, orientados a garantizar una ejecución

www.anei.org.co

ordenada, eficiente y alineada con los objetivos del proyecto, sentando bases sólidas para el cumplimiento de las metas establecidas.

Ver Anexo 6. Producto 1.4

TAREA N°1. Planificación y Alistamiento del Proyecto					
PRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**PERIODOS**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**INFORME N°**
PRODUCTO 1.5	***Realización de Encuentro de Armonización Territorial Inicial***	1	100%	100%	1

Se llevó a cabo para el periodo del informe, el encuentro de armonización territorial inicial como un espacio de diálogo, concertación y reconocimiento del territorio y sus dinámicas sociales, culturales y ambientales, con la participación de jóvenes y productores de la región. Este encuentro tuvo como objetivo generar un primer acercamiento con las comunidades, socializar los alcances del proyecto y promover un ambiente de confianza y corresponsabilidad.

Durante este espacio se resaltó la importancia del respeto por los saberes ancestrales, las prácticas locales y la relación de las comunidades con su entorno, integrando estos elementos en el desarrollo del proyecto. El encuentro de armonización territorial permitió fortalecer la legitimidad del proyecto y sentar las bases para una implementación participativa y contextualizada.

La jornada inició con una cálida bienvenida, seguida de una oración colectiva y una actividad simbólica llamada Tejiendo la Red, orientada a fortalecer los lazos comunitarios, reconocer la memoria del territorio y representar de manera colectiva el proceso organizativo que venimos construyendo desde el trabajo comunitario y la visión de paz territorial. Durante el encuentro se abordaron diversos temas de interés para los productores y productoras, entre ellos el comportamiento del precio del café, los retos actuales del sector y la importancia de avanzar hacia sistemas productivos sostenibles y resilientes. Así mismo, se socializaron los componentes del proyecto asociativo con Corpocesar el cual lleva como nombre Restauración Ecológica Integral y Gobernanza Ambiental de la Serranía del Perijá, resaltando en este como la creación de soluciones basadas en la naturaleza, permitirán promover la recuperación funcional de ecosistemas, incrementando la cobertura vegetal con especies nativas en sistemas agroforestales que no solo regeneran el paisaje y mejoran la conectividad ecológica, sino que también fortalecen los medios de vida y la economía de las familias campesinas del territorio. A ello se suma la limitada formación ambiental y técnica de la población joven, explicando que esto restringe su capacidad para implementar prácticas agroecológicas sostenibles y participar activamente en procesos de conservación y manejo del territorio. En respuesta a esta realidad, se socializa la inclusión de la Escuela Guardianes del Territorio, concebida como un espacio de educación ambiental comunitaria orientado al fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes campesinos en la gestión sostenible del suelo, el agua y la biodiversidad.

Con la finalidad de contextualizar a los participantes del encuentro se indica que la población objetivo se enfoca en 80 personas beneficiarias, correspondientes a 20 familias campesinas con un

promedio de 4 integrantes por hogar, quienes serán directamente impactados por las actividades plasmadas en el proyecto (restauración ecológica de 20 hectáreas y la capacitación de 25 jóvenes), además, se comenta sobre el proceso de convocatoria, selección y vinculación de las familias beneficiarias y jóvenes guardianes del territorio, explicando los criterios necesarios que se evaluaran para el ingreso al proyecto.

Se contó con la participación activa de más de 50 personas, incluyendo productores, productoras y jovenes, quienes compartieron sus experiencias, expectativas y compromisos frente al proceso. Este espacio permitió consolidar el diálogo comunitario, fortalecer la organización social y reafirmar la disposición colectiva para seguir trabajando por el bienestar del territorio y sus ecosistemas.

Registro Fotográfico

Encuentro De Armonización Territorial Inicial. Productores y jóvenes participantes. 18 de diciembre de 2025



Imagen 6 - Actividad Tejiendo La Red



Imagen 7- Almuerzo



Imagen 8 - Jornada de socialización



Imagen 9 - Jornada de socialización

Ver Anexo 7. Producto 1.5

TAREA N°1. Planificación y Alistamiento del Proyecto					
PRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**PERIODOS**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**INFORME N°**
PRODUCTO 1.6	***Realización de Convocatoria, Selección y Vinculación de las Familias Beneficiarias***	1	100%	100%	1

La convocatoria para la selección y vinculación de las familias beneficiarias se realizó de manera articulada con la Coordinadora Municipal de la sede ANEI – Agustin Codazzi, quien desempeñó un papel fundamental como enlace entre el equipo técnico y las comunidades del territorio. Este proceso se desarrolló mediante estrategias de comunicación directa y contextualizadas, priorizando la socialización verbal en el territorio y la difusión de la información a través de grupos oficiales de WhatsApp, lo que permitió un acceso oportuno, amplio y efectivo a la convocatoria.

A través de estos mecanismos se informó a las familias sobre los objetivos del proyecto, los criterios de selección, los compromisos requeridos y los beneficios asociados a su participación. Posteriormente, se adelantó el proceso de selección de las familias interesadas, el cual luego fue complementado con actividades de caracterización social y visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada, identificar las condiciones reales de las familias y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

Ver Anexo 8. Producto 1.6

TAREA N°1. Planificación y Alistamiento del Proyecto					
PRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**PERIODOS**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**INFORME N°**
PRODUCTO 1.7	***Realización de Convocatoria, Selección y Vinculación de Grupo de Jóvenes Guardianes del Territorio***	1	100%	100%	1

De manera paralela, se adelantó la convocatoria para la conformación del grupo de Jóvenes Guardianes del Territorio, proceso que contó igualmente con el acompañamiento y liderazgo de la Coordinadora Municipal del proyecto y la Profesional Social. La difusión de esta convocatoria se realizó mediante socialización verbal en las comunidades y a través de grupos oficiales de WhatsApp, facilitando la participación de jóvenes provenientes de diferentes veredas del área de intervención.

Este proceso tuvo como objetivo fomentar la participación activa de jóvenes en iniciativas orientadas al cuidado, protección y valoración del territorio, así como al fortalecimiento del liderazgo juvenil y la apropiación de prácticas ambientalmente sostenibles. La selección de los jóvenes se basó en

criterios especificos entre los cuales la motivación para participar en procesos comunitarios y formativos, y el compromiso con los objetivos y principios del proyecto.

Ver Anexo 9. Producto 1.7

TAREA N°1. Planificación y Alistamiento del Proyecto					
PRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**PERIODOS**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**INFORME N°**
PRODUCTO 1.8	***20 Familias Beneficiarias Vinculadas al Proyecto***	1	100%	100%	1

Como parte del proceso de selección y previo a la vinculación formal, se realizaron visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada por las familias, identificar sus condiciones sociales, productivas y territoriales, y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

Como resultado del proceso de convocatoria, verificación y selección, se logró la vinculación de 20 familias beneficiarias al proyecto. Estas familias representan el núcleo principal de la intervención y participan activamente en los procesos productivos, formativos y comunitarios planteados.

La vinculación de las familias se realizó mediante acuerdos claros, en los que se establecieron compromisos mutuos, garantizando su participación responsable y constante en las actividades del proyecto. Este proceso fortalece el sentido de pertenencia y la apropiación de las acciones desarrolladas.

Ver Anexo 10. Producto 1.8

TAREA N°1. Planificación y Alistamiento del Proyecto					
PRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**PERIODOS**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**INFORME N°**
PRODUCTO 1.9	***25 Miembros Conformando el Grupo de jóvenes Guardianes del Territorio***	1	100%	100%	1

En el marco del proceso de conformación del grupo de Jóvenes Guardianes del Territorio, y mediante las visitas de verificación a los hogares, se constató la información suministrada, conociendo sus condiciones familiares y territoriales, y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

Finalmente, se consolidó la conformación del grupo de Jóvenes Guardianes del Territorio, integrado por 25 jóvenes del área de intervención. Este grupo desempeña un rol fundamental en la promoción de prácticas de conservación, restauración y protección del territorio, así como en la sensibilización comunitaria.

La participación de los jóvenes contribuye al relevo generacional, al fortalecimiento del tejido social y a la construcción de una visión de futuro basada en el cuidado del territorio. Su vinculación al proyecto reafirma el enfoque participativo e inclusivo de la iniciativa y refuerza su impacto a mediano y largo plazo.

Ver Anexo 11. Producto 1.9

TAREA N°3. Plan de Fortalecimiento Productivo					
PRODUCTO	**ACTIVIDAD**	**META**	**AVANCE**	**EJECUTADO**	**INFORME N°**
PRODUCTO 3.1	***Visitas de asistencia técnica y acompañamiento***	240	20	8.3%	1

En el marco de la TAREA N°3 correspondiente al Plan de Fortalecimiento Productivo, se desarrollaron un total de 20 visitas de asistencia técnica y acompañamiento, las cuales estuvieron orientadas a la verificación de predios postulados por las familias interesadas en vincularse al proyecto. Estas visitas fueron realizadas directamente por la gestora de campo, como parte de las acciones iniciales de seguimiento y validación en territorio.

El objetivo principal de estas visitas fue constatar en campo la información suministrada por las familias durante el proceso de convocatoria, identificar las condiciones reales de los predios y caracterizar los aspectos sociales, productivos y ambientales relevantes para la implementación de las acciones del proyecto. Asimismo, permitieron evaluar la viabilidad de las iniciativas productivas propuestas, considerando variables como el uso actual del suelo, la disponibilidad de áreas productivas, el acceso a recursos naturales y el nivel de compromiso de las familias beneficiarias.

Las visitas de verificación se constituyeron en un insumo técnico fundamental para la toma de decisiones, ya que posibilitaron validar la pertinencia de la vinculación de las familias al proyecto y ajustar la focalización territorial inicialmente planteada. De igual manera, estas acciones de acompañamiento facilitaron un primer acercamiento entre la gestora de campo y las familias, fortaleciendo la confianza, la comunicación directa y el conocimiento del contexto local.

En conjunto, las 20 visitas de asistencia técnica y acompañamiento desarrolladas durante esta primera etapa contribuyeron al adecuado alistamiento del Plan de Fortalecimiento Productivo, garantizando que la selección de beneficiarios y la planificación de las acciones se llevaran a cabo teniendo en cuenta información verificada, criterios técnicos y una comprensión real de las dinámicas del territorio.

Ver Anexo 12. Producto 3.1

7.2 Avance de actividades

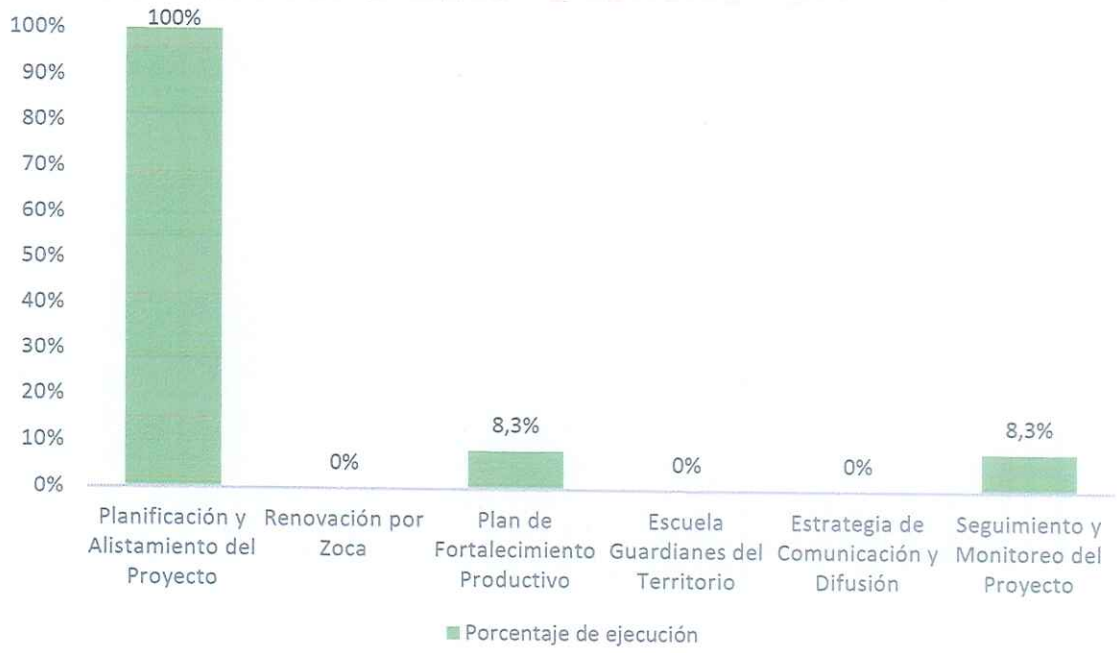


Figura 3 - Avance de actividades

8. PERSONAL, EQUIPOS E INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

8.1 Equipo de trabajo con intervención en el proyecto

Tabla 9 - Equipo de trabajo con intervención en el proyecto

N°	NOMBRE COMPLETO	CARGO
1	Alecy Andrade Carmona	Profesional agroecológico
2	Yalidys Lorena Olivares Baquero	Profesional social
3	Clarena Maestre Martinez	Dinamizador social
4	Yaleidys Lopez Bula	Gestor técnico de campo
5	Yeidis Meliza Montero Gutiérrez	Gestor Administrativo Contable

8.2 Roles y funciones de los profesionales

Profesional agroecológico

Rol general: Coordinar y acompañar la implementación técnica del componente agroecológico del proyecto, asegurando la transición hacia sistemas sostenibles de producción de café mediante prácticas de conservación del suelo, manejo de bioinsumos y fortalecimiento de capacidades locales.

Funciones principales:

- Diseñar e implementar el plan técnico de renovación por zoca con enfoque agroecológico.
- Acompañar a los productores en la aplicación de buenas prácticas agrícolas (BPA) y agroforestales.
- Promover el uso de bioinsumos, abonos orgánicos y técnicas de conservación de suelos y agua.
- Coordinar el establecimiento del sistema agroforestal.
- Apoyar los procesos formativos de la Escuela Guardianes del Territorio en los módulos de agroecología, suelos y restauración ecológica.
- Realizar monitoreos técnicos (crecimiento, productividad, control de plagas, etc.) y generar informes mensuales de avance.

Profesional Social

Rol general: Fortalecer el tejido social, la organización comunitaria y el liderazgo en torno a la sostenibilidad, la equidad de género y la participación efectiva de jóvenes y mujeres en la ejecución del proyecto.

Funciones principales:

- Diseñar e implementar estrategias y metodologías de participación social con las familias beneficiarias.
- Facilitar espacios de diálogo y concertación en la comunidad.
- Incorporar enfoques diferenciales (género, juventud, interculturalidad) en la ejecución del proyecto.
- Acompañar procesos de fortalecimiento organizativo y liderazgo juvenil en la Escuela Guardianes del Territorio.
- Promover el intercambio de saberes entre generaciones y entre comunidades.
- Coordinar actividades de educación ambiental y sensibilización social en las zonas de intervención.
- Elaborar informes mensuales de avance de la Escuela.

Dinamizador Social

Rol general: Apoyar la gestión operativa, logística y comunitaria del proyecto en territorio, garantizando la articulación entre las comunidades, la organización (ASOANEI) y los equipos técnicos.

Funciones principales:

- Realizar la convocatoria, acompañamiento y seguimiento a las familias participantes.
- Apoyar la logística de talleres, formaciones y jornadas de campo.
- Dinamizar la comunicación entre productores, técnicos y la coordinación del proyecto.
- Facilitar el registro de información social y técnica en campo.
- Motivar la participación efectiva de jóvenes y mujeres en las actividades del proyecto.
- Apoyar las actividades prácticas de la Escuela Guardianes en campo.

www.anei.org.co

- Promover el sentido de pertenencia, cooperación y trabajo colectivo en las comunidades.

Gestor Técnico de Campo

Rol general: Brindar acompañamiento técnico directo a las familias productoras durante el proceso de renovación de cafetales, asegurando la aplicación de los planes productivos y la adopción de prácticas sostenibles.

Funciones principales:

- Realizar diagnósticos prediales mediante visitas de asistencia técnica y acompañamiento.
- Acompañar la ejecución de labores agrícolas en campo (zoca, poda, siembra, fertilización, control biológico).
- Monitorear el avance técnico de la renovación y elaborar informes de seguimiento.
- Capacitar a las familias en temas de manejo de cultivo, agroforestería y uso de bioinsumos.
- Coordinar con el Profesional Agroecológico la implementación de prácticas sostenibles.
- Participar en las sesiones prácticas de la Escuela Guardianes como facilitador técnico.

Gestor Administrativo Contable

Rol general: Apoyar la gestión administrativa, contable y financiera de la organización, mediante el registro y control de los movimientos contables, la organización documental y la asistencia en procesos presupuestales y de pagos, garantizando la correcta ejecución de los recursos y el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la entidad y las normas vigentes.

Funciones principales:

- Registrar y controlar los movimientos contables y financieros del proyecto, de acuerdo con el presupuesto aprobado, el POA y la normativa vigente.
- Apoyar el seguimiento a la ejecución presupuestal, verificando la correcta imputación de los gastos por actividad, componente y fuente de financiación.
- Organizar y custodiar la documentación administrativa, contable y financiera del proyecto, garantizando la trazabilidad y disponibilidad de los soportes.
- Apoyar los procesos de pago a proveedores, contratistas y personal del proyecto, verificando el cumplimiento de los requisitos administrativos, contractuales y fiscales.
- Realizar conciliaciones bancarias de la cuenta exclusiva del proyecto y apoyar el control de los recursos financieros.
- Apoyar la elaboración de informes administrativos y financieros para la rendición de cuentas y los procesos de seguimiento, interventoría o auditoría.

Ver Anexo 13. Hojas de vida

Anexo 2. Acta de inicio y listado de asistencia

CONVENIO N°	19-7-0008-0-2025
FECHA	06 de noviembre de 2025
CLASE DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN
CONTRATISTA	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI
C.C O NIT	900048861-7
SUPERVISOR (A)	SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACION ECOLOGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANIA DEL PERIJA, MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
ACTIVIDADES	Ejecutar las actividades contempladas en la Clausula Primera – *Objetivos Específicos del Contrato*, inmersa en el Convenio de asociación No. 19-7-0008-0-2025 y en el Estudio Previo.
VALOR DEL CONTRATO	El valor del presente convenio asciende a la suma de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($575.297.423,95) M/CTE. APORTES CORPOCESAR ($399.663.662,95) APORTES ASOANEI ($175.633.761,00)
PLAZO	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	28 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	27 de noviembre de 2026

El día 28 de noviembre de 2025, en la ciudad de Valledupar, se reunieron **MONICA INES GONZALEZ THOMAS,** Subdirectora General del Área de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en calidad Supervisora, y **AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES**, en su condición de representante legal de ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI, con el fin de dar inicio a los trabajos correspondientes al CONVENIO DE

054

ASOCIACIÓN N.° 19-7-0008-0-2025 del 06 de noviembre de 2025, celebrado entre las partes una vez verificado los requisitos de perfeccionamiento del convenio referenciado.

De la presente acta hace parte la entrega formal del plan de trabajo y cronograma en formato Project.

Las partes abajo firmantes dejan constancia que se presentaron y revisaron los documentos antes mencionados necesarios para dar inicio al CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 19-7-0008-0-2025

El Supervisor del convenio puso en conocimiento lo siguiente:

1. Que para el desarrollo del convenio es indispensable mantener el plan de trabajo presentado en el proyecto y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.

2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias del Supervisor, quien vigila el cumplimiento en forma permanente de todas las obligaciones.

Verificado lo anterior, se establece como fecha de iniciación del Convenio, el día 28 de noviembre de 2025.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

MONICA INES GONZALEZ THOMAS
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental
Supervisora

AURORA MARIA IZQUIERDO
R/L ASOANEI

CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PLANILLA DE ASISTENCIA	PCA-04-F-13 VERSIÓN: 2.0 FECHA: 22/09/2022 Página 1 de 1

ASUNTO: Reunión inicio Convenio 19-7-0005-0-2025 Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Económicos Para La Restauración Ecológica Integral y Gobernanza Ambiental En La Serranía del Perijá, Municipio de Agustín Codazzi, En El Departamento Del Cesar. FECHA: 24/10/2025

LUGAR: Subdirección General del Área de Gestión Ambiental HORA: 10:00 am

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Equipo Subdirección General Área de Gestión Ambiental, Equipo ASONEI

No.	Nombre del funcionario/ Asistente	Documento de Identificación	Dependencia /Entidad	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Celular	Asistencia		Firma
							Presencial	Virtual	
1	Fabian L. Ruiz V.	1100953097	SGAGA / Corpocesar	Profes. Apoyo	ingfabianruiz7@gmail.	3017063622	X		
2.	Yaidys Olivares Bayuro	49609796	ASOANEI - DR.	Coordinadora Social	yl.olivares@anei.org.co	3164760761	X		
3	Guillermo Calcedo V	1067590400	ASOANEI	Gestor de proyecto	g.calcedo@anei.org.co	3043825090	X		
4.	Lucia Córdoba A.	49722292.	SGAGA/ Corpocesar	Prof. Apoyo.	Sostenibilidad 2030 @outlook.s.	3004526688.	X		
5.	Juan Quintero	77042073.	ASOANEI	Líder Coop.	j.quintero@anei.org.co	3017046	X		
6.	Aurora [illegible]	51610.167	ASOANEI	Director	gerencia@anei.org.co	3173418504	X		
7	Sheyra Gonzalez	1065834080	AsoAnei	Com. Social	Sheyragonzalez@gmail.com	3205752308	X		
8	Alex Andrade	79159641	AsoAnei	Coord. Agroecol.	a.andrade@anei.org.co	3144 5014711	X		
9	Mónica Gonzalez T	49.607.368	SGAGA/ Corpocesar	Subd. Gest Amb	monica.gonzalez@corpocesar.gov.co	3015533331	X		
10	Ana Milena Maestre Alvarez	1.065.649.958	ECAP/CORPOCESAR	Prof. de Apoyo	anamilenamaestre@hotmail.com	3114307837	X		Ana Milena Maestre A.
11	Martha Arregocés	49779174	SGAGA / Corpocesar	Prof de Apoyo	admongestionambiental@corpocesar.gov.co	3022205681	X		

Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del link https://www.corpocesar.gov.co/politicas-seguridad.html de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS
DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA "ASOANEI"
NIT.900048861-7

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 24- Noviembre - 2025

LUGAR: CORPOCESAR

TEMA: Reunión Presentación Plan de Trabajo y Acta de Inicio Proyecto CORPOCESAR

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° DOCUMENTO	VEREDA	FIRMA
1	[illegible]	1067590400	Valledupar - ASOANEI	[illegible]
2	Lucía Córdoba Arangegos.	49722292.	Valledupar.	[illegible]
3	[illegible]	7709 2092	Ypar. ASOANEI	[illegible]
4	[illegible]	51610.167	Valledupar ASOANEI	[illegible]
5	[illegible]	1065894020	Ypar ASOANEI	[illegible]
6	[illegible]	7716941	Ypar. ASOANEI	[illegible]
7	Mónica González Thomas	49607368	CORPOCESAR	[illegible]
8	Ana Milena Maestre Alvarez	1.065.647.958	CORPOCESAR	Ana Milena Maestre A
9	Fabian L. Ruiz Velasquez	1.100.953097	Corpocesar-SCACA	[illegible]
10	[illegible]	49609796	Vpar ASOANEI	[illegible]
11	Martha Araque Barros	49779174	Valledupar	[illegible]
12				
13				

Anexo 3. Producto 1.1

Realización de Convocatoria para Conformación del equipo técnico del proyecto

Dec 12, 2025 3:29:38 PM

Convocatoria Oportunidad laboral - Profesional Agroecológico

Anei

Share:

La Asociación de Productores Agroecológicos e Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta – ANEI, invita a profesionales comprometidos, éticos y apasionados por la gestión transparente de los recursos a participar en la convocatoria para el cargo de:

Profesional Agroecológico

Área: Desarrollo Rural
Tipo de contrato: Indefinido.
Jornada laboral: Tiempo completo.



Propósito del cargo

Coordinar y acompañar la implementación técnica del componente agroecológico del proyecto, asegurando la transición hacia sistemas sostenibles de producción de café mediante prácticas de conservación del suelo, manejo de bioinsumos y fortalecimiento de capacidades locales.

Requisitos del cargo:

✅ Formación: profesional agroecológico
✅ Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia en la coordinación técnica de proyectos agroecológicos, manejo de sistemas agroforestales y procesos de transición hacia una agricultura sostenible.

Documentos requeridos:

📌 Hoja de vida actualizada.
📌 Copia o certificación de estudios.
📌 Certificaciones laborales que acrediten experiencia.

¿Por qué unirte a Anei?

Formarás parte de una organización indígena y campesina que promueve la sostenibilidad, la transparencia y el desarrollo integral de las comunidades productoras de café y otros proyectos agroecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.

Email: talentohumanoanei@gmail.com

Dec 12, 2025 3:26:55 PM

Convocatoria Oportunidad laboral - Profesional Social

Anei

Share:

La Asociación de Productores Agroecológicos e Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta – ANEI, invita a profesionales comprometidos, éticos y apasionados por la gestión transparente de los recursos a participar en la convocatoria para el cargo de:

Profesional Social

Área: Desarrollo rural
Tipo de contrato: Tiempo indefinido



Propósito del cargo

Fortalecer el tejido social, la organización comunitaria y el liderazgo en torno a la sostenibilidad, la equidad de género y la participación efectiva de jóvenes y mujeres en la ejecución del proyecto.

Requisitos del cargo:

✅ Formación: Profesional en Sociología, Trabajo Social o Ciencias Sociales afines.
✅ Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia en procesos de trabajo comunitario en comunidades indígenas y campesinas, fortalecimiento organizativo y gestion de proyectos sociales.

Documentos requeridos:

📌 Hoja de vida actualizada.
📌 Copia o certificación de estudios.
📌 Certificaciones laborales que acrediten experiencia.

¿Por qué unirte a Anei?

Formarás parte de una organización indígena y campesina que promueve la sostenibilidad, la transparencia y el desarrollo integral de las comunidades productoras de café y otros proyectos agroecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.

Dec 12, 2025 3:38:40 PM

Convocatoria Oportunidad laboral - Dinamizador Social

Anei

Share:

La Asociación de Productores Agroecológicos e Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta – ANEI, invita a profesionales comprometidos, éticos y apasionados por la gestión transparente de los recursos a participar en la convocatoria para el cargo de:

Gestor/a Técnico/a de campo

Área: Desarrollo rural
Tipo de contrato: Prestación de servicios.



Propósito del cargo

Apoyar la gestión operativa, logística y comunitaria del proyecto en territorio, garantizando la articulación entre las comunidades, la organización (ASOANEI) y los equipos técnicos.

Requisitos del cargo:

✅ Formación: Licenciado en Ciencias Sociales o afines.
✅ Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia en acompañamiento social a comunidades indígenas y campesinas, con énfasis en procesos de participación, formación y liderazgo comunitario.

Documentos requeridos:

📌 Hoja de vida actualizada.
📌 Copia o certificación de estudios.
📌 Certificaciones laborales que acrediten experiencia.

¿Por qué unirte a Anei?

Formarás parte de una organización indígena y campesina que promueve la sostenibilidad, la transparencia y el desarrollo integral de las comunidades productoras de café y otros proyectos agroecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.

Email: talentohumanoanei@gmail.com

Dec 12, 2025 3:00:05 PM

Convocatoria Oportunidad laboral - Gestor/a Técnico/a de campo

Anei

Share:

La Asociación de Productores Agroecológicos e Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta – ANEI, invita a profesionales comprometidos, éticos y apasionados por la gestión transparente de los recursos a participar en la convocatoria para el cargo de:

Gestor/a Técnico/a de campo

Área: Desarrollo rural
Tipo de contrato: Prestación de servicios.



Propósito del cargo

Brindar acompañamiento técnico directo a las familias productoras durante el proceso de renovación de cafetales, asegurando la aplicación de los planes productivos y la adopción de prácticas sostenibles.

Requisitos del cargo:

✅ Formación: Técnico o tecnólogo en areas agropecuarias.
✅ Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia en la asistencia técnica a pequeños productores, implementación de prácticas agroecológicas y acompañamiento en sistemas productivos sostenibles.

Documentos requeridos:

📌 Hoja de vida actualizada.
📌 Copia o certificación de estudios.
📌 Certificaciones laborales que acrediten experiencia.

¿Por qué unirte a Anei?

Formarás parte de una organización indígena y campesina que promueve la sostenibilidad, la transparencia y el desarrollo integral de las comunidades productoras de café y otros proyectos agroecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.

062

Dec 11, 2025 1:59:07 PM

Convocatoria Oportunidad laboral - Gestor Administrativo Contable

Anei

Share:

La Asociación de Productores Agroecológicos e Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta – ANEI, invita a profesionales comprometidos, éticos y apasionados por la gestión transparente de los recursos a participar en la convocatoria para el cargo de:

Gestor Administrativo Contable

Área: Administrativo, Contable & Financiero.
Tipo de contrato: Indefinido.
Jornada laboral: Tiempo completo.



Propósito del cargo

Apoyar la gestión administrativa, contable y financiera de la organización, mediante el registro y control de los movimientos contables, la organización documental y la asistencia en procesos presupuestales y de pagos, garantizando la correcta ejecución de los recursos y el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la entidad y las normas vigentes.

Requisitos del cargo:

✅ Formación: Técnico o tecnólogo en contabilidad, gestión administrativa, gestión financiera o afines.
✅ Deseable: Formación complementaria en Excel, programas contables o legislación tributaria
✅ Experiencia: Mínimo 2 año en cargos administrativos y contables, gestion presupuestal, conciliación de gastos y elaboración de informes administrativos.

Documentos requeridos:

📌 Hoja de vida actualizada.
📌 Copia o certificación de estudios.
📌 Certificaciones laborales que acrediten experiencia.

¿Por qué unirte a Anei?

Formarás parte de una organización indígena y campesina que promueve la sostenibilidad, la transparencia y el desarrollo integral de las comunidades productoras de café y otros proyectos agroecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.

Email: talentohumanoanei@gmail.com

Anexo 4. Producto 1.2

Apertura de cuenta bancaria exclusiva del convenio

www.anei.org.co

Bogota Febrero 11 de 2026

Señores
ASONEI
Ciudad

ASUNTO: Apertura Cuenta Corriente

Nos permitimos informar que se realizó con éxito Apertura Cuenta Corriente **900-88823-1** Oficina Valledupar .

ASONEI NIT 900.048.861-7

La anterior cuenta está activa y puede ser utilizada de manera inmediata, le damos una gratificante bienvenida y agradecemos de antemano por elegirnos.

Cordialmente,

Mesa Soporte de Negocio Gerencia S.O.A

Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología

Anexo 5. Producto 1.3

Ejecución de Mesas de Trabajo con Equipo Técnico

ACTA DE REUNIÓN APERTURA DEL PROYECTO

ORGANIZACIÓN: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ - ASOANEI

Fecha de realización: 17 de diciembre de 2025
Hora de inicio: 8:00 AM
Lugar: Salón de juntas ASOANEI

Se deja constancia de la participación del equipo técnico del Proyecto en el desarrollo de la reunión de apertura donde se abarcaron las temáticas, actividades y productos iniciales que corresponden a la etapa inicial de planificación y alistamiento del Proyecto.

Orden del día

1. Adecuación de la reunión y bienvenida
2. Presentación del equipo técnico
3. Presentación general del proyecto
4. Planificación y alistamiento del proyecto
5. Análisis de las primeras actividades y sus avances
6. Socialización de la convocatoria para conformación del equipo técnico
7. Confirmación de la apertura de cuenta bancaria exclusiva del convenio
8. Análisis del plan de trabajo productivo y de formación, teniendo en cuenta las actividades y las fechas.
9. Identificación de la convocatoria, análisis del proceso de selección y vinculación de las familias beneficiarias.
10. Identificación de la convocatoria, análisis del proceso de selección y vinculación de las de jóvenes para el grupo de Guardianes del Territorio
11. Identificación del punto estratégico para la ubicación de la valla publicitaria.
12. Planificación del encuentro de armonización territorial y definición del lugar.
13. Compromisos y cierre

Desarrollo de la reunión

Se inició la reunión dando la bienvenida a los asistentes y realizando una contextualización del proyecto RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ , se comenta que las mesas de trabajo están creadas como escenarios de articulación técnica y metodológica, donde se facilite la construcción de una visión compartida del proyecto y el fortalecimiento del trabajo colaborativo entre los profesionales involucrados, por lo que se desarrollaran con continuidad para llevar un control de las actividades realizadas.

En esta mesa de trabajo, se destacaron los objetivos generales y el alcance esperado en el territorio. Posteriormente, se abordaron las actividades correspondientes a la primera etapa plasmada en el cronograma de actividades del proyecto abarcando la planificación y alistamiento para el inicio optimo y exitoso de este, definiendo las acciones iniciales necesarias para su correcta ejecución.

Se socializaron las diferentes actividades y se comenzó un proceso de identificación de actividades realizadas y aquellas que necesitaban organización para su ejecución. Asimismo, se corroboró la apertura de la cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos del convenio, confirmando la creación de este producto.

Durante la reunión se planteó la ejecución de mesas de trabajo con el equipo técnico, con la finalidad de orientarlas a la confirmación y planeación de las actividades descritas en el plan de trabajo y formación. Igualmente, se resaltó la importancia de realizar el encuentro de armonización territorial inicial como espacio de diálogo y articulación con las comunidades, identificando factores claves como traslado del equipo y familias productoras, decidiendo el día a realizarlo, el lugar, la creación de un flayer de invitación y definiendo el cronograma del día, en este mismo sentido, se concertó el diseño y tamaño del pendón para su uso en los acompañamientos comunitarios.

Finalmente, se explicó el proceso de convocatoria, selección y vinculación de las familias beneficiarias, así como la conformación del grupo de Jóvenes Guardianes del Territorio, estableciendo como meta la vinculación de 25 jóvenes y 20 familias, teniendo en cuenta algunos criterios de importancia logrando que se alineen a los requerimientos y objetivos del proyecto, con esto, se logra adentrar al equipo en el proceso de reconocimiento de las personas beneficiarias para lograr un acercamiento que permita conocer y compartir aprendizajes desde el aspecto empírico y técnico, además, se socializa el POA detallando las actividades, indicadores y resultados esperados.

Compromisos

- Creación de la agenda con las actividades detallas para el desarrollo del día entorno al encuentro de armonización territorial inicial, con el objetivo de socializar la información del proyecto con las comunidades beneficiarias.
- Identificar las actividades a desarrollar, teniendo en cuenta fechas establecidas.
- Establecer los soportes para cada actividad con la finalidad de llevar un desarrollo transparente.

Cierre

No siendo otro el tema a tratar se dio por finalizada la reunión, dejando constancia de los acuerdos alcanzados y compromisos establecidos.

www.anei.org.co

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS







www.anei.org.co

NIT. 900048861-7

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI" – CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ convenio N° 19-7-0008-0-2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 17/DIC/2025 LUGAR: Salón de juntas-3er piso EVENTO: Mesa de trabajo con equipo tecnico

TEMATICA: Planificación, alistamiento y apertura del proyecto

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° DOCUMENTO	GENERO		EDAD	Socio / Familia / Colaborador / Otro				VEREDA	FIRMA
			F	M		S	F	C	O		
1	Yorena Maestre M	39.462.494	V		40		X	X		V/pr.	
2	Yeidis Montero	9133599276	V		25		a	a		VIPR	Yeidis Montero.
3	Yolidys Lorena Olivares B.	49609796	X		43			X		V/par	Yoldz.
4	Yaicidis Lopez Bula	1003390876	X		30			X		Agustin Codazzi	Yaicidis Lopez B.
5	Alacy Andrada C	77164641		X	63			X		VPAR	
6											
0											
1											
2											
3											

Anexo 6. Producto 1.4

Planes de Trabajo Productivos y de Formación Elaborados

Anexo 7. Producto 1.5

Realización de Encuentro de Armonización Territorial Inicial

CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

anei
NIT. 900048861-7

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI" – CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ convenio N° 19-7-0008-0-2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 18/12/2025 **LUGAR:** Finca la Mariela / vereda El Guamal **EVENTO:** Encuentro de Armonización Territorial Inicial

TEMATICA: Socialización del proyecto con familias productoras y Jovenes

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° DOCUMENTO	GENERO		EDAD	Socio / Familia / Colaborador / Otro				VEREDA	FIRMA
			F	M		S	F	C	O		
1	Ancelmo Miranda	77153173		x	56.	x				El Jardin	ANCELMO
2	Luis Manuel Aguila	77157871		x	51		x			Sanora.	
3	Hermes Jimenez Delgado	18938420		x	48	x				La Duda	Hermes J.
4	Elvis Lopez Quintero	77158157		x	51	x				7 de Agosto.	Elvis Lopez Quintero
5	Wilfrido Lopez Vaca	1067715889		x	37		x			El Potón	
6	Enelis Carvajal	77150870		x	60	x				Sanora.	ENELIS C
7	Yelineth Maldonado	1003396566	x		22		x			El Jardin	Yelineth M. B.
8	Eliceo Molina	1055066358		x		x				La Duda.	Eliceo Mol. M
9	Everist Marrugo Bayaloza	77152014		x	58	x				La Duda	
10	Pablo Puente.	77150848		x	61	x				Guamal	Pablo Puentes
11	Edwin Puente. Pena.	1067715752			37	x				Guamal	edwin Puentes
12	Celina Gonzalez N.	49685874	x			x				El Jardin	Celina Gonzalez
13	Karla Valeria Morante	1101690489	x		15	x	x			El Jardin	Karla Valeria Morantes.

NIT. 900048861-7

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI" – CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ convenio N° 19-7-0008-0-2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 18/12/2025 **LUGAR:** Finca la Manuela / Vereda el Guamal **EVENTO:** Taller de Armonización Territorial Local

TEMATICA: Socialización del proyecto con familias productoras y jovenes

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° DOCUMENTO	GENERO		EDAD	Socio / Familia / Colaborador / Otro				VEREDA	FIRMA
			F	M		S	F	C	O		
1	Leiner Yesid Maldonado	1066350125		x	28	x	x			El Jardin	leiner yesid
2	Albeiro Gonzalez Manrique	1007356305		x	28	x				San Jacinto	
3	Jesus Oliver Bonilla	18955547		x	45	x				El Jardin	Jesus oliver
4	Rene Baron Arzuaga	77157254		x	51	x				Tamaquito	
5	Zoraidis Caballero	1085169162	x		26		x			La Sombra	Zoraidis caballero
6	Gustavo Cañizares	77153155		x	59	x				Marcial	Gustavo Cañizares
7	Hector solano	77151698		x	59				x	Guamal	Hector Solano
8	Javier Fragoso	1067718610		x	20	x				Tinaquita	Javier Fragoso
9	Omar Yesid Guerra	1067471273		x	18		x			La Nuda	
10	Orlando Salgado Ovalle	77151009		x	60		x			El Jardin	Orlando S.C.
11	Rosalia Sanchez	36456770	x			x				El Jardin	Rosalia sanchez
12	Jhon Fredy Flores	1067719810		x	35				x	La Guacamaya	
13	Ledys Mendoza Vega	49691515	x		53		x			El Jardin	Ledys Muñoz

CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

asnei
NIT. 900345661-7

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI" – CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ convenio N° 19-7-0008-0-2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 18/12/2025 **LUGAR:** Finca la Horqueta/vereda el Guamal **EVENTO:** Encuentro de Armonización Inicial

TEMATICA: Socialización del proyecto con familias productoras y jovenes

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° DOCUMENTO	GENERO		EDAD	Socio / Familia / Colaborador / Otro				VEREDA	FIRMA
			F	M		S	F	C	O		
1	Emili Carrillo	1066352408	x		14		x			El Jardin	Emily carrillo
2	Yuleidis Bustica.	49700062.	x			x				el Jardin	Yuleidis Bustica C
3	Hernan Neira	18972067	x		50	x	x			Guamal	HERNAN NEIRA
4	Gustavo Cuniz cares	77153155		x	57	x				Makenta/	Gustavo E. cuniz cares
5	Reiner Bayona Vega	1005610478		x	32			x		Valledupar.	REINER BAYONA VEGA
6	Jesus Garcia Lozano	18955465		x	47		x			San Juan N.	JESUS GARCIA
7	Luz Adriana Garcia H.	1007838995		x	27		x			San juan N	Luz Adriana G H
8	Emel Carrillo	77154684		x	54	x				El Jardin	
9	Jose del Carmen Portillo	18910741		x	78	x				La nueva.	Jose portillo
10	Ruth Angueta Ortega	49690494	x		56	x				Campo nuevo	Ruth Angueta O.
11	Anderson Romero A.	1102802054		x	39	x				Campo Nuevo	Anderson Romero
12	Jaime Niño Centeno	13167113		x	48	x				Sinaca.	Jaime niño
13	Uriel Manjeja	1895555 58		x	47					El Jardin	Uriel Manjeja

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI" – CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ convenio N° 19-7-0008-0-2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 19/12/2025 **LUGAR:** Finca la Horizontal Vereda el Guamal **EVENTO:** Socializacion de Almacenamiento territorial Local

TEMATICA: Socialización del Proyecto con familias productoras y jovenes

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° DOCUMENTO	GENERO		EDAD	Socio / Familia / Colaborador / Otro				VEREDA	FIRMA
			F	M		S	F	C	O		
1	Santiago Rodriguez	1069725591		x	31					Guamal	
2	Nelson Eduardo Soto	1066865110		x	21	x				Matkenkal.	
3	Carlos Humberto Leal	18930372		x	80	x				Matkenkal.	
4	Oscar luzardo wilches	77152085		x	57	x				Matkenkal.	
5	Pedro luis Soto	18955281		x	48	x				Matkenkal	
6	Martha Vargas Garay	49688377	x		58	x				Matkenkal.	
7	Miriam Gafaro Rizo	49689109	x		65	x				Matkenkal	
8	Wilfredo Lopez Vera	1067718289		x	32	x				Guamal.	
9	Cin Antonio Jaime.	18933277		x	73	x				Fernambuco	
10	Eideliz Celeon	18938706		x	24	x				Alto Sicarare.	
11	Emel Carrillo	77154568		x	54	x				El jardin.	
12	Olge Beatriz	18956415		x	45	x				El Jardin	
13	Jhon fredy Flores	1067719750		x	40	x				Sabana	

CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

anei
NIT. 900048861-7

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI" – CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR "CORPOCESAR"

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ convenio N° 19-7-0008-0-2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 18/12/2025 **LUGAR:** Finca la Nacional / vereda el Guamal **EVENTO:** Encuentro de Armonización Territorial Local

TEMATICA: Socialización del Proyecto con familias productoras y jovenes

N°	NOMBRE Y APELLIDO	N° DOCUMENTO	GENERO		EDAD	Socio / Familia / Colaborador / Otro				VEREDA	FIRMA
			F	M		S	F	C	O		
1	Danitza Avila Lopez	1067718271	✓		35		✓			Guamal Alto	Danitza Avila L.
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											

Anexo 8. Producto 1.6

Realización de Convocatoria, Selección y Vinculación de las Familias Beneficiarias



Anei

CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Convocatoria Familias Productoras Beneficiarias

Restauración ecológica integral y gobernanza ambiental en la Serrania del Perijá, Municipio de Agustin Codazzi

- Que sea asociado de la organización ASOANEI
- Que cuenten con minimo una hectárea de cultivo de Café, cuya edad de la plantación sea superior a 8 años, y que no haya sido zoqueada.
- Que se encuentre ubicado en la zona de intervención del proyecto.
- Que dentro del predio cuente con áreas ambientales estratégicas.

aneicoffee

081

Convocatoria Familias Beneficiarias

En el marco del proyecto RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ Municipio de Agustin Codazzi, en el departamento del...

forms.gle

5:16 p. m.

Oledis Izquierdo Enlace Anei


Reenviado



Mensaje

Anexo 9. Producto 1.7

Realización de Convocatoria, Selección y Vinculación de Grupo de Jóvenes Guardianes del Territorio

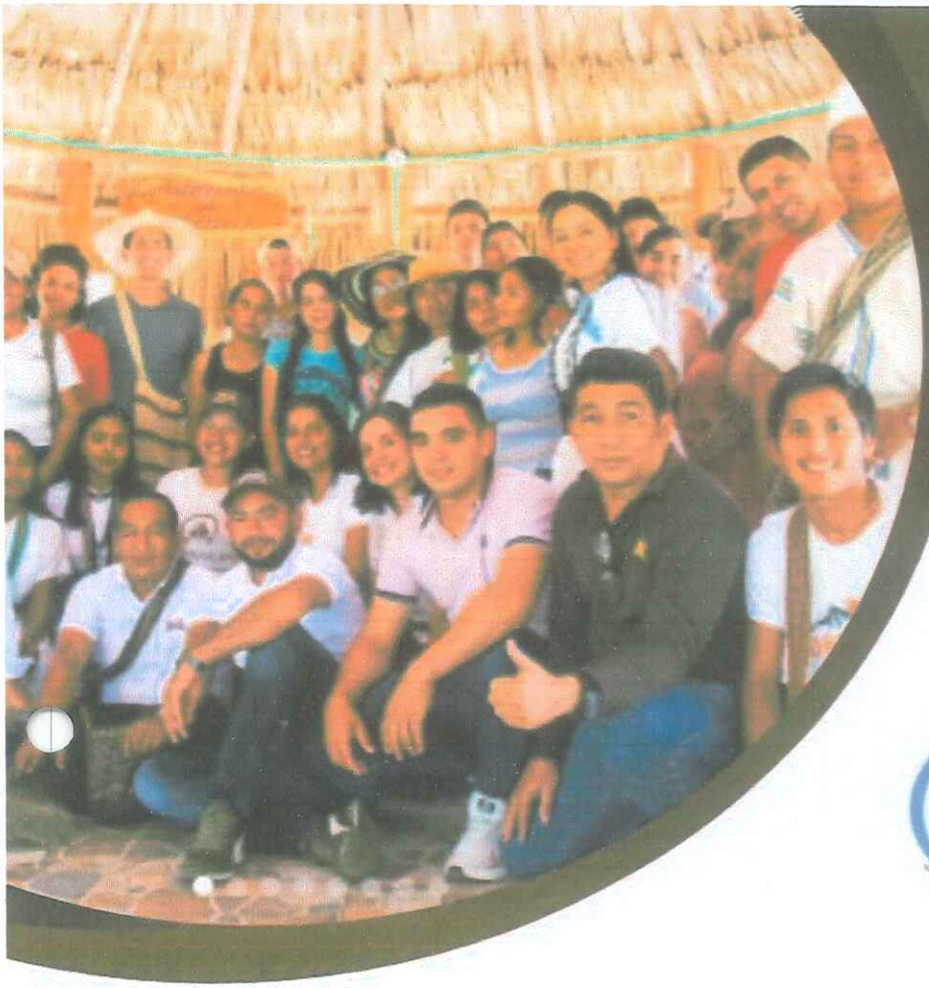

aneí

CORPOCESAR
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR

Convocatoria Grupo de Jovenes Guardianes del Territorio

Restauración ecológica integral y gobernanza ambiental en la Serrania del Perijá, Municipio de Agustin Codazzi

- Edad: Hombres entre 14 y 28 años.
- Mujeres entre 14 y 35 años.
- Jóvenes, hijos, hijas, nietos, sobrinos, esposos o esposas de los beneficiarios directos del proyecto.
- Jóvenes con interés en la agroecologia, el cuidado ambiental y la gestión sostenible del territorio, y disposición para participar en las actividades formativas, prácticas de campo y comunitarias.

aneicoffee

084

Lore ANEI



Lore ANEI



Convocatoria Grupo de Jovenes Guardianes del Territorio

forms.gle

3:18 p.m.

👍 3

~Deimer.Izquierdo +57 315 3721701

👍

D 3:23 p.m.

Anexo 10. Producto 1.8

20 Familias Beneficiarias Vinculadas al Proyecto

LISTADO 20 FAMILIAS BENEFICIARIAS

NOMBRE PRODUCTOR/A	CÉDULA	VEREDA
ELVIS LOPEZ QUINTERO	77158157	7 DE AGOSTO
ANGEL MARIA GOMEZ GONZALES	12488101	ALTO SICARARE
EIDELVER CELON RODRIGUEZ	18938106	BAJO SICARARE
RUTH ANGARITA ORTEGA	49690994	CANO FRIO
EVERST ALBERTO MORON PEÑALOZA	77151014	LA DUDA
JOSE DEL CARMEN PORTILLO	18930527	LA DUDA
HERMES JIMENEZ DELGADO	18938420	LA DUDA
ELISEO MOLINA	1050064756	LA DUDA
CIRO ANTONIO JAIME ACOSTA	18934277	FERNAMBUCO
MARIA LIZETH HERNANDEZ GOMEZ	49698320	SAN JACINTO
URIEL MONTEJO SARMIENTO	18955558	EL JARDIN
EMEL CARRILLO GONZALEZ	77154684	EL JARDIN
OSCAR ORLANDO LOZANO WILCHES	77153085	MAKENKAL
NELSON SALAS PORRAS	77151901	MAKENKAL
CARLOS HUMBERTO LEAL	18930372	MAKENKAL
GUSTAVO CAÑIZARES RIZO	77153155	MAKENKAL
MELBA ISABEL RODRIGUEZ BUELVAS	26052209	LAS VEGAS
HEINER BARBOSA RODRIGUEZ	77158678	LAS VEGAS
ALBEIRO FLOREZ CARRILLO	77159197	ZORROCUCO
ANSELMO MIRANDA HERRERA	77153173	EL JARDIN

Anexo 11. Producto 1.9

25 Miembros Conformando el Grupo de jóvenes Guardianes del Territorio

www.anei.org.co

LISTADO 25 JÓVENES

Nombre y apellidos	No. Documento identidad	Vereda	Parentesco	Productor de referencia/parentesco
Albeiro José García Hernández	1007356305	San Jacinto	Hijo/a	MARIA LIZETH HERNANDEZ
Esneider David Ramírez Saurit	1067713794	7 de agosto	Sobrino/a	ELVIS LOPEZ QUINTERO
Johan Estivinson Hernández Uribe	1066270179	Alto Sicarare	Sobrino/a	ANGEL MARIA GOMEZ GONZALES
Juan Sebastián Pérez Vega	1065202593	Fernambuco	Sobrino/a	CIRO ANTONIO JAIME ACOSTA
Darcy Patricia Hernández Uribe	1129504853	Bajo Sicarare	Sobrino/a	EIDELVER CELON RODRIGUEZ
Keilyn Tatiana Cervantes Hernández	1066349481	Siete de Agosto	Sobrino/a	ELVIS LOPEZ QUINTERO
Luilder Alexander Bula López	1062815816	El Jardin	Sobrino/a	URIEL MONTEJO SARMIENTO
Sebastián Ayala Romero	1137724000	Caño Frio	Nieto/a	RUTH ANGARITA ORTEGA
Albeiro Jose Romero Angarita	1003258887	Caño Frio	Hijo/a	RUTH ANGARITA ORTEGA
Karoll Daiana Romero Torres	1066284095	Caño Frio	Nieto/a	RUTH ANGARITA ORTEGA
Yureinis Tarifa Estrada	1066351007	La Duda	Sobrino/a	HERMES JIMENEZ DELGADO
Maribel Martínez Hernández	1066349593	Caño Frio	Nieto/a	ANGEL MARIA GOMEZ GONZALES
Edinson Andrés Contreras Ardila	1067717533	San Jacinto	Sobrino/a	ALBEIRO FLOREZ CARRILLO
Jaime David Flórez Rodríguez	1067713346	Caño Frio	Sobrino/a	ALBEIRO JOSE GARCIA
Neymar Jesús Molina Quintero	1066353604	La Duda	Hijo/a	ELISEO MOLINA
Eider Andrey Barbosa Pérez	1067723011	Las Vegas	Hijo/a	HEINER BARBOSA RODRIGUEZ
Víctor Manuel Ramos Pabon	1007398791	Fernambuco	Sobrino/a	CIRO ANTONIO JAIME ACOSTA
Eider Santiago Acosta Torres	1067719871	Las Vegas	Sobrino/a	MELBA ISABEL RODRIGUEZ BUELVAS
Angel Gabriel Leal Badillo	1065885628	Makenkal	Nieto/a	CARLOS HUMBERTO LEAL GUERRERO
Jhon Jairo Leal Botello	1067717896	Makenkal	Nieto/a	CARLOS HUMBERTO LEAL GUERRERO
María Dayana Arias Durango	1066350438	La Duda	Sobrino/a	EVERST ALBERTO MORON PEÑALOZA
Davinson David Martínez Ovalle	1067715238	La Duda	Sobrino/a	JOSE DEL CARMEN PORTILLO
Sara Valentina Hernández Santana	1066350505	Las Vegas	Sobrino/a	MELBA ISABEL RODRIGUEZ BUELVAS
Gildardo David Arias Durango	1000402761	La Duda	Sobrino/a	EVERST ALBERTO MORON PEÑALOZA
Stevenson Andrés Martínez Ovalle	1066350800	Zorrocuco	Sobrino/a	ALBEIRO FLOREZ CARRILLO

Anexo 12. Producto 3.1

Visitas de asistencia técnica y acompañamiento

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	16 de diciembre de 2025
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Elvis Lopez Quintero - 77158157*
Nombre de la finca	El Eden
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	7 de Agosto
Objetivo de la visita	Visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada, identificar las condiciones reales de las familias y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

SITUACIÓN ENCONTRADA

En el lote de café Castillo con más de 8 años, se presenta baja productividad, follaje envejecido y alta colonización de malezas, limitando la renovación del cultivo. El productor planea la zoca entre diciembre y enero. Lote de 1 ha, priorizado en el proyecto con Corpocesar, sin manejo actual de malezas.

RECOMENDACIÓN

1. Realizar desrame 2.Hacer zoca a 30 cm, corte inclinado. 3. Recoger el material vegetal grueso para mejorar el ingreso. 4. Aplicar Trichoderma o cicatrizante. 5.Controlar arvenses trimestralmente. 6Llevar registros de campo.

---

www.anei.org.co

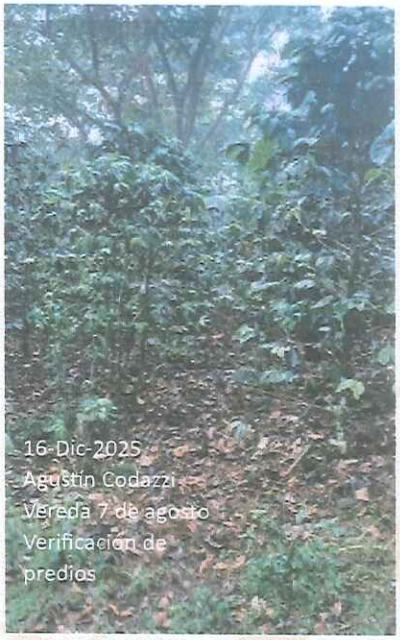


Ilustración 1 - Situación encontrada



Ilustración 2 - Situación encontrada



Ilustración 3 – Foto del productor

Elvis Lopez Quintero

Firma del Productor

YAIEDIS LOPEZ

Firma del Gestor

092

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

NIT. 900048861-7

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

Visita de Verificación de Predio Postulado | VISITA NUMERO: 1

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 16-DIC-25

PRODUCTOR/A: Elvis Lopez Quintero

No. IDENTIFICACION: 77158157

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☑ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: El Eden.

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustin Codazzi

VEREDA: 7 de Agosto

TELÉFONO: 3187278886

PROYECTO: Corpocesar

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ ☑ CAFÉ ☐ CACAO ☐ SOBERANÍA ALIMENTARIA ☐

TEJER EL FUTURO ☑ JÓVENES ☐ MUJERES ☐ ANCESTRAL ☐ CULTURAL ☐

ARMONÍA CON LA NATURALEZA ☐ AMBIENTAL ☐ BIOINSUMOS ☐ SABERES ☐

SITUACION ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

Durante la visita Se evidencio un lote de cafe Variedad Castillo, Con una edad Superior a 8 años de edad, Se evidencio baja Productividad Presencia de follaje envejecido y alto Porcentaje de maleza lo que limita el desarrollo del cultivo

El Productor tiene Programada la Zoca Para el mes de enero.

El lote tiene una área de 1 hectarea. Se encuentra Priorizado dentro del Proyecto con Corpocesar y actualmente no Presenta manejo de Malezas. El lote tiene un porcentaje alto de Sombra mayor a un 45% de Guamo.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

* Realizar desrame del follaje de la Planta
* Hacer la Zoca a una altura de 30cm Con un corte inclinado Tipo bisel
* Recolectar el material vegetal grueso Producto de la Zoca Para mejorar Las labores Culturares.
* Aplicar trichoderma o cicatrizante en los cortes Para Prevenir el ingreso de Patogenos
* Realizar Control de arvenses de manera bimestral de acuerdo Con el Crecimiento de malezas Presente en el lote.
* llevar Registro de Campo de las lobores Realizadas
* Realiza Regulacion de Sombrio entre saca arboles de Guamo y en otros desramar para que quede una Sombra del 40%.

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA		FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO/QUIEN VISITA
Elvis lopez Quintero	Huella	Yaleidis Lopez Bun.

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	25 de diciembre de 2025
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Ángel Maria Gomez Gonzales - 12488101*
Nombre de la finca	El Diamante
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Alto Sicarare
Objetivo de la visita	Visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada, identificar las condiciones reales de las familias y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

SITUACIÓN ENCONTRADA

En el lote de café Castillo con más de 8 años, se aprecia baja producción, tejido envejecido y presencia alta de malezas, afectando el desarrollo del cultivo. El productor tiene prevista la zoca entre diciembre y enero. Predio de 1 ha vinculado al proyecto Corpocesar, sin manejo actual de arvenses.

RECOMENDACIÓN

1. Realizar rere, dejar surcos trampa. 2. Realizar desrame 3. Ejecutar zoca común a 30 cm de altura del suelo. 4. Realizar corte liso y con desnivel. 5. Aplicar bioprotector en el corte. 6. Recoger los tallos de café grueso, para facilitar el acceso.

---

www.anei.org.co



Ilustración 1 - Situación encontrada

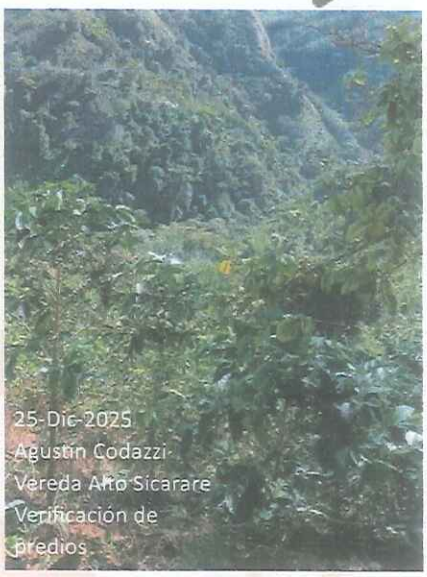


Ilustración 2 - Situación encontrada

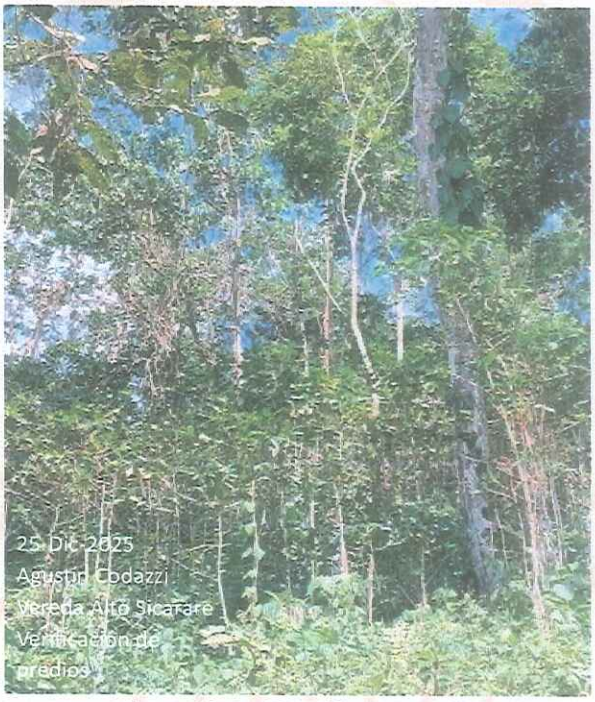


Ilustración 3 – Situación encontrada

Angel Me

Firma del Productor

YAIEDIS LOPEZ

Firma del Gestor

095

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

NIT. 900048861-7

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO: 2

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 25-DIC-25

PRODUCTOR/A: Angel María Gomez Gonzales.
No. IDENTIFICACION: 12488101
PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☐ Familiar ☒ Trabajador ☐
NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:
NOMBRE FINCA: El Diamante

DEPARTAMENTO: Cesar
MUNICIPIO: Agustin codazzi
VEREDA: Alto Sicarare
TELÉFONO:
PROYECTO: Corpocesar

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ ☒ CAFÉ ☐ CACAO ☐ SOBERANÍA ALIMENTARIA ☐
TEJER EL FUTURO ☐ JÓVENES ☐ MUJERES ☐ ANCESTRAL ☐ CULTURAL ☐
ARMONÍA CON LA NATURALEZA ☒ AMBIENTAL ☐ BIOINSUMOS ☐ SABERES ☐

SITUACION ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

El lote de cafe castillo con mas de 8 años. Se aprecia baja Produccion, tejido envejecido y Presencia alta de malezas, afectando el desarrollo del cultivo. El Productor tiene Prevista la zoca entre el mes de enero. Predio de 1 ha, vinculado al Proyecto Corpocesar, sin manejo actual de arvenses.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN ENCONTRADA

* Realiza desrame
* Realizar zoca comun a 30cm de altura.
* Recoger el material Grueso
* En el momento de deschupar dejar dos chupones por sitio.
* sellar el corte con bioProductor.
* Realizar manejo de arvenses
* Aplicar Fertifitante al mes.
* Dejar surcos trampas para el control de plagas.

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO/QUIEN VISITA
Angel Maria Gomez		Yaneidy Lopez

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	25 de diciembre de 2025
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Eidelver Celon Rodríguez - 18938106*
Nombre de la finca	La Cabaña
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Alto Sicarare
Objetivo de la visita	Visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada, identificar las condiciones reales de las familias y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

SITUACIÓN ENCONTRADA

En el café variedad Castillo con edad mayor a 8 años, se identifica reducción productiva, hojas envejecidas y presencia de malezas, lo que limita la recuperación del cultivo. El productor proyecta la zoca a fin de año. Lote de 1 ha priorizado dentro del proyecto Corpocesar, sin manejo actual de arvenses.

RECOMENDACIÓN

1. Realizar rere, dejar surcos trampa. 2. Realizar desrame 3. Ejecutar zoca común a 30 cm de altura del suelo. 4. Realizar corte liso y con desnivel. 5. Aplicar bioprotector en el corte. 6. Recoger los tallos de café grueso, para facilitar el acceso.

---

www.anei.org.co

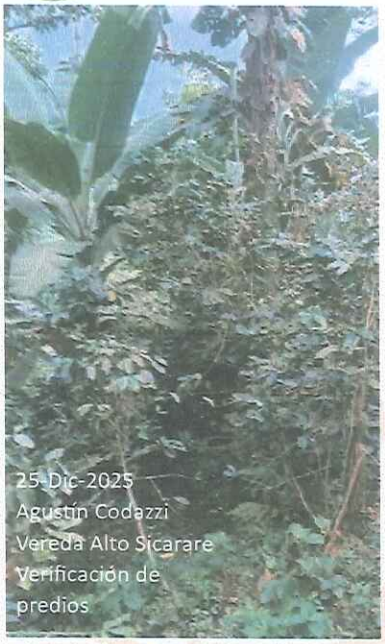


Ilustración 1 - Situación encontrada



Ilustración 2 - Situación encontrada



Ilustración 3 – Foto del productor

Eidilver Selon

Firma del Productor

YAIEDIS LOPEZ

Firma del Gestor

098

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

NIT. 900048861-7

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO: 3

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 25-12-25

PRODUCTOR/A: EIDELVER CELON GONZALES.

No. IDENTIFICACION: 1893819G.

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☐ Familiar ☒ Trabajador ☐

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: ALBARO

NOMBRE FINCA: LA CABAÑA

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustin Codazzi

VEREDA: Alto Sicorare

TELÉFONO:

PROYECTO: Corpocesar

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ ☐	CAFÉ ☐	CACAO ☐	SOBERANÍA ALIMENTARIA ☐				
TEJER EL FUTURO ☐	JÓVENES ☐	MUJERES ☐	ANCESTRAL ☐	CULTURAL ☐			
ARMONÍA CON LA NATURALEZA ☐	AMBIENTAL ☐	BIOINSUMOS ☐	SABERES ☐				

SITUACIÓN ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

En el cafe variedad castillo con edad mayor a 8 años, se identifica reproduccion productiva, hojas envejecidas y presencia de maletas, lo que limita la recuperacion del cultivo. El Productor Proyecta la zoca a mitad de enero. Lote de 1 ha Priorizado dentro del Proyecto corpocesar, sin manejo actual de arvenses.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

* Realizar rere, dejar surcos trampa
* Realizar desrame
* Ejecutar zoca comun a 30cm de altura del suelo
* Realizar corte liso y con desnivel.
* Aplicar bioprotector en el corte
* Recoger los tallos de cafe grueso, para facilitar el acceso.

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO/QUIEN VISITA
Eidelver Celon R.		Yaneidi Lopez R-A

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	24 de diciembre de 2025
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Ruth Angarita Ortega - 49690994*
Nombre de la finca	Las Violetas
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Caño Frio
Objetivo de la visita	Visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada, identificar las condiciones reales de las familias y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

SITUACIÓN ENCONTRADA

En el cultivo de café Colombia con edad superior a 8 años, se evidencia desgaste productivo, escasa renovación de brotes y presencia de malezas en el lote. El productor planea la zoca al cierre del año. Área de 1 ha priorizada dentro del proyecto con Corpocesar, sin manejo actual de arvenses. Ya termino de recolectar todo el café y realizó Rere.

RECOMENDACIÓN

1. Realizar RERE, dejar surcos trampa dentro del lote. 2. Realizar desrame. 3.Ejecutar zoca a 30 cm del tallo. 4.Aplicar bioprotección en el corte. 5.Desyerbar durante los primeros meses. 6.Fertilizar después de 30 días. 7.Realizar seguimiento técnico.

---

www.anei.org.co



Ilustración 1 - Situación encontrada

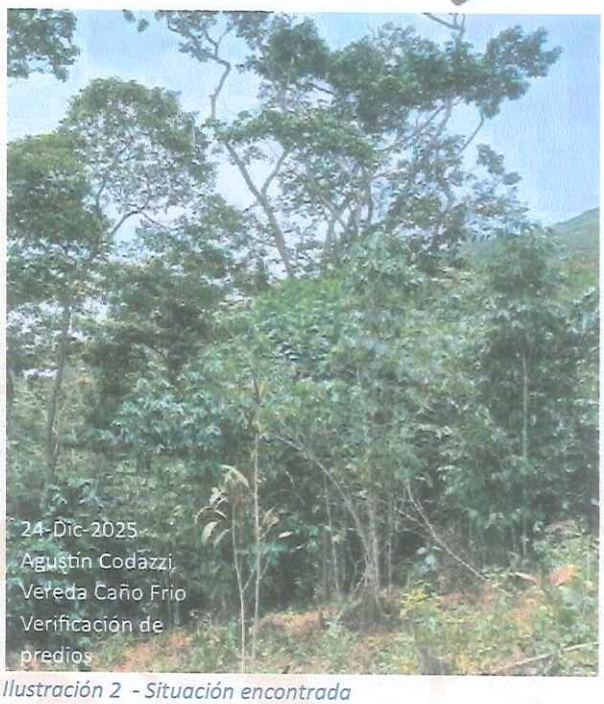


Ilustración 2 - Situación encontrada

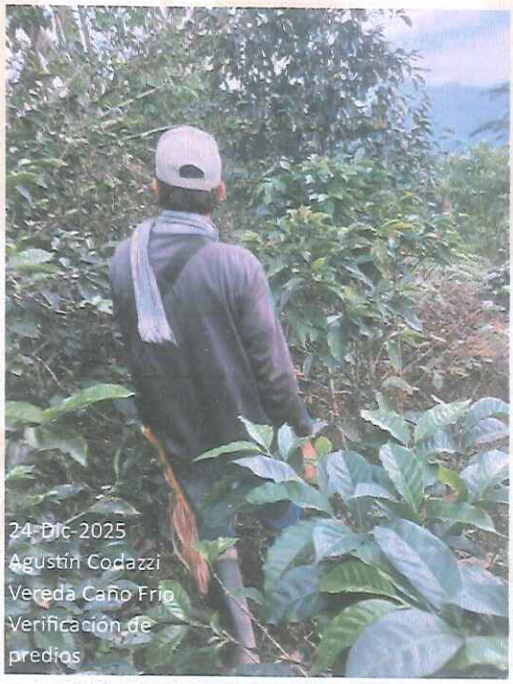


Ilustración 3 – Foto del productor

Ruth Angarita

Firma del Productor

YAIRDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO: 1

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 24-07-25

PRODUCTOR/A: Ruth Angarita Ortega

No. IDENTIFICACION: 49690992

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☐ Familiar ☐ Trabajador ☑

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Alberto.

NOMBRE FINCA: Las Violetas

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustin Codazzi

VEREDA: Canaguate

TELEFONO: 321 895 42 55

PROYECTO: Cervecería

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	☑ CAFÉ	☐ CACAO	☐ SOBERANÍA ALIMENTARIA	☐			
TEJER EL FUTURO	☐ JÓVENES	☐ MUJERES	☐ ANCESTRAL	☐	CULTURAL	☐	
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	☐ AMBIENTAL	☐ BIOINSUMOS	☐ SABERES	☐			

SITUACION ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

En el cultivo de café variedad Colombia con edad superior a 8 años, se evidencia descarte productivo, escala removación de brotes y presencia de maleza en el lote. El productor planea le zoca a inicio del mes de enero. Área de 1 ha priozada dentro del proyecto con cervecería sin manejo actual de arvenses. Ya termino de recolectar todo el café y realizo pepa.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

1) Realizar Re Re / Dejar Sucu trampa dentro del lote.
2) Realizar deshierbe
3) Ejecutar zoca comun a 30 cm de altura del suelo
4) Realizar corte con desnivel y que fea pareja
5) aplicar biopreparación en el corte.
6) Desyerbar dentro los primeros 3 meses
7) Recubrir el tallo de café para mejorar el arrepo.
8) Realizar seguimiento tecnico

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN
1 Realizar las recomendaciones dadas.	Enero

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO QUIEN VISITA
Ruth Angarita Ortega		Yaricson Lopez M.

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	29 de diciembre de 2025
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Everst Alberto Morón Peñaloza - 77151014*
Nombre de la finca	Casanare
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	La Duda
Objetivo de la visita	Visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada, identificar las condiciones reales de las familias y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

SITUACIÓN ENCONTRADA

En el lote de café de la variedad Colombia, con más de diez años de establecimiento, se evidencia una disminución en la producción, presencia predominante de follaje envejecido y alta infestación de malezas, acompañada de una limitada formación de nuevos tejidos productivos. El productor programó la zoca inicios de enero, con el fin de recuperar progresivamente la plantación. El terreno, de 1 hectárea, dispone de adecuada cobertura de sombra y prioriza para la vinculación al Proyecto de Restauración Ecológica Integral y Gobernanza Ambiental en la Serranía del Perijá, ejecutado junto con Corpocesar; actualmente no se realiza manejo de arvenses.

RECOMENDACIÓN

Efectuar la zoca común a una altura aproximada de 30 cm, dejando una leve inclinación en el corte. Aplicar Trichoderma o un cicatrizante biológico sobre la superficie expuesta. Implementar control de malezas durante los primeros tres meses posteriores a la labor. Mantener acompañamiento técnico y registrar cada actividad dentro del proyecto.

www.anei.org.co



Ilustración 1 - Situación encontrada



Ilustración 2 - Situación encontrada

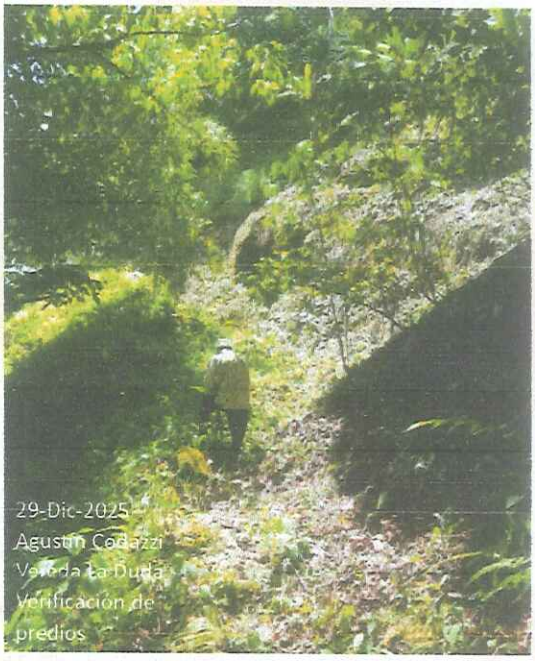


Ilustración 3 – Foto del productor

Firma del Productor

YAIRDIS LOPEZ

Firma del Gestor

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

NIT. 900048861 7

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO: 5

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 29-Dic-25

PRODUCTOR/A: Eveist Alberto Morron Peñaloza

No. IDENTIFICACION: 77151014

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a [x] Familiar [ ] Trabajador [ ]

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: Casamar.

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustin Codazzi

VEREDA: La Duda

TELÉFONO: 320 555 2041

PROYECTO: Corpoica

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	[x] CAFÉ	[ ] CACAO	[ ] SOBERANÍA ALIMENTARIA	[ ]			
TEJER EL FUTURO	[ ] JÓVENES	[ ] MUJERES	[ ] ANCESTRAL	[ ] CULTURAL	[ ]		
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	[x] AMBIENTAL	[ ] BIOINSUMOS	[ ] SABERES	[ ]			

SITUACION ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

En el lote de café de la Variedad Colombia con más de cinco de establecimiento, se evidencia una disminución en la producción, presencia predominante de follaje excesivo alta incidencia de maleza acompañada de una limitada formación de nuevo tejido productivo S. El productor programa la poda para inicio de mes de enero con el fin de recepcionar progresivo la plantación el terreno de 1 Hectarea, dispone de adecuada Cobertura de sombra y va hacer parte del proyecto de RESGASP, ejecutado con Corpoica.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

1. Efectuar la poda a una altura aproximada de 30cm dejando una leve inclinación en el corte
2. Aplicar trichoderma o cicatrizante Biológico sobre la superficie expuesta
3. Implementar control de maleza durante los primeros meses posteriores a la labor
4. Mantener el acompañamiento técnico del gestor y registrar cada actividad dentro del proyecto

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TECNICO QUIEN VISITA
		YAMEIDIS Lopez B-B

105

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	29 de diciembre de 2025
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Jose Del Carmen Portillo - 18930527*
Nombre de la finca	El Porvenir
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	La Duda
Objetivo de la visita	Visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada, identificar las condiciones reales de las familias y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

SITUACIÓN ENCONTRADA

En el cafetal de variedad Colombia, con una edad aproximada de 8 años, se evidencia una disminución en la productividad, predominio de hojas envejecidas y una alta presencia de arvenses, junto con una escasa renovación de estructuras productivas. El lote presenta un sombrío permanente superior al 45 %, lo cual limita la aireación y la entrada de luz. El productor tiene proyectado realizar la zoca entre finales de comienzos de enero, con el propósito de favorecer la recuperación gradual del cultivo. El predio, con una extensión de 1 ha, está priorizado dentro del Proyecto de Restauración Ecológica Integral y Gobernanza Ambiental en la Serranía del Perijá, en articulación con Corpocesar, y actualmente no cuenta con manejo de malezas.

RECOMENDACIÓN

1.Ejecutar la zoca a 30 cm sobre el nivel del suelo, procurando un corte ligeramente inclinado. 2.Aplicar Trichoderma o un cicatrizante biológico en la superficie del corte. 3.Implementar control de malezas durante los tres primeros meses posteriores a la intervención. 4.Evaluar el sombrío y realizar clareo progresivo hasta alcanzar un nivel adecuado para el cultivo. 5.Aplicar fertilización orgánica mes después, de acuerdo con el estado del cultivo y el análisis de suelo. 6Mantener seguimiento técnico y registrar las actividades dentro del proyecto.

---

www.anei.org.co



Ilustración 1 - Situación encontrada



Ilustración 2 - Situación encontrada



Ilustración 3 – Foto del productor

---

jose del carmen

Firma del Productor

YAIEDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO: 6

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 29-DIC-21

PRODUCTOR/A: Jose del Carmen Portillo

No. IDENTIFICACION: 7891323121

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☑ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: El Porvenir

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: A. Cotzal

VEREDA: La Dada

TELEFONO:

PROYECTO: Cuenca

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	☑ CAFÉ	☐ CACAO	☐ SOBERANIA ALIMENTARIA	☐			
TEJER EL FUTURO	☐ JÓVENES	☐ MUJERES	☐ ANCESTRAL	☐ CULTURAL	☐		
ARMONIA CON LA NATURALEZA	☑ AMBIENTAL	☐ BIOINSUMOS	☐ SABERES	☐			

SITUACION ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

En el corte 1 de variedad Colombia con una edad aprox mayor de 8 años, se evidencia una disminución en la producción predominando lotes envejecidos y una alta presencia de arvenses tanto con una edad reducida de estructura productiva. El lote presenta un sombrío permanente superior al 75%, lo cual limita la aireación y la entrada de luz. El productor tiene previsto la entrada del lote en el finalizo de Diciembre iniciando de enero con el propósito de fomentar la recuperación gradual del cultivo

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

1) Ejecutar Zoca Roman al 30 cm del suelo, manteniendo un corte ligeramente inclinado.
2) Aplicar fitosanitario en la superficie del corte.
3) Implementar Cuentro de arvenses durante los primeros meses.
4. Evaluar el sombrío y realizar podas progresivas hasta alcanzar un nivel adecuado para el cultivo
5. Aplicar fertilización química después de un mes.
6. Mantener seguimiento técnico y registro de actividades

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACION

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de mis datos personales aquí relacionados según la legislación vigente, igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañan, en el que aparezca la finca y/o

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TECNICO QUIEN VISITA
Jose del Carmen Portillo		Marcos Lopez B.

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	29 de diciembre de 2025
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Hermes Jiménez Delgado - 18938420*
Nombre de la finca	La Reforma
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	La Duda
Objetivo de la visita	Visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada, identificar las condiciones reales de las familias y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

SITUACIÓN ENCONTRADA

Situación encontrada En el cultivo de café Castillo, con edad superior a 8 años, se observa reducción del rendimiento, tejido foliar deteriorado y cobertura de malezas en gran parte del lote. El productor contempla efectuar la zoca a mediado del mes de enero. Predio de 1 ha incluido en el proyecto de restauración con Corpocesar, actualmente sin manejo de arvenses.

RECOMENDACIÓN

1.Ejecutar zoca a 30 cm del suelo. 2. Que el corte sea parejo y que tenga un desnivel para evitar encharcamientos. 3.Aplicar biocontrolador en el corte. 4. Implementar desyerbe periódico inicial. 5.Realizar fertilización al mes. 6.Continuar con monitoreo y registro. 7. Dejar surcos trampa para el control de plagas.

---

www.anei.org.co

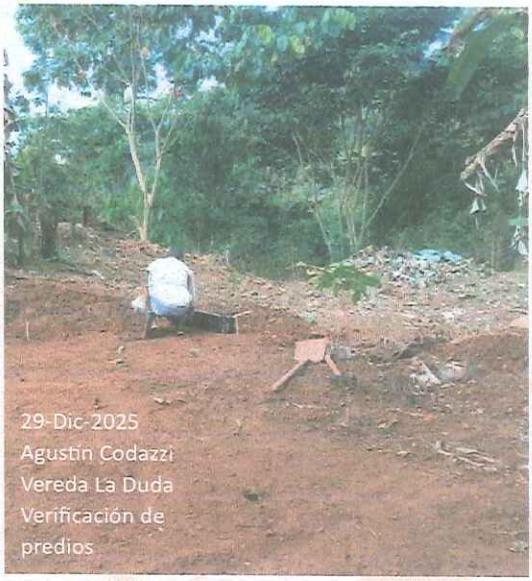


Ilustración 1 - Situación encontrada

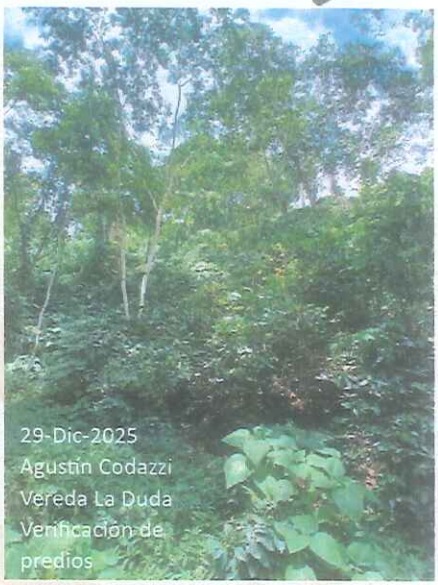


Ilustración 2 - Situación encontrada



Ilustración 3 – Foto del productor

Hermes Jimenez

Firma del Productor

YAIEDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DE PERIJÁ - ASOANEI

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO: 7

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 29-DIC-25

PRODUCTOR/A: Hermes J. menez Delgado

No. IDENTIFICACION: 1893856

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a [x] Familiar [ ] Trabajador [ ]

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: La Reforma

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustin Codazzi

VEREDA: La nueva.

TELEFONO: 3145843569.

PROYECTO: Corpocesar.

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	[ ]	CAFE	[ ]	CACAO	[ ]	SOBERANIA ALIMENTARIA	[ ]
TEJER EL FUTURO	[ ]	JOVENES	[ ]	MUJERES	[ ]	ANCESTRAL [ ]	CULTURAL [ ]
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	[x]	AMBIENTAL	[ ]	BIOINSUMOS	[ ]	SABERES	[ ]

SITUACION ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

Durante la visita se logra evidenciar que el productor tiene un lote de Cafe variedad Colombia con una edad de 8 años. Con bajo rendimiento, tejido foliar deteriorado y cobertura de maleza en gran parte del lote. El productor contempla ejecutar la zoca a mediado del mes de enero y febrero. Predio sera incluido en el proyecto de restauracion con Corpocesar. Aun no ha realizado manejo de arvenses y Roya. Cuenta con un vivero para resiembra.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

1) Realizar recoleccion de granos maduros que esten en el suelo y los que esten en la planta.
2) Antes de realizar el Corte realizar deshierme esto ayuda a mejorar la estructura del Suelo
3) Ejecutar el corte a 30 cm del Suelo
4) Que el Corte sea parejo y que tenga un declive para evitar encharcamiento.
5) Aplicar un biocontrolador (Bc) en el corte.
6) Realizar Fertilizacion organica en mes despues del corte.
7 Continuar con monitoreo y registro

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACION

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TECNICO QUIEN VISITA
Hermes Jimenez Hermes Jimenez.		YAIRON LOPEZ B.M.

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	23 de diciembre de 2025
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Eliseo Molina - 1050064756*
Nombre de la finca	La Esperanza
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	La Duda
Objetivo de la visita	Visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada, identificar las condiciones reales de las familias y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

SITUACIÓN ENCONTRADA

En el lote de café con más de ocho años de edad, variedad Castillo, actualmente en etapa improductiva, se evidencia que el cultivo fue paloteado después de la cosecha. Durante la visita, el productor manifiesta que se tiene programada la realización de la zoca para finales del mes de diciembre o inicios del mes de enero, con el objetivo de iniciar un proceso de renovación del cultivo y recuperar la productividad del lote. Este lote fue seleccionado para el proyector (protector) de renovación en articulación con Corpocesar.

RECOMENDACIÓN

Dejar surcos de café trampa distribuidos en el lote para la captura y reducción de poblaciones de broca, realizando revisión y recambio periódico. Efectuar primero el desrame de las plantas con el fin de disminuir focos de plagas y facilitar la operación de corte. Realizar el corte del tallo a una altura aproximada de 30 cm sobre el nivel del suelo, procurando que el corte presente un ligero desnivel para evitar el empozamiento de agua y reducir el riesgo de aparición de hongos. Protección de la herida de corte Aplicar cicatrizante o Trichoderma a una dosis de 5 g por litro de agua sobre la superficie del corte, con el objetivo de prevenir infecciones y favorecer una adecuada regeneración del tejido.

---

www.anei.org.co



Ilustración 1 - Situación encontrada



Ilustración 2 - Situación encontrada



Ilustración 3 – Foto del productor

Eliceo molina zamudio

Firma del Productor

YAIENIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

M2513

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

NIT 900548001 7

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO: 8

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 23-12-21

PRODUCTOR/A: Felipe Molina Zamudio

No. IDENTIFICACION: 105.069.758

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a [x] Familiar [ ] Trabajador [ ]

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: La Esperanza.

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustín Codazzi

VEREDA: La Nida

TELÉFONO: 314 291 8919

PROYECTO: Corpocesar.

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ: [x] CAFÉ [ ] CACAO [ ] SOBERANÍA ALIMENTARIA [ ]

TEJER EL FUTURO: [ ] JÓVENES [ ] MUJERES [ ] ANCESTRAL [ ] CULTURAL [ ]

ARMONÍA CON LA NATURALEZA: [x] AMBIENTAL [ ] BIOINSUMOS [ ] SABERES [ ]

SITUACION ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

El lote de cafe con mas de 8 años de edad, variedad castillo, actualmente en etapa improductiva, se evidencia que el cultivo fue Poloteado despues de la cosecha. Durante la visita, el Productor manifiesta que se tiene Programada la realizacion de la zoca Para finales del mes de diciembre o inicios del mes de enero con el objetivo de iniciar un Proceso de renovacion del cultivo y recuperar la Produccion del lote. Este lote fue Seleccionado Para el proyecto (Proyector) de renovacion en articulacion con Corpocesar.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

* Dejar surcos de cafe trampa distribuidos en el lote Para la captura y reduccion de poblaciones de broca, realizando revision y recambio Periodico.

Ejecutar primero el derrame de las plantas con el fin de disminuir Focos de plagas y facilitar la operacion de corte.

Realizar el corte de tallo a una altura aproximadamente de 30cm Sobre el nivel del Suelo procurando que el corte presente un pequeño desnivel para evitar el empozamiento de agua y reducir el riesgo de aparicion de hongos Pudricion de la herida Corte.

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN
• Aplicar cicatrizante o Trichoderma a una dosis de 5 g Por Litro de agua Sobre la Superficie del corte con el objetivo de prevenir infecciones y Favorecer una adecuada regeneracion del tejido	

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO/QUIEN VISITA
Felipe Molina Zamudio		Yaneidis Lopez Bru

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	24 de diciembre de 2025
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Ciro Antonio Jaime Acosta - 18934277*
Nombre de la finca	San Martin
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Fernambuco
Objetivo de la visita	Visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada, identificar las condiciones reales de las familias y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

SITUACIÓN ENCONTRADA

En el café variedad Castillo con antigüedad mayor a 8 años, se identifican signos de envejecimiento productivo, reducción de cosecha y presencia significativa de malezas. El productor tiene prevista la zoca en temporada de fin de año. Predio de 1 ha que será vinculado al proyecto de restauración con Corpocesar, sin control actual de arvenses. Además se ha desfoliado por la presencia del ojo de gallo.

RECOMENDACIÓN

1. Realizar desrame antes del corte. 2. Realizar zoca común a 30 cm de altura. 3. recoger el material grueso. 4. en el momento de deschupar dejar 2 chupones por sitio. 5.Sellar el corte con bioproductos. 6. Realizar manejo de arvenses 7.Aplicar fertilización al mes. 8.Continuar con acompañamiento técnico.

---

www.anei.org.co

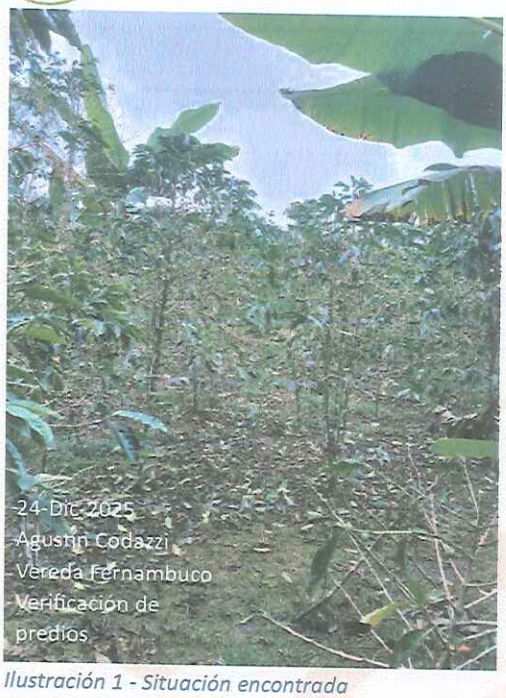


Ilustración 1 - Situación encontrada

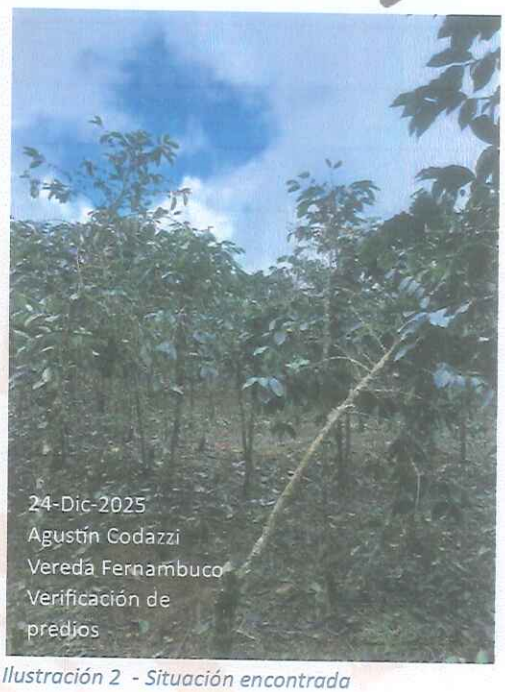


Ilustración 2 - Situación encontrada

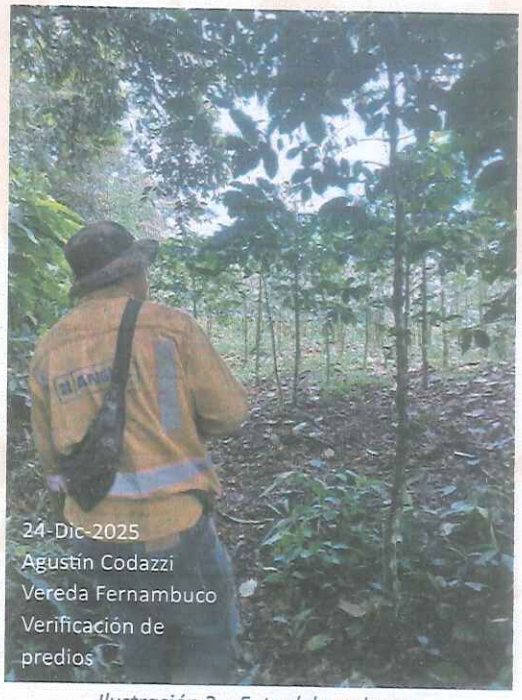


Ilustración 3 – Foto del productor

Ciro Antonio Jaime

Firma del Productor

Yaneidis Lopez

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DE PERIJA - ASOANEI

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO: (1) (9)

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 24-DIE-25

PRODUCTORA: Ciro Jaime Acosta.

No. IDENTIFICACION: 18954277

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productora [x] Familiar [ ] Trabajador [ ]

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: San ma. Fin.

DEPARTAMENTO: Cesar.

MUNICIPIO: Agustin Codazzi

VEREDA: Tamalameque

TELÉFONO: 3126806242

PROYECTO: Corpocesar.

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ: [x] CAFE [ ] CACAO [ ] SOBERANIA ALIMENTARIA [ ]

TEJER EL FUTURO: [ ] JÓVENES [ ] MUJERES [ ] ANCESTRAL [ ] CULTURAL [ ]

ARMONÍA CON LA NATURALEZA: [x] AMBIENTAL [ ] BIOINSUMOS [ ] SABERES [ ]

SITUACION ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

En el cafe variedad Castillo con antigüedad mayor a 8 años, le identifican Signos de envejecimiento productivo, reduccion de cosecha y presencia significativa de malezas. El productor tiene previsto la zoca en Abril del a inicio del mes de enero predio de 1 Ha que sera vinculado al proyecto de restauracion con Corpocesar. Tiene sombrio Regulado de guamo.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN ENCONTRADA

1) Realizar desrame antes del corte.
2. Realizar la zoca Cuna a 30 cm de altura.
3. Realizar la recogida del material grueso para facilitar el ingreso al lote
4. El momento de deschuponar deje 2 brotes por sitio.
5. Sellar el corte con biuproductor.
6. Realizar manejo de arvenjel.
7. Aplicar fertilizacion al mes
8. Continuar con acompañamiento tecnico

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañan, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TECNICO QUIEN VISITA
Yaleidis Lopez.		Ciro Antonio Jaime

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	20 de diciembre de 2025
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*María Lizeth Hernández - 49698320*
Nombre de la finca	La Montañita
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	San Jacinto
Objetivo de la visita	Visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada, identificar las condiciones reales de las familias y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

SITUACIÓN ENCONTRADA

En el lote de café con siete años de edad, variedad F6, se observa un bajo nivel de productividad y presencia de follaje envejecido. Durante el recorrido se evidencia que el cultivo fue paloteado posterior a la cosecha y que el lote presenta áreas con alta densidad de malezas y escasa renovación de tejidos productivos. El productor manifiesta que tiene programada la realización de la zoca para finales del mes de diciembre o inicios del mes de enero, con el fin de iniciar un proceso de renovación gradual del cultivo y mejorar la capacidad productiva del lote en el siguiente ciclo. Este lote fue identificado y priorizado para su vinculación al Proyecto de Restauración Ecológica Integral y Gobernanza Ambiental en la Serranía del Perijá, ejecutado en articulación con Corpocesar.

RECOMENDACIÓN

Ejecutar la zoca de manera técnica, realizando el corte a una altura aproximada de 30 cm sobre el nivel del suelo y procurando que el corte tenga un ligero desnivel para evitar acumulación de agua y reducir el riesgo de infecciones por hongos. Aplicar Trichoderma a una dosis de 5 g por litro de agua o cicatrizante biológico directamente sobre la superficie del corte, con el fin de proteger el tejido y favorecer una adecuada brotación del cultivo. Realizar desrame y limpieza del lote antes de la zoca y mantener control manual o mecánico de malezas durante los primeros tres meses posteriores al rebrote, para garantizar un mejor establecimiento. Efectuar la primera fertilización un mes después de la zoca, ajustando la dosis según el estado del cultivo y, de ser posible, con base en análisis de suelo, priorizando el estímulo del crecimiento de ramas productivas. Realizar seguimiento técnico periódico al rebrote y registrar las actividades ejecutadas.

www.anei.org.co

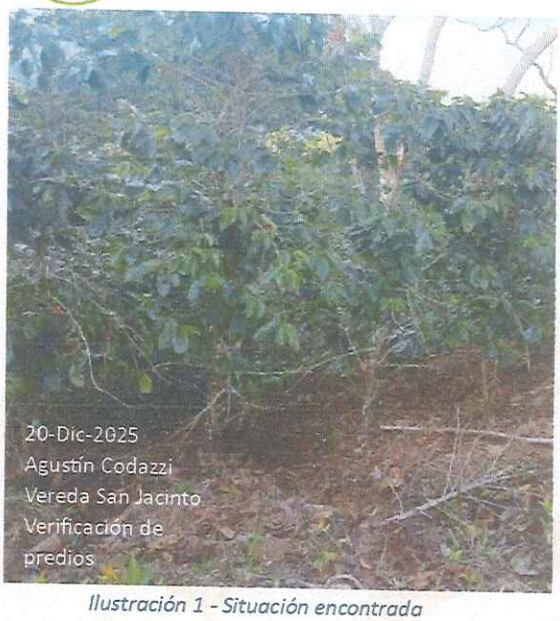


Ilustración 1 - Situación encontrada



Ilustración 2 - Situación encontrada

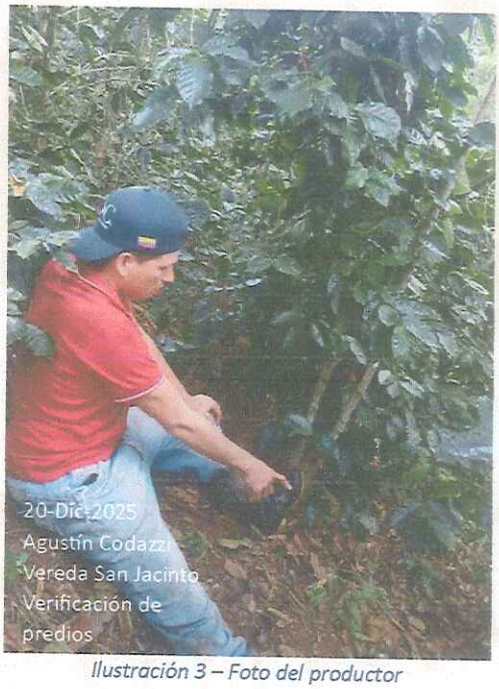


Ilustración 3 – Foto del productor

María Lizeth Hernandez

Firma del Productor

Yaneidis Lopez

Firma del Gestor

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 25-DIC-25

PRODUCTOR/A: Maria lizeth Hernandez Gomez
No. IDENTIFICACION: 49.695.320
PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☑ Familiar ☐ Trabajador ☐
NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Maria Hernandez Gomez
NOMBRE FINCA: La Montañita

DEPARTAMENTO: Cesar
MUNICIPIO: Agustin Codazzi
VEREDA: San Juanito
TELÉFONO: 313 526 2182
PROYECTO: Corpocesar

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ ☐	CAFÉ ☐	CACAO ☐	SOBERANIA ALIMENTARIA ☐				
TEJER EL FUTURO ☐	JÓVENES ☐	MUJERES ☐	ANCESTRAL ☐	CULTURAL ☐			
ARMONÍA CON LA NATURALEZA ☐	AMBIENTAL ☐	BIOINSUMOS ☐	SABERES ☐				

SITUACIÓN ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

En el lote de Café con siete años de edad, Variedad T6. Se observa un bajo nivel de productividad y presencia de follaje envejecido. Durante el recorrido se evidencia que el cultivo fue paloteado posterior a la cosecha y que el lote presenta áreas con alta densidad de malezas y escasa renovación de tejidos productivos. el productor manifiesta que tiene programada la realización de la zoca para finales del mes de diciembre o inicios del mes de enero, con el fin de iniciar un proceso de renovación gradual del cultivo y mejorar la capacidad productiva del lote en el siguiente ciclo.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN ENCONTRADA

Este lote fue identificado y priorizado para su vinculación al proyecto de Restauración Ecologica integral y Gobernanza Ambiental en la Serrania del perijá ejecutado en articulación con Corpocesar.

- Ejecutar la zoca de manera tecnica, realizando el corte a una altura aproximada de 30cm sobre el nivel del suelo y procurando que el corte tenga un ligero desnivel del suelo y procurando que el corte tenga un ligero desnivel para entrar acumulacion de agua y reducir el riesgo de infecciones por hongos.
Aplicar Trinchoderma a una dosis de 5g por litro de agua o Cicatrizante inmediatamente sobre la Superficie del corte, con el fin de proteger el tejido y favorecer una adecuada protección del cultivo

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACION
- Realizar desmonte y limpieza del lote antes de lo zoca y mantener Control manual mecanismo de malezas durante los primeros tres meses. Posteriores al brote, para garantizar un mejor establecimiento.	
- Ejecutar la primera fertilizacion un mes despues de la zoca, aplicando la dosis segun el estado del cultivo y, de ser posible, con base en analisis del suelo priorizando el estimulo del crecimiento de ramas productivas.	

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA		FIRMA DEL GESTOR O TECNICO QUIEN VISITA
Maria Lizeth Hernandez	Huella	YALEIDIS LOPEZ

Powered by CamScanner

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	26 de diciembre de 2025
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Uriel Montejo Sarmiento - 18955558*
Nombre de la finca	La Esmeralda
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	El jardín
Objetivo de la visita	Visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada, identificar las condiciones reales de las familias y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

SITUACIÓN ENCONTRADA

En el lote de café de ocho años de edad, variedad Castillo, se evidencia baja productividad y presencia de follaje envejecido. Durante la visita se observa que el cultivo fue paloteado después de la cosecha y que el área presenta sectores con alta infestación de malezas, además de una limitada renovación de estructuras productivas. El productor manifiesta que la zoca está programada para finales de diciembre o comienzos de enero. Este lote fue seleccionado y priorizado para su participación en el Proyecto de Restauración Ecológica Integral y Gobernanza Ambiental en la Serranía del Perijá, desarrollado en articulación con Corpocesar, con un área intervenida de 1,5 ha. Se identifica que actualmente no se ha realizado manejo de arvenses en el lote.

RECOMENDACIÓN

Realizar manejo de arvenses de forma inmediata mediante control manual o mecánico, priorizando la limpieza en las zonas cercanas a los tallos y sitios de futura brotación, evitando el uso de herbicidas durante el proceso de renovación. Ejecutar la zoca de manera técnica, realizando el corte a una altura aproximada de 30 cm sobre el nivel del suelo y procurando que el corte tenga un ligero desnivel para evitar acumulación de agua y reducir el riesgo de infecciones por hongos. Aplicar Trichoderma a una dosis de 5 g por litro de agua o cicatrizante biológico directamente sobre la superficie del corte, con el fin de proteger el tejido y favorecer una adecuada brotación del cultivo. Mantener control periódico de malezas durante los primeros tres meses posteriores al rebrote, complementando con desrame y limpieza de la zona intervenida para garantizar un mejor establecimiento del cultivo. Efectuar la primera fertilización un mes después de la zoca, ajustando la dosis al estado del cultivo y, de ser posible, con base en análisis de suelo, priorizando nutrientes que

favorezcan el desarrollo de nuevas ramas productivas. Realizar seguimiento técnico continuo al proceso de renovación del lote y registrar las actividades ejecutadas dentro del marco del Proyecto de Restauración Ecológica Integral y Gobernanza Ambiental. Regular sombra a 25–35%. Podar ramas secas y muy densas. Mantener árboles de sombra a 4–6 m. Reponer faltantes (siembra cada 8–10 m). Dejar el material podado como cobertura. Realizar vivero para realizar resiembra.



Ilustración 1 - Situación encontrada



Ilustración 2 - Situación encontrada



Ilustración 3 – Foto del productor

Firma del Productor

YAIENIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

NIT. 900948861-7

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO: 11

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 26-DIC-25

PRODUCTOR/A: Uriel Montejo Sarmiento

No. IDENTIFICACION: 18955558

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a [x] Familiar [ ] Trabajador [ ]

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: La Esmeralda

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustín Codazzi

VEREDA: El Jardín

TELÉFONO: 3133185592

PROYECTO: Loaiza Cera

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ: [x] CAFÉ [ ] CACAO [ ] SOBERANÍA ALIMENTARIA [ ]

TEJER EL FUTURO: [ ] JÓVENES [ ] MUJERES [ ] ANCESTRAL [ ] CULTURAL [ ]

ARMONÍA CON LA NATURALEZA: [x] AMBIENTAL [ ] BIOINSUMOS [ ] SABERES [ ]

SITUACIÓN ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

En el lote de año años de edad Variedad castillo, se evidencia baja producción y presencia de follaje envejecido. Durante la visita se observa que el cultivo fue podado después de la cosecha y que el área presenta sectores con alta incidencia de arvenses, además de una limitada renovación de estructuras productivas. El productor manifiesta que la zoca está programada para finales de diciembre o comienzo de enero. Este lote fue seleccionado y priorizado para su participación en el proyecto de restauración ecológica, Lotesa y Gobernanza ambiental en la Serranía para desarrollarse en articulación con compromisos con una área inferior a 1.5 ha. Se evidencia que no se ha realizado manejo de arvenses.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

- Realizar manejo de arvenses de forma inmediata mediante control manual o mecánico.
- Realizar corte de una altura de (manera) aproximadamente 30 cm sobre el nivel del suelo y procurando que el corte tenga un ligero desnivel para evitar acumulación de agua y reducir el riesgo de infecciones por hongos.
- Aplicar Trichoderma a una dosis de 5gr x litro o cualquier biológico directamente sobre la superficie del corte con el fin de proteger el tejido y favorecer una adecuada brotación del cultivo.
- Mantener control periódico de malezas durante los primeros meses posteriores a la zoca.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACION
Efectuar la primera fertilización en mes después de la poda ajustando la dosis al estado del cultivo y de ser posible con base en análisis de suelo priorizando nutrientes que favorezcan el desarrollo de nuevos ramos productivos.	
Realizar acompañamiento técnico continuo al proceso de renovación del lote y registrar las actividades ejecutadas dentro del marco del proyecto.	

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TECNICO/QUIEN VISITA
Uriel Montejo 18955558.		YACELOU LOPEZ BUA

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	20 de diciembre de 2025
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	Emel Carrillo Gonzalez - 77154684
Nombre de la finca	El Porvenir
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	El Jardín
Objetivo de la visita	Visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada, identificar las condiciones reales de las familias y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

SITUACIÓN ENCONTRADA

En el lote de café con una edad aproximada de 8 años y correspondiente a la variedad Castillo, se evidencia reducción en la producción y predominio de hojas envejecidas. Durante la evaluación en campo se identificó que el cultivo fue paloteado luego de la cosecha, y que el terreno presenta sectores con alta presencia de malezas y poca renovación de tejidos productivos. El productor indica que tiene prevista la ejecución de la zoca entre finales de diciembre y comienzos de enero, con el propósito de iniciar un proceso de recuperación gradual del cultivo y mejorar su desempeño productivo en el próximo ciclo. El lote cuenta con adecuada cobertura de sombra, lo que contribuye a la protección del suelo y al equilibrio micro climático del sistema productivo. Este predio fue priorizado para su participación en el Proyecto de Restauración Ecológica Integral y Gobernanza Ambiental en la Serranía del Perijá, desarrollado en convenio con Corpocesar. El área evaluada corresponde a 1 hectárea y, en la actualidad, no se realizan labores de manejo de arvenses.

RECOMENDACIÓN

Realizar la zoca a 30 cm del suelo con corte inclinado para evitar agua y hongos. Aplicar Trichoderma o cicatrizante biológico sobre el corte para proteger el tejido y favorecer la brotación. Mantener control de malezas durante los primeros tres meses. Realizar la primera fertilización al mes, ajustando la dosis según el cultivo y análisis de suelo. Ejecutar seguimiento técnico continuo y registrar las actividades del proceso de renovación.

www.anei.org.co



Ilustración 1 - Situación encontrada

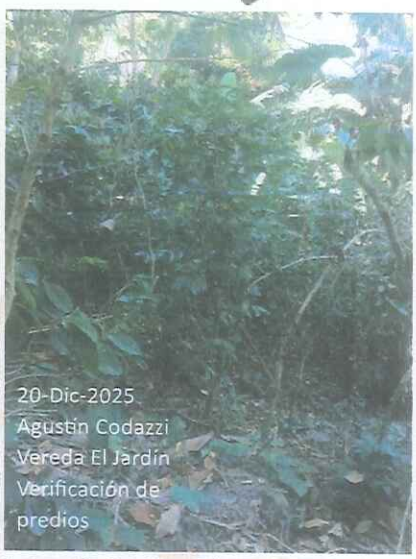


Ilustración 2 - Situación encontrada

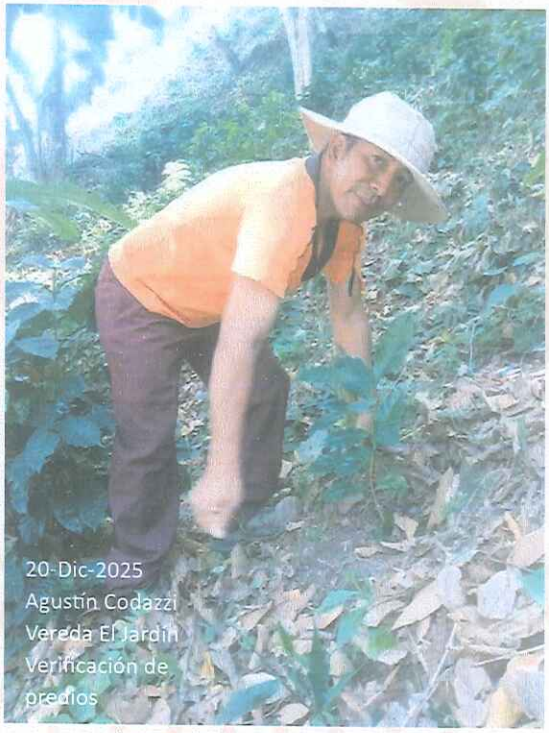


Ilustración 3 – Foto del productor

Firma del Productor

YAIRDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

NIT. 900048861-7

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO: 12

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 26-Dic-25

PRODUCTOR/A: Emel Carrillo

No. IDENTIFICACION: 77.154684

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a [x] Familiar [ ] Trabajador [ ]

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: El porvenir

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustín Codazzi

VEREDA: El Jardín

TELÉFONO: 3224452215

PROYECTO: Campesinos

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ [x] CAFÉ [ ] CACAO [ ] SOBERANÍA ALIMENTARIA [ ]

TEJER EL FUTURO [ ] JÓVENES [ ] MUJERES [ ] ANCESTRAL [ ] CULTURAL [ ]

ARMONÍA CON LA NATURALEZA [ ] AMBIENTAL [ ] BIOINSUMOS [ ] SABERES [ ]

SITUACIÓN ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

En el lote de café con una edad aproximada de 8 años y correspondiente a la variedad Castillo, se evidencian reducción en la producción y promedio de hojas amarillas. Durante la evaluación en campo se identificó que el cultivo fue podado luego de la cosecha, y que el terreno presenta cobertura con algunas arvenses de porte bajo y poca remoción de tejidos productivos.

El productor registrará las raleas entre finales de diciembre y inicios de enero para recuperar el cultivo. El lote cuenta con buena cobertura de sombra y el predio, de 1 hectárea, fue priorizado en el proyecto de Restauración Ecológica en la Serranía del Perijá. Actualmente no se realiza manejo de arvenses.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN ENCONTRADA

Realizar la poda con criterio técnico (corte a 20 cm, inclinado), aplicar Trichoderma a cada tratamiento biológico, mantener control de malezas durante los primeros dos meses y fertilizar con más lupas según el estado del cultivo y análisis de suelo. Se recomienda seguimiento técnico continuo y registro de labores dentro del proyecto.

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO QUIEN VISITA

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	20 de diciembre de 2025
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Anselmo Miranda Herrera - 77153173*
Nombre de la finca	El Recuerdo
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	El Jardín
Objetivo de la visita	Visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada, identificar las condiciones reales de las familias y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

SITUACIÓN ENCONTRADA

Lote de café variedad Castillo (8 años) con baja producción, hojas envejecidas y presencia de malezas. Se planea realizar zoca entre diciembre y enero para recuperar el cultivo. El área es de 1 ha, cuenta con buena sombra y fue priorizada en el Proyecto de Restauración Ecológica Integral en la Serranía del Perijá, en articulación con Corpocesar.

RECOMENDACIÓN

Realizar la zoca de forma técnica, con corte a 30 cm del suelo y ligera inclinación para evitar acumulación de agua y enfermedades. Aplicar Trichoderma (5 g/L) o cicatrizante biológico en el corte para proteger el tejido y favorecer la brotación. Mantener control de malezas durante los primeros tres meses posteriores a la zoca. Fertilizar un mes después de la zoca, ajustando dosis según el estado del cultivo y, de ser posible, análisis de suelo. Hacer seguimiento técnico continuo y registrar las labores dentro del Proyecto de Restauración Ecológica Integral.

www.anei.org.co



Ilustración 1 - Situación encontrada



Ilustración 2 - Situación encontrada

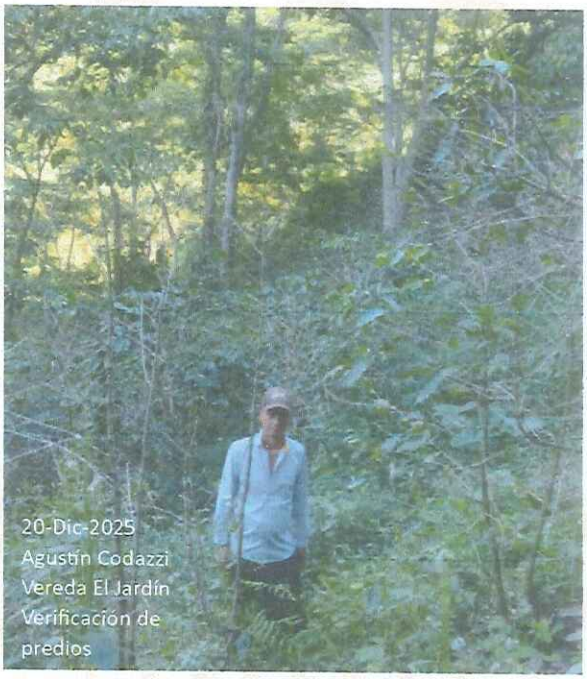


Ilustración 3 – Foto del productor

ANCELMO

Firma del Productor

YAIRDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

NIT. 900048861-7

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO: 13

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 20/12/21

PRODUCTOR/A: Anselmo Miranda

No. IDENTIFICACION: 77.153.123

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a [x] Familiar [ ] Trabajador [ ]

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: El Ruredo

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustin Codazzi

VEREDA: El Jardin

TELÉFONO: 312 646 2891

PROYECTO: Corpocesar

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	[ ]	CAFÉ [ ]	CACAO [ ]	SOBERANÍA ALIMENTARIA [ ]		
TEJER EL FUTURO	[ ]	JÓVENES [ ]	MUJERES [ ]	ANCESTRAL [ ]	CULTURAL [ ]	
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	[ ]	AMBIENTAL [ ]	BIOINSUMOS [ ]	SABERES [ ]		

SITUACIÓN ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

Lote de café variedad Castillo con 8 años de edad con bajo producción, hojas envejecidas y presencia de malezas. Se planea realizar zoca entre diciembre y enero para recuperar el cultivo. El área es de 1 ha, cuenta con buena sombra y fue priorizada en el proyecto de Restauración Ecológica Integral en la Serranía del Perijá, en articulación con Corpocesar.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

- Realizar la zoca de forma técnica, con corte a 30cm del suelo y ligera inclinación para evitar acumulación de agua y enfermedades.
- Aplicar Trichoderma (5 g/L) o cualquier biológico en el corte para proteger el tejido y favorecer la brotación.
- Mantener control de malezas durante los primeros tres meses posteriores a la zoca.
- Fertilizar un mes después de la zoca, ajustando dosis según el estado del cultivo y de ser posible, análisis de suelo.

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN
• Hacer seguimiento técnico continuo y registrar las labores del proyecto de Restauración Ecológica Integral.	Enero

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO/QUIEN VISITA
ANCELMO		YAELON LOPEZ B

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	27 de diciembre de 2025
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Oscar Orlando Lozano Wilches - 77153085*
Nombre de la finca	Tres Filos
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Makenkal
Objetivo de la visita	Visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada, identificar las condiciones reales de las familias y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

SITUACIÓN ENCONTRADA

En el lote de café de 8 años, variedad Castillo, se registra una baja producción y predominio de follaje envejecido. Durante la inspección se constató que el cultivo fue paloteado después de la cosecha y que el terreno presenta zonas con alta presencia de malezas y escasa renovación de órganos productivos. El productor señala que tiene prevista la zoca para finales de diciembre o inicios de enero, con el propósito de iniciar un proceso de recuperación gradual del cultivo y fortalecer la productividad para el próximo ciclo. Este predio fue identificado y priorizado para su inclusión en el Proyecto de Restauración Ecológica Integral y Gobernanza Ambiental en la Serranía del Perijá, desarrollado en coordinación con Corpocesar. El área total es de 1 ha y actualmente no se realiza manejo de arvenses.

RECOMENDACIÓN

Implementar el manejo de arvenses de manera inmediata mediante control manual o mecánico, priorizando la limpieza alrededor de los tallos y en las zonas donde se generará el nuevo rebrotes. Realizar la zoca con criterio técnico, efectuando el corte a una altura aproximada de 30 cm sobre el suelo y procurando que presente una leve inclinación para evitar acumulación de agua y disminuir la probabilidad de infecciones fúngicas. Aplicar Trichoderma (5 g/L de agua) o un cicatrizante biológico directamente sobre la superficie del corte, con el propósito de proteger el tejido expuesto y estimular una brotación uniforme. Mantener un control permanente de malezas durante los tres primeros meses. Realizar la primera fertilización un mes después de la zoca, ajustando la dosis al estado del cultivo y, de ser posible, con base en resultados de análisis de suelo, priorizando nutrientes que impulsen la formación de nuevas estructuras productivas.



Ilustración 1 - Situación encontrada

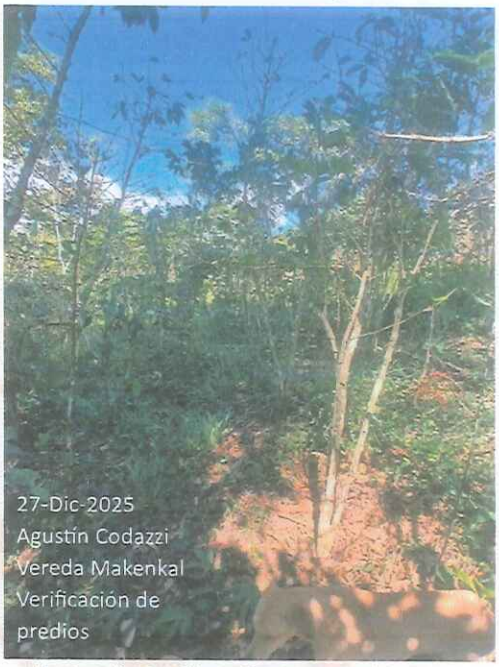


Ilustración 2 - Situación encontrada

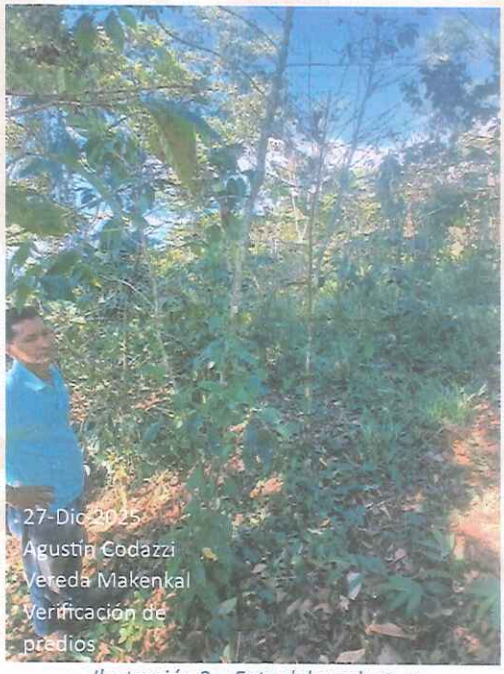


Ilustración 3 – Foto del productor

Oscar Lozano

Firma del Productor

YAIENIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

NIT. 900048841-7

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO: 14

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 22-12-2025

PRODUCTOR/A: Oscar Lozano

No. IDENTIFICACION: 77153085

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☐ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: Tres Ales

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustín Codazzi

VEREDA: Malvinal

TELÉFONO: 3002819230

PROYECTO: Cacaoscesar

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	☐ CAFÉ	☐ CACAO	☐ SOBERANÍA ALIMENTARIA	☐		
TEJER EL FUTURO	☐ JÓVENES	☐ MUJERES	☐ ANCESTRAL	☐ CULTURAL	☐	
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	☐ AMBIENTAL	☐ BIOINSUMOS	☐ SABERES	☐		

SITUACIÓN ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

En el lote de café de 8 años, variedad Castillo, se registra una baja producción y predominio de talla ramificada. Durante la inspección se constató que el cultivo fue podado después de la cosecha y que el terreno presenta zonas con alta presencia de malezas y escasa renovación de órganos productivos. El productor señala que desea podar la vara para poder favorecer el crecimiento de ramas productivas con el propósito de iniciar un proceso de recuperación gradual del cultivo y fortalecer la productividad para el próximo ciclo. Este predio fue identificado y priorizado para su inclusión en el proyecto de Restauración Ecológica Integral y Gobernanza Ambiental en la serranía del perijá, desarrollado en coordinación con Corpocesar. El área total es de 1 hada y actualmente no se realiza manejo de arvenses.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN ENCONTRADA

- Implementar el manejo de arvenses de manera inmediata mediante control manual, priorizando la limpieza alrededor de los tallos y en las zonas donde se generarán el nuevo rebrotes.
- Realizar la poda con criterios técnicos, dejando el corte a unos 40 cm aproximadamente de 30 cm sobre el suelo y procurando que presente una leve inclinación para evitar acumulación de agua y disminuir la probabilidad de infecciones fúngicas.
- Aplicar Trichoderma (5g) / 1L de agua), o un cicatrizante biológico recomendado sobre la superficie del corte, con el propósito de proteger el tejido expuesto y contribuir a una buena cicatrización.

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN
• Desarrollar un seguimiento técnico continuo al proceso de recuperación, registrando las labores realizadas con el marco de proyecto de restauración Ecológica Integral y Gobernanza Ambiental.	

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA		FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO QUIEN VISITA
Oscar O. Pozano.	Huella	YAEIP, S (OPE 2 Bula

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	15 de diciembre de 2026
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Nelson Salas Porras - 77151901*
Nombre de la finca	Danelis
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Makenkal
Objetivo de la visita	Visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada, identificar las condiciones reales de las familias y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

SITUACIÓN ENCONTRADA

En el lote de café de siete años de edad, variedad Castillo, se evidencia una baja productividad y presencia de follaje envejecido. Durante la visita se observa que el cultivo fue paloteado después de la cosecha y que el área presenta sectores con alta infestación de malezas y limitada renovación de estructuras productivas. El productor informa que la zoca está programada para finales de diciembre o comienzos de enero, con el objetivo de iniciar un proceso de renovación del cultivo y recuperar el rendimiento del lote para el siguiente ciclo productivo. Este lote fue seleccionado y priorizado para su participación en el Proyecto de Restauración Ecológica Integral y Gobernanza Ambiental en la Serranía del Perijá, desarrollado en articulación con Corpocesar.

RECOMENDACIÓN

Ejecutar la zoca de manera técnica, realizando el corte a una altura aproximada de 30 cm sobre el nivel del suelo y procurando que el corte tenga un ligero desnivel para evitar acumulación de agua y reducir el riesgo de infecciones por hongos. Aplicar Trichoderma a una dosis de 5 g por litro de agua, o cicatrizante biológico, directamente sobre la superficie del corte, con el fin de proteger el tejido y favorecer una adecuada brotación del cultivo. Realizar desrame y limpieza del lote antes de la zoca y mantener control manual o mecánico de malezas durante los primeros tres meses posteriores al rebrote, para garantizar un mejor establecimiento del cultivo. Efectuar la primera fertilización un mes después de la zoca, ajustando la dosis según el estado del cultivo y, de ser posible, con base en análisis de suelos, priorizando el estímulo del crecimiento de ramas productivas. Realizar seguimiento técnico periódico al rebrote y registrar las actividades ejecutadas, en articulación con el proceso del Proyecto de Restauración Ecológica Integral y Gobernanza Ambiental. Ejecutar los cortes con guadaña equipada con disco de corte y hacer uso adecuado de los elementos de

protección personal durante la labor, para reducir riesgos de accidentes. Implementar manejo de arvenses (malezas) de forma oportuna mediante control manual o mecánico, evitando el uso innecesario de herbicidas en la etapa de recuperación del cultivo.

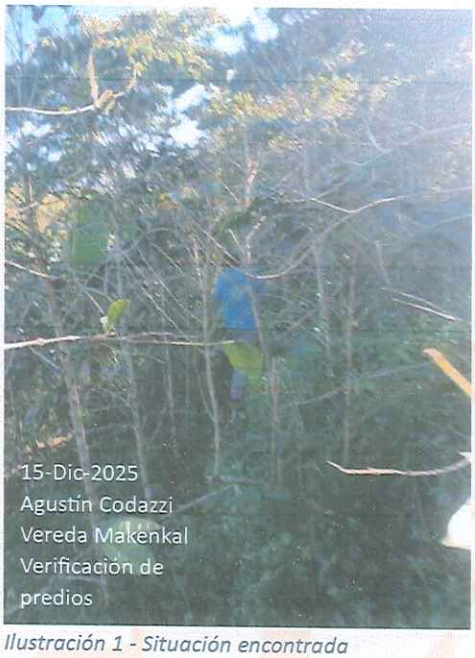


Ilustración 1 - Situación encontrada

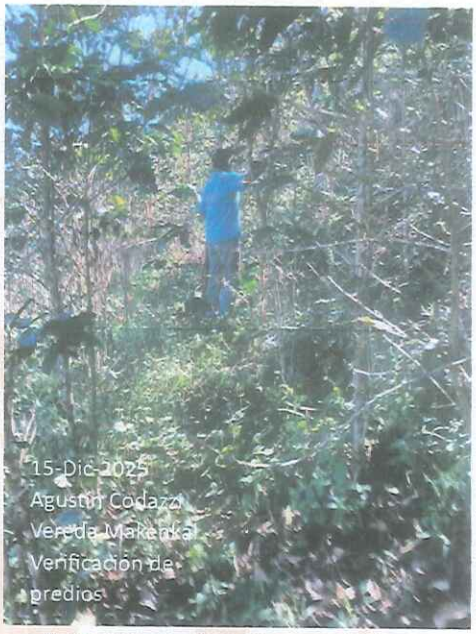


Ilustración 2 - Situación encontrada

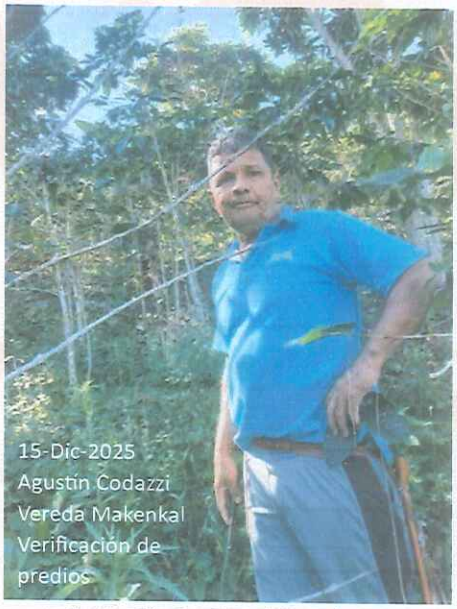


Ilustración 3 – Foto del productor

Nelson Salas Parras

Firma del Productor

YAIENIS LOPEZ

Firma del Gestor

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

ANEI

N/T. 900618883 - 7

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO: 15

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 27-12-21

PRODUCTOR/A: Nelson Salas Porras

No. IDENTIFICACION: 77151901

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☐ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: Canelis

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustin Codazzi

VEREDA: Valencia

TELÉFONO:

PROYECTO: Corpocesar

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	☐ CAFÉ	☐ CACAO	☐ SOBERANÍA ALIMENTARIA	☐	
TEJER EL FUTURO	☐ JÓVENES	☐ MUJERES	☐ ANCESTRAL	☐ CULTURAL	☐
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	☐ AMBIENTAL	☐ BIOINSUMOS	☐ SABERES	☐	

SITUACION ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

En el lote de café de siete años de edad, variedad Castillo, se evidencia una baja productividad y presencia de follaje envejecido. Durante la visita se observa que el cultivo fue palateado después de la cosecha y que el área presenta áreas sesgadas con alta incidencia de malezas y limitada renovación de estructuras productivas. El productor informa que la zoca está programada para finales de diciembre o comienzos de marzo, con el objetivo de iniciar con proceso de renovación del cultivo y recuperar el rendimiento del lote para el siguiente ciclo productivo. Este lote fue seleccionado y priorizado para su participación en el proyecto de Restauración Ecológica Integral y Gobernanza Ambiental en la Serranía del Perijá, desarrollando de articulación con Corpocesar.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

* Ejecutar la zoca de manera técnica, realizando el corte a una altura aproximada de 30 cm sobre el nivel del suelo y procurando que el corte tenga una ligera desnivel para evitar acumulación de agua y reducir el riesgo de infecciones por hongos.
* Aplicar Trichoderma a una dosis de 5g por litro de agua, o enfermedades biológicas, directamente sobre la superficie del corte, con el fin de proteger el tejido y favorecer una adecuada cicatrización del cultivo.
* Realizar deschante y limpieza del lote antes de la zoca, ajustando y manteniendo control manual o mecánico de malezas durante los primeros tres meses posteriores al corte, para garantizar un mejor establecimiento del cultivo.

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACION
- Ejecutar la primera fertilización un mes después de la zoca, ajustando la dosis según el estado del cultivo y, de ser posible, con base en análisis de suelos, priorizando el estímulo del crecimiento de ramas productivas. - Ejecutar los cortes con guadaña empuñada una disco de corte y buen uso adecuado de los elementos de protección personal durante la labor, para reducir riesgos de accidentes, implementar manejo de arvenses de forma apropiada mediante control manual o mecánico.	

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TECNICO/QUIEN VISITA
Nelson Salas 77151901		YANELIS LOPEZ BUSTA

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	27 de diciembre de 2025
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Carlos Humberto Leal Guerrero - 18930372*
Nombre de la finca	Las Delicias
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Makenkal
Objetivo de la visita	Visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada, identificar las condiciones reales de las familias y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

SITUACIÓN ENCONTRADA

En el lote de café Castillo de 8 años se observa reducción de producción, predominio de hojas envejecidas y alta presencia de malezas, con poca renovación de tejidos productivos. El productor tiene prevista la zoca entre finales de diciembre y comienzos de enero para recuperar gradualmente el cultivo. El predio, de 1 ha, cuenta con buena cobertura de sombra y está priorizado dentro del Proyecto de Restauración Ecológica Integral y Gobernanza Ambiental en la Serranía del Perijá, en coordinación con Corpocesar, sin manejo actual de arvenses.

RECOMENDACIÓN

Realizar zoca a 30 cm del suelo con ligera inclinación. Aplicar Trichoderma o cicatrizante biológico en el corte. Controlar malezas durante los primeros 3 meses. Fertilizar un mes después, según estado del cultivo y análisis de suelo. Hacer seguimiento técnico y registrar las labores en el proyecto.

www.anei.org.co

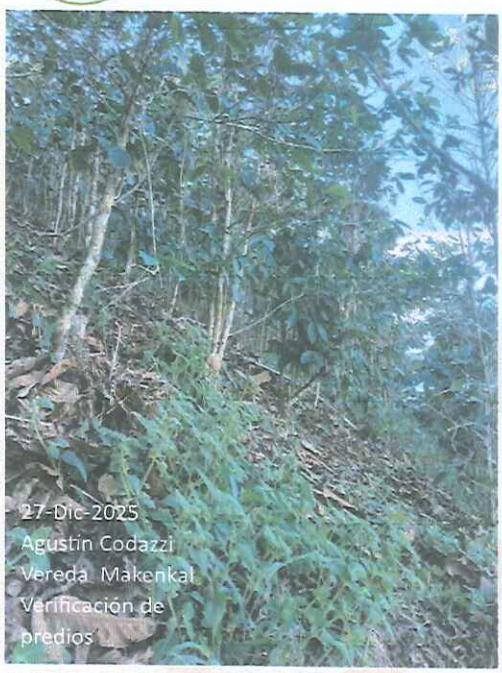


Ilustración 1 - Situación encontrada

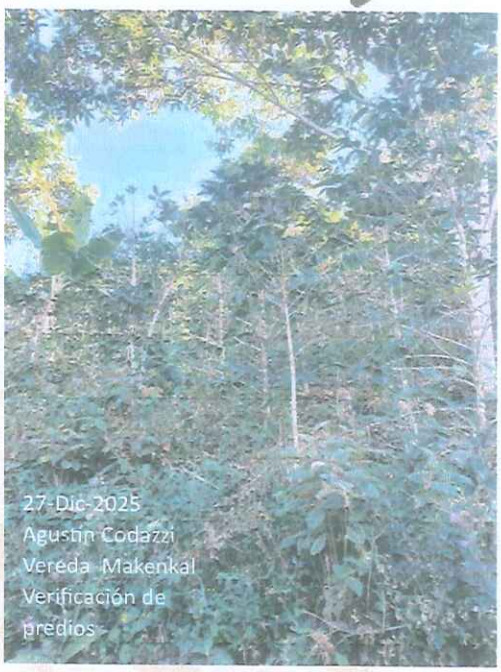


Ilustración 2 - Situación encontrada

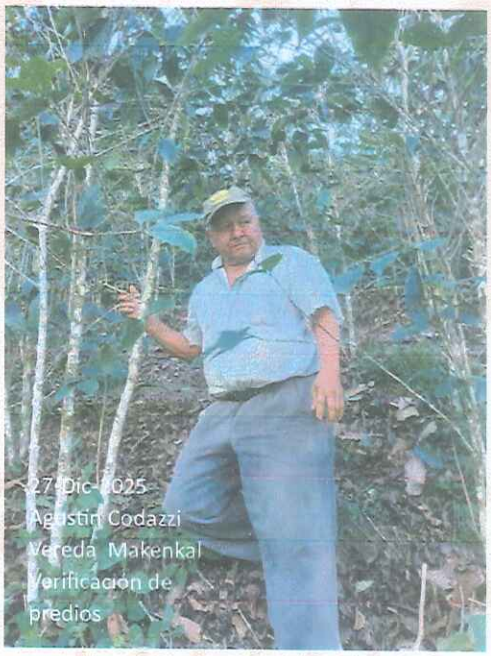


Ilustración 3 – Foto del productor

Carlos A Hear

Firma del Productor

YAIENDIS LOPEZ

Firma del Gestor

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

Nit. 900580061-7

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO: 16

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 29-10-25

PRODUCTOR/A: Carlos Leal

No. IDENTIFICACION: 1693037?

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a [x] Familiar [ ] Trabajador [ ]

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: Las delicias

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustín Codazzi

VEREDA: Manantial.

TELÉFONO: 3213561539.

PROYECTO: Corporcesar

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	[ ] CAFÉ	[ ] CACAO	[ ] SOBERANÍA ALIMENTARIA	[ ]			
TEJER EL FUTURO	[ ] JÓVENES	[ ] MUJERES	[ ] ANCESTRAL	[ ]	CULTURAL	[ ]	
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	[ ] AMBIENTAL	[ ] BIOINSUMOS	[ ] SABERES	[ ]			

SITUACION ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

El lote de cacao cardillo de 3 años de edad se observa reducción de producción y productividad de bajas inoculación y altas presencias de malezas, con poca renovación de tejidos productivos. El productor tiene previsto las zocas entre finales de diciembre y principios de enero para recuperar gradualmente el cultivo. El predio tiene árboles con buena cobertura de sombra que está proveyendo dentro del proyecto de restauración Ecológica integral y Gobernanza ambiental en la serranía las parejas en coordinación con corporcesar.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

- Realizar Zoca a 30cm del suelo para lograr inducción.
- Aplicar Trichoderma a excremento biológico en el cultivo
- Controlar malezas durante los primeros tres meses.
- Fertilizar un mes después, según estado del cultivo y análisis del suelo.
- Hacer Seguimiento técnico y registrar las labores del proyecto.

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TECNICO/QUIEN VISITA
Carlos H Leal		YAMELIS LOPO

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	27 de diciembre de 2025
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Gustavo Cañizares Rizo - 77153155*
Nombre de la finca	La Esperanza
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Makenkal
Objetivo de la visita	Visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada, identificar las condiciones reales de las familias y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

SITUACIÓN ENCONTRADA

El lote de 1 ha de café variedad Castillo, con 8 años de establecido, presenta baja producción, follaje envejecido y presencia de malezas, aunque conserva buena cobertura de sombra. El productor tiene previsto realizar la zoca del cultivo a inicios de enero, como parte del proceso de renovación productiva. Asimismo, se requiere la renovación del componente arbóreo: el productor va a tumbar el sombrío permanente existente y establecerá uno nuevo con especies de Carbonero, apoyado mediante viveros de café y especies forestales en el marco del Proyecto de Restauración Ecológica Integral. Las acciones técnicas priorizadas incluyen la zoca, el control de malezas, la fertilización y la implementación del nuevo sistema de sombra.

RECOMENDACIÓN

Realizar zoca del café con corte técnico a 30 cm del suelo y ligera inclinación para evitar acumulación de agua y enfermedades. Aplicar Trichoderma (5 g/L) o cicatrizante biológico en el corte para favorecer la brotación. Mantener control de malezas durante los primeros tres meses posteriores a la zoca. Fertilizar un mes después de la zoca, ajustando dosis según el estado del cultivo y, de ser posible, con análisis de suelo. Establecer en enero vivero de Carbonero y vivero para resiembra de café.

www.anei.org.co

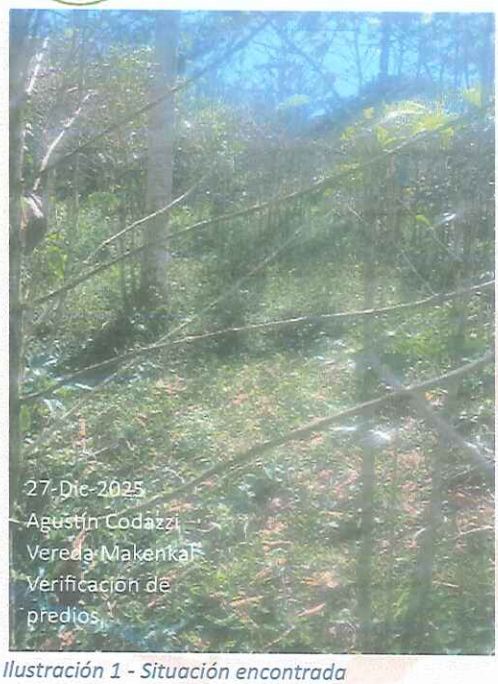


Ilustración 1 - Situación encontrada



Ilustración 2 - Situación encontrada

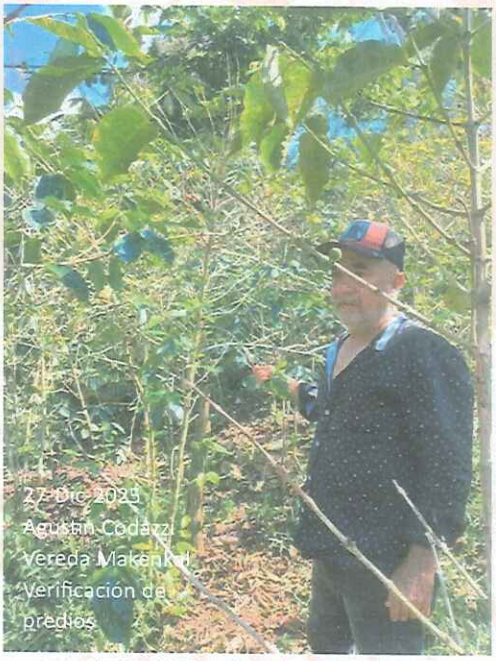


Ilustración 3 – Foto del productor

Gustavo Carrizal

Firma del Productor

YAIEDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO: 17

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 29-02-21

PRODUCTORA: Gustavo Carrizal

No. IDENTIFICACION: 77153155

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productora [x] Familiar [ ] Trabajador [ ]

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: La esperanza

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustín Codazzi

VEREDA: Makrobal

TELÉFONO: 3233019757

PROYECTO: Surriego

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	[x] CAFÉ	[ ] CACAO	[ ] SOBERANÍA ALIMENTARIA	[ ]			
TEJER EL FUTURO	[ ] JÓVENES	[ ] MUJERES	[ ] ANCESTRAL	[ ]	CULTURAL	[ ]	
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	[x] AMBIENTAL	[ ] BIOINSUMOS	[ ] SABERES	[ ]			

SITUACION ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

El lote de 1 ha de café variedad Castillo, con 8 años de establecidos presenta baja producción, follaje envejecido y presencia de malezas, cuenta con cobertura de sombrío. El productor fue propuesto realizar la zoca de la cultura a inicios de marzo, como parte del proceso de renovación productiva. Asimismo se realizará la eliminación del componente arbóreo: el productor va a tumbar el sábado posteriormente resiembra y establecimiento con especies de Cedro amargo, Guamo machete, Nogal y café y especies frutales en el marco del proyecto de restauración ecológica integral por Corpocesar.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

- Realizar zoca del café con corte técnico a 5 cm del suelo y hacer inclinación para evitar acumulación para evitar de agua y enfermedades.
- Aplicar Trichoderma (5 g/L) o cualquier bioinsumo en el corte para favorecer la brotación.
- Mantener control de malezas durante los primeros tres meses posteriores a la zoca.
- Fertilizar un mes después de la zoca ajustando dosis según el estado del cultivo y de ser posible con análisis de suelo.

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACION
• Establecer un cercado viveros de Cedro y Nogal para siembra de café.	

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TECNICO/QUIEN VISITA
Gustavo Cañizal.		Yaneidis Lopez B.

27

14

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	17 de diciembre de 2026
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*SPV-02 - Melba Isabel Rodríguez Buelvas - 26052209*
Nombre de la finca	Las Flores
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Las Vegas
Objetivo de la visita	Visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada, identificar las condiciones reales de las familias y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

SITUACIÓN ENCONTRADA

En el lote de café variedad Castillo, con más de 8 años, se evidencia disminución en la producción, hojas envejecidas y presencia de malezas, lo que afecta la brotación y el rendimiento. El productor tiene programada la zoca entre diciembre y enero. El área es de 1 ha, cuenta con sombra adecuada y está priorizada en el proyecto con Corpocesar, sin control actual de arvenses.

RECOMENDACIÓN

1.Realizar la zoca a 30 cm con corte inclinado. 2.Aplicar Trichoderma o sellante biológico.
3.Mantener control de malezas por 3 meses. 4.Fertilizar al mes según condición del cultivo.
5.Registrar labores y hacer seguimiento técnico. 6. Dejar surcos trampa para el control de broca.

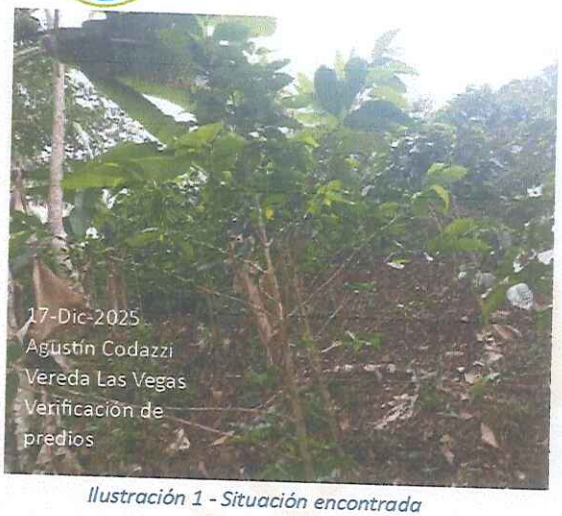


Ilustración 1 - Situación encontrada



Ilustración 2 - Situación encontrada



Ilustración 3 – Foto receptor visita

Melva Rodriguez

Firma del Productor

YAIEDIS LOPEZ

Firma del Gestor

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

NIT. 900048861-7

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO:

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 17/Dic-25

PRODUCTOR/A: Melva Isabel Rodriguez Buelvas

No. IDENTIFICACION: 26052209

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a ☐ Familiar ☐ Trabajador ☐

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: Las flores

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustin Codazzi

VEREDA: Las Vegas

TELÉFONO: 3052610908

PROYECTO: Corpocesar

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	☐	CAFÉ	☐	CACAO	☐	SOBERANÍA ALIMENTARIA	☐
TEJER EL FUTURO	☐	JÓVENES	☐	MUJERES	☐	ANCESTRAL ☐	CULTURAL ☐
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	☐	AMBIENTAL	☐	BIOINSUMOS	☐	SABERES	☐

SITUACIÓN ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

Durante la visita se evidenció un lote de Café Variedad Castillo con 8 años de edad. Se logró evidenciar disminución en la producción, hojas envejecidas y presencia de malezas lo que afecta la floración y el desarrollo del cultivo.

El productor tiene programada la zoca para el mes de enero y febrero, el área es 1 Ha. Cuenta con sombra adecuada y está priorizada en el proyecto con Corpocesar.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

* Realizar recolección de todos los granos de café para prevenir presencia de broca
* Aplicar manejo integrado del cultivo mediante la realización de limpias oportunas para el control de malezas
* Realizar la zoca a 30 cms con corte inclinado tipo bisel.
* Aplicar Trichoderma o sellante biológico
* Fertilizar al mes segun analisis de suelo y requerimientos nutricionales
* Hacer registro de labores agronomicas con el fin de llevar un seguimiento técnico del lote.

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACION

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados segun la legislacion vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA		FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO QUIEN VISITA
Melva Rodriguez	Huella	Yaneidis Lopez Bulm

144

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	17 de diciembre de 2025
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*SPV-05 - Heiner Barbosa Rodríguez - 77158678*
Nombre de la finca	Las Flores
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Las Vegas
Objetivo de la visita	Visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada, identificar las condiciones reales de las familias y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

SITUACIÓN ENCONTRADA

En el lote de café variedad Colombia, con más de 8 años, se evidencia baja producción, follaje envejecido y presencia elevada de malezas, lo que limita la renovación de estructuras productivas. El productor proyecta realizar la zoca entre finales de diciembre y comienzos de enero para recuperar el cultivo. El predio tiene 1 ha, cuenta con buena sombra y está priorizado dentro del proyecto de Restauración Ecológica Integral con Corpocesar, actualmente sin manejo de arvenses.

RECOMENDACIÓN

1. Ejecutar la zoca a 30 cm del suelo, con leve inclinación del corte. 2. Aplicar Trichoderma o cicatrizante biológico en la herida. 3. Realizar control de malezas durante los primeros 3 meses. 4. Mantener seguimiento técnico y registro de actividades del proyecto.

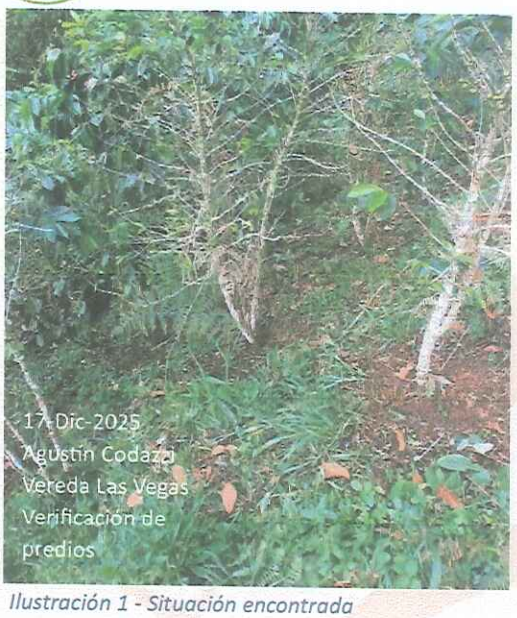


Ilustración 1 - Situación encontrada

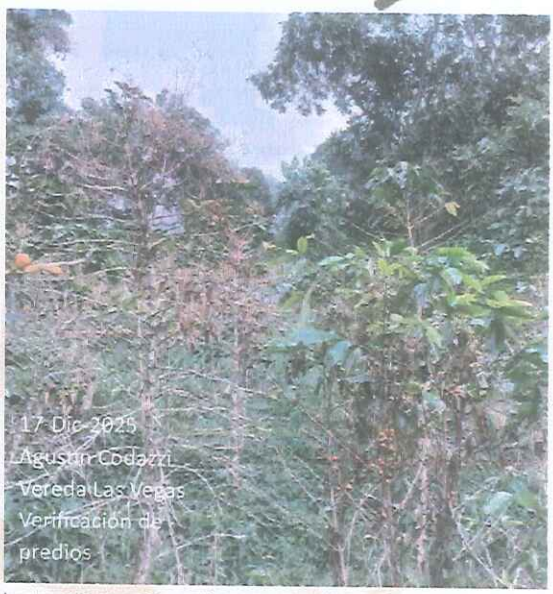


Ilustración 2 - Situación encontrada



Ilustración 3 – Foto del productor

Firma del Productor

YAIEDIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO: 19

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 17 DIC-25.

PRODUCTOR/A: Heiner Barbosa Rodriguez.

No. IDENTIFICACION: 77158678

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productor/a [x] Familiar [ ] Trabajador [ ]

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: Las Flores

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Agustin Codazzi

VEREDA: La vegas

TELÉFONO: 317 643 4381

PROYECTO: Corpocesar.

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	[x] CAFÉ	[ ] CACAO	[ ] SOBERANIA ALIMENTARIA	[ ]			
TEJER EL FUTURO	[ ] JÓVENES	[ ] MUJERES	[ ] ANCESTRAL	[ ]	CULTURAL	[ ]	
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	[x] AMBIENTAL	[ ] BIOINSUMOS	[ ] SABERES	[ ]			

SITUACIÓN ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

Durante la visita se evidencia un lote de café Variedad Castillo, con 9 años de edad, se evidencia buen follaje con baja produccion, Follaje envejecido y presencia elevada de arvenses, lo que limita su produccion. El productor tiene proyectada realizar la zoca entre finales de enero y inicio del mes de febrero con el fin de recuperar el lote. Este lote de café cuenta con poca sombra permanente y sera priorizado para el proyecto con Corpocesar.

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACION ENCONTRADA

1) Terminar de recoger los granos maduros que esten en la planta y en el suelo para evitar la presencia de plagas como la broca.
2) Realizar manejo de arvenses para facilitar las labores
3) Realizar Desrame para que las rama nos aporte a mejo la estructura del suelo.
4) Realizar el corte a 30 cm del Suelo con Motosierra o Guadaña para que el corte quede Preciso y liso, Dejandolo con desnivel para evitar encharcamiento.
5. Aplicar Trichoderma para el control de patogenos.
6. Mantener seguimiento tecnico y registro de visita.

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados segun la legis vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta v

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TECNICO/QUIEN VISITA
		YAIDIS LOPEZ B.

ACTA DE VISITA TECNICA

Entidad: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ "ASOANEI"

Proyecto: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Fecha	24 de diciembre de 2025
Gestor	Yaleidis López Bula
Nombre Socio	*Albeiro Flórez Carrillo - 77159197*
Nombre de la finca	La Planadas
Municipio	Agustín Codazzi
Vereda	Zorrocuco
Objetivo de la visita	Visitas de verificación a los predios postulados, con el propósito de constatar la información suministrada, identificar las condiciones reales de las familias y validar la pertinencia de su vinculación al proyecto.

SITUACIÓN ENCONTRADA

En el lote de café Castillo, con más de 8 años de establecimiento, se observa disminución del rendimiento, hojas envejecidas y malezas activas en el área productiva. El productor proyecta realizar zoca entre diciembre y enero. Lote de 1 ha incluido en el proyecto Corpocesar, actualmente sin manejo de arvenses.

RECOMENDACIÓN

1. Realizar desrame antes del corte. 2. Realizar zoca común a 30 cm de altura. 3. recoger el material grueso. 4. en el momento de deschupar dejar 2 chupones por sitio. 4.Sellar el corte con bioproductos. 5. Realizar manejo de arvenses Aplicar fertilización al mes. Continuar con acompañamiento técnico. 6 dejar surcos trampas para el control de plagas.

www.anei.org.co

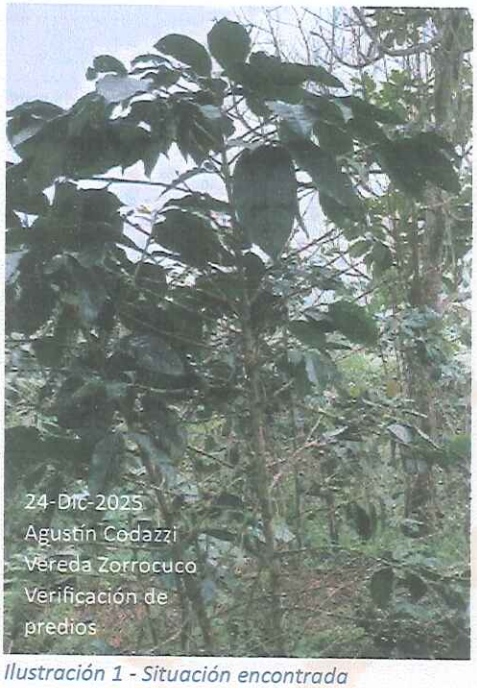


Ilustración 1 - Situación encontrada

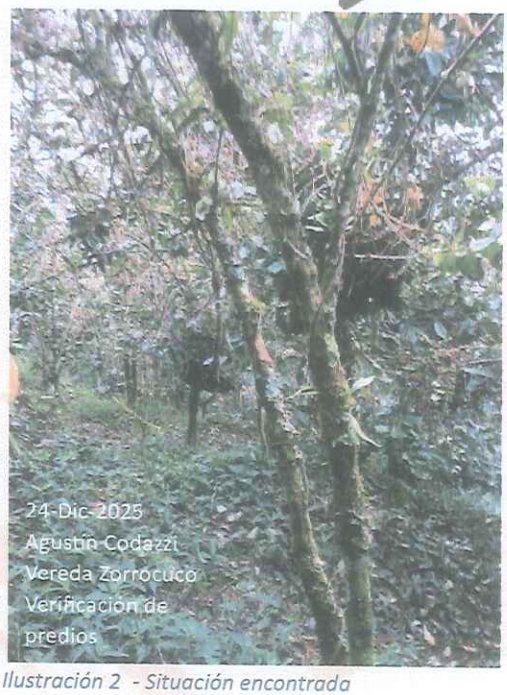


Ilustración 2 - Situación encontrada

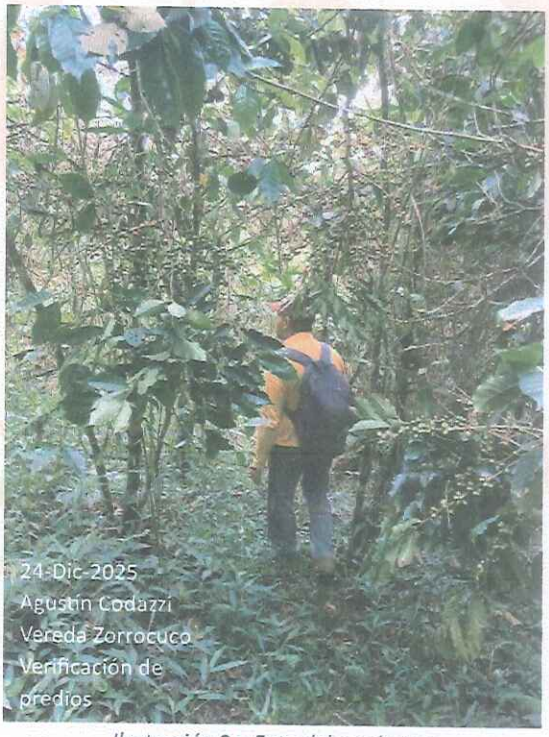


Ilustración 3 – Foto del productor

Alberto Florez

Firma del Productor

YAIENIS LOPEZ

Firma del Gestor

www.anei.org.co

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANÍA DE PERIJÁ - ASOANEI

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES

OBJETIVO DE LA VISITA

VISITA NUMERO: 20

INFORMACION GENERAL

FECHA DE VISITA: 24-7-25.

PRODUCTORIA: ALBEIRO FLOREZ

No. IDENTIFICACION: 77154197.

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Productora ☐ Familiar ☑ Trabajador ☐

NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA:

NOMBRE FINCA: La Planadas

DEPARTAMENTO: Cesar

MUNICIPIO: Manaure Codazzi

VEREDA: 2proceso

TELÉFONO: 3135270377

PROYECTO: Corpocesar

ENFOQUE DE LA VISITA

SEMBRAR PAZ	☐ CAFE	☐ CACAO	☐ SOBERANIA ALIMENTARIA	☐		
TEJER EL FUTURO	☐ JÓVENES	☐ MUJERES	☐ ANCESTRAL	☐ CULTURAL	☐	
ARMONÍA CON LA NATURALEZA	☐ AMBIENTAL	☐ BIONSUMOS	☐ SABERES	☐		

SITUACIÓN ENCONTRADA / SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

En el lote de cafe castillo. Con mas de 8 años de establecimiento, se observa disminucion del rendimiento, hojas envejecidas y malezas activas en el area productiva El productor proyecta realizar zoca entre diciembre y enero el mes de enero. Lote de 1 ha incluido en el Proyecto Corpocesar, actualmente sin manejo de arvenses

RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN ENCONTRADA

* Realizar desrame antes del corte
* Realizar zoca (arriba a 30 cm de altura.
* Recoger el material grueso
* En el momento de deschupar dejar 2 chupones por sitio.
* sellar el corte con bioproductor
* Realizar manejo de arvenses
* APlicar Fertilizacion al mes.
* Continuar con acompañamiento tecnico
* Dejar surco trampa para control de plaga

LABORES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN

Mediante la firma del presente documento, autorizo de manera expresa a ASOANEI y a sus colaboradores(as) para que realicen el tratamiento de los datos personales aquí consignados según la legislación vigente. Igualmente, otorgo mi consentimiento para el registro, manejo y publicación de imágenes del suscrito(a) y de las personas menores de edad que me acompañen, en lo que respecta a esta visita.

FIRMA BENEFICIARIO / QUIEN ATIENDE LA VISITA	Huella	FIRMA DEL GESTOR O TÉCNICO QUIEN VISITA
Albeiro Florez		Yaleinis Lopez B. A

Anexo 13. Actas de Concertación y Documentos de Identificación beneficiarios

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

ACTA DE CONCERTACIÓN

En la vereda 7 de Agosto del municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar, el día 30 de Diciembre del 2025, se reunieron, AURORA MARIA IZQUIERDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 51.610.167 de BOGOTA DC, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI , **MONICA INÉS GONZALEZ THOMAS**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en su calidad de Supervisora y Elvis Lopez Quintero (**En calidad de beneficiario**), identificado con cedula de ciudadanía N° 77158157 expedida en Agustín Codazzi, en el marco del Convenio N° **19-7-0008-0-2025** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, con el fin de concertar las actividades contempladas en dicho convenio, las cuales se realizarán en el predio El Eden ubicado en la vereda 7 de Agosto del municipio AGUSTÍN CODAZZI.

Las actividades concertadas que se realizaran dentro del marco del proyecto son las siguientes:

1. **RESTAURACION ECOLOGICA**: ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO ESQUEMAS AGROFORESTALES-RENOVACIÓN POR ZOCA.

Área destinada por el beneficiario para la restauración (Ha)	Numero de plántulas de especies forestales nativas	Insumos aportados por el proyecto	Mano de obra aportada por el proyecto.
Una (1) Hectárea.	*Plántulas de café (765 Plántulas). *Plántulas Forestales o Maderables. (44 Plántulas) *Plántulas Musáceas (278 Plántula) *Frijol (20 Kg).	*Fertilizantes (Roca fosfórica)- 153,06 Kg *Fertilizantes Patenkali) 153,06 Kg *Micorriza 153,06 Kg *Acondicionador de suelos 5.973,47 Kg. *Trichoderma 1,00 Kg *Equipo para manejo de arvenses Guadaña) 1,0Unidad.	Plateo Ahoyado Zoqueo Fertilización. Siembra Reposición o replante Control Fitosanitario y de malezas. Limpias. Transporte mayor y menor. Asistencia Técnica. (Profesional Agroecológico- Gestor de Campo)

152

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

Se deja constancia de que lo descrito en la presente **acta de concertación**, es aceptado a satisfacción por el beneficiario y que este se compromete a salvaguardar, realizando seguimiento, atención a las especies establecidas dentro de su predio y el sostenimiento de las mismas, así como reportar inmediatamente a CORPOCESAR, los conatos de incendio (entendido como fuego de pequeña magnitud) o los incendios, así como cualquier novedad que se presente en la zona establecida.

AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES
CC. 51.610.167 de Bogotá D.C
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI

Elvis Lopez Quintero

Nombre beneficiario: Elvis Lopez Quintero
CC. 77158157 de Agustín Codazzi
Vereda 7 de Agosto

Mónica Inés González Thomas.
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental.
Supervisora – CORPOCESAR.

Anexos:
-Documento de Identidad del Beneficiario
-Documento que acredita la propiedad o Tenencia del Predio
-Georreferenciación de área a intervenir.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 77.158.157

LOPEZ QUINTERO

APELLIDOS

ELVIS

NOMBRES

Elvis Lopez Quintero

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-NOV-1974

AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

20-JUN-1994 AGUSTIN CODAZZI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1215000-00148742-M-0077158157-20090202 0009789155A 1 8060002029

CORPOCESAR	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN** **FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO**	**PCA-03-F- 39** **VERSIÓN:** 1.0 **FECHA:** 24/10/2025

ACTA DE CONCERTACIÓN

En la vereda Alto Sicarare del municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar, el día 30 de Diciembre del 2025, se reunieron, AURORA MARIA IZQUIERDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 51.610.167 de BOGOTA DC, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI , **MONICA INÉS GONZALEZ THOMAS**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en su calidad de Supervisora y Ángel Maria Gomez Gonzales (**En calidad de beneficiario**), identificado con cedula de ciudadanía N° 12488101 expedida en Agustín Codazzi, en el marco del Convenio N° **19-7-0008-0-2025** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, con el fin de concertar las actividades contempladas en dicho convenio, las cuales se realizarán en el predio El Diamante ubicado en la vereda Alto Sicarare del municipio AGUSTÍN CODAZZI.

Las actividades concertadas que se realizaran dentro del marco del proyecto son las siguientes:

1. **RESTAURACION ECOLOGICA**: ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO ESQUEMAS AGROFORESTALES-RENOVACIÓN POR ZOCA.

Área destinada por el beneficiario para la restauración (Ha)	Numero de plántulas de especies forestales nativas	Insumos aportados por el proyecto	Mano de obra aportada por el proyecto.
Una (1) Hectárea.	*Plántulas de café (765 Plántulas). *Plántulas Forestales o Maderables. (44 Plántulas) *Plántulas Musáceas (278 Plántula) *Frijol (20 Kg).	*Fertilizantes (Roca fosfórica)- 153,06 Kg *Fertilizantes Patenkali) 153,06 Kg *Micorriza 153,06 Kg *Acondicionador de suelos 5.973,47 Kg. *Trichoderma 1,00 Kg *Equipo para manejo de arvenses Guadaña) 1,0Unidad.	Plateo Ahoyado Zoqueo Fertilización. Siembra Reposición o replante Control Fitosanitario y de malezas. Limpias. Transporte mayor y menor. Asistencia Técnica. (Profesional Agroecológico- Gestor de Campo)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

Se deja constancia de que lo descrito en la presente **acta de concertación**, es aceptado a satisfacción por el beneficiario y que este se compromete a salvaguardar, realizando seguimiento, atención a las especies establecidas dentro de su predio y el sostenimiento de las mismas, así como reportar inmediatamente a CORPOCESAR, los conatos de incendio (entendido como fuego de pequeña magnitud) o los incendios, así como cualquier novedad que se presente en la zona establecida.

AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES
CC. 51.610.167 de Bogotá D.C
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI

Nombre beneficiario: Ángel Maria Gomez Gonzales
CC. 12488101 de Agustín Codazzi
Vereda Alto Sicarare

Mónica Inés González Thomas.
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental.
Supervisora – CORPOCESAR.

Anexos:
- Documento de Identidad del Beneficiario
-Documento que acredita la propiedad o Tenencia del Predio
-Georreferenciación de área a intervenir.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 12.488.101
GOMEZ GONZALEZ
APELLIDOS
ANGEL MARIA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1944
PLAYA RICA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
04-AGO-1966 AGUSTIN CODAZZI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
A-1215000-37162313-M-0012488101-20071002
02053 07279C 02 224581953

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

ACTA DE CONCERTACIÓN

En la vereda Alto Sicarare del municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar, el día 30 de Diciembre del 2025, se reunieron, AURORA MARIA IZQUIERDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 51.610.167 de BOGOTA DC, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI , **MONICA INÉS GONZALEZ THOMAS**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en su calidad de Supervisora y Eidelver Celon Rodriguez (**En calidad de beneficiario**), identificado con cedula de ciudadanía N° 18938106 expedida en Agustín Codazzi, en el marco del Convenio N° **19-7-0008-0-2025** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, con el fin de concertar las actividades contempladas en dicho convenio, las cuales se realizarán en el predio La Cabaña ubicado en la vereda Alto Sicarare del municipio AGUSTÍN CODAZZI.

Las actividades concertadas que se realizaran dentro del marco del proyecto son las siguientes:

1. **RESTAURACION ECOLOGICA**: ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO ESQUEMAS AGROFORESTALES-RENOVACIÓN POR ZOCA.

Área destinada por el beneficiario para la restauración (Ha)	Numero de plántulas de especies forestales nativas	Insumos aportados por el proyecto	Mano de obra aportada por el proyecto.
Una (1) Hectárea.	*Plántulas de café (765 Plántulas). *Plántulas Forestales o Maderables. (44 Plántulas) *Plántulas Musáceas (278 Plántula) *Frijol (20 Kg).	*Fertilizantes (Roca fosfórica)- 153,06 Kg *Fertilizantes Patenkali) 153,06 Kg *Micorriza 153,06 Kg *Acondicionador de suelos 5.973,47 Kg. *Trichoderma 1,00 Kg *Equipo para manejo de arvenses Guadaña) 1,0Unidad.	Plateo Ahoyado Zoqueo Fertilización. Siembra Reposición o replante Control Fitosanitario y de malezas. Limpias. Transporte mayor y menor. Asistencia Técnica. (Profesional Agroecológico- Gestor de Campo)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

Se deja constancia de que lo descrito en la presente **acta de concertación**, es aceptado a satisfacción por el beneficiario y que este se compromete a salvaguardar, realizando seguimiento, atención a las especies establecidas dentro de su predio y el sostenimiento de las mismas, así como reportar inmediatamente a CORPOCESAR, los conatos de incendio (entendido como fuego de pequeña magnitud) o los incendios, así como cualquier novedad que se presente en la zona establecida.

AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES
CC. 51.610.167 de Bogotá D.C
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI

Nombre beneficiario: Eidelver Celon Rodriguez
CC. 18938106 de Agustín Codazzi
Vereda Alto Sicarare

Mónica Inés González Thomas.
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental.
Supervisora – CORPOCESAR.

Anexos:
- Documento de Identidad del Beneficiario
-Documento que acredita la propiedad o Tenencia del Predio
-Georreferenciación de área a intervenir.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 18.938.106
APELLIDOS CELON RODRIGUEZ
NOMBRES EIDELBER



FECHA DE NACIMIENTO 08-ENE-1962
AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
29-MAY-1980 AGUSTIN CODAZZI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

A-1215000-37162313-M-0018938106-20071007 0108507280M 02 224816270

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

ACTA DE CONCERTACIÓN

En la vereda Caño Frio del municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar, el día 30 de Diciembre del 2025, se reunieron, AURORA MARIA IZQUIERDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 51.610.167 de BOGOTA DC, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI , **MONICA INÉS GONZALEZ THOMAS**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en su calidad de Supervisora y Ruth Angarita Ortega (**En calidad de beneficiario**), identificado con cedula de ciudadanía N° 49690994 expedida en Agustín Codazzi, en el marco del Convenio N° **19-7-0008-0-2025** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, con el fin de concertar las actividades contempladas en dicho convenio, las cuales se realizarán en el predio Las Violetas ubicado en la vereda Caño Frio del municipio AGUSTÍN CODAZZI.

Las actividades concertadas que se realizaran dentro del marco del proyecto son las siguientes:

1. **RESTAURACION ECOLOGICA**: ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO ESQUEMAS AGROFORESTALES-RENOVACIÓN POR ZOCA.

Área destinada por el beneficiario para la restauración (Ha)	Numero de plántulas de especies forestales nativas	Insumos aportados por el proyecto	Mano de obra aportada por el proyecto.
Una (1) Hectárea.	*Plántulas de café (765 Plántulas). *Plántulas Forestales o Maderables. (44 Plántulas) *Plántulas Musáceas (278 Plántula) *Frijol (20 Kg).	*Fertilizantes (Roca fosfórica)- 153,06 Kg *Fertilizantes Patenkali) 153,06 Kg *Micorriza 153,06 Kg *Acondicionador de suelos 5.973,47 Kg. *Trichoderma 1,00 Kg *Equipo para manejo de arvenses Guadaña) 1,0Unidad.	Plateo Ahoyado Zoqueo Fertilización. Siembra Reposición o replante Control Fitosanitario y de malezas. Limpias. Transporte mayor y menor. Asistencia Técnica. (Profesional Agroecológico- Gestor de Campo)

CORPOCESAR	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN** **FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO**	**PCA-03-F- 39** **VERSIÓN:** 1.0 **FECHA:** 24/10/2025

Se deja constancia de que lo descrito en la presente **acta de concertación**, es aceptado a satisfacción por el beneficiario y que este se compromete a salvaguardar, realizando seguimiento, atención a las especies establecidas dentro de su predio y el sostenimiento de las mismas, así como reportar inmediatamente a CORPOCESAR, los conatos de incendio (entendido como fuego de pequeña magnitud) o los incendios, así como cualquier novedad que se presente en la zona establecida.

AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES
CC. 51.610.167 de Bogotá D.C
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI

Nombre beneficiario: Ruth Angarita Ortega
CC. 49690994 de Agustín Codazzi
Vereda Caño Frio

Mónica Inés González Thomas.
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental.
Supervisora – CORPOCESAR.

Anexos:
- Documento de Identidad del Beneficiario
-Documento que acredita la propiedad o Tenencia del Predio
-Georreferenciación de área a intervenir.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 49.690.994
ANGARITA ORTEGA

APELLIDOS

RUTH

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-JUN-1969
AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

17-MAY-1989 AGUSTIN CODAZZI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1215000-00253580-F-0049690994-20100903 0023741652A 1 8050901172

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

ACTA DE CONCERTACIÓN

En la vereda La Duda del municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar, el día 30 de Diciembre del 2025, se reunieron, AURORA MARIA IZQUIERDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 51.610.167 de BOGOTA DC, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI , **MONICA INÉS GONZALEZ THOMAS**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en su calidad de Supervisora y Everst Alberto Moron Peñaloza (**En calidad de beneficiario**), identificado con cedula de ciudadanía N° 77151014 expedida en Agustín Codazzi, en el marco del Convenio N° **19-7-0008-0-2025** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, con el fin de concertar las actividades contempladas en dicho convenio, las cuales se realizarán en el predio Casanare ubicado en la vereda La Duda del municipio AGUSTÍN CODAZZI.

Las actividades concertadas que se realizaran dentro del marco del proyecto son las siguientes:

1. **RESTAURACION ECOLOGICA**: ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO ESQUEMAS AGROFORESTALES-RENOVACIÓN POR ZOCA.

Área destinada por el beneficiario para la restauración (Ha)	Numero de plántulas de especies forestales nativas	Insumos aportados por el proyecto	Mano de obra aportada por el proyecto.
Una (1) Hectárea.	*Plántulas de café (765 Plántulas). *Plántulas Forestales o Maderables. (44 Plántulas) *Plántulas Musáceas (278 Plántula) *Frijol (20 Kg).	*Fertilizantes (Roca fosfórica)- 153,06 Kg *Fertilizantes Patenkali) 153,06 Kg *Micorriza 153,06 Kg *Acondicionador de suelos 5.973,47 Kg. *Trichoderma 1,00 Kg *Equipo para manejo de arvenses Guadaña) 1,0Unidad.	Plateo Ahoyado Zoqueo Fertilización. Siembra Reposición o replante Control Fitosanitario y de malezas. Limpias. Transporte mayor y menor. Asistencia Técnica. (Profesional Agroecológico- Gestor de Campo)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

Se deja constancia de que lo descrito en la presente **acta de concertación**, es aceptado a satisfacción por el beneficiario y que este se compromete a salvaguardar, realizando seguimiento, atención a las especies establecidas dentro de su predio y el sostenimiento de las mismas, así como reportar inmediatamente a CORPOCESAR, los conatos de incendio (entendido como fuego de pequeña magnitud) o los incendios, así como cualquier novedad que se presente en la zona establecida.

AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES
CC. 51.610.167 de Bogotá D.C
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI

Nombre beneficiario: Everst Alberto Moron Peñaloza
CC. 77151014 de Agustín Codazzi
Vereda La Duda

Mónica Inés González Thomas.
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental.
Supervisora – CORPOCESAR.

Anexos:
- Documento de Identidad del Beneficiario
-Documento que acredita la propiedad o Tenencia del Predio
-Georreferenciación de área a intervenir.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 77.151.014
MORON PEÑALOZA
APELLIDOS
EVERST ALBERTO
NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 02-JUN-1965
AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
07-SEP-1983 AGUSTIN CODAZZI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1215000-00120001-M-0077151014-20081102 0005169903A 1

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

ACTA DE CONCERTACIÓN

En la vereda La Duda del municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar, el día 30 de Diciembre del 2025, se reunieron, AURORA MARIA IZQUIERDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 51.610.167 de BOGOTA DC, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI , **MONICA INÉS GONZALEZ THOMAS**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en su calidad de Supervisora y Jose Del Carmen Portillo (**En calidad de beneficiario**), identificado con cedula de ciudadanía N° 18930527 expedida en Agustín Codazzi, en el marco del Convenio N° **19-7-0008-0-2025** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, con el fin de concertar las actividades contempladas en dicho convenio, las cuales se realizarán en el predio El Porvenir ubicado en la vereda La Duda del municipio AGUSTÍN CODAZZI.

Las actividades concertadas que se realizaran dentro del marco del proyecto son las siguientes:

1. **RESTAURACION ECOLOGICA**: ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO ESQUEMAS AGROFORESTALES-RENOVACIÓN POR ZOCA.

Área destinada por el beneficiario para la restauración (Ha)	Numero de plántulas de especies forestales nativas	Insumos aportados por el proyecto	Mano de obra aportada por el proyecto.
Una (1) Hectárea.	*Plántulas de café (765 Plántulas). *Plántulas Forestales o Maderables. (44 Plántulas) *Plántulas Musáceas (278 Plántula) *Frijol (20 Kg).	*Fertilizantes (Roca fosfórica)- 153,06 Kg *Fertilizantes Patenkali) 153,06 Kg *Micorriza 153,06 Kg *Acondicionador de suelos 5.973,47 Kg. *Trichoderma 1,00 Kg *Equipo para manejo de arvenses Guadaña) 1,0Unidad.	Plateo Ahoyado Zoqueo Fertilización. Siembra Reposición o replante Control Fitosanitario y de malezas. Limpias. Transporte mayor y menor. Asistencia Técnica. (Profesional Agroecológico- Gestor de Campo)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

Se deja constancia de que lo descrito en la presente **acta de concertación**, es aceptado a satisfacción por el beneficiario y que este se compromete a salvaguardar, realizando seguimiento, atención a las especies establecidas dentro de su predio y el sostenimiento de las mismas, así como reportar inmediatamente a CORPOCESAR, los conatos de incendio (entendido como fuego de pequeña magnitud) o los incendios, así como cualquier novedad que se presente en la zona establecida.


AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES
CC. 51.610.167 de Bogotá D.C
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI

Nombre beneficiario: Jose Del Carmen Portillo
CC. 18930527 de Agustín Codazzi
Vereda La Duda

Mónica Inés González Thomas.
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental.
Supervisora – CORPOCESAR.

Anexos:
- Documento de Identidad del Beneficiario
-Documento que acredita la propiedad o Tenencia del Predio
-Georreferenciación de área a intervenir.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
18.930.527
PORTILLO
JOSE DEL CARMEN

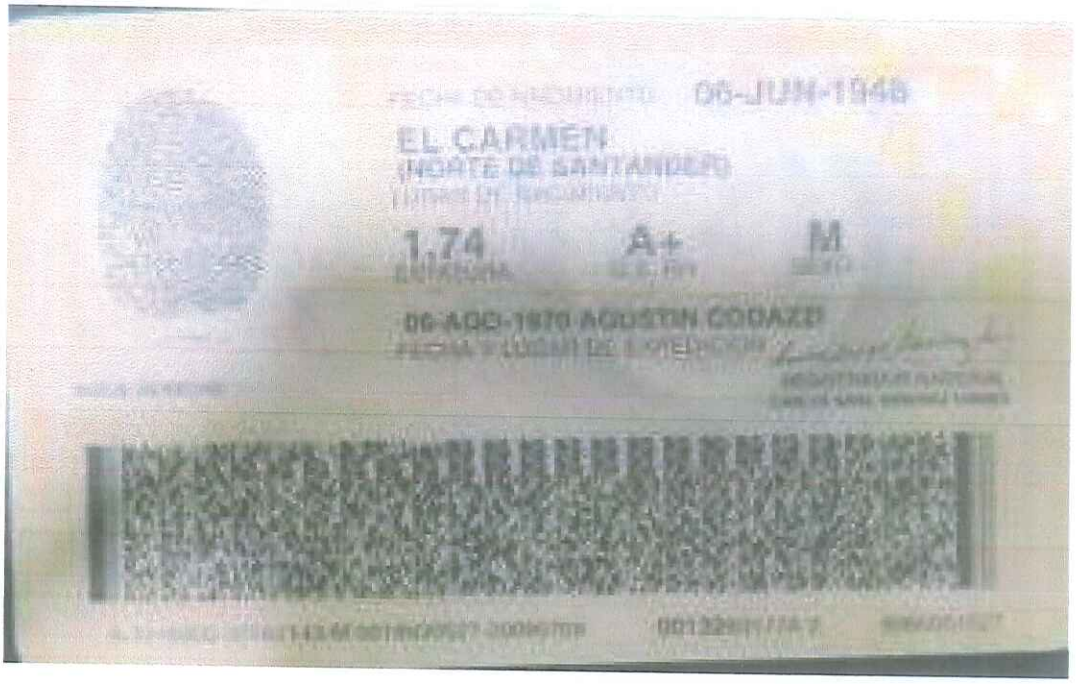
06-JUN-1948
EL CARMEN
(NORTE DE SANTANDER)
1.74
A+
M
06-AGO-1970 AGUSTIN CODAZZI

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

ACTA DE CONCERTACIÓN

En la vereda La Duda del municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar, el día 30 de Diciembre del 2025, se reunieron, AURORA MARIA IZQUIERDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 51.610.167 de BOGOTA DC, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI , **MONICA INÉS GONZALEZ THOMAS**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en su calidad de Supervisora y Hermes Jimenez Delgado (**En calidad de beneficiario**), identificado con cedula de ciudadanía N° 18938420 expedida en Agustín Codazzi, en el marco del Convenio N° **19-7-0008-0-2025** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, con el fin de concertar las actividades contempladas en dicho convenio, las cuales se realizarán en el predio La Reforma ubicado en la vereda La Duda del municipio AGUSTÍN CODAZZI.

Las actividades concertadas que se realizaran dentro del marco del proyecto son las siguientes:

1. **RESTAURACION ECOLOGICA**: ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO ESQUEMAS AGROFORESTALES-RENOVACIÓN POR ZOCA.

Área destinada por el beneficiario para la restauración (Ha)	Numero de plántulas de especies forestales nativas	Insumos aportados por el proyecto	Mano de obra aportada por el proyecto.
Una (1) Hectárea.	*Plántulas de café (765 Plántulas). *Plántulas Forestales o Maderables. (44 Plántulas) *Plántulas Musáceas (278 Plántula) *Frijol (20 Kg).	*Fertilizantes (Roca fosfórica)- 153,06 Kg *Fertilizantes Patenkali) 153,06 Kg *Micorriza 153,06 Kg *Acondicionador de suelos 5.973,47 Kg. *Trichoderma 1,00 Kg *Equipo para manejo de arvenses Guadaña) 1,0Unidad.	Plateo Ahoyado Zoqueo Fertilización. Siembra Reposición o replante Control Fitosanitario y de malezas. Limpias. Transporte mayor y menor. Asistencia Técnica. (Profesional Agroecológico- Gestor de Campo)

CORPOCESAR	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN** **FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO**	**PCA-03-F- 39** **VERSIÓN:** 1.0 **FECHA:** 24/10/2025

Se deja constancia de que lo descrito en la presente **acta de concertación**, es aceptado a satisfacción por el beneficiario y que este se compromete a salvaguardar, realizando seguimiento, atención a las especies establecidas dentro de su predio y el sostenimiento de las mismas, así como reportar inmediatamente a CORPOCESAR, los conatos de incendio (entendido como fuego de pequeña magnitud) o los incendios, así como cualquier novedad que se presente en la zona establecida.

AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES
CC. 51.610.167 de Bogotá D.C
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI

Hermes Jimenez Delgado
Nombre beneficiario: Hermes Jimenez Delgado
CC. 18938420 de Agustín Codazzi
Vereda La Duda

Mónica Inés González Thomas.
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental.
Supervisora – CORPOCESAR.

Anexos:
- Documento de Identidad del Beneficiario
-Documento que acredita la propiedad o Tenencia del Predio
-Georreferenciación de área a intervenir.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 18.938.420
JIMENEZ DELGADO
APELLIDOS
HERMES
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 13-MAY-1975
AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

14-SEP-1993 AGUSTIN CODAZZI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1215000-00148742-M-0018938420-20090202 0009784883A 1 8050002096

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

ACTA DE CONCERTACIÓN

En la vereda La Duda del municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar, el día 30 de Diciembre del 2025, se reunieron, AURORA MARIA IZQUIERDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 51.610.167 de BOGOTA DC, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI , **MONICA INÉS GONZALEZ THOMAS**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en su calidad de Supervisora y Eliseo Molina Zamudio (**En calidad de beneficiario**), identificado con cedula de ciudadanía N° 1050064756 expedida en San Martín de Loba, en el marco del Convenio N° **19-7-0008-0-2025** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, con el fin de concertar las actividades contempladas en dicho convenio, las cuales se realizarán en el predio La Esperanza ubicado en la vereda La Duda del municipio AGUSTÍN CODAZZI.

Las actividades concertadas que se realizaran dentro del marco del proyecto son las siguientes:

1. **RESTAURACION ECOLOGICA**: ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO ESQUEMAS AGROFORESTALES-RENOVACIÓN POR ZOCA.

Área destinada por el beneficiario para la restauración (Ha)	Numero de plántulas de especies forestales nativas	Insumos aportados por el proyecto	Mano de obra aportada por el proyecto.
Una (1) Hectárea.	*Plántulas de café (765 Plántulas). *Plántulas Forestales o Maderables. (44 Plántulas) *Plántulas Musáceas (278 Plántula) *Frijol (20 Kg).	*Fertilizantes (Roca fosfórica)- 153,06 Kg *Fertilizantes Patenkali) 153,06 Kg *Micorriza 153,06 Kg *Acondicionador de suelos 5.973,47 Kg. *Trichoderma 1,00 Kg *Equipo para manejo de arvenses Guadaña) 1,0Unidad.	Plateo Ahoyado Zoqueo Fertilización. Siembra Reposición o replante Control Fitosanitario y de malezas. Limpias. Transporte mayor y menor. Asistencia Técnica. (Profesional Agroecológico- Gestor de Campo)

CORPOCESAR	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN** **FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO**	**PCA-03-F- 39** **VERSIÓN:** 1.0 **FECHA:** 24/10/2025

Se deja constancia de que lo descrito en la presente **acta de concertación**, es aceptado a satisfacción por el beneficiario y que este se compromete a salvaguardar, realizando seguimiento, atención a las especies establecidas dentro de su predio y el sostenimiento de las mismas, así como reportar inmediatamente a CORPOCESAR, los conatos de incendio (entendido como fuego de pequeña magnitud) o los incendios, así como cualquier novedad que se presente en la zona establecida.

AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES
CC. 51.610.167 de Bogotá D.C
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI

Eliceo Molina

Nombre beneficiario: Eliseo Molina Zamudio
CC. 1050064756 de San Martín de Loba
Vereda La Duda

Mónica Inés González Thomas.
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental.
Supervisora – CORPOCESAR.

Anexos:
- Documento de Identidad del Beneficiario
-Documento que acredita la propiedad o Tenencia del Predio
-Georreferenciación de área a intervenir.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.050.064.756
MOLINA ZAMUDIO
APELLIDOS
ELISEO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1984
SAN MARTIN DE LOBA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
06-FEB-2006 SAN MARTIN DE LOBA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
P-0508200-30149252-M-1050064756-20060615 01467 061884 02 167347725

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

ACTA DE CONCERTACIÓN

En la vereda Fernambuco del municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar, el día 30 de Diciembre del 2025, se reunieron, AURORA MARIA IZQUIERDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 51.610.167 de BOGOTA DC, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI , **MONICA INÉS GONZALEZ THOMAS**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en su calidad de Supervisora y Ciro Antonio Jaime Acosta (**En calidad de beneficiario**), identificado con cedula de ciudadanía N° 18934277 expedida en Agustín Codazzi, en el marco del Convenio N° **19-7-0008-0-2025** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, con el fin de concertar las actividades contempladas en dicho convenio, las cuales se realizarán en el predio San Martin ubicado en la vereda Fernambuco del municipio AGUSTÍN CODAZZI.

Las actividades concertadas que se realizaran dentro del marco del proyecto son las siguientes:

1. **RESTAURACION ECOLOGICA**: ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO ESQUEMAS AGROFORESTALES-RENOVACIÓN POR ZOCA.

Área destinada por el beneficiario para la restauración (Ha)	Numero de plántulas de especies forestales nativas	Insumos aportados por el proyecto	Mano de obra aportada por el proyecto.
Una (1) Hectárea.	*Plántulas de café (765 Plántulas). *Plántulas Forestales o Maderables. (44 Plántulas) *Plántulas Musáceas (278 Plántula) *Frijol (20 Kg).	*Fertilizantes (Roca fosfórica)- 153,06 Kg *Fertilizantes Patenkali) 153,06 Kg *Micorriza 153,06 Kg *Acondicionador de suelos 5.973,47 Kg. *Trichoderma 1,00 Kg *Equipo para manejo de arvenses Guadaña) 1,0Unidad.	Plateo Ahoyado Zoqueo Fertilización. Siembra Reposición o replante Control Fitosanitario y de malezas. Limpias. Transporte mayor y menor. Asistencia Técnica. (Profesional Agroecológico- Gestor de Campo)

CORPOCESAR	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN** **FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO**	**PCA-03-F- 39** **VERSIÓN:** 1.0 **FECHA:** 24/10/2025

Se deja constancia de que lo descrito en la presente **acta de concertación**, es aceptado a satisfacción por el beneficiario y que este se compromete a salvaguardar, realizando seguimiento, atención a las especies establecidas dentro de su predio y el sostenimiento de las mismas, así como reportar inmediatamente a CORPOCESAR, los conatos de incendio (entendido como fuego de pequeña magnitud) o los incendios, así como cualquier novedad que se presente en la zona establecida.


AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES
CC. 51.610.167 de Bogotá D.C
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI

Ciro Antonio Jaimes

Nombre beneficiario: Ciro Antonio Jaime Acosta
CC. 18934277 de Agustín Codazzi
Vereda Fernambuco

Mónica Inés González Thomas.
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental.
Supervisora – CORPOCESAR.

Anexos:
- Documento de Identidad del Beneficiario
-Documento que acredita la propiedad o Tenencia del Predio
-Georreferenciación de área a intervenir.

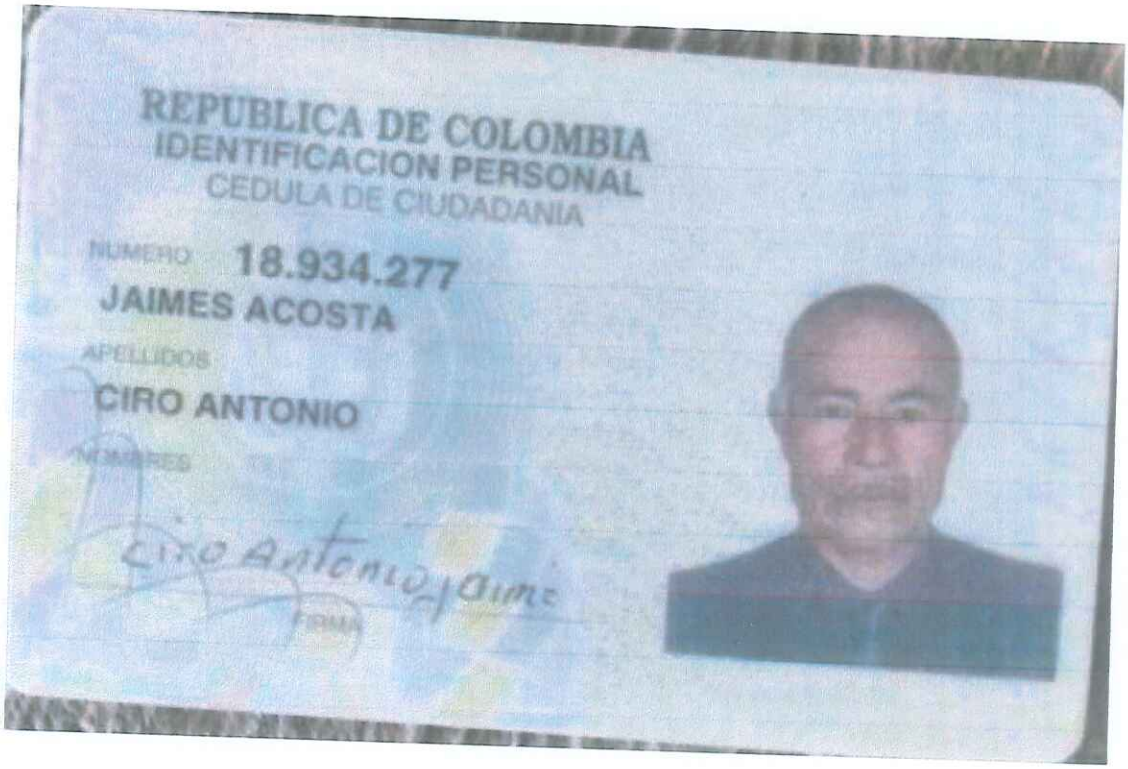

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 18.934.277
JAIMES ACOSTA
APELLIDOS
CIRO ANTONIO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-JUL-1953
CONVENCION
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
09-SEP-1976 AGUSTIN CODAZZI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1215000-00196083-M-0018934277-20091111 0017929166A 1 26163480

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

ACTA DE CONCERTACIÓN

En la vereda San Jacinto del municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar, el día 30 de Diciembre del 2025, se reunieron, AURORA MARIA IZQUIERDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 51.610.167 de BOGOTA DC, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI , **MONICA INÉS GONZALEZ THOMAS**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en su calidad de Supervisora y María Lizeth Hernandez Gómez (**En calidad de beneficiario**), identificado con cedula de ciudadanía N° 49698320 expedida en Agustín Codazzi, en el marco del Convenio N° **19-7-0008-0-2025** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, con el fin de concertar las actividades contempladas en dicho convenio, las cuales se realizarán en el predio La Montañita ubicado en la vereda San Jacinto del municipio AGUSTÍN CODAZZI.

Las actividades concertadas que se realizaran dentro del marco del proyecto son las siguientes:

1. **RESTAURACION ECOLOGICA**: ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO ESQUEMAS AGROFORESTALES-RENOVACIÓN POR ZOCA.

Área destinada por el beneficiario para la restauración (Ha)	Numero de plántulas de especies forestales nativas	Insumos aportados por el proyecto	Mano de obra aportada por el proyecto.
Una (1) Hectárea.	*Plántulas de café (765 Plántulas). *Plántulas Forestales o Maderables. (44 Plántulas) *Plántulas Musáceas (278 Plántula) *Frijol (20 Kg).	*Fertilizantes (Roca fosfórica)- 153,06 Kg *Fertilizantes Patenkali) 153,06 Kg *Micorriza 153,06 Kg *Acondicionador de suelos 5.973,47 Kg. *Trichoderma 1,00 Kg *Equipo para manejo de arvenses Guadaña) 1,0Unidad.	Plateo Ahoyado Zoqueo Fertilización. Siembra Reposición o replante Control Fitosanitario y de malezas. Limpias. Transporte mayor y menor. Asistencia Técnica. (Profesional Agroecológico- Gestor de Campo)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

Se deja constancia de que lo descrito en la presente **acta de concertación**, es aceptado a satisfacción por el beneficiario y que este se compromete a salvaguardar, realizando seguimiento, atención a las especies establecidas dentro de su predio y el sostenimiento de las mismas, así como reportar inmediatamente a CORPOCESAR, los conatos de incendio (entendido como fuego de pequeña magnitud) o los incendios, así como cualquier novedad que se presente en la zona establecida.

AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES
CC. 51.610.167 de Bogotá D.C
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI

Nombre beneficiario: María Lizeth Hernandez Gómez
CC. 49698320 de Agustín Codazzi
Vereda San Jacinto

Mónica Inés González Thomas.
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental.
Supervisora – CORPOCESAR.

Anexos:
-Documento de Identidad del Beneficiario
-Documento que acredita la propiedad o Tenencia del Predio
-Georreferenciación de área a intervenir.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 49.698.320
HERNANDEZ GOMEZ
APELLIDOS
MARIA LIZETH
NOMBRES

María Lizeth Hernandez G
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-AGO-1974
AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

23-JUN-2000 AGUSTIN CODAZZI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
HERNÁN PENAGOS GIRALDO

A-1215000-01414123-F-0049698320-20240118 0138236365A 1 8510554176

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

ACTA DE CONCERTACIÓN

En la vereda El Jardín del municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar, el día 30 de Diciembre del 2025, se reunieron, AURORA MARIA IZQUIERDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 51.610.167 de BOGOTA DC, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI , **MONICA INÉS GONZALEZ THOMAS**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en su calidad de Supervisora y Uriel Montejo Sarmiento (**En calidad de beneficiario**), identificado con cedula de ciudadanía N° 18955558 expedida en Agustín Codazzi, en el marco del Convenio N° **19-7-0008-0-2025** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, con el fin de concertar las actividades contempladas en dicho convenio, las cuales se realizarán en el predio La Esmeralda ubicado en la vereda El Jardín del municipio AGUSTÍN CODAZZI.

Las actividades concertadas que se realizaran dentro del marco del proyecto son las siguientes:

1. **RESTAURACION ECOLOGICA**: ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO ESQUEMAS AGROFORESTALES-RENOVACIÓN POR ZOCA.

Área destinada por el beneficiario para la restauración (Ha)	Numero de plántulas de especies forestales nativas	Insumos aportados por el proyecto	Mano de obra aportada por el proyecto.
Una (1) Hectárea.	*Plántulas de café (765 Plántulas). *Plántulas Forestales o Maderables. (44 Plántulas) *Plántulas Musáceas (278 Plántula) *Frijol (20 Kg).	*Fertilizantes (Roca fosfórica)- 153,06 Kg *Fertilizantes Patenkali) 153,06 Kg *Micorriza 153,06 Kg *Acondicionador de suelos 5.973,47 Kg. *Trichoderma 1,00 Kg *Equipo para manejo de arvenses Guadaña) 1,0Unidad.	Plateo Ahoyado Zoqueo Fertilización. Siembra Reposición o replante Control Fitosanitario y de malezas. Limpias. Transporte mayor y menor. Asistencia Técnica. (Profesional Agroecológico- Gestor de Campo)

182

CORPOCESAR	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN** **FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO**	**PCA-03-F- 39** **VERSIÓN:** 1.0 **FECHA:** 24/10/2025

Se deja constancia de que lo descrito en la presente **acta de concertación**, es aceptado a satisfacción por el beneficiario y que este se compromete a salvaguardar, realizando seguimiento, atención a las especies establecidas dentro de su predio y el sostenimiento de las mismas, así como reportar inmediatamente a CORPOCESAR, los conatos de incendio (entendido como fuego de pequeña magnitud) o los incendios, así como cualquier novedad que se presente en la zona establecida.

AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES
CC. 51.610.167 de Bogotá D.C
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI

Nombre beneficiario: Uriel Montejo Sarmiento
CC. 18955558 de Agustín Codazzi
Vereda El Jardín

Mónica Inés González Thomas.
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental.
Supervisora – CORPOCESAR.

Anexos:
-Documento de Identidad del Beneficiario
-Documento que acredita la propiedad o Tenencia del Predio
-Georreferenciación de área a intervenir.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 18.955.558
MONTEJO SARMIENTO
APELLIDOS
URIEL
NOMBRES

FIRMA

Escaneado con CamScanner



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-NOV-1978
LA PAZ
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
28-NOV-1997 AGUSTIN CODAZZI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1215000-01115872-M-0018955558-20191127 0069095362A 1 4725742373

Escaneado con CamScanner

CORPOCESAR	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN** **FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO**	**PCA-03-F- 39** **VERSIÓN:** 1.0 **FECHA:** 24/10/2025

ACTA DE CONCERTACIÓN

En la vereda El Jardín del municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar, el día 30 de Diciembre del 2025, se reunieron, AURORA MARIA IZQUIERDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 51.610.167 de BOGOTA DC, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI , **MONICA INÉS GONZALEZ THOMAS**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en su calidad de Supervisora y Emel Carrillo Gonzalez (**En calidad de beneficiario**), identificado con cedula de ciudadanía N° 77154684 expedida en Agustín Codazzi, en el marco del Convenio N° **19-7-0008-0-2025** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, con el fin de concertar las actividades contempladas en dicho convenio, las cuales se realizarán en el predio El Porvenir ubicado en la vereda El Jardín del municipio AGUSTÍN CODAZZI.

Las actividades concertadas que se realizaran dentro del marco del proyecto son las siguientes:

1. **RESTAURACION ECOLOGICA**: ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO ESQUEMAS AGROFORESTALES-RENOVACIÓN POR ZOCA.

Área destinada por el beneficiario para la restauración (Ha)	Numero de plántulas de especies forestales nativas	Insumos aportados por el proyecto	Mano de obra aportada por el proyecto.
Una (1) Hectárea.	*Plántulas de café (765 Plántulas). *Plántulas Forestales o Maderables. (44 Plántulas) *Plántulas Musáceas (278 Plántula) *Frijol (20 Kg).	*Fertilizantes (Roca fosfórica)- 153,06 Kg *Fertilizantes Patenkali) 153,06 Kg *Micorriza 153,06 Kg *Acondicionador de suelos 5.973,47 Kg. *Trichoderma 1,00 Kg *Equipo para manejo de arvenses Guadaña) 1,0Unidad.	Plateo Ahoyado Zoqueo Fertilización. Siembra Reposición o replante Control Fitosanitario y de malezas. Limpias. Transporte mayor y menor. Asistencia Técnica. (Profesional Agroecológico- Gestor de Campo)

CORPOCESAR	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN** **FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO**	**PCA-03-F- 39** **VERSIÓN:** 1.0 **FECHA:** 24/10/2025

Se deja constancia de que lo descrito en la presente **acta de concertación**, es aceptado a satisfacción por el beneficiario y que este se compromete a salvaguardar, realizando seguimiento, atención a las especies establecidas dentro de su predio y el sostenimiento de las mismas, así como reportar inmediatamente a CORPOCESAR, los conatos de incendio (entendido como fuego de pequeña magnitud) o los incendios, así como cualquier novedad que se presente en la zona establecida.

AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES
CC. 51.610.167 de Bogotá D.C
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI

Nombre beneficiario: Emel Carrillo Gonzalez
CC. 77154684 de Agustín Codazzi
Vereda El Jardín

Mónica Inés González Thomas.
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental.
Supervisora – CORPOCESAR.

Anexos:
- Documento de Identidad del Beneficiario
-Documento que acredita la propiedad o Tenencia del Predio
-Georreferenciación de área a intervenir.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 77.154.68

CARRILLO GONZA

APELLIDOS

EMEL

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-OCT-1970

AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

11-MAY-1989 AGUSTIN CODAZZI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1215000-00243248-M-0077154684-20100702 0022547314A 2 8050705518

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

ACTA DE CONCERTACIÓN

En la vereda Makenkal del municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar, el día 30 de Diciembre del 2025, se reunieron, AURORA MARIA IZQUIERDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 51.610.167 de BOGOTA DC, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI , **MONICA INÉS GONZALEZ THOMAS**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en su calidad de Supervisora y Oscar Orlando Lozano Wilches (**En calidad de beneficiario**), identificado con cedula de ciudadanía N° 77153085 expedida en Agustín Codazzi, en el marco del Convenio N° **19-7-0008-0-2025** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, con el fin de concertar las actividades contempladas en dicho convenio, las cuales se realizarán en el predio Tres Filos ubicado en la vereda Makenkal del municipio AGUSTÍN CODAZZI.

Las actividades concertadas que se realizaran dentro del marco del proyecto son las siguientes:

1. **RESTAURACION ECOLOGICA**: ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO ESQUEMAS AGROFORESTALES-RENOVACIÓN POR ZOCA.

Área destinada por el beneficiario para la restauración (Ha)	Numero de plántulas de especies forestales nativas	Insumos aportados por el proyecto	Mano de obra aportada por el proyecto.
Una (1) Hectárea.	*Plántulas de café (765 Plántulas). *Plántulas Forestales o Maderables. (44 Plántulas) *Plántulas Musáceas (278 Plántula) *Frijol (20 Kg).	*Fertilizantes (Roca fosfórica)- 153,06 Kg *Fertilizantes Patenkali) 153,06 Kg *Micorriza 153,06 Kg *Acondicionador de suelos 5.973,47 Kg. *Trichoderma 1,00 Kg *Equipo para manejo de arvenses Guadaña) 1,0Unidad.	Plateo Ahoyado Zoqueo Fertilización. Siembra Reposición o replante Control Fitosanitario y de malezas. Limpias. Transporte mayor y menor. Asistencia Técnica. (Profesional Agroecológico- Gestor de Campo)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

Se deja constancia de que lo descrito en la presente **acta de concertación**, es aceptado a satisfacción por el beneficiario y que este se compromete a salvaguardar, realizando seguimiento, atención a las especies establecidas dentro de su predio y el sostenimiento de las mismas, así como reportar inmediatamente a CORPOCESAR, los conatos de incendio (entendido como fuego de pequeña magnitud) o los incendios, así como cualquier novedad que se presente en la zona establecida.

AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES
CC. 51.610.167 de Bogotá D.C
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI

Oscar O. Lozano

Nombre beneficiario: Oscar Orlando Lozano Wilches
CC. 77153085 de Agustín Codazzi
Vereda Makenkal

Mónica Inés González Thomas.
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental.
Supervisora – CORPOCESAR.

Anexos:
- Documento de Identidad del Beneficiario
-Documento que acredita la propiedad o Tenencia del Predio
-Georreferenciación de área a intervenir.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
77.153.085
LOZANO WILCHES
OSCAR ORLANDO


FECHA DE NACIMIENTO 24-JUN-1968
AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)
1.68
O+
M
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
18-FEB-1987 AGUSTIN CODAZZI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

ACTA DE CONCERTACIÓN

En la vereda Makenkal del municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar, el día 30 de Diciembre del 2025, se reunieron, AURORA MARIA IZQUIERDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 51.610.167 de BOGOTA DC, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI , **MONICA INÉS GONZALEZ THOMAS**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en su calidad de Supervisora y Nelson Salas Porras (**En calidad de beneficiario**), identificado con cedula de ciudadanía N° 77151901 expedida en Agustín Codazzi, en el marco del Convenio N° **19-7-0008-0-2025** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, con el fin de concertar las actividades contempladas en dicho convenio, las cuales se realizarán en el predio Danelis ubicado en la vereda Makenkal del municipio AGUSTÍN CODAZZI.

Las actividades concertadas que se realizaran dentro del marco del proyecto son las siguientes:

1. **RESTAURACION ECOLOGICA**: ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO ESQUEMAS AGROFORESTALES-RENOVACIÓN POR ZOCA.

Área destinada por el beneficiario para la restauración (Ha)	Numero de plántulas de especies forestales nativas	Insumos aportados por el proyecto	Mano de obra aportada por el proyecto.
Una (1) Hectárea.	*Plántulas de café (765 Plántulas). *Plántulas Forestales o Maderables. (44 Plántulas) *Plántulas Musáceas (278 Plántula) *Frijol (20 Kg).	*Fertilizantes (Roca fosfórica)- 153,06 Kg *Fertilizantes Patenkali) 153,06 Kg *Micorriza 153,06 Kg *Acondicionador de suelos 5.973,47 Kg. *Trichoderma 1,00 Kg *Equipo para manejo de arvenses Guadaña) 1,0Unidad.	Plateo Ahoyado Zoqueo Fertilización. Siembra Reposición o replante Control Fitosanitario y de malezas. Limpias. Transporte mayor y menor. Asistencia Técnica. (Profesional Agroecológico- Gestor de Campo)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

Se deja constancia de que lo descrito en la presente **acta de concertación**, es aceptado a satisfacción por el beneficiario y que este se compromete a salvaguardar, realizando seguimiento, atención a las especies establecidas dentro de su predio y el sostenimiento de las mismas, así como reportar inmediatamente a CORPOCESAR, los conatos de incendio (entendido como fuego de pequeña magnitud) o los incendios, así como cualquier novedad que se presente en la zona establecida.

AURÓRA MARIA IZQUIERDO TORRES
CC. 51.610.167 de Bogotá D.C
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI

Nombre beneficiario: Nelson Salas Porras
CC. 77151901 de Agustín Codazzi
Vereda Makenkal

Mónica Inés González Thomas.
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental.
Supervisora – CORPOCESAR.

Anexos:
-Documento de Identidad del Beneficiario
-Documento que acredita la propiedad o Tenencia del Predio
-Georreferenciación de área a intervenir.

192


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
77.151.901
SALAS PORRAS
NELSON


07-MAR-1966
AGUSTIN CODAZZI
1.68
O+
M
15-ENE-1980 AGUSTIN CODAZZI

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	PCA-03-F- 39 VERSIÓN: 1.0 FECHA: 24/10/2025

ACTA DE CONCERTACIÓN

En la vereda Makenkal del municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar, el día 30 de Diciembre del 2025, se reunieron, AURORA MARIA IZQUIERDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 51.610.167 de BOGOTA DC, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI , **MONICA INÉS GONZALEZ THOMAS**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en su calidad de Supervisora y Carlos Humberto Leal Guerrero (**En calidad de beneficiario**), identificado con cedula de ciudadanía N° 18930372 expedida en Agustín Codazzi, en el marco del Convenio N° **19-7-0008-0-2025** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, con el fin de concertar las actividades contempladas en dicho convenio, las cuales se realizarán en el predio Las Delicias ubicado en la vereda Makenkal del municipio AGUSTÍN CODAZZI.

Las actividades concertadas que se realizaran dentro del marco del proyecto son las siguientes:

1. **RESTAURACION ECOLOGICA**: ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO ESQUEMAS AGROFORESTALES-RENOVACIÓN POR ZOCA.

Área destinada por el beneficiario para la restauración (Ha)	Numero de plántulas de especies forestales nativas	Insumos aportados por el proyecto	Mano de obra aportada por el proyecto.
Una (1) Hectárea.	*Plántulas de café (765 Plántulas). *Plántulas Forestales o Maderables. (44 Plántulas) *Plántulas Musáceas (278 Plántula) *Frijol (20 Kg).	*Fertilizantes (Roca fosfórica)- 153,06 Kg *Fertilizantes Patenkali) 153,06 Kg *Micorriza 153,06 Kg *Acondicionador de suelos 5.973,47 Kg. *Trichoderma 1,00 Kg *Equipo para manejo de arvenses Guadaña) 1,0Unidad.	Plateo Ahoyado Zoqueo Fertilización. Siembra Reposición o replante Control Fitosanitario y de malezas. Limpias. Transporte mayor y menor. Asistencia Técnica. (Profesional Agroecológico- Gestor de Campo)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

Se deja constancia de que lo descrito en la presente **acta de concertación**, es aceptado a satisfacción por el beneficiario y que este se compromete a salvaguardar, realizando seguimiento, atención a las especies establecidas dentro de su predio y el sostenimiento de las mismas, así como reportar inmediatamente a CORPOCESAR, los conatos de incendio (entendido como fuego de pequeña magnitud) o los incendios, así como cualquier novedad que se presente en la zona establecida.

AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES
CC. 51.610.167 de Bogotá D.C
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI

Nombre beneficiario: Carlos Humberto Leal Guerrero
CC. 18930372 de Agustín Codazzi
Vereda Makenkal

Mónica Inés González Thomas.
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental.
Supervisora – CORPOCESAR.

Anexos:
-Documento de Identidad del Beneficiario
-Documento que acredita la propiedad o Tenencia del Predio
-Georreferenciación de área a intervenir.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 18.930.372

LEAL

APELLIDOS

CARLOS HUMBERTO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-DIC-1945

CHARTA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

19-ENE-1970 AGUSTIN CODAZZI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1215000-00143600-M-0018930372-20061226 0008953304A 1

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

ACTA DE CONCERTACIÓN

En la vereda Makenkal del municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar, el día 30 de Diciembre del 2025, se reunieron, AURORA MARIA IZQUIERDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 51.610.167 de BOGOTA DC, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI , **MONICA INÉS GONZALEZ THOMAS**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en su calidad de Supervisora y Gustavo Cañizares Rizo (**En calidad de beneficiario**), identificado con cedula de ciudadanía N° 77153155 expedida en Agustín Codazzi, en el marco del Convenio N° **19-7-0008-0-2025** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, con el fin de concertar las actividades contempladas en dicho convenio, las cuales se realizarán en el predio La Esperanza ubicado en la vereda Makenkal del municipio AGUSTÍN CODAZZI.

Las actividades concertadas que se realizaran dentro del marco del proyecto son las siguientes:

1. **RESTAURACION ECOLOGICA**: ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO ESQUEMAS AGROFORESTALES-RENOVACIÓN POR ZOCA.

Área destinada por el beneficiario para la restauración (Ha)	Numero de plántulas de especies forestales nativas	Insumos aportados por el proyecto	Mano de obra aportada por el proyecto.
Una (1) Hectárea.	*Plántulas de café (765 Plántulas). *Plántulas Forestales o Maderables. (44 Plántulas) *Plántulas Musáceas (278 Plántula) *Frijol (20 Kg).	*Fertilizantes (Roca fosfórica)- 153,06 Kg *Fertilizantes Patenkali) 153,06 Kg *Micorriza 153,06 Kg *Acondicionador de suelos 5.973,47 Kg. *Trichoderma 1,00 Kg *Equipo para manejo de arvenses Guadaña) 1,0Unidad.	Plateo Ahoyado Zoqueo Fertilización. Siembra Reposición o replante Control Fitosanitario y de malezas. Limpias. Transporte mayor y menor. Asistencia Técnica. (Profesional Agroecológico- Gestor de Campo)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

Se deja constancia de que lo descrito en la presente **acta de concertación**, es aceptado a satisfacción por el beneficiario y que este se compromete a salvaguardar, realizando seguimiento, atención a las especies establecidas dentro de su predio y el sostenimiento de las mismas, así como reportar inmediatamente a CORPOCESAR, los conatos de incendio (entendido como fuego de pequeña magnitud) o los incendios, así como cualquier novedad que se presente en la zona establecida.

AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES
CC. 51.610.167 de Bogotá D.C
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI

GUSTAVO CAÑIZARES

Nombre beneficiario: Gustavo Cañizares Rizo
CC. 77153155 de Agustín Codazzi
Vereda Makenkal

Mónica Inés González Thomas.
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental.
Supervisora – CORPOCESAR.

Anexos:
-Documento de Identidad del Beneficiario
-Documento que acredita la propiedad o Tenencia del Predio
-Georreferenciación de área a intervenir.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 77.153.155

CAÑIZARES RIZO

APELLIDOS

GUSTAVO

NOMBRES

FIRMA



Escaneado con CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-AGO-1968

AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

20-MAR-1987 AGUSTIN CODAZZI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1215000-00132795-M-0077153155-20081202 0007357006A 1 8050002278

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

ACTA DE CONCERTACIÓN

En la vereda Las Vegas del municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar, el día 30 de Diciembre del 2025, se reunieron, AURORA MARIA IZQUIERDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 51.610.167 de BOGOTA DC, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI , **MONICA INÉS GONZALEZ THOMAS**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en su calidad de Supervisora y Melba Isabel Rodríguez Buelvas (**En calidad de beneficiario**), identificado con cedula de ciudadanía N° 26052209 expedida en Sahagun, en el marco del Convenio N° **19-7-0008-0-2025** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, con el fin de concertar las actividades contempladas en dicho convenio, las cuales se realizarán en el predio Las Flores ubicado en la vereda Las Vegas del municipio AGUSTÍN CODAZZI.

Las actividades concertadas que se realizaran dentro del marco del proyecto son las siguientes:

1. **RESTAURACION ECOLOGICA**: ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO ESQUEMAS AGROFORESTALES-RENOVACIÓN POR ZOCA.

Área destinada por el beneficiario para la restauración (Ha)	Numero de plántulas de especies forestales nativas	Insumos aportados por el proyecto	Mano de obra aportada por el proyecto.
Una (1) Hectárea.	*Plántulas de café (765 Plántulas). *Plántulas Forestales o Maderables. (44 Plántulas) *Plántulas Musáceas (278 Plántula) *Frijol (20 Kg).	*Fertilizantes (Roca fosfórica)- 153,06 Kg *Fertilizantes Patenkali) 153,06 Kg *Micorriza 153,06 Kg *Acondicionador de suelos 5.973,47 Kg. *Trichoderma 1,00 Kg *Equipo para manejo de arvenses Guadaña) 1,0Unidad.	Plateo Ahoyado Zoqueo Fertilización. Siembra Reposición o replante Control Fitosanitario y de malezas. Limpias. Transporte mayor y menor. Asistencia Técnica. (Profesional Agroecológico- Gestor de Campo)

200

CORPOCESAR	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN** **FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO**	**PCA-03-F- 39** **VERSIÓN:** 1.0 **FECHA:** 24/10/2025

Se deja constancia de que lo descrito en la presente **acta de concertación**, es aceptado a satisfacción por el beneficiario y que este se compromete a salvaguardar, realizando seguimiento, atención a las especies establecidas dentro de su predio y el sostenimiento de las mismas, así como reportar inmediatamente a CORPOCESAR, los conatos de incendio (entendido como fuego de pequeña magnitud) o los incendios, así como cualquier novedad que se presente en la zona establecida.

AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES
CC. 51.610.167 de Bogotá D.C
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI

Melba Rodriguez
Nombre beneficiario: Melba Isabel Rodriguez B
CC. 26052209 de Sahagun
Vereda Las Vegas

Mónica Inés González Thomas.
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental.
Supervisora – CORPOCESAR.

Anexos:
- Documento de Identidad del Beneficiario
-Documento que acredita la propiedad o Tenencia del Predio
-Georreferenciación de área a intervenir.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 26.052.209
RODRIGUEZ BUELVAS

APELLIDOS
MELBA ISABEL

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 28-OCT-1966
PLANETA RICA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

12-JUN-1985 SAHAGUN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1215000-00163662-F-0026052209-20090718 0013693925A 1 8050000473

CORPOCESAR	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN** **FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO**	**PCA-03-F- 39** **VERSIÓN:** 1.0 **FECHA:** 24/10/2025

ACTA DE CONCERTACIÓN

En la vereda Las Vegas del municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar, el día 30 de Diciembre del 2025, se reunieron, AURORA MARIA IZQUIERDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 51.610.167 de BOGOTA DC, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI , **MONICA INÉS GONZALEZ THOMAS**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en su calidad de Supervisora y Heiner Barbosa Rodríguez (**En calidad de beneficiario**), identificado con cedula de ciudadanía N° 77158678 expedida en Agustín Codazzi, en el marco del Convenio N° **19-7-0008-0-2025** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, con el fin de concertar las actividades contempladas en dicho convenio, las cuales se realizarán en el predio Las Flores ubicado en la vereda Las Vegas del municipio AGUSTÍN CODAZZI.

Las actividades concertadas que se realizaran dentro del marco del proyecto son las siguientes:

1. **RESTAURACION ECOLOGICA**: ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO ESQUEMAS AGROFORESTALES-RENOVACIÓN POR ZOCA.

Área destinada por el beneficiario para la restauración (Ha)	Numero de plántulas de especies forestales nativas	Insumos aportados por el proyecto	Mano de obra aportada por el proyecto.
Una (1) Hectárea.	*Plántulas de café (765 Plántulas). *Plántulas Forestales o Maderables. (44 Plántulas) *Plántulas Musáceas (278 Plántula) *Frijol (20 Kg).	*Fertilizantes (Roca fosfórica)- 153,06 Kg *Fertilizantes Patenkali) 153,06 Kg *Micorriza 153,06 Kg *Acondicionador de suelos 5.973,47 Kg. *Trichoderma 1,00 Kg *Equipo para manejo de arvenses Guadaña) 1,0Unidad.	Plateo Ahoyado Zoqueo Fertilización. Siembra Reposición o replante Control Fitosanitario y de malezas. Limpias. Transporte mayor y menor. Asistencia Técnica. (Profesional Agroecológico- Gestor de Campo)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

Se deja constancia de que lo descrito en la presente **acta de concertación**, es aceptado a satisfacción por el beneficiario y que este se compromete a salvaguardar, realizando seguimiento, atención a las especies establecidas dentro de su predio y el sostenimiento de las mismas, así como reportar inmediatamente a CORPOCESAR, los conatos de incendio (entendido como fuego de pequeña magnitud) o los incendios, así como cualquier novedad que se presente en la zona establecida.

AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES
CC. 51.610.167 de Bogotá D.C
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI

Nombre beneficiario: Heiner Barbosa Rodríguez
CC. 77158678 de Agustín Codazzi
Vereda Las Vegas

Mónica Inés González Thomas.
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental.
Supervisora – CORPOCESAR.

Anexos:
- Documento de Identidad del Beneficiario
-Documento que acredita la propiedad o Tenencia del Predio
-Georreferenciación de área a intervenir.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 77.158.678

BARBOSA RODRIGUEZ
APELLIDOS

HEINER
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-NOV-1974
OCAÑA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

20-DIC-1994 AGUSTIN CODAZZI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1215099-70166746-M-0077158678-20071109 01824 07313N 02 228746501

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

ACTA DE CONCERTACIÓN

En la vereda Zorrocuco del municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar, el día 30 de Diciembre del 2025, se reunieron, AURORA MARIA IZQUIERDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 51.610.167 de BOGOTA DC, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI , **MONICA INÉS GONZALEZ THOMAS**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en su calidad de Supervisora y Albeiro Florez Carrillo (**En calidad de beneficiario**), identificado con cedula de ciudadanía N° 77159197 expedida en Agustín Codazzi, en el marco del Convenio N° **19-7-0008-0-2025** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, con el fin de concertar las actividades contempladas en dicho convenio, las cuales se realizarán en el predio La Planadas ubicado en la vereda Zorrocuco del municipio AGUSTÍN CODAZZI.

Las actividades concertadas que se realizaran dentro del marco del proyecto son las siguientes:

1. **RESTAURACION ECOLOGICA**: ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO ESQUEMAS AGROFORESTALES-RENOVACIÓN POR ZOCA.

Área destinada por el beneficiario para la restauración (Ha)	Numero de plántulas de especies forestales nativas	Insumos aportados por el proyecto	Mano de obra aportada por el proyecto.
Una (1) Hectárea.	*Plántulas de café (765 Plántulas). *Plántulas Forestales o Maderables. (44 Plántulas) *Plántulas Musáceas (278 Plántula) *Frijol (20 Kg).	*Fertilizantes (Roca fosfórica)- 153,06 Kg *Fertilizantes Patenkali) 153,06 Kg *Micorriza 153,06 Kg *Acondicionador de suelos 5.973,47 Kg. *Trichoderma 1,00 Kg *Equipo para manejo de arvenses Guadaña) 1,0Unidad.	Plateo Ahoyado Zoqueo Fertilización. Siembra Reposición o replante Control Fitosanitario y de malezas. Limpias. Transporte mayor y menor. Asistencia Técnica. (Profesional Agroecológico- Gestor de Campo)

206

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025


Se deja constancia de que lo descrito en la presente **acta de concertación**, es aceptado a satisfacción por el beneficiario y que este se compromete a salvaguardar, realizando seguimiento, atención a las especies establecidas dentro de su predio y el sostenimiento de las mismas, así como reportar inmediatamente a CORPOCESAR, los conatos de incendio (entendido como fuego de pequeña magnitud) o los incendios, así como cualquier novedad que se presente en la zona establecida.


AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES
CC. 51.610.167 de Bogotá D.C
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI

Nombre beneficiario: Albeiro Florez Carrillo
CC. 77159197 de Agustín Codazzi
Vereda Zorrocuco

Mónica Inés González Thomas.
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental.
Supervisora – CORPOCESAR.

Anexos:
- Documento de Identidad del Beneficiario
-Documento que acredita la propiedad o Tenencia del Predio
-Georreferenciación de área a intervenir.

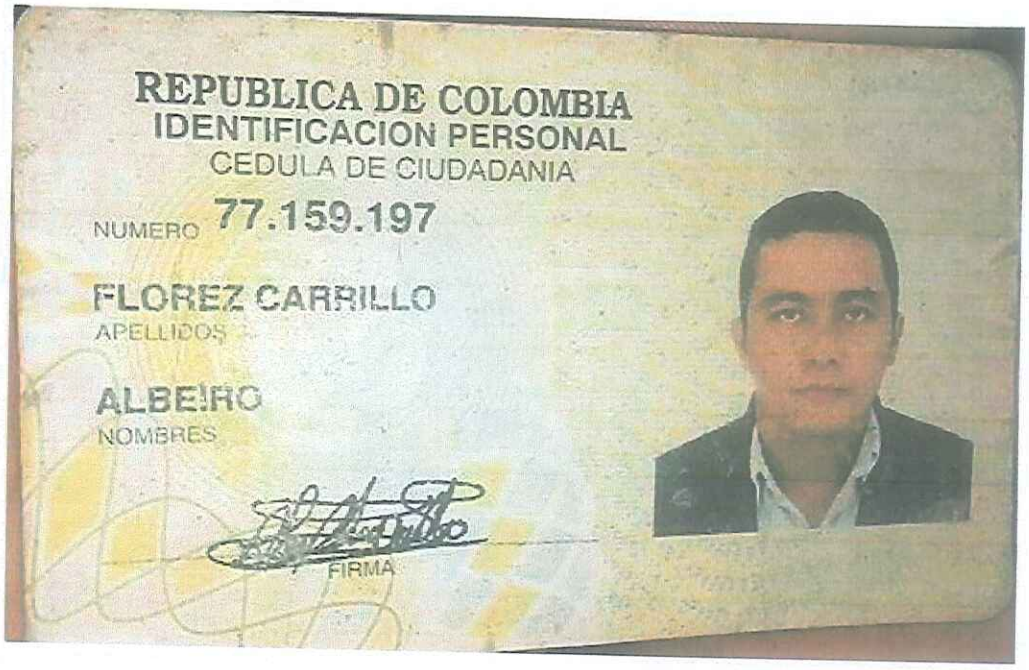
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 77.159.197
FLOREZ CARRILLO
APELLIDOS
ALBEIRO
NOMBRES
FIRMA

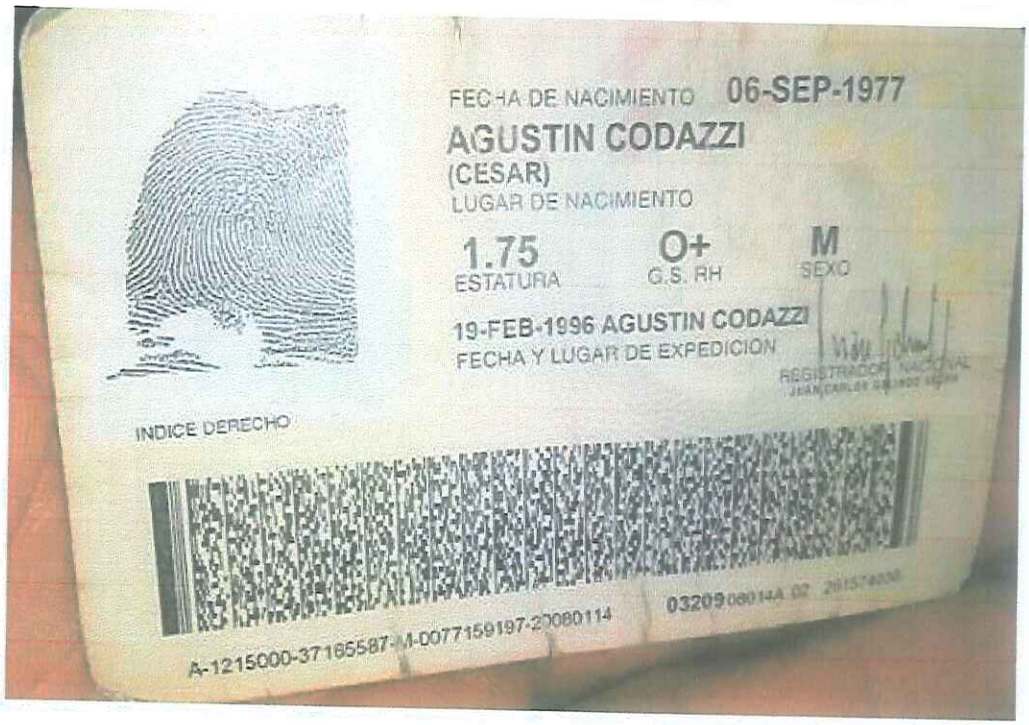
FECHA DE NACIMIENTO 06-SEP-1977
AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
19-FEB-1996 AGUSTIN CODAZZI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1215000-37165587-M-0077159197-20080114
03209

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

ACTA DE CONCERTACIÓN

En la vereda El Jardín del municipio Agustín Codazzi, departamento del Cesar, el día 30 de Diciembre del 2025, se reunieron, AURORA MARIA IZQUIERDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 51.610.167 de BOGOTA DC, en calidad de Representante Legal de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI , **MONICA INÉS GONZALEZ THOMAS**, Subdirectora General Área de Gestión Ambiental, en representación de CORPOCESAR, en su calidad de Supervisora y Anselmo Miranda Herrera (**En calidad de beneficiario**), identificado con cedula de ciudadanía N° 77153173 expedida en Agustín Codazzi, en el marco del Convenio N° **19-7-0008-0-2025** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, con el fin de concertar las actividades contempladas en dicho convenio, las cuales se realizarán en el predio El Recuerdo ubicado en la vereda El Jardín del municipio AGUSTÍN CODAZZI.

Las actividades concertadas que se realizaran dentro del marco del proyecto son las siguientes:

1. **RESTAURACION ECOLOGICA**: ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO ESQUEMAS AGROFORESTALES-RENOVACIÓN POR ZOCA.

Área destinada por el beneficiario para la restauración (Ha)	Numero de plántulas de especies forestales nativas	Insumos aportados por el proyecto	Mano de obra aportada por el proyecto.
Una (1) Hectárea.	*Plántulas de café (765 Plántulas). *Plántulas Forestales o Maderables. (44 Plántulas) *Plántulas Musáceas (278 Plántula) *Frijol (20 Kg).	*Fertilizantes (Roca fosfórica)- 153,06 Kg *Fertilizantes Patenkali) 153,06 Kg *Micorriza 153,06 Kg *Acondicionador de suelos 5.973,47 Kg. *Trichoderma 1,00 Kg *Equipo para manejo de arvenses Guadaña) 1,0Unidad.	Plateo Ahoyado Zoqueo Fertilización. Siembra Reposición o replante Control Fitosanitario y de malezas. Limpias. Transporte mayor y menor. Asistencia Técnica. (Profesional Agroecológico- Gestor de Campo)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F- 39
CORPOCESAR	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1.0
	FORMATO ACTA DE CONCERTACIÓN CON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	FECHA: 24/10/2025

Se deja constancia de que lo descrito en la presente **acta de concertación**, es aceptado a satisfacción por el beneficiario y que este se compromete a salvaguardar, realizando seguimiento, atención a las especies establecidas dentro de su predio y el sostenimiento de las mismas, así como reportar inmediatamente a CORPOCESAR, los conatos de incendio (entendido como fuego de pequeña magnitud) o los incendios, así como cualquier novedad que se presente en la zona establecida.

AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES
CC. 51.610.167 de Bogotá D.C
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA - ASOANEI

Anselmo Miranda

Nombre beneficiario: Anselmo Miranda Herrera
CC. 77153173 de Agustín Codazzi
Vereda El Jardín

Mónica Inés González Thomas.
Subdirectora General Área de Gestión Ambiental.
Supervisora – CORPOCESAR.

Anexos:
- Documento de Identidad del Beneficiario
-Documento que acredita la propiedad o Tenencia del Predio
-Georreferenciación de área a intervenir.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 77.153.173
MIRANDA HERRERA

APELLIDOS

ANSELMO

NOMBRES

FIRMA

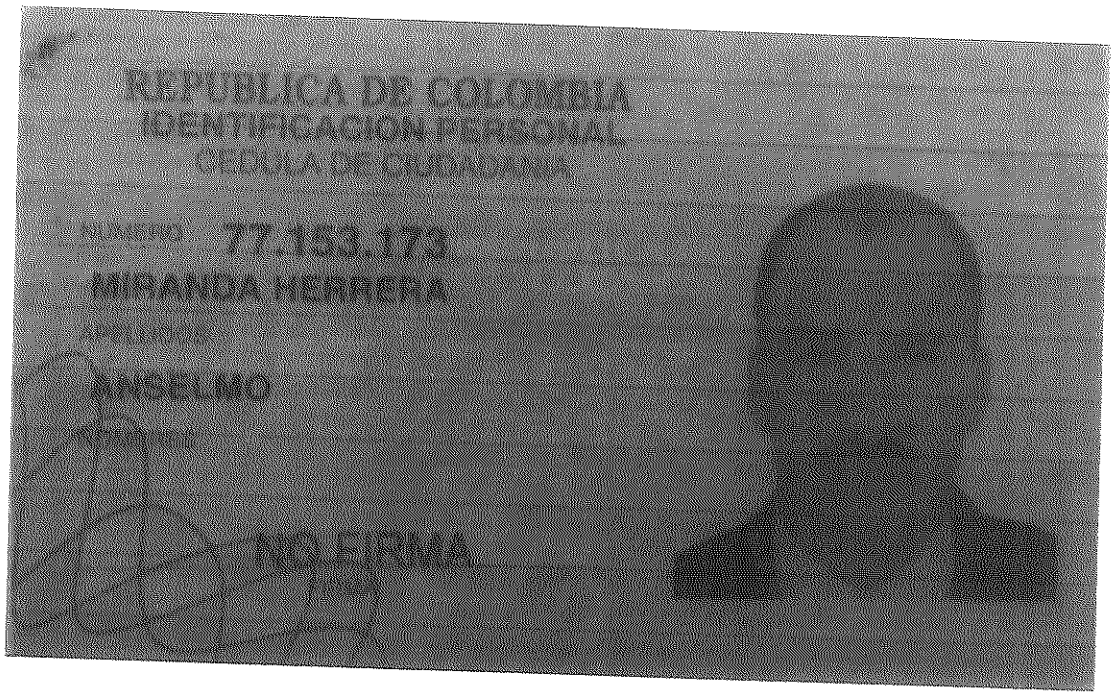



RH
