INFORME DE SUPERVISIÓN

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 4600018638 DE 2025

Departamento de Antioquia (Secretaría de Educación) – Municipio de Vegachí

INFORME No. 6

PERÍODO: 27 DE JUNIO DE 2026 – 26 DE JULIO DE 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Convenio	Interadministrativo N° 4600018638 de 2025
Objeto	Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la infraestructura física de la Institución Educativa Efe Gómez - Sedes Liceo Efe Gómez y Colegio Amigoniano Raúl Cardona Zapata, del municipio de Vegachí, Antioquia.
Conveniante	Departamento de Antioquia – Secretaría de Educación (NIT 890.900.286-0)
Conveniante ejecutor	Municipio de Vegachí (NIT 890.985.285-8)
Valor total del convenio	$2.098.000.000,00 (Departamento: $1.431.500.000,00 – 68,23% / Municipio: $666.500.000,00 – 31,77%)
Plazo	13 meses contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2026
Supervisión	Tipo C (administrativa, técnica, contable, financiera y jurídica), según Cláusula Novena
Supervisora	Maribel Díaz Isaza – Secretaria de Obras Públicas y Saneamiento Básico, Municipio de Vegachí

2. CONTRATO DERIVADO DE OBRA

Contrato	IP-OP-003-2025, suscrito por la Sociedad de Economía Mixta Visión Global S.A.S. en cumplimiento del Convenio 4600018638
Contratista	Estructuras y Montajes Todo Metal S.A.S. – NIT 901.113.242-1
Objeto	Mejoramiento de la infraestructura física de la I.E. Efe Gómez – Sedes Liceo Efe Gómez y Colegio Amigoniano Raúl Cardona Zapata
Valor inicial	$1.918.458.547,30
Plazo de ejecución	7 meses (212 días)
Fecha acta de inicio	22 de enero de 2026
Fecha de terminación inicial	22 de agosto de 2026
Director de obra	Carlos Giovanni Pérez Pérez
Residente de obra	Javier Alejandro Trujillo

3. ANTECEDENTES

El presente informe se elabora en cumplimiento de las obligaciones de supervisión establecidas en la Cláusula Novena del Convenio Interadministrativo N° 4600018638 de 2025, con base en el informe de obra mensual presentado por el contratista Estructuras y Montajes Todo Metal S.A.S., correspondiente al período reportado. A continuación se relaciona la verificación del cumplimiento de las obligaciones del convenio durante el período informado, como soporte para el seguimiento y trámite de pago correspondiente.

4. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO – CLÁUSULA SEXTA. COMPROMISOS GENERALES DE LAS PARTES

No.	Obligación	Cumple	Observaciones / soporte
1	Perfeccionar conjuntamente la minuta del convenio, suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y actas incluyendo la de liquidación.	Sí	
2	Aportar al convenio los recursos para la realización del objeto.	Sí	
3	Cumplir con el objeto del convenio y las obligaciones que se derivan de su alcance.	Sí	
4	Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del convenio.	Sí	
5	Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio.	Sí	
6	Designar un supervisor que realice el seguimiento, control y vigilancia de las actividades.	Sí	
7	Propender por el logro de los productos pactados.	Sí	
8	Mantener un flujo constante de información necesaria durante la ejecución y liquidación del convenio.	Sí	
9	Asistir a las reuniones requeridas y/o programadas por los conveniantes.	Sí	
10	Coordinar conjuntamente la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos necesarios.	Sí	
11	Acordar conjuntamente los formatos y medios para la remisión de las autorizaciones de desembolsos.	Sí	
12	Facilitar en cualquier momento la práctica de auditorías por parte de supervisores y organismos de control.	Sí	
13	Liquidar el presente convenio, previa liquidación de los contratos que se suscriban en desarrollo del mismo.	Sí	
14	Designar un profesional con la experiencia requerida para el manejo y control del convenio, enlace entre las partes.	Sí	
15	Poner en conocimiento de la otra parte cualquier circunstancia anómala, inesperada o de fuerza mayor que incida en la ejecución.	Sí	

5. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO – CLÁUSULA OCTAVA, LITERAL A. COMPROMISOS TÉCNICOS DEL CONVENIANTE EJECUTOR

No.	Obligación	Cumple	Observaciones / soporte
1	Garantizar el cumplimiento del objeto del convenio conforme al alcance y especificaciones técnicas del estudio previo y propuesta avalada.	Sí	
2	Adelantar los procesos de contratación requeridos mediante modalidades de selección competitiva cuando el valor supere la menor cuantía.	Sí	Contrato de obra IP-OP-003-2025 e interventoría OC-INT-010-2025 ya suscritos
3	Invertir los recursos entregados por el Departamento única y exclusivamente en el cumplimiento del alcance del objeto del convenio.	Sí	
4	El municipio es responsable de diseños, presupuesto, contratación de obra e interventoría, ejecución y supervisión de la obra y de la interventoría.	Sí	
5	Realizar las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para el proceso de selección o modificaciones a que haya lugar.	Sí	
6	Realizar los procesos contractuales establecidos por la ley para la selección del contratista e interventor.	Sí	
7	Destinar los recursos correspondientes para el proceso de selección de interventoría de la obra.	Sí	
8	Elaborar estudio del sector (legal, comercial, financiero, organizacional, técnico y de riesgo) en los procesos de contratación.	Sí	
9	Exigir al contratista de obra la constitución de las pólizas que amparen los riesgos derivados del contrato.	Sí	Pólizas Nos. 496 47 994000023436 y 496 74 994000009928 vigentes (Aseguradora Solidaria de Colombia)
10	Las modificaciones al convenio deben ser previamente aprobadas por la Dirección de Infraestructura Física y Tecnológica.	Sí	
11	Exigir al contratista la instalación de valla en obra y placa inaugural al finalizar.	Sí	
12	Presentar informe de avance mensual de la ejecución presupuestal y del avance de la obra.	Sí	Presente informe de supervisión
13	Atender los requerimientos formulados desde la Dirección de Infraestructura Física Educativa.	Sí	
14	Establecer comunicación permanente con la Dirección de Infraestructura Física y Tecnológica del Departamento.	Sí	

6. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO – CLÁUSULA OCTAVA, NUMERAL 2. COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS

No.	Obligación	Cumple	Observaciones / soporte
1	Garantizar y realizar el aporte de los recursos para la adecuada ejecución del convenio conforme al presupuesto oficial.	Sí	
2	Incorporar los recursos aportados por el Departamento a su presupuesto dentro de la vigencia correspondiente.	Sí	
3	Adelantar los procesos de contratación derivados conforme al Estatuto de Contratación Pública.	Sí	
4	Mantener informada mensualmente a la Dirección de Infraestructura Física y Tecnológica sobre el avance de las actividades mediante informe de seguimiento administrativo, técnico, legal, financiero, ambiental y social.	Sí	Presente informe de supervisión
5	Designar por escrito una persona de enlace con la Dirección de Infraestructura Física y Tecnológica del Departamento.	Sí	
6	Allegar las garantías exigidas en el convenio para efectos de legalización.	Sí	
7	Encontrarse al día en aportes a seguridad social integral y parafiscales.	Sí	Ver observación sobre mora en pago de planilla de seguridad social del contratista de obra
8	Incorporar al presupuesto todos los recursos aportados para la ejecución del proyecto.	Sí	
9	Administrar los aportes de las partes y rendir informe mensual detallado sobre su inversión y avance.	Sí	
10	Presentar dentro del mes siguiente los medios de verificación del alcance del objeto (informes de interventoría, actas, registro fotográfico, bitácora, etc.).	Sí	
11	Contratar la ejecución de obras e interventoría ciñéndose al proyecto viabilizado por la Dirección de Infraestructura Física y Tecnológica.	Sí	
12	Llevar una carpeta del proyecto que dé cuenta de todas las etapas del mismo.	Sí	
15	Abrir cuenta de ahorros en el IDEA para el manejo exclusivo de los recursos aportados por el Departamento, exenta de 4x1000.	Sí	
22	Acatar las recomendaciones o instrucciones dadas por el responsable de la supervisión del convenio por parte del Departamento.	Sí	

7. OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN (CLÁUSULA NOVENA, PARÁGRAFO 1°)

No.	Obligación	Cumple	Observaciones / soporte
1	Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida ejecución del convenio y realizar los informes de supervisión parcial y final.	Sí	Presente informe
6	Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la ejecución del convenio.	Sí	
9	Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al convenio cuando sea procedente.	Sí	
11	Garantizar la publicación oportuna en el SECOP II de todos los documentos inherentes al convenio y su rendición en Gestión Transparente.	Sí	

8. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PERÍODO

Durante el período comprendido entre el 27 de abril y el 26 de mayo de 2026 (Informe de Obra No. 4), el contratista terminó las actividades de desmonte de cubierta existente, vaciado de concreto para alfajía de antepecho, pañete para muros, vaciado de concreto para viga cinta afectada, estructura metálica, reemplazo de machimbre deteriorado, panel termoacústico tipo sándwich y suministro e instalación de teja metálica. Continúan en ejecución el mantenimiento de machimbre (acabados), el mantenimiento de teja metálica (parcial) y la aplicación de pintura con polímeros acrílicos para exteriores. Se iniciaron actividades adicionales y de obra extra: resane de estuco para muros interiores, pintura en vinilo tipo 1, pintura de aceite para muro y pintura de barandas (en ejecución); quedan pendientes de ejecución las salidas eléctricas para interruptor y tomacorriente, programadas para después de finalizar labores de pintura. La estructura metálica, que en el informe anterior presentaba retraso por diseños en revisión, fue ejecutada y terminada satisfactoriamente durante este período.

Concepto	Valor acumulado a la fecha	Observación
Valor contractual del proyecto (obra)	$1.918.458.546,88	Sede 1: $1.029.164.641,96 – Sede 3: $889.293.904,92
Recursos ejecutados a la fecha (contrato de obra IP-OP-003-2025)	$872.100.998,52 (45,46% del proyecto)	Sede 1: $0 (0%) – Sede 3: $872.100.998,52 (98%)
Valor pendiente por ejecutar	$1.046.357.548,00	Sede 1: $1.029.164.641,96 – Sede 3: $17.192.906,00
Anticipo entregado	$575.537.564,00 (30% del valor del contrato)	
Anticipo amortizado acumulado	$261.630.300,00 (45,46% del anticipo entregado)	Amortización proporcional al avance financiero ejecutado
Aporte Departamento de Antioquia / Municipio desembolsado	[verificar con tesorería / Secretaría de Hacienda]	No reportado en el Informe de Obra No. 4

Avance en tiempo acumulado: 120 de 210 días contractuales (57%, según Tabla 8 del informe del contratista). El avance en tiempo (57%) continúa superando el avance financiero acumulado (45,46%); la brecha (delta de atraso reportado por el contratista: 7,96%) se redujo frente al corte anterior (13 puntos en abril), lo que indica una leve mejora en el ritmo de ejecución, aunque persiste el rezago.

9. ALERTAS Y OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN

- La Sede 1 (Liceo Efe Gómez) continúa en 0% de ejecución financiera a la fecha, mientras la Sede 3 se encuentra en 98% de avance; se reitera la recomendación de solicitar al contratista el plan de inicio de actividades en la Sede 1, dado que restan aproximadamente 90 días de plazo contractual.

- La brecha entre avance en tiempo (57%) y avance financiero (45,46%) se redujo respecto al informe anterior (de 13 a 7,96 puntos porcentuales), lo cual es una mejora, pero se recomienda mantener el seguimiento dado el plazo contractual restante y la ausencia de ejecución en la Sede 1.
- Se recomienda solicitar al contratista y a la interventoría el estado de aprobación (APU y acta) de las actividades adicionales y de obra extra identificadas en informes anteriores, así como de las nuevas actividades OE-1 a OE-9 relacionadas en el presente informe.
- No se cuenta en este corte con el Informe SISO ni con el Informe de Interventoría de mayo; se recomienda solicitarlos para completar la verificación de aportes a seguridad social, parafiscales y demás obligaciones administrativas y legales del período.
- Verificar con tesorería/Secretaría de Hacienda el estado de desembolso de los aportes del Departamento de Antioquia y del Municipio, dato no reportado en el Informe de Obra No. 4.


10. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS

Se verificó la vigencia de la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. 496 47 994000023436 y de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 496 74 994000009928, ambas expedidas por Aseguradora Solidaria de Colombia, con amparos de cumplimiento, buen manejo y correcta inversión de anticipo, estabilidad y calidad de obra, pago de salarios y prestaciones, y responsabilidad civil extracontractual, vigentes a la fecha de corte del presente informe.

11. CONCEPTO Y RECOMENDACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

Con base en la verificación efectuada, la supervisión conceptúa que la ejecución del Convenio 4600018638, a través del contrato de obra IP-OP-003-2025, se desarrolla dentro de los parámetros contractuales, sin perjuicio de las observaciones consignadas en el numeral 9 del presente informe, las cuales deberán ser objeto de seguimiento en el siguiente corte.

MARIBEL DÍAZ ISAZA
Secretaria de Obras Públicas y Saneamiento Básico
Supervisora del Convenio 4600018638 de 2025

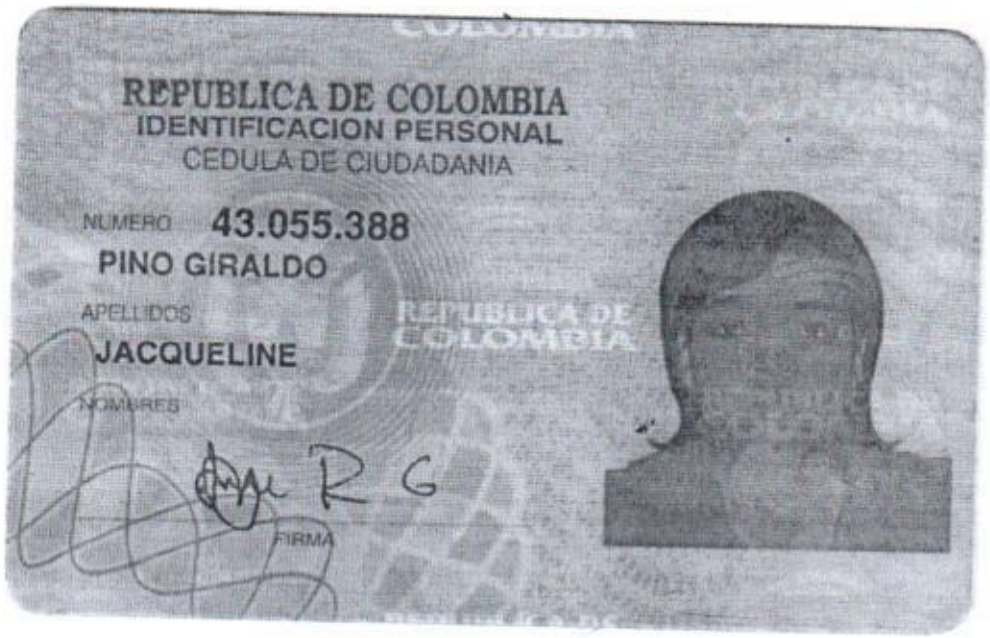

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43.055.388
PINO GIRALDO
APELLIDOS
JACQUELINE
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-MAY-1963
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
18-SEP-1981 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-0114200-00262970-F-0043055388-20101029 0024593218A 1 33168987

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 8 8 E 3 4 B 1 8 A 2 5 2 A 2 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JACQUELINE PINO GIRALDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43055388 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 33438-T Sl tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Vegachi 24 de julio de 2026

La Suscrita Contadora Público del Municipio de Vegachí

Certifica

Que el Municipio con NIT 890.985.285-8 a la fecha, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y aportes a la seguridad social de los empleados y trabajadores a su servicio correspondiente a los últimos seis (6) meses.

La anterior certificación para fines pertinentes


Cordialmente,

JACQUELINE PINO GIRALDO

Contador Público

TP 33438-T

Anexo (1) Tarjeta profesional

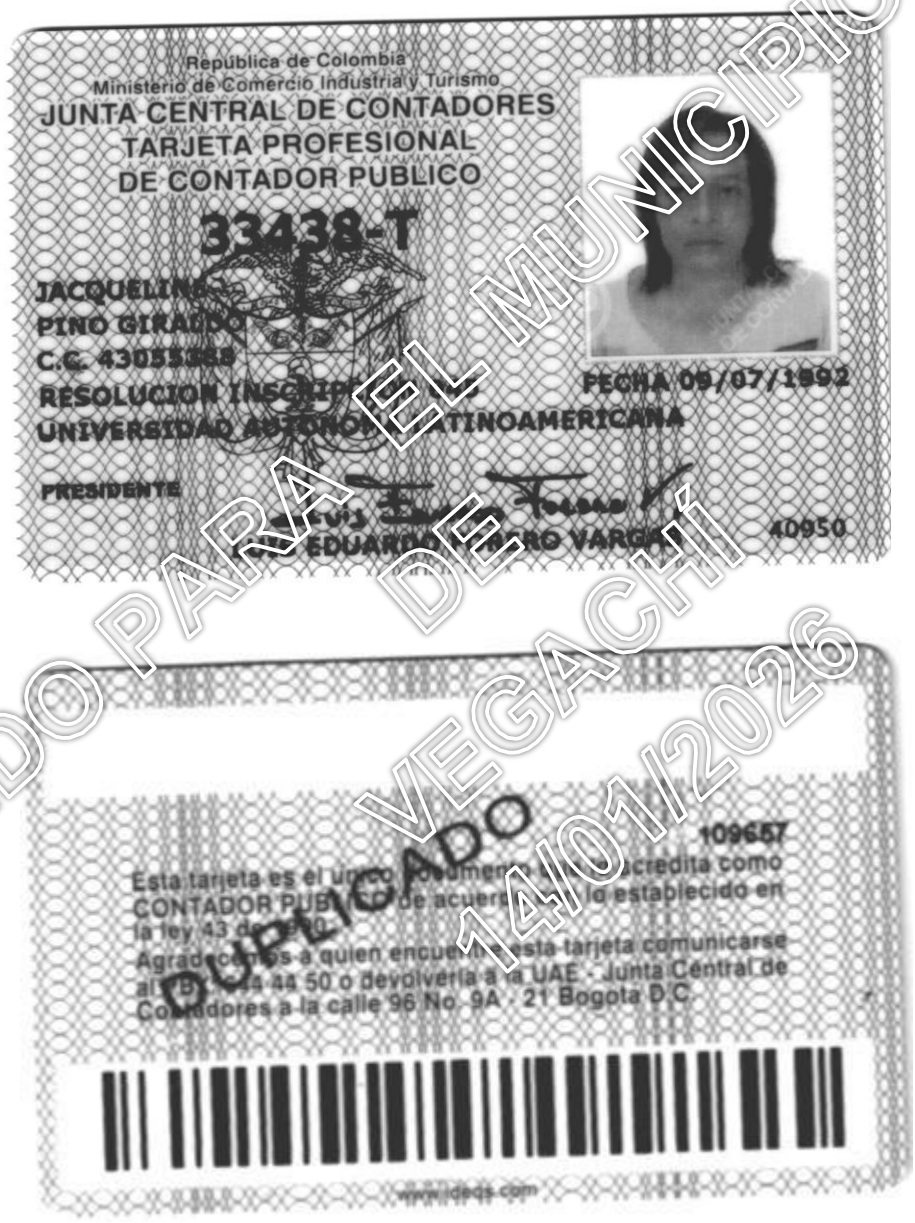

VALIDO PARA EL MUNICIPIO DE VEGACHÍ 14/01/2026

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890985285
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		MUNICIPIO DE VEGACHI	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VEGACHI	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 49A N 50A- 14	TELÉFONO:	8305625
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades ejecutivas de la administración públi
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6030689844**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/12		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		561163059	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 1.437.600	$ 0	$ 0	$ 45.000	$ 45.000	$ 0	$ 0	$ 1.527.600	$ 0	$ 1.527.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	15	$ 10.123.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.123.100	$ 0	$ 10.123.100
230301	230301-PORVENIR	17	$ 9.762.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.762.800	$ 0	$ 9.762.800
230201	230201- PROTECCION	7	$ 4.956.100	$ 0	$ 0	$ 45.000	$ 45.000	$ 0	$ 0	$ 5.046.100	$ 0	$ 5.046.100
SUBTOTALES:										**$ 26.459.600**	**$ 0**	**$ 26.459.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	17		$ 0		$ 0		$ 0	$ 10.007.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.007.400	$ 0	$ 0	$ 10.007.400
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.286.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.286.100	$ 0	$ 0	$ 2.286.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.136.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.136.400	$ 0	$ 0	$ 1.136.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 661.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 661.900	$ 0	$ 0	$ 661.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	14		$ 0		$ 0		$ 0	$ 6.422.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.422.800	$ 0	$ 0	$ 6.422.800
SUBTOTALES:													**$ 20.514.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 20.514.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	40		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.710.000	$ 2.710.000	$ 0	$ 0	$ 2.710.000
SUBTOTALES:									**$ 2.710.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.710.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	40	$ 6.515.500	$ 0	$ 6.515.500
SUBTOTALES:			**$ 6.515.500**	**$ 0**	**$ 6.515.500**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAESAP	PAESAP - ESAP	40	$ 815.700	$ 0	$ 815.700
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	40	$ 4.887.400	$ 0	$ 4.887.400
PAMIED	PAMIED - MINISTERIO DE EDUCACION	40	$ 1.630.200	$ 0	$ 1.630.200
PASENA	PASENA - SENA	39	$ 770.700	$ 0	$ 770.700
SUBTOTALES:			**$ 8.104.000**	**$ 0**	**$ 8.104.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																									PENSIÓN									SALUD								ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																		
1	CC 1001809722	RAMIREZ ZULETA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 3.059.413	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 3.059.413	$ 489.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 489.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.059.413	$ 382.500	$ 0	$ 382.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.059.413	1	$ 16.000	30	$ 3.059.413	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 122.400	$ 15.300	$ 91.800	$ 15.300	$ 30.600
2	CC 1007767704	AVILEZ PASOS NATTY MYCHELI	DEPEND		$ 2.218.150	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 2.218.150	$ 355.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 355.000	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 2.218.150	$ 277.300	$ 0	$ 277.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.218.150	1	$ 11.600	30	$ 2.218.150	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 88.800	$ 11.100	$ 66.600	$ 11.100	$ 22.200
3	CC 1013596798	SERRANO FLOREZ INGRID VERONICA	DEPEND		$ 2.218.150	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 2.218.150	$ 355.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 355.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.218.150	$ 277.300	$ 0	$ 277.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.218.150	1	$ 11.600	30	$ 2.218.150	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 88.800	$ 11.100	$ 66.600	$ 11.100	$ 22.200
4	CC 1035228310	HINCAPIE LONDOÑO MERLYN ANDREA	DEPEND		$ 3.826.800	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 3.826.800	$ 612.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 612.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.826.800	$ 478.400	$ 0	$ 478.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.826.800	1	$ 20.000	30	$ 3.826.800	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 153.100	$ 19.200	$ 114.900	$ 19.200	$ 38.300
5	CC 1038545554	MESA MIRA LAURA CAMILA	DEPEND		$ 3.836.800	FIJO			NO									01-30							230301-PORVENIR	30	$ 5.294.784	$ 847.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 847.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 5.294.784	$ 661.900	$ 0	$ 661.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.294.784	1	$ 129.000	30	$ 5.294.784	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 211.800	$ 26.500	$ 158.900	$ 26.500	$ 53.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890985285
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		MUNICIPIO DE VEGACHI	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VEGACHI	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 49A N 50A- 14	TELÉFONO:	8305625
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades ejecutivas de la administración públi
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6030689844**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/12			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	561163059

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
6	CC 1042090140	BRAND MONSALVE EDUARD	DEPEND		$ 2.398.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.398.000	$ 383.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 383.700	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 2.398.000	$ 299.800	$ 0	$ 299.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.398.000	4	$ 104.400	30	$ 2.398.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 96.000	$ 12.000	$ 72.000	$ 12.000	$ 24.000
7	CC 1042090675	MACIAS URIBE DIEGO ARMANDO	DEPEND		$ 6.510.570	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 6.510.570	$ 1.041.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.041.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 6.510.570	$ 813.900	$ 0	$ 813.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.510.570	1	$ 34.000	30	$ 6.510.570	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 260.500	$ 32.600	$ 195.400	$ 32.600	$ 65.200
8	CC 1042092655	ARIAS HERNANDEZ BRAYAN ANDRES	DEPEND		$ 5.492.614	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 5.492.614	$ 878.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 878.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.492.614	$ 686.600	$ 0	$ 686.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.492.614	1	$ 28.700	30	$ 5.492.614	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 219.800	$ 27.500	$ 164.800	$ 27.500	$ 55.000
9	CC 1042092831	BEDOYA GIL YESSENIA MAYERLYN	DEPEND		$ 2.158.200	FIJO			NO														28-31			230301-PORVENIR	3	$ 215.820	$ 34.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 34.600	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	3	$ 215.820	$ 27.000	$ 0	$ 27.000	14-11 - ARL SURA	3	$ 215.820	1	$ 0	3	$ 215.820	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.700	$ 1.100	$ 6.500	$ 1.100	$ 2.200
10	CC 1042092831	BEDOYA GIL YESSENIA MAYERLYN	DEPEND		$ 2.158.200	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	27	$ 1.942.380	$ 310.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 310.800	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	27	$ 1.942.380	$ 242.800	$ 0	$ 242.800	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.942.380	1	$ 10.200	27	$ 1.942.380	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 77.700	$ 9.800	$ 58.300	$ 9.800	$ 19.500
11	CC 1042093974	LONDOÑO TEJADA MARIA ELENA	DEPEND		$ 3.716.900	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.716.900	$ 594.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 594.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.716.900	$ 464.700	$ 0	$ 464.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.716.900	1	$ 90.600	30	$ 3.716.900	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 148.700	$ 18.600	$ 111.600	$ 18.600	$ 37.200
12	CC 1045606684	MONTALVO MUÑOZ RONAL	DEPEND		$ 2.529.547	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.529.547	$ 404.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 404.800	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 2.529.547	$ 316.200	$ 0	$ 316.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.529.547	1	$ 13.300	30	$ 2.529.547	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 101.200	$ 12.700	$ 75.900	$ 12.700	$ 25.300
13	CC 1046913082	QUINTERO MIRA DANIEL ARTURO	DEPEND		$ 6.824.732	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.824.732	$ 1.092.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.092.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 6.824.732	$ 853.100	$ 0	$ 853.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.824.732	1	$ 35.700	30	$ 6.824.732	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 273.000	$ 34.200	$ 204.800	$ 34.200	$ 68.300
14	CC 1048045549	BERNAL MONSALVE LAURA	DEPEND		$ 2.158.200	FIJO			NO														21-31			230301-PORVENIR	10	$ 719.400	$ 115.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 115.200	EPS037-NUEVA EPS	10	$ 719.400	$ 90.000	$ 0	$ 90.000	14-11 - ARL SURA	10	$ 719.400	1	$ 0	10	$ 719.400	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 28.800	$ 3.600	$ 21.600	$ 3.600	$ 7.200
15	CC 1048045549	BERNAL MONSALVE LAURA	DEPEND		$ 2.158.200	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	20	$ 1.438.800	$ 230.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 230.300	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 1.438.800	$ 179.900	$ 0	$ 179.900	14-11 - ARL SURA	20	$ 1.438.800	1	$ 7.600	20	$ 1.438.800	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 57.600	$ 7.200	$ 43.200	$ 7.200	$ 14.400
16	CC 1129724038	MONTOYA ZAPATA ANYI PAOLA	DEPEND		$ 2.398.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.398.000	$ 383.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 383.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.398.000	$ 299.800	$ 0	$ 299.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.398.000	1	$ 12.600	30	$ 2.398.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 96.000	$ 12.000	$ 72.000	$ 12.000	$ 24.000
17	CC 1152190040	GALLEGO GAVIRIA DIANA MILENA	DEPEND		$ 3.597.000	FIJO			NO														01-07			230201-PROTECCION	7	$ 839.300	$ 134.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 134.300	EPS002-SALUD TOTAL	7	$ 839.300	$ 105.000	$ 0	$ 105.000	14-11 - ARL SURA	7	$ 839.300	1	$ 0	7	$ 839.300	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 33.600	$ 4.200	$ 25.200	$ 4.200	$ 8.400
18	CC 1152190040	GALLEGO GAVIRIA DIANA MILENA	DEPEND		$ 3.597.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	23	$ 2.757.700	$ 441.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 441.300	EPS002-SALUD TOTAL	23	$ 2.757.700	$ 344.800	$ 0	$ 344.800	14-11 - ARL SURA	23	$ 2.757.700	1	$ 14.400	23	$ 2.757.700	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 110.400	$ 13.800	$ 82.800	$ 13.800	$ 27.600
19	CC 1152684581	PINO BUSTAMANTE ANGUI ALEXANDRA	DEPEND		$ 3.716.900	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 3.716.900	$ 594.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 594.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.716.900	$ 464.700	$ 0	$ 464.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.716.900	1	$ 90.600	30	$ 3.716.900	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 148.700	$ 18.600	$ 111.600	$ 18.600	$ 37.200
20	CC 15340502	CARMONA GOMEZ JUAN NICOLAS	DEPEND		$ 2.158.200	FIJO			NO														01-14			25-14 COLPENSIONES	14	$ 1.007.160	$ 161.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 161.200	EPS037-NUEVA EPS	14	$ 1.007.160	$ 125.900	$ 0	$ 125.900	14-11 - ARL SURA	14	$ 1.007.160	4	$ 0	14	$ 1.007.160	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.300	$ 5.100	$ 30.300	$ 5.100	$ 10.100

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890985285
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		MUNICIPIO DE VEGACHI	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VEGACHI	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 49A N 50A- 14	TELÉFONO:	8305625
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades ejecutivas de la administración públi
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6030689844**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/12			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	561163059

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
21	CC 15340502	CARMONA GOMEZ JUAN NICOLAS	DEPEND		$ 2.158.200	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	16	$ 1.151.040	$ 184.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 184.200	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 1.151.040	$ 143.900	$ 0	$ 143.900	14-11 - ARL SURA	16	$ 1.151.040	4	$ 50.100	16	$ 1.151.040	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 46.100	$ 5.800	$ 34.600	$ 5.800	$ 11.600
22	CC 15340540	AGUDELO JORGE EDUARDO	DEPEND		$ 4.679.850	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.679.850	$ 748.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 748.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.679.850	$ 585.000	$ 0	$ 585.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.679.850	1	$ 325.800	30	$ 4.679.850	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 187.200	$ 23.400	$ 140.400	$ 23.400	$ 46.800
23	CC 15341601	CARDONA VARGAS ALEXANDER	DEPEND		$ 5.995.000	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.995.000	$ 959.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 959.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 5.995.000	$ 749.400	$ 0	$ 749.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.995.000	1	$ 62.600	30	$ 5.995.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 239.800	$ 30.000	$ 179.900	$ 30.000	$ 60.000
24	CC 15341908	OCHOA MUÑOZ JOSE MARIA	DEPEND		$ 6.824.732	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 6.824.732	$ 1.092.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.092.000	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 6.824.732	$ 853.100	$ 0	$ 853.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.824.732	1	$ 35.700	30	$ 6.824.732	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 273.000	$ 34.200	$ 204.800	$ 34.200	$ 68.300
25	CC 15342061	MUÑOZ CARLOS MARIO	DEPEND		$ 3.096.434	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 3.096.434	$ 495.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 495.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.096.434	$ 387.100	$ 0	$ 387.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.096.434	1	$ 16.200	30	$ 3.096.434	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 123.900	$ 15.500	$ 92.900	$ 15.500	$ 31.000
26	CC 21501039	FLOREZ ESCUDERO ALBA ADAISY	DEPEND		$ 6.510.570	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 6.510.570	$ 1.041.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.041.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 6.510.570	$ 813.900	$ 0	$ 813.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.510.570	1	$ 34.000	30	$ 6.510.570	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 260.500	$ 32.600	$ 195.400	$ 32.600	$ 65.200
27	CC 39170722	ROJO PALACIO GLORIA CECILIA	DEPEND		$ 3.854.930	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.854.930	$ 616.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 616.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.854.930	$ 481.900	$ 0	$ 481.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.854.930	1	$ 20.200	30	$ 3.854.930	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 154.200	$ 19.300	$ 115.700	$ 19.300	$ 38.600
28	CC 39171301	MENDEZ RAMIREZ DIANA JOAQUINA	DEPEND		$ 3.268.353	FIJO			NO														21-31			25-14 COLPENSIONES	10	$ 1.089.451	$ 174.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 174.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	10	$ 1.089.451	$ 136.200	$ 0	$ 136.200	14-11 - ARL SURA	10	$ 1.089.451	1	$ 0	10	$ 1.089.451	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 43.600	$ 5.500	$ 32.700	$ 5.500	$ 10.900
29	CC 39171301	MENDEZ RAMIREZ DIANA JOAQUINA	DEPEND		$ 3.268.353	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	20	$ 2.178.902	$ 348.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 348.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	20	$ 2.178.902	$ 272.400	$ 0	$ 272.400	14-11 - ARL SURA	20	$ 2.178.902	1	$ 11.400	20	$ 2.178.902	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 87.200	$ 10.900	$ 65.400	$ 10.900	$ 21.800
30	CC 39172155	TORRES GAVIRIA LILIANA MARIA	DEPEND		$ 2.218.150	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.218.150	$ 355.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 355.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.218.150	$ 277.300	$ 0	$ 277.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.218.150	1	$ 11.600	30	$ 2.218.150	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 88.800	$ 11.100	$ 66.600	$ 11.100	$ 22.200
31	CC 39172722	TOBON CARMONA DALSY LUCIA	DEPEND		$ 2.158.200	FIJO			NO														01-07			230301-PORVENIR	7	$ 503.580	$ 80.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 80.600	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	7	$ 503.580	$ 63.000	$ 0	$ 63.000	14-11 - ARL SURA	7	$ 503.580	1	$ 0	7	$ 503.580	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 20.200	$ 2.600	$ 15.200	$ 2.600	$ 5.100
32	CC 39172722	TOBON CARMONA DALSY LUCIA	DEPEND		$ 2.158.200	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	23	$ 1.654.620	$ 264.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 264.800	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	23	$ 1.654.620	$ 206.900	$ 0	$ 206.900	14-11 - ARL SURA	23	$ 1.654.620	1	$ 8.700	23	$ 1.654.620	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 66.200	$ 8.300	$ 49.700	$ 8.300	$ 16.600
33	CC 39172926	PARRA MARIN YOLIMA ANDREA	DEPEND		$ 3.597.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 3.597.000	$ 575.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 575.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.597.000	$ 449.700	$ 0	$ 449.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.597.000	1	$ 18.800	30	$ 3.597.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 143.900	$ 18.000	$ 108.000	$ 18.000	$ 36.000
34	CC 39173326	VELASQUEZ DUQUE VIVIANA PATRICIA	DEPEND		$ 2.158.200	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.158.200	$ 345.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 345.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.158.200	$ 269.800	$ 0	$ 269.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.158.200	1	$ 11.300	30	$ 2.158.200	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 86.400	$ 10.800	$ 64.800	$ 10.800	$ 21.600
35	CC 39213126	DIAZ ISAZA MARIBEL	DEPEND		$ 6.510.570	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 6.510.570	$ 1.041.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.041.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 6.510.570	$ 813.900	$ 0	$ 813.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.510.570	1	$ 453.200	30	$ 6.510.570	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 260.500	$ 32.600	$ 195.400	$ 32.600	$ 65.200

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890985285
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		MUNICIPIO DE VEGACHI	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VEGACHI	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 49A N 50A- 14	TELÉFONO:	8305625
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades ejecutivas de la administración públi
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6030689844**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	561163059

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																								PENSIÓN									SALUD						ARP											
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS															CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
36	CC 42143056	JARAMILLO FORONDA CLAUDIA JOHANA	DEPEND		$ 6.510.570	FIJO			NO									01-30								231001-COLFONDOS	30	$ 8.984.587	$ 1.437.600	$ 45.000	$ 45.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.527.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 8.984.587	$ 1.123.100	$ 0	$ 1.123.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 8.984.587	1	$ 46.900	30	$ 8.984.587	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 359.400	$ 45.000	$ 269.600	$ 45.000	$ 89.900
37	CC 43202889	VARGAS RUA MONICA PATRICIA	DEPEND		$ 2.158.200	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.158.200	$ 345.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 345.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.158.200	$ 269.800	$ 0	$ 269.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.158.200	1	$ 11.300	30	$ 2.158.200	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 86.400	$ 10.800	$ 64.800	$ 10.800	$ 21.600
38	CC 43872126	TABORDA PALACIO YENI PAOLA	DEPEND		$ 6.510.570	FIJO			NO									01-30								230201-PROTECCION	30	$ 8.984.587	$ 1.437.600	$ 45.000	$ 45.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.527.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 8.984.587	$ 1.123.100	$ 0	$ 1.123.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 8.984.587	1	$ 46.900	30	$ 8.984.587	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 359.400	$ 0	$ 269.600	$ 45.000	$ 89.900
39	CC 43912402	OSORNO MIRA BLEIDY MARIA	DEPEND		$ 3.059.413	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 3.059.413	$ 489.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 489.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.059.413	$ 382.500	$ 0	$ 382.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.059.413	1	$ 16.000	30	$ 3.059.413	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 122.400	$ 15.300	$ 91.800	$ 15.300	$ 30.600
40	CC 43987286	MORENO GOMEZ JULIANA	DEPEND		$ 5.492.614	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.492.614	$ 878.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 878.900	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 5.492.614	$ 686.600	$ 0	$ 686.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.492.614	1	$ 28.700	30	$ 5.492.614	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 219.800	$ 27.500	$ 164.800	$ 27.500	$ 55.000
41	CC 43990013	MENESES CORREA YULIANA ANDREA	DEPEND		$ 3.205.906	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.205.906	$ 513.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 513.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.205.906	$ 400.800	$ 0	$ 400.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.205.906	1	$ 16.800	30	$ 3.205.906	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 128.300	$ 16.100	$ 96.200	$ 16.100	$ 32.100
42	CC 70601313	AGUDELO BARRERA LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 5.862.393	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.862.393	$ 938.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 938.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.862.393	$ 732.800	$ 0	$ 732.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.862.393	1	$ 408.100	30	$ 5.862.393	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 234.500	$ 29.400	$ 175.900	$ 29.400	$ 58.700
43	CC 70601720	URIBE RIVERA HERNANDO ANTONIO	DEPEND		$ 2.529.547	FIJO			NO														01-07			25-14 COLPENSIONES	7	$ 590.228	$ 94.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 94.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	$ 590.228	$ 73.800	$ 0	$ 73.800	14-11 - ARL SURA	7	$ 590.228	1	$ 0	7	$ 590.228	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 23.700	$ 3.000	$ 17.800	$ 3.000	$ 6.000
44	CC 70601720	URIBE RIVERA HERNANDO ANTONIO	DEPEND		$ 2.529.547	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	23	$ 1.939.320	$ 310.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 310.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	23	$ 1.939.320	$ 242.500	$ 0	$ 242.500	14-11 - ARL SURA	23	$ 1.939.320	4	$ 84.400	23	$ 1.939.320	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 77.600	$ 9.700	$ 58.200	$ 9.700	$ 19.400
45	CC 71187829	ZEA RUA JULIO CESAR	DEPEND		$ 4.679.850	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.679.850	$ 748.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 748.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4.679.850	$ 585.000	$ 0	$ 585.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.679.850	1	$ 325.800	30	$ 4.679.850	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 187.200	$ 23.400	$ 140.400	$ 23.400	$ 46.800
46	CC 71607806	CANO LOAIZA WALTER GUILLERMO	DEPEND		$ 6.619.012	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.619.012	$ 1.059.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.059.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 6.619.012	$ 827.400	$ 0	$ 827.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.619.012	1	$ 34.600	30	$ 6.619.012	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 264.800	$ 33.100	$ 198.600	$ 33.100	$ 66.200
47	CC 98555266	JARAMILLO HAMID ZHAMIR ALBERTO	DEPEND		$ 3.379.000	FIJO			NO		16															230201-PROTECCION	1	$ 112.634	$ 18.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 112.634	$ 14.100	$ 0	$ 14.100	14-11 - ARL SURA	1	$ 112.634		$ 600	1	$ 112.634	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.600	$ 600	$ 3.400	$ 600	$ 1.200
48	CC 98555266	JARAMILLO HAMID ZHAMIR ALBERTO	DEPEND		$ 3.379.000	FIJO			NO										01-15							230201-PROTECCION	15	$ 1.858.450	$ 223.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 223.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	15	$ 1.858.450	$ 158.000	$ 0	$ 158.000	14-11 - ARL SURA	15	$ 1.858.450		$ 0	15	$ 1.858.450	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 64.303.700

Planilla Pagada
