ALIANZA MUNDIAL S.A.S.
Nit. 900.153.859-0

Medellín, 5 de agosto de 2026

ENV-PARQUES-045

Señora,
MEBYS DE LA OSSA
Representante Legal
Compañía Consultora Colombiana Triple C S.A.S BIC

Referencia: Contrato No. 4600106254 de 2025. Objeto: OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO (PARQUES) DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

Asunto: Solicitud de suspensión del contrato a partir del 19 de agosto de 2026 y hasta tanto se superen los hechos que motivan la presente solicitud.

Respetada señora:

Mediante comunicación de fecha 14 de julio de 2026, la Secretaría de Infraestructura Física solicitó la elaboración de una propuesta ajustada a las necesidades del proyecto, teniendo en cuenta las características particulares de los sectores donde se ubican los parques Ciudad del Río y Lineal La Frontera, así como las dinámicas y condiciones propias de sus espacios públicos.

En este sentido, se consideró pertinente evaluar e implementar una nueva tipología de mobiliario urbano que respondan de mejor manera a las características propias del sector, bajo criterios de diseño urbano, ergonomía y compatibilidad arquitectónica y paisajística, procurando una adecuada integración con el entorno y con las condiciones físicas y funcionales de cada parque.

La implementación de este cambio de mobiliario exige la elaboración de una propuesta técnica y económica ajustada a los requerimientos del Distrito, la cual debe contemplar los respectivos Análisis de Precios Unitarios (APU) y el presupuesto correspondiente, así como surtir el proceso de revisión y aprobación por parte de la Secretaría de Infraestructura Física.

.

ALIANZA MUNDIAL S.A.S.
Nit. 900.153.859-0

En atención a la necesidad de adelantar las actividades previamente descritas y considerando los tiempos requeridos para la aprobación definitiva del mobiliario por parte de la Secretaría de Infraestructura Física, así como para la posterior gestión de fabricación, suministro e instalación de los elementos correspondientes, se hace necesario suspender temporalmente la ejecución del presente contrato.

La suspensión del plazo contractual constituye la medida más adecuada para ajustar la programación de las actividades a los tiempos reales que demandan los procesos de aprobación, producción, suministro e instalación del mobiliario, garantizando de esta manera la calidad técnica de las intervenciones, el correcto desarrollo de las obras y el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales, sin generar afectaciones a las partes.

En consecuencia, solicitamos respetuosamente la suspensión temporal del plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 4600106254 de 2025, a partir del 19 de agosto de 2026 y hasta tanto desaparezcan las circunstancias que dan origen a la presente solicitud y se cuente con las condiciones necesarias para la reanudación de las actividades contractuales.

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar la adecuada culminación de las obras de mejoramiento correspondientes a los dos (2) parques adicionados al contrato, a saber: Parque Ciudad del Río y Parque Lineal La Frontera, asegurando que las intervenciones se ejecuten conforme a los criterios técnicos, de calidad y funcionalidad previstos para el proyecto.

Agradecemos de antemano su gestión para la tramitación de la correspondiente del Acta de Suspensión y quedamos atentos a sus instrucciones.

Se anexa propuesta de mobiliario.


Atentamente,

JOHN JAIRO CEDIEL
Representante Legal
ALIANZA MUNDIAL S.A.S

.

Design references


Referentes de diseño

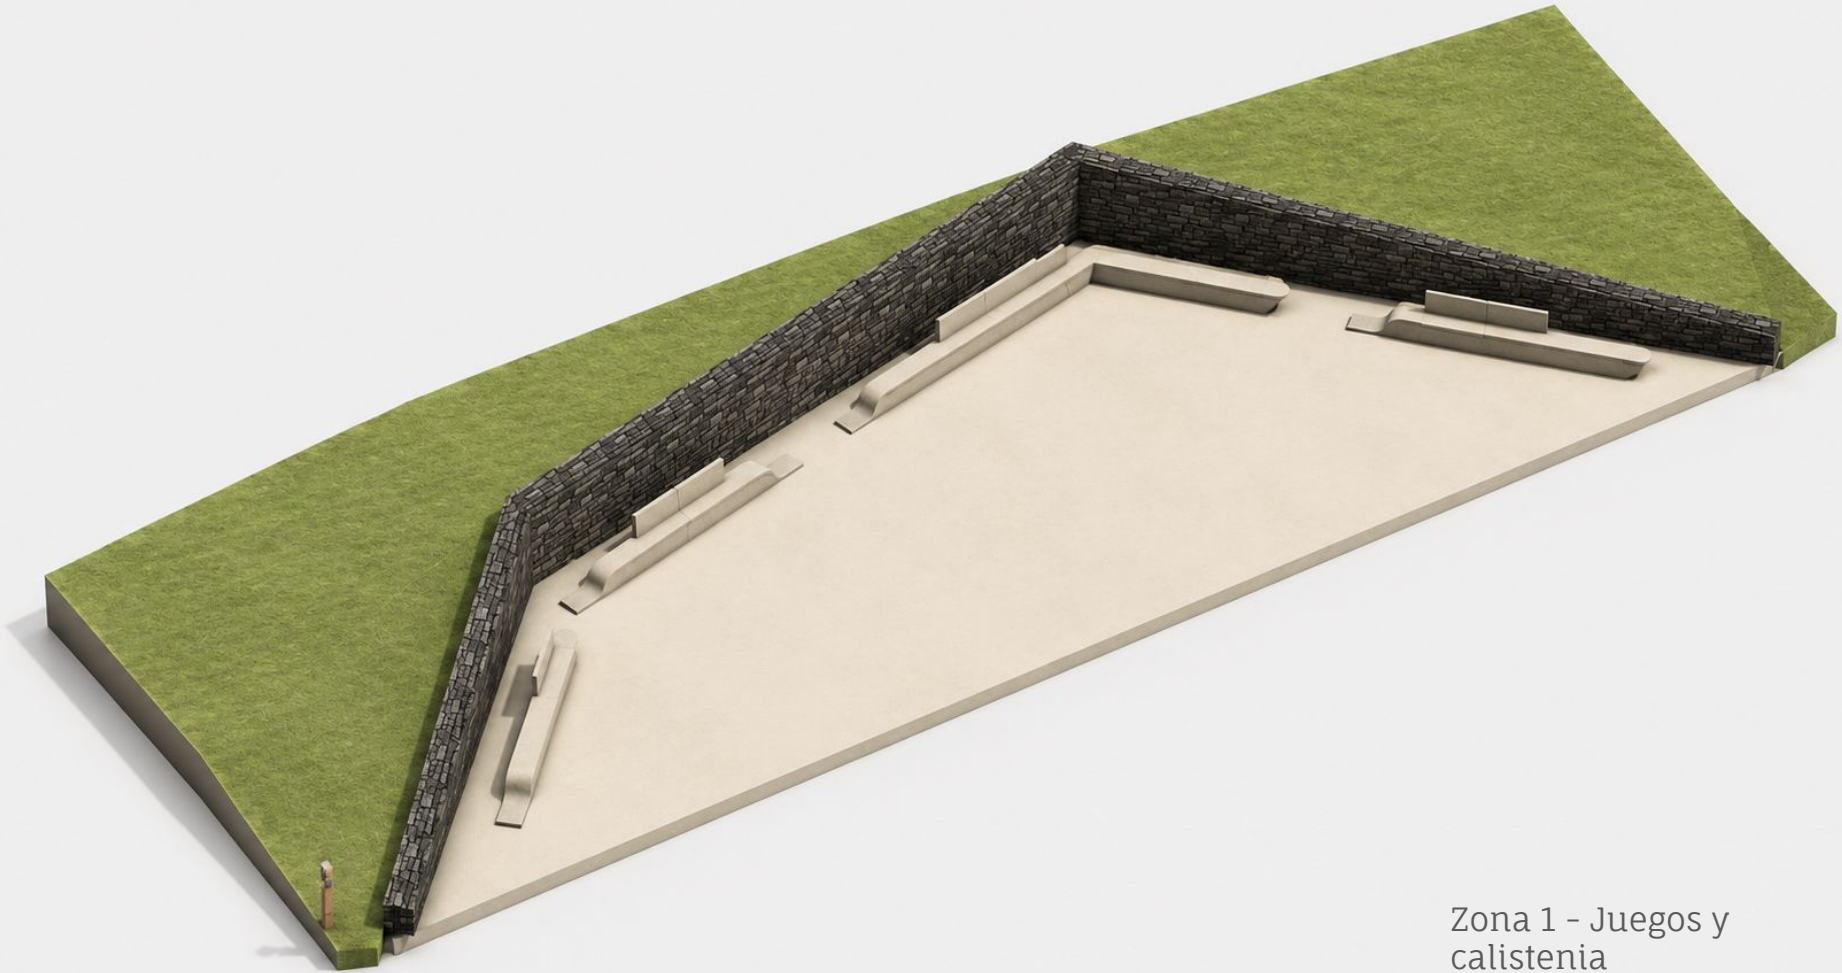

Zona 1 - Juegos y calistenia



Zona 2 - Pet

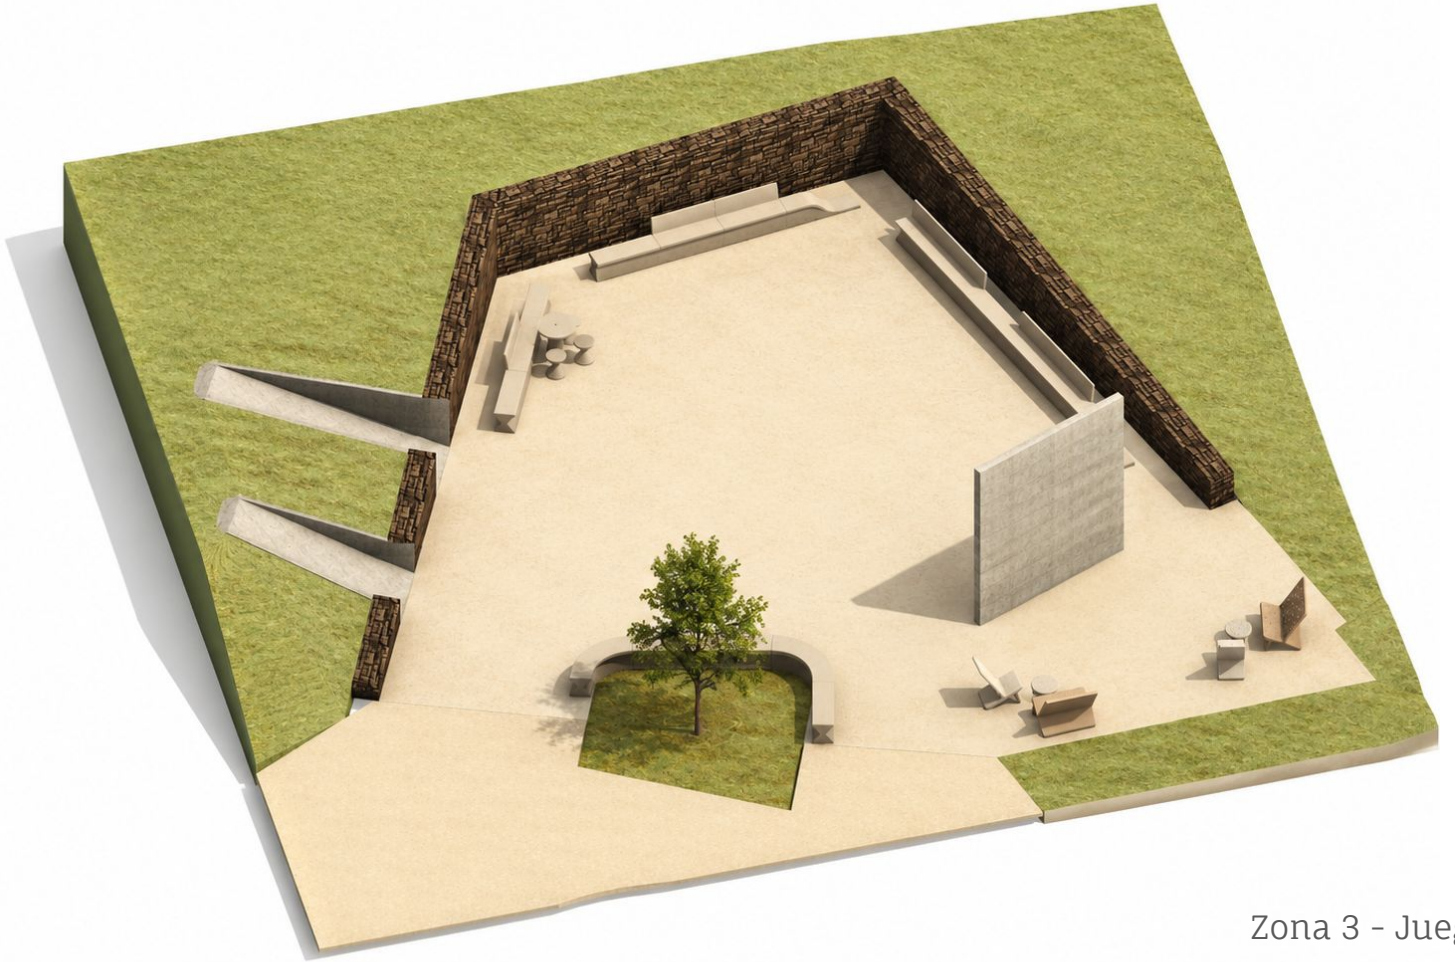

Zona 3 - Juegos Escalar



Zona 4 - Juegos Infantiles



Zona 5 - Laberinto




Zona 6 - Pérgolas



ASOLEADORA SONDAG

Cantidad: 1




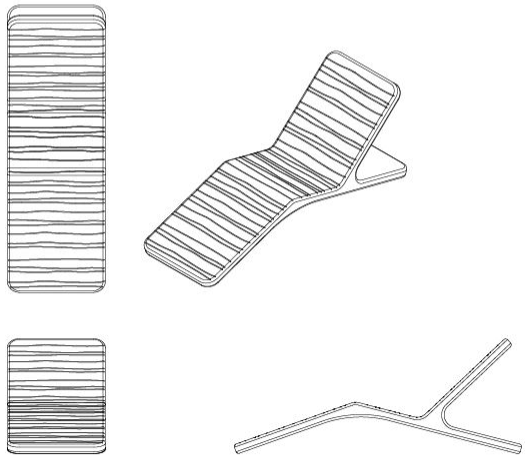


MESA DE CENTRO S SONDAG

Cantidad: 10



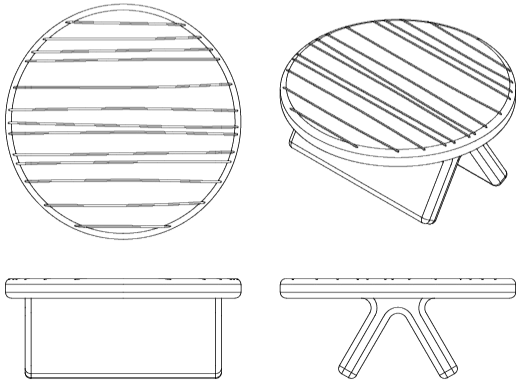

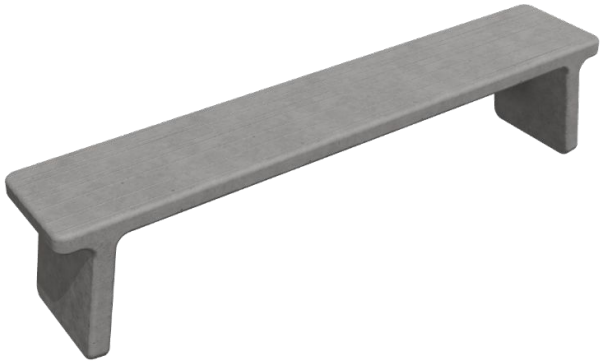

BANCA SONDAG

Cantidad: 4

MESA DE COMEDOR SONDAG


Cantidad: 2





BANCA CIRCULAR A FUNGI


Cantidad: 3

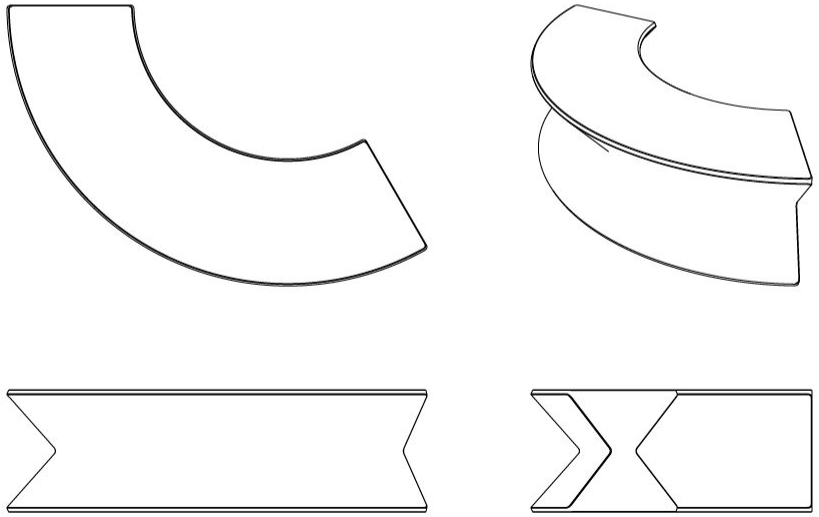



BANCA CON ESPALDAR LINEAL A FUNGI


Cantidad: 14

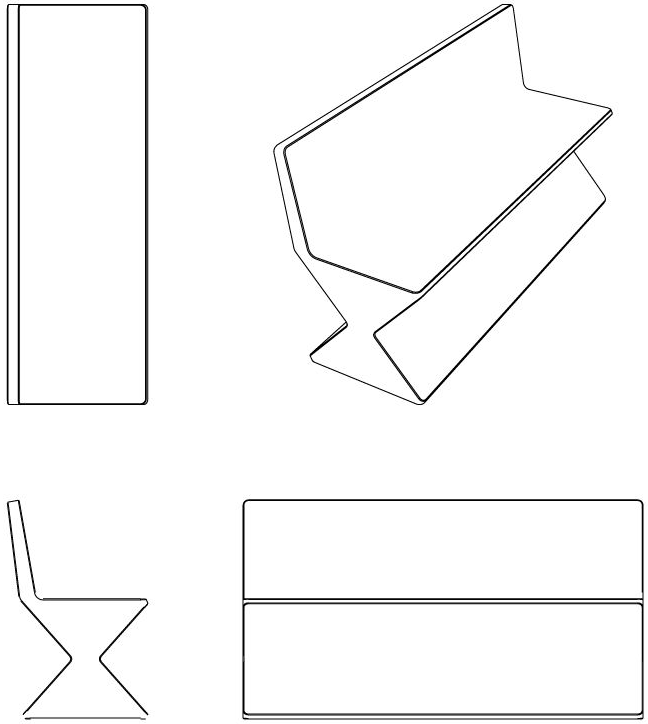



BANCA LINEAL A FUNGI


Cantidad: 14

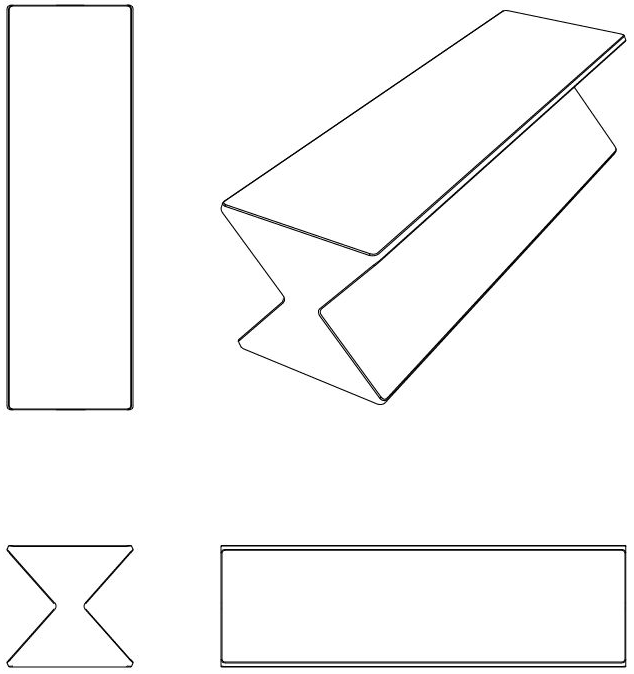



BANCA ÁNGULO FUNGI


Cantidad: 1

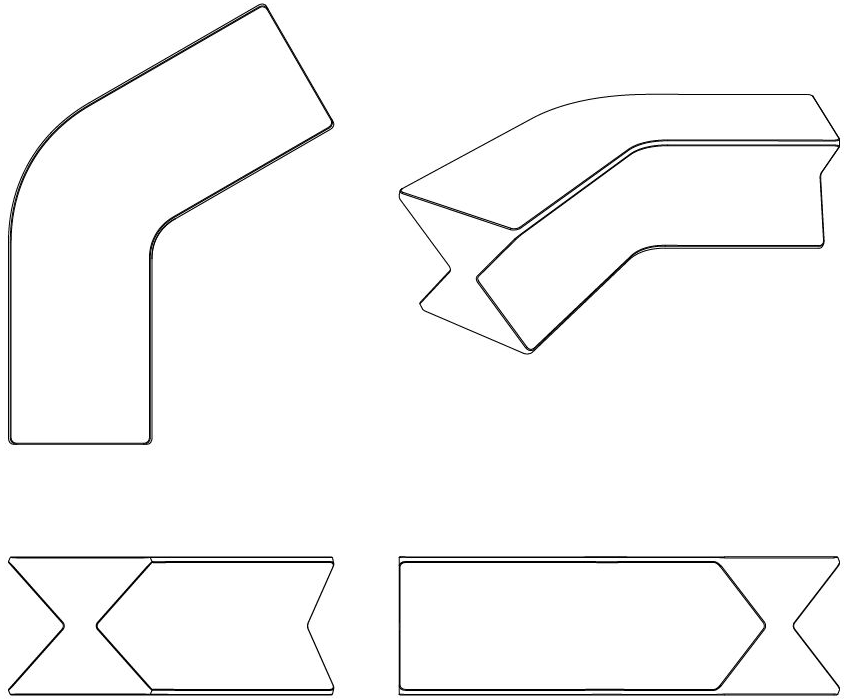



BANCA REMATE FUNGI


Cantidad: 8

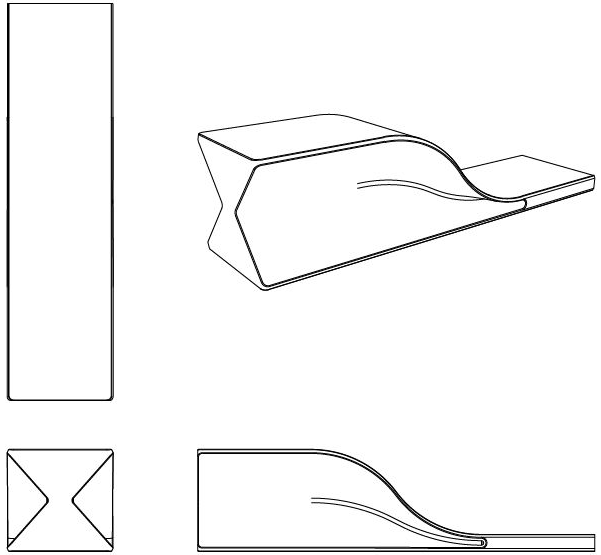



BUTACO FUNGI

Cantidad: 9

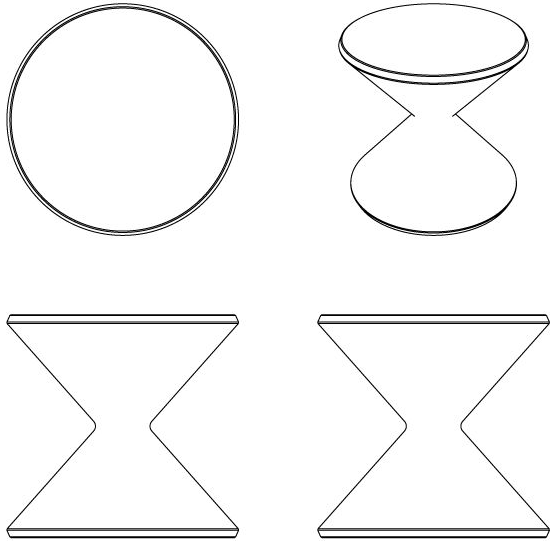





PAPELERA MASCOTAS AEERO

Cantidad: 4

POLTRONA DOBLE SONDAG

Cantidad: 2

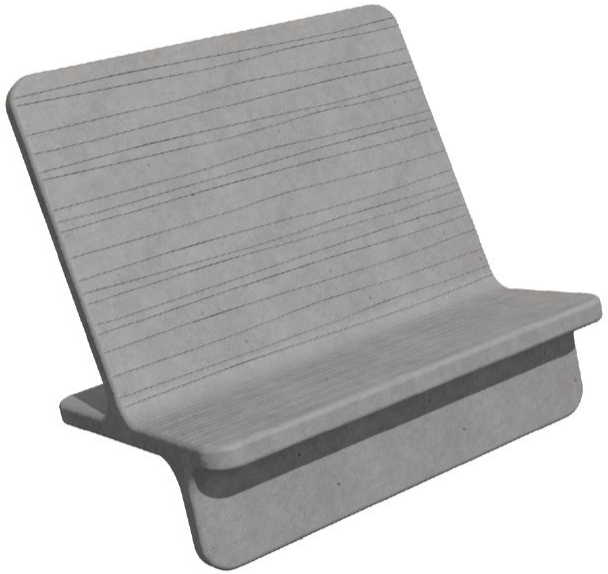


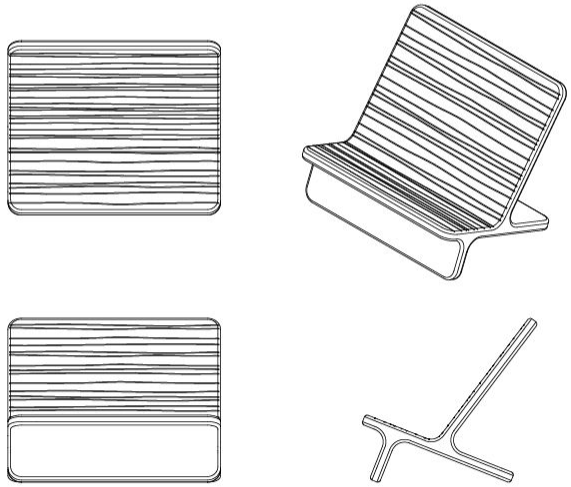

POLTRONA SONDAG

Cantidad: 18



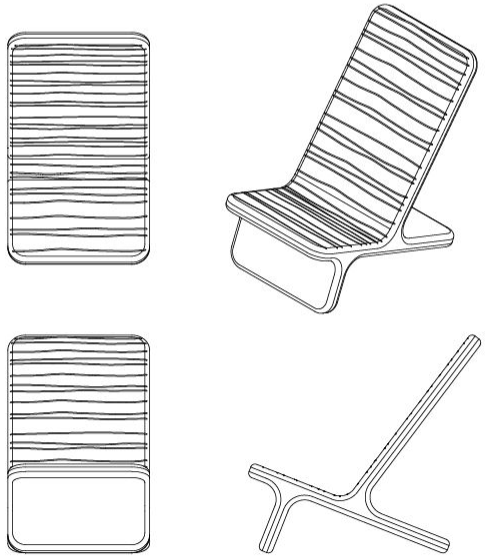

BANCA LINEAL D CERRADA FUNGI


Cantidad: 4





MESA DE COMEDOR FUNGI


Cantidad: 2

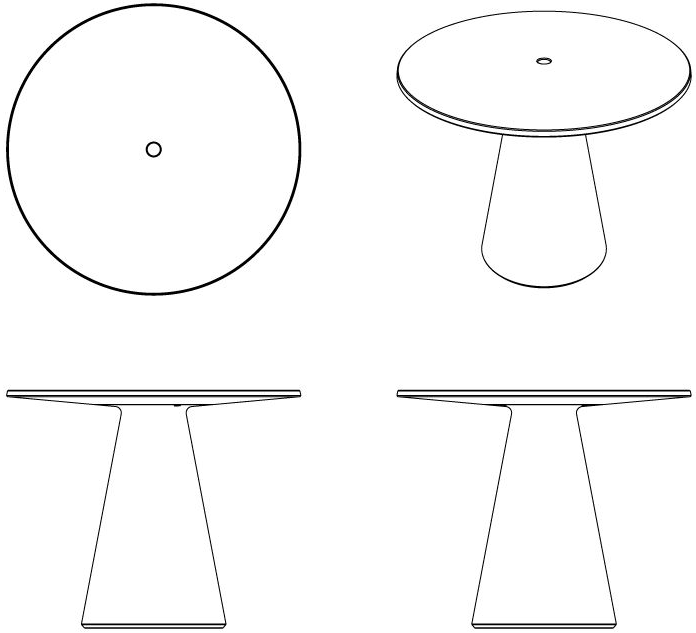

BANCA CIRCULAR H FUNGI

Cantidad: 13




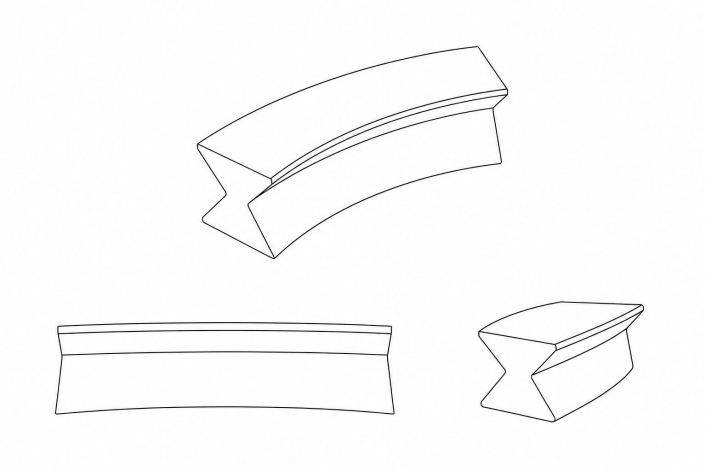

BANCA ANGULO 90° FUNGI

Cantidad: 2




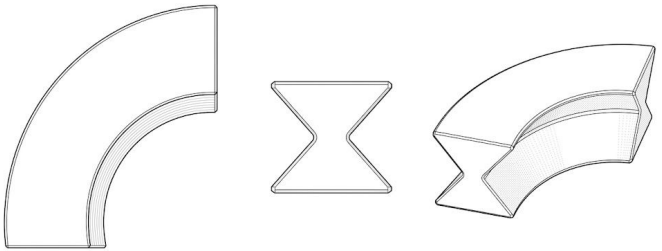



Mesa L FUNGI

Cantidad: 1

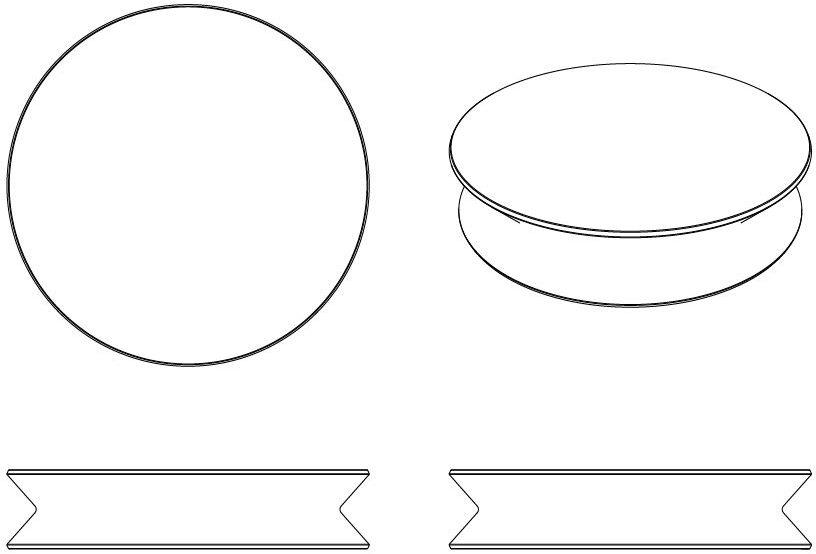



MESA M FUNGI

Cantidad: 2

