	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/26

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	20//05/26				
INFORME No.	4	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	1/04/26	Y EL	30/04/26
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: "FORMULACI ÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO (PORH) DE LA CORRIENTE PRINCIPAL DEL RÍO SOGAMOSO Y SUS PRINCIPALES TRIBUTARIOS EN LA JURISDICCI ÓN DE LA CORPORACI ÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)"				

ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	12 meses
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 271.261.643,18
PROCESO No.:	CM2-030-2025	FECHA DE INICIO:	31/12/25
CONTRATO No.:	Contrato de Interventoría No. 01510-2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/12/26
CONTRATISTA:	HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO	LOCALIZACIÓN	SANTANDER
NIT CONTRATISTA:	7.169.171	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	APOYO SUPERVISIÓN	RODOLFO SANCHEZ RUIZ / JHORMAN RAFAEL RAMÍREZ PINTO

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	31/12/25	31/12/25	30/12/26	12				


2. EJECUCION PRESUPUESTAL

		ADICIONES			
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00				
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 0,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 271.261.643,18				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 271.261.643,18				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 271.261.643,18				
VALOR PAGADO:	$ 0,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 271.261.643,18				
% POR PAGAR	100,00%				
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
TOTAL		$ -

3. CURVA "S"

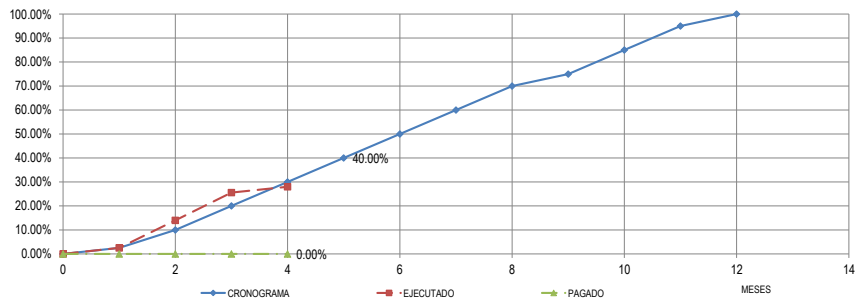

MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	2,50%	2,50%	0,00%
2	10,00%	14,00%	0,00%
3	20,00%	25,60%	0,00%
4	30,00%	28,00%	0,00%
5	40,00%		
6	50,00%		
7	60,00%		
8	70,00%		
9	75,00%		
10	85,00%		
11	95,00%		
12	100,00%		

PROGRAMADO	30,00%	
EJECUTADO	28,00%	
ATRASOS	-2,00%	
DESEMPEÑO		0,93
% PAGADO A LA FECHA	0,00%	
Pendiente por Ejecutar total	$	*271.261.643,18*
% POR CANCELAR A LA FECHA	100,00%	
Índice de avance financiero		0,00

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

En el marco del seguimiento realizado, se informa que la consultoría ha cumplido con actividades clave orientadas al fortalecimiento del proyecto, entre las cuales se destacan:

Diseño e implementación del proceso de participación

Definición de los tramos o sectores de análisis

Censo de usuarios y consolidación de información

Diseño y ejecución del plan de monitoreo

Identificación de zonas de recarga del acuífero o interacciones con las aguas superficiales

La CAS participa en la socialización con las entidades institucionales, actores interesados, comunidades y juntas de acción comunal, con el acompañamiento del apoyo profesional de la consultoría.

Se realiza el acompañamiento a interventoria y consultoria en el marco del contrato en reuniones periodicas.


5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>



DISEÑO DE PROCESOS DE PARTICIPACION



TRAMOS DE ANALISIS



CENSO DE USUARIOS



DISEÑO PLAN DE MONITOREO




EJECUCION DE MONITOREO



MATERIALIZACION MOJONES



ESPACIOS DE SOCIALIZACION



PARTICIPACIÓN CAS - SOCIALIZACÓN



PARTICIPACIÓN CAS - SOCIALIZACIÓN



PARTICIPACIÓN CAS - SOCIALIZACIÓN

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

Nombre: SUPERVISOR / INTERVENTOR
EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	Jhorman Rafael Ramírez Pinto	Contratista SPL	

REVISO:	Rodolfo Sanchez Ruiz	Funcionario Esp. SPL	
V.B:			
